

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.065.600.37	Nº SICOM 895302/2019	GESTOR Ministério do Desenv. Regional - MDR	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO/MODALIDADE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO	RECURSO OGU não-PAC
PROFONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB	MUNICÍPIO / UF CAMPINA GRANDE/PB	LOCALIDADE / ENDEREÇO Diversas ruas de diversos bairros	VALORES CONTRATADOS (R\$)		
OBJETO Recapetimento Asfáltico e Requalificação de Calçadas	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapetimento Asfáltico e Humanização de Calçadas em Campina Grande- PB	REPASSA 19.299.907,63	CONTRAPARTIDA 798.016,79	INVESTIMENTO 20.094.924,42	

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.
									Repassa (R\$)	Acum. Período Anterior	No Período	
Situação do TC/CR:									Reprogramar:			
Atrasada									6	Saldo a	Contra-partida (R\$)	
Percentual previsto em: dez-20									100,00%	127.584,37	5.276,21	
Acumulado Anterior: 37,33%												
1	Meta 1.	Serviços Preliminares	Licitado / Em Execução	80,00	m²	2.08.022/2020	1	37.667,20	-	-	-	-
1	Meta 2.	Recapetimento Asfáltico	Licitado / Em Execução	287.724,69	m²	2.08.022/2020	6	18.187.979,23	7.376.954,23	1.765.463,99	9.142.418,22	50,27%
1	Meta 3.	Requalificação de Calçadas	Licitado / Em Execução	9.465,69	m²		1	1.679.473,03	75.205,81	-	75.205,81	4,48%
1	Meta 4.	Requalificação de Calçadas	Licitado / Em Execução	44,48	m		1	56.944,38	-	-	-	-
TOTAL									7.452.160,04	1.765.463,99	9.217.624,03	46,18%

Rel: 261 > 500a
276

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
Eng. Civ. - CREA/PB Nº 20.283/2012

(Assinatura)
José Benício da Silva Filho
Eng. Civil - CREA/PB Nº 20.283/2012 - Coordenador de Planejamento de OBRAS

(Assinatura)
Construtora Rocha-Genelente Ltda.
Eng. Antônio de Oliveira
CREA 16660/5338 D/PB

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período	Física Acum.
-------	-----------------	------------------------------	----------	------------	-------	-----------------------------	----------	-------------------	------------------------	------------	---------------------------	--------------

Observações:

Local: CAMPINA GRANDE-PB

Data: 22 de dezembro de 2020

Francisco de Jesus C. Xavier
 Representante Tomador / Agente Promotor

Responsável Técnico
 Nome: FRANCISCO DE JESUS C. XAVIER
 Cargo: RESPONSÁVEL TÉCNICO
 ART/RRT Fiscal: PB20180221411

FERNANDA RIBEIRO BARBOZA
 SECRETÁRIA DE OBRAS

Responsável Social
 Nome:
 Cargo:

Responsável Financeiro
 Nome:
 Cargo:

Francisco de Jesus C. Xavier
 PRF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
 FRANCISCO DE JESUS C. XAVIER
 Eng. Civil - CREA-PB Nº 13728/US-1-2

José Benício da Silva Filho
 José Benício da Silva Filho
 FIA 0052008 - Coordenador
 de Planejamento de Obras

Consuelo Rocha Cavalcante Ltda.
 Eng. João Nildo de Oliveira
 CREA 1600/5208-D/PE



Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

CNPJ: 09.323.098/0001-92 -Insc. Estadual:16.056.310-0

Rua Álvaro de Araújo Pereira, N° 255 – Jardim Tavares – CEP: 58.402-300 – Campina Grande – PB

Fone: (83) 3341-1471

Fax: (83) 3322-6933

CREA: 821 – 16ª

À

Prefeitura Municipal de Campina Grande – PB

A/C: Eng. (a).Fernanda Ribeiro Barboza – Secretária Municipal de Obras

Ref.: 06ª Medição da obra de recapeamento asfáltico nos bairros Centro, Bela Vista, Alto Branco, Conceição, Estação Velha, Palmeira, Prata, Bodocongó, Santa Cruz, Dinamérica, Catolé, Centenário, Cruzeiro, Jardim Tavares, Jeremias, José Pinheiro, Mirante, Novo Bodocongó, Santo Antônio, São José, Serrotão, Malvinas, Monte Santo e Universitário, no município de Campina Grande, estado da Paraíba.

Assunto: Solicitação de Análise Técnica da medição de serviços nº 06

Senhora Secretária,

PMCG
Secretaria de Obras
Recebido em 29 / 12 / 2020
Odete Oliveira
SECRETÁRIA

Encaminhamos, em anexo, o **Boletim da Medição de Serviços nº 06 – Revisado e demais elementos técnicos integrantes**, relativo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 2.08.022/2020, referente ao período de 13 de novembro/2020 a 18 de dezembro/2020, para aprovação da fiscalização da obra e providencias cabíveis no tocante à liberação dos recursos.

Campina Grande, 22 de dezembro de 2020.

SECRETARIA
Recebido em
Secretaria de Obras
PMCG

Atenciosamente,

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

Eng. João Neto de Oliveira
CREA 1606755208 D/PB



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIRROS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTAÇÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCONGÓ, SANTA CRUZ, DINAMÉRICA, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCONGÓ, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTÃO, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA

06ª MEDIÇÃO
CONTRATO 2.08.022/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIROS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTAÇÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCONGÓ, SANTA CRUZ, DINAMÉRICA, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCONGÓ, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTÃO, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA


FÍSICO-FINANCEIRO

		GRUPO DE SERVIÇOS Nº 43 CT 1.055.660.37 Transmissão de Energia ou Transferência de Energia		Nº 43 CT 01/07/20	
Nº do CTE (Elemento Essencial - Elemento)		Nº 43 CT 1.055.660.37		Nº 43 CT 01/07/20	
Data de emissão 28/02/2020		Data de validade da medição de 13/11/2020 a 18/12/2020		Data de emissão 22/12/2020	
Nome do cliente 29/06/2020		Nome do cliente 26/07/2021		Nome do cliente 09/333.099/0001-92	
Valor total (R\$) 18.225.646,43		Valor atual (R\$) 18.225.646,43		Valor atual (R\$) 18.225.646,43	
Descrição do serviço 18.225.646,43		Descrição do serviço 18.225.646,43		Descrição do serviço 18.225.646,43	
Valor atual (R\$) 18.225.646,43		Valor atual (R\$) 18.225.646,43		Valor atual (R\$) 18.225.646,43	

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU EQUIPAMENTO	PREÇO DO EQUIPAMENTO			PREÇO DO SERVIÇO PLANEJADO			PREÇO DO FINANCIAMENTO			
		UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.	ADJUDICADO EM ANTERIOR	MÉDIA DO PERÍODO	ADJUDICADO EM PERÍODO ANTERIOR	MÉDIA DO PERÍODO	ADJUDICADO INCLUINDO O PERÍODO	EMPIRIN	
1.0	RUA ÍNDIOS CARINIS										
2.0	RUA IREMAR VILLARIM										
3.0	RUA FÉLIX ARAÚJO										
4.0	RUA MIGUEL BARRETO										
5.0	RUA TEODÓSIO DE OLIVEIRA LEDO										
6.0	RUA FREI CAIECA										
7.0	RUA MAIOR JOVINO DO Ó										
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
7.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	2.266,20	0,33							
7.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO										
7.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	2.064,76	2,36							
7.2.2	CBUQ										
7.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017 - Capa	m³	103,24	1.147,56							
7.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	103,24	3,87							
7.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.094,02	1,09							
7.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA										
7.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	4,00	115,23							
8.0	RUA VIGOLVINO WANDERLEY										
9.0	RUA ALEXANDRINO CAVALCANTE										
10.0	RUA JOÃO ALVES DE OLIVEIRA										
11.0	RUA CRISTIANO LAURITZKI										
12.0	RUA FERREIRO DE CARVALHO										
13.0	RUA BENTO VIANA										
13.1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
13.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	827,50	0,33							
13.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO										
13.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	761,30	2,36							
13.2.2	CBUQ										
13.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017 - Capa	m³	38,06	1.147,56							
13.2.2	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	38,06	3,87							
13.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	388,21	1,09							
13.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA										
13.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	1,00	115,23							
14.0	RUA CEL JOÃO GONCALVES PORTO										

José Benício da Silva Filho
 Eng.º Civil - CREA-PB Nº 28.859/42
 Coordenador de Planejamento de Obras

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
 Eng.º Civil - CREA-PB Nº 160055208-01/PB

		Nº de CTE (contato e atendimento) 208.02/2020		Nº de CT 1.065.650-37		Grau de Sigilo Em Aberto	
Título 4.08.02/2020		Prazo 29/06/2020		Nº de CT 1.065.650-37		Grau de Sigilo Em Aberto	
CTEF: 18.225.646.43		CTEF: 26/07/2021		Nº de CT 1.065.650-37		Grau de Sigilo Em Aberto	
Valor total licitação (R\$)		CTEF: 26/07/2021		Nº de CT 1.065.650-37		Grau de Sigilo Em Aberto	
Valor atual (R\$)		CTEF: 26/07/2021		Nº de CT 1.065.650-37		Grau de Sigilo Em Aberto	
Valor atual (R\$)		CTEF: 26/07/2021		Nº de CT 1.065.650-37		Grau de Sigilo Em Aberto	

ITEM	EXTENSÃO DOS SERVIÇOS NO EMPREITADO	PERÍODO DE OBRAS			PREÇO TOTAL	ACUMULADO DE PERÍODO ANTERIOR			PERÍODO DE OBRAS RELATIVIZADO			ACUMULADO DE PERÍODO ANTERIOR	ACUMULADO DE PERÍODO ATUALIZADO	ACUMULADO DE PERÍODO ANTERIOR	ACUMULADO DE PERÍODO ATUALIZADO	EMPENHO
		UNID.	QTDDE	FREQ. UNIT.		ACUMULADO DE PERÍODO ANTERIOR	ACUMULADO DE PERÍODO ANTERIOR	ACUMULADO DE PERÍODO ANTERIOR	ACUMULADO DE PERÍODO ANTERIOR	ACUMULADO DE PERÍODO ANTERIOR	ACUMULADO DE PERÍODO ANTERIOR					
15.0	RUA PEDRO AMÉRICO				37.240,04											
15.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				227,30											
15.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acor parhamento e grade	m²	688,80	0,33	227,30	688,80			688,80							
15.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				36.897,51											
15.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	610,03	2,36	1.439,79	610,03			610,03							
15.2.2	CBUQ															
15.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF. 03/2017. - Capa	m³	30,50	1,147,56	35.000,59	25,63			25,63							
15.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminha basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	30,50	3,87	118,04	25,63			25,63							
15.2.4	Transporte com caminha basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	311,10	1,09	339,10	261,43			261,43							
15.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				115,23											
15.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	1,00	115,23	115,23											
16.0	RUA DEP. ANVARO GAUDÊNCIO				207.174,99											
16.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.245,02											
16.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acor parhamento e grade	m²	3.772,80	0,33	1.245,02	3.654,67			3.654,67							
16.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				205.353,82											
16.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	3.335,52	2,36	8.013,43	3.288,10			3.288,10							
16.2.2	CBUQ															
16.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF. 03/2017. - Capa	m³	169,78	1,147,56	194.837,74	145,73			145,73							
16.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminha basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	169,78	3,87	657,05	145,73			145,73							
16.2.4	Transporte com caminha basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.697,80	1,09	1.850,60	1.457,30			1.457,30							
16.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				576,15											
16.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	5,00	115,23	576,15											
17.0	RUA VILA NOVA DA RAINHA				371.895,94											
17.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.014,89											
17.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acor parhamento e grade	m²	6.105,72	0,33	2.014,89	5.867,35			5.867,35							
17.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				369.190,67											
17.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	6.105,72	2,36	14.409,50	5.485,62			5.485,62							
17.2.2	CBUQ															
17.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF. 03/2017. - Capa	m³	305,39	1,147,56	350.338,59	225,37			225,37							

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
 FUNDADOR JOSÉ DA SILVA FILHO
 Eng. Civil - CREA-PB Nº 158.959-2

José Benício da Silva Filho
 Eng. Civil - COB - Coordenador de Planejamento de Obras

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
 Eng. João Neto de Oliveira
 CREA 168655208-DPB


		Grav de S/ção Dia do CT	
Nº do CTE (Contrato de Execução/Financiamento) 2.08.022/2020		Nº do CT 1.055.660-37	
Início da obra - data 23/06/2020		Data do CT 01/07/20	
CTEF - Valor total (R\$) 18.225.616,43		Tomador/da Promotor ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	
CTEF - Valor atual (R\$) 18.225.616,43		Agência Executora ou Ag. Operadora Pagadora CAUSA ECONÔMICA FEDERAL	
Descrição do Objeto PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO		Objeto do CTE (resumido) RECAPAMENTO ASFÁLTICO NOS BARRIOS CENTRO, REIA VISTA, ALTO BRAUNCO, CONCEIÇÃO, ESTACÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, RODRIGOS, SANTA CRUZ, DORMIÊNCIA, CATEDRÉ, CENHÉRIO, CRUZEIRO, JARDIM TANARES, JEREMIAS, JOSÉ FERREIRO, MIRANTE, NOVO RODRIGOS, SANTO ANTONIO, SÃO JOSÉ, SERROÃO, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA	
Local da obra (Bairro/Quilombo/UF) PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO		Fonte de Recursos outra (Especificar)	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PRESTIÇO DO EMPREITADO			PRESTIÇO DESEJADO (REAJUSTADO)			PRESTIÇO FINANCEIRO (R\$)			EMPENHO
		UNID.	QTDDE	PREÇO UNIT.	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MÉDIO DO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MÉDIO DO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO		
17.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	305,29	3,87	1.181,47	225,37	872,18	872,18	872,18	26,18	
17.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	2.591,84	1,09	3.261,11	2.208,63	2.407,41	2.407,41	2.407,41	26,18	
17.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	6,00	115,23	691,38					100,00	
17.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita				45.042,32						
18.0	RUA PADRE BIAPPIA				191.836,38						
19.0	RUA EUAS ASFORA				924,41						
19.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.801,25						
19.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	924,41	0,33	2.706,63	2.706,63	184.877,65	893,19	893,19	3,38	
19.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				190.451,05						
19.2.1	Pinura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	5.104,50	2,36	12.046,62	4.931,32	11.637,92	11.637,92	11.637,92	3,39	
19.2.2	CBUQ										
19.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	76,57	1.207,08	92.426,12	73,97	89.287,71	89.287,71	89.287,71	3,40	
19.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017. - Reperflamento	m³	76,57	1.093,55	83.733,12	73,97	80.889,89	80.889,89	80.889,89	3,40	
19.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	153,14	3,87	592,65	147,94	572,53	572,53	572,53	3,39	
19.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.516,09	1,09	1.657,54	1.464,60	1.596,41	1.596,41	1.596,41	3,40	
19.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	4,00	115,23	460,92					100,00	
19.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita				460,92						
20.0	RUA BARÃO DO ABMÍ				224.608,87						
21.0	RUA JOSÉ BONIFÁCIO				72.355,08						
21.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				441,56						
21.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	1.338,05	0,33	441,56	1.338,05	441,56	441,56	441,56		
21.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				71.683,06						
21.2.1	Pinura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	1.185,13	2,36	2.796,91	1.185,13	67.475,02	67.475,02	67.475,02		
21.2.2	CBUQ										
21.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	59,26	1.147,56	68.004,41	55,64	63.850,24	63.850,24	63.850,24	6,11	
21.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	59,26	3,87	229,34	55,64	215,33	215,33	215,33	6,11	
21.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	598,53	1,09	652,40	561,96	612,54	612,54	612,54	6,11	
21.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	2,00	115,23	230,46					100,00	
21.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita				230,46						


José Bânicio da Silva Filho
 FISCAL DO COB - Coordenador
 de Planejamento de Obras

Consórcio Rocha Cavalcante Ltda.
 Eng.º Jay Nelson de Oliveira
 CREA: 160905208 DFB

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
 Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng.º Civ. - CREA-PE Nº 138.28.452-2

		Grav de Sglo Data de CT	
Nº da CTE (Contrato de Execução/Execução)		Nº da CT	
2.08.022/2020		1.055.600-37	
Início da obra - data		Data de referência da medição	
29/06/2020		de 13/11/2020 a 18/12/2020	
Fim da obra - data		Data de CT	
26/07/2021		01/07/20	
CTE - de assinatura		Tomador/da Promotor ou Tomador	
CTE - de assinatura		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	
Valor total (R\$)		Agente fiscalizador ou Ag. Operador Pagador	
18.225.646,43		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Valor atual (R\$)		Fonte de Recursos	
18.225.646,43		obra (transferir)	

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DO EMPANAMENTO	PÉTIMO DO EMPANAMENTO			PERÍODO TOTAL	DESEMPENHO REALIZADO (R\$)			DESEMPENHO FINANCEIRO (R\$)						
		UNID.	QTDDE	PERÍODO UNIT.		ACUMULADO DE PERÍODO ANTERIOR	MÉDIO DO PERÍODO	ACUMULADO DO PERÍODO	ACUMULADO DO PERÍODO ANTERIOR	MÉDIO DO PERÍODO	ACUMULADO DO PERÍODO				
22.0	RUA JOÃO TAVARES				241.187,71										
22.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.412,00										
22.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	4.278,78	0,33	1.412,00	3.323,04	3.323,04	1.096,60	1.096,60	1.096,60	1.096,60	1.096,60	1.096,60	1.096,60	22,34
22.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				238.853,87										
22.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	3.947,34	2,35	9.315,72	2.990,92	2.990,92	7.058,57	7.058,57	7.058,57	7.058,57	7.058,57	7.058,57	24,23	
22.2.2	CBUQ														
22.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusiva transporte. AF 03/2017. - Capa	m³	197,37	1,147,56	226.493,92	119,64	119,64	137.294,08	137.294,08	137.294,08	137.294,08	137.294,08	137.294,08	39,38	
22.2.2.2	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminho basculante de 10 m³, descarga em vibro-sabadora	m³	197,37	3,87	763,82	119,64	119,64	463,01	463,01	463,01	463,01	463,01	463,01	39,38	
22.2.4	Transporte com caminho basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	2.092,12	1,09	2.280,41	1.268,18	1.268,18	1.382,32	1.382,32	1.382,32	1.382,32	1.382,32	1.382,32	39,38	
22.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				921,84										
22.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	8,00	115,23	921,84									100,00	
23.0	RUA CORONEL JOSÉ ANDRÉ				150.827,84										
24.0	RUA MANOEL PEREIRA DE ARAÚJO				175.604,31										
24.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.043,65										
24.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	3.162,60	0,33	1.043,65	980,50	980,50	323,57	323,57	323,57	323,57	323,57	323,57	69,00	
24.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				174.284,50										
24.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	2.881,48	2,35	6.800,29	682,76	682,76	2.083,31	2.083,31	2.083,31	2.083,31	2.083,31	2.083,31	69,36	
24.2.2	CBUQ														
24.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusiva transporte. AF 03/2017. - Capa	m³	144,08	1,147,56	165.340,44	44,14	44,14	50.653,30	50.653,30	50.653,30	50.653,30	50.653,30	50.653,30	69,36	
24.2.2.2	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminho basculante de 10 m³, descarga em vibro-sabadora	m³	144,08	3,87	557,59	44,14	44,14	170,82	170,82	170,82	170,82	170,82	170,82	69,36	
24.2.4	Transporte com caminho basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.455,21	1,09	1.556,18	445,81	445,81	485,93	485,93	485,93	485,93	485,93	485,93	69,36	
24.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				576,15										
24.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	5,00	115,23	576,15									100,00	
25.0	RUA CAPITÃO JOÃO DE SÁ				256.656,37										
25.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.511,24										
25.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	4.579,50	0,33	1.511,24	4.238,27	4.238,27	1.398,63	1.398,63	1.398,63	1.398,63	1.398,63	1.398,63	7,45	
25.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				254.789,44										
25.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	4.213,14	2,35	9.043,01	3.837,45	3.837,45	9.174,41	9.174,41	9.174,41	9.174,41	9.174,41	9.174,41	7,73	
25.2.2	CBUQ														


José Benício da Silva Filho
 Coordenador
 do Planejamento de Obras


PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
 Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng. Civil - CREA-PB Nº 1428/S242

Consórcio Rocha Cavalcante Ltda.
 Eng. Roberto Augusto de Albuquerque
 CREA 148305/208 DPE

CAIXA		EM - empresa		EM - Data emissão		EM - Período de referência da medição		Nº da CT		Data de CT	
Nº do CTEP (Contrato, Emissão/Reconhecimento)		6		22/12/2020		de 13/11/2020 a 19/12/2020		1.055.600-37		01/07/20	
Data de emissão		26/07/2021		Empresa Contratada		CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA		Tomador/Pre Promotor ou Tomador		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	
Valor total local (R\$)		18.225.646,43		Objeto do CTEP (resumido)		RECAPAMENTO ASFÁLTICO NOS BARRIOS CERTEIRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTAÇÃO VELHA, PALMEIRA, FRATA, BODOCONGÓ, SANTA CRUZ, DINAMÉICA, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM JAVIERES, JEREMIAS, JOSÉ PIPIREIRO, MIRANTE, NOVO BODOCONGÓ, SANTO ANTONIO, SÃO JOSÉ, SERRÃO, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA		Agente Financeiro ou Ag. Operador Pagador		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Vistoria (R\$)		18.225.646,43		Local de obra (Bairro/Município/UF)		PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO		Fonte de Recursos		obra (descrever)	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	RECEITO DO ORÇAMENTO			DESCRIÇÃO FÍSICA (QUANTIDADE)			DESCRIÇÃO FINANCEIRA (R\$)			DESCRIÇÃO
		UNID.	QTD.	PREÇ. UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEMÓRIA DE CÁLCULO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	
252.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	210,66	1.147,56	241.744,99	168,05	168,05	192.847,46	192.847,46	20,23	192.847,46
252.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	210,66	3,87	815,25	168,05	168,05	650,35	650,35	20,23	650,35
252.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	2.106,60	1,09	2.296,19	1.680,50	1.680,50	1.831,75	1.831,75	20,23	1.831,75
253	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	3,00	115,23	345,69					100,00	
26.0	RUA CRISTÓVÃO COLOMBO				96.110,74			91.626,41	91.626,41		91.626,41
26.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				558,05			532,95	532,95		532,95
26.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	1.691,10	0,33	558,05	1.614,59	1.614,59	532,95	532,95	4,55	532,95
26.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				95.437,45			91.093,46	91.093,46		91.093,46
26.2.1	Finura de ligação com emissão RR-2C. Inclusive aquisição e transporte	m²	1.581,74	2,35	3.732,91	1.509,79	1.509,79	3.563,10	3.563,10	4,55	3.563,10
26.2.2	CBUQ										
26.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	79,09	1.147,56	90.760,52	75,49	75,49	86.629,30	86.629,30	4,55	86.629,30
26.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	79,09	3,87	306,08	75,49	75,49	292,15	292,15	4,55	292,15
26.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	585,27	1,09	637,94	558,63	558,63	608,91	608,91	4,55	608,91
26.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				115,23						
26.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita	unidade	1,00	115,23	115,23					100,00	
27.0	RUA DR. CARLOS AGRA				205.820,16			170.415,95	170.415,95		170.415,95
27.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.201,17			1.010,68	1.010,68		1.010,68
27.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	3.639,90	0,33	1.201,17	3.052,66	3.052,66	1.010,68	1.010,68	15,85	1.010,68
27.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				203.697,15			169.405,27	169.405,27		169.405,27
27.2.1	Finura de ligação com emissão RR-2C. Inclusive aquisição e transporte	m²	3.375,18	2,35	7.955,42	2.806,83	2.806,83	6.624,12	6.624,12	16,81	6.624,12
27.2.2	CBUQ										
27.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	168,76	1.147,56	193.662,23	140,35	140,35	161.060,05	161.060,05	16,83	161.060,05
27.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	168,76	3,87	653,10	140,35	140,35	543,15	543,15	16,84	543,15
27.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.299,45	1,09	1.416,40	1.080,69	1.080,69	1.177,95	1.177,95	16,83	1.177,95
27.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				921,84						
27.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita	unidade	8,00	115,23	921,84					100,00	
28.0	RUA PEDRO ALVARES CARVAL				67.138,89			62.048,03	62.048,03		62.048,03



JOSE BENICIO DA SILVA FILHO

 Fiscal do COB - Coordenador

 do Financiamento de Obras



Conselheira Rocha Cavalcante Lobo

 Eng. João Neto de Oliveira

 CREA 16.80055/08 DDPB

CAIXA		W da CTR (Conto Especial/Recurso)		EM - número		EM - Data emissão		EM - Período de referência da medição		Nº da CT		Grau de Selo	
2.08.02/2020		6		23/12/2020		06/13/2020 a 19/12/2020		1.055.600-37		01/07/20		Data de CT	
29/06/2020		26/07/2021		Empresa Construtora		CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA		Tomador/Prestador ou Tomador		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE		Agente Financeiro ou Ag. Operador Passivo	
18.225.64643		CTF - de assinatura		Objeto da CTR (resumido)		RECAPAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIRROS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTAÇÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCÓNGO, SANTA CRUZ, DINAMÉRICA, CATONÉ, CENTENÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCÓNGO, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, FERROVIA, MALVIAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA		Fonte de Recursos		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		conta (diágnostic)	
18.225.64643		CTF - de último déd.		Local de obra (Município/UF)		PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO							

ITEM	DESCR. DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	RECURSO PAVIMENTO				RECURSO PAVIMENTO (R\$)				CANTO N			
		UNID.	QTD.	PREÇ.UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO NO PERÍODO	ACUMULADO ANTE PERÍODO ANTERIOR	ACUMULADO NO PERÍODO				
28.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				396,00			396,00				396,00	
28.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e gride	m²	1.200,00	0,33	396,00		1.200,00	396,00			396,00		
28.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				66.627,66			61.652,03				61.652,03	
28.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	1.104,00	2,36	2.605,44		1.104,00	2.605,44			2.605,44		
28.2.2	CBUQ												
28.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	55,20	1.147,56	63.345,31		50,91	58.422,28			58.422,28		7,77
28.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-escabadora	m³	55,20	3,87	213,62		50,91	197,02			197,02		7,77
28.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	425,04	1,09	463,29		392,01	427,29			427,29		7,77
28.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				115,23								
28.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	1,00	115,23	115,23								100,00
29.0	RUA ULISSES GOMES				58.275,63			51.680,64			51.680,64		
29.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				351,38			351,38			351,38		
29.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e gride	m²	1.064,80	0,33	351,38		1.064,80	351,38			351,38		
29.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				57.809,02			51.329,26			51.329,26		
29.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	938,32	2,35	2.261,64		938,32	2.261,64			2.261,64		
29.2.2	CBUQ												
29.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	47,92	1.147,56	54.991,08		42,33	48.576,21			48.576,21		11,67
29.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-escabadora	m³	47,92	3,87	185,45		42,33	163,82			163,82		11,65
29.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	340,23	1,09	370,85		300,54	327,59			327,59		11,67
29.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				115,23								
29.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	1,00	115,23	115,23								100,00
30.0	RUA DESEMBARGADOR TRINDADE				140.663,02			121.901,73			121.901,73		
30.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				671,72			589,86			589,86		
30.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e gride	m²	2.034,00	0,33	671,72		1.787,45	589,86			589,86		12,12
30.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				139.415,65			121.311,87			121.311,87		
30.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	3.742,56	2,35	8.837,44		3.256,52	7.635,39			7.635,39		12,99
30.2.2	CBUQ												
30.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	56,14	1.207,09	67.765,47		48,85	58.965,66			58.965,66		12,99
30.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017. - Reparfamento	m³	56,14	1.093,55	61.391,50		48,85	53.419,92			53.419,92		12,99

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
 Eng. Anjo Vitor de Oliveira
 CREA 106665208-DPB

José Benício da Silva Filho
 FISCAL DO COB - Coordenador
 do Planejamento de Obras

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
 Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng. CIV. - CREA/PB Nº 19.265.524-2




№ do CTR (Contrato de Execução/Processamento)	2.08.02/2020	№ do CTR (Contrato de Execução/Processamento)	1.085.660-37	GRUPO de SÍMBOLO	01/07/20
Índice	da obra - obra	Previdência Termino da obra	26/07/2021	№ do CTR	01/07/20
CTEF	Valor total (R\$)	CTEF de assinatura		Tomador/Previdenciador ou Tomador	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
	18.225.646,43	CTEF de emissão		Agente Financeiro ou Ag. Operador Financeiro	
CTEF	Valor atual (R\$)	CTEF de último A.F.R.			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	18.225.646,43				

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO EMPRÉTIMO	RESULTADO DA OBRAS			DESEMPENHO QUANTITATIVO			DESEMPENHO FINANCEIRO (R\$)			COTAÇÃO Nº
		UNID.	QTD	PREÇO UNIT.	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	INSCRIÇÃO DO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MÉDIA DO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	ACUMULADO ATÉ PERÍODO	
302.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	112,28	3,87		97,70	378,10	378,10	378,10	12,98	
302.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	909,47	1,09		791,38	862,60	862,60	862,60	12,98	
30.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	5,00	115,23						100,00	
30.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita										
31.0	RUA ERITÁCIO PESSOA										
32.0	RUA AFONSO CAMPOS										
32.1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
32.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e gride	m²	4.045,50	0,33		4.002,26	1.320,75	1.320,75	1.320,75	1,07	
32.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO										
32.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	3.685,90	2,36		3.646,20	198.747,82	198.747,82	198.747,82	1,08	
32.2.2	CBUQ										
32.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	184,29	1,147,56		164,08	168.291,64	168.291,64	168.291,64	10,97	
32.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	184,29	3,87		164,08	634,99	634,99	634,99	10,97	
32.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.253,17	1,09		1.115,74	1.216,16	1.216,16	1.216,16	10,97	
32.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA										
32.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita	unidade	11,00	115,23						100,00	
33.0	RUA BENEDITO HOTTA										
33.1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
33.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e gride	m²	2.729,92	0,33		2.434,59	803,41	803,41	803,41	10,82	
33.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO										
33.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	5.057,65	2,36		4.869,18	181.042,48	181.042,48	181.042,48	3,73	
33.2.2	CBUQ										
33.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	75,87	1.207,08		73,04	88.165,12	88.165,12	88.165,12	3,73	
33.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperfimento	m³	75,87	1.093,55		72,23	78.987,12	78.987,12	78.987,12	4,80	
33.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	151,74	3,87		145,27	562,19	562,19	562,19	4,26	
33.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.760,18	1,09		1.685,13	1.836,79	1.836,79	1.836,79	4,26	
33.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA										
33.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita	unidade	2,00	115,23		2,00	230,46	230,46	230,46		


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 FONE: (31) 3361-1000
 Eng.º Cív. - CREA-PB Nº 198.350/42

José Benício da Silva Filho
 Eng.º Civil - CREA-PB Nº 198.350/42
 de Planejamento de Obras

Consultoria Resenha Consultante Ltda
 Eng.º João Nildo Oliveira
 CREA - PB Nº 198.350/42


		Nº do CTEP (Contrato de prestação de serviços)		Grau de Selo	
2.08.022/2020		6		Nº do CTEP	
29/06/2020		22/12/2020		1.055.660-37	
26/07/2021		13/11/2020 a 18/12/2020		Data da CT	
CTEP - de assinatura		CTEP - de emissão		01/07/20	
18.225.646.43		PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO		Nome do Promotor ou Tomador	
CTEP - de alteração		Local da obra (Bairro/Município/UF)		PREFEREÇA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	
CTEP - de novo ADL		Descrição da obra		Agência Executora ou Ag. Operadora Pagadora	
CTEP - de alteração		Descrição dos serviços do empreendimento		CAUSA ECONÔMICA FEDERAL	
CTEP - de alteração		Descrição dos serviços do empreendimento		Fonte de Recursos	
CTEP - de alteração		Descrição dos serviços do empreendimento		outra (descrever)	

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL			PREÇO UNITÁRIO QUANTITATIVO			PREÇO TOTAL QUANTITATIVO			EMPENHO (R\$)
		UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	MÉDIO NO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MÉDIO NO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MÉDIO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO		
34.0	RUA PEDRO II				349.189,55									
35.0	RUA PROFESSOR MAURO LUIA				276.279,99									
35.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.418,18									
35.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	4.297,50	0,33	1.418,18			3.394,57				1.120,21	1.120,21	21,01
35.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				274.285,66									
35.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	7.311,70	2,36	17.255,61			6.789,14				16.092,37	16.092,37	7,15
35.2.2	CBUQ													
35.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	118,61	1.207,08	143.171,76			101,84				122.929,03	122.929,03	14,14
35.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperflamento	m³	100,74	1.093,55	110.164,23			100,74				110.164,23	110.164,23	7,14
35.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em viário-acabadora	m³	219,35	3,87	848,88			200,21				774,81	774,81	8,73
35.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	2.610,26	1,09	2.845,18			2.423,60				2.641,94	2.641,94	7,14
35.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				576,15									
35.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	5,00	115,23	576,15			5,00				576,15	576,15	
36.0	RUA CAZUZA BARRETO				44.922,03									
37.0	RUA BENJAMIM CONSTANT				31.901,56									
37.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				151,01									
37.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	457,60	0,33	151,01			457,60				151,01	151,01	
37.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				31.635,32									
37.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	848,64	2,36	2.002,79			848,64				16.137,69	16.137,69	
37.2.2	CBUQ													
37.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	12,73	1.207,08	15.365,13									100,00
37.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperflamento	m³	12,73	1.093,55	13.920,89			12,73				13.920,89	13.920,89	
37.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em viário-acabadora	m³	25,46	3,87	98,53			15,77				61,03	61,03	38,05
37.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	226,59	1,09	246,98			140,35				152,98	152,98	38,05
37.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				115,23									
37.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	1,00	115,23	115,23									100,00
38.0	RUA PRUDENTE DE MORAIS				360.222,03									




JOSE BENICIO DA SILVA FILHO

 Eng.º Civil - CREA-PE nº 199.293.645-2



FRANCISCO DE ASSIS C. XAVIER

 Eng.º Civil - CREA-PE nº 199.293.645-2





Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

 Eng.º João Roberto de Oliveira


CAIXA		Nº da CTR (Contrato Executivo/Contratado)		Nº do CT		Grau de Sigilo	
2.08.022/2020		29/06/2020		1.055.650-37		01/07/20	
Início da obra - data		Previsão Término da obra		Nº do CT		Data do CT	
26/07/2021		26/07/2021		1.055.650-37		01/07/20	
Vínculo social (RFB)		CITEF de Matrícula		Tombado/Insc. Processo de Tomada		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMERINA GRANDE	
18.225.656/43		CITEF de Matrícula		Agentes Financeiros ou Ag. Operador Financeiro		Agentes Financeiros ou Ag. Operador Financeiro	
Vínculo social (RFB)		CITEF de Matrícula Adm.		Local de obra (Bairro/Av. e nº do lote)		CASA ECONÔMICA FEDERAL	
18.225.656/43		CITEF de Matrícula Adm.		PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO		Fonte de Recursos	
						outra (Estimativa)	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO EMPANAMENTO	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL	EXECUÇÃO FÍSICA (PAVIMENTAÇÃO)			EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$)			SÉRIE Nº	
		UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.		ACUMULADO até período anterior	ACUMULADO até período anterior	ACUMULADO até período anterior	MÉDIA NO PERÍODO	MÉDIA NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO		
39.0	RUA DESEMBARGADOR AZEVEDO				482.133,33								
39.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.429,30								
39.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acorpanhamento e grade	m²	7.361,50	0,33	2.479,30	4.641,68		4.641,68			348.705,93	691,38	349.397,31
39.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				478.551,73						1.531,75		1.531,75
39.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	11.570,38	2,36	27.306,10	9.283,36		9.283,36			1.531,75		1.531,75
39.2.2	CBUQ				113.310,07						347.174,18		347.174,18
39.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclui-se transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	98,74	1.147,56							21.908,73		21.908,73
39.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclui-se transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	143,93	1.207,08									
39.2.2.3	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclui-se transporte. AF_03/2017. - Repetimento	m³	143,93	1.093,55									
39.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	386,61	3,87	1.496,18								
39.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	4.871,29	1,09	5.309,71	3.509,10		3.509,10			3.824,92		3.824,92
39.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				1.152,30								
39.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	10,00	115,23									
40.0	RUA DUQUE DE CAXIAS				148.557,74								
40.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				690,69								
40.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acorpanhamento e grade	m²	2.093,00	0,33	690,69	1.764,39		1.764,39			53.562,09	77.536,77	131.098,86
40.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				147.636,59						582,25	109,44	690,69
40.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	3.561,52	2,36	9.349,19	1.764,39		1.764,39			52.979,94	77.187,87	130.167,71
40.2.2	CBUQ				785.789,19						4.163,96	4.694,63	8.858,65
40.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclui-se transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	59,43	1.207,08									
40.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclui-se transporte. AF_03/2017. - Repetimento	m³	59,43	1.093,55									
40.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	118,84	3,87	459,91								
40.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.010,14	1,09	1.101,05	374,94		374,94			43.236,49		43.236,49
40.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				230,46								
40.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	2,00	115,23									
41.0	RUA ANTONIO NAVASRO				785.789,19								
41.0	RUA SEBASTIÃO MARTINS DE OLIVEIRA				83.944,02								



Jose Benicio da Silva Filho
 Filho - C. S. SOB - Coordenador
 do Planejamento de Obras



Eng. José Nivaldo de Oliveira
 CREA - PB 100.205.694/2

CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA.
 Eng. José Nivaldo de Oliveira
 CREA - PB 100.205.694/2

		Nº do CITEF (Código de Identificação) 2.08.022/2020 Data de emissão 26/07/2021		Nº do CITEF 1.055.660-37 Data de CT 01/07/20	
Início 29/06/2020 Valor total inicial (R\$) 18.225.646,43		Fim 22/12/2020 Valor atual (R\$) 18.225.646,43		Nº do CITEF 1.055.660-37 Data de CT 01/07/20	
CITEF - Valor total inicial (R\$) 18.225.646,43		CITEF - Valor atual (R\$) 18.225.646,43		Nº do CITEF 1.055.660-37 Data de CT 01/07/20	
CITEF - Valor atual (R\$) 18.225.646,43		CITEF - Valor atual (R\$) 18.225.646,43		Nº do CITEF 1.055.660-37 Data de CT 01/07/20	

ITEM	DESCR. VALORES DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PREÇO NO EMPILHAMENTO			PREÇO NO FICCO (PLANILHA EM VIGOR)			PREÇO NO FICCO (PROJEÇÃO F3)			CENÁRIO	
		UNID.	QTDDE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MÉDIO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MÉDIO NO PERÍODO		ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
43.0	RUA FLORÍDEDES COUTINHO				739.687,48							
44.0	RUA PROFESSOR LUIZ GILLIARD				157.918,18							
45.0	RUA DAS TRÊS IRMÃS				211.439,22							
45.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.022,21							
45.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	3.097,60	0,33	1.022,21	3.097,60	3.097,60	102.050,43	1.022,21	1.022,21	102.050,43	
45.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				209.610,40							
45.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-ZC, inclusive aquisição e transporte	m²	5.632,03	2,36	13.291,71	3.195,83	3.195,83	101.038,22	7.542,16	7.542,16	101.038,22	43,26
45.2.2	CBUQ											
45.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	84,48	1.207,08	101.974,12							100,00
45.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperfilamento	m³	84,48	1.093,55	92.383,10	84,48	84,48	92.383,10	92.383,10	92.383,10	92.383,10	43,26
45.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	168,96	3,87	653,88	95,87	95,87	371,02	371,02	371,02	371,02	43,26
45.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.199,62	1,09	1.307,59	680,68	680,68	741,94	741,94	741,94	741,94	43,26
45.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				806,61							
45.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	7,00	115,23	806,61							100,00
46.0	RUA DR. JOÃO ARLINDO CORREIA				123.899,22							
46.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				578,92							
46.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	1.754,31	0,33	578,92	1.754,31	1.754,31	57.997,53	578,92	578,92	57.997,53	
46.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				122.964,61							
46.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-ZC, inclusive aquisição e transporte	m²	3.294,62	2,36	7.775,30	1.663,72	1.663,72	57.418,61	3.976,38	3.976,38	57.418,61	49,50
46.2.2	CBUQ											
46.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	49,42	1.207,08	59.633,89							100,00
46.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperfilamento	m³	49,42	1.093,55	54.043,24	48,25	48,25	52.763,79	52.763,79	52.763,79	52.763,79	2,37
46.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	98,84	3,87	382,51	48,25	48,25	186,73	186,73	186,73	186,73	51,18
46.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.018,05	1,09	1.109,67	458,98	458,98	541,71	541,71	541,71	541,71	51,18
46.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				345,69							
46.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	3,00	115,23	345,69							100,00
47.0	RUA JOÃO LÉUS				385.044,84							
47.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.833,25							
								375.053,53		691,38	375.744,91	
								1.653,34		1.653,34	1.653,34	


José Benício da Silva Filho
 FICCO 008 - Coordenador
 de Planejamento de Obras


Eng. João Venício Oliveira
 CREA 10662008 DFB

CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA
 Eng. João Venício Oliveira
 CREA 10662008 DFB

CAIXA W do CTEF (Contrato de Execução/Contratante) 2.08.022/2020	EM - número 6	EM - Data emissão 22/11/2020	EM - Período de referência da medição de 13/11/2020 a 18/12/2020	Nº do CT 1.065.600-37	Grau de Siglo Data do CT 01/07/20
	Início da obra - data 25/06/2020	Previsão término da obra 26/07/2021	Objeto do CTEF (resumido) CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA	Tomador/PA Promotor ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	
CTEF - Valor total (R\$) 18.225.646,43	CTEF - de assinatura	Local da obra (de acordo com o projeto)	Agente Habilitado ou AE Operador Repasse CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
CTEF - Valor atual (R\$) 18.225.646,43	CTEF - Ex. último Adm.	Fonte de Recursos obra (descrever)			

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO EMPREITEIRO	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL	DEBÍTCIO FISCAL PRELIMINAR (R\$)			DEBÍTCIO FISCAL REALIZADO (R\$)			QUANTIDADE
		UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.		ACUMULADO REF. ANTERIOR	MEIO DO PERÍODO	ACUMULADO DO PERÍODO	MEIO DO PERÍODO	ACUMULADO DO PERÍODO		
47.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acorpanhamento e gride	m²	5.525,00	0,33	1.823,25	5.010,13	5.010,13	1.653,34	1.653,34	9,32	1.653,34	
47.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				382.530,21		373.400,19		373.400,19		373.400,19	
47.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	10.264,40	2,36	24.223,98	10.019,69	23.646,47	23.646,47	23.646,47	2,38	23.646,47	
47.2.2	CBUQ											
47.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017 - Reperfilamento	m³	153,97	1,207,08	185.854,11	150,29	181.412,05	181.412,05	181.412,05	2,39	181.412,05	
47.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017 - Reperfilamento	m³	153,97	1,093,55	168.379,89	150,30	164.360,57	164.360,57	164.360,57	2,38	164.360,57	
47.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vótreo-acebadora	m³	307,93	3,87	1.191,69	300,59	1.163,28	1.163,28	1.163,28	2,38	1.163,28	
47.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	2,648,20	1,09	2.886,54	2.585,16	2.585,16	2.817,82	2.817,82	2,38	2.817,82	
47.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				691,38	6,00	6,00	691,38	691,38		691,38	
47.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	6,00	115,23	691,38	6,00	6,00	691,38	691,38		691,38	
48.0	RUA LUIZ SODRÉ FILHO				199.803,52		194.792,93		194.792,93		194.792,93	
48.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				963,47		873,05		873,05		873,05	
48.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acorpanhamento e gride	m²	2.919,60	0,33	963,47	2.645,61	873,05	873,05	873,05	9,38	873,05	
48.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				198.033,44		193.919,88		193.919,88		193.919,88	
48.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	5.320,16	2,36	12.555,55	5.288,31	12.460,41	12.460,41	12.460,41	0,60	12.460,41	
48.2.2	CBUQ											
48.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017 - Reperfilamento	m³	79,80	1,207,08	96.324,98	79,28	95.697,30	95.697,30	95.697,30	0,65	95.697,30	
48.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017 - Reperfilamento	m³	79,80	1,093,55	87.265,29	76,72	83.897,16	83.897,16	83.897,16	3,66	83.897,16	
48.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vótreo-acebadora	m³	159,60	3,87	617,65	156,00	603,72	603,72	603,72	2,26	603,72	
48.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.165,08	1,09	1.269,94	1.138,80	1.241,29	1.241,29	1.241,29	2,26	1.241,29	
48.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				806,61		806,61		806,61		806,61	
48.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	7,00	115,23	806,61	7,00	7,00	806,61	806,61		806,61	
49.0	RUA LADISLAU RODRIGUES DE SOUZA				137.669,10		61.115,72		61.115,72		61.115,72	
49.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				656,70		560,52		560,52		560,52	
49.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acorpanhamento e gride	m²	1.990,00	0,33	656,70	1.698,54	560,52	560,52	560,52	14,65	560,52	
49.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				136.781,94		60.555,20		60.555,20		60.555,20	
49.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	3.661,60	2,36	8.641,38	1.698,54	4.008,55	4.008,55	4.008,55	53,61	4.008,55	
49.2.2	CBUQ											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 Francisco de Jesus Cavalcante
 Eng.º Civil - CREA/RN Nº 150.280594-2

José Belício da Silva Filho
 Filho - Coordenador
 de Planejamento da Obra

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
 Rua João Vitor da Oliveira
 CEP: 50050-000 - UFPE


CAIXA		Grav de 5 g/lit	
№ do CTR (Contrato Executivo/Execução)	2.08.022/2020	№ do CT	1.055.600-37
lido da obra - data	23/06/2020	Termino da obra	01/07/20
Valor total (R\$)	18.225.646,43	Tendência/Promotor ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Agente Fiscal ou Ag. Operador Pagador	
CTEF -	18.225.646,43	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
CTEF -	18.225.646,43	Fonte de Recursos outra (descrever)	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO EMPENDIMENTO	RESULTADO DO CÁLCULO			PREÇO TOTAL	DESCRIÇÃO DO PREÇO (VALORATIVO)			DESCRIÇÃO FINANCEIRO (R\$)			
		UNID.	QTD.	PREÇO UN.		ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MÉDIO NO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MÉDIO NO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MÉDIO NO PERÍODO	
492.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exlusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	54,92	1.207,08	66.292,83							100,00
492.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exlusive transporte. AF_03/2017. - Reperflamento	m³	54,92	1.093,55	60.057,77	50,95			55.716,37			7,23
492.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	109,84	3,87	425,08	50,95			197,18			53,61
492.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.252,18	1,09	1.364,88	500,83			633,10			53,61
493	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	2,00	115,23	230,46							100,00
493.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	2,00	115,23	230,46							100,00
50.0	RUA FRANCISCO LOPES				112.352,05							
50.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				526,00							53.895,08
50.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acor panhamento e gréde	m²	1.600,00	0,33	528,00	1.498,03			494,35			494,35
50.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				111.476,36							53.400,73
50.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	2.984,40	2,36	7.043,18	1.498,03			3.535,35			3.535,35
50.2.2	CBUQ											49,80
50.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exlusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	44,76	1.207,08	54.028,90							100,00
50.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exlusive transporte. AF_03/2017. - Reperflamento	m³	44,76	1.093,55	48.917,30	44,93			49.133,20			(0,38)
50.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	89,53	3,87	345,48	44,93			173,88			49,82
50.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.020,64	1,09	1.112,50	512,20			558,30			49,82
50.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	3,00	115,23	345,69							100,00
50.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	3,00	115,23	345,69							100,00
51.0	RUA DR. FLORIANO MENDES FREIRE				330.073,98							
51.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.617,26							158.225,02
51.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acor panhamento e gréde	m²	4.900,80	0,33	1.617,26	4.900,80			1.617,26			1.617,26
51.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				327.704,42							158.607,76
51.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	8.821,44	2,36	20.818,60	4.513,38			10.651,58			10.651,58
51.2.2	CBUQ											48,81
51.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exlusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	132,32	1.207,08	159.720,83							100,00
51.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exlusive transporte. AF_03/2017. - Reperflamento	m³	132,32	1.093,55	144.698,54	132,32			141.698,54			144.698,54

PTEF. MUNIC. DE C. GRANDE
 FRANCISCO DE JESUS C. XAVIER
 Eng.º Civ. - CREA-PB nº 153.288-5/04-2

José Benício da Silva Filho
 FIA/GRU/COB - Coordenador
 de Planejamento de Obras

Consórcio Rocha Cavalcante Ltda.
 Eng. João Nivaldo Oliveira
 CREA 160/055208-0/DF

		Nº da CTRF (Contrato de Prestação de Serviços)		Nº do CT		Grau de Sigilo	
2.08.022/2020		29/06/2020		1.055.660-37		01/07/20	
44.484.474		26/07/2021		1.055.660-37		01/07/20	
Valor total (R\$)		CTEF - de abertura		09.323.098/0001-92		01/07/20	
18.225.646,43		CTEF - de abertura		09.323.098/0001-92		01/07/20	
Valor atual (R\$)		CTEF - de último mês		CAUSA ECONÔMICA FEDERAL		01/07/20	
18.225.646,43		CTEF - de último mês		CAUSA ECONÔMICA FEDERAL		01/07/20	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL			PREÇO UNITÁRIO (PREVISTO)			PREÇO TOTAL (PREVISTO)			DESCRIÇÃO DO PERÍODO	ACUMULADO INCLUSIVE DO PERÍODO	DESCRIÇÃO DO PERÍODO	ACUMULADO INCLUSIVE DO PERÍODO	DESCRIÇÃO DO PERÍODO	ACUMULADO INCLUSIVE DO PERÍODO
		UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MÉDIO DO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MÉDIO DO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MÉDIO DO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MÉDIO DO PERÍODO						
51.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com camião basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	264,64	3,87	1.024,16	134,94	1.024,16	134,94	522,22	522,22	522,22	522,22	49,01	522,22	522,22	49,01	522,22	522,22	
51.2.4	Transporte com camião basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.323,20	1,09	1.442,29	674,70	1.442,29	674,70	735,42	735,42	735,42	735,42	49,01	735,42	735,42	49,01	735,42	735,42	
51.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	10,00	115,23	1.152,30		1.152,30						100,00			100,00			
52.0	RUA SALUSTIANO BEZERRA CABRAL				266.312,38		266.312,38												
52.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.306,89		1.306,89												
52.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive rota de serviços, acorpanhamento e grade	m²	3.950,00	0,33	1.306,50	3.754,20	1.306,50	3.754,20											
52.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				264.775,12		264.775,12												
52.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	7.128,00	2,36	16.822,08	3.341,27	16.822,08	3.341,27											
52.2.2	CBUQ																		
52.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exlusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	106,92	1,207,08	129.050,93		129.050,93												
52.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exlusive transporte. AF_03/2017. - Reperflamento	m³	106,92	1,093,55	116.922,37	100,24	116.922,37	100,24											
52.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com camião basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	213,84	3,87	827,55	100,24	827,55	100,24											
52.2.4	Transporte com camião basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.047,82	1,09	1.142,12	491,18	1.142,12	491,18											
52.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	2,00	115,23	230,46		230,46												
52.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita				230,45		230,45												
53.0	RUA ALCEBIANES GONÇALVES DA ROCHA				222.475,30		222.475,30												
53.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.074,10		1.074,10												
53.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acorpanhamento e grade	m²	3.254,85	0,33	1.074,10	2.534,37	1.074,10	2.534,37											
53.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				220.910,28		220.910,28												
53.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	5.931,06	2,36	13.997,30	2.534,37	13.997,30	2.534,37											
53.2.2	CBUQ																		
53.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exlusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	88,95	1,207,08	107.381,84		107.381,84												
53.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exlusive transporte. AF_03/2017. - Reperflamento	m³	88,95	1,093,55	97.282,21	76,03	97.282,21	76,03											
53.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com camião basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	177,93	3,87	688,59	76,03	688,59	76,03											
53.2.4	Transporte com camião basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.459,03	1,09	1.590,34	623,45	1.590,34	623,45											
53.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	4,00	115,23	460,92		460,92												
53.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita				460,92		460,92												



 José Benício da Silva Filho

 Filio G. S. COB - Coordenador


 de Planejamento de Obras



 Eng.º Carlos Antonio Oliveira

 CREA 166652/08 DFB

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

		Grav de Sítio Dia 01/07/20	
Nº do CT 1.055.660-37		Nº do CT 1.055.660-37	
Tomador/da Prestadora ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE		Tomador/da Prestadora ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	
Agência Executora ou Ag. Operadora Reparat CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência Executora ou Ag. Operadora Reparat CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Fonte de Recursos outra (descrever)		Fonte de Recursos outra (descrever)	
Nº do Contrato 2.08.022/2020		Nº do Contrato 2.08.022/2020	
Data da obra - data 29/06/2020		Data da obra - data 29/06/2020	
Valor total (R\$) 18.225.616,43		Valor total (R\$) 18.225.616,43	
Valor atual (R\$) 18.225.616,43		Valor atual (R\$) 18.225.616,43	
Data de referência da medição de 13/11/2020 a 18/12/2020		Data de referência da medição de 13/11/2020 a 18/12/2020	
CEF - de assinatura CEF - de último ADL		CEF - de assinatura CEF - de último ADL	
CEF - de assinatura CEF - de último ADL		CEF - de assinatura CEF - de último ADL	

ITEM	DESCRIÇÃO DE TODOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PREÇO UNIT. ORÇAMENTO			PREÇO TOTAL QUANTITATIVOS			PREÇOS POR METRO CUBO			EMPON
		QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MÉDIO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MÉDIO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	
54.0	RUA FRANCISCO ERNESTO DO RÊGO			159.547,62			71.327,69			71.327,69	
54.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			764,28			717,41			717,41	
54.1.1	Serviços topográficos para pavimentação. Inclui nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	0,33	764,28	2.173,97	2.173,97	717,41	717,41	717,41	717,41	6,13
54.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			158.207,19			70.610,28			70.610,28	
54.2.1	Pinura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	2,36	10.057,00	1.993,34	1.993,34	4.704,28	4.704,28	4.704,28	4.704,28	53,22
54.2.2	CBUQ			77.156,55							
54.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m³	1.207,08	77.156,55							100,00
54.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Reperflamento	m³	1.093,55	69.897,72	59,80	59,80	65.394,29	65.394,29	65.394,29	65.394,29	6,45
54.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	127,84	49.474	59,80	59,80	231,43	231,43	231,43	231,43	53,22
54.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	549,71	599,18	257,14	257,14	260,28	260,28	260,28	260,28	53,22
54.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA			576,15							
54.3.1	Nivelamento de Tampo de Poço de Visita	unidade	115,23	576,15							100,00
55.0	RUA MARIA VIEIRA CÉSAR			323.047,21			308.518,15		115,23	308.633,38	
55.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			1.539,95			1.356,48			1.356,48	
55.1.1	Serviços topográficos para pavimentação. Inclui nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	0,33	1.539,95	4.110,56	4.110,56	1.356,48	1.356,48	1.356,48	1.356,48	11,91
55.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			320.810,88			307.161,67			307.161,67	
55.2.1	Pinura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	2,36	20.263,81	8.221,12	8.221,12	19.401,84	19.401,84	19.401,84	19.401,84	4,25
55.2.2	CBUQ			155.471,90							
55.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m³	1.207,08	155.471,90	123,32	123,32	148.857,11	148.857,11	148.857,11	148.857,11	4,25
55.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Reperflamento	m³	1.093,55	140.849,24	123,32	123,32	134.856,59	134.856,59	134.856,59	134.856,59	4,25
55.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	3,87	996,91	2.46,64	2.46,64	954,50	954,50	954,50	954,50	4,25
55.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1,09	3.429,02	2.836,36	2.836,36	3.091,63	3.091,63	3.091,63	3.091,63	4,25
55.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA			691,38					115,23	115,23	
55.3.1	Nivelamento de Tampo de Poço de Visita	unidade	6,00	691,38	1,00	1,00	115,23	115,23	115,23	115,23	83,33
56.0	RUA SÃO LUCAS			447.409,26			211.577,29			211.577,29	
56.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			2.148,53			2.148,53			2.148,53	
56.1.1	Serviços topográficos para pavimentação. Inclui nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	0,33	2.148,53	6.510,70	6.510,70	2.148,53	2.148,53	2.148,53	2.148,53	


 Francisco de Jesus Cavaliar
 Eng.º Civil - CREA/PB Nº 130.280.542


 José Benício da Silva Filho
 Eng.º Civil - COB - Coordenador
 de Planejamento de Obras



CAIXA		EM - Adicional		EM - Data emissão		EM - Período de referência da medição		Grau de Siglo	
Nº do CTE (Contrato de Execução Financeira)		6		22/12/2020		de 13/11/2020 a 18/12/2020		Dia do CT	
Data de emissão		26/07/2021		Empresa Contratada		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE		01/07/20	
Valor total líquido (R\$)		18.225.646,43		Objeto do CTE (resumido)		RECAPAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIRROS CENTRO, BELA VISTA, AUTO BRAVCO, CONCEIÇÃO, ESTACÇÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, RODRIGOS, SANTA CRUZ, DINAMÉRICA, CATOLÉ, CENTEIRO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, NOVO RODRIGOS, SANTO ANTONIO, SÃO JOSÉ, SERROTIÃO, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA		Causa Econômica Federal	
Valor atual (R\$)		18.225.646,43		Local de obra (Bairro/Município/UF)		CAMPINA GRANDE/PB		Fonte de Recursos	
CTE -		CTE -		CTE -		CTE -		outra (descrever)	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO EMPASTAMENTO	PREÇO UNITÁRIO			PERÍODO TOTAL	PREÇO POR PERÍODO (QUANTIDADE)			PREÇO POR PERÍODO (R\$)			ENTRADA N
		UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.		ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUSIVE DO PERÍODO		
56.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				443.762,74			209.428,76			209.428,76	
56.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	11.851,281	2,36	27.977,42	5.861,28		13.832,62			13.832,62	50,56
56.2.2	CBUQ											
56.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	177,82	1.207,08	214.642,97							100,00
56.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperflamento	m³	177,82	1.093,55	194.455,06	175,84		197.289,83			197.289,83	1,11
56.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	355,65	3,87	1.376,37	175,84		680,50			680,50	50,56
56.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	4.872,40	1,09	5.310,92	2.409,00		2.625,81			2.625,81	50,56
56.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				1.497,59							
56.3.1	Nivelamento de Tampeo de Poço de Visita	unidade	13,00	115,23	1.497,59							100,00
57.0	RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ				266.855,16			266.016,69		806,61	266.823,30	
57.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.270,17			1.238,31			1.238,31	
57.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e gréu	m²	3.849,00	0,33	1.270,17	3.752,45		1.238,31			1.238,31	7,51
57.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				264.778,38			264.778,38			264.778,38	
57.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	7.119,00	2,36	16.600,84	7.119,00		16.600,84			16.600,84	
57.2.2	CBUQ											
57.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	106,78	1.207,08	128.892,00	106,78		128.892,00			128.892,00	
57.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperflamento	m³	106,78	1.093,55	116.769,27	106,78		116.769,27			116.769,27	
57.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	213,56	3,87	846,48	213,56		846,48			846,48	
57.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.365,78	1,09	1.489,79	1.365,78		1.489,79			1.489,79	
57.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				806,61			806,61		806,61	806,61	
57.3.1	Nivelamento de Tampeo de Poço de Visita	unidade	7,00	115,23	806,61	7,00		806,61			806,61	
58.0	RUA JOANA D'ARC DE ARRUDA - TRECHO 01				314.117,23							
59.0	RUA JOANA D'ARC DE ARRUDA - TRECHO 02				199.723,34			197.233,94		460,92	197.694,86	
59.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				953,54			883,38			883,38	
59.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e gréu	m²	2.839,50	0,33	953,54	2.676,50		883,38			883,38	7,36
59.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				168.308,88			166.350,56			166.350,56	
59.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	5.316,68	2,36	12.547,36	4.465,88		10.589,04			10.589,04	15,61
59.2.2	CBUQ											


José de Jesus Filho
 Prefeito Municipal - Coordenador
 de Planejamento de Obras


Eng. João Neto de Oliveira
 CREA 160605208 DFB

CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA.

CAIXA

Mo do CTR (Contrato Executivo/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)	Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)	Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)	Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)	Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)	Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)	Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)	Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)	Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)	Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)	Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)	Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)	Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)	Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)	Mo do CTR (Contrato Execução/Execução)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PREÇO DE ORÇAMENTO			PREÇO TOTAL	ACUMULADO DE PREÇOS ANTERIORES			ACUMULADO INCLUSIVE DO PREÇO	ACUMULADO DE PREÇOS ANTERIORES			ACUMULADO INCLUSIVE DO PREÇO	SERV. IN
		UNID.	QTDE.	PREÇO UNIT.		ACUMULADO DE PREÇOS ANTERIORES	MÉDIA DO PREÇO	ACUMULADO INCLUSIVE DO PREÇO		ACUMULADO DE PREÇOS ANTERIORES	MÉDIA DO PREÇO	ACUMULADO INCLUSIVE DO PREÇO		
59.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	79,75	1.207,08	86.264,63	79,75	79,75	79,75	79,75	79,75	79,75	79,75	79,75	96.264,63
59.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperflamento	m²	79,75	1.093,55	87.210,61	79,75	79,75	79,75	79,75	79,75	79,75	79,75	79,75	87.210,61
59.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	159,50	3,87	617,27	159,50	159,50	159,50	159,50	159,50	159,50	159,50	159,50	617,27
59.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.531,20	1,09	1.669,01	1.531,20	1.531,20	1.531,20	1.531,20	1.531,20	1.531,20	1.531,20	1.531,20	1.669,01
59.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	4,00	115,23	460,92	460,92	460,92	460,92	460,92	460,92	460,92	460,92	460,92	460,92
59.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita	unidade	4,00	115,23	460,92	460,92	460,92	460,92	460,92	460,92	460,92	460,92	460,92	460,92
60.0	RUA FERNANDES VIEIRA													
60.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				218.658,73									99.792,91
60.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acorpanhamento e grade	m²	3.038,00	0,33	1.002,54	1.002,54	1.002,54	1.002,54	1.002,54	1.002,54	1.002,54	1.002,54	1.002,54	435,70
60.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				216.964,81									435,70
60.2.1	Pinura de ligação com emulsão RR-2C, Inclusive aquisição e transporte	m²	5.832,56	2,36	13.765,79	13.765,79	13.765,79	13.765,79	13.765,79	13.765,79	13.765,79	13.765,79	13.765,79	99.357,21
60.2.2	CBUQ													6.239,58
60.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	87,49	1.207,08	105.607,43	87,49	87,49	87,49	87,49	87,49	87,49	87,49	87,49	47.933,15
60.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperflamento	m²	87,49	1.093,55	95.674,69	87,49	87,49	87,49	87,49	87,49	87,49	87,49	87,49	43.315,52
60.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	174,98	3,87	677,17	174,98	174,98	174,98	174,98	174,98	174,98	174,98	174,98	306,97
60.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.137,37	1,09	1.239,73	1.239,73	1.239,73	1.239,73	1.239,73	1.239,73	1.239,73	1.239,73	1.239,73	561,59
60.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				691,38									
60.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita	unidade	6,00	115,23	691,38	691,38	691,38	691,38	691,38	691,38	691,38	691,38	691,38	100,00
61.0	RUA ALFREDO GODFREDO DE SANTANA													
61.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				64.597,98									59.048,64
61.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acorpanhamento e grade	m²	937,00	0,33	309,21	309,21	309,21	309,21	309,21	309,21	309,21	309,21	309,21	260,82
61.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				64.163,54									260,82
61.2.1	Pinura de ligação com emulsão RR-2C, Inclusive aquisição e transporte	m²	1.224,09	2,36	4.068,83	4.068,83	4.068,83	4.068,83	4.068,83	4.068,83	4.068,83	4.068,83	4.068,83	58.787,82
61.2.2	CBUQ													3.723,25
61.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	25,66	1.207,08	31.215,09	25,66	25,66	25,66	25,66	25,66	25,66	25,66	25,66	28.595,73
61.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperflamento	m²	25,66	1.093,55	28.279,20	25,66	25,66	25,66	25,66	25,66	25,66	25,66	25,66	25.928,07

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
FRANCISCO DA JESUS C. XAVIER
Eng. Civ. -CREA-PB Nº. 130.285.54-2

José Roberto da Silva Filho
FUND. COOB - Coordenador
de Planejamento de Obras

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
Eng. João Neto de Oliveira
CREA - 160020204 DFB

CAIXA		Nº do CUP (Contorno Exceção/Forçadíssimo)		Nº do CUP		Grau de Sigilo	
2.08.022/2020		29/06/2020		1.055.660-37		Outra	
Data de emissão		Data de validade da medição		13/11/2020 a 18/12/2020		01/07/20	
26/07/2021		22/12/2020		09 333.099/0001-92		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPELA GRANDE	
CITEF - de execução		CITEF - de prestação de serviços		09 333.099/0001-92		Agência Financeira ou de Operações Financeiras	
18.225-646.43		18.225-646.43		09 333.099/0001-92		CAUSA ECONÔMICA FEDERAL	
Valor atual (R\$)		Valor atual (R\$)		09 333.099/0001-92		Fonte de Recursos	
18.225-646.43		18.225-646.43		09 333.099/0001-92		outra (descrever)	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBRAS	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL			ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR			ACUMULADO ATÉ PERÍODO ATUAL			ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO			CENSO IN
		QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MÉDIO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MÉDIO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MÉDIO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO				
61.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	51,72	3,87	200,16	47,40	47,40	183,44	183,44	47,40	183,44	183,44	8,35				
61.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	367,21	1,09	400,26	322,32	322,32	351,33	351,33	322,32	351,33	351,33	12,22				
61.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	1,00	115,23	115,23	1,00	1,00	115,23	115,23	1,00	115,23	115,23					
61.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita	unidade	1,00	115,23	115,23	1,00	1,00	115,23	115,23	1,00	115,23	115,23					
62.0	TRAVESSA JOÃO FLORENTINO DE CARVALHO				79.643,92			75.195,72	75.195,72			75.195,72					
62.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				380,82			331,87	331,87			331,87					
62.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acorpanhamento e grade	m²	1.154,00	0,33	380,82	1.005,67	1.005,67	331,87	331,87	1.005,67	1.005,67	331,87	12,85				
62.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				79.032,64			74.863,85	74.863,85			74.863,85					
62.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C. Inclusive aquisição e transporte	m³	2.123,36	2,36	5.011,13	2.011,35	2.011,35	4.746,79	4.746,79	2.011,35	4.746,79	4.746,79	5,28				
62.2.2	CBUQ																
62.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	31,85	1.207,08	38.445,50	30,17	30,17	36.417,60	36.417,60	30,17	36.417,60	36.417,60	5,27				
62.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperflamento	m²	31,85	1.093,55	34.829,57	30,17	30,17	32.994,40	32.994,40	30,17	32.994,40	32.994,40	5,27				
62.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	63,70	3,87	246,52	60,34	60,34	233,52	233,52	60,34	233,52	233,52	5,27				
62.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	458,64	1,09	499,92	434,44	434,44	473,54	473,54	434,44	473,54	473,54	5,28				
63	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				230,46												
63.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita	unidade	2,00	115,23	230,46												
63.0	RUA DIALMA MIGUEL DE MORAIS				193.918,95			187.314,58	187.314,58			187.314,58					
63.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				947,50			825,99	825,99			825,99					
63.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acorpanhamento e grade	m²	2.871,20	0,33	947,50	2.503,01	2.503,01	825,99	825,99	2.503,01	2.503,01	825,99	12,82				
63.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				192.510,54			185.488,59	185.488,59			185.488,59					
63.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C. Inclusive aquisição e transporte	m²	5.168,16	2,36	12.198,86	5.006,33	5.006,33	11.814,94	11.814,94	5.006,33	11.814,94	11.814,94	3,13				
63.2.2	CBUQ																
63.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	77,52	1.207,08	93.572,84	75,10	75,10	90.651,71	90.651,71	75,10	90.651,71	90.651,71	3,12				
63.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperflamento	m²	77,52	1.093,55	84.772,00	75,09	75,09	82.114,67	82.114,67	75,09	82.114,67	82.114,67	3,13				
63.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	155,04	3,87	600,00	150,19	150,19	581,24	581,24	150,19	581,24	581,24	3,13				
63.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.255,82	1,09	1.368,84	1.216,54	1.216,54	1.326,03	1.326,03	1.216,54	1.326,03	1.326,03	3,13				
63.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				460,92			460,92	460,92			460,92					
63.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita	unidade	4,00	115,23	460,92	4,00	4,00	460,92	460,92	4,00	460,92	460,92					

Eng. João Nilton de Oliveira
CREA - Profissional DPE

Josefencio da Silva Filho
Físico - Coordenador de Planejamento do CUP

PREF. MUNIC. DE CAMPELA GRANDE
FOMENTO DE JOSEFENECIO DA SILVA FILHO
Eng. Civ. - CREA-PB Nº 30.283/2012


Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

CAIXA W do CTEF (Contrato de Prestação de Serviços) 2.08.022/2020 4 de abril - data 29/06/2020 Prazo de término da obra 26/07/2021 Valor total inicial (R\$) 18.225.646,43 CTEF- Valor total inicial (R\$) CTEF- Ch. assinatura CTEF- Em último mês 18.225.646,43		R\$M - Valor 6 Empresa Contratada CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA (Órgão do CTEF responsável)		R\$M - Data emissão 22/12/2020 R\$M - Período de referência da medição de 13/11/2020 a 18/12/2020 (Data) 09.333.099/0001-92		Nº do CT 1.065.660-37 Tomador (da Promotora ou Tomadora) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Agente Financeiro (ou Ag. Operadora Financeira) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Grau de Serviço DVA 4x CT 01/07/20	
Local da obra: Bairro: Município: UF: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO									

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PREÇO DO ORÇAMENTO			EXECUÇÃO FÍSICA REALIZADA (em %)			EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$)					
		UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MÉDIO DO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MÉDIO DO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO			
64.0	RUA DAS BARAÚNAS												
64.1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
64.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	3.438,40	0,33	1.134,67	3.021,49	3.021,49	997,09	997,09	997,09	997,09	997,09	12,13
64.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO												
64.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	6.348,72	2,36	14.982,98	2.765,03	2.765,03	98.541,70	98.541,70	98.541,70	98.541,70	56,45	
64.2.2	CBUQ												
64.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	95,23	1,207,08	114.950,23								100,00
64.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Repetimento	m³	95,23	1.093,55	104.138,77	82,52	82,52	90.239,75	90.239,75	90.239,75	90.239,75	13,35	
64.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibrador-acabadora	m³	190,47	3,87	737,12	82,52	82,52	319,35	319,35	319,35	319,35	56,68	
64.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	3.085,61	1,09	3.369,31	1.336,82	1.336,82	1.457,13	1.457,13	1.457,13	1.457,13	56,68	
64.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA												
64.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	1,00	115,23	115,23								100,00
65.0	RUA ALICE GAUDÊNCIO												
65.1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
65.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	4.242,65	0,33	1.400,07	4.152,77	4.152,77	1.370,41	1.370,41	1.370,41	1.370,41	2,12	
65.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO												
65.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	8.073,14	2,36	19.052,61	8.073,14	8.073,14	19.052,61	19.052,61	19.052,61	19.052,61		
65.2.2	CBUQ												
65.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	121,09	1.207,08	146.165,32	121,09	121,09	146.165,32	146.165,32	146.165,32	146.165,32		
65.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Repetimento	m³	121,09	1.093,55	132.417,97	121,09	121,09	132.417,97	132.417,97	132.417,97	132.417,97		
65.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibrador-acabadora	m³	242,18	3,87	937,24	242,18	242,18	937,24	937,24	937,24	937,24		
65.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	2.010,09	1,09	2.191,00	2.010,09	2.010,09	2.191,00	2.191,00	2.191,00	2.191,00		
65.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA												
65.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	1,00	115,23	115,23								100,00
66.0	RUA SUIPINO COLAÇO												
66.1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
66.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	766,00	0,33	259,38	705,27	705,27	252,74	252,74	252,74	252,74	10,27	


JOSÉ BENÍCIO DA SILVA FILHO
 Engenheiro Civil - CREA PB Nº 190.283/04-2
 Coordenador de Planejamento de Obras


JOSÉ BENÍCIO DA SILVA FILHO
 Engenheiro Civil - CREA PB Nº 190.283/04-2
 Coordenador de Planejamento de Obras


Eng. João N. de Oliveira
 CREA - 15524/2008-07/18

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

CAIXA	Grau de Sijlo	
№ da CTE (Contorno Externo/Fornecimento)	№ da CT	Data da CT
2.08.02/2020	1.065.600-37	01/07/20
Início da obra - data	Tomador/PA Promotor ou Tomador	
29/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	
Final do término da obra	Agente Fiscalizador ou Ag. Operador Pagador	
26/07/2021		
Valor total liquidado (R\$)	CAUSA ECONÔMICA FEDERAL	
18.225.646,43	Fonte de Recursos	
	outra (decrement)	
CTEF - Valor atual (R\$)		
18.225.646,43		

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO EMPILHAMENTO	PERÍODO DE PAGAMENTO			PERÍODO DE EXECUÇÃO			PERÍODO FINANCEIRO (R\$)			DEBTO (R\$)	
		UNID.	QTD	PREÇO UNIT.	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	PERÍODO		
66.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO											
66.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	1.446,24	2,36	53.807,94	705,27	3.413,13	25.044,99	1.654,44	25.044,99	1.654,44	51,23
66.2.2	CBUQ											
66.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	21,69	1.207,08	26.181,57							100,00
66.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017. - Reperflamento	m³	21,69	1.093,55	23.719,10	21,16		23.139,52				2,44
66.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com camião basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	43,38	3,87	167,83	21,16		81,89				51,22
66.2.4	Transporte com camião basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	289,32	1,09	316,26	146,00		159,14				51,22
66.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA											
66.3.1	Nivelamento de Tampao de Poço de Visita	unidade	3,00	115,23	345,69							100,00
67.0	RUA PROFESSOR CAPIBA											
67.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				129.521,65			55.251,56				
67.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acor panhamento e greide				618,42			569,51				
67.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				618,42			560,51				9,35
67.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	1.874,00	0,33	128.327,08	1.698,50		54.691,05				
67.2.2	CBUQ	m²	3.448,16	2,36	8.137,65	1.698,50		4.008,46				50,74
67.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	51,72	1.207,08	62.430,18							100,00
67.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017. - Reperflamento	m³	51,72	1.093,55	56.558,41	45,86		50.150,20				11,33
67.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com camião basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	103,44	3,87	400,31	45,86		177,48				55,66
67.2.4	Transporte com camião basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	734,42	1,09	800,52	315,61		354,91				55,67
67.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				576,15							
67.3.1	Nivelamento de Tampao de Poço de Visita	unidade	5,00	115,23	576,15							100,00
68.0	RUA RAFAELA DE SOUZA E SILVA				797.192,55			365.330,25				
68.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				3.846,99			3.799,56				
68.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acor panhamento e greide	m²	11.657,55	0,33	3.846,99	11.513,83		3.799,56				1,23
68.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				791.982,80			361.530,69				
68.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	21.204,62	2,36	50.042,90	10.472,04		24.714,01				50,61
68.2.2	CBUQ											
68.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	318,07	1.207,08	383.935,94							100,00

Constutora Rocha Cavalcante Ltda.
 Rua João Neves de Azevedo
 Caixa Postal 5005-010

José Benício da Silva Filho
 FISCAL DO COB - Coordenador
 de Manutenção de Obras

DR. F. MUNIC. DE C. GRANDE
 FRANCISCO DE JESUS C. Xavier
 Eng. Civ. - CREAB/PB Nº 158/2005/42

CAIXA Nº da CTEU (Código de Funcionamento) 2.08.02/2020 Valor total (R\$) 29/06/2020 18.225.646,43		Nº do CT 1.055.660-37 Data da CT 01/07/20	
Nome do Contratado CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA CTEU de abertura 28/07/2021 18.225.646,43		Nº do CT 1.055.660-37 Data da CT 01/07/20	
Local da obra (R. ou Av.) / Município / UF Rua 18.225.646,43		Nº do CT 1.055.660-37 Data da CT 01/07/20	
Descrição da obra PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO		Nº do CT 1.055.660-37 Data da CT 01/07/20	
Valor total (R\$) 18.225.646,43		Nº do CT 1.055.660-37 Data da CT 01/07/20	

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO (PREÇO UNITÁRIO)			PREÇO TOTAL (PREÇO TOTAL)			ERRO (N)
		QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL		ACUMULADO PREÇO UNITÁRIO	ACUMULADO PREÇO TOTAL	ACUMULADO PREÇO UNITÁRIO	ACUMULADO PREÇO TOTAL			
75.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e medição	m²	2.156,60	0,33	711,68	2.065,96	2.065,96	682,76	682,76	4,05		
75.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	3.930,08	2,36	9.416,59	1.908,92	1.908,92	68.265,68	68.265,68	52,16		
75.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	59,85	1.207,08	72.243,74	57,27	57,27	62.627,61	62.627,61	4,31		
75.2.2	CBUQ	m³	59,85	1.093,55	65.448,97	57,27	57,27	221,63	221,63	52,16		
75.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, excludive transporte. AF_03/2017 - Capa	m³	119,70	3,87	952,45	856,14	856,14	911,39	911,39	4,31		
75.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, excludive transporte. AF_03/2017 - Reperflamento	m³	873,81	1,09	230,46	230,46	230,46	37.667,20	37.667,20	100,00		
75.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³ x km	2,00	115,23	230,46	230,46	230,46	37.667,20	37.667,20	100,00		
75.3	INIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	60,00	470,84	28.250,40	80,00	80,00	37.667,20	37.667,20	100,00		
75.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	m²	60,00	470,84	28.250,40	80,00	80,00	37.667,20	37.667,20	100,00		
76.0	PLACAS DE OBRAS (4x2,0 m - 10 PLACAS)	m²	256.890,62		256.890,62			118.010,04	118.010,04	50,74		
76.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	unidade	1,00	256.890,62	256.890,62	0,0951	0,0951	118.010,04	118.010,04	50,74		
76.1.1	Placa da Obra	unidade	1,00	256.890,62	256.890,62	0,0951	0,0951	118.010,04	118.010,04	50,74		
77.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (12 MESES DE OBRA)	mês	50.466,24		50.466,24			19.908,93	19.908,93	51,04		
77.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	mês	50.466,24		50.466,24			19.908,93	19.908,93	51,04		
77.1.1	Administração local da obra (12 meses de obra)	mês	50.466,24		50.466,24			19.908,93	19.908,93	51,04		
78.0	LABORATÓRIO DE BETUME (BDI de 26,85%)	mês	12,00	4.205,52	50.466,24			4.799,34	4.799,34	51,04		
78.1.1	Laboratório de Betume (BDI de 26,85%)	mês	12,00	4.205,52	50.466,24			4.799,34	4.799,34	51,04		
TOTAL					18.225.646,43			7.376.954,23	1.765.463,59	9.142.418,22	49,84	

Campina Grande, 22 de dezembro de 2020

LOCALIA

Assinatura do Engenheiro Responsável/Mostrador

José Benedito da Silva Filho
 Engenheiro de Obras - Coordenador
 de Planejamento de Obras

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
 Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng. Civ. - CREA-PB Nº 160.280.504-2

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
 Eng. Antonio Nery de Oliveira
 CREA - PB Nº 160.280.504-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIROS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTAÇÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCONGÓ, SANTA CRUZ, DINAMÉRICA, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCONGÓ, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTÃO, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO
MEMÓRIA DE CÁLCULO



ITEM	SERVIÇOS	ESTACA				Área (AutoCAD)	Altura	Volume	N.V.	dm	QUANTIDADES		OBSERVAÇÃO
		Inicial	Final	Comp. (AutoCAD)	Larg. (m/área)						Parciais	Totais	
33.0	RUA BENEDITO MOTTA												
33.3	NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA												
33.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita							3,00			3,00	Trecho 01 unidade	
											Executado:		
35.0	RUA PROFESSOR MAURO LUNA												
35.3	NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA												
35.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita							5,00			5,00	Trecho 01 unidade	
											Executado:		
39.0	RUA DESEMBARGADOR AZEVEDO												
39.3	NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA												
39.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita							6,00			6,00	Trecho 01 unidade	
											Executado:		
40.0	RUA DUQUE DE CAXIAS												
40.1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
40.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	0,00	10,00	10,12	210,12	10,01	2103,30				2103,30	Trecho 01	
											Executado:		
40.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO												
40.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	0,00	10,00	10,12	210,12	9,21	1935,54		1,00		1935,54	Trecho 01	
											53,62	Rua Teixeira de Freitas LE + LD	
											Executado:		
											1969,36	m²	
40.2.2	CBUQ												
40.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	0,00	10,00	10,12	210,12	9,21	1935,54		1,00		58,07	Trecho 01	
											1,34	Rua Teixeira de Freitas LE + LD	
											Executado:		
											59,41	m³	
40.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora												
40.2.4	Transporte local de material betuminoso												
											59,41	[VIDE CBUQ CAPA]	
											Executado:		
											59,41	m³	
40.3	NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA												
40.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita												
											8,50	[VIDE CBUQ CAPA]	
											Executado:		
											504,99	m³ x 1m	
46.0	RUA DR. JOÃO ARIUNDO CORREIA												
46.1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
46.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	0,00	6,00	14,63	134,63	15,69	2152,73				2152,73	Trecho 01	
											Executado:		
											2,00	Trecho 01	
											Executado:		
											2,00	unidade	

Eng.ª Jucy Nery de Oliveira
CREA 1606953268-DFPB

[Handwritten signature]

José Benício da Silva Filho
FIA/COB - Coordenador
de Planejamento de Obras

PREF. MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
Município de Jesus C. Xavier
Eng.º Cív. - CREA/PB Nº 160.265.942

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO
MEMÓRIA DE CÁLCULO



ITEM	SERVIÇOS	ESTACA					QUANTIDADES			OBSERVAÇÃO											
		Inicial	Final	Comp. (AutoCAD)	Larg. (média)	Área (AutoCAD)	Altura	Volume	H.V.		dmt	Parcelis	Totais								
46.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO																				
46.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-ZC, inclusive aquisição e transporte	0,00 + 0,00	6,00 + 14,63	134,63	12,36	1663,72	1,00								1663,72					Trecho 01	
46.2.2	CBUQ																				
46.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte.																				
46.2.3	AF_03/2017.- Reperfilamento	0,00 + 0,00	6,00 + 14,63	134,63	12,36	1663,72	0,029	48,25	1,00						48,25						Trecho 01
46.2.4	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora																				
46.2.4	Transporte local de material betuminoso																				
47.0	RUA JOÃO LEÍS																				
47.3	NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA																				
47.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita																				
55.0	RUA MARIA VIEIRA CÉSAR																				
55.3	NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA																				
55.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita																				
57.0	RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ																				
57.3	NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA																				
57.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita																				
59.0	RUA JOANA D'ARC DE ARRUDA - TRECHO 02																				
59.3	NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA																				
59.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita																				
61.0	RUA ALFREDO GODOFREDO DE SANTANA																				
61.3	NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA																				
61.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita																				
63.0	RUA DIALMA MIGUEL DE MORAIS																				
63.3	NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA																				
63.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita																				

[Handwritten signature]

José Benício da Silva Filho
FIC 03/2008 - Coordenador
de Planejamento de Obras

Constâncio Rocha Cavalcante Ltda.
Eng. João N. de Oliveira
CREA 156.055.938/PA-PB

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
FONTE: Juscelino C. Xavier
FIC 03/2008 - DREA-PB Nº 13072835942

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO
MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	SERVIÇOS	ESTACA				Comp. (AutoCAD)	Larg. (média)	Área (AutoCAD)	Altura	Volume	N.V.	dm	QUANTIDADES		OBSERVAÇÃO
		Inicial	Final	Parciais	Totais										
71.0	RUA FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA														
71.1	SERVIÇOS PRELIMINARES														
71.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	0,00 + 0,00	15,00 + 7,64	307,64	13,68	4270,04							4270,04	Trecho 01	
		0,00 + 0,00	31,00 + 5,94	635,94	9,90	6196,81							6196,81	Trecho 02	
		0,00 + 0,00	25,00 + 19,19	519,19	6,10	3167,66							3167,66	Trecho 03	
		11,00 + 2,74	12,00 + 11,76	29,02	6,10	177,02							177,02	Trecho 04	
		0,00 + 0,00	78,00 + 5,01	1565,01	9,73	15227,55							15227,55	Trecho 05	
		0,00 + 0,00	4,00 + 7,49	87,49	7,70	673,67							673,67	Trecho 06	
													Executado: 29712,15 m²		
71.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO														
71.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	0,00 + 0,00	15,00 + 7,64	307,64	13,08	4022,71				1,00			4022,71	Trecho 01	
		0,00 + 0,00	31,00 + 5,94	635,94	9,10	5696,91				1,00			5696,91	Trecho 02	
		0,00 + 0,00	25,00 + 19,19	519,19	5,30	2752,50				1,00			2752,50	Trecho 03	
		11,00 + 2,74	12,00 + 11,76	29,02	5,30	153,87				2,00			307,74	Trecho 04	
		0,00 + 0,00	78,00 + 5,01	1565,01	8,93	13976,53				1,00			13976,53	Trecho 05	
		0,00 + 0,00	4,00 + 7,49	87,49	6,90	604,65				1,00			604,65	Trecho 06	
													Executado: 27360,44 m²		
71.2.2	CBUQ														
71.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Caps	0,00 + 0,00	15,00 + 7,64	307,64	13,08	4022,71			0,649				197,11	Trecho 01	
		0,00 + 0,00	31,00 + 5,94	635,94	9,10	5696,91			0,448				273,45	Trecho 02	
		0,00 + 0,00	25,00 + 19,19	519,19	8,93	668,83			0,05				668,83	Trecho 05	
		11,00 + 2,74	12,00 + 11,76	29,02	6,90	604,65			0,05				30,20	Trecho 06	
		0,00 + 0,00	4,00 + 7,49	87,49	6,90	604,65			0,05				30,20	Trecho 06	
													Executado: 1199,59 m³		
71.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Caps	0,00 + 0,00	25,00 + 19,19	519,19	5,30	2752,50			0,029				79,82	Trecho 03	
		11,00 + 2,74	12,00 + 11,76	29,02	5,30	153,87			0,03				4,62	Trecho 04	
													Executado: 81,44 m³		
71.2.2.3	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperilamento	11,00 + 2,74	12,00 + 11,76	29,02	5,30	153,87			0,027				4,15	Trecho 04	
													Executado: 4,15 m³		
71.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabada												1199,59	[WIDE CBUQ CAPA 5 cm]	
													84,44	[WIDE CBUQ CAPA 3 cm]	
													4,15	[WIDE CBUQ REPERILAMENTO]	
													Executado: 1288,18 m³		
71.2.4	Transporte local de material betuminoso												1199,59	[WIDE CBUQ CAPA 5 cm]	
													84,44	[WIDE CBUQ CAPA 3 cm]	
													4,15	[WIDE CBUQ REPERILAMENTO]	
													Executado: 1288,18 m³		
													13675,33	[WIDE CBUQ CAPA 5 cm]	
													962,02	[WIDE CBUQ CAPA 3 cm]	
													47,31	[WIDE CBUQ REPERILAMENTO]	

APRF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
Eng. Civ. - CREA/PB. N.º 150.265.534-2

José Benedito da Silva Filho
FICUC/2008 - Coordenador
de Planejamento de Obras

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
Eng. João Neto de Oliveira
CREA 146605208 DRR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO
MEMÓRIA DE CÁLCULO



ITEM	SERVIÇOS	ESTACA					QUANTIDADES			OBSERVAÇÃO			
		Inicial	Final	Comp. (AutoCAD)	Larg. (médias)	Área (AutoCAD)	Altura	Voluma	N.V.		dmt	Parçelas Executadas:	Totais
73.0	RUA ANTONIETA CAVALCANTE											14683,26 m² x km	
73.3	NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA												
73.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita								6,00		6,00		Trço:01 unidade
77.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (12 MESES DE OBRA)												
77.1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
77.1.1	Administração Local da Obra (12 meses de obra)								9,51%		9,5100%		9,5100% unidade
78.0	LABORATÓRIO DE BETUME (BDI DE 26,85%)												
78.1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
79.1.1	Laboratório de Betume (BDI de 26,85%)								0,0951		0,0951		0,0951 %

[Handwritten Signature]
 PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
 FRANCISCO DE JESUS C. XAVIER
 Engº Civil - CREA/PB Nº 130.283/5-2

[Handwritten Signature]
 José Benício da Silva Filho
 Engº Civil - CREA/PB Nº 130.283/5-2
 Coordenador de Planejamento de Obras


[Handwritten Signature]
 Consórcio Rocha Cavalcante Ltda.
 Eng. João Neto de Oliveira
 CREA/PB Nº 130.283/5-2





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIROS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTAÇÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCONGÓ, SANTA CRUZ, DINAMÉRICA, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCONGÓ, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTÃO, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA

PLANTA (CROQUI)




01 - Planta Baixa Estaqueamento

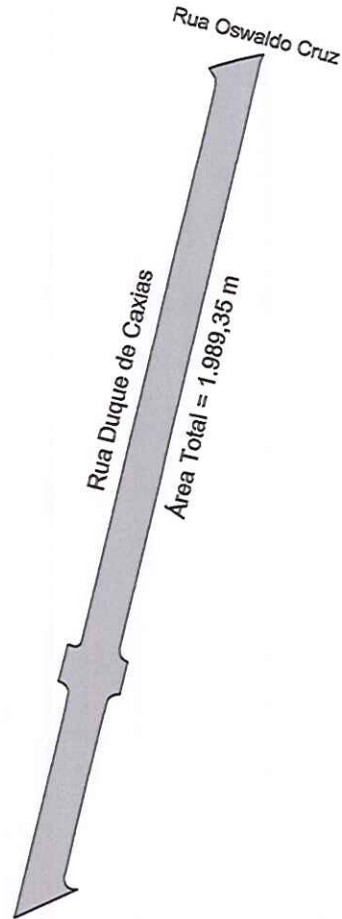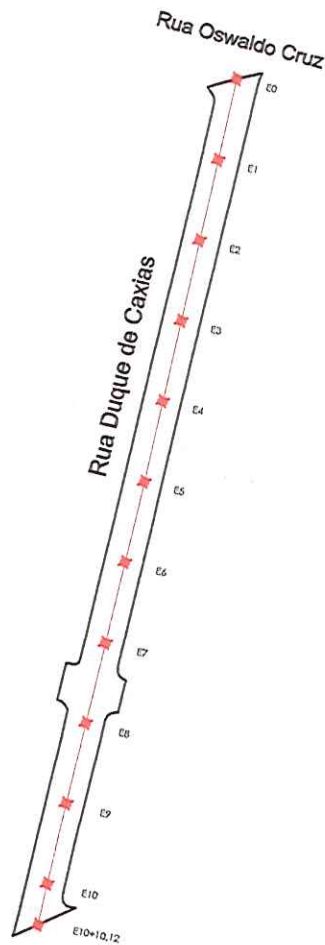

02 - Planta Baixa com Pavimentação Asfáltica (Capa)

Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: Duque de Caxias	
Bairro: Prata	
Data/Ano: dezembro/2020	Prancha: 1/1
RUA DUQUE DE CAXIAS	
ÁREA DA BOCA DE RUA	53,81 m ²
ÁREA DA RUA – CAPA	1.935,54 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	210,12 m
LARGURA DA RUA (média)	9,21 m

03 - Planta de Situação

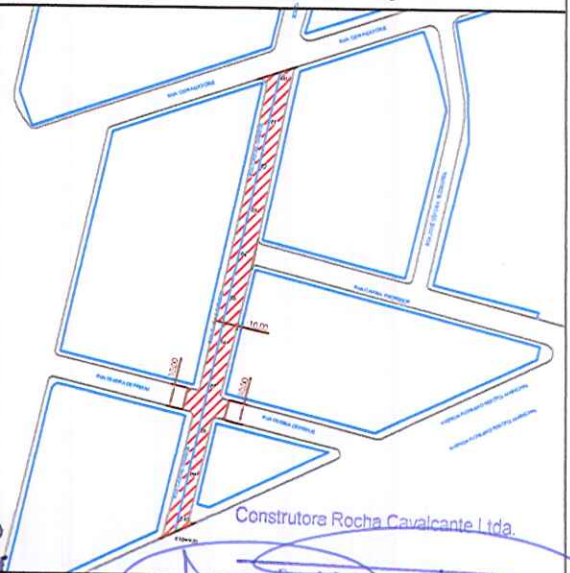


PREF. MUNIC. DE Q. GRANDE
Francisco José Xavier
Eng. Civil - CREA Nº 130.283594-2


José Benício da Silva Filho
Eng. Civil - CREA Nº 130.283594-2 - Coordenador
de Manutenção de Obras

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

Eng. João Neto de Oliveira
CREA. 160603/202 D/PR

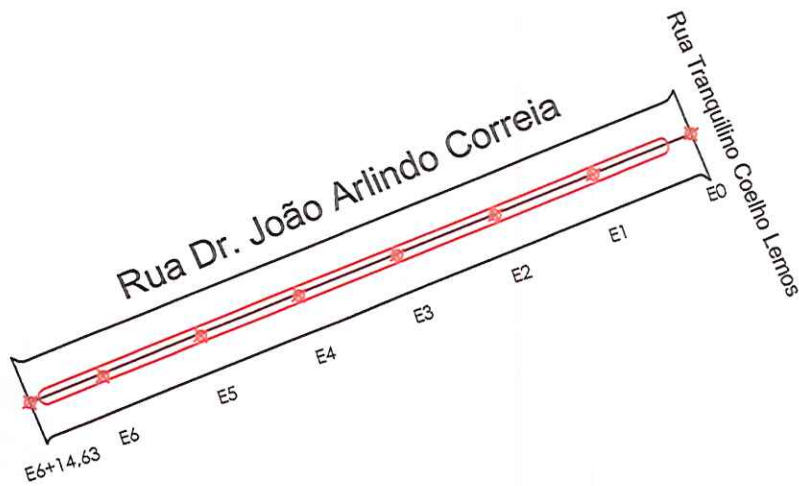


01 - Planta Baixa Estaqueamento

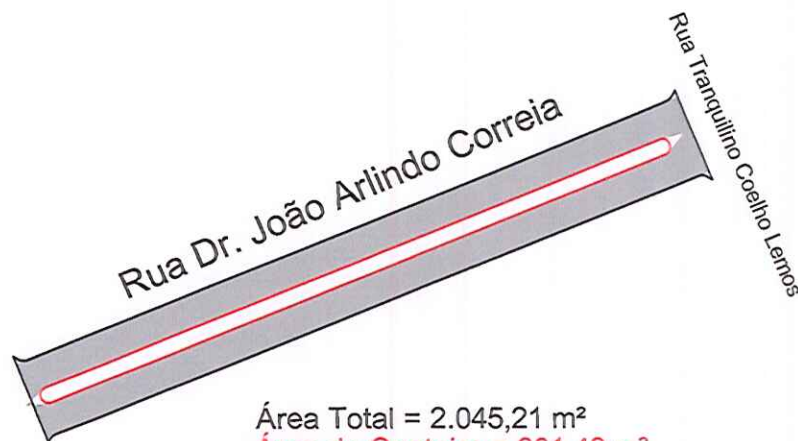

02 - Planta Baixa com Pavimentação Asfáltica (Reperfilamento)

Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: Dr. João Arlindo Correia	
Bairro: Dinamérica	
Data/Ano: novembro/2020	Prancha: 1/1
RUA DR. JOÃO ARLINDO CORREIA	
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²
ÁREA DA RUA - CAPA	1.663,72 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	134,63 m
LARGURA DA RUA (média)	12,36 m

03 - Planta de Situação


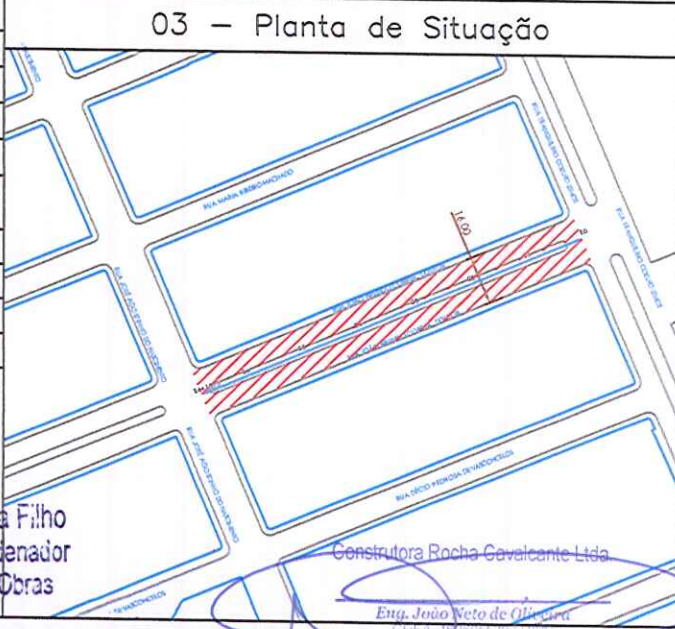


PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
Eng. Cvt. - CREA - PE 130.283504-2


José Benício da Silva Filho
PMOG/DECOP - Coordenador
de Planejamento de Obras

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng. João Neto de Oliveira
CREA - 19.988/2008-0/PE



01 - Planta Baixa Estaqueamento




Área Total = 4.129,14 m²
 Área Total = 106,43 m²
 Área Asfaltada = 4.022,71 m²

02 - Planta Baixa com Pavimentação Asfáltica (Capa)

Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: Francisco Lopes de Almeida - Trecho 01	
Bairro: Malvinas	
Data/Ano: dezembro/2020	Prancha: 1/6
RUA FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA - TRECHO 01	
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²
ÁREA DA RUA - CAPA	4.022,71 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	307,64 m
LARGURA DA RUA (média)	13,08 m


03 - Planta de Situação

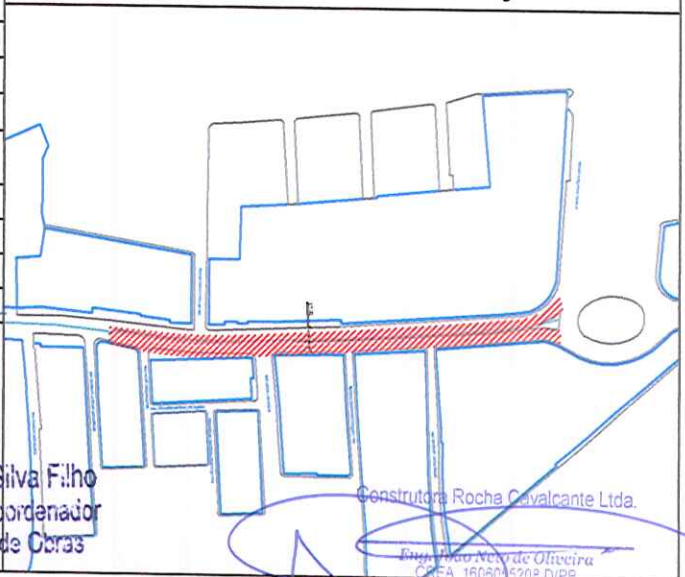


PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
 Francisco de Jesus S. Xavier
 Eng. Civil - CREA/PA 130.283594-2

Jose Benicio da Silva Filho
 FUND. SEC. DE COB. - Coordenador
 de Planejamento de Obras

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
 Eng. Paulo Roberto Oliveira
 CREA 160.045.202-0/PA




01 - Planta Tabela Estaqueamento



02 - Planta Baixa com Pavimentação Asfáltica (Capa)

Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: Francisco Lopes de Almeida - Trecho 02	
Bairro: Malvinas	
Data/Ano: dezembro/2020	Prancha: 2/6
RUA FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA - TRECHO 02	
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²
ÁREA DA RUA - CAPA	5.696,91 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	625,94 m
LARGURA DA RUA (média)	9,10 m


03 - Planta de Situação

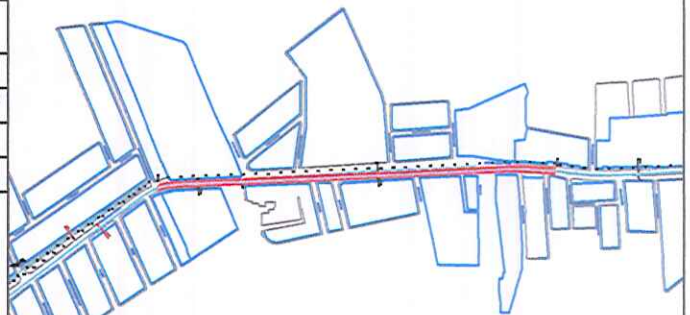

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
 Francisco de Jesus G. Xavier
 Eng. Civil - CREA-RS Nº 180.203584-2


José Benício da Silva Filho
 PNOG/SECOB - Coordenador
 de Planejamento de Obras

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
 Eng. João Neto de Oliveira
 CREA - 185987/RS-0166

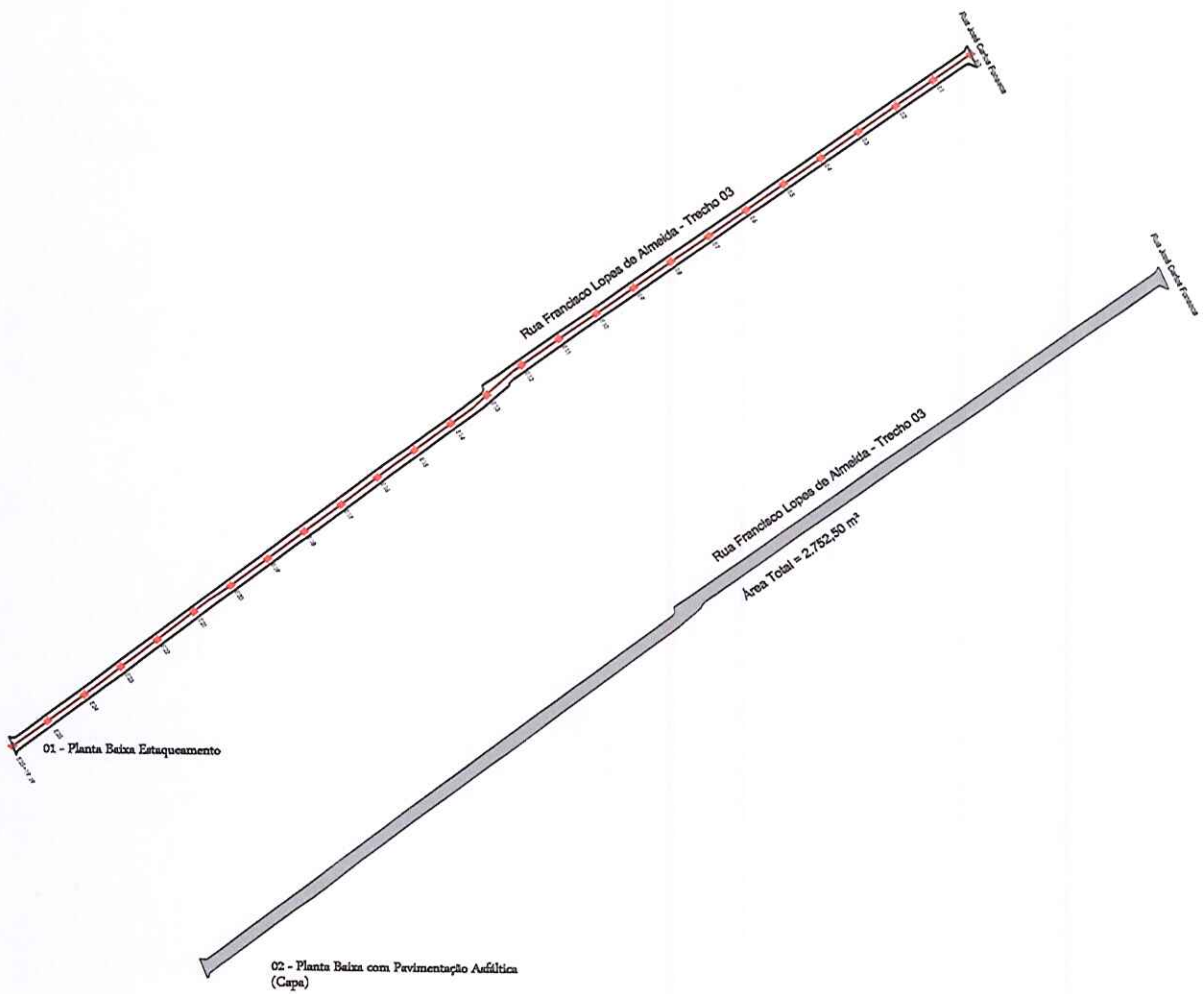

Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: Francisco Lopes de Almeida - Trecho 03	
Bairro: Malvinas	
Data/Ano: dezembro/2020	Prancha: 3/6
RUA FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA - TRECHO 03	
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²
ÁREA DA RUA - CAPA	2.752,50 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	519,19 m
LARGURA DA RUA (média)	5,30 m

03 - Planta de Situação

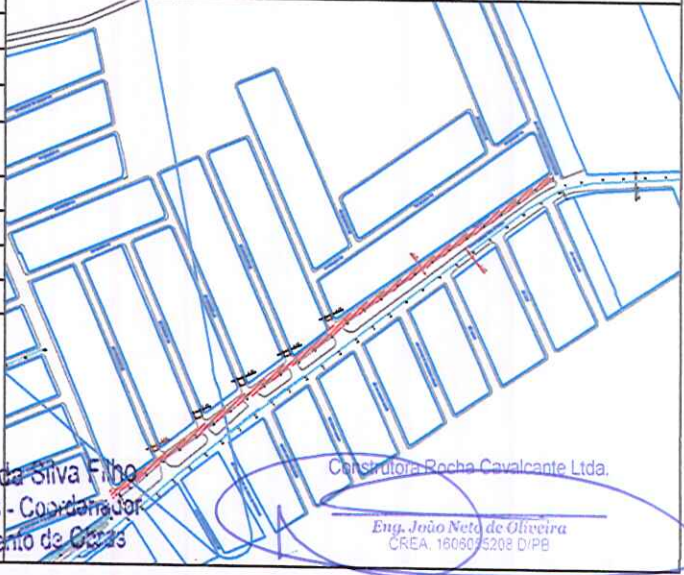


PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
 Francisco de Jesus G. Xavier
 Eng. Civil - CREA-PB Nº 150.283594-2

José Benício da Silva Filho
 PPG/SECOP - Coordenador
 de Planejamento de Obras


Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
 Eng. João Neto de Oliveira
 CREA. 1606095208 DIBP



Rua Francisco Lopes de Almeida - Trecho 04



01 - Planta Baixa Estaqueamento




Área Total = 53,87 m²

02 - Planta Baixa com Pavimentação Asfáltica (Reperfilamento e Capa)

Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: Francisco Lopes de Almeida - Trecho 04	
Bairro: Malvinas	
Data/Ano: dezembro/2020	Prancha: 4/6
RUA FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA - TRECHO 04	
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²
ÁREA DA RUA - REPERFILAMENTO E CAPA	153,87 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	29,01 m
LARGURA DA RUA (média)	5,30 m

03 - Planta de Situação

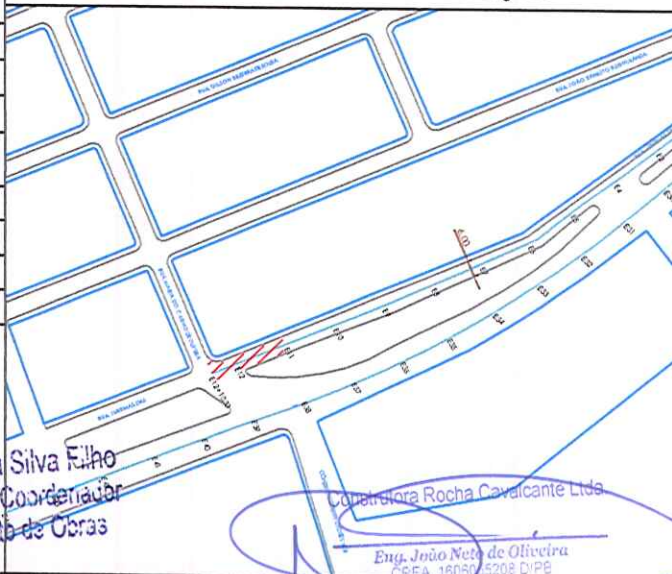


PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
Eng. Civil - CREA-PB nº 130.283504-2

José Benício da Silva Filho
PROCOSECOB - Coordenador
de Planejamento de Obras


Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng. João Neto de Oliveira
CREA 16080/5208 D/PE

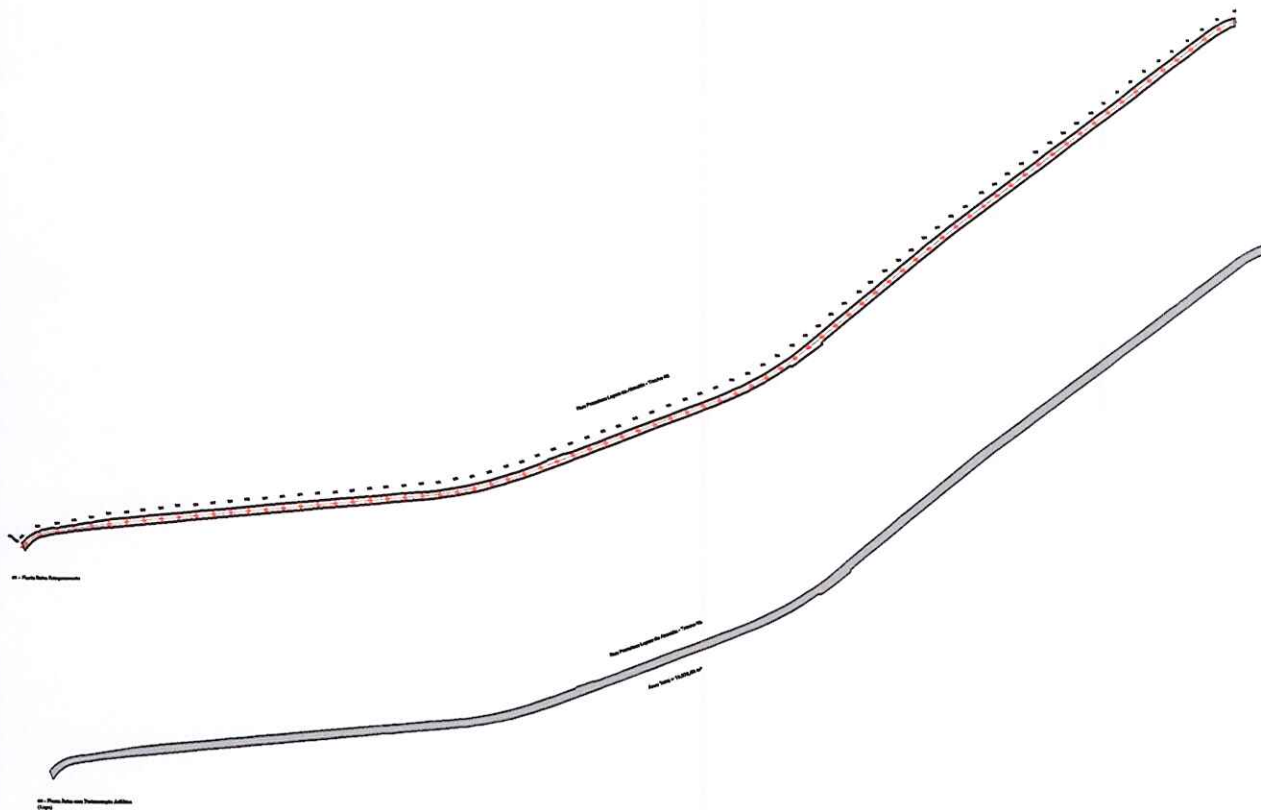

Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: Francisco Lopes de Almeida – Trecho 05	
Bairro: Malvinas	
Data/Ano: dezembro/2020	Prancha: 5/6
RUA FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA – TRECHO 05	
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²
ÁREA DA RUA – CAPA	13.976,53 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	1.565,01 m
LARGURA DA RUA (média)	8,94 m

03 – Planta de Situação

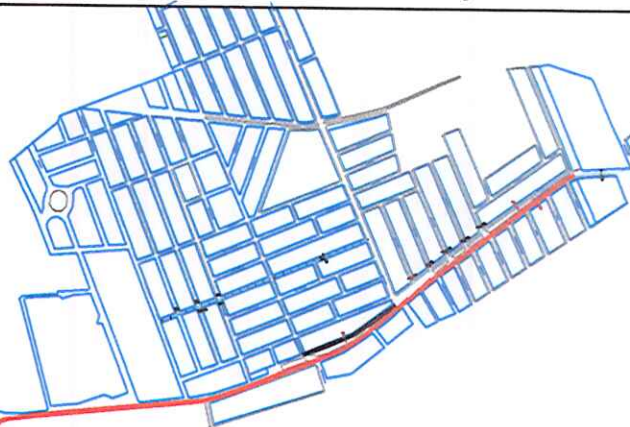



PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
 Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng. Civil - CREA/PB Nº 130.283504-2

José Benício da Silva Filho
 PMCO/SECOB - Coordenador
 de Planejamento de Obras

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.


Eng. João Neto de Oliveira
 P.E.A. 12881/2008-RN

Rua Francisco Lopes de Almeida - Trecho 06



01 - Planta Baixa Estaqueamento

Rua Francisco Lopes de Almeida - Trecho 06




Área Total = 604,05 m²

02 - Planta Baixa com Pavimentação Asfáltica (Capa)

Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: Francisco Lopes de Almeida - Trecho 06	
Bairro: Malvinas	
Data/Ano: dezembro/2020	Prancha: 6/6
RUA FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA - TRECHO 06	
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²
ÁREA DA RUA - CAPA	604,05 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	87,49 m
LARGURA DA RUA (média)	6,90 m

03 - Planta de Situação

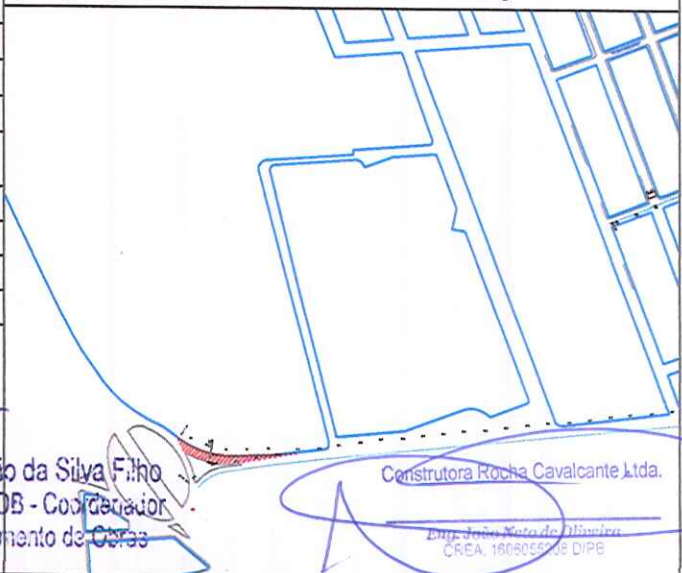

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
 Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng. Civil - CRP 130.283594-2

José Benício da Silva Filho
 FUND. CO/SECOP - Coordenador
 de Planejamento de Obras

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

Eng. João Neto de Oliveira
 CREA 18080557-2 DPE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIROS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTAÇÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCONGÓ, SANTA CRUZ, DINAMÉRICA, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCONGÓ, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTÃO, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA
CONTRATO: 2.08.022/2020
PERÍODO LÍQUIDO: 13/11/2020 À 18/12/2020

MEDIÇÃO: 06ª

FOTO 01



COORDENADAS:

RUA:

7°12'34.5"S
35°52'58.9"W

RUA BENEDITO MOTTA

FOTO 02



COORDENADAS:

RUA:

7°12'37.8"S
35°52'59.9"W

RUA BENEDITO MOTTA

FOTO 03



COORDENADAS:

RUA:

7°12'37.8"S
35°52'59.9"W

RUA BENEDITO MOTTA

FOTO 04



COORDENADAS:

RUA:

7°12'37.3"S
35°52'59.7"W

RUA BENEDITO MOTTA

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
Eng.º Civil - CREA/PB Nº 180.283504-2

José Benício da Silva Filho
FMCC/SE/OB - Coordenador
de Planejamento de Obras

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
Eng.º João Neto de Oliveira
CREA. 16060/5208/D/PE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: **CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA**

CONTRATO: **2.08.022/2020**

MEDIÇÃO: **06ª**

PERÍODO LÍQUIDO: **13/11/2020 À 18/12/2020**

FOTO 05



FOTO 06



COORDENADAS:

RUA:

7°12'50.3"S
35°53'12.4"W

RUA PROFESSOR MAURO LUNA

COORDENADAS:

RUA:


7°12'40.8"S
35°53'06.7"W

RUA PROFESSOR MAURO LUNA

FOTO 07



FOTO 08

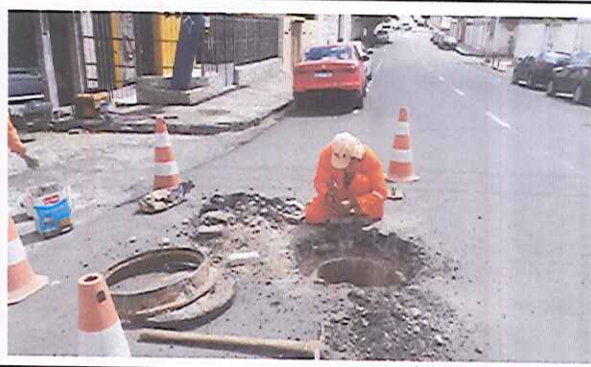

COORDENADAS:

RUA:

7°12'48.1"S
35°53'11.3"W

RUA PROFESSOR MAURO LUNA

COORDENADAS:

RUA:

7°12'49.4"S
35°53'11.8"W

RUA PROFESSOR MAURO LUNA

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng.º Civil - CREA-PB Nº 160.263564-2

José Benício da Silva Filho
 FMO/SECOB - Coordenador
 de Planejamento de Obras

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
Eng. João Neto de Oliveira
 CREA, 1606095208 D/PB



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: **CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA**
 CONTRATO: **2.08.022/2020**
 PERÍODO LÍQUIDO: **13/11/2020 À 18/12/2020**

MEDIÇÃO: **06ª**

FOTO 09



COORDENADAS:	RUA:
7°12'27.6"S 35°53'39.3"W	RUA DESEMBARGADOR AZEVEDO

FOTO 10



COORDENADAS:	RUA:
7°12'33.2"S 35°53'35.7"W	RUA DESEMBARGADOR AZEVEDO

FOTO 11



COORDENADAS:	RUA:
7°12'37.7"S 35°53'32.4"W	RUA DESEMBARGADOR AZEVEDO

FOTO 12



COORDENADAS:	RUA:
7°12'32.7"S 35°53'35.9"W	RUA DESEMBARGADOR AZEVEDO

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
 Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng.º Civil - CREA-PB Nº 130.293504-2

José Benício da Silva Filho
 FPM/CG/SECOB - Coordenador
 de Planejamento de Obras

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

Eng. João Neto de Oliveira
 CREA. 160/055202 D/PE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA
CONTRATO: 2.08.022/2020
PERÍODO LÍQUIDO: 13/11/2020 À 18/12/2020

MEDIÇÃO: 06^a

FOTO 13



COORDENADAS:	RUA:
7°13'30.6"S 35°53'54.1"W	DUQUE DE CAXIAS

FOTO 14



COORDENADAS:	RUA:
7°13'30.7"S 35°53'54.1"W	DUQUE DE CAXIAS

FOTO 15



COORDENADAS:	RUA:
7°13'32.8"S 35°53'54.7"W	DUQUE DE CAXIAS

FOTO 16



COORDENADAS:	RUA:
7°13'32.8"S 35°53'54.7"W	DUQUE DE CAXIAS

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus S. Xavier
Eng. Civil - CREA-PB Nº 130.263524-2

José Benício da Silva Filho
FMOC/SECOB - Coordenador
de Planejamento de Obras

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

Eng. João Neto de Oliveira
CREA. 160.8055209 DPB



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: **CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA**
 CONTRATO: **2.08.022/2020**
 PERÍODO LÍQUIDO: **13/11/2020 À 18/12/2020**

MEDIÇÃO: **06ª**

FOTO 17



COORDENADAS:	RUA:
7°13'28.2"S 35°53'53.5"W	DUQUE DE CAXIAS

FOTO 18



COORDENADAS:	RUA:
7°13'30.7"S 35°53'54.1"W	DUQUE DE CAXIAS

FOTO 19



COORDENADAS:	RUA:
7°14'21.1"S 35°55'03.5"W	DR. JOÃO ARLINDO CORREIA

FOTO 20



COORDENADAS:	RUA:
7°14'20.4"S 35°55'02.9"W	DR. JOÃO ARLINDO CORREIA

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng. CIVIL - CREA-PB Nº 130.263504-2

José Benício da Silva Filho
 Eng.º MECANICISTA - Coordenador
 do Planejamento de Obras

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
Eng. João Neto de Oliveira
 CREA 160605/202 DPE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: **CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA**
 CONTRATO: **2.08.022/2020**
 PERÍODO LÍQUIDO: **13/11/2020 À 18/12/2020**

MEDIÇÃO: **06ª**

FOTO 21



COORDENADAS:	RUA:
7°12'50.5"S 35°52'37.8"W	RUA MARIA VIEIRA CESAR

FOTO 22




COORDENADAS:	RUA:
7°12'50.5"S 35°52'37.8"W	RUA MARIA VIEIRA CESAR

FOTO 23



COORDENADAS:	RUA:
7°12'50.5"S 35°52'37.8"W	RUA MARIA VIEIRA CESAR

FOTO 24

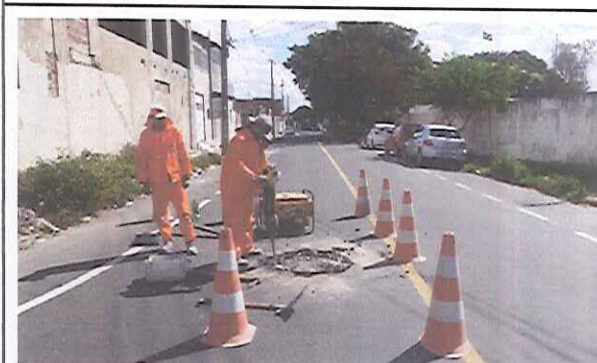

COORDENADAS:	RUA:
7°13'15.8"S 35°52'28.6"W	RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
 Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng. CIVIL - CREA-PB Nº 100.283504-2

José Benício da Silva Filho
 PMCG/SECOB - Coordenador
 de Planejamento de Obras

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

Eng. João Neto de Oliveira
 CREA. 1908055209 D/PE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: **CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA**
 CONTRATO: **2.08.022/2020**
 PERÍODO LÍQUIDO: **13/11/2020 À 18/12/2020**

MEDIÇÃO: **06ª**

FOTO 25



COORDENADAS:	RUA:
7°13'54.8"S 35°52'31.3"W	JOÃO LÉLIS

FOTO 26




COORDENADAS:	RUA:
7°13'56.3"S 35°52'33.1"W	JOÃO LÉLIS

FOTO 27



COORDENADAS:	RUA:
7°13'51.9"S 35°52'27.7"W	JOÃO LÉLIS

FOTO 28

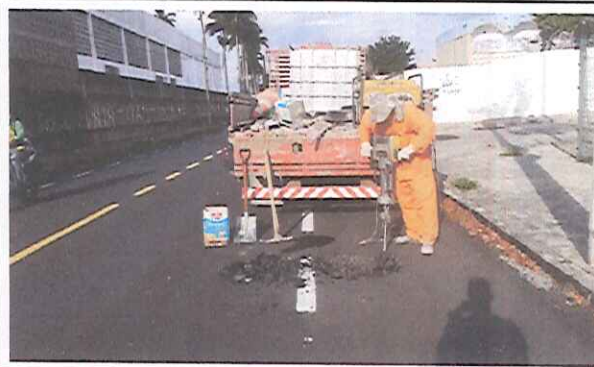

COORDENADAS:	RUA:
7°13'51.0"S 35°52'26.6"W	JOÃO LÉLIS

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
 Francisco de Jesus S. Xavier
 Eng. Civil - CREA-PB Nº 100.283504-2

José Benício da Silva Filho
 FMCG/SECOB - Coordenador
 de Planejamento de Obras

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

Eng. João Neto de Oliveira
 CREA 162.255202 D/PB



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA
CONTRATO: 2.08.022/2020
PERÍODO LÍQUIDO: 13/11/2020 À 18/12/2020

MEDIÇÃO: 06ª

FOTO 29



FOTO 30




COORDENADAS:	RUA:
7°13'17.7"S 35°52'28.9"W	RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ

COORDENADAS:	RUA:
7°13'22.1"S 35°52'29.4"W	RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ

FOTO 31



FOTO 32

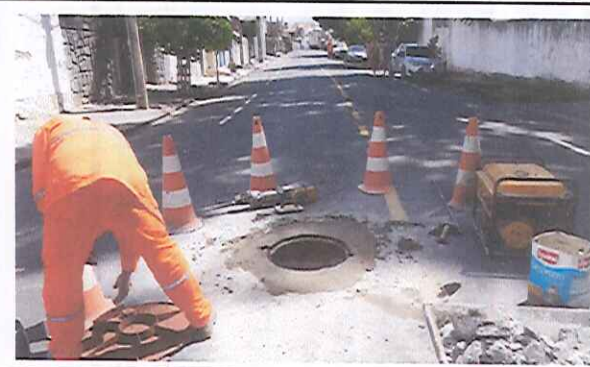

COORDENADAS:	RUA:
7°13'26.3"S 35°52'29.6"W	RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ

COORDENADAS:	RUA:
7°13'20.2"S 35°52'29.3"W	RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
Eng. Civil - CREA-PB Nº 130.283504-2

José Benício da Silva Filho
FMOC/SECOB - Coordenador
de Planejamento de Obras

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

Eng. João Neto de Oliveira
CREA. 16050/5208 D/PB



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA

CONTRATO: 2.08.022/2020

MEDIÇÃO: 06ª

PERÍODO LÍQUIDO: 13/11/2020 À 18/12/2020

FOTO 33



FOTO 34



COORDENADAS:	RUA:
7°13'24.3"S 35°52'29.8"W	RUA JOANA D'ARC DE ARRUDA

COORDENADAS:	RUA:
7°13'24.3"S 35°52'29.8"W	RUA JOANA D'ARC DE ARRUDA

FOTO 35



FOTO 36



COORDENADAS:	RUA:
7°13'23.5"S 35°52'26.0"W	RUA JOANA D'ARC DE ARRUDA

COORDENADAS:	RUA:
7°13'24.1"S 35°52'28.1"W	RUA JOANA D'ARC DE ARRUDA

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE

Francisco de Jesus C. Xavier
Eng. Civil - CREA-PB Nº 160.283504-2

José Benício da Silva Filho
FACCO/SECOB - Coordenador
do Planejamento de Obras

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

Eng. João Neto de Oliveira
CREA. 160605/208 D/PB



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: **CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA**
 CONTRATO: **2.08.022/2020**
 PERÍODO LÍQUIDO: **13/11/2020 À 18/12/2020**

MEDIÇÃO: **06ª**

FOTO 37



COORDENADAS:	RUA:
7°13'27.1"S 35°52'36.0"W	RUA ALFREDO GODOFREDO DE SANTANA

FOTO 38




COORDENADAS:	RUA:
7°13'27.2"S 35°52'36.0"W	RUA ALFREDO GODOFREDO DE SANTANA

FOTO 39



COORDENADAS:	RUA:
7°13'27.2"S 35°52'35.9"W	RUA ALFREDO GODOFREDO DE SANTANA

FOTO 40

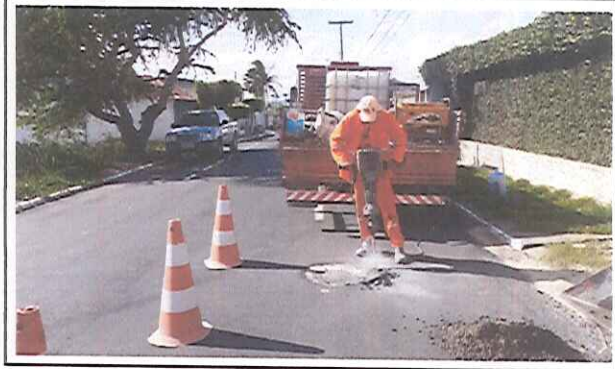

COORDENADAS:	RUA:
7°13'55.0"S 35°51'51.6"W	RUA DJALMA MIGUEL DE MORAIS

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
 Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng.º Civil - CREA-PB 1º 1409,2835/04-2

José Benício da Silva Filho
 FNUC/SECOP - Coordenador
 de Planejamento de Obras

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

Eng. João Neto de Oliveira
 CREA 16080/5208 D/PR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA
CONTRATO: 2.08.022/2020
PERÍODO LÍQUIDO: 13/11/2020 À 18/12/2020

MEDIÇÃO: 06ª

FOTO 41



COORDENADAS:	RUA:
7°13'57.4"S 35°51'49.5"W	RUA DJALMA MIGUEL DE MORAIS

FOTO 42



COORDENADAS:	RUA:
7°13'52.4"S 35°51'53.6"W	RUA DJALMA MIGUEL DE MORAIS

FOTO 43



COORDENADAS:	RUA:
7°13'52.4"S 35°51'53.6"W	RUA DJALMA MIGUEL DE MORAIS

FOTO 44



COORDENADAS:	RUA:
7°13'51.8"S 35°51'54.1"W	RUA DJALMA MIGUEL DE MORAIS

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
Eng.º Civil - CREA-PB Nº 139.253524-2

José Benício da Silva Filho
FMCC/SECOB - Coordenador
de Planejamento de Obras

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
Eng. João Neto de Oliveira
CREA 16080552/8 D/PB



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA
CONTRATO: 2.08.022/2020
PERÍODO LÍQUIDO: 13/11/2020 À 18/12/2020

MEDIÇÃO: 06ª

FOTO 45




COORDENADAS:	RUA:
7°15'00.9"S 35°55'31.2"W	FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA

FOTO 46



COORDENADAS:	RUA:
7°15'02.0"S 35°55'33.8"W	FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA

FOTO 47

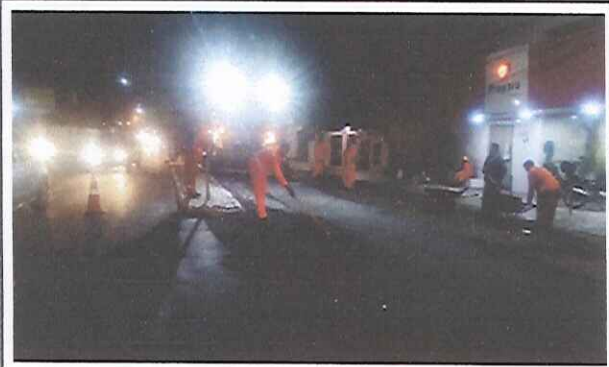

COORDENADAS:	RUA:
7°14'47.4"S 35°54'48.4"W	FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA

FOTO 48



COORDENADAS:	RUA:
7°14'47.3"S 35°54'50.7"W	FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
Eng.º Civil - CREA-PB Nº 130.283524-2

José Benício da Silva Filho
FMUG/SECOB - Coordenador
de Planejamento de Obras

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

Eng. João Neto de Oliveira
CREA: 16080552/3-PB



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: **CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA**
 CONTRATO: **2.08.022/2020**
 PERÍODO LÍQUIDO: **13/11/2020 À 18/12/2020**

MEDIÇÃO: **06ª**

FOTO 49



FOTO 50



COORDENADAS:	RUA:
7°12'41.8"S 35°54'01.8"W	ANTONIETA CAVALCANTE

COORDENADAS:	RUA:
7°12'41.0"S 35°54'03.5"W	ANTONIETA CAVALCANTE

FOTO 51



FOTO 52



COORDENADAS:	RUA:
7°12'38.3"S 35°54'09.6"W	ANTONIETA CAVALCANTE

COORDENADAS:	RUA:
7°12'39.5"S 35°54'07.2"W	ANTONIETA CAVALCANTE

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
 Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng. Civ. - CREA-PB nº 130.283524-2

José Benício da Silva Filho
 FNUCC/SECOB - Coordenador
 de Planejamento de Obras

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
 Eng. João Neto de Oliveira
 CREA 1608015208 D/PB
