

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BIM	Valor Total (R\$)	Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período	Física Acum.
-------	-----------------	------------------------------	----------	------------	-------	-----------------------------	-----------	-------------------	------------------------	------------	---------------------------	--------------

Observações:

Local: CAMPINA GRANDE-PB

[Handwritten Signature]

Responsável Técnico

Nome: FRANCISCO DE JESUS C. XAVIER
Cargo: RESPONSÁVEL TÉCNICO
ART/IRRT Fiscal: PB20180221411

Responsável Social

Nome:
Cargo:

Data: 09 de abril de 2021

[Handwritten Signature]

Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: FERNANDA RIBEIRO BARBOZA
Cargo: SECRETÁRIA DE OBRAS


Responsável Financeiro

Nome:
Cargo:

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
[Handwritten Signature]
Francisco de Jesus C. Xavier
Engº Civil - CREA-PB Nº 160.283504-2

[Handwritten Signature]
Adriano Gomes do Nascimento
Coordenador de Planejamento Obras
SECOB/PMCG

[Handwritten Signature]
Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
Eng. João Victor Oliveira
CREA 100005200-DPB



Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

CNPJ: 09.323.098/0001-92 -Insc. Estadual:16.056.310-0

Rua Álvaro de Araújo Pereira, N° 255 – Jardim Tavares – CEP: 58.402-300 – Campina Grande – PB

Fone: (83) 3341-1471

Fax: (83) 3322-6933

CREA: 821 – 16ª

À

Prefeitura Municipal de Campina Grande – PB

A/C: Eng. (a).Fernanda Ribeiro Barboza – Secretária Municipal de Obras

Ref.: 09ª Medição da obra de recapeamento asfáltico nos bairros Centro, Bela Vista, Alto Branco, Conceição, Estação Velha, Palmeira, Prata, Bodocongó, Santa Cruz, Dinamérica, Catolé, Centenário, Cruzeiro, Jardim Tavares, Jeremias, José Pinheiro, Mirante, Novo Bodocongó, Santo Antônio, São José, Serrotão, Malvinas, Monte Santo e Universitário, no município de Campina Grande, estado da Paraíba.

Assunto: Solicitação de Análise Técnica da medição de serviços nº 09

Senhora Secretária,

Encaminhamos, em anexo, o **Boletim da Medição de Serviços nº 09 – Revisado e demais elementos técnicos integrantes**, relativo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 2.08.022/2020, referente ao período de 04 de março/2021 a 07 de abril/2021, para aprovação da fiscalização da obra e providencias cabíveis no tocante à liberação dos recursos.

Campina Grande, 09 de abril de 2021.

Atenciosamente,

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
Eng. João Neto de Oliveira
CREA 1606055208 D/PB



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIROS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTAÇÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCONGÓ, SANTA CRUZ, DINAMÉRICA, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCONGÓ, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTÃO, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA

09ª MEDIÇÃO

CONTRATO 2.08.022/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIRROS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTAÇÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCONGÓ, SANTA CRUZ, DINAMÉRICA, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCONGÓ, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTÃO, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA

FÍSICO-FINANCEIRO

		RM - número 9		RM - Data recebida 09/04/2021		RM - Período de referência da medição de 04/03/2021 a 07/04/2021		Grau de Sigilo Data do CT			
RM - Descrição Empreisa Contratada CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA		Objeto do CTT (resumido) RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIRROS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTAÇÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCONGO, SANTA CRUZ, DIMAMÉRICA, CATOLÉ, CENTENÁRIO, GUAZUPIRÁ, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ FERREIRO, MIRANTE, NOVO BODOCONGO, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROÃO, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA		CPF 09.323.099/0001-92		Nº do CT 1.065.660-37		Tomador/Obj. Promotor ou Titular PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE		Data do CT 01/07/20	
Valor total inicial (R\$) 18.225.646,43		Valor atual (R\$) 18.225.646,43		Local de obra (bairro/município/UF) PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO		Fonte de Recursos outra (descrever)		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBRAMENTO	PREÇO NO COTAMENTO			EXECUÇÃO FÍSICA QUANTITATIVA			EXECUÇÃO FÍSICA PREVISÃO			DESVIO (%)
		USO	QTD	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MÉDIA NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	MÉDIA NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	
1.0	RUA ÍNDIOS CARRIS	m²	1.465,20	0,33	273.489,56						
2.0	RUA IREMAR VILARIM	m²	1.465,20	0,33	82.917,71						
2.1	SERVÇOS PRELIMINARES				483,52						
2.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e gride				483,52			1.320,86	74.077,91	435,88	74.077,91
2.2	SERVÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				82.318,96						
2.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	1.358,64	2,36	3.106,39			1.215,31	435,88	435,88	9,85
2.2.2	CBUQ							1.215,31	79.642,03	2.864,13	10,55
2.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m²	67,93	1.147,56	77.553,75			60,77	69.737,22		10,54
2.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	67,93	3,87	262,89			60,77	235,18		10,54
2.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	821,95	1,09	895,93			736,32	801,50		10,54
2.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	1,00	115,23	115,23						
2.3.1	Nivelamento de Tambo de Poço de Visita				115,23						
3.0	RUA FELIX ARAUJO				168.987,64						
4.0	RUA MIGUEL BARRETO				37.696,80						
5.0	RUA TECOZOSO DE OLIVEIRA LEO				43.369,83						
6.0	RUA FREI CANECA				158.074,51						
7.0	RUA MAIOR JOVINO DO O				126.136,81						
7.1	SERVÇOS PRELIMINARES				747,85						
7.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e gride				747,85			2.266,20	747,85	747,85	
7.2	SERVÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				124.928,04						
7.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	2.064,76	2,36	4.872,83			2.035,55	106.590,36	747,85	
7.2.2	CBUQ							2.035,55	108.590,36	4.803,90	1,41
7.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m²	103,24	1.147,56	118.474,09			87,53	100.445,93		15,22
7.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	103,24	3,87	399,34			87,53	338,74		15,22
7.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.084,02	1,09	1.181,58			919,07	1.001,79		15,22
7.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	4,00	115,23	460,92			3,00	345,69		
7.3.1	Nivelamento de Tambo de Poço de Visita				460,92				345,69		
8.0	RUA VIGOLVINO WANDERLEY				258.870,62						
8.1	SERVÇOS PRELIMINARES				1.311,40						
8.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e gride				1.311,40			4.580,00	1.511,40	1.511,40	
8.2	SERVÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				256.667,84						
8.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	4.580,00	0,33	1.511,40			3,00	251.266,02	1.511,40	
					10.000,74			4.237,60	251.266,02	10.000,74	
					10.000,74			4.237,60	251.266,02	10.000,74	

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
FRANCISCO DE JESUS C. XAVIER
 E-mail: Civil - CREA-PB Nº 160.283534-2

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SECOP/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
 Rua...



№ do CTE (Contrato de Execução/Implementação)

2.08.02/2020

Banco

29/06/2020

Previsão término da obra

26/07/2021

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

18.225.646.43

Valor atual (R\$)

18.225.646.43

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

CTE - nº de estadia

Grav de Sijlo	01/07/20
№ de C	1.065.660-37
Formação/Ag Promotor ou Tomador	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
Agente Financeiro ou Ag. Operador Financeiro	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Fonte de Recursos	outra (descrever)

BM - Data emissão	09/04/2021
BM - Período de referência da medição	de 04/03/2021 a 07/04/2021
CPN	09.323.098/0001-92

Empresa Contratada	CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA
Objeto do CTE (resumido)	RECAPAMENTO ASFÁLTICO NOS BARRIOS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTACÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCONGÓ, SANTA CRUZ, DINÂMICA, COTOLÉ, CENTENÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCONGÓ, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SEBROTHO, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA
Local da obra (bairro/Município/UF)	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	UNID.	QTD.	PREÇO UNID.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR + PREÇO DO PERÍODO	MÉDIA DO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	DESEJO (%)
8.2.2	CBUQ									
8.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	211,88	1.147,56	243.145,01	207,24	207,24	237.820,33	237.820,33	2,19
8.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	211,88	3,87	819,98	207,24	207,24	802,02	802,02	2,19
8.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	2.475,00	1,09	2.702,11	2.424,71	2.424,71	2.642,93	2.642,93	2,19
8.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	6,00	115,23	691,38	691,38	691,38			100,00
8.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita									
9.0	RUA ALEXANDRINO CAVALCANTE				19.772,34		19.772,34	19.657,11	19.657,11	
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				126,97		126,97	126,97	126,97	
9.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	384,75	0,33	126,97	384,75	384,75	126,97	126,97	
9.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				19.530,14		19.530,14	19.530,14	19.530,14	
9.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	323,19	2,36	762,73	323,19	323,19	762,73	762,73	
9.2.2	CBUQ									
9.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	16,16	1.147,56	18.544,57	16,16	16,16	18.344,57	18.344,57	
9.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m²	16,16	3,87	62,54	16,16	16,16	62,54	62,54	
9.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m² x km	147,06	1,09	160,30	147,06	147,06	160,30	160,30	
9.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	1,00	115,23	115,23					100,00
9.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita									
10.0	RUA JOÃO ALVES DE OLIVEIRA				216.876,68		216.876,68	215.011,06	215.011,06	
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.272,48		1.272,48	1.272,48	1.272,48	
10.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m³	3.856,00	0,33	1.272,48	3.856,00	3.856,00	1.272,48	1.272,48	
10.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				214.797,59		214.797,59	213.738,58	213.738,58	
10.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	3.547,52	2,36	8.372,15	3.547,52	3.547,52	8.372,15	8.372,15	
10.2.2	CBUQ									
10.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	177,38	1.147,56	203.554,19	176,47	176,47	202.509,91	202.509,91	0,51
10.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	177,38	3,87	686,46	176,47	176,47	682,94	682,94	0,51
10.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	2.004,39	1,09	2.184,79	1.994,11	1.994,11	2.173,58	2.173,58	0,51
10.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	7,00	115,23	806,61					100,00
10.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita									
11.0	RUA CRISTIANO LAURITZEN				70.564,25		70.564,25	61.334,18	61.334,18	
11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				412,48		412,48	374,88	374,88	

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
 Eng.º Civil - CREA-PB Nº 160.283334-2

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento e Obras
 SECOP/PMCC

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

CAIXA
 Nº do CTE (Contrato Execução/Financiamento): 2.08.022/2020
 Grau de Sigilo: _____
 Data do CT: 01/07/20

Item: 9
 Data emissão: 09/04/2021
 Nº do CT: 1.055.660-37
 Data do CT: 01/07/20

Empresa Contratada: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA
 CNPJ: 09.323.098/0001-92
 Endereço: Rua Primavera ou Tomador Agente Financeiro ou Ag. Operador Financeiro
 Município: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

Objeto do CTE (requisito): RECAPAMENTO ASFÁLTICO NOS BARRIOS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTAÇÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCONGÓ, SANTA CRUZ, DINAMÉRICA, CATOLÉ, CENTEÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCONGÓ, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTIÃO, MALVINAS, MORTE SAO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA

Valor total (R\$): 18.225.646,43
 Fonte de Recursos: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL


Valor atual (R\$): 18.225.646,43
 Fonte de Recursos: outra (descrever): _____

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBRAS	REQUISITO DO ORÇAMENTO			EXECUTIVO FÍSICO QUANTITATIVO			EXECUTIVO FINANCEIRO (R\$)			DEBITO (N)
		UNID.	QTD	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	PREÇO UNIT.	PERÍODO	ACUMULADO INCLUSIVE PERÍODO	PREÇO UNIT.	
11.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	1.260,00	0,33	422,40		1.136,00	1.136,00	374,88	374,88	11,25
11.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				69.681,49		60.959,30	60.959,30	60.959,30	60.959,30	11,25
11.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	1.152,00	2,36	2.710,72		1.007,84	1.007,84	2.378,50	2.378,50	12,51
11.2.2	CBUQ				66.099,46		50,39	50,39	57.825,55	57.825,55	12,52
11.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	57,60	1.147,56	66.099,46		50,39	50,39	57.825,55	57.825,55	12,52
11.2.2.2	10 m³ de descarga em vibro-acabadora	m³	57,60	3,87	223,91		50,39	50,39	195,01	195,01	12,52
11.2.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	587,52	1,09	640,40		513,98	513,98	560,24	560,24	12,52
11.3.1	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	4,00	115,23	460,92						
12.0	RUA PREGRINO DE CARVALHO				460,92						
12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				213.681,01				212.338,61	212.338,61	
12.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	3.638,05	0,33	1.266,56		3.826,19	3.826,19	1.263,63	1.263,63	0,23
12.1.2	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	3.496,89	2,36	8.252,86		3.487,95	3.487,95	8.231,56	8.231,56	0,26
12.2	CBUQ				200.639,39		174,40	174,40	200.134,46	200.134,46	0,25
12.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	174,84	1.147,56	200.639,39		174,40	174,40	674,93	674,93	0,25
12.2.2	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	174,84	3,87	676,83		174,40	174,40	674,93	674,93	0,25
12.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.870,79	1,09	2.039,16		1.866,08	1.866,08	2.034,03	2.034,03	0,25
12.3.1	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	7,00	115,23	806,61						
13.0	RUA BENTO VIANA				806,61						
13.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				46.431,55				40.689,59	40.689,59	
13.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	273,08	0,33	91,12		273,08	273,08	273,08	273,08	
13.1.2	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	827,50	2,36	1.965,67		827,50	827,50	273,08	273,08	
13.2	CBUQ				46.043,24		761,30	761,30	40.416,51	40.416,51	
13.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	36,06	1.147,56	41.366,13		33,22	33,22	38.121,94	38.121,94	12,72
13.2.2	10 m³ de descarga em vibro-acabadora	m³	36,06	3,87	147,29		33,22	33,22	128,56	128,56	12,72
13.2.2.1	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	348,21	1,09	380,44		338,84	338,84	369,34	369,34	12,72
13.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	115,23		115,23						

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
 Eng.º Cui. - CREA-PB nº 160.283534-2
 Eng.º Cui. - CREA-PB nº 160.283534-2
 Eng.º Cui. - CREA-PB nº 160.283534-2

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento-Obras
 SECOB/PMCG

Const. Rocha Cavalcante Ltda
 Eng.º Cui. - CREA-PB nº 160.283534-2

		BM - número 9		BM - Data emissão 09/04/2021		BM - Período de referência da medição de 04/03/2021 a 07/04/2021		UF do CT 01/07/20	
UF do CITEI (Contrato Especial/Fornecimento) 2.08.02/2020		Empresa Contratada CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA (Objeto do CITEI resumido)		CPF do CITEI (resumido)		CPF do CITEI (resumido)		UF do CT 01/07/20	
Início da obra - data 29/06/2020		Previsão término da obra 26/07/2021		CPF de assinatura		CPF de assinatura		UF do CT 01/07/20	
Valor total anual (R\$)		Valor total anual (R\$)		Valor atual (R\$)		Valor atual (R\$)		UF do CT 01/07/20	
18.225.646,43		18.225.646,43		18.225.646,43		18.225.646,43		UF do CT 01/07/20	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PREÇO NO ORÇAMENTO			DESCRIÇÃO ITEM QUANTITATIVOS			DESCRIÇÃO ITEM PREÇOS			TOTAL
		UNID.	CITEN	PREÇO UNIT.	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	
13.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	1,00	115,23	115,23						115,23
14.0	RUA CEL. JOÃO LOURENÇO PORTO				168.546,24						168.546,24
15.0	RUA PEDRO AMÉRICO				37.240,04						37.240,04
15.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				227,30						227,30
15.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	688,80	0,33	227,30	688,80					227,30
15.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				36.897,51						36.897,51
15.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	610,08	2,36	1.439,79	610,08					1.439,79
15.2.2	CBUQ				25,63						25,63
15.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	30,50	1.147,56	35.000,58	25,63					29.411,96
15.2.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³	30,50	3,87	118,04	25,63					99,19
15.2.4	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	m³ x km	311,10	1,09	339,10	261,43					261,43
15.3	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	1,00	115,23	115,23						115,23
15.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita				207.174,99						207.174,99
16.0	RUA DEP. ALVARO GAUDÊNCIO				1.245,02						1.245,02
16.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.245,02						1.245,02
16.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	3.772,80	0,33	1.245,02	3.694,67					1.245,02
16.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				205.353,82						205.353,82
16.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	3.395,52	1,36	8.013,43	3.288,10					7.759,92
16.2.2	CBUQ				145,73						145,73
16.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	169,78	1.147,56	194.832,74	145,73					194.832,74
16.2.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³	169,78	3,87	657,05	145,73					563,98
16.2.4	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	m³ x km	1.697,00	1,09	1.850,60	1.457,30					1.457,30
16.3	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	5,00	115,23	576,15						576,15
16.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita				371.896,94						371.896,94
17.0	RUA VILA NOVA DA RAINHA				2.014,89						2.014,89
17.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.014,89						2.014,89
17.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	6.105,72	0,33	2.014,89	5.867,35					1.936,23
17.1.1	Serviços de pavimentação				669.190,61						669.190,61
17.1.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	6.105,72	2,36	14.409,54	5.435,62					12.946,06
17.1.2	CBUQ				5,485,62						5,485,62

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng. Civil - CREA-PB Nº 60.283534-2

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 CREA/PB/MCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
 Eng. João Neto de Oliveira
 CREA 163458-0/010



BR de CTEC (Contrato Terceirizado/Transmissão)
 2.08.022/2020
Início da obra - data 29/06/2020 **Prestado Termino da obra** 26/07/2021
CTE - # assinatura
 Valor total fiscal (R\$) 18.225.646,43
CTE - # último Adit.
 Valor atual (R\$) 18.225.646,43

RM - número 9
Empresa Contratada CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA
Objeto do CTE (resumido)

RM - número 9
Data emissão 09/04/2021
RM - período de referência da medição de 09/03/2021 a 07/04/2021
RM - nº de CT 1.065.660-37
Data do CT 01/07/20
Tornados/Ag. Promotor ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
Agente Fiscalizador ou Ag. Operador Agente Fiscalizador ou Ag. Operador Inopasse

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS BARRIOS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTAÇÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCINGÓ, SANTA CRUZ, DINÂMICA, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ FERREIRO, MIRANTE, NOVO BODOCINGÓ, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTIÃO, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Fonte de Recursos outro (diferente)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PREVISTO NO ORÇAMENTO				EXECUTADO FISCAL QUANTITATIVAMENTE				EXECUTADO FINANCEIRO		DEPÓSITO IN
		UNID.	QTDZ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ALIMENTADO até o último mês anterior	MESES DO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MÉDIO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	
17.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Carga	m²	305,29	1.147,56	350.336,59	225,37		225,37	258.625,60		258.625,60	26,18
17.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	305,29	3,87	1.181,47	225,37		225,37	872,18		872,18	26,18
17.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	2.991,84	1,09	3.261,11	2.208,63		2.208,63	2.407,41		2.407,41	26,18
17.3.1	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	6,00	115,23	691,38	691,38		691,38				100,00
18.0	RUA PADRE BIAPINA				45.042,32							
19.0	RUA ELIAS ASTORA				191.856,38							
19.1	SERVÇOS PRELIMINARES				929,41				185.336,57		185.336,57	
19.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	2.801,25	0,33	924,41	2.706,63		2.706,63	893,19		893,19	3,38
19.2	SERVÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				190.451,05				183.984,46		183.984,46	
19.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	5.104,50	2,36	12.046,62	4.931,32		4.931,32	11.037,92		11.037,92	3,39
19.2.2	CBUQ											
19.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	76,57	1.207,08	92.426,12	73,97		73,97	89.287,71		89.287,71	3,40
19.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperfilamento	m²	76,57	1.093,55	83.733,12	73,97		73,97	80.869,89		80.869,89	3,40
19.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	153,14	3,87	591,65	147,94		147,94	572,53		572,53	3,39
19.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.516,09	1,09	1.651,54	1.464,60		1.464,60	1.596,41		1.596,41	3,40
19.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	4,00	115,23	460,92	460,92		460,92	460,92		460,92	
19.3.1	Nivelamento de Tambo de Poço de Visita				460,92	4,00		4,00	460,92		460,92	
20.0	RUA BARÃO DO ABÍÁ				234.608,87				209.470,58		209.470,58	
20.1	SERVÇOS PRELIMINARES				1.365,80				1.293,83		1.293,83	
20.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	4.136,80	0,33	1.365,80	3.920,71		3.920,71	1.293,83		1.293,83	5,27
20.2	SERVÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				233.666,92				208.176,75		208.176,75	
20.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	3.844,88	2,36	9.073,92	3.600,40		3.600,40	8.496,94		8.496,94	6,36
20.2.2	CBUQ											
20.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	192,24	1.147,56	220.006,93	171,68		171,68	197.013,10		197.013,10	10,69
20.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	192,24	3,87	743,97	171,68		171,68	664,40		664,40	10,70
20.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	2.056,97	1,09	2.242,10	1.836,98		1.836,98	2.002,31		2.002,31	10,69
20.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	5,00	115,23	576,15	576,15		576,15				
20.3.1	Nivelamento de Tambo de Poço de Visita				576,15							

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco dos Jesus C. Xavier
 Eng. Civil - CREA-PB Nº 160.283534-2

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
SECOB/PMCC

Coordenadora Rocha Cavalcante Lida
 CREA - 100552326-0/2019



Nº do CTE (Contrato Execução/Financiamento)
2.08.022/2020

Início da obra - data
29/06/2020

Previsão Término da obra
26/07/2021

CTE - Valor total inicial (R\$)
18.225.646,43

CTE - Valor atual (R\$)
18.225.646,43

RM - Número
9

Empresa Contratada
CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA

Objeto do CTE (resumido)
RECAPAMENTO ASFÁLTICO NOS BARRIOS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTACÇÃO VILHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCONGÓ, SANTA CRUZ, DINAMÉRICA, COTOLE, CENTEÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCONGÓ, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERRIÃO, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA

RM - Data emissão
09/04/2021

RM - Pedido de referência de medição de
04/03/2021 a 07/04/2021

Nº do CT
1.065.660-37

Data do CT
01/07/20

Tomador/Ag. Promotor ou Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

Agente Financeiro ou Ag. Operador Passivo
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Fonte de Recursos
outra (descrever)

Local da obra (Bairro/Município/UF)
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO DO EMPREGO	PREÇO NO DOCUMENTO			PREÇO DE PREÇO QUANTITATIVO			DESCRIÇÃO FINANCEIRO (R\$)		
		UNID.	QTDTE	PREÇO UNIT.	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MÉDIO DO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	MÉDIO DO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PERÍODO (R\$)
21.0	RUA JOSÉ BONIFÁCIO									
21.1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
21.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	1.338,05	0,33	441,56	1.338,05	441,56	441,56	441,56	68.147,04
21.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO									
21.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	1.185,13	2,36	2.796,91	1.185,13	2.796,91	2.796,91	2.796,91	67.475,02
21.2.2	CBUQ									2.796,91
21.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m³	59,26	1.147,56	68.004,41	55,64	55,64	55,64	55,64	63.850,24
21.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-ascubadora	m³	59,26	3,87	229,34	55,64	55,64	55,64	55,64	215,33
21.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	598,53	1,09	652,40	561,96	561,96	561,96	561,96	612,54
21.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA									
21.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	2,00	115,23	230,46	2,00	2,00	2,00	2,00	230,46
22.0	RUA JOÃO TAVARES									
22.1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
22.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	4.278,78	0,33	1.412,00	3.323,04	1.412,00	1.412,00	1.412,00	147.870,73
22.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO									
22.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	3.947,34	2,36	9.315,72	2.990,92	2.990,92	2.990,92	2.990,92	1.096,60
22.2.2	CBUQ									1.096,60
22.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m³	197,37	1.147,56	226.493,92	119,64	119,64	119,64	119,64	137.294,09
22.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-ascubadora	m³	197,37	3,87	763,82	119,64	119,64	119,64	119,64	463,01
22.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	2.090,12	1,09	2.280,41	1.288,18	1.288,18	1.288,18	1.288,18	1.362,32
22.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA									
22.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita	unidade	8,00	115,23	921,84	5,00	5,00	5,00	5,00	576,15
23.0	RUA CORONEL JOSÉ ANDRÉ									
23.1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
23.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	2.134,00	0,33	704,22	2.134,00	704,22	704,22	704,22	146.771,63
23.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO									
23.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	4.012,96	1,36	9.670,59	4.012,96	4.012,96	4.012,96	4.012,96	146.067,41
23.2.2	CBUQ									9.670,59
23.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m³	60,20	1.207,00	72.656,22	58,61	58,61	58,61	58,61	70.746,96

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE -
Eng.º Civil - CREA-PB Nº 160.29353-2

Adriano Gomes do Nascimento
Coordenador de Planejamento Obras
SECOB/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
CREA: 190306539-0/PB


CAIXA		Grau de Sigilo	
Nº do CITE (Contrato Execução/Transmissão) 2.08.022/2020 Início: 29/06/2020 CITE: 26/07/2021 Valor total inicial (R\$): 18.225.646,43	Nº do CITE 1.085.660-37 Tomador/Ag. Promotor ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Agente Financeiro ou Ag. Operador Financeiro CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Data emissão 09/04/2021 Data do CITE 01/07/20	Período de referência da medição de 04/03/2021 a 07/04/2021 CNPJ 09.323.098/0001-92
Empresa Contratada CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA Objeto do CITE (revisado) RECAMBAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIROS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTAÇÃO VEIHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCONGO, SANTA CRUZ, DINAMÉRIA, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCONGO, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTAÓ, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA		Fonte de Recursos outra (descrever)	
Local de obra (bairro/Município/UF) PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO			

ITEM	QTD	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	DEBITADO PERÍODO ANTERIOR		DEBITADO PERÍODO ATUAL		DEBITADO PERÍODO ANTERIOR	DEBITADO PERÍODO ATUAL	DEBITADO PERÍODO ANTERIOR	DEBITADO PERÍODO ATUAL
				REQUERIDO NO EMPENHO	RECEBIDO NO PERÍODO	REQUERIDO NO PERÍODO	RECEBIDO NO PERÍODO				
FÍSICO - FINANCIADO											
0 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DO EMPENHO											
23.2.2.2	m³	60,20	65.631,71	58,61	58,61	58,61	58,61	64.092,97	64.092,97	2,64	2,64
Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exlusive transporte. AF_03/2017. - Reperfilamento											
23.2.3	m³	120,39	465,91	117,22	117,22	117,22	117,22	453,64	453,64	2,63	2,63
Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora											
23.2.4	m³ x km	1.227,98	1.338,50	1.195,64	1.195,64	1.195,64	1.195,64	1.303,25	1.303,25	2,63	2,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana											
23.3	unidade	3,00	345,69	345,69	345,69	345,69	345,69			100,00	100,00
Nivelamento de Tampão de Poço de Visita											
24.0	m²	1.043,66	175.904,31	1.043,66	1.043,66	1.043,66	1.043,66	53.716,93	53.716,93		
RUA MANOEL PEREIRA DE ARAÚJO											
24.1	m²	0,33	1.043,66	980,50	980,50	980,50	980,50	323,57	323,57		
SERVIÇOS PRELIMINARES											
24.1.1	m²	0,33	1.043,66	980,50	980,50	980,50	980,50	323,57	323,57		
Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço, acompanhamento e gride											
24.2	m²	2.881,48	6.890,29	882,76	882,76	882,76	882,76	53.395,36	53.395,36		
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO											
24.2.1	m²	144,08	165.340,44	144,08	144,08	144,08	144,08	170,82	170,82		
Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte											
24.2.2	m²	1.455,21	1.596,18	445,81	445,81	445,81	445,81	485,93	485,93		
CBUQ											
24.2.2.1	m²	144,08	165.340,44	144,08	144,08	144,08	144,08	170,82	170,82		
Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exlusive transporte. AF_03/2017. - Capa											
24.2.3	m²	144,08	576,15	44,14	44,14	44,14	44,14	170,82	170,82		
Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora											
24.2.4	m² x km	1.455,21	1.596,18	445,81	445,81	445,81	445,81	485,93	485,93		
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana											
24.3	unidade	5,00	576,15	576,15	576,15	576,15	576,15			100,00	100,00
NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA											
24.3.1	unidade	115,23	576,15	576,15	576,15	576,15	576,15				
Nivelamento de Tampão de Poço de Visita											
25.0	m²	4.579,50	256.656,37	4.236,27	4.236,27	4.236,27	4.236,27	1.398,63	1.398,63		
RUA CAPITÃO JOÃO DE SÁ											
25.1	m²	0,33	1.511,24	1.511,24	1.511,24	1.511,24	1.511,24	1.398,63	1.398,63		
SERVIÇOS PRELIMINARES											
25.1.1	m²	0,33	1.511,24	1.511,24	1.511,24	1.511,24	1.511,24	1.398,63	1.398,63		
Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço, acompanhamento e gride											
25.2	m²	2,36	256.799,44	2.36	2.36	2.36	2.36	204.509,97	204.509,97		
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO											
25.2.1	m²	4.233,14	9.943,01	3.887,46	3.887,46	3.887,46	3.887,46	9.174,41	9.174,41		
Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte											
25.2.2	m²	210,66	241.744,99	168,05	168,05	168,05	168,05	192.847,46	192.847,46		
CBUQ											
25.2.2.1	m²	210,66	241.744,99	168,05	168,05	168,05	168,05	192.847,46	192.847,46		
Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exlusive transporte. AF_03/2017. - Capa											
25.2.3	m²	210,66	815,25	168,05	168,05	168,05	168,05	650,35	650,35		
Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora											
25.2.4	m² x km	2.106,60	2.296,19	1.680,50	1.680,50	1.680,50	1.680,50	1.831,75	1.831,75		
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana											
25.3	unidade	3,00	345,69	345,69	345,69	345,69	345,69	230,46	230,46		
NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA											
25.3.1	unidade	3,00	345,69	2,00	2,00	2,00	2,00	230,46	230,46		
Nivelamento de Tampão de Poço de Visita											
26.0			96.10,24					91.626,41	91.626,41		
RUA CRISTOVÃO COLOMBO											
26.1			68,06					532,95	532,95		
SERVIÇOS PRELIMINARES											

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng. Civil - CREA-PB Nº 160.29352-7

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SECOP/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
 Engenharia e Planejamento
 CREA - 110.155.555-0/01

		W de CTF (Contrato Termino/Encerramento) 2.08.027/2020		BM - Data emitido 09/04/2021		BM - Período de referência da medição: de 04/03/2021 a 07/04/2021		Grav de Sigilo Data do CT 01/07/20	
Início da obra - data 29/06/2020		Empresa Contratada CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA		Tomador/Ag. Promotor ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE		Tomador/Ag. Promotor ou Tomador Agente financeiro ou Ag. Operador Impasse		Tomador/Ag. Promotor ou Tomador 1.065.660-37	
Valor total inicial (R\$) 18.235.646,43		Prestação Termino da obra 26/07/2021		Valor do CTF (reembolso)		Valor do CTF (reembolso) 09.323.098/0001-92		Fonte de Recursos CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Valor atual (R\$) 18.235.646,43		CTF - nº anterior		Local de obra (Bairro/Município/UF) PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO		Fonte de Recursos CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Fonte de Recursos outra (descrever)	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS	PREVISTO NO ORÇAMENTO			EXECUTADO PRÉCIO QUANTITATIVOS			EXECUTADO PREÇO UNITÁRIO			ACUMULADO ATE PERÍODO ANTERIOR	MÉDIO DO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	MÉDIO DO PERÍODO	COSTO (%)
		QTD	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MÉDIO DO PERÍODO	INCLUINDO O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MÉDIO DO PERÍODO	INCLUINDO O PERÍODO					
26.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	1.614,99	0,33	558,06	1.614,99	1.614,99	532,95	532,95	532,95	532,95	91.093,46	91.093,46	4,50	
26.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				95.437,45										
26.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	1.581,74	2,36	3.732,91	1.581,74	1.581,74	1.509,79	1.509,79	1.509,79	1.509,79	3.563,10	3.563,10	4,55	
26.2.2	CBUQ														
26.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m³	79,09	1.147,56	90.760,52	79,09	1.147,56	75,49	75,49	75,49	75,49	86.629,30	86.629,30	4,55	
26.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	79,09	3,87	306,08	79,09	3,87	75,49	75,49	75,49	75,49	292,15	292,15	4,55	
26.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	585,27	1,09	637,94	585,27	1,09	558,63	558,63	558,63	558,63	608,91	608,91	4,55	
26.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				115,23										
26.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita	unidade	1,00	115,23	115,23	1,00	115,23							100,00	
27.0	RUA DR. CARLOS AGRA				205.820,16										
27.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.201,17										
27.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	3.639,90	0,33	1.201,17	3.639,90	1.201,17	3.062,66	3.062,66	3.062,66	3.062,66	1.010,68	1.010,68	15,86	
27.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				203.697,15										
27.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	3.375,18	2,36	7.965,42	3.375,18	2,36	2.806,83	2.806,83	2.806,83	2.806,83	6.624,12	6.624,12	16,84	
27.2.2	CBUQ														
27.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m³	188,76	1.147,56	193.662,23	188,76	1.147,56	140,35	140,35	140,35	140,35	161.060,05	161.060,05	16,83	
27.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	188,76	3,87	653,10	188,76	3,87	140,35	140,35	140,35	140,35	543,15	543,15	16,84	
27.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.299,45	1,09	1.416,40	1.299,45	1,09	1.080,69	1.080,69	1.080,69	1.080,69	1.177,95	1.177,95	16,83	
27.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				921,94										
27.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita	unidade	8,00	115,23	921,94	8,00	115,23	7,00	7,00	7,00	7,00	806,61	806,61	12,50	
28.0	RUA PEDRO ALVARES CABRAL				67.138,99										
28.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				396,00										
28.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	1.200,00	0,33	396,00	1.200,00	396,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	396,00	396,00		
28.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				66.627,66										
28.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	1.104,00	2,36	2.605,44	1.104,00	2,36	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	2.605,44	2.605,44		
28.2.2	CBUQ														
28.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m³	55,20	1.147,56	63.345,31	55,20	1.147,56	50,91	50,91	50,91	50,91	58.422,28	58.422,28	7,77	
28.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	55,20	3,87	213,62	55,20	3,87	50,91	50,91	50,91	50,91	197,02	197,02	7,77	
28.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	425,04	1,09	465,29	425,04	1,09	392,01	392,01	392,01	392,01	427,29	427,29	7,77	

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SECOP/PMCG

Eng.º Civil - CREA-PB nº 190.293534-2
 Eng.º Civil - CREA-PB nº 190.293534-2

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
 Responsável Técnico: Oliveira
 CREA 190.293534-010

CAIXA		Grau de Sigilo	
Nº do CT 1.055.660-37		Data do CT 01/07/20	
Nº do CT 1.055.660-37		Tomador/Ag. Promotor ou Fornecedor PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	
Nº do CT 09.323.098/0001-92		Agente Financeiro ou Ag. Operador Pagador CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Nº do CT 09.323.098/0001-92		Fonte de Recursos outra (descrever)	
Nº do CT 09.323.098/0001-92		Fonte de Recursos outra (descrever)	
Nº do CT 09.323.098/0001-92		Fonte de Recursos outra (descrever)	
Nº do CT 09.323.098/0001-92		Fonte de Recursos outra (descrever)	
Nº do CT 09.323.098/0001-92		Fonte de Recursos outra (descrever)	

ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL		ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR		ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO		DESEJO (N)
				QTD	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO		
28.3	1,00	115,23	115,23									100,00
28.3.1	1,00	115,23	115,23									100,00
29.0	58.275,03	58.275,03	58.275,03									51.795,87
29.1	351,38	351,38	351,38									351,38
29.1.1	351,38	351,38	351,38									351,38
29.2	51.329,26	51.329,26	51.329,26									51.329,26
29.2.1	2.261,64	2.261,64	2.261,64									2.261,64
29.2.2	49.067,62	49.067,62	49.067,62									49.067,62
29.2.2.1	48.576,21	48.576,21	48.576,21									48.576,21
29.2.2.2	500,41	500,41	500,41									500,41
29.2.3	163,82	163,82	163,82									163,82
29.2.4	327,59	327,59	327,59									327,59
29.3	115,23	115,23	115,23									115,23
29.3.1	115,23	115,23	115,23									115,23
30.0	140.663,02	140.663,02	140.663,02									121.901,73
30.1	671,22	671,22	671,22									589,86
30.1.1	671,22	671,22	671,22									589,86
30.2	139.415,85	139.415,85	139.415,85									121.311,87
30.2.1	6.832,44	6.832,44	6.832,44									7.685,39
30.2.2	132.583,41	132.583,41	132.583,41									113.626,48
30.2.2.1	48,85	48,85	48,85									58.965,86
30.2.2.2	132.534,56	132.534,56	132.534,56									53.419,92
30.2.3	376,10	376,10	376,10									376,10
30.2.4	862,60	862,60	862,60									862,60
30.3	221.889,00	221.889,00	221.889,00									221.889,00
30.3.1	8.663,37	8.663,37	8.663,37									8.663,37
30.3.1.1	3.893,40	3.893,40	3.893,40									3.893,40
30.3.1.2	4.769,97	4.769,97	4.769,97									4.769,97
31.0	223.173,82	223.173,82	223.173,82									223.173,82
31.1	1.284,82	1.284,82	1.284,82									1.284,82
31.1.1	1.284,82	1.284,82	1.284,82									1.284,82
31.2	221.889,00	221.889,00	221.889,00									221.889,00
31.2.1	8.663,37	8.663,37	8.663,37									8.663,37
31.2.2	213.225,63	213.225,63	213.225,63									213.225,63

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SECOP/P/MCC

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
 Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng. Civil - CREA-PB N.º 180.283534-2

Construtora Rocha Cavalcante Ltda
 Rua...
 UREA...

CAIXA		RUA Afonso Campos		RUA Afonso Campos		RUA Afonso Campos	
Nº do CTEI (Contrato Executivo/Orçamento)		RUA Afonso Campos		RUA Afonso Campos		RUA Afonso Campos	
2.08.022/2020		9		09/04/2021		01/07/20	
Início da obra - data		Empresa Contratada		RUA Afonso Campos		Tomador/Ag. Promotor ou Titular	
29/06/2020		CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA		09/04/2021		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	
Valor total inicial (R\$)		Objeto do CTEI (resumido)		RUA Afonso Campos		Agente Financeiro ou Ag. Operador Pagador	
18.225.646,43		RECAPAMENTO ASFÁLTICO NOS BARRIOS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTÁÇÃO VELHA, PALMEIRA, IPRATA, BODOCOONGO, SANTA CRUZ, DINA MÉRICA, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JERÔNIMUS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCOONGO, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERRIOTÃO, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA		RUA Afonso Campos		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Valor atual (R\$)		Local de obra (bairro/Município/UF)		RUA Afonso Campos		Fonte de Recursos	
18.225.646,43		CAMPINA GRANDE - PB		RUA Afonso Campos		outra (descrever)	
Grau de Sigilo		RUA Afonso Campos		RUA Afonso Campos		RUA Afonso Campos	
		RUA Afonso Campos		RUA Afonso Campos		RUA Afonso Campos	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PRESTADO NO ORÇAMENTO			PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	DETERMINADO FISCO (QUANTITATIVOS)			ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	DETERMINADO FINANCEIRO (R\$)		CÉDULO (Nº)
		UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.			UNIDADES INCLUINDO O PERÍODO	VALOR INCLUINDO O PERÍODO	VALOR NO PERÍODO			ADICIONADO NO PERÍODO		
31.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	183,55	1.147,56	210.634,64	183,55	183,55	210.634,64	210.634,64	210.634,64			210.634,64	
31.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	183,55	3,87	710,34	183,55	183,55	710,34	710,34	710,34			710,34	
31.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.725,37	1,09	1.880,85	1.725,37	1.725,37	1.880,85	1.880,85	1.880,85			1.880,85	
31.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	8,00	115,23	921,84	8,00	8,00	921,84	921,84	921,84			921,84	
32.0	RUA AFONSO CAMPOS				224.864,26			224.864,26	224.864,26	224.864,26			224.864,26	
32.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.335,02			1.335,02	1.335,02	1.335,02			1.335,02	
32.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e gride	m²	4.045,90	0,33	1.335,02	4.045,90	4.045,90	1.335,02	1.335,02	1.335,02			1.335,02	
32.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				222.261,71			222.261,71	222.261,71	222.261,71			222.261,71	
32.2.1	Pinura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	3.655,90	2,36	8.698,72	3.655,90	3.655,90	8.698,72	8.698,72	8.698,72			8.698,72	
32.2.2	CBUQ				211.483,83			211.483,83	211.483,83	211.483,83			211.483,83	
32.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	184,29	1.147,56	715,20	184,29	184,29	715,20	715,20	715,20			715,20	
32.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	184,29	3,87	715,20	184,29	184,29	715,20	715,20	715,20			715,20	
32.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.253,17	1,09	1.365,96	1.253,17	1.253,17	1.365,96	1.365,96	1.365,96			1.365,96	
32.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	11,00	115,23	1.267,53	11,00	11,00	1.267,53	1.267,53	1.267,53			1.267,53	
32.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita				1.267,53			1.267,53	1.267,53	1.267,53			1.267,53	
33.0	RUA BENEDITO MOTTA				150.122,51			150.122,51	150.122,51	150.122,51			150.122,51	
33.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				900,87			900,87	900,87	900,87			900,87	
33.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e gride	m²	2.729,92	0,33	900,87	2.729,92	2.729,92	900,87	900,87	900,87			900,87	
33.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				188.991,18			188.991,18	188.991,18	188.991,18			188.991,18	
33.2.1	Pinura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	5.057,86	2,36	11.936,55	5.057,86	5.057,86	11.936,55	11.936,55	11.936,55			11.936,55	
33.2.2	CBUQ				176.954,63			176.954,63	176.954,63	176.954,63			176.954,63	
33.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	75,87	1.207,08	91.581,16	75,87	75,87	91.581,16	91.581,16	91.581,16			91.581,16	
33.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDEF, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Repetimento	m³	75,87	1.093,55	82.967,64	75,87	75,87	82.967,64	82.967,64	82.967,64			82.967,64	
33.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	151,74	3,87	587,23	151,74	151,74	587,23	587,23	587,23			587,23	
33.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.760,18	1,09	1.916,60	1.760,18	1.760,18	1.916,60	1.916,60	1.916,60			1.916,60	
33.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	2,00	115,23	230,46	2,00	2,00	230,46	230,46	230,46			230,46	
33.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita				230,46			230,46	230,46	230,46			230,46	

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng.º Civil - CREA-PB nº 180.203/2017

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SECOP/PMCG

Constância Rocha Cavalcante Ltda.
 Associação Profissional de Engenheiros e Arquitetos
 CREA - 100000000-0/PE

CAIXA Nº do CTEIC (Contrato, Empenho, Resumido) 2.08.027/2020 Início de obra (dia) 29/06/2020 CTEI - Valor total a cair(R\$) 18.225.646,43		Nº do CTEIC (Contrato, Empenho, Resumido) 9 Empresa contratada CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA (Objeto do CTEI resumido)		BM - Data emitido 09/04/2021 IM - Período de referência de medição de 04/03/2021 a 07/04/2021 (CNPJ) 09.321.098/0001-92		Nº de CT 1.065.660-37 Tomador/Ag.Promotor ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Agente Financeiro ou Ag. Operador Pagase CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Grau de Sigilo Data do CT 01/07/20	
CTEI - Valor atual (R\$) 18.225.646,43 CTEI - Valor atual (R\$) 18.225.646,43		Recuperação Asfáltico nos bairros Centro, Bela Vista, Alto Branco, Conceição, Estação Velha, Palmeira, Prata, Bodocongó, Santa Cruz, Dinâmica, Catolé, Gentemário, Cruzeiro, Jardim Tavares, Jeremias, José Pinheiro, Mirante, Novo Bodocongó, Santo Antônio, São José, Serrotaço, Malvinas, Monte Santo e Universitário, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba		Local de obra(Bairros/Município/UF)		Fonte de Recursos		outra (descreva)	
DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS NO ORÇAMENTO		Local de obra(Bairros/Município/UF)		PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO					

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS NO ORÇAMENTO	PREVISTO NO ORÇAMENTO			EXECUÇÃO FÍSICA (QUANTITATIVOS)			EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$)			DEVOLO NI	
		UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADA E PERÍODO ANTERIOR	MIDIO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUIDO O PERÍODO	MIDIO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUIDO O PERÍODO		
34.0	RUA PEDRO II					340.189,55						
35.0	RUA PROFESSOR MAURO LUIZA					276.279,99						
35.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.418,18						
35.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e			0,33		4.297,50						
35.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²				1.418,18	670,40	4.064,97	21.969,79	254.228,74	276.198,53	1.341,44
35.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²		2,36		274.285,66	6.789,14	3.354,57	21.748,56	252.532,38	274.280,94	5,41
35.2.2	CBUQ	m²				17.255,61	6.789,14	3.354,57	21.748,56	252.532,38	274.280,94	5,41
35.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017. - Capa	m²		118,61		143.171,76	101,84	16,77	118,61	122.929,03	143.171,76	0,56
35.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017. - Repetimento	m²		1.093,55		110.164,23	100,74	100,74	100,74	110.164,23	110.164,23	
35.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³		3,87		848,88	200,21	17,92	218,13	774,81	844,16	
35.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km		1,09		2.845,18	2.423,80	186,46	2.610,26	2.641,94	2.845,18	
35.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade				576,15	5,00	5,00	5,00	576,15	576,15	
35.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita	unidade		115,23		576,15	5,00	5,00	5,00	576,15	576,15	
36.0	RUA CAZUA BARRETO					44.922,03						
36.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					264,00						
36.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²		0,33		254,00	800,00	800,00	800,00	264,00	264,00	
36.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²				44.542,80						
36.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²		2,36		1.736,96	736,00	736,00	736,00	44.542,80	44.542,80	
36.2.2	CBUQ	m²				44.542,80	736,00	736,00	736,00	1.736,96	1.736,96	
36.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017. - Capa	m²		36,80		42.230,21	36,80	36,80	36,80	42.230,21	42.230,21	
36.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³		3,87		142,42	36,80	36,80	36,80	142,42	142,42	
36.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km		1,09		433,21	397,44	397,44	397,44	433,21	433,21	
36.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade				115,23						
36.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita	unidade		115,23		115,23						100,00
37.0	RUA BENJAMIN CONSTANT					31.901,56						
37.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					151,01						
37.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²		0,33		151,01	457,60	457,60	457,60	151,01	151,01	
37.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²				31.635,32						
37.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²		2,36		2.002,79	846,64	846,64	846,64	2.002,79	2.002,79	
37.2.2	CBUQ	m²				31.635,32						

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
 F. JESUS C. XAVIER
 Eng. Civil - CREA-PB Nº 160.283/534-2

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SECOB/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

Eng. Civil - CREA-PB Nº 160.283/534-2

CAIXA		Grau de Sigilo	
Nº do CITEF (Contrato Execução/forneçimento) 2.08.022/2020 Início da obra - data 29/06/2020 Prazo (término da obra) 26/07/2021 CITEF - di. assinatura Valor total inicial (R\$) 18.225.646,43	BIM - número 9 Empresa Contratada CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA Objeto do CITEF (resumo) RECAPAMENTO ASFÁLTICO NOS BARRIOS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTAÇÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCONGÓ, SANTA CRUZ, DINAMÉRICA, CATOLÉ, CEMITÉRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, JARDIM BODOCONGÓ, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTIÃO, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA	BIM - Data emissão 09/04/2021 BIM - Período de referência de medição de 09/03/2021 a 07/04/2021 (R\$) 09.323.098/0001-92	Nº do CT 1.065.660-37 Tomador/Ag. Promotor ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte de Recursos outra (descrever)
CITEF - Valor atual (R\$) 18.225.646,43	Local da obra (Bairro/Município/UF) PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO		

ITEM	PRELIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PRECISO DO ORÇAMENTO			EXECUÇÃO FÍSICA QUANTITATIVOS			EXECUÇÃO FINANCEIRA			DÍGNO (R\$)
		UNID.	QTDDES.	FÍSICO UNID.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEIO DO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEIO DO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	
37.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Ccpa	m³	12,73	1.207,08	15.366,13	12,73	12,73	15.366,13		15.366,13	
37.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperilamento	m³	12,73	1.093,55	13.920,89	12,73	12,73	13.920,89		13.920,89	
37.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-escavadora	m³	25,46	3,87	98,53	25,46	25,46	98,53		98,53	
37.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	226,59	1,09	246,98	226,59	226,59	246,98		246,98	
37.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	1,00	115,23	115,23						100,00
37.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita										
38.0	RUA PRUDENTE DE MORAIS										
38.1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
38.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	5.877,28	0,33	1.939,50	4.287,89	4.287,89	1.415,00		1.415,00	27,04
38.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	5.393,55	2,36	12.728,78	3.916,42	3.916,42	232.084,70		232.084,70	27,39
38.2.2	CBUQ										
38.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Ccpa	m³	296,68	1.147,56	340.658,10	191,90	191,90	220.216,76		220.216,76	35,32
38.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-escavadora	m³	296,68	3,87	1.148,15	191,90	191,90	742,65		742,65	35,32
38.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	2.670,12	1,09	2.910,43	1.727,10	1.727,10	1.882,54		1.882,54	35,32
38.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade			1.037,07						100,00
38.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita										
39.0	RUA DESEMBARGADOR AZEVEDO										
39.1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
39.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	7.361,50	0,33	2.429,30	4.641,68	1.575,16	6.219,84		6.219,84	15,51
39.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO										
39.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	11.570,38	1,36	27.306,10	9.283,36	1.434,29	21.908,73		21.908,73	7,37
39.2.2	CBUQ										
39.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Ccpa	m³	98,74	1.147,56	113.310,07	71,72	71,72	82.303,00		82.303,00	27,36
39.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Ccpa	m³	143,93	1.207,08	173.735,02	139,25	139,25	188.085,89		188.085,89	3,25
39.2.2.3	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 40 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperilamento	m³	143,93	1.093,55	157.394,65	139,25	139,25	152.276,84		152.276,84	3,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
Francisco José Jesus C. Xavier
 Eng.º Civil - CREA-PB nº 160.283534-2

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SEC08/PMCG

Consórcio Rocha Cavalcante Ltda.
 Rua João Augusto Cavalcante
 CREA 100662001/2012

CAIXA		Grau de Sigilo	
Razão Social: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA		Data do CT: 01/07/20	
CNPJ: 09.333.998/0001-92		Número do CT: 1.065.660-37	
Data de emissão: 09/04/2021		Tomador/Prestador do Trabalho: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	
Data de validade: 09/04/2021 a 07/04/2021		Agente Inscrição ou Aq. Operações Especiais:	
Data de referência da medição: 04/03/2021 a 07/04/2021		Outra Descrição:	
Valor total inicial (R\$): 18.225.646,43		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Valor atual (R\$): 18.225.646,43		Fonte de Recurso:	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PREÇO UNITÁRIO			QUANTIDADE			PREÇO TOTAL	DESCRIÇÃO PREÇO QUANTITATIVO			DESCRIÇÃO PREÇO UNITÁRIO			RESERVA (%)
		QTD	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	UNIDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL		PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	
39.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	386,61	3,87	1.495,18	m³	276,50	71,72	350,22	1.077,80	277,58	1.355,36	9,41			
39.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	4.871,29	1,09	5.309,71	m³ x km	3.509,10	903,67	4.412,77	3.824,92	985,00	4.809,92	9,41			
39.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	10,00	115,23	1.152,30	unidade	6,00	6,00	6,00	691,38	691,38	691,38	40,00			
40.0	RUA RIQUE DE CAXIAS			148.557,74					131.088,85		131.088,85				
40.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			690,69					690,69		690,69				
40.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	2.093,00	0,33	690,69	m²	2.093,00	690,69	2.093,00	130.167,70		130.167,70				
40.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			147.636,59					8.858,85		8.858,85				
40.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	3.961,52	2,36	9.349,19	m³	3.753,75	3.753,75	3.753,75	71.712,62		71.712,62				
40.2.2	CBUQ								48.236,49		48.236,49				
40.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Repetimento	59,43	1.207,08	71.736,76	m³	59,41	59,41	59,41	400,62		400,62				
40.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Repetimento	59,43	1.093,55	64.989,68	m³	59,41	59,41	59,41	959,12		959,12				
40.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	118,84	3,87	459,91	m³	103,52	103,52	103,52	230,46		230,46				
40.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	1.010,14	1,09	1.101,05	m³ x km	879,93	879,93	879,93	230,46		230,46				
40.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA			230,46					737.274,05		737.274,05				
40.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita	2,00	115,23	230,46	unidade	2,00	2,00	2,00	4.619,39		4.619,39				
41.0	RUA ANTERIOR NAVARRO			785.789,19					782.654,66		782.654,66				
41.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			4.619,39					30.371,19		30.371,19				
41.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	13.994,15	0,33	4.619,39	m²	13.994,15	13.994,15	13.994,15	693.034,44		693.034,44				
41.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			776.694,74					2.337,17		2.337,17				
41.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	12.869,15	2,36	30.371,19	m²	12.869,15	12.869,15	12.869,15	6.911,86		6.911,86				
41.2.2	CBUQ								155.486,24		155.486,24				
41.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	643,46	1.147,56	738.408,96	m³	603,92	603,92	603,92	912,58		912,58				
41.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	643,46	3,87	2.490,19	m³	603,92	603,92	603,92	912,58		912,58				
41.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	8.796,33	1,09	7.564,40	m³ x km	6.341,16	6.341,16	6.341,16	912,58		912,58				
41.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA			2.535,06					154.573,66		154.573,66				
41.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita	22,00	115,23	2.535,06	unidade	2,00	2,00	2,00	154.573,66		154.573,66				
42.0	RUA SEBASTIÃO MARTINS DE OLIVEIRA			85.944,02											
43.0	RUA FLORENTEZ COUTINHO			739.687,48											
44.0	RUA PROFESSOR LUIZ GILLIAND			157.918,18											
44.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			912,58											
44.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	2.765,40	0,33	912,58	m²	2.765,40	2.765,40	2.765,40							
44.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			156.690,37											

PROF. MUNIC. DE C. GRANDE
Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SECOP/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
 Rua João Manoel de Azevedo, 100 - Jd. Boa Vista - Campina Grande - PB
 CEP: 57060-000

CAIXA		Grau de Sigilo	
NP do CTEI (Contrato Emenda/Forneceimento)	1.065.460-37	IM - Período de referência da medição de 04/03/2021 a 07/04/2021	Data de CT
NP do CTEI	1.065.460-37	Tomador/Ag.Promotor ou Tomador	01/07/20
Inciso da obra - data	29/06/2020	Objeto do CTEI (resumo)	
Valor total inicial (R\$)	18.225.646,43	RECAPAMENTO ASFÁLTICO NOS BARRIOS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTACÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCONGÓ, SANTA CRUZ, DINÂMICA, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCONGÓ, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTAO, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA	
Valor atual (R\$)	18.225.646,43	Fonte de Recursos	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
		outra (descrever)	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO EMPRÉTIMO	PREÇO NO ORÇAMENTO			EXECUÇÃO FÍSICA QUANTITATIVA			EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$)			DEDOZO Nº
		UNID.	QTDDE	PREÇO UNID.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO O PERÍODO ANTERIOR	PERÍODO NO PERÍODO	ACUMULADO INÍCIO DO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MÉDIO NO PERÍODO	
44.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	2.612,24	2,36	6.164,89		2.612,24	2.612,24		6.164,89	6.164,89
44.2.2	CEUQ										
44.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CEUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m³	129,05	1.147,56	148.082,62		127,05	127,05		145.797,50	145.797,50
44.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CEUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m³	0,47	1.207,08	567,33		0,47	0,47		567,33	567,33
44.2.2.3	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CEUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Reperflamento	m³	0,47	1.093,55	513,97		0,47	0,47		513,97	513,97
44.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibrador	m³	129,99	3,87	503,06		128,18	128,18		496,06	496,06
44.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	961,93	1,09	1.048,50		948,54	948,54		1.033,91	1.033,91
44.3	NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA				115,23		115,23				
44.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	1,00	115,23	115,23						100,00
45.0	RUA DAS TRÊS IRMÃS				211.439,22		210.632,61	210.632,61		210.632,61	210.632,61
45.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.022,21		1.022,21	1.022,21		1.022,21	1.022,21
45.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	3.097,60	0,33	1.022,21		3.097,60	3.097,60		1.022,21	1.022,21
45.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				209.610,40		209.610,40	209.610,40		209.610,40	209.610,40
45.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	5.632,08	2,36	13.291,71		5.632,08	5.632,08		13.291,71	13.291,71
45.2.2	CEUQ										
45.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CEUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m³	84,48	1.207,08	101.974,12		84,48	84,48		101.974,12	101.974,12
45.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CEUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Reperflamento	m³	84,48	1.093,55	92.383,10		84,48	84,48		92.383,10	92.383,10
45.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibrador	m³	168,96	3,87	653,88		168,96	168,96		653,88	653,88
45.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.199,62	1,09	1.307,59		1.199,62	1.199,62		1.307,59	1.307,59
45.3	NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA				806,61		806,61				
45.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	7,00	115,23	806,61						100,00
46.0	RUA DR. JOÃO ARJUNDO CORREIA				123.889,22		122.254,13	122.254,13		122.254,13	122.254,13
46.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				578,92		578,92	578,92		578,92	578,92
46.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	1.754,31	0,33	578,92		1.754,31	1.754,31		578,92	578,92
46.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				122.964,66		121.675,21	121.675,21		121.675,21	121.675,21
46.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	3.294,62	2,36	7.775,30		3.294,62	3.294,62		7.775,30	7.775,30
46.2.2	CEUQ										

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng. Civil - CREA-PB N.º 60.233534-2

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SECOP/IPMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
 Eng.º de Arquitetura e Urbanismo
 CRACK - 150000000-0



CAIXA

2.08.027/2020

29/06/2020

26/07/2021

209.06.2020

18.225.646/43

18.225.646/43

18.225.646/43

Grau de Sigilo
 Nº de CT 01/07/20
 Data de CT
 1.065.660.37
 Tipo de Operação de Transferência
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 Agência Financeira no Ag. Operador Resposta

EM - Período de referência de emissão de 04/01/2021 a 07/04/2021
 CNPJ 09.323.098/0001-92
 Agência Financeira no Ag. Operador Resposta

RM - Número 9
 Empresa Contratada CONSTRUTORA BOCHA CAVALCANTE LTDA
 CNPJ 09.323.098/0001-92
 Objeto do CTE (resumido)

RECAPAMENTO ASFÁLTICO NOS BARRIOS CENTRO, REIA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTAÇÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCONGO, SANTA CRUZ, DIMMÉRICA, CATOLÉ, CENTEÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, FERREIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCONGO, SANTO ANTONIO, SÃO JOSÉ, SERRODÃO, MALVINAS, MORTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA
 Local da obra (Bairro/Município/UF)
 PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU DEPOSIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL			EXERCÍCIO DE EMPENHO ANTERIOR			EXERCÍCIO DE EMPENHO QUANTITATIVO			EXERCÍCIO FINANCEIRO (R\$)		
		UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	MÉDIO DO PERÍODO	ACUMULADO INCLUIDO NO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	MÉDIO DO PERÍODO	ACUMULADO INCLUIDO NO PERÍODO	DEBITO Nº				
46.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	49,42	1.207,08	59.652,89	49,42	49,42	59.653,89	59.653,89	59.653,89	59.653,89	2,37				
46.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperflamento	m³	49,42	1.093,45	54.043,24	48,25	48,25	52.763,79	52.763,79	52.763,79	2,37					
46.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	98,18	3,87	380,51	98,18	98,18	379,96	379,96	379,96	0,67					
46.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.018,05	1,09	1.109,67	1.011,26	1.011,26	1.102,27	1.102,27	1.102,27	0,67					
46.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	3,00	115,23	345,69	345,69	345,69	345,69	345,69	345,69	100,00					
46.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	3,00	115,23	345,69	345,69	345,69	345,69	345,69	345,69	100,00					
47.0	RUA JOÃO LÉLIS				385.044,84			375.744,91		375.744,91						
47.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.823,25			1.653,34		1.653,34						
47.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	5.525,00	0,33	1.823,25	5.010,13	5.010,13	1.035,34	1.035,34	1.653,34	9,32					
47.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				382.530,21			373.400,19		373.400,19						
47.2.1	Plintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	10.284,40	2,36	24.273,98	10.019,69	10.019,69	23.646,47	23.646,47	23.646,47	2,38					
47.2.2	CBUQ				185.854,11	150,29	150,29	181.412,05		181.412,05	2,39					
47.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	153,97	1.207,08	185.854,11	150,29	150,29	181.412,05		181.412,05	2,39					
47.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperflamento	m³	153,97	1.093,55	168.373,69	150,30	150,30	164.360,57		164.360,57	2,38					
47.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	307,93	3,87	1.191,69	300,59	300,59	1.163,28		1.163,28	2,38					
47.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	2.648,20	1,09	2.886,54	2.585,16	2.585,16	2.817,82		2.817,82	2,38					
47.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	6,00	115,23	691,38	6,00	6,00	691,38		691,38						
47.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	6,00	115,23	691,38	6,00	6,00	691,38		691,38						
48.0	RUA LUIZ SOBRÉ FILHO				199.803,52			194.794,93		194.794,93						
48.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				963,47			873,05		873,05						
48.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	2.919,60	0,33	963,47	2.645,61	2.645,61	873,05	873,05	873,05	9,38					
48.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				198.033,44			193.919,88		193.919,88						
48.2.1	Plintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	5.320,16	2,36	12.555,58	5.286,31	5.286,31	12.480,41		12.480,41	0,60					
48.2.2	CBUQ				96.324,98	79,28	79,28	95.697,30		95.697,30	0,65					
48.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	79,80	1.207,08	96.324,98	79,28	79,28	95.697,30		95.697,30	0,65					
48.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperflamento	m³	79,80	1.093,55	87.265,29	76,72	76,72	83.897,16		83.897,16	3,06					
48.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	159,66	3,87	617,66	156,00	156,00	603,72		603,72	2,26					

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
 FRANCISCO DE JESUS C. XAVIER
 Eng. Civil - CREA-PB Nº 150.283534-2

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SECOP/PMCG

Construtora Bocha Cavalcante Ltda
 Rua Paraíba, 100 - Jd. Primavera
 CEP: 57.000-000 - Campina Grande - PB
 CREA: 150.655.938-0/0

CAIXA		Grau de Sigilo	
Nº do CTEI (Contrato Execução/Funcionário) 2.08.02272020 Início de obra - obra 29/06/2020 Término de obra 26/07/2021 Valor total (R\$) 18.225.646,43	Nº do CTEI 1.085.660-37 Tomador/Promotor em Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Agente Financeiro ou Ag. Operador Pagador CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Período de validade do contrato de 04/03/2021 a 07/04/2021 Data emissão 09/03/2021	Nº do CT 1.085.660-37 Data do CT 01/07/20
Empresa Contratada CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA Objeto do CTEI (resumido) RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIROS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTACÇÃO VELHA, PALMEIRA, FRATA, BODOCÓNGO, SANTA CRUZ, DINAMÉICA, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCÓNGO, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SEIROTAO, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA		Local da obra (bairro/Município/UF) PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO	
Valor atual (R\$) 18.225.646,43		Fonte de Recursos outra (descrever)	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO EMPREITEIRO	PREVISTO NO ORÇAMENTO			PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ATÉ O INÍCIO DA OBRA	EXECUTADO (R\$) (QUANTITATIVOS)		ACUMULADO INCLUIDO O PERÍODO	EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)		SERVIDO (N)
		UNID.	QTDE.	PREÇO UNIT.				PREÇOS DO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR		PERÍODO	ACUMULADO INCLUIDO O PERÍODO	
48.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.165,08	1,08	1.258,94	1.138,80	1.138,80	1.241,29	1.241,29	2,0	1.241,29	2,0	
48.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	7,00	115,23	806,61	806,61	806,61					100,00	
48.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita												
49.0	RUA LADISLAU RODRIGUES DE SOUZA				137.669,10					125.453,87		125.453,87	
49.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				656,70	656,70	656,70			560,52		560,52	
49.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	1.990,00	0,33	656,70	1.698,54	1.698,54			1.698,54		1.698,54	
49.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				136.781,94					124.662,89		124.662,89	
49.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	3.661,60	2,36	8.641,38	3.394,82	3.394,82			8.011,78		8.011,78	
49.2.2	CBUQ												
49.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Cepa	m³	54,92	1.207,06	66.252,83	49,13	49,13			59.503,84		59.503,84	
49.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Reperflamento	m³	54,92	1.093,55	60.057,77	50,95	50,95			55.716,37		55.716,37	
49.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibrador-acabadora	m³	109,84	3,87	425,08	100,08	100,08			387,31		387,31	
49.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.252,18	1,08	1.364,88	1.140,91	1.140,91			1.243,59		1.243,59	
49.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				230,46					230,46		230,46	
49.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita	unidade	2,00	115,23	230,46	2,00	2,00			230,46		230,46	
50.0	RUA FRANCISCO LOPES				112.352,05					112.352,05		112.352,05	
50.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				528,00	528,00	528,00			494,35		494,35	
50.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	1.600,00	0,33	528,00	1.498,03	1.498,03			494,35		494,35	
50.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				111.478,36					111.628,05		111.628,05	
50.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	2.984,40	2,36	7.043,18	2.984,40	2.984,40			7.043,18		7.043,18	
50.2.2	CBUQ												
50.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Cepa	m³	44,76	1.207,06	54.028,90	44,73	44,73			53.993,69		53.993,69	
50.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Reperflamento	m³	44,76	1.093,55	48.947,30	44,93	44,93			49.133,20		49.133,20	
50.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibrador-acabadora	m³	89,53	3,87	346,48	89,53	89,53			346,48		346,48	
50.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.020,64	1,08	1.112,50	1.020,64	1.020,64			1.112,50		1.112,50	
50.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				345,69					330,46		330,46	
50.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita	unidade	3,00	115,23	345,69	2,00	2,00			230,46		230,46	
51.0	RUA DR. FLORIANO MENDES FREIRE				330.473,88					329.321,68		329.321,68	
51.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.617,26					1.617,26		1.617,26	

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SECOP/PMCG

FRANCISCO DE JESUS C. Xavier
 Engº Civil - CREA-PB Nº 150.293524-2

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
 Engº Civil - CREA - PB Nº 150.293524-2

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
 Eng. Arto Nelson
 CREA - PB Nº 150.293524-2

CAIXA		Nº do CTE (Cadastro Especializado)		Nº do CT		Grau de Sigilo	
2.08.022/2020		Data emissão		1.065.660-37		Data do CT	
29/06/2020		09/04/2021		Tomador/Ag. Prestador ou Tomador		01/07/20	
Prestação Termino da obra		09/04/2021		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE			
26/07/2021		09/04/2021		Agente Financeiro ou Ag. Operador Financeiro			
CTE - Valor total (R\$)		Objeto do CTE (resumido)		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
18.225.646,43		RECAPAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIRROS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTÁÇÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCONGÓ, SANTA CRUZ, DIMÂMÉRICA, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, RIO DO BODOCONGÓ, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTIÃO, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA					
18.225.646,43		Local de obra (Bairro/Município) (R\$)		Fonte de Recursos			
		PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO		outra (descrever)			
CTE - Valor atual (R\$)		CTE - De último Adic.					
18.225.646,43							

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PREVISTO NO ORÇAMENTO			EXCUTIDO FÍSICO (DENTRINTE DO PERÍODO)			EXCUTIDO FINANCEIRO (R\$)		
		UNID.	QTDDES	PREÇO UNIT.	Quantidade até o Período anterior	MEZOS DO PERÍODO	ADIMLADO INCLUINDO O PERÍODO	MEZOS DO PERÍODO	ADIMLADO INCLUINDO O PERÍODO	DEVIDO IN
51.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	4.900,80	0,33	1.617,26	4.900,80	4.900,80	1.617,26	327.704,42	1.617,26
51.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	8.821,44	2,36	327.704,42	8.821,44	327.704,42	327.704,42	20.818,60	20.818,60
51.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	132,32	1,207,08	159.720,83	132,32	132,32	159.720,83	159.720,83	159.720,83
51.2.2	CBUQ	m³	132,32	1,207,08	159.720,83	132,32	132,32	159.720,83	159.720,83	159.720,83
51.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	132,32	1,207,08	159.720,83	132,32	132,32	159.720,83	159.720,83	159.720,83
51.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperfilamento	m³	132,32	1,207,08	159.720,83	132,32	132,32	159.720,83	159.720,83	159.720,83
51.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibrador	m³	264,64	3,87	1.074,16	264,64	264,64	1.074,16	1.074,16	1.074,16
51.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.323,20	1,09	1.442,29	1.323,20	1.323,20	1.442,29	1.442,29	1.442,29
51.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	10,00	115,23	1.152,30	1.152,30	1.152,30	1.152,30	1.152,30	1.152,30
51.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita	unidade	10,00	115,23	1.152,30	1.152,30	1.152,30	1.152,30	1.152,30	1.152,30
52.0	RUA SALUSTIANO BEZERRA CABRAL				266.312,38		266.312,38	266.312,38	266.312,38	266.312,38
52.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	3.960,00	0,33	1.306,80	3.960,00	1.306,80	1.306,80	1.306,80	1.306,80
52.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e gride	m²	3.960,00	0,33	1.306,80	3.960,00	1.306,80	1.306,80	1.306,80	1.306,80
52.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m³	7.128,00	2,36	16.822,08	7.128,00	16.822,08	16.822,08	16.822,08	16.822,08
52.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m³	7.128,00	2,36	16.822,08	7.128,00	16.822,08	16.822,08	16.822,08	16.822,08
52.2.2	CBUQ	m³	7.128,00	2,36	16.822,08	7.128,00	16.822,08	16.822,08	16.822,08	16.822,08
52.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	106,92	1,207,08	129.040,99	106,92	106,92	129.040,99	129.040,99	129.040,99
52.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperfilamento	m³	106,92	1,207,08	129.040,99	106,92	106,92	129.040,99	129.040,99	129.040,99
52.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibrador	m³	213,84	3,87	827,56	213,84	213,84	827,56	827,56	827,56
52.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.047,82	1,09	1.142,12	1.047,82	1.047,82	1.142,12	1.142,12	1.142,12
52.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	2,00	115,23	230,46	2,00	230,46	230,46	230,46	230,46
52.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita	unidade	2,00	115,23	230,46	2,00	230,46	230,46	230,46	230,46
53.0	RUA ALCEBIADES GONÇALVES DA ROCHA				222.475,30		222.475,30	222.475,30	222.475,30	222.475,30
53.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	3.254,85	0,33	1.074,10	3.254,85	1.074,10	1.074,10	836,34	836,34
53.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	3.254,85	0,33	1.074,10	3.254,85	1.074,10	1.074,10	836,34	836,34
53.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m³	5.931,06	2,36	13.997,30	5.931,06	13.997,30	13.997,30	11.960,67	11.960,67
53.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m³	5.931,06	2,36	13.997,30	5.931,06	13.997,30	13.997,30	11.960,67	11.960,67
53.2.2	CBUQ	m³	5.931,06	2,36	13.997,30	5.931,06	13.997,30	13.997,30	11.960,67	11.960,67
53.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	88,56	1,207,08	107.381,44	88,56	107.381,44	107.381,44	88.696,24	88.696,24

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SEC08/PMCC

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 CREA 1396553-1/17


CAIXA		Grau de Sigilo	
Nº do CTE (Contato Execução/Financiamento)		Data do CTE	
2.08.022/2020		01/07/20	
Início da obra - data		Data de referência da medição	
29/06/2020		de 04/03/2021 a 07/04/2021	
Previsão Término da obra		Nº do CT	
26/07/2021		1.085.660-37	
CTE: R - assinatura		Tomador/Ag.Prestador de Tomador	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	
Valor total (R\$)		Agente Financiador Ag. Operador Repasse	
18.225.646,43		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Válida até (R\$)		Fonte de Recurso:	
18.225.646,43		outra (descrever)	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PREÇO NO ORÇAMENTO			PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	DESCRIÇÃO PREÇO PARAMETRIZADOS			ESTIMADO FINANCIADO (R\$)		
		UNID.	QTDES.	PREÇO UNIT.			ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	DEBTO N°
53.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperfilamento	m³	88,96	1.093,55	97.282,21	76,03	76,03	63.142,61	83.142,61	14,53		
53.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	177,93	3,87	688,59	149,51	149,51	575,60	578,60	15,97		
53.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.459,03	1,09	1.590,34	1.225,99	1.225,99	1.336,33	1.336,33	15,97		
53.3	NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	unidade	4,00	115,23	460,92	460,92				100,00		
54.0	RUA FRANCISCO ERNESTO DO RÉGO				159.547,62			148.714,08	148.714,08			
54.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				764,28			717,41	717,41			
54.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	2.316,00	0,33	764,28	2.173,97	2.173,97	717,41	717,41	6,13		
54.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				158.207,19			147.996,67	147.996,67			
54.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	4.261,44	2,36	10.057,00	3.986,33	3.986,33	9.407,74	9.407,74	6,46		
54.2.2	CBUQ											
54.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	63,92	1.107,06	77.156,55	59,79	59,79	72.171,31	72.171,31	6,46		
54.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperfilamento	m³	63,92	1.093,55	69.899,72	59,80	59,80	65.394,29	65.394,29	6,45		
54.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	127,84	3,87	494,74	119,59	119,59	462,81	462,81	6,45		
54.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	549,71	1,09	599,18	514,24	514,24	560,52	560,52	6,45		
54.3	NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	unidade	5,00	115,23	576,15	576,15				100,00		
55.0	RUA MARIA VIEIRA CÉSAR				323.042,21			308.633,39	308.633,39			
55.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.539,95			1.356,48	1.356,48			
55.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	4.666,50	0,33	1.539,95	4.110,56	4.110,56	1.356,48	1.356,48	11,91		
55.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				320.810,88			307.161,67	307.161,67			
55.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m³	8.586,36	2,36	20.263,81	8.221,12	8.221,12	19.401,84	19.401,84	4,25		
55.2.2	CBUQ											
55.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	126,80	1.207,08	155.471,90	123,32	123,32	148.857,11	148.857,11	4,25		
55.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperfilamento	m³	126,80	1.093,55	140.849,24	123,32	123,32	134.856,59	134.856,59	4,25		
55.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	257,60	3,87	996,91	246,64	246,64	954,50	954,50	4,25		
55.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	2.962,40	1,09	3.229,02	2.896,36	2.896,36	3.091,63	3.091,63	4,25		
55.3	NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA				691,53			115,23	115,23			

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
FRANCISCO DE JESUS C. XAVIER
 EPP - CNH - CREA-PB N° 480.280534-2

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SECOP/PMCG

Consultoria Tópicos Contabilidade Ltda.
 CNPJ: 16.045.820/0001-07
 CREA: 16045820/0001-07

		Grau de Sigilo Dia do CT	
Nº do CTE (Cadastro Especial/Função/Item) 2.08.021/2020		Nº do CT 1.065.660-37	
Data do CTE 29/06/2020		Data do CT 01/07/20	
Valor total inscrit(ões) 18.225.646,43		Tomador/Ag. Promotor ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	
Previdência Termino da obra 26/07/2021		Agente Fintanciero ou Ag. Operador Financeiro CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
CTE - Valor total inscrit(ões) 18.225.646,43		Fonte de Recursos multa (recursos)	
CTE - Valor atual(ões) 18.225.646,43		Fonte de Recursos	

ITEM	FISICO - FINANCIARIO	UNID.	PREÇO NO EMPILHAMENTO		PREÇO TOTAL	DEBILITADO FÍSICO (QUANTIA TÍTULOS)		ACUMULADO NO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODOS ANTERIORES	MEDIDA NO PERÍODO	ADJUDICADO INCLUINDO O PERÍODO	DESEJO (%)
			QTD	PREÇO UNIT.		ACUMULADO ATÉ PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODOS ANTERIORES					
55.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	5,00	115,23	691,38	1,00	1,00	115,23	115,23	115,23	115,23	83,33
56.0	RUA SÃO LUCAS				447.409,26			439.423,82	439.423,82		439.423,82	
56.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.148,53			2.148,53	2.148,53		2.148,53	
56.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	6.510,70	0,33	2.148,53	6.510,70	6.510,70	2.148,53	2.148,53		2.148,53	
56.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				443.762,74			437.275,29	437.275,29		437.275,29	
56.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição a transporte	m²	11.854,84	2,36	27.977,42	11.820,94	11.820,94	27.897,42	27.897,42		27.897,42	0,29
56.2.2	CBUQ				214.642,97			174,39	210.502,68		210.502,68	1,93
56.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	177,82	1.207,08	214.642,97	174,39	174,39	174,39	210.502,68		210.502,68	1,93
56.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperilamento	m³	177,82	1.093,55	194.455,06	175,84	175,84	175,84	192.289,83		192.289,83	1,11
56.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	355,65	3,87	1.376,37	350,23	350,23	350,23	1.355,39		1.355,39	1,52
56.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	4.872,40	1,09	5.310,92	4.798,14	4.798,14	4.798,14	5.229,97		5.229,97	1,52
56.3	NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA				1.497,99							
56.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	13,00	115,23	1.497,99	1,00	1,00	115,23	115,23		115,23	100,00
57.0	RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ				366.855,16			266.873,30	266.873,30		266.873,30	
57.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.270,17			1.238,31	1.238,31		1.238,31	
57.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	3.849,00	0,33	1.270,17	3.732,45	3.732,45	1.238,31	1.238,31		1.238,31	2,51
57.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				264.778,38			264.778,38	264.778,38		264.778,38	
57.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	7.119,00	2,36	16.800,84	7.119,00	7.119,00	16.800,84	16.800,84		16.800,84	
57.2.2	CBUQ				128.897,00			106,78	128.897,00		128.897,00	
57.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	106,78	1.207,08	128.897,00	106,78	106,78	106,78	128.897,00		128.897,00	
57.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperilamento	m³	106,78	1.093,55	116.769,27	106,78	106,78	106,78	116.769,27		116.769,27	
57.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	213,56	3,87	826,48	213,56	213,56	213,56	826,48		826,48	
57.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.360,78	1,09	1.489,79	1.366,78	1.366,78	1.366,78	1.489,79		1.489,79	
57.3	NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA				806,61			806,61	806,61		806,61	
57.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	7,00	115,23	806,61	7,00	7,00	115,23	115,23		115,23	
58.0	RUA JOANA D'ARC DE ARRUDA - TRECHO 01				314.117,23			197.694,86	197.694,86		197.694,86	
59.0	RUA JOANA D'ARC DE ARRUDA - TRECHO 02				199.721,34			883,38	883,38		883,38	
59.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				953,54			883,38	883,38		883,38	
59.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	2.889,50	0,33	953,54	2.676,90	2.676,90	883,38	883,38		883,38	7,36
59.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				199.308,88			196.350,56	196.350,56		196.350,56	


PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
FUNÇÃO: Coordenador de Planejamento Obras
CPF: 031.111.111-11

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SECOB/PMCG

Consultoria: **Adriano Gomes do Nascimento Ltda.**
 Rua: ...
 ...


CAIXA		Empresa Contratada:		R\$ - Valor emitido		R\$ - Valor de referência de medição		Mês do CT		Grau de Sigilo	
2.08.025/2020		CONSTRUTORA ROCCHA CAVALCANTE LTDA		09/04/2021		de 04/03/2021 a 07/04/2021		1.065.660-37		01/07/20	
Início da obra - data		Previdido término da obra		Data emitido		R\$ - Valor de referência de medição		Tomador/Ac. Promotor ou Titular		Data do CT	
26/07/2021		26/07/2021		09/04/2021		de 04/03/2021 a 07/04/2021		1.065.660-37		01/07/20	
Valor total liquidado (R\$)		CITEF de assinatura		Número de serviços		CNPJ		Agente Financeiro ou Ab. Operador Repasse		Fonte de Recurso	
18.225.646,43		CITEF de último Adm.		3		09.323.098/0001-92		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		outra (descrever)	
Valor atual (R\$)		CITEF de último Adm.		Descrição de obra/Município/UF		R\$ - Valor de referência de medição		Objeto do CITEF (resumo)		Fonte de Recurso	
18.225.646,43		CITEF de último Adm.		PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO		09.323.098/0001-92		RECAPAMENTO ASFÁLTICO NOS BARRIOS CENTRO, BEIA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTAÇÃO VELHA, PALMEIRA, PIATA, BODOCONGO, SANTA CRUZ, DINAMÉRICA, CATOLÉ, CENTERÁRIO, CRUZERIO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCONGO, SANTO ANTONIO, SÃO JOSÉ, SERROTAO, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO DE OBRAS	PREVISTO NO ORÇAMENTO			DECUPLADO FÍZICO QUANTITATIVO			DECUPLADO FINANCEIRO (R\$)			
		UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE DE SERVIÇOS	MÉDIO NO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MÉDIO DO PERÍODO	ACUMULADO (INCLUINDO O PERÍODO)	DEVIDO (R\$)
59.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	5.316,68	2,36	12.547,36	4.486,88	10.589,04	4.486,88	10.589,04	10.589,04	15,61
59.2.2	CBUQ	m³	79,75	1.207,08	96.264,63	79,75	96.264,63	79,75	96.264,63	96.264,63	
59.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	79,75	1.093,55	87.210,61	79,75	87.210,61	79,75	87.210,61	87.210,61	
59.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperfilamento	m³	159,50	3,87	617,27	159,50	617,27	159,50	617,27	617,27	
59.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³ x km	1.531,20	1,09	1.669,01	1.531,20	1.669,01	1.531,20	1.669,01	1.669,01	
59.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	unidade	4,00	112,23	460,92	4,00	460,92	4,00	460,92	460,92	
59.3.1	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA										
60.0	RUA FERNANDES VIEIRA				218.658,73					98.752,91	
60.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.002,54					435,70	
60.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	3.036,00	0,33	1.002,54	1.320,30	435,70	1.320,30	435,70	435,70	56,54
60.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				216.964,81					98.357,21	
60.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	5.831,96	2,36	13.765,79	2.643,89	6.239,58	2.643,89	6.239,58	6.239,58	54,67
60.2.2	CBUQ										
60.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	87,49	1.207,08	106.607,43	39,71	47.933,15	39,71	47.933,15	47.933,15	54,61
60.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperfilamento	m³	87,49	1.093,55	95.674,69	39,61	43.315,52	39,61	43.315,52	43.315,52	54,73
60.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	174,98	3,87	677,17	79,32	306,97	79,32	306,97	306,97	54,67
60.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.137,37	1,09	1.239,73	515,59	561,89	515,59	561,89	561,89	54,67
60.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA										
60.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	6,00	115,23	691,38	6,00	691,38	6,00	691,38	691,38	100,00
61.0	RUA ALFREDO GODOFREDO DE SANTANA				64.587,98					59.163,87	
61.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				309,21					260,82	
61.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	937,00	0,33	309,21	790,37	260,82	790,37	260,82	260,82	15,65
61.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				64.163,54					58.787,82	
61.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	1.734,08	2,36	4.068,63	1.500,19	3.729,25	1.500,19	3.729,25	3.729,25	8,35
61.2.2	CBUQ										
61.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	25,86	1.207,08	31.215,09	23,69	28.595,73	23,69	28.595,73	28.595,73	8,39
61.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperfilamento	m³	25,86	1.093,55	28.279,20	23,71	25.925,07	23,71	25.925,07	25.925,07	8,31

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
 RUA ALFREDO GODOFREDO DE SANTANA
 CEP: 56600-000 - SANTANA - PE
 CREA: 100000000-0

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SECOP/PMCG

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
 LEI Nº 1.500/2017
 EPP - Cvt. - CREA-PB Nº 150.283524-2

		Grau de Sigilo _____	
Nº do CTE (Contato Especial/Encargamento) 2.08.022/2020		Nº do CT 01/07/20	
Início da obra - data 29/06/2020		Data do CT 01/07/20	
Previsão Término da obra 26/07/2021		Tomador/Ag. Promotor ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	
CTE: de abertura 18.225-646.43		Agente Financiador ou Ag. Operador Repasse CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
CTE: de alteração 18.225-646.43		Fonte de Recursos CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
CTE: de último Adit. 18.225-646.43		Fonte de Recursos CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	

ITEM	ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PREVISTO NO ORÇAMENTO			PREÇO TOTAL	DESCRIÇÃO FÍSICA (QUANTITATIVOS)			ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEIODO VIO PERÍODO	ACUMULADO INCLUIDO O PERÍODO	DEBTO FN
		UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.		Quantidade em metros cúbicos	MEIODO VIO PERÍODO	ACUMULADO INCLUIDO O PERÍODO				
61.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	51,72	3,87	200,16	47,40	47,40	183,44	183,44	8,35	183,44	
61.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	367,21	1,09	400,26	322,32	322,32	351,33	351,33	12,72	351,33	
61.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	1,00	115,23	115,23	1,00	1,00	115,23	115,23		115,23	
61.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	1,00	115,23	115,23	1,00	1,00	115,23	115,23		115,23	
62.0	TRAVESSA JOÃO FLORENTINO DE CARVALHO				79.643,92			79.195,72	79.195,72		79.195,72	
62.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				380,92			331,87	331,87		331,87	
62.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	1.154,00	0,33	380,92	1.005,67	1.005,67	331,87	331,87		331,87	
62.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				79.032,64			74.863,85	74.863,85		74.863,85	
62.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	2.123,36	2,36	5.011,13	2.011,35	2.011,35	4.746,79	4.746,79		4.746,79	
62.2.2	CBUQ											
62.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exlusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	31,85	1.207,08	38.445,50	30,17	30,17	36.417,60	36.417,60		36.417,60	
62.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exlusive transporte. AF_03/2017. - Reperflimento	m³	31,85	1.093,55	34.829,57	30,17	30,17	32.992,40	32.992,40		32.992,40	
62.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	63,70	3,87	246,52	60,34	60,34	233,52	233,52		233,52	
62.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	458,64	1,09	499,92	434,44	434,44	473,54	473,54		473,54	
63.0	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	2,00	115,23	230,46	230,46	230,46				230,46	
63.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	2,00	115,23	230,46	230,46	230,46				230,46	
63.0	RUA DIALMA MIGUEL DE MORAIS				193.918,96			187.775,50	187.775,50		187.775,50	
63.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				947,50			825,99	825,99		825,99	
63.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	2.871,20	0,33	947,50	2.503,01	2.503,01	825,99	825,99		825,99	
63.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				192.510,54			186.488,59	186.488,59		186.488,59	
63.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	5.168,16	2,36	12.196,86	5.006,33	5.006,33	11.814,94	11.814,94		11.814,94	
63.2.2	CBUQ											
63.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exlusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	77,52	1.207,08	93.572,84	75,10	75,10	90.651,71	90.651,71		90.651,71	
63.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exlusive transporte. AF_03/2017. - Reperflimento	m³	77,52	1.093,55	84.771,00	75,09	75,09	82.114,67	82.114,67		82.114,67	
63.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	155,04	3,87	600,00	150,19	150,19	581,24	581,24		581,24	
63.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.255,62	1,09	1.368,84	1.216,54	1.216,54	1.326,03	1.326,03		1.326,03	
63.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	4,00	115,23	460,92	460,92	460,92	460,92	460,92		460,92	
63.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	4,00	115,23	460,92	460,92	460,92	460,92	460,92		460,92	
64.0	RUA DAS BARAUNHAS				239.423,31			207.440,39	207.440,39		207.440,39	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng. Civil - CREA-PB Nº 150.283/34-2

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SECOP/PMCG

CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA
 CREA: 140000000-0/08


CAIXA Nº do CTE (Contrato de prestação de serviços) 2.08.02/2020		Nº do CT 1.065.660-37		Grau de Sigilo 01/07/20	
Início da obra - data 29/06/2020		BIM - Data emissão 09/04/2021		Data de CT 01/07/20	
Valor total (R\$) 18.225.646,43		Empresa Contratada CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA (Órgão do CTE) (razão social)		Tomador/Alg. Promotor ou Titular PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Agente Financiador ou Ag. Operador Financeiro CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
CTE - Valor atual (R\$) 18.225.646,43		Prazo de validade da medição de 04/03/2021 a 07/04/2021 CUP 09.323.098/0001-92		Fonte de Recursos outra (descrever)	
Objeto da obra (bairro/Quilombo/UF) PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO					
Local da obra (bairro/Quilombo/UF) RECAPAMENTO ASFÁLTICO NOS BARRIOS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTAÇÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCONGÓ, SANTA CRUZ, DORAMÉRICA, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCONGÓ, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERRIOTO, MULVINHAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA					

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEBATE	PRELIMINAR DO ORÇAMENTO			EXECUÇÃO FÍSICA QUANTITATIVA			EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$)			
		UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ALICATADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MÉDIA DO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MÉDIA DO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
64.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.134,67			997,09			997,09
64.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	3.438,40	0,33	1.134,67	3.021,49	3.021,49	997,09	997,09	997,09	12,13
64.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				236.172,41			206.443,30			206.443,30
64.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	6.348,73	2,36	14.982,98	5.516,00	5.516,00	13.017,76	13.017,76	13.017,76	13,12
64.2.2	CBUQ										
64.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte, AF_03/2017. - Capa	m³	95,23	1.207,08	114.950,23	82,54	82,54	99.632,38	99.632,38	99.632,38	13,33
64.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte, AF_03/2017. - Repetimento	m³	95,23	1.093,55	104.388,77	82,52	82,52	90.239,75	90.239,75	90.239,75	13,35
64.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	190,47	3,87	737,12	165,06	165,06	638,78	638,78	638,78	13,34
64.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	3.085,61	1,09	3.363,31	2.673,97	2.673,97	2.914,63	2.914,63	2.914,63	13,34
64.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				115,23						
64.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	1,00	115,23	115,23						100,00
65.0	RUA ALICE GAUDÊNCIO				302.279,44			302.134,95			302.134,95
65.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.400,07			1.370,41			1.370,41
65.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	4.247,65	0,33	1.400,07	4.132,77	4.132,77	1.370,41	1.370,41	1.370,41	2,12
65.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				300.764,14			300.764,14			300.764,14
65.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	8.073,14	2,36	19.052,61	8.073,14	8.073,14	19.052,61	19.052,61	19.052,61	
65.2.2	CBUQ										
65.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte, AF_03/2017. - Capa	m³	121,09	1.207,08	146.165,32	121,09	121,09	146.165,32	146.165,32	146.165,32	
65.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte, AF_03/2017. - Repetimento	m³	121,09	1.093,55	132.417,97	121,09	121,09	132.417,97	132.417,97	132.417,97	
65.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	243,18	3,87	937,24	242,18	242,18	937,24	937,24	937,24	
65.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	2.010,09	1,09	2.191,00	2.010,09	2.010,09	2.191,00	2.191,00	2.191,00	
66.0	RUA SUIPINO COLAÇO				54.413,01			51.211,43			51.211,43
66.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				259,38			232,74			232,74
66.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	786,00	0,33	259,38	705,27	705,27	232,74	232,74	232,74	10,27
66.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				53.807,94			50.748,23			50.748,23
66.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	1.446,24	2,36	3.413,13	1.409,85	1.409,85	3.327,25	3.327,25	3.327,25	2,52
66.2.2	CBUQ										
66.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte, AF_03/2017. - Capa	m³	21,69	1.207,08	26.181,57	19,73	19,73	23.815,69	23.815,69	23.815,69	9,04


PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
 ADRIANO GOMES DO NASCIMENTO
 Coordenador de Planejamento Obras
 SECOP/PMCG

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SECOP/PMCG


Constutora Rocha Cavalcante Ltda.
 Rua ...
 ...


		Grau de Sigilo Data de CT	
Nº do CTE (Contrato Executivo/Funções)		Nº de CT	
Início da obra - data		Data de início da execução	
28/02/2020		09/04/2021	
Valor total inicial(R\$)		Valor atualizado de 04/03/2021 a 07/04/2021	
26/07/2021		R\$ 1.065.660,37	
CTE - Valor atual(R\$)		Descrição do Empreendimento	
26/07/2021		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	
CTE - Valor atual(R\$)		Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse	
18.225.646,43		CAIMA ECONÔMICA FEDERAL	
CTE - Valor atual(R\$)		Fonte de Recursos	
18.225.646,43		outra (descrever)	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU SUPORTE	PRESTADO NO ORÇAMENTO				FREQ.UNIT.	FREQU. TOTAL	Atualização e revisão ANEXO	EXECUÇÃO FÍSICA (ADMINISTRATIVO)			ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$)		DEBITO (%)
		UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.	FREQU. TOTAL				ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	MEIO DO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO				
66.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Repetimento	m³	21,69	1.093,55	23.719,10	21,16	23.139,52	21,16		23.139,52		23.139,52	2,44		
66.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-sabadora	m³	43,38	3,87	167,88	40,89	158,24	40,89		158,24		158,24	5,74		
66.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	299,32	1,09	326,26	282,14	307,53	282,14		307,53		307,53	5,74		
66.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	3,00	115,23	345,69	2,00	230,46	2,00		230,46		230,46	33,33		
67.0	RUA PROFESSOR CARIBA				126.571,65							114.597,69			
67.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				618,42							560,51			
67.1.1	Serviço topográfico para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	1.698,50	0,33	618,42	1.698,50	560,51	1.698,50		560,51		560,51	9,36		
67.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				128.327,06							113.805,72			
67.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C. Inclusive aquisição e transporte	m²	3.448,16	2,36	8.137,66	3.318,73	7.832,20	3.318,73		7.832,20		7.832,20	3,75		
67.2.2	CBUQ				62.930,18							54.765,22			
67.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	51,72	1.207,08	62.930,18	45,37	54.765,22	45,37		54.765,22		54.765,22	12,28		
67.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Repetimento	m³	51,72	1.093,55	56.558,41	45,86	50.150,20	45,86		50.150,20		50.150,20	11,33		
67.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-sabadora	m³	103,44	3,87	400,31	91,23	353,06	91,23		353,06		353,06	11,80		
67.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	734,42	1,09	800,52	647,74	706,04	647,74		706,04		706,04	11,80		
67.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	5,00	115,23	576,15	2,00	230,46	2,00		230,46		230,46	60,00		
67.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita				576,15							230,46			
68.0	RUA RAFAELA DE SOUZA E SILVA				797.192,55							760.804,38			
68.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				3.846,99							3.799,56			
68.1.1	Serviço topográfico para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	11.657,55	0,33	3.846,99	11.513,83	3.799,56	11.513,83		3.799,56		3.799,56	1,23		
68.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				791.962,80							757.004,82			
68.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C. Inclusive aquisição e transporte	m²	21.204,62	2,36	50.042,90	20.935,85	49.408,61	20.935,85		49.408,61		49.408,61	1,27		
68.2.2	CBUQ				383.535,94							365.936,37			
68.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	318,07	1.207,08	383.535,94	303,16	365.936,37	303,16		365.936,37		365.936,37	4,69		
68.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Repetimento	m³	318,07	1.093,55	347.823,45	303,57	331.966,97	303,57		331.966,97		331.966,97	4,56		
68.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-sabadora	m³	636,14	3,87	2.461,86	606,73	2.346,05	606,73		2.346,05		2.346,05	4,62		
68.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	7.696,65	1,09	7.696,65	6.734,70	7.340,62	6.734,70		7.340,62		7.340,62	4,62		
68.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				1.382,76										


Francisco de Jesus C. Xavier
 Engº Civil - CREA-PB nº 150.283594-2

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SECOP/PMCG


Constância Rocha Cavalcante Lida
 Engª Civil - CREA-PB nº 150.283594-2


		Grav de Selo 01/07/20	
Nº do CTH (Contrato Execução/Financiamento) 2.08.027/2020		Nº de CT 1.065.666-37	
Início da obra - data 29/06/2020		Data do CT 07/04/2021	
Valor total local (R\$) 18.225.646,43		Valor da prestação de serviços 09/04/2021	
CITEF - PRELIMINAR 18.225.646,43		Empresa Contratada CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA	
CITEF - In último Alim. 18.225.646,43		Objeto do CTH (resumido) RECAPAMENTO ASFÁLTICO NOS BARRIOS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTAÇÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCONGO, SANTA CRUZ, DIMAMÉRICA, CATOLÉ, CEMENÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ PIETRETO, MIRANTE, NOVO BODOCONGO, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTIÃO, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA	
CITEF - In último Alim. 18.225.646,43		Fonte de Recursos CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PREÇO DO SERVIÇO			PREÇO TOTAL			ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO ANTERIOR			ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO ATUAL			ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO ANTERIOR	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO ATUAL	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO ANTERIOR	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO ATUAL	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO ANTERIOR	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO ATUAL	
		UNID.	QTD.	PREÇO/UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ATUAL	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ATUAL	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ATUAL							ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
68.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	12,00	115,23	1.382,76															
69.0	RUA JOSÉ DA GUJA FERREIRA				182.232,35															
69.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				886,64															
69.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	2.686,80	0,33	886,64															
69.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				180.539,10															
69.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	4.836,24	2,36	11.413,53															
69.2.2	CBUQ																			
69.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	72,54	1.207,08	87.581,58															
69.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017. - Reperflimento	m³	72,54	1.093,55	79.326,12															
69.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	145,09	3,87	561,90															
69.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.337,95	1,09	1.876,37															
69.3	NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA				806,61															
69.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	7,00	115,23	806,61															
70.0	RUA DR. JOSÉ MOISÉS DE MEDEIROS NETO				160.975,26															
70.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				784,09															
70.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	2.376,00	0,33	784,08															
70.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				159.154,11															
70.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	4.276,80	2,36	10.093,25															
70.2.2	CBUQ																			
70.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	64,15	1.207,08	77.434,18															
70.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017. - Reperflimento	m³	64,15	1.093,55	70.151,23															
70.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	128,30	3,87	496,52															
70.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	896,10	1,09	978,93															
70.3	NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA				1.037,07															
70.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	9,00	115,23	1.037,07															
71.0	RUA FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA				2.270.847,37															
71.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				12.869,83															
71.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	36.999,49	0,33	12.869,83															
71.1.2	greide																			
71.1.3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				2.256.856,24															
71.1.3.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	36.999,49	0,33	12.869,83															
71.1.3.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				2.256.856,24															

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
 PAULO JOSÉ DE JESUS C. Xavier
 CREA - PB 1º 180.283534-2

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SEC08/PMCG

Consultoria Técnica Cavalcante Ltda.
 Engenheira Responsável
 CREA - PB 1º 180.283534-2

		Nº do CTE (Contrato de Execução/Transferência) 2.08.02/2020		Nº do CTE 1.065.660-37		Grau de Sigilo 	
Início de obra - data 29/06/2020		Previsão Término de obra 26/07/2021		Nº do CT 1.065.660-37		Data do CT 01/07/20	
Valor total inicial (R\$) 18.225.646,43		CTEF - de assinatura 		Tomador/Ag. Promotor ou Tomado PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE			
		CTEF - de último Adm. 		Agente Executor ou Ag. Operador Serviço CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
				Fonte de Recursos 		outra (descrever) 	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU ORÇAMENTO	PREÇO UNIT. ORÇAMENTO				EXERCÍCIO FÍSICO QUANTITATIVO				EXERCÍCIO FINANCEIRO (R\$)		
		UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ADQUIÇÃO DE MATERIAIS	MÉDIO EM PREÇO	ACUMULADO INCLUINDO O PREÇO	ADQUIÇÃO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MÉDIO NO PERÍODO	ADQUIÇÃO INCLUINDO O PERÍODO	DEBITO FN
71.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	40.324,17	2,36	95.165,04	32.448,60	32.448,60	32.448,60	76.578,70	76.578,70	19,53	
71.2.2	CEBUQ	m³	1.617,58	1.147,56	1.858.270,10	1.199,59	1.199,59	1.199,59	1.376.601,50	1.376.601,50	25,84	
71.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	119,59	1.207,08	144.354,70	119,47	119,47	119,47	144.209,85	144.209,85	0,10	
71.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	119,59	1.093,55	130.777,64	119,59	119,59	119,59	130.777,64	130.777,64		
71.2.2.2	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa Usinado à Quente - CBUQ, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Repetimento	m³	1.856,76	3,87	7.185,66	1.446,82	1.446,82	1.446,82	5.575,97	5.575,97	22,40	
71.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	21.167,06	1,09	23.072,10	16.425,35	16.425,35	16.425,35	17.903,63	17.903,63	22,40	
71.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	10,00	115,23	1.152,30	1.152,30	1.152,30	1.152,30	100,00	100,00		
71.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	10,00	115,23	1.152,30	1.152,30	1.152,30	1.152,30	100,00	100,00		
72.0	RUA OLINDINA P. DOS SANTOS				253.988,79							
72.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.223,03				209.103,20	209.103,20		
72.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	3.706,15	0,33	1.223,03	3.156,19	3.156,19	3.156,19	1.041,54	1.041,54		
72.1.2	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	6.781,18	2,36	16.003,58	5.025,47	5.025,47	5.025,47	208.061,66	208.061,66	14,84	
72.2	CEBUQ	m³	101,71	1.207,08	122.774,11	83,39	83,39	83,39	100.658,40	100.658,40	18,01	
72.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	101,71	1.093,55	111.224,97	84,08	84,08	84,08	91.945,68	91.945,68	17,33	
72.2.2	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	203,43	3,87	787,27	167,47	167,47	167,47	648,11	648,11	17,68	
72.2.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.706,81	1,09	1.867,60	1.406,75	1.406,75	1.406,75	1.533,36	1.533,36	17,68	
72.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	unidade	1,00	115,23	115,23	115,23	115,23	115,23	100,00	100,00		
73.0	RUA ANTONIETA CAVALCANTE				245.714,58							
73.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.151,70				238.200,45	238.200,45		
73.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	3.490,00	0,33	1.151,70	3.173,70	3.173,70	3.173,70	1.047,32	1.047,32		
73.1.2	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	6.031,60	2,36	15.154,98	6.347,40	6.347,40	6.347,40	236.461,75	236.461,75	9,06	
73.2	CEBUQ	m³	96,32	1.207,08	116.624,11	95,21	95,21	95,21	114.925,09	114.925,09	3,16	
73.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	96,32	1.207,08	116.624,11	95,21	95,21	95,21	114.925,09	114.925,09	3,16	


PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SECOP/PMCG

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SECOP/PMCG

CAIXA		Grau de Sigilo	
Nº do CTE (Contrato Execução/financiamento)	2.08.027/2020	Nº do CT	01/07/20
Início da obra - data	29/06/2020	Tomador/Ag. Promotor ou Tomador	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
CTE - Valor total inicial (R\$)	18.225.646,43	Agente Financeiro ou Ag. Operador Financeiro	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CTE - Valor atual (R\$)	18.225.646,43	Fonte do Recurso	Fonte do Recurso
CTE - Valor atual (R\$)	18.225.646,43	Fonte do Recurso	Fonte do Recurso

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PREÇO UNIT. (PREÇO UNIT. EMPILHADO)			PREÇO TOTAL	EXECUÇÃO PREÇO (PONTAÇÃO)			RESULTADO FINANCEIRO (R\$)		
		QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL		ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MÉDIO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO PERÍODO	MÉDIO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO PERÍODO	DESVIO (R\$)
73.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Repetimento	m²	98,32	1.093,55	107.517,84	95,21	104.116,90	104.116,90	3,16	104.116,90	
73.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	196,64	3,87	761,00	190,42	736,93	736,93	3,16	736,93	
73.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.612,45	1,09	1.757,97	1.561,44	1.701,97	1.701,97	3,16	1.701,97	
73.3	NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	unidade	6,00	115,23	691,38	6,00	691,38	691,38		691,38	
73.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	6,00	115,23	691,38	6,00	691,38	691,38		691,38	
74.0	RUA JOÃO LUJÃO MARTINS				259.834,30		259.141,92	259.141,92		259.141,92	
74.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	3.845,55	0,33	1.269,03	3.845,55	1.269,03	1.269,03		1.269,03	
74.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	6.923,10	2,36	16.338,52	6.923,10	16.338,52	16.338,52		16.338,52	
74.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	6.923,10	2,36	16.338,52	6.923,10	16.338,52	16.338,52		16.338,52	
74.2.2	CBUQ	m²	103,85	1.207,08	125.355,26	103,85	125.355,26	125.355,26		125.355,26	
74.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Cepa	m²	103,85	1.207,08	125.355,26	103,85	125.355,26	125.355,26		125.355,26	
74.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Repetimento	m²	103,85	1.093,55	113.565,17	103,85	113.565,17	113.565,17		113.565,17	
74.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	207,70	3,87	803,80	207,70	803,80	803,80		803,80	
74.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.661,60	1,09	1.811,14	1.661,60	1.811,14	1.811,14		1.811,14	
74.3	NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	unidade	6,00	115,23	691,38	6,00	691,38	691,38		691,38	
74.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	6,00	115,23	691,38	6,00	691,38	691,38		691,38	
75.0	RUA JOSÉ GONÇALVES DE MELO				149.467,13		142.791,50	142.791,50		142.791,50	
75.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	711,68		711,68	711,68	682,76	682,76		682,76	
75.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e gride	m²	2.156,60	0,33	711,68	2.068,96	682,76	682,76		682,76	
75.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	3.930,08	2,36	9.214,59	3.817,42	142.108,74	142.108,74		142.108,74	
75.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	3.930,08	2,36	9.214,59	3.817,42	9.009,11	9.009,11		9.009,11	
75.2.2	CBUQ	m²	59,85	1.207,08	72.243,74	59,85	69.117,40	69.117,40		69.117,40	
75.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Cepa	m²	59,85	1.207,08	72.243,74	59,85	69.117,40	69.117,40		69.117,40	
75.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Repetimento	m²	59,85	1.093,55	65.448,97	59,85	62.627,61	62.627,61		62.627,61	
75.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	119,70	3,87	463,24	114,53	443,23	443,23		443,23	
75.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	873,81	1,09	952,44	836,14	911,39	911,39		911,39	

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SECOP/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda
 Rua Manoel Antonio de Sousa
 CREA 100000000-0/03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 FRANCISCO DE JESUS C. XAVIER
 5º Suplente - CREA-PB Nº 180.283504-2

CAIXA		Grat de Sigilo	
Nº do CTE (Contrato de Prestação de Serviços) 2.08.027/2020	Nº do CT 1.065.660-37	Data do CT 01/07/20	
Início da obra - data 29/06/2020	Data emissão 09/04/2021	BM - Período de referência da medição de 04/03/2021 a 07/04/2021	
Término da obra - data 26/07/2021	Tomador/Ag. Promotor ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE		
Valor total (incluindo IBS) 18.225.646,43	Agente Financiador ou Ag. Operador Repasse CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Empresa Contratada CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA			
Objeto do CTE (resumido) RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS BARRIOS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTACÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCONGÓ, SANTA CRUZ, DINAMÉFICA, CATOLÉ, CENTERÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCONGÓ, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERGIATO, MALVINAS, RIONE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA			
Local da obra (bairro/Município/UF) PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO			
Valor atual (R\$) 18.225.646,43	Fonte de Recursos outros (descrever)		

ITEM	CIZIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PREÇO UNIT. QUANTIDADE			PREÇO TOTAL	ENLUCIDO FICCO (COMBUSTÍVEL)			ENLUCIDO FINANCEIRO (R\$)			DEBIDO (R\$)	
		UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.		ACUMULADO até o PERÍODO ANTERIOR	MÉDIO DO PERÍODO	ACUMULADO até o PERÍODO ANTERIOR	MÉDIO DO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO			
75.3	NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA				230,46								
75.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	2,00	115,23	230,46								100,00
76.0	PLACAS DE OBRAS (4x2,0 m - 10 PLACAS)				37.667,20								37.667,20
76.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				37.667,20								37.667,20
76.1.1	Placa da Obra	m²	80,00	470,84	37.667,20	80,00							37.667,20
77.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (12 MESES DE OBRA)				296.880,62								224.027,59
77.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				296.880,62								224.027,59
77.1.1	Administração Local de Obra (12 meses de obra)	unidade	1,00	296.880,62	296.880,62	0,6220	0,132605	0,7546	39.367,85	39.367,85	224.027,59	24,54	
78.0	LABORATÓRIO DE BETUME (BDI DE 26,85%)				50.466,24								38.349,54
78.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				50.466,24								38.349,54
78.1.1	Laboratório de Betume (BDI de 26,85%)	mes	12,00	4.205,52	50.466,24	6,6303	0,132605	0,7629	6.692,08	6.692,08	38.349,54	24,01	
TOTAL					18.225.646,43				11.546.462,92	2.462.873,60	14.009.336,32	231,13	


Campina Grande, 09 de abril de 2021

LOCAL DATA

Assinatura do Agente Promotor/Marcador


 PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
 FRANCISCO DE JESUS C. XAVIER
 Eng. Civil - CREA-PB Nº 180.283534-2

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SECOP/PMCG


 Consórcio Rocha Cavalcante Ltda
 Eng. Civil - CREA - 180.000.000-0/000



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIRROS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTAÇÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCONGÓ, SANTA CRUZ, DINAMÉRICA, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCONGÓ, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTÃO, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA

MEMÓRIA DE CÁLCULO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO
MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	SERVIÇOS	ESTACA						QUANTIDADES			OBSERVAÇÃO				
		Inicial	Final	Comp. (AutoCAD)	Larg. (média)	Área (AutoCAD)	Altura	Volume	N.V.	dmt		Parciais	Totais		
2.0	RUA IREMAR VILLARIM														
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES														
2.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	0,00 + 0,00	6,00 + 12,75	132,75	9,95	1320,86								1320,86	Trecho 01
														Executado: 1320,86 m²	
2.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO														
2.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	0,00 + 0,00	6,00 + 12,75	132,75	9,15	1215,31								1215,31	Trecho 01
														Executado: 1215,31 m²	
2.2.2	CBUQ														
2.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. -Capa	0,00 + 0,00	6,00 + 12,75	132,75	9,15	1215,31	0,05	60,77	1,00					60,77	Trecho 01
														Executado: 60,77 m²	
2.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora							60,77	1,00					60,77	(VIDE CBUQ CAPA)
														Executado: 60,77 m²	
2.2.4	Transporte local de material betuminoso							60,77	12,10					735,32	(VIDE CBUQ CAPA)
														Executado: 735,32 m³ x km	
8.0	RUA VIGOLVINO WANDERLEY														
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES														
8.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	0,00 + 0,00	6,00 + 16,27	136,27	10,08	1373,60								1373,60	Trecho 01
		0,00 + 0,00	5,00 + 10,03	110,23	10,90	1199,33								1199,33	Trecho 02
		0,00 + 0,00	8,00 + 15,41	175,41	12,00	2104,92								2104,92	Trecho 03
														Executado: 4677,85 m²	
8.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO														
8.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	0,00 + 0,00	6,00 + 16,27	136,27	9,28	1265,21								1265,21	Trecho 01
		0,00 + 0,00	5,00 + 10,03	110,03	10,10	1111,40								1111,40	Trecho 02
		0,00 + 0,00	8,00 + 15,41	175,41	11,20	1963,99								1963,99	Trecho 03
														Executado: 4340,60 m²	
8.2.2	CBUQ														
8.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. -Capa	0,00 + 0,00	6,00 + 16,27	136,27	9,28	1265,21	0,048	60,73	1,00					60,73	Trecho 01
		0,00 + 0,00	5,00 + 10,03	110,03	10,10	1111,40	0,047	52,24	1,00					52,24	Trecho 02
		0,00 + 0,00	8,00 + 15,41	175,41	11,20	1963,99	0,048	94,27	1,00					94,27	Trecho 03
														Executado: 207,24 m²	
8.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora							207,24	1,00					207,24	(VIDE CBUQ CAPA)
														Executado: 207,24 m²	

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
FRANCISCO DE JESUS C. XAVIER
ENR Cvt. - CREA-PB Nº 180.283594-2

Adriano Gomes do Nascimento
Coordenador de Planejamento Obras
SECOB/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
Espirito Santo do Olivieira
CNPJ: 06.900.000/0001-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO
MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	SERVIÇOS	ESTACA		Comp. (AutoCAD)	Larg. (média)	Área (AutoCAD)	Altura	Volume	N.V.	dnt	QUANTIDADES		OBSERVAÇÃO
		Inicial	Final								Parciais	Totais	
8.2.4	Transporte local de material betuminoso							207,24		11,70	2424,71 Executado:	2424,71 m² x km	(VIDE CBUQ, CAPA)
9.0	RUA ALEXANDRINO CAVALCANTI										432,42 Executado:	432,42 m²	Trecho 01
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00	0,00 + 3,00 + 17,08	77,08	5,61	432,42							
9.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade									1,00	371,11 Executado:	371,11 m²	Trecho 01
9.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00 + 3,00 + 17,08	77,08	4,81	371,11							
9.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte									1,00	17,44 Executado:	17,44 m³	Trecho 01
9.2.2	CBUQ	0,00	0,00 + 3,00 + 17,08	77,08	4,81	371,11	0,047	17,44	17,44	1,00	17,44 Executado:	17,44 m³	(VIDE CBUQ, CAPA)
9.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa									9,10	158,70 Executado:	158,70 m² x km	(VIDE CBUQ, CAPA)
9.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com cernição basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora												
9.2.4	Transporte local de material betuminoso										3909,27 Executado:	3909,27 m³	Trecho 01
10.0	RUA JOÃO ALVES DE OLIVEIRA												
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00	0,00 + 19,00 + 5,53	385,53	10,14	3909,27							
10.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade									1,00	3601,34 Executado:	3601,34 m²	Trecho 01
10.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00 + 19,00 + 5,53	385,53	9,34	3601,34							
10.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte										176,47 Executado:	176,47 m³	Trecho 01
10.2.2	CBUQ	0,00	0,00 + 19,00 + 5,53	385,53	9,34	3601,34	0,049	176,47	176,47	1,00	176,47 Executado:	176,47 m³	(VIDE CBUQ, CAPA)
10.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa									2,00	176,47 Executado:	176,47 m³	(VIDE CBUQ, CAPA)
10.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com cernição basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora										1994,11 Executado:	1994,11 m² x km	(VIDE CBUQ, CAPA)
10.2.4	Transporte local de material betuminoso									11,30	176,47 Executado:	176,47 m³	

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE

Adriano Gomes do Nascimento
Coordenador de Planejamento Obras
SECOB/P.M.C.G.

Consultoria Técnica Gerenciadora Ltda
Rua...
CREA 16095338 D-28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ESTACA	QUANTIDADES						OBSERVAÇÃO				
	Final	Comp. (AutoCAD)	Larg. (média)	Área (AutoCAD)	Altura	Volume		N.V.	dmt	Parciais	Totais
30	8,00 + 0,00	150,00	7,10	1136,00					1136,00 Executado:	1136,00 m ² Trecho 01	
30	8,00 + 0,00	160,00	6,30	1007,84			1,00		1007,84 Executado:	1007,84 m ² Trecho 01	
30	8,00 + 0,00	160,00	6,30	1007,84	0,05	50,39	1,00		50,39 Executado:	50,39 m ³ Trecho 01	
						50,39			50,39 Executado:	50,39 m ³ (VIDE CBUQ CAPA)	
						50,39		10,20	513,98 Executado:	513,98 m ³ x km (VIDE CBUQ CAPA)	
00	17,00 + 2,67	342,67	8,72	2988,08					2988,08 841,11 Executado:	Trecho 01 Trecho 02	
00	4,00 + 2,30	82,30	10,22	841,11					841,11 Executado:	841,11 m ² Trecho 02	
						3829,19			3829,19 Executado:	3829,19 m ² Trecho 01	
00	17,00 + 2,67	342,67	7,92	2712,30			1,00		2712,30 775,65 Executado:	Trecho 01 Trecho 02	
00	4,00 + 2,30	82,30	9,42	775,65			1,00		775,65 Executado:	775,65 m ² Trecho 02	
						135,62			135,62 38,78 Executado:	Trecho 01 Trecho 02	
00	17,00 + 2,67	342,67	7,92	2712,30	0,05	135,62	1,00		135,62 38,78 Executado:	135,62 m ³ Trecho 01	
00	4,00 + 2,30	82,30	9,42	775,65	0,05	38,78	1,00		38,78 Executado:	38,78 m ³ Trecho 02	
						174,40			174,40 Executado:	174,40 m ³ (VIDE CBUQ CAPA)	
						174,40		10,70	1866,08 Executado:	1866,08 m ³ x km (VIDE CBUQ CAPA)	

Adriano Gomes do Nascimento
Coordenador de Planejamento Obras
SEC08/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
Eng. João Nivaldo Oliveira
CREA: 150025254-0/04

L	dmt	QUANTIDADES		OBSERVAÇÃO
		Parciais	Totais	
		1682,66 442,01 1796,04 Executado:	3920,71 m ²	Trecho 01 Trecho 02 Trecho 03
1,00		1514,98		Trecho 01
1,00		384,31		Trecho 02
1,00		1701,11		Trecho 03
		Executado:	3600,40 m ²	
1,00		71,20		Trecho 01
1,00		18,83		Trecho 02
1,00		81,65		Trecho 03
		Executado:	171,68 m ³	
1,00		171,68		(VIDE CBUQ CAPA)
		Executado:	171,68 m ³	
10,70		1856,98		(VIDE CBUQ CAPA)
		Executado:	1856,98 m ³ x km	
		2144,42		Trecho 01
		Executado:	2144,42 m ³	
1,00		3948,96		Trecho 01
1,00		50,82		Rua Professor José Ceelho
1,00		50,82		Rua Expedicionários do Brasil
		Executado:	4050,60 m ²	
0,00		57,26		Trecho 01
0,00		0,66		Rua Professor José Ceelho
0,00		0,69		Rua Expedicionários do Brasil
		Executado:	58,61 m ²	

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

Eng. João Nivaldo Oliveira
CREA: 150025254-0/04



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO
MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	SERVIÇOS	ESTACA					QUANTIDADES			OBSERVAÇÃO			
		Inicial	Final	Comp. (AutoCAD)	Larg. (média)	Área (AutoCAD)	Altura	Volume	N.V.		dmt	Parciais	Totale
23.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ , BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017.- Reperfilamento	0,00 + 0,00	10,00 + 12,74	212,74	9,28	1974,43	0,029	57,26	1,00		57,26		Trecho 01 Rua Professor José Coelho Rua Expedicionários do Brasil 58,61 m²
				3,00	8,47	25,41	0,026	0,66	1,00		0,66		(VIDE CBUQ CAPA)
				3,00	8,47	25,41	0,027	0,69	1,00		0,69		(VIDE CBUQ REPERFILAMENTO)
													Executado: 58,61 m²
23.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora							58,61	1,00		58,61		(VIDE CBUQ CAPA)
								58,61	1,00		58,61		(VIDE CBUQ REPERFILAMENTO)
								58,61	10,20		597,82		(VIDE CBUQ CAPA)
								58,61	10,20		597,82		(VIDE CBUQ REPERFILAMENTO)
													Executado: 1195,64 m² x km
31.0	RUA EPITÁCIO PESSOA												
31.1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
31.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	0,00 + 0,00	14,00 + 18,67	298,67	13,84	4133,59					4133,59		Trecho 01
													Executado: 4133,59 m²
31.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO												
31.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	0,00 + 0,00	14,00 + 18,67	298,67	13,04	3894,01			1,00		3894,01		Trecho 01
													Executado: 3894,01 m²
31.2.2	CBUQ												
31.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ . camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017.- Capa	0,00 + 0,00	14,00 + 18,67	298,67	13,04	3894,01	0,05	194,70	1,00		194,70		Trecho 01
													Executado: 194,70 m³
													(VIDE CBUQ CAPA)
													Executado: 194,70 m³
31.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora												(VIDE CBUQ CAPA)
													Executado: 1830,18 m² x km
31.2.4	Transporte local de material betuminoso									9,40			(VIDE CBUQ CAPA)
													Executado: 1830,18 m² x km
35.0	RUA PROFESSOR MAURO LUNA												
35.1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
35.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	0,00 + 0,00	3,00 + 5,79	65,79	10,19	670,40					670,40		Trecho 05
													Executado: 670,40 m²
35.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO												
35.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	0,00 + 0,00	3,00 + 5,79	65,79	9,39	617,99			1,00		617,99		Trecho 05
													Executado: 617,99 m²

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
 Engº Civil - CREA-PB Nº 180.283534-2

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SECOP/PMCC

Construtora Rycka Cavalcante Ltda.
 Engenharia e Arte de Desenho
 CREA 18005240/05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO
MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	SERVIÇOS	ESTACA						QUANTIDADES			OBSERVAÇÃO			
		Inicial	Final	Comp. (AutoCAD)	Long. (média)	Área (AutoCAD)	Altura	Volume	N.V.	dmr		Parciais	Totais	
35.2.2	CBUQ													
35.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	0,00 + 0,00	3,00 + 5,79	65,79	9,39	617,99	0,019	17,92	1,00		17,92	17,92	Trecho 05	17,92 m³
								Executado:			Executado:	17,92		
35.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora							17,92	1,00		17,92			(VIDE CBUQ, CAPA)
								Executado:			Executado:	17,92		
35.2.4	Transporte local de material betuminoso							17,92		11,90	213,25			(VIDE CBUQ, CAPA)
								Executado:			Executado:	213,25		(VIDE CBUQ, CAPA)
39.0	RUA DESEMBARGADOR AZEVEDO													
39.1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
39.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	0,00 + 0,00	7,00 + 4,21	144,21	10,01	1443,54					1443,54		Trecho 03	
		0,00 + 0,00	1,00 + 16,09	36,09	3,73	134,62					134,62		Trecho 04	
								Executado:			Executado:	1578,16		
39.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO													
39.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	0,00 + 0,00	7,00 + 4,21	144,21	9,21	1328,72			1,00		1328,72		Trecho 03	
		0,00 + 0,00	1,00 + 16,09	36,09	2,93	105,57			1,00		105,57		Trecho 04	
								Executado:			Executado:	1434,29		
39.2.2	CBUQ													
39.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	0,00 + 0,00	7,00 + 4,21	144,21	9,21	1328,72	0,05	66,44	1,00		66,44		Trecho 03	
		0,00 + 0,00	1,00 + 16,09	36,09	2,93	105,57	0,05	5,28	1,00		5,28		Trecho 04	
								Executado:			Executado:	71,72		
39.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora							71,72	1,00		71,72			(VIDE CBUQ, CAPA)
								Executado:			Executado:	71,72		
39.2.4	Transporte local de material betuminoso							71,72			903,67			(VIDE CBUQ, CAPA)
								Executado:			Executado:	903,67		
41.0	RUA ANTONIO NAVARRO													
41.1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
41.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	0,00 + 0,00	17,00 + 11,51	351,51	9,90	3479,95					3479,95		Trecho 01	
		0,00 + 0,00	4,00 + 5,86	85,86	9,01	773,60					773,60		Trecho 02	
		0,00 + 0,00	12,00 + 13,98	253,98	9,85	2501,70					2501,70		Trecho 03	
		0,00 + 0,00	5,00 + 4,55	104,55	9,97	1042,36					1042,36		Trecho 04	
		0,00 + 0,00	5,00 + 5,37	105,37	9,94	1047,38					1047,38		Trecho 05	
		0,00 + 0,00	4,00 + 4,17	84,17	9,84	828,23					828,23		Trecho 06	
		0,00 + 0,00	4,00 + 5,50	85,50	9,78	836,19					836,19		Trecho 07	

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
Adriano Gomes do Nascimento
 Eng. Civil - CREA-PB N.º 180.285/04-2

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SECOP/IPMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
 Eng. João Antônio de Oliveira
 CREA 199935/09-01/PB



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO
MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	SERVIÇOS	ESTACA						QUANTIDADES				OBSERVAÇÃO		
		Inicial	Final	Comp. (AutoCAD)	Log. (média)	Área (AutoCAD)	Altura	Volume	N.V.	dmr	Parcels		Totale	
41.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO													
41.2.1	41.2.1.1 Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	0,00 + 0,00	4,00 + 3,27	83,27	10,02	3197,74	9,10	3197,74	0,046	147,10	1,00	1,00	834,37	Trecho 08
		0,00 + 0,00	4,00 + 5,86	77,08	9,99	765,40	8,21	765,40	0,046	32,43	1,00	1,00	765,40	Trecho 09
		0,00 + 0,00	12,00 + 13,98	253,98	9,95	2297,56	9,17	2297,56	0,046	103,39	1,00	1,00	769,68	Trecho 10
		0,00 + 0,00	5,00 + 4,55	104,55	9,17	958,85	9,14	958,85	0,046	44,11	1,00	1,00	1039,33	Trecho 11
		0,00 + 0,00	5,00 + 5,37	105,37	9,14	962,82	9,14	962,82	0,046	43,33	1,00	1,00	373,85	Trecho 12
		0,00 + 0,00	4,00 + 4,17	84,17	9,04	761,05	9,04	761,05	0,046	35,01	1,00	1,00	14282,04	m²
		0,00 + 0,00	4,00 + 5,50	85,50	8,98	767,48	8,98	767,48	0,046	36,07	1,00	1,00		Trecho 01
		0,00 + 0,00	4,00 + 3,27	83,27	9,22	765,08	9,22	765,08	0,046	35,33	1,00	1,00		Trecho 02
		0,00 + 0,00	3,00 + 17,08	77,08	9,13	704,11	9,13	704,11	0,046	35,33	1,00	1,00		Trecho 03
		0,00 + 0,00	3,00 + 17,20	77,20	9,17	707,80	9,17	707,80	0,046	33,80	1,00	1,00		Trecho 04
		0,00 + 0,00	5,00 + 3,45	103,45	9,15	946,77	9,15	946,77	0,046	45,55	1,00	1,00		Trecho 05
		0,00 + 0,00	1,00 + 16,76	36,76	9,37	344,33	9,37	344,33	0,046	16,53	1,00	1,00		Trecho 06
													603,92	m³
													603,92	(VIDE CBUQ CAPA)
41.2.2	41.2.2.1 CBUQ													
		0,00 + 0,00	17,00 + 11,51	351,51	9,10	3197,74	9,10	3197,74	0,046	147,10	1,00	1,00	147,10	Trecho 01
		0,00 + 0,00	4,00 + 5,86	85,86	8,21	765,02	8,21	765,02	0,046	32,43	1,00	1,00	32,43	Trecho 02
		0,00 + 0,00	12,00 + 13,98	253,98	9,05	2297,56	9,05	2297,56	0,046	103,39	1,00	1,00	103,39	Trecho 03
		0,00 + 0,00	5,00 + 4,55	104,55	9,17	958,85	9,17	958,85	0,046	44,11	1,00	1,00	44,11	Trecho 04
		0,00 + 0,00	5,00 + 5,37	105,37	9,14	962,82	9,14	962,82	0,046	43,33	1,00	1,00	43,33	Trecho 05
		0,00 + 0,00	4,00 + 4,17	84,17	9,04	761,05	9,04	761,05	0,046	35,01	1,00	1,00	35,01	Trecho 06
		0,00 + 0,00	4,00 + 5,50	85,50	8,98	767,48	8,98	767,48	0,046	36,07	1,00	1,00	36,07	Trecho 07
		0,00 + 0,00	4,00 + 3,27	83,27	9,22	765,08	9,22	765,08	0,046	35,33	1,00	1,00	35,33	Trecho 08
		0,00 + 0,00	3,00 + 17,08	77,08	9,13	704,11	9,13	704,11	0,046	33,80	1,00	1,00	33,80	Trecho 09
		0,00 + 0,00	3,00 + 17,20	77,20	9,17	707,80	9,17	707,80	0,046	33,27	1,00	1,00	33,27	Trecho 10
		0,00 + 0,00	5,00 + 3,45	103,45	9,15	946,77	9,15	946,77	0,046	45,55	1,00	1,00	45,55	Trecho 11
		0,00 + 0,00	1,00 + 16,76	36,76	9,37	344,33	9,37	344,33	0,046	16,53	1,00	1,00	16,53	Trecho 12
													603,92	m³
													603,92	(VIDE CBUQ CAPA)
41.2.3	41.2.3.1 Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-escabiosa													
													603,92	(VIDE CBUQ CAPA)
41.2.4	41.2.4.1 Transporte local de material betuminoso													
													603,92	(VIDE CBUQ CAPA)
44.0	44.0.1 RUA PROFESSOR LUIZ BILLIARD													
													6341,16	m² x km
													6341,16	m² x km

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO URBANO
EPPº Civil - CREA-PB Nº 050.283534-2

Adriano Gomes do Nascimento
Coordenador de Planejamento Urbano
SECOB/PMCG

Construtora Rocha Cevalcante Ltda.
Eng.º Civil - CREA-PB Nº 050.283534-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO
MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	SERVIÇOS	ESTACA				Comp. (AutoCAD)	Larg. (mêdo)	Área (AutoCAD)	Altura	Volume	N.V.	dmt	QUANTIDADES		OBSERVAÇÃO
		Inicial	Final	Parciais	Totais										
44.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	0,00 + 0,00	11,00 + 11,11	231,11	12,02	2777,94							2777,94 Executado:	Trecho 01 m²	
44.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO														
44.2.1	Pintura de lição com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	0,00 + 0,00	11,00 + 11,11	231,11	11,22	2592,87				1,00			2592,87 41,88 Executado:	Trecho 01 Rua Eng. Walbert Pimentel 2634,75 m²	
44.2.2	CBUQ														
44.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017.-Copa	0,00 + 0,00	11,00 + 11,11	231,11	11,22	2592,87		0,049	127,05	1,00			127,05 Executado:	Trecho 01 127,05 m³	
44.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017.-Copa			3,00	6,98	20,94		0,028	0,59	1,00			0,59 Executado:	Rua Eng. Walbert Pimentel 0,59 m³	
44.2.2.3	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017.-Reperfilamento			3,00	6,98	20,94		0,026	0,54	1,00			0,54 Executado:	Rua Eng. Walbert Pimentel 0,54 m³	
44.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-afibadora								127,05	1,00			127,05	(WIDE CBUQ,CAPA 05 CM)	
									0,59	1,00			0,59	(WIDE CBUQ,CAPA 03 CM)	
									0,54	1,00			0,54	(WIDE CBUQ,REPERFILAMENTO)	
44.2.4	Transporte local de material betuminoso								127,05	7,40			940,17	(WIDE CBUQ,CAPA 05 CM)	
									0,59	7,40			4,27	(WIDE CBUQ,CAPA 03 CM)	
									0,54	7,40			4,00	(WIDE CBUQ,REPERFILAMENTO)	
													948,54	m³ x km	
77.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (12 MESES DE OBRA)														
77.1	SERVIÇOS PRELIMINARES														
77.1.1	Administração local da Obra (12 meses de obra)									13,2605%			13,2605%	13,2605% unidade	
78.0	LABORATÓRIO DE BETUME (BDI DE 26,85%)														
78.1	SERVIÇOS PRELIMINARES														
78.1.1	Laboratório de Betume (BDI de 26,85%)									0,132650			0,132650	0,132650 %	

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
Eng. Civil - CREA-PB N°160 28.35.34-2

Adriano Gomes do Nascimento
Coordenador de Planejamento-Obras
SECOB/PMCG


Construtora Rocha Cavalcante Ltda
Eng. João Nivaldo Cabral
CREA 10050508 DDP




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIROS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTAÇÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCONGÓ, SANTA CRUZ, DINAMÉRICA, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCONGÓ, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTÃO, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA

PLANTA (CROQUI)

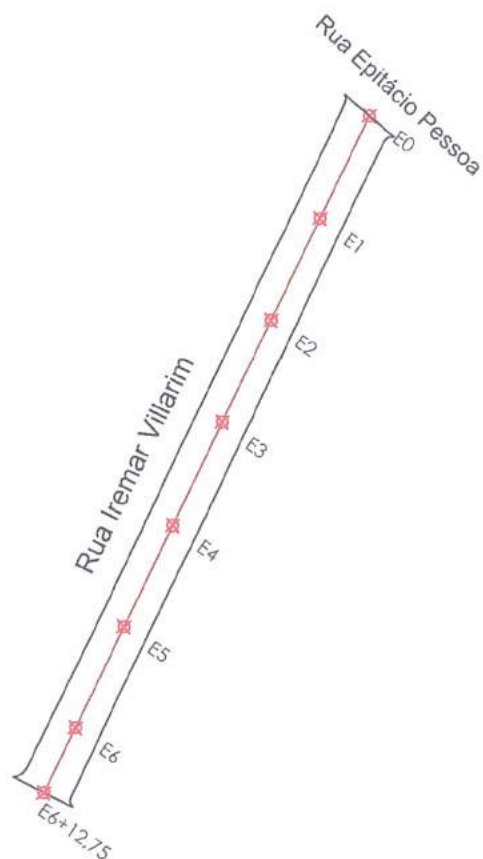


01 - Planta Baixa Estaqueamento

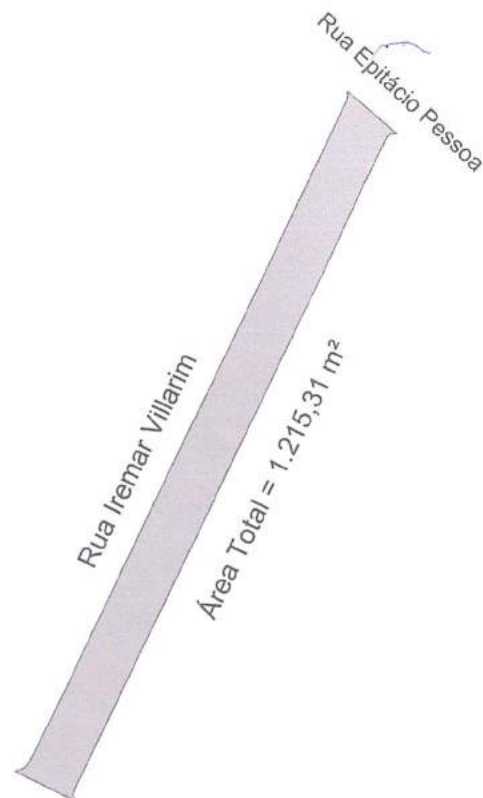

02 - Planta Baixa com Pavimentação Asfáltica (Capa)

Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: Iremar Villarim	
Bairro: Centro	
Data/Ano: março/2021	Prancha: 1/1
RUA IREMAR VILLARIM	
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²
ÁREA DA RUA – CAPA	1.215,31 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	132,75 m
LARGURA DA RUA (média)	9,15 m

03 – Planta de Situação

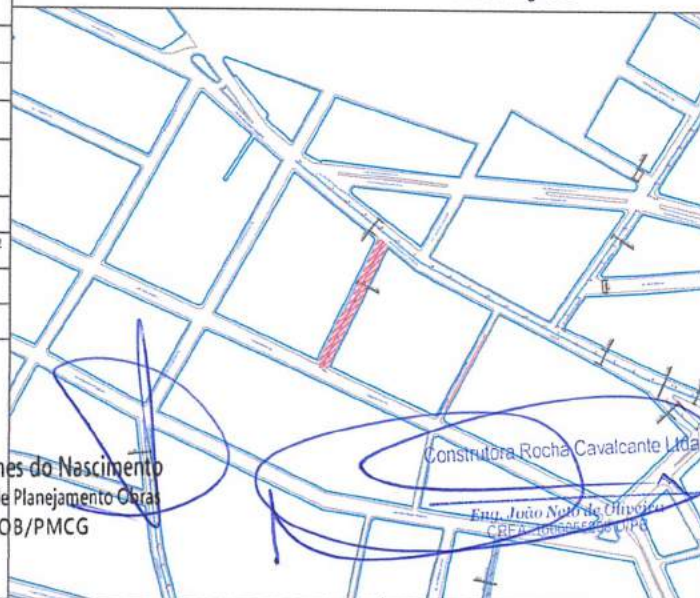


PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
Eng.º Civil - CREA-PB Nº 180.283594-2


Adriano Gomes do Nascimento
Coordenador de Planejamento Obras
SECOB/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

Eng.º João Nogueira Oliveira
CREA-PB Nº 180.283594-2

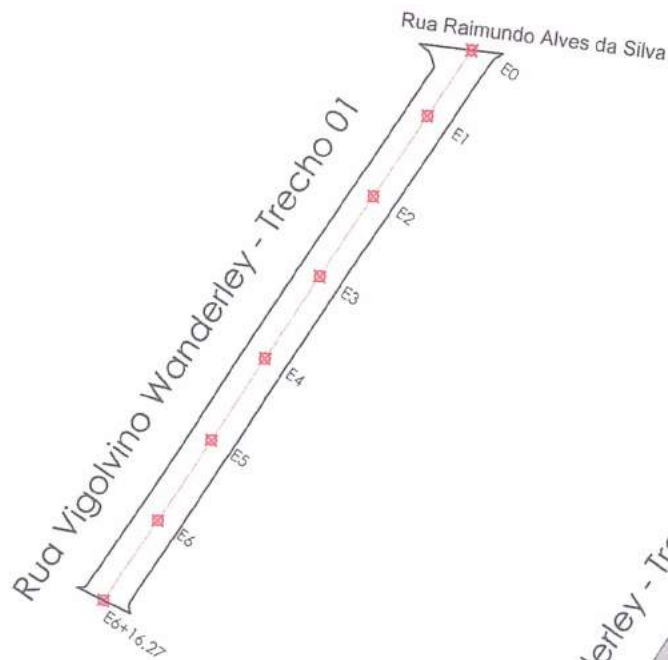


01 - Planta Baixa Estaqueamento

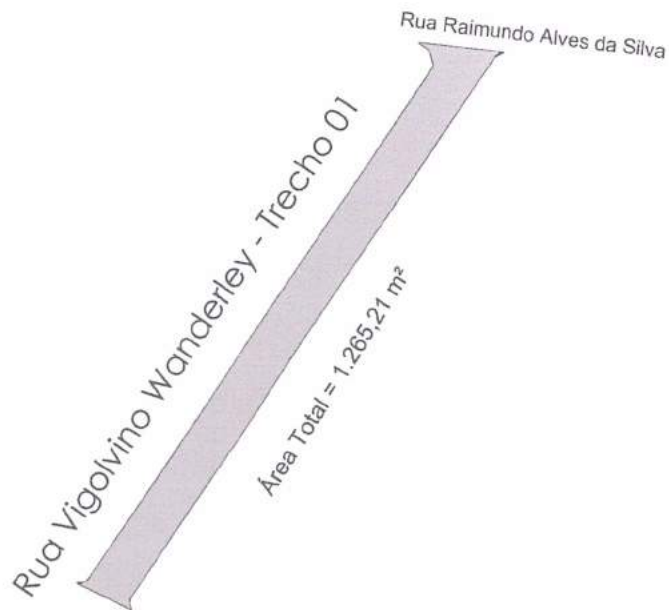

02 - Planta Baixa com Pavimentação Asfáltica (Capa)

Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: Vigolvino Wanderley – Trecho 01	
Bairro: Centro	
Data/Ano: março/2021	Prancha: 1/3
RUA VIGOLVINO WANDERLEY – TRECHO 01	
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²
ÁREA DA RUA – CAPA	1.265,21 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	136,27 m
LARGURA DA RUA (média)	9,28 m


03 – Planta de Situação

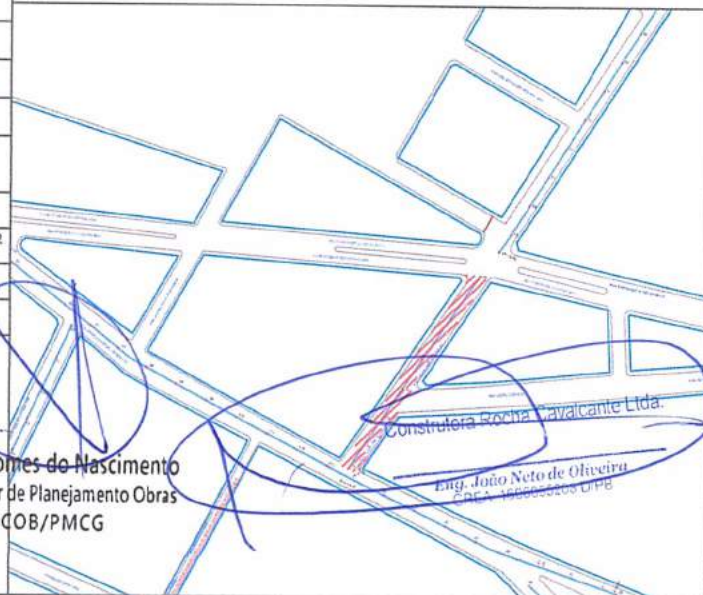


PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng.º Cmt. - CREA-PE Nº 180.203594-2

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SECOP/PMCG

Eng. João Neto de Oliveira
 CREA - 185503/2018-DFPE

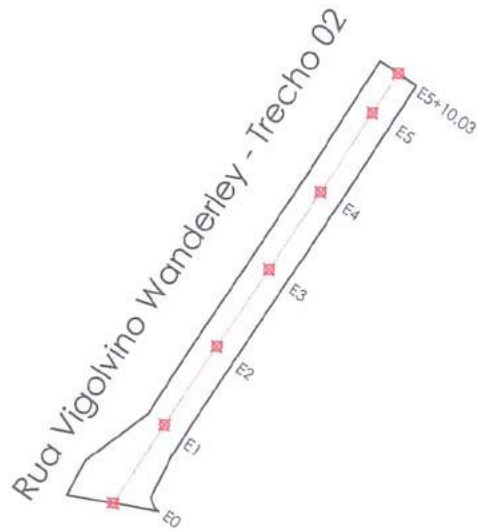


01 - Planta Baixa Estaqueamento

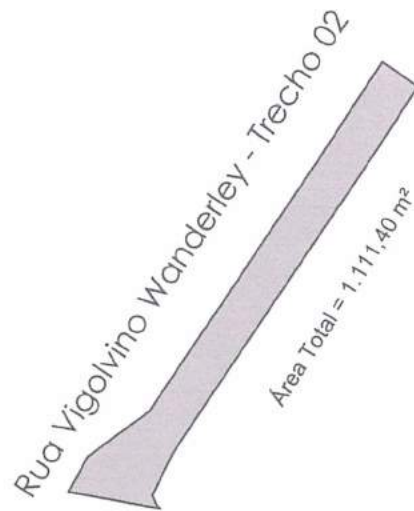

02 - Planta Baixa com Pavimentação Asfáltica (Capa)

Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: Vigolvino Wanderley – Trecho 02	
Bairro: Centro	
Data/Ano: março/2021	Prancha: 2/3
RUA VIGOLVINO WANDERLEY – TRECHO 02	
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²
ÁREA DA RUA – CAPA	1.111,40 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	110,03 m
LARGURA DA RUA (média)	10,10 m


03 – Planta de Situação

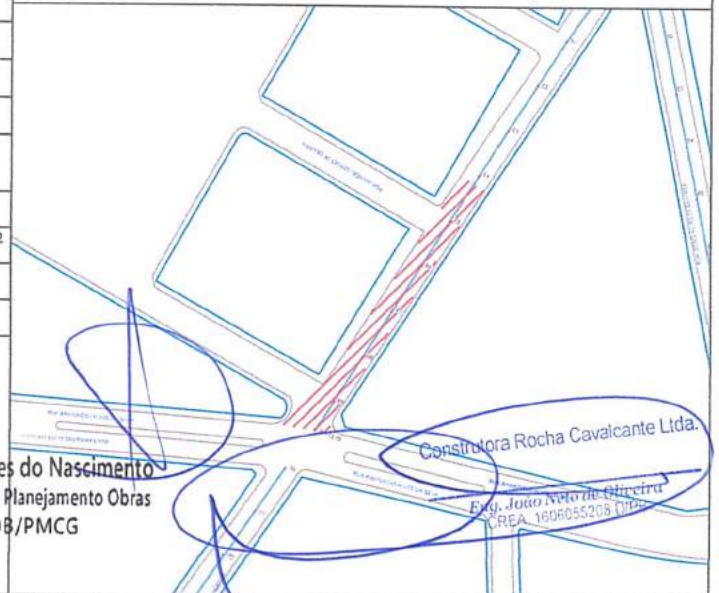

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng.º Cml - CREA-PB Nº 160.283594-2

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SECOP/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
 Eng. João Neto de Oliveira
 CREA 160605208 PB

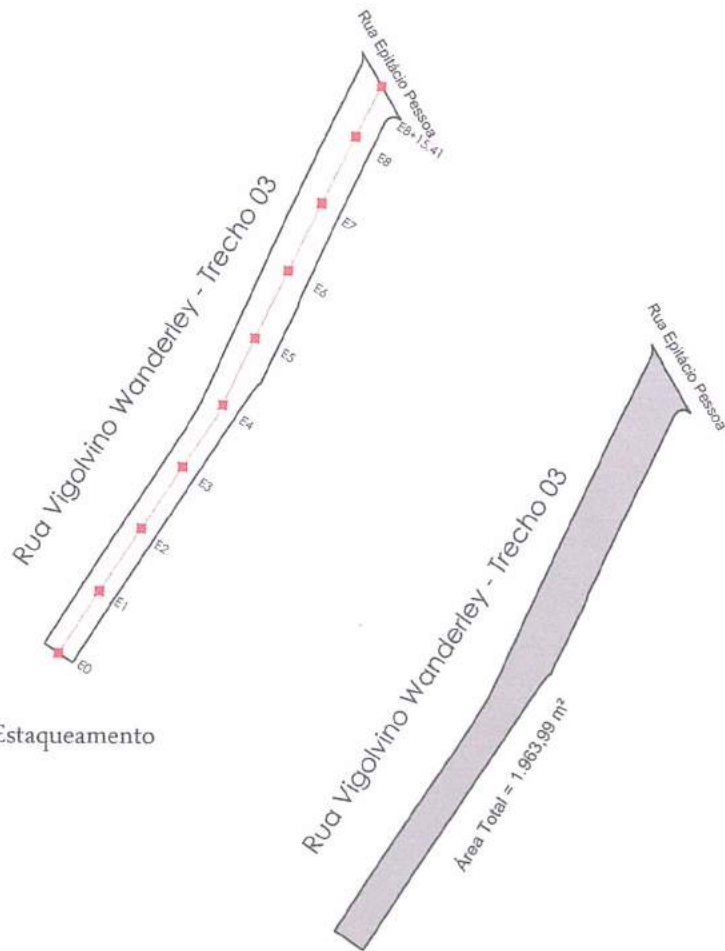


01 - Planta Baixa Estaqueamento

02 - Planta Baixa com Pavimentação Asfáltica (Capa)

Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: Vigolvino Wanderley – Trecho 03	
Bairro: Centro	
Data/Ano: março/2021	Prancha: 3/3
RUA VIGOLVINO WANDERLEY – TRECHO 03	
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²
ÁREA DA RUA – CAPA	1.963,99 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	175,41 m
LARGURA DA RUA (média)	11,20 m


03 – Planta de Situação

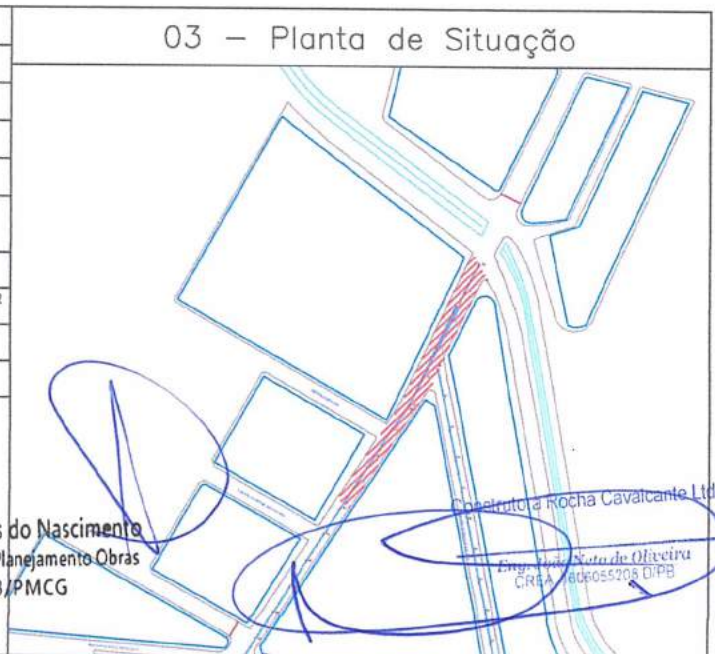


PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
 Francisco de Jesus C. Xavier
 Engº Civi. - CREA-PB Nº 100.283694-2

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SECOB/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
 Eng.º Roberto Neto de Oliveira
 CREA - 14885205 D/PB

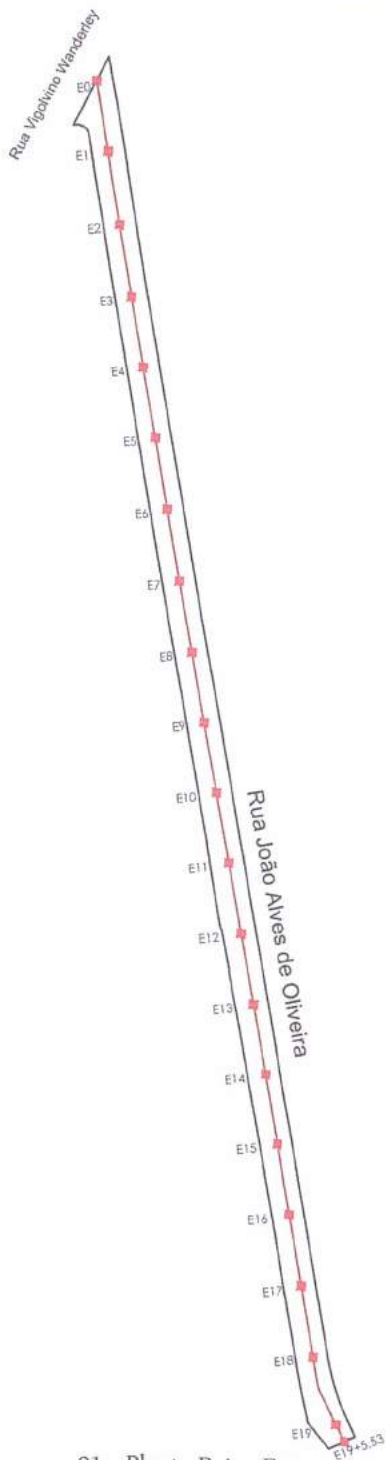

01 - Planta Baixa Estaqueamento

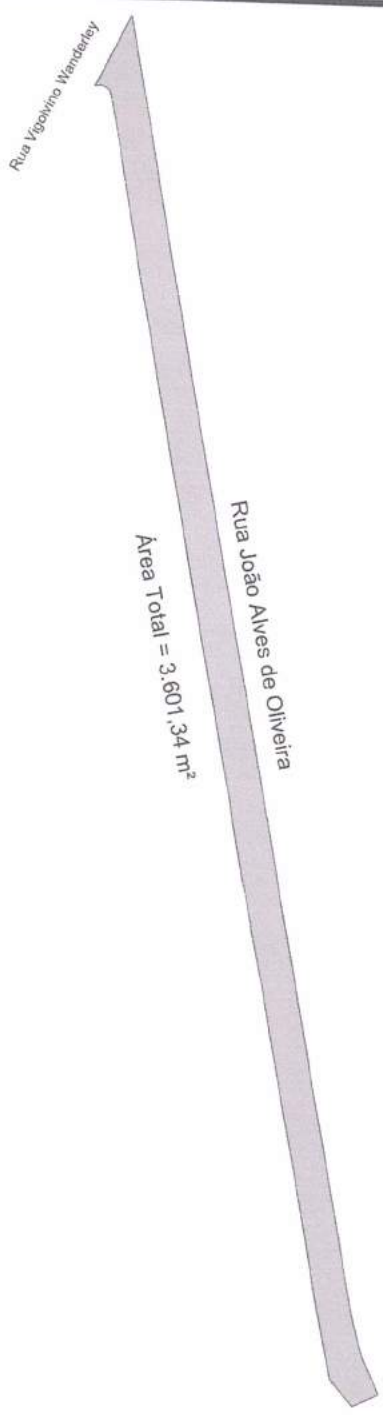


02 - Planta Baixa com Pavimentação Asfáltica (Capa)



Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: João Alves de Oliveira	
Bairro: Centro	
Data/Ano: março/2021	Prancha: 1/1
RUA JOÃO ALVES DE OLIVEIRA	
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²
ÁREA DA RUA – CAPA	3.601,34 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	385,53 m
LARGURA DA RUA (média)	9,34 m


03 – Planta de Situação

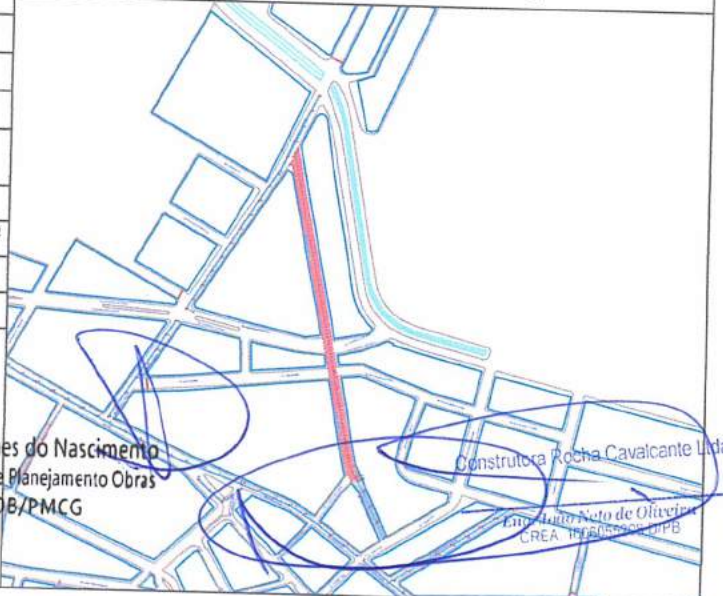


PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng.º CMI - CREA-PB Nº 180.203694-2

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SECOB/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda
 Eng.º João Neto de Oliveira
 CREA - PB 180.203694-2




01 - Planta Baixa Estaqueamento

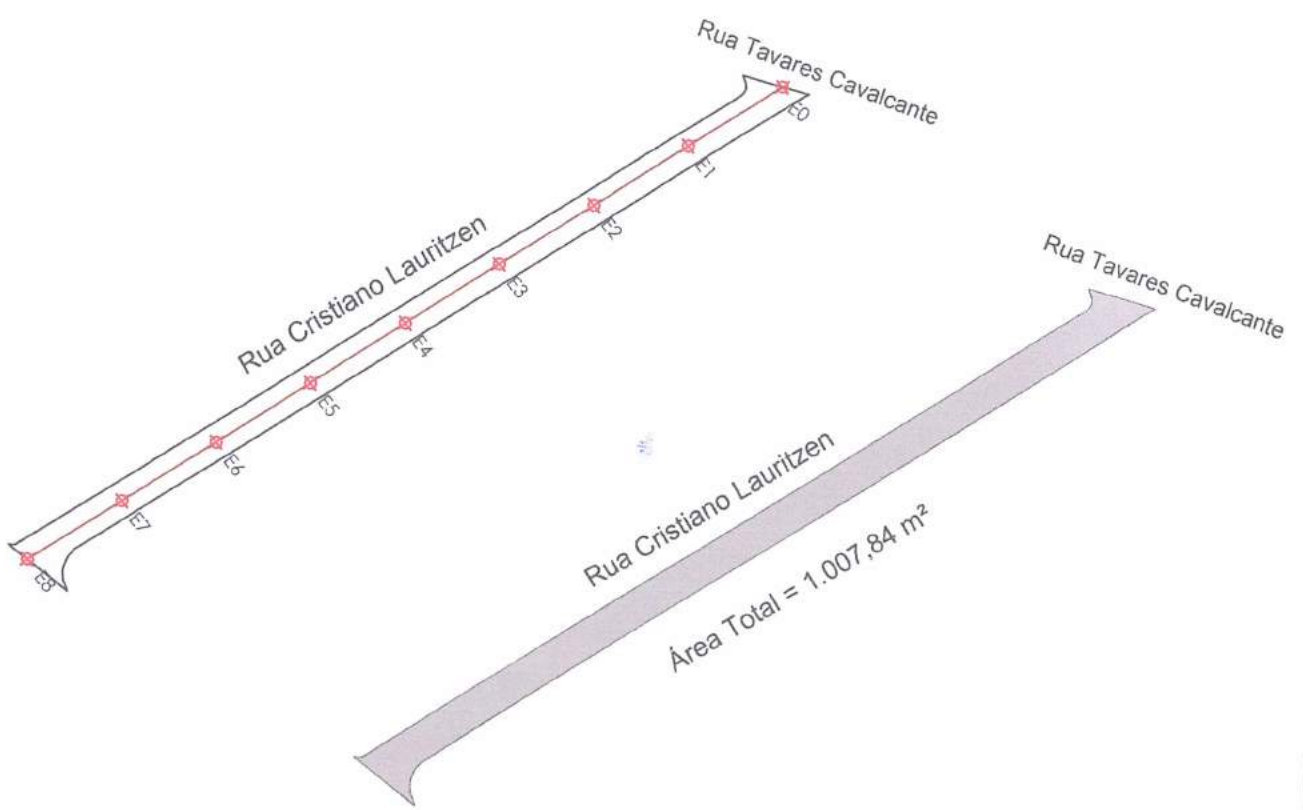

02 - Planta Baixa com Pavimentação Asfáltica (Capa)

Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: Cristiano Lauritzen	
Bairro: Centro	
Data/Ano: março/2021	Prancha: 1/1
RUA CRISTIANO LAUTIZEN	
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²
ÁREA DA RUA – CAPA	1.007,84 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	160,00 m
LARGURA DA RUA (média)	6,30 m


03 – Planta de Situação

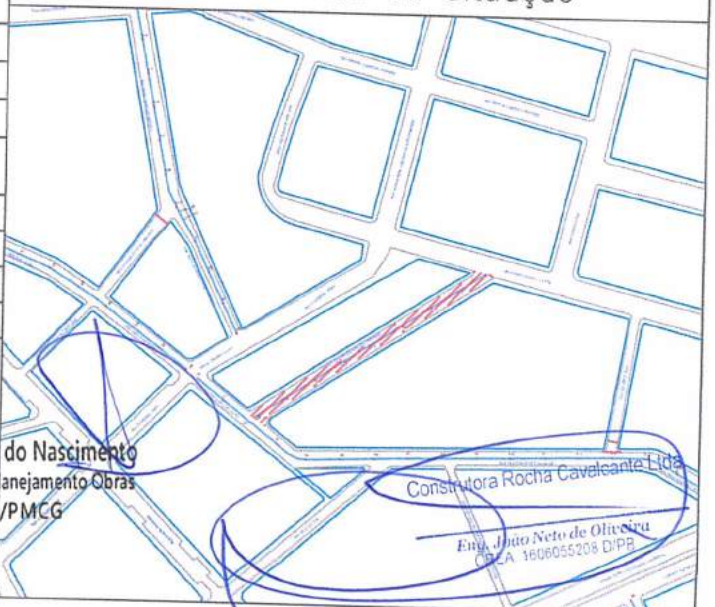


PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
 Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng.º Civi. - CREA-PB Nº 108 28394-2

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SEC0B/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda
 Eng.º João Neto de Oliveira
 CREA 160605208 D/PB

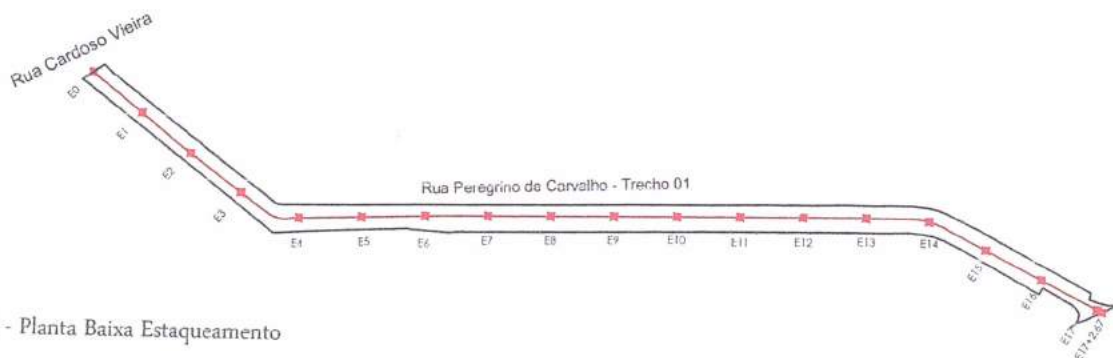


01 - Planta Baixa Estaqueamento

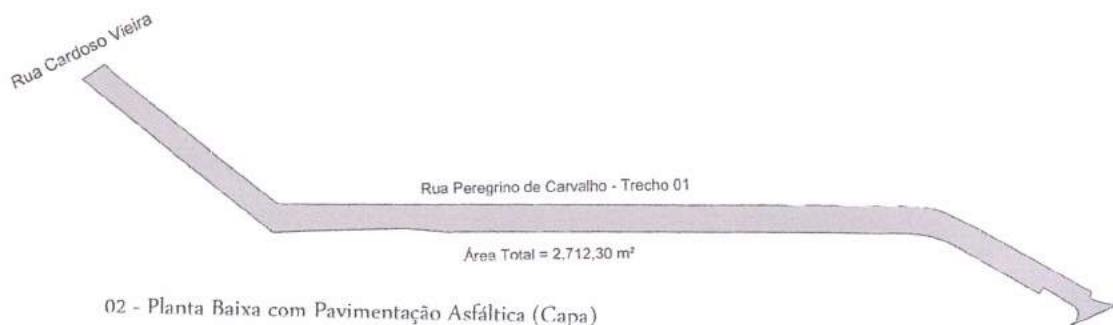

02 - Planta Baixa com Pavimentação Asfáltica (Capa)

Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: Peregrino de Carvalho – Trecho 01	
Bairro: Centro	
Data/Ano: março/2021	Prancha: 1/2
RUA PEREGRINO DE CARVALHO – TRECHO 01	
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²
ÁREA DA RUA – CAPA	2.712,30 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	342,67 m
LARGURA DA RUA (média)	7,92 m

03 – Planta de Situação

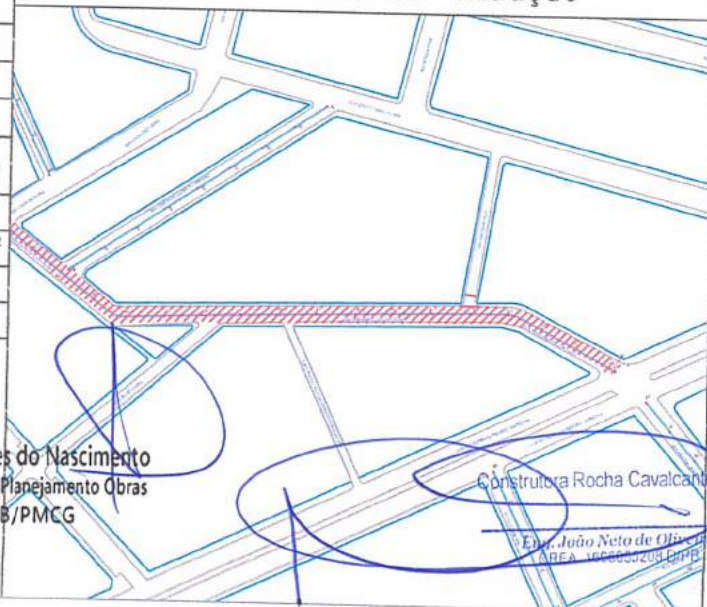


PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng.º Cmt. - CREA-PB Nº 180.283/94-2

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SECOS/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

Eng.º João Neto de Oliveira
 CREA - 106603/2014-01/PA

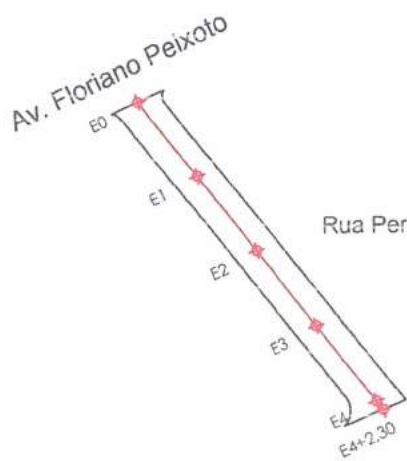

01 - Planta Baixa Estaqueamento



02 - Planta Baixa com Pavimentação Asfáltica (Capa)


Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA
 Projeto: Pavimentação Asfáltica
 Rua: Peregrino de Carvalho – Trecho 02
 Bairro: Centro
 Data/Ano: março/2021 Prancha: 2/2

RUA PEREGRINO DE CARVALHO – TRECHO 02	
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²
ÁREA DA RUA – CAPA	775,65 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	82,30 m
LARGURA DA RUA (média)	9,42 m

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
 Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng. Civil - CREA-PB Nº 180.283694-2


Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SECOB/PMCG

03 – Planta de Situação

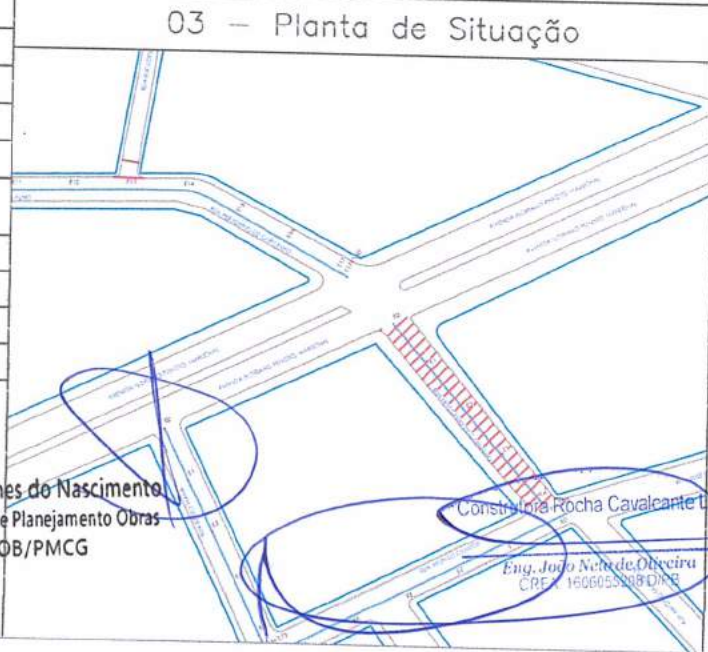

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

Eng. João Neto de Oliveira
 CREA 150605388/01/PB

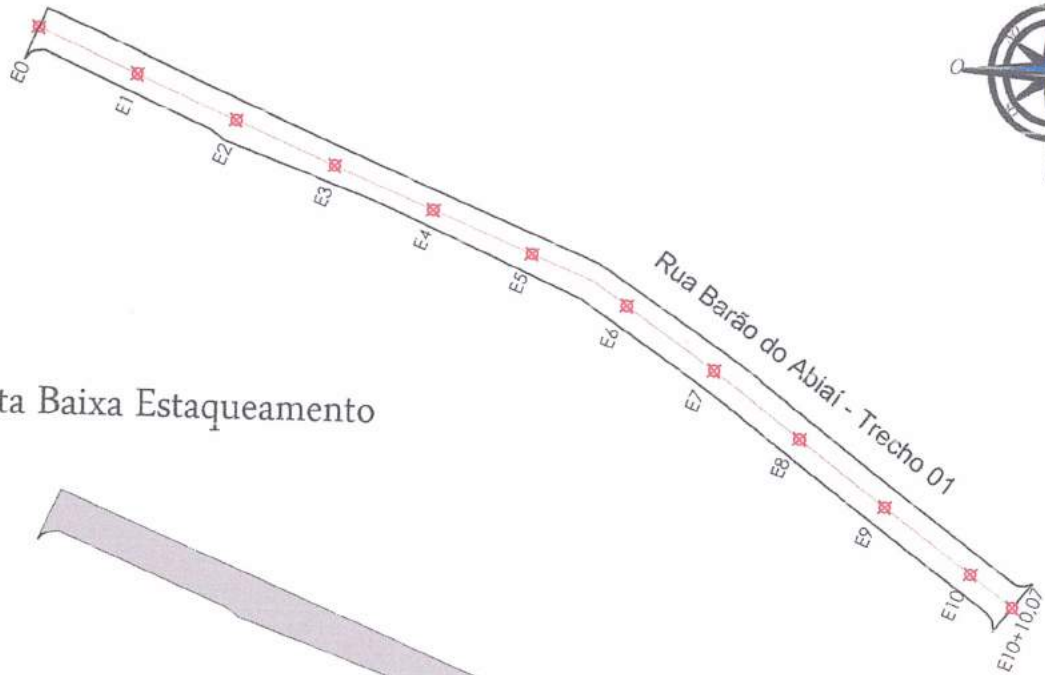


01 - Planta Baixa Estaqueamento



02 - Planta Baixa com Pavimentação Asfáltica (Capa)

Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: Barão do Abiaí – Trecho 01	
Bairro: Centro	
Data/Ano: março/2021	Prancha: 1/3
RUA BARÃO DO ABIAÍ – TRECHO 01	
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²
ÁREA DA RUA – CAPA	1.514,98 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	210,07 m
LARGURA DA RUA (média)	7,21 m


03 – Planta de Situação

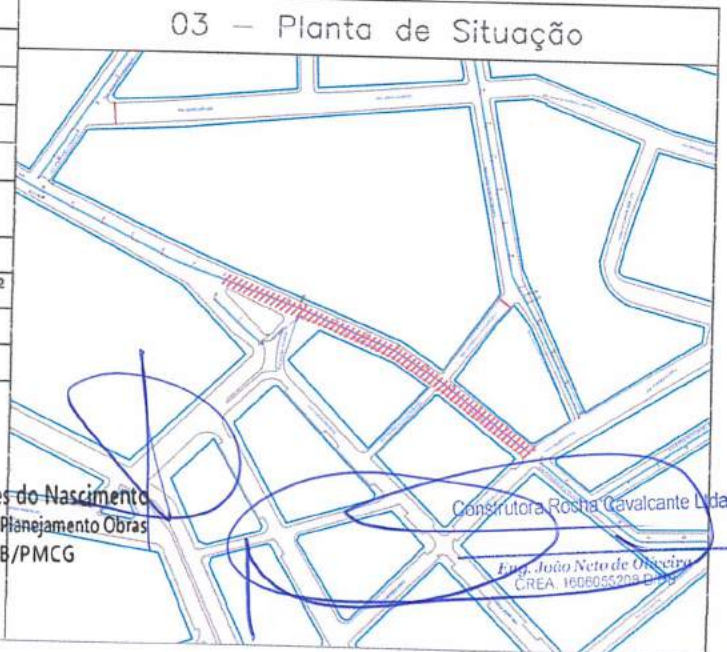


PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
 Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng.º Cml - CREA-PB Nº 180.283694-2

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SECOP/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
 Eng.º João Neto de Oliveira
 CREA 16080532098-2

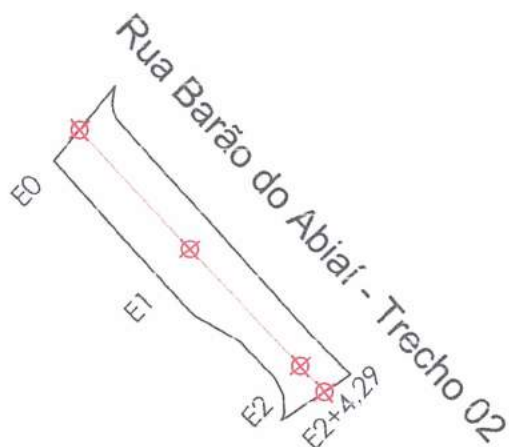

01 - Planta Baixa Estaqueamento

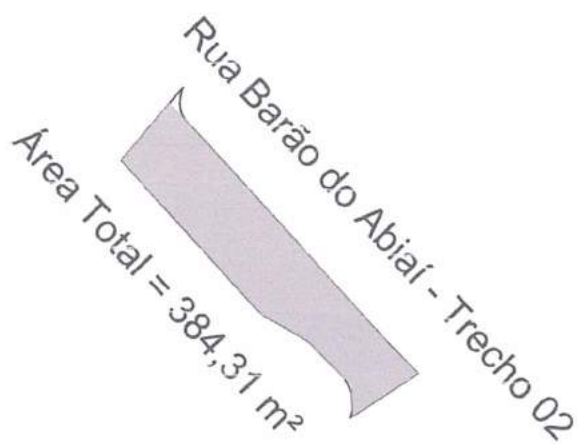

02 - Planta Baixa com Pavimentação Asfáltica (Capa)

Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA

Projeto: Pavimentação Asfáltica

Rua: Barão do Abiaí - Trecho 02

Bairro: Centro

Data/Ano: março/2021

Prancha: 2/3

RUA BARÃO DO ABIAÍ - TRECHO 02


ÁREA DA BOCA DE RUA 0,00 m²

ÁREA DA RUA - CAPA 384,31 m²

COMPRIMENTO DO EIXO 44,29 m

LARGURA DA RUA (média) 8,68 m

03 - Planta de Situação

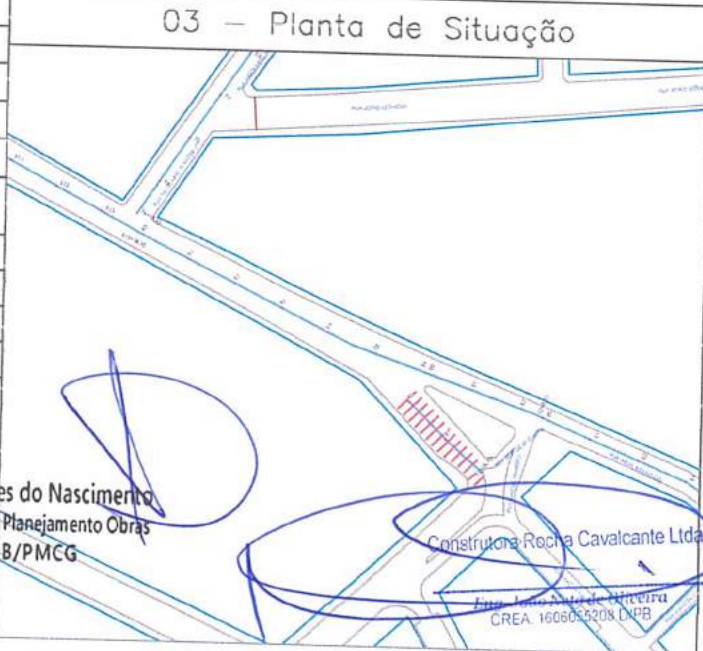


PREF. MUNIC. DE C. GRANDE

Francisco de Jesus C. Xavier
Eng.º Civil - CREA-PB Nº 180.283694-2


Adriano Gomes do Nascimento
Coordenador de Planejamento Obras
SECOB/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

Eng.º João Paulo de Oliveira
CREA. 1606055208 D/PB

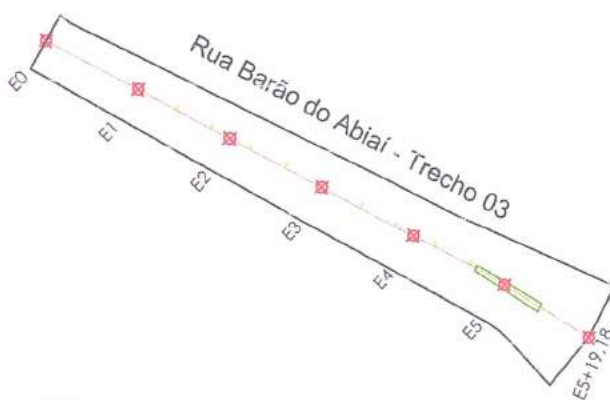


01 - Planta Baixa Estaqueamento

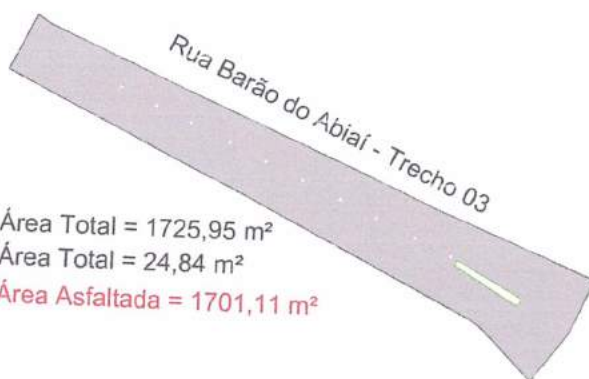

02 - Planta Baixa com Pavimentação Asfáltica (Capa)

Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: Barão do Abiaí – Trecho 03	
Bairro: Centro	
Data/Ano: março/2021	Prancha: 3/3
RUA BARÃO DO ABIAÍ – TRECHO 03	
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²
ÁREA DA RUA – CAPA	1.701,11 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	119,18 m
LARGURA DA RUA (média)	14,27 m

03 – Planta de Situação

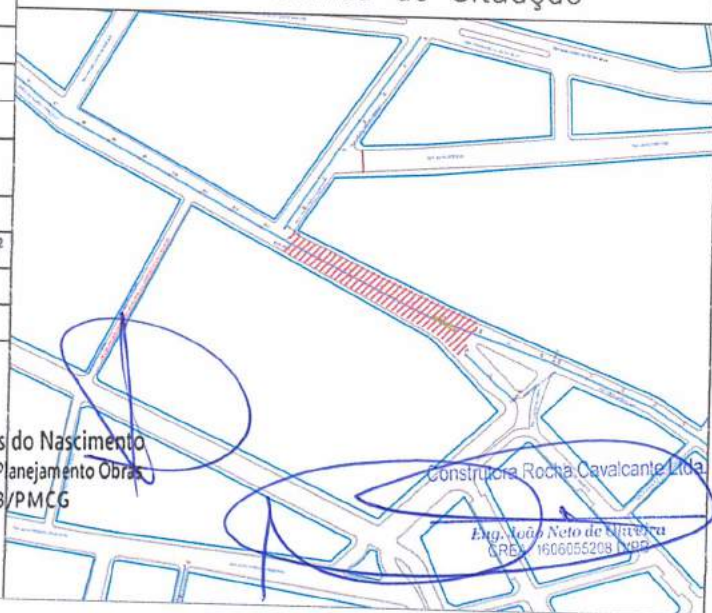


PREF. MUNICIPAL DE C. GRANDE
 Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng.º Civil - CREA-PB Nº 180.283594-2

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SECOP/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
 Eng.º João Neto de Oliveira
 CREA-PB Nº 1606055208-1/987


01 - Planta Baixa Estaqueamento

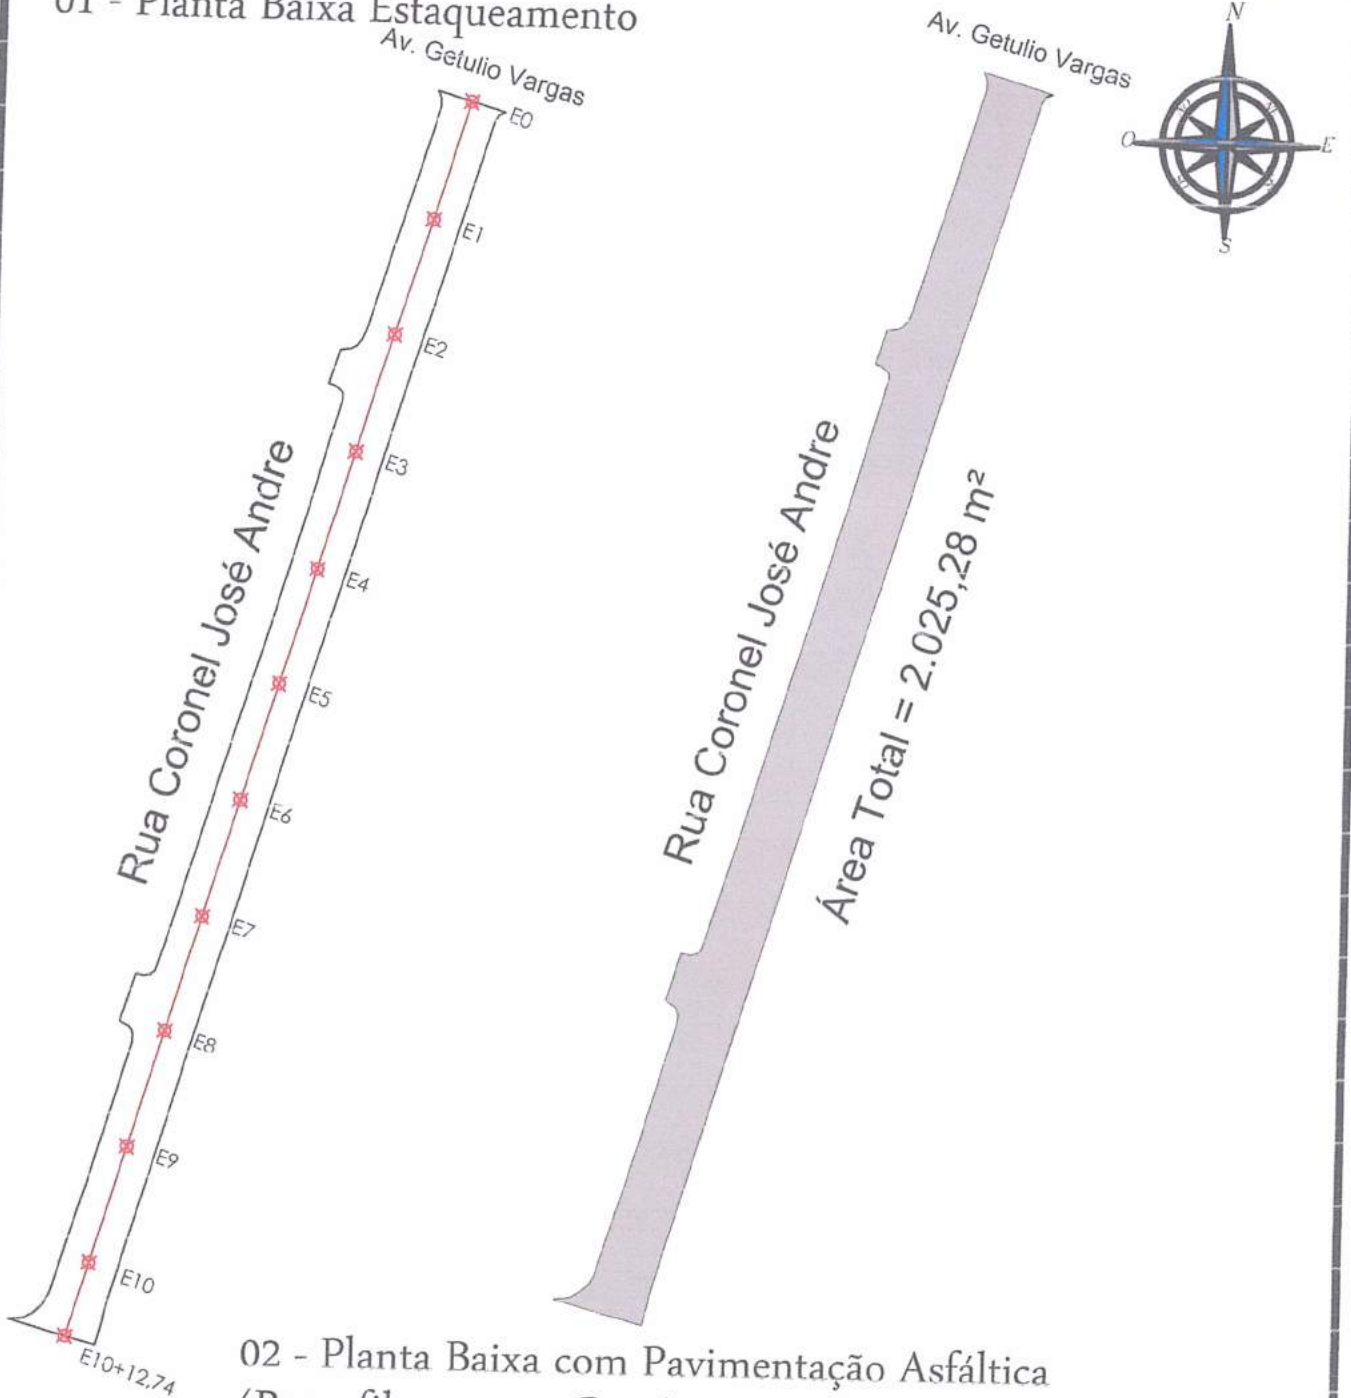

02 - Planta Baixa com Pavimentação Asfáltica (Reperfilamento e Capa)

Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: Coronel José Andre	
Bairro: Centro	
Data/Ano: abril/2021	Prancha: 1/1
RUA CORONEL JOSÉ ANDRE	
ÁREA DA BOCA DE RUA	50,80 m ²
ÁREA DA RUA - REPERFILAMENTO E CAPA	1.974,48 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	212,74 m
LARGURA DA RUA (média)	9,28 m

03 - Planta de Situação

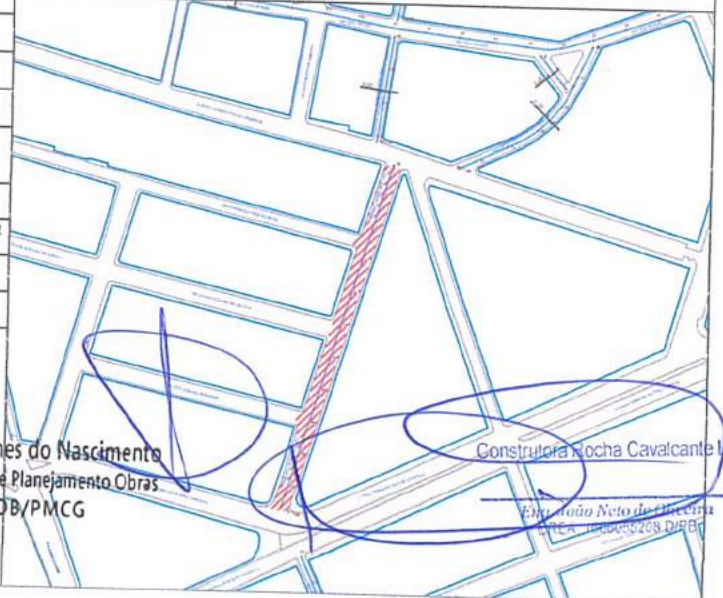


PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
 Francisco de Jesus C. Xavier
 Engº Cmt. - CREA-PB Nº 190.293694-2

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SECOB/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.


Eng. João Neto de Oliveira
 CREA - 190.293694-2

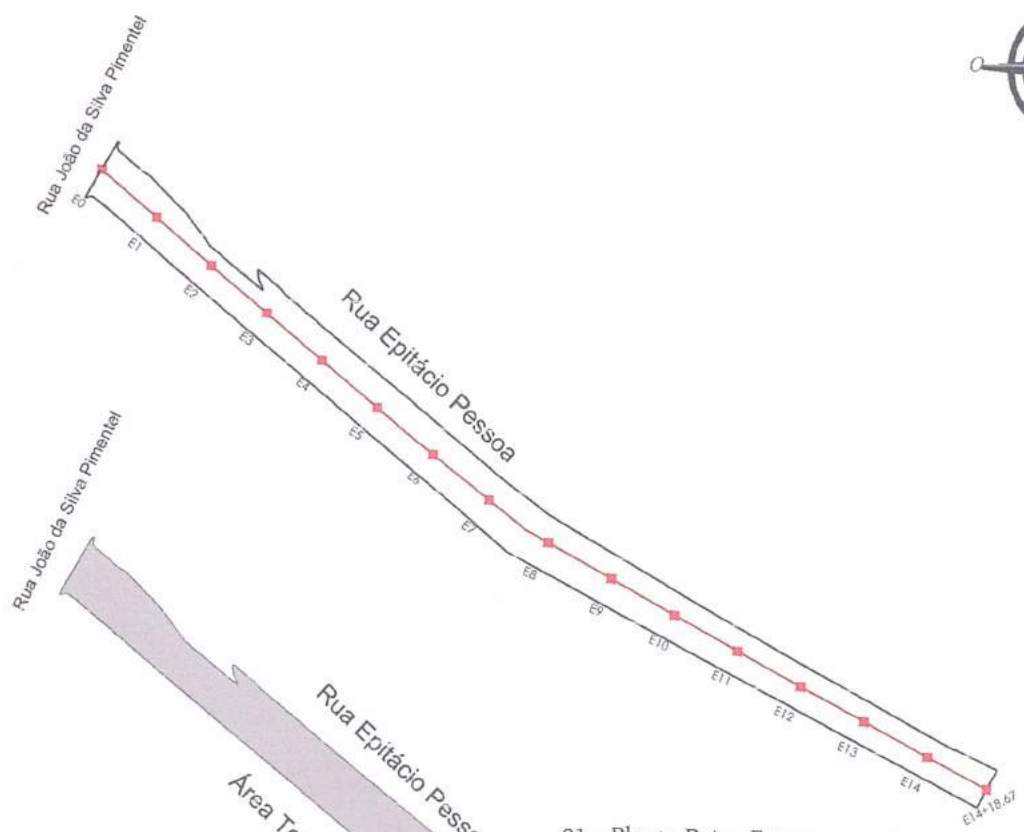

02 - Planta Baixa com Pavimentação Asfáltica (Capa)

Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: Epitácio Pessoa	
Bairro: Centro	
Data/Ano: março/2021	Prancha: 1/1
RUA EPITÁCIO PESSOA	
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²
ÁREA DA RUA – CAPA	3.894,01 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	298,67 m
LARGURA DA RUA (média)	13,04 m

03 – Planta de Situação

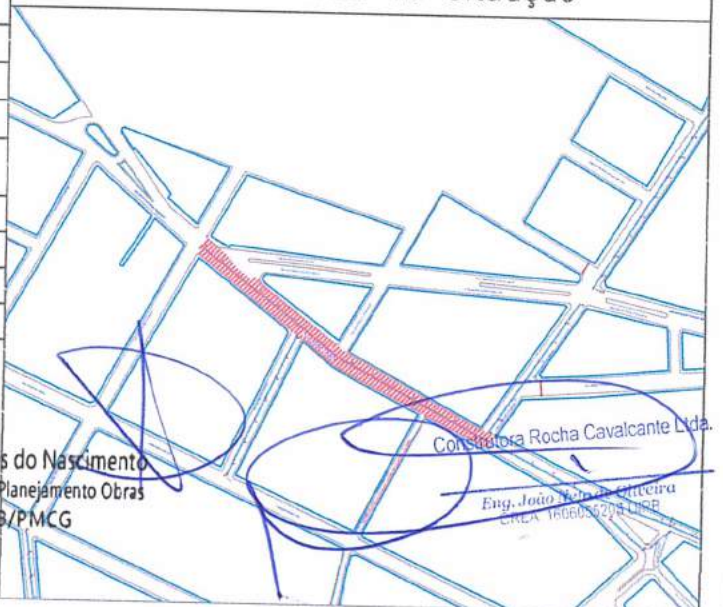

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
 Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng.º Civil - CREA-PB Nº 180.283594-2

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SECOP/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
 Eng. João Vitor de Oliveira
 CREA 160603204-0128P



01 - Planta Baixa Estaqueamento



02 - Planta Baixa com Pavimentação Asfáltica (Capa)



Proprietário: **Construtora Rocha Cavalcante LTDA**

Projeto: **Pavimentação Asfáltica**

Rua: **Professor Mauro Luna**

Bairro: **Conceição**

Data/Ano: **março/2021**

Prancha: **1/1**

RUA PROFESSOR MAURO LUNA

ÁREA DA BOCA DE RUA **0,00 m²**

ÁREA DA RUA – CAPA **617,99 m²**

COMPRIMENTO DO EIXO **65,79 m**


LARGURA DA RUA (média) **9,39 m**

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE

Francisco de Jesus C. Xavier
Eng.º Cml - CREA-PB Nº 180.283694-2


Adriano Gomes do Nascimento
Coordenador de Planejamento Obras
SECOB/PMCG

03 - Planta de Situação

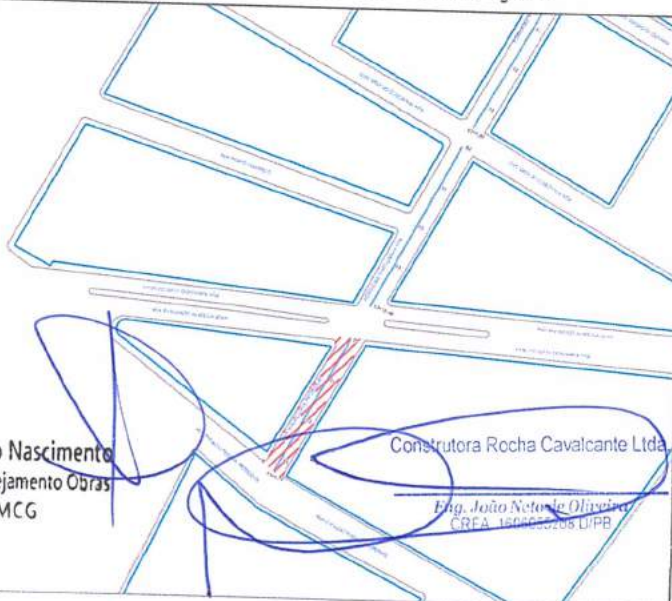


Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

Eng. João Neto de Oliveira
CREA 180.000.000 D/PPB




01 - Planta Baixa Estaqueamento

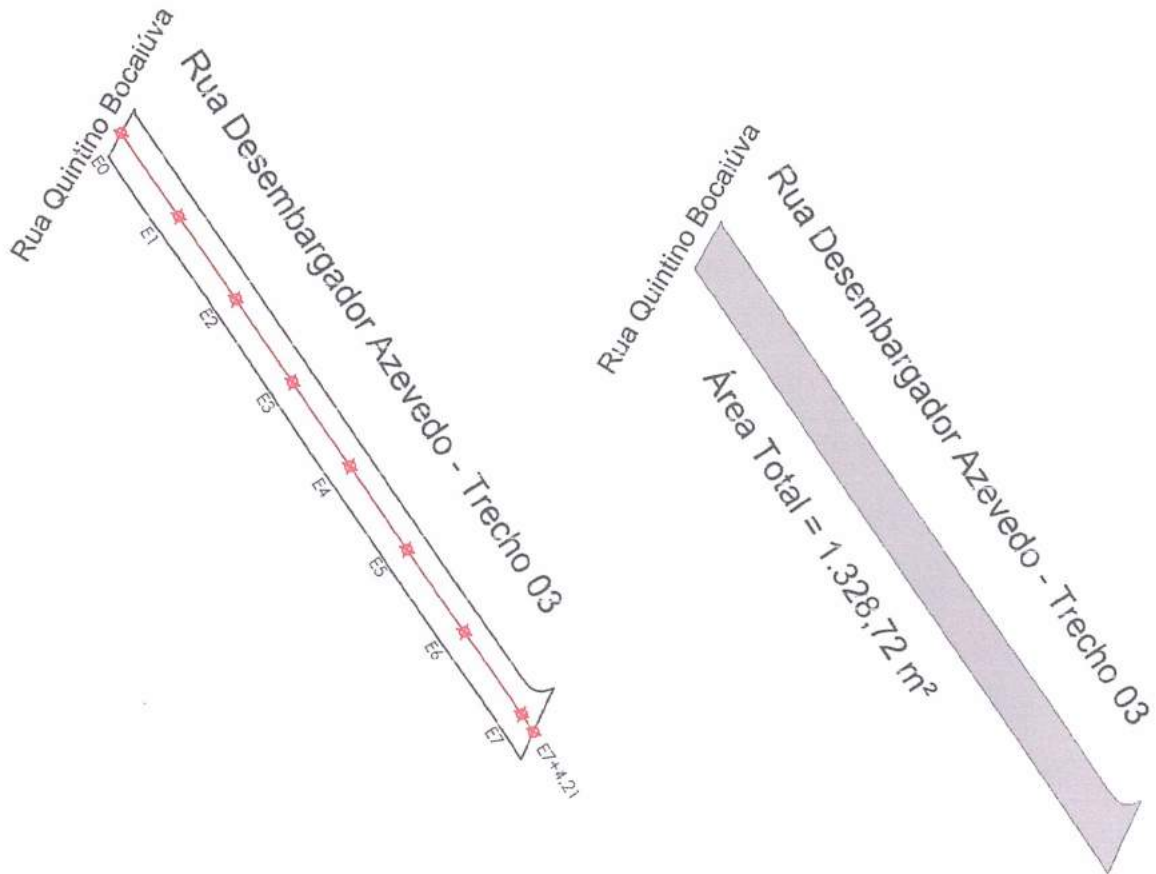

02 - Planta Baixa com Pavimentação Asfáltica (Capa)

Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: Desembargador Azevedo – Trecho 03	
Bairro: Palmeira	
Data/Ano: março/2021	Prancha: 3/4
RUA DESEMBARGADOR AZEVEDO – TRECHO 03	
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²
ÁREA DA RUA – CAPA	1.328,72 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	144,21 m
LARGURA DA RUA (média)	9,21 m

03 – Planta de Situação

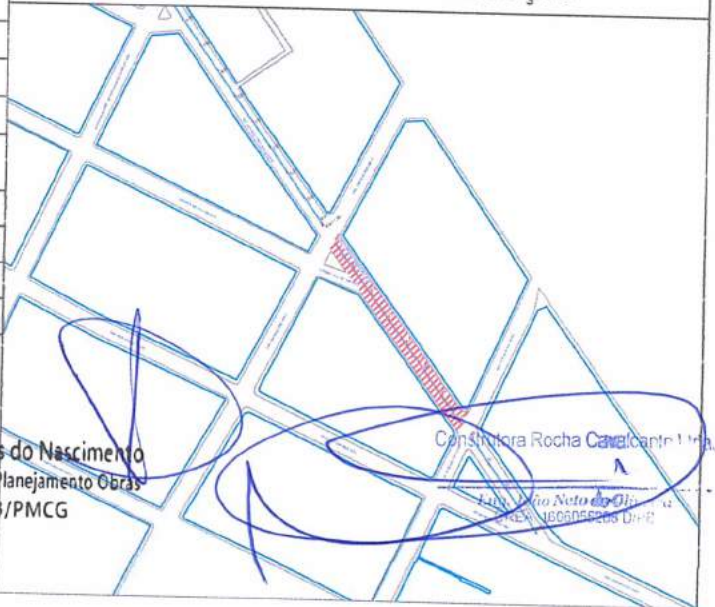

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
Eng.º CMA - CREA-PB Nº 180.283594-2


Adriano Gomes do Nascimento
Coordenador de Planejamento Obras
SECOB/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante LTDA

Luiz Antonio Neto de Oliveira
Eng.º CREA-PB Nº 186695228-0



01 - Planta Baixa Estaqueamento

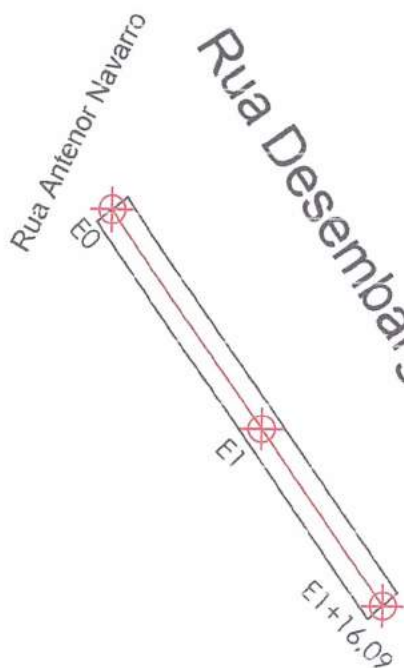


Rua Desembargador Azevedo - Trecho 04
Área Total = 105,57 m²

02 - Planta Baixa com Pavimentação Asfáltica (Capa)

Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: Desembargador Azevedo - Trecho 04	
Bairro: Palmeira	
Data/Ano: março/2021	Prancha: 4/4
RUA DESEMBARGADOR AZEVEDO - TRECHO 04	
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²
ÁREA DA RUA - CAPA	105,57 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	36,09 m
LARGURA DA RUA (média)	2,93 m

03 - Planta de Situação

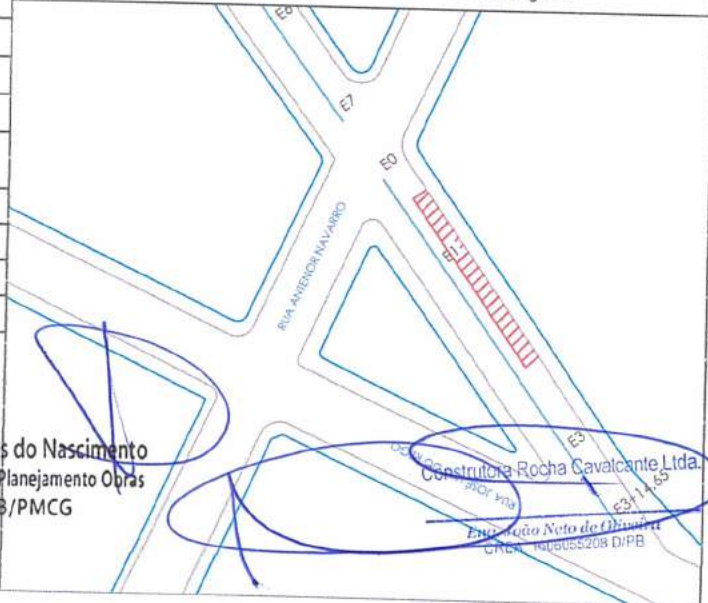


PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
Engº Cml - CREA-PB Nº 180.283694-2

Adriano Gomes do Nascimento
Coordenador de Planejamento Obras
SECOB/PMCG


Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
Engº Neto de Oliveira
CREA - PB/208 D/PB

01 - Planta Baixa Estaqueamento

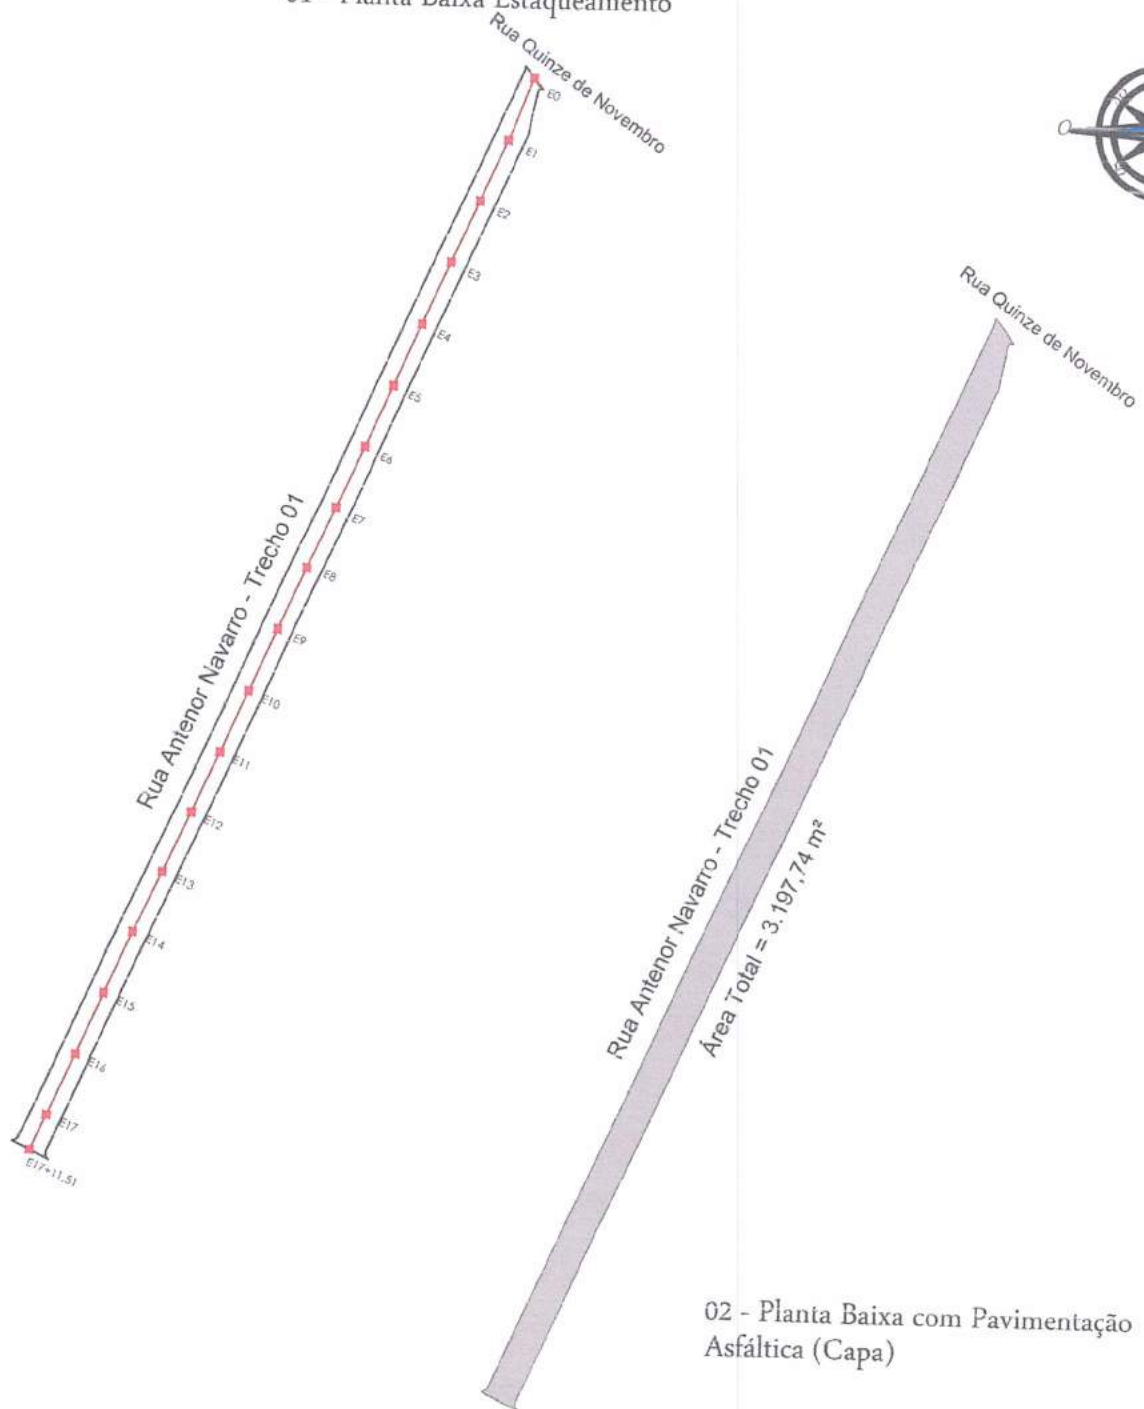

Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: Antenor Navarro – Trecho 01	
Bairro: Prata, Monte Santo e Palmeira	
Data/Ano: março/2021	Prancha: 1/12
RUA ANTEHOR NAVARRO – TRECHO 01	
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²
ÁREA DA RUA – CAPA	3.197,74 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	351,51 m
LARGURA DA RUA (média)	9,09 m



03 – Planta de Situação

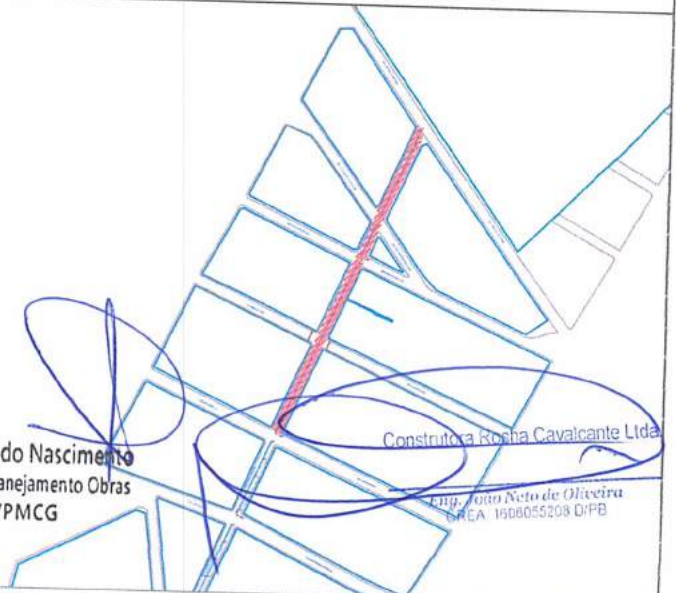

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
Eng. Civil - CREA-PB Nº 180.263694-2

Adriano Gomes do Nascimento
Coordenador de Planejamento Obras
SECOB/PMCG

01 - Planta Baixa Estaqueamento

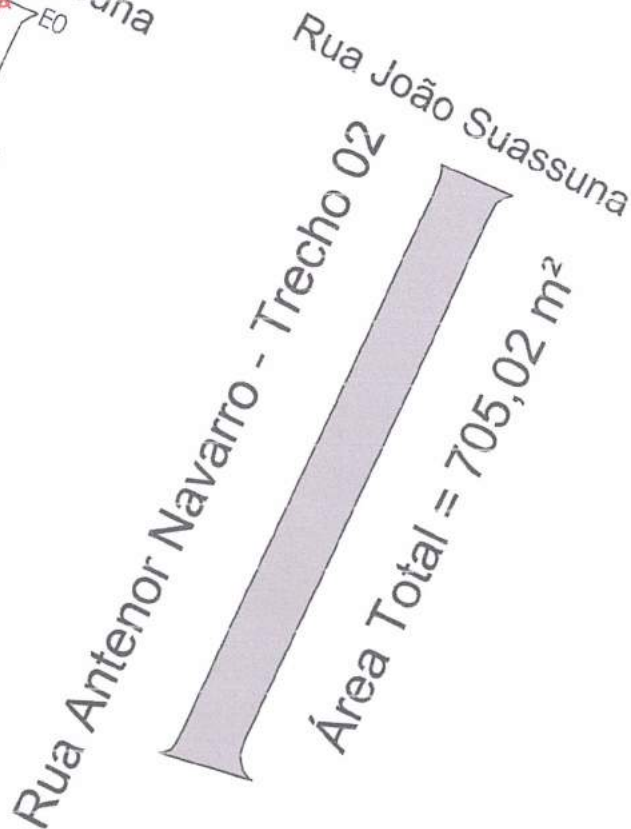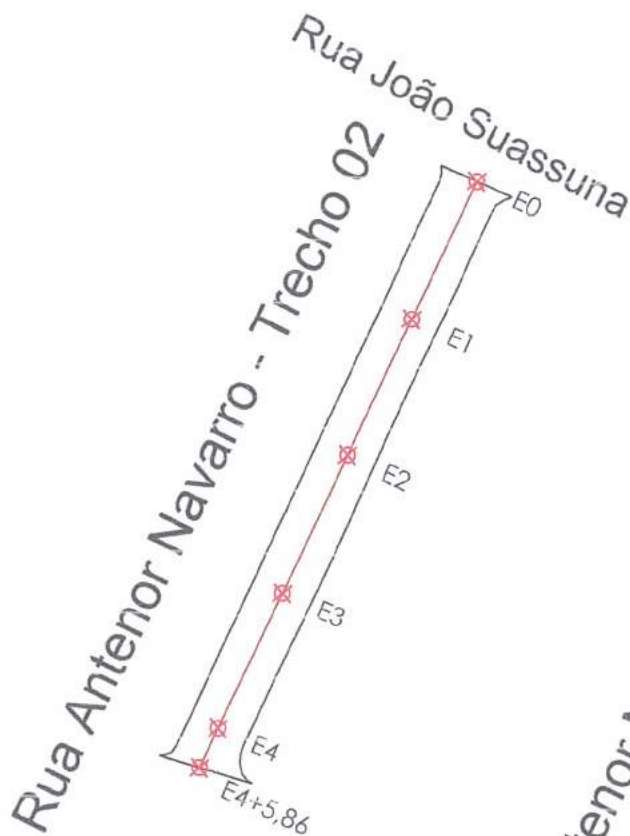


02 - Planta Baixa com Pavimentação Asfáltica (Capa)

Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: Antenor Navarro – Trecho 02	
Bairro: Prata, Monte Santo e Palmeira	
Data/Ano: março/2021	Prancha: 2/12
RUA ANTEHOR NAVARRO – TRECHO 02	
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²
ÁREA DA RUA – CAPA	705,02 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	85,86 m
LARGURA DA RUA (média)	8,20 m

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
 Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng.º Cmt. - CREA-PB Nº 180.283694-2

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SEC0B/PMCG


03 – Planta de Situação

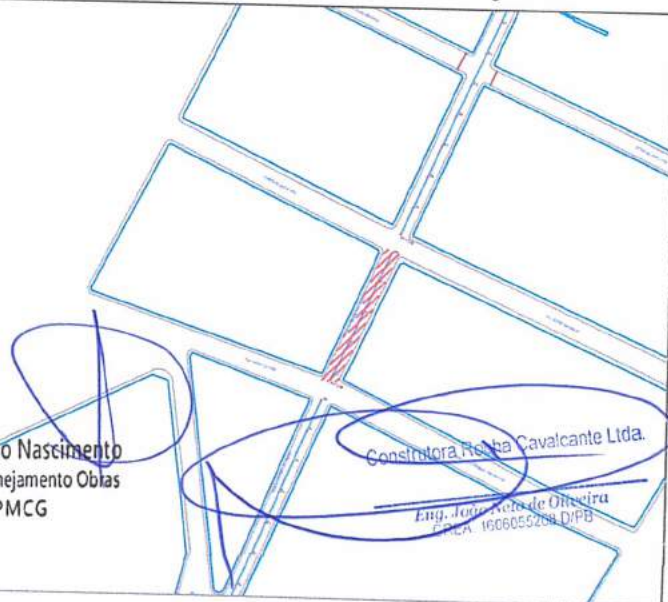

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

Eng. João Neto de Oliveira
 CREA 1606052/98 D/PB


01 - Planta Baixa Estaqueamento

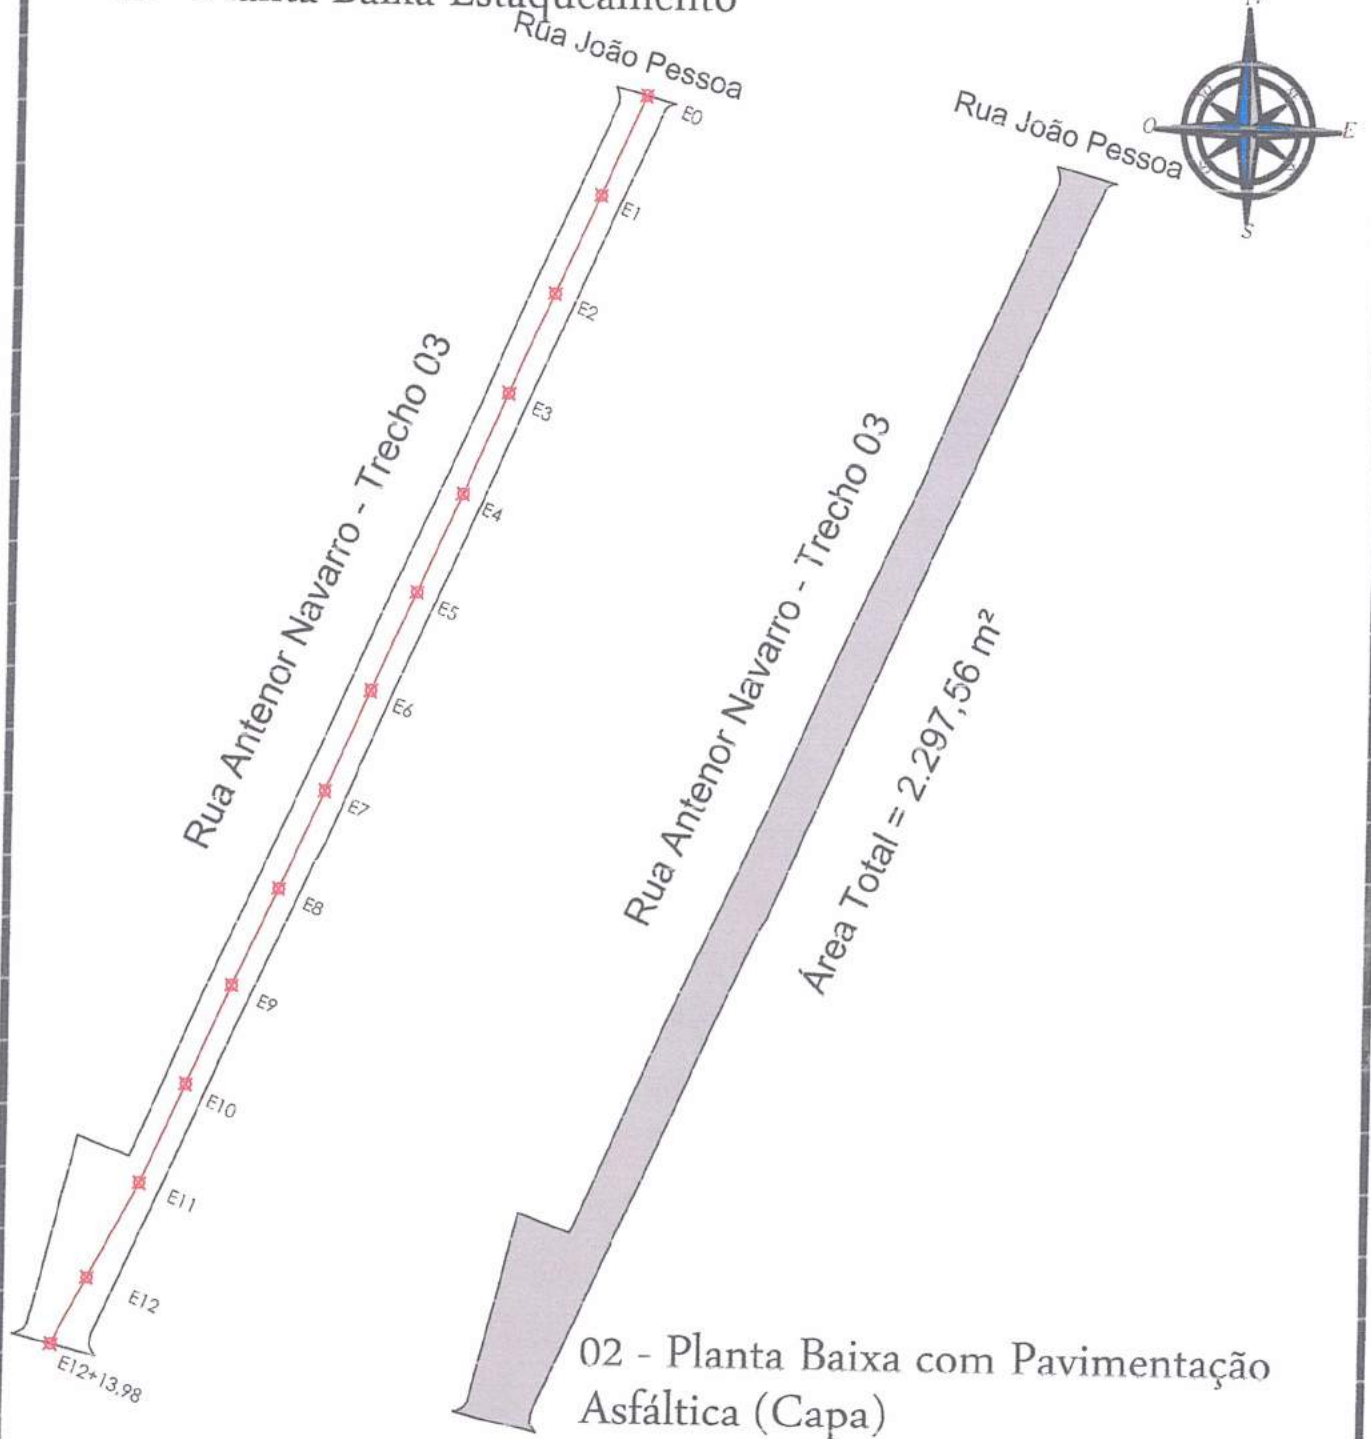

02 - Planta Baixa com Pavimentação Asfáltica (Capa)

Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: Antenor Navarro – Trecho 03	
Bairro: Prata, Monte Santo e Palmeira	
Data/Ano: março/2021	Francha: 3/12
RUA ANTEHOR NAVARRO – TRECHO 03	
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²
ÁREA DA RUA – CAPA	2.297,56 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	253,98 m
LARGURA DA RUA (média)	9,04 m

03 – Planta de Situação

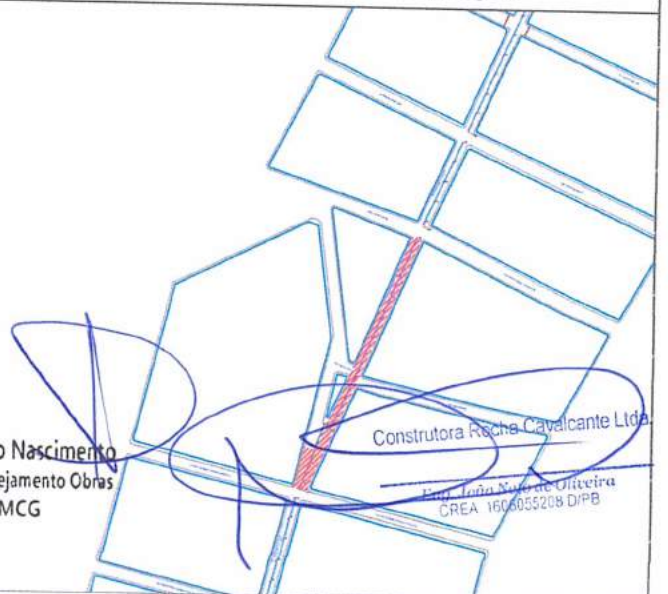


PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
 Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng.º Civil - CREA-PB Nº 160.283594-2

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SECOB/PMCG

Eng.º João Nuno de Oliveira
 CREA 160.6055208 D/PB



01 - Planta Baixa Estaqueamento

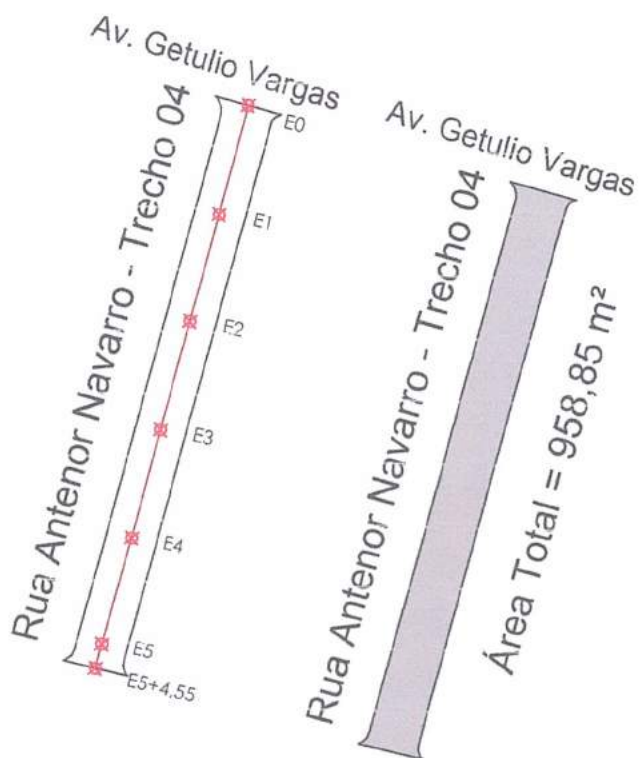

02 - Planta Baixa com Pavimentação Asfáltica (Capa)


Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA
 Projeto: Pavimentação Asfáltica
 Rua: Antenor Navarro - Trecho 04
 Bairro: Prata, Monte Santo e Palmeira
 Data/Ano: março/2021 Prancha: 4/12

RUA ANTEADOR NAVARRO - TRECHO 04	
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²
ÁREA DA RUA - CAPA	958,85 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	104,55 m
LARGURA DA RUA (média)	9,17 m


PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
 Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng.º Cmi - CREA-PB Nº 160.283694-2

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SECOP/PMCG

03 - Planta de Situação

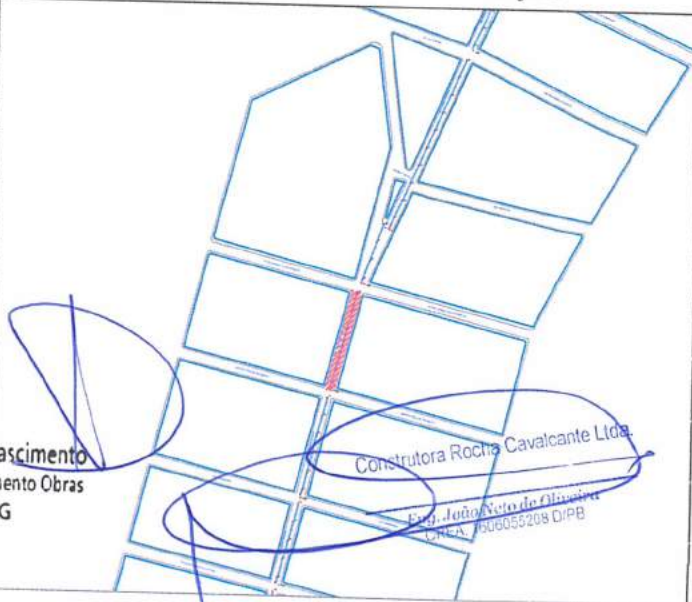


01 - Planta Baixa Estaqueamento

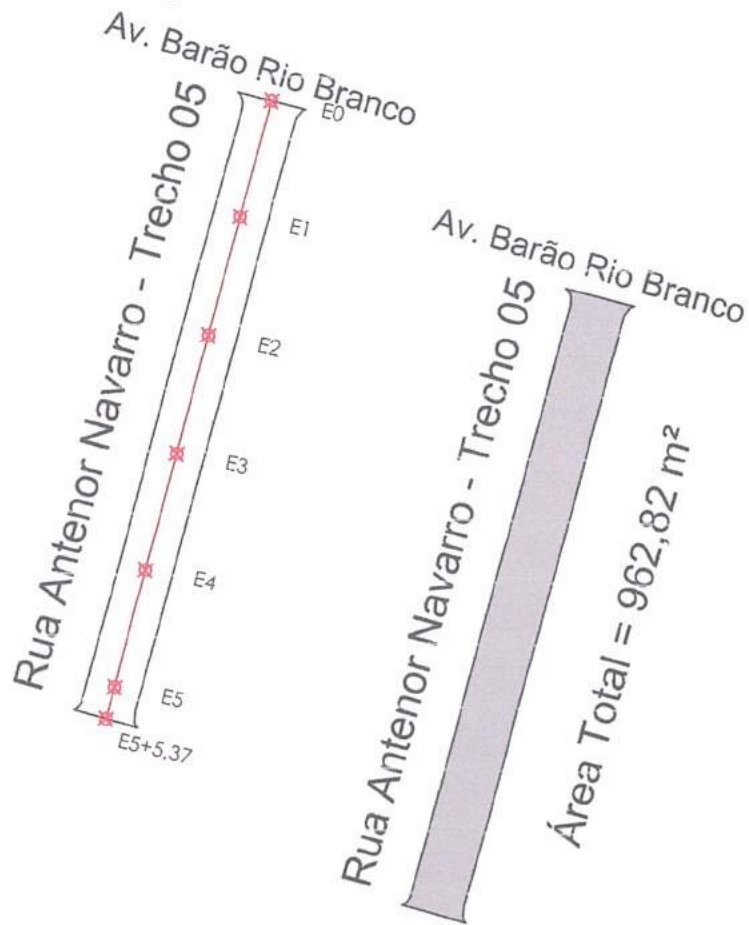

02 - Planta Baixa com Pavimentação Asfáltica (Capa)

Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: Antenor Navarro – Trecho 05	
Bairro: Prata, Monte Santo e Palmeira	
Data/Ano: março/2021	Prancha: 5/12
RUA ANTEOR NAVARRO – TRECHO 05	
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²
ÁREA DA RUA – CAPA	962,82 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	105,37 m
LARGURA DA RUA (média)	9,13 m

03 – Planta de Situação

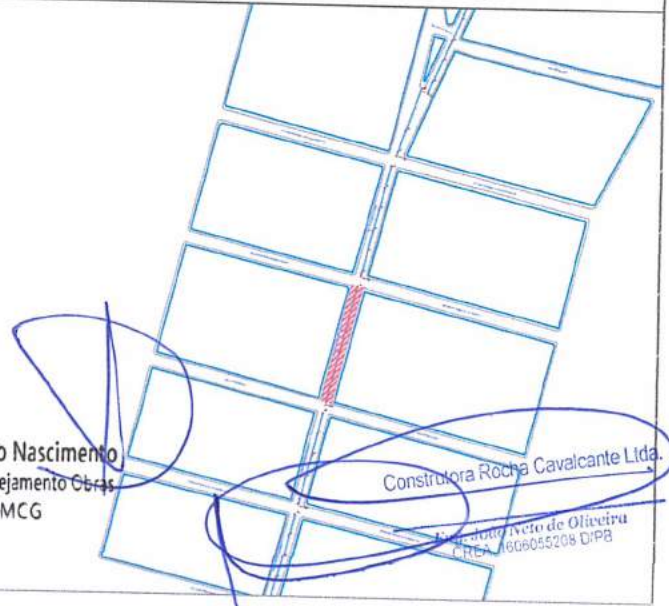


PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
Engº Cml - CREA-PB Nº 100.283694-2

Adriano Gomes do Nascimento
Coordenador de Planejamento Obras
SECDB/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
R. João Inácio de Oliveira
CREA 1606055208 D/PB




01 - Planta Baixa Estaqueamento

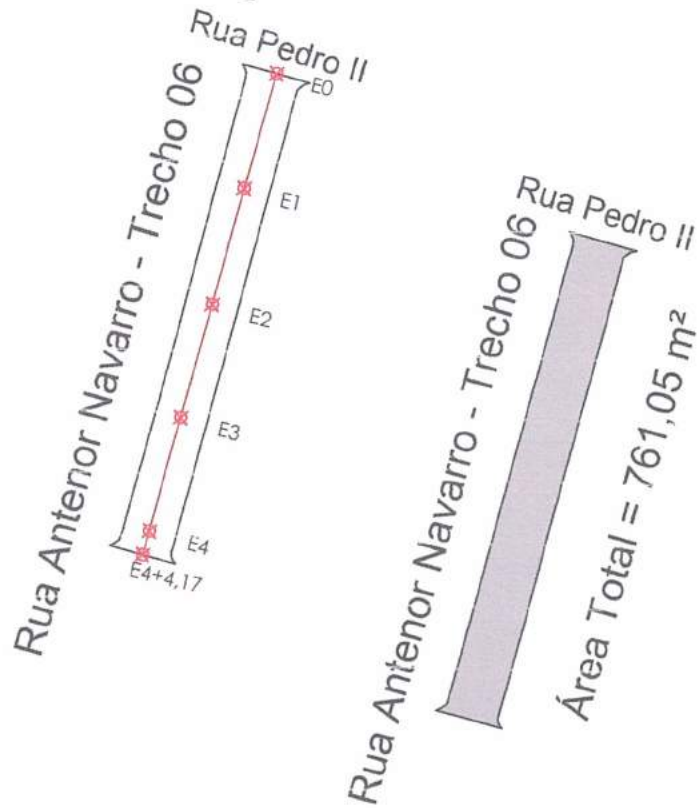

02 - Planta Baixa com Pavimentação Asfáltica (Capa)

Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: Antenor Navarro – Trecho 06	
Bairro: Prata, Monte Santo e Palmeira	
Data/Ano: março/2021	Prancha: 6/12
RUA ANTEHOR NAVARRO – TRECHO 06	
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²
ÁREA DA RUA – CAPA	761,05 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	84,17 m
LARGURA DA RUA (média)	8,50 m

03 – Planta de Situação

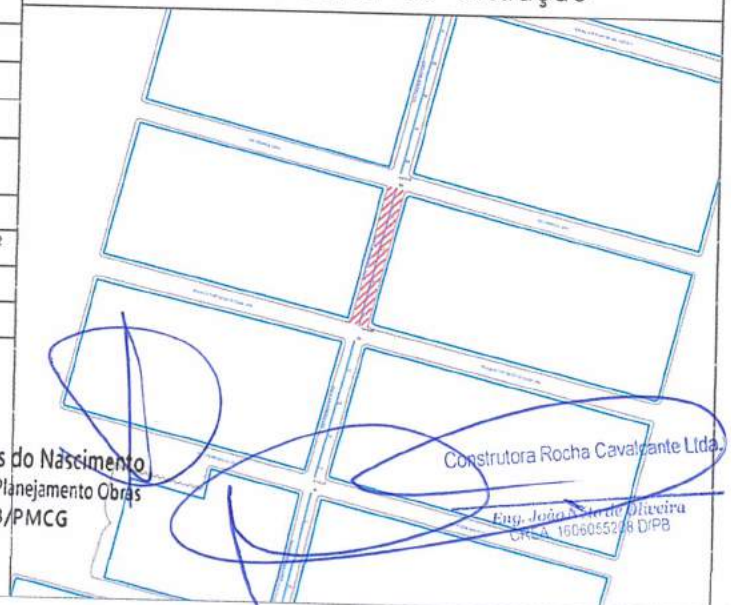


PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
 Francisco de Jesus C. Xavier
 Engº Cml - CREA-PB Nº 100.283694-2

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SECOP/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
 Eng. João Sato de Oliveira
 CREA 16060552/8 D/PB


01 - Planta Baixa Estaqueamento

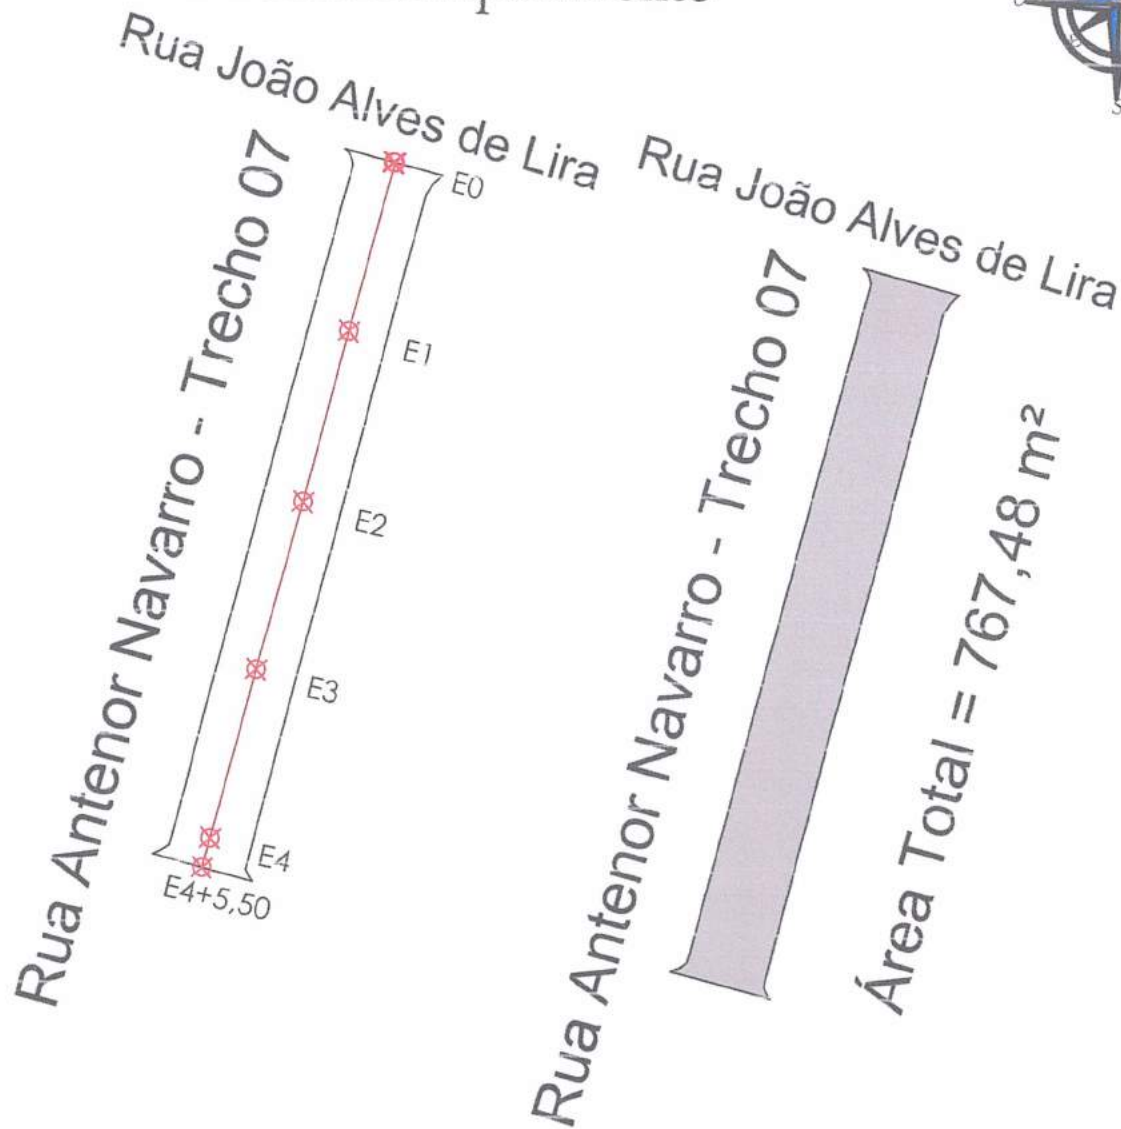

02 - Planta Baixa com Pavimentação Asfáltica (Capa)

Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: Antenor Navarro – Trecho 07	
Bairro: Prata, Monte Santo e Palmeira	
Data/Ano: março/2021	Prancha: 7/12
RUA ANTENOR NAVARRO – TRECHO 07	
ÁREA DA BOCA DE RUA	0.00 m ²
ÁREA DA RUA – CAPA	767,48 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	83,50 m
LARGURA DA RUA (média)	9,18 m

03 – Planta de Situação

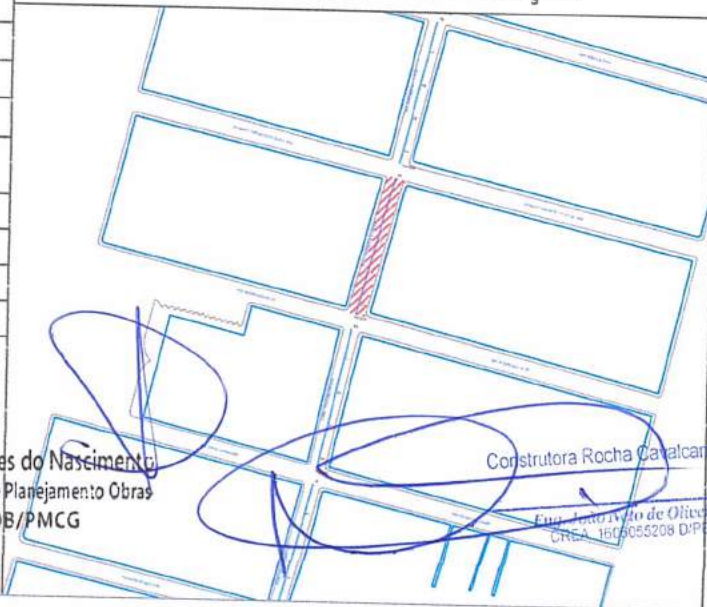


PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng.º CMI - CREA-PB Nº 180.283694-2

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SECOB/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

Eng.º João Alfredo de Oliveira
 CREA 160.0053208 D/PB

01 - Planta Baixa Estaqueamento

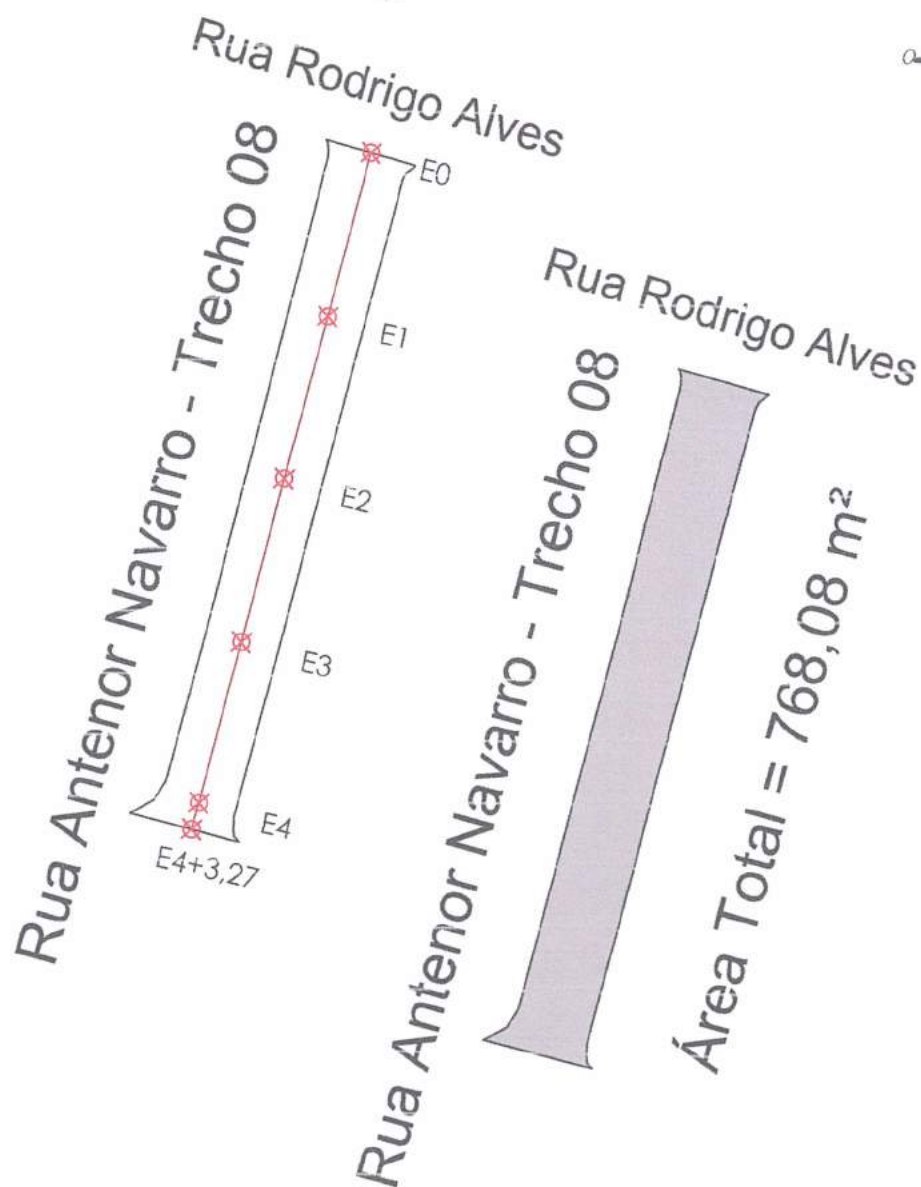


02 - Planta Baixa com Pavimentação Asfáltica (Capa)

Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: Antenor Navarro – Trecho 08	
Bairro: Prata, Monte Santo e Palmeira	
Data/Ano: março/2021	Planha: 8/12
RUA ANTENOR NAVARRO – TRECHO 08	
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²
ÁREA DA RUA – CAPA	768,08 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	83,27 m
LARGURA DA RUA (média)	9,22 m

PREF. MUNIC. DE S. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
Eng.º Civil - CREA-PB Nº 100.203694-2

Adriano Gomes do Nascimento
Coordenador de Planejamento Obras
SECOB/PMCG

03 – Planta de Situação

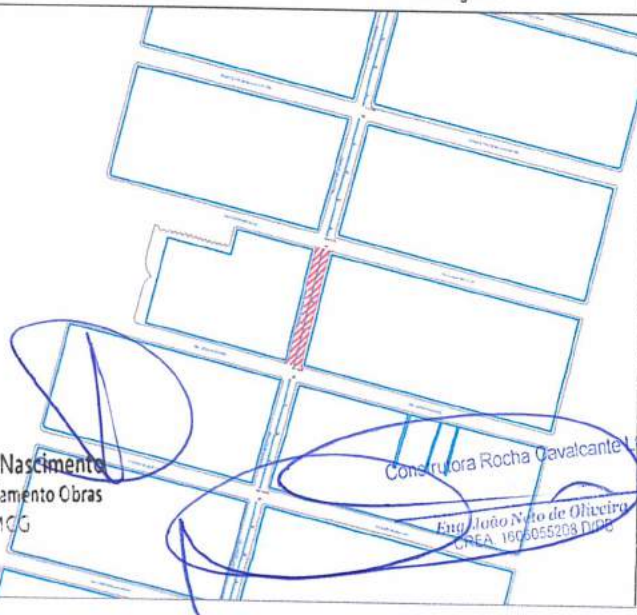


Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

Eng. João Neto de Oliveira
CREA 100.6055208 DPE



01 - Planta Baixa Estaqueamento

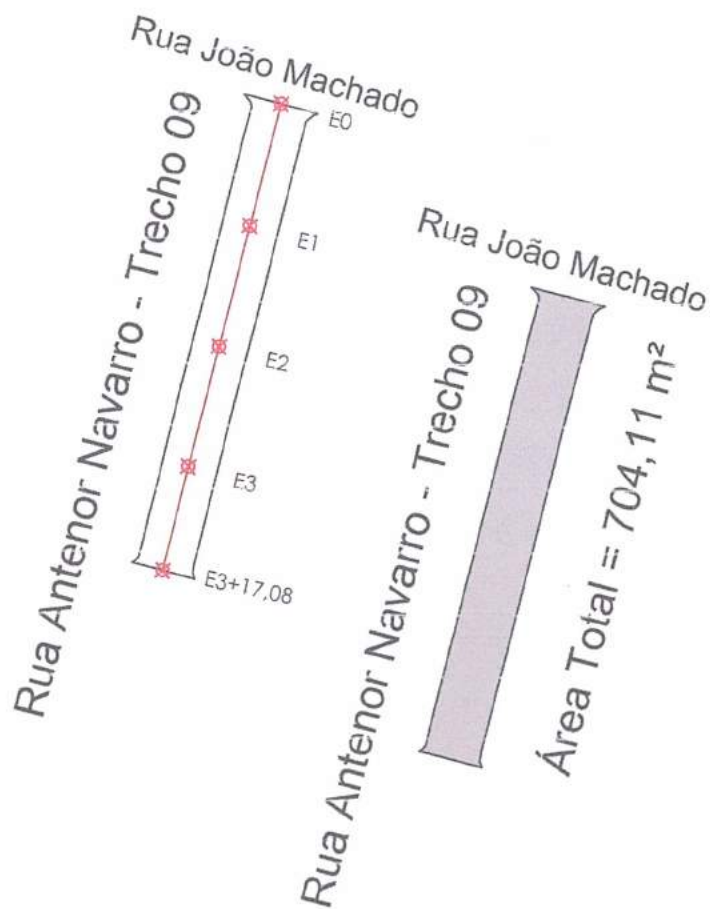

02 - Planta Baixa com Pavimentação Asfáltica (Capa)

Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: Antenor Navarro – Trecho 09	
Bairro: Prata, Monte Santo e Palmeira	
Data/Ano: março/2021	Prancha: 9/12
RUA ANTENOR NAVARRO – TRECHO 09	
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²
ÁREA DA RUA – CAPA	704,11 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	77,08 m
LARGURA DA RUA (média)	9,13 m

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
Eng.º Smt.: CREA-PB Nº 160.283694-2



Adriano Gomes do Nascimento
Coordenador de Planejamento Obras
SECOB/PMCG

03 – Planta de Situação



Construtora Rocha Cavalcante
Eng.º João Neto de Oliveira
CREA 160605208 D/PB

01 - Planta Baixa Estaqueamento

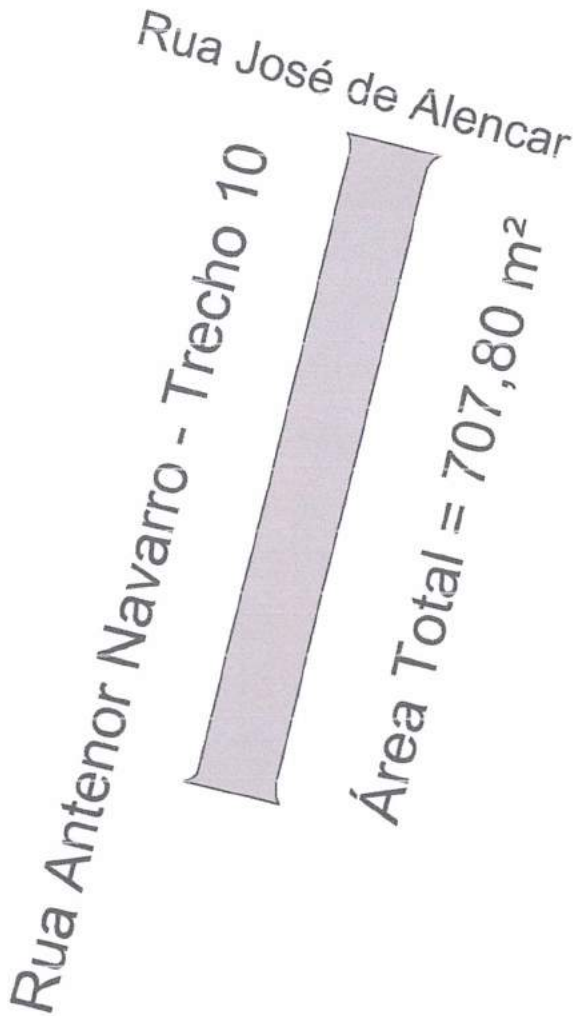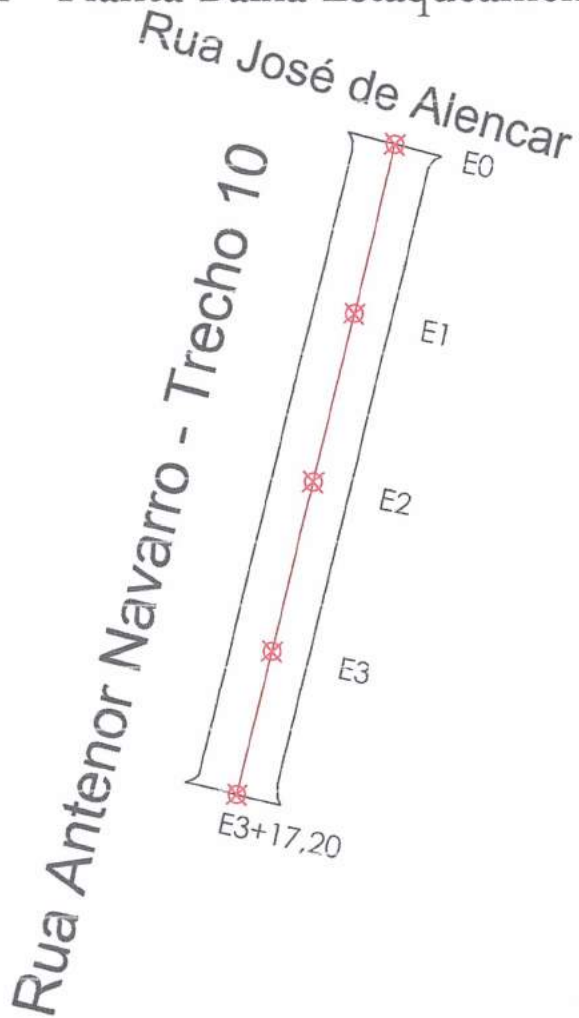


02 - Planta Baixa com Pavimentação Asfáltica (Capa)

Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: Antenor Navarro - Trecho 10	
Bairro: Prata, Monte Santo e Palmeira	
Data/Ano: março/2021	Prancho: 10/12
RUA ANTENOR NAVARRO - TRECHO 10	
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²
ÁREA DA RUA - CAPA	707,80 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	77,20 m
LARGURA DA RUA (média)	9,16 m


PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
 Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng.º Cmt. - CREA-PB Nº 100.283634-2

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SECOP/PMCG

03 - Planta de Situação

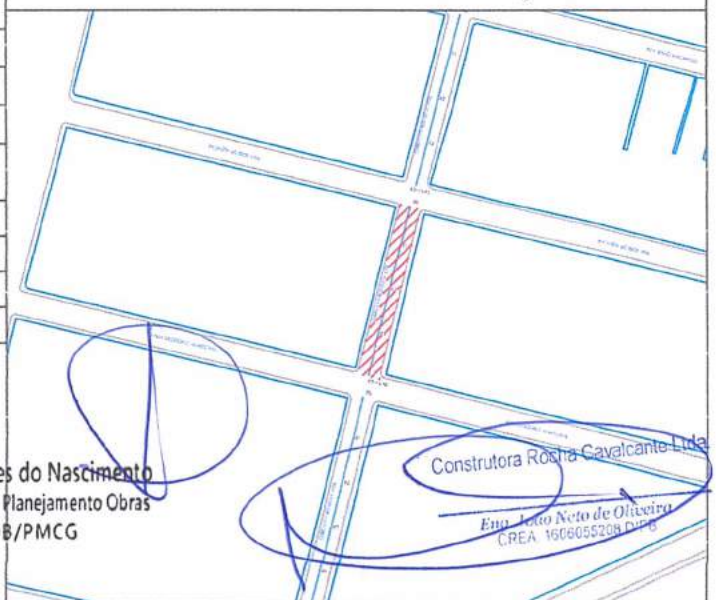


01 - Planta Baixa Estaqueamento

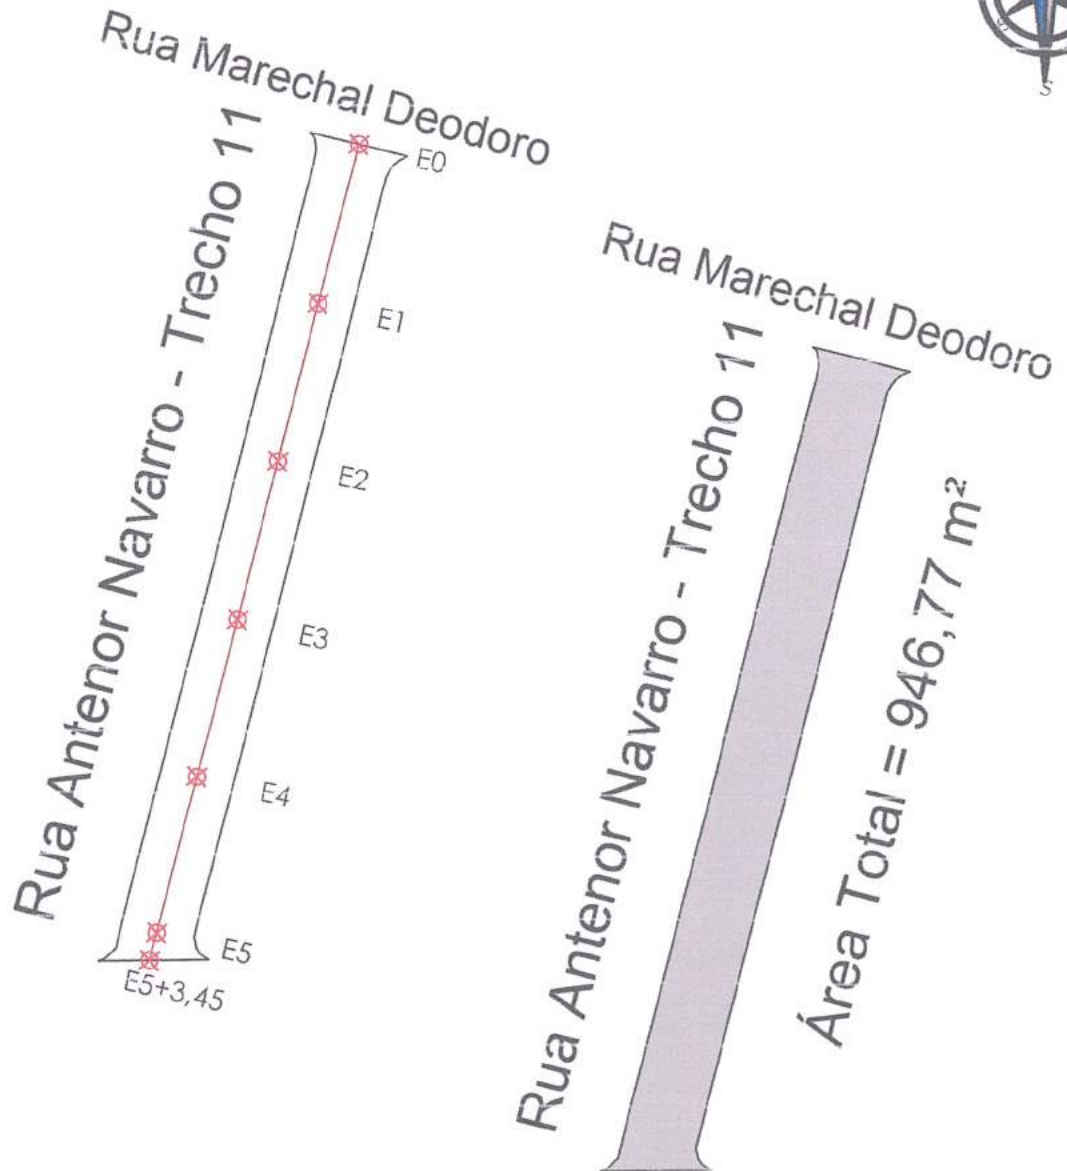

02 - Planta Baixa com Pavimentação Asfáltica (Capa)

Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: Antenor Navarro – Trecho 11	
Bairro: Prata, Monte Santo e Palmeira	
Data/Ano: março/2021	Prancha: 11/12
RUA ANTEHOR NAVARRO – TRECHO 11	
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²
ÁREA DA RUA – CAPA	946,77 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	103,45 m
LARGURA DA RUA (média)	9,15 m

03 – Planta de Situação

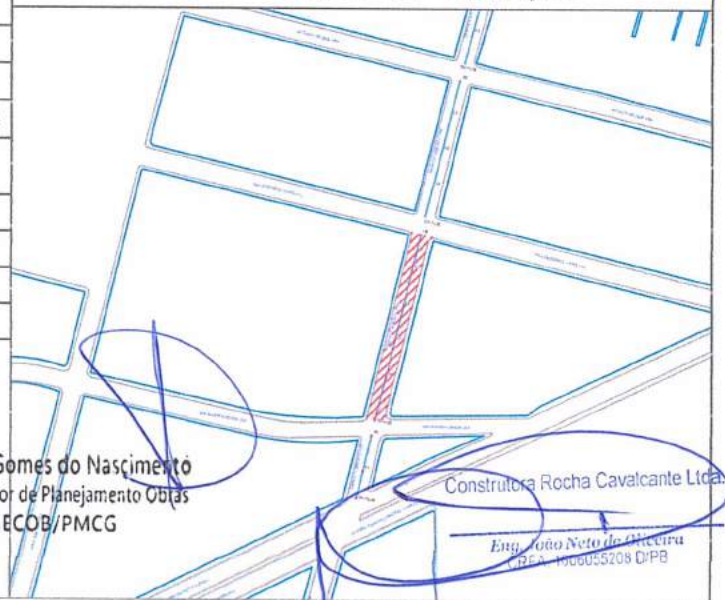

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng.º Cmt. - CREA-PB Nº 180.283694-2

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SECOP/PMCG


Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

Eng.º João Neto de Oliveira
 CREA 1000055208 DPB



01 - Planta Baixa Estaqueamento

Av. Francisco Lopes de Almeida



Av. Francisco Lopes de Almeida



Área Total = 2.613,82 m²


02 - Planta Baixa com Pavimentação Asfáltica (Capa)

Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: Professor Luiz Gilliard	
Bairro: Santa Cruz	
Data/Ano: março/2021	Planilha: 1/1
RUA PROFESSOR LUIZ GILLIARD	
ÁREA DA BOCA DE RUA	20,95 m ²
ÁREA DA RUA – CAPA	2.592,87 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	231,11 m
LARGURA DA RUA (média)	11,22 m

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng.º Civil - CREA-PB Nº 180.283594-2

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SECOB/PMCG

03 – Planta de Situação

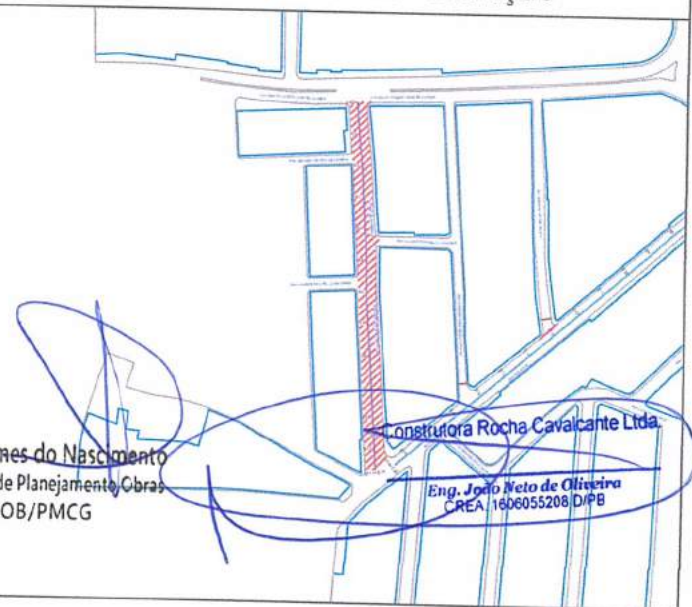



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIROS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTAÇÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCONGÓ, SANTA CRUZ, DINAMÉRICA, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCONGÓ, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTÃO, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA
CONTRATO: 2.08.022/2020
PERÍODO LÍQUIDO: 04/03/2021 A 07/04/2021

MEDIÇÃO: 09ª

FOTO 01



FOTO 02



COORDENADAS:

7°12'54.7"S
35°53'16.4"W

RUA:

IREMAR VILLARIM

COORDENADAS:

7°12'54.7"S
35°53'16.4"W

RUA:

IREMAR VILLARIM

FOTO 03



FOTO 04



COORDENADAS:

7°12'48.3"S
35°53'04.7"W

RUA:

VIGOLVINO WANDERLEY

COORDENADAS:

7°12'48.9"S
35°53'05.2"W

RUA:

VIGOLVINO WANDERLEY

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
Engº Civil - CREA-PB Nº 180.283594-2

Adriano Gomes do Nascimento
Coordenador de Planejamento Obras
SECOB/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

Eng. João Neto de Oliveira
CREA-1606033208 D/PB



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA
CONTRATO: 2.08.022/2020
PERÍODO LÍQUIDO: 04/03/2021 A 07/04/2021

MEDIÇÃO: 09ª

FOTO 05



COORDENADAS:	RUA:
7°12'50.0"S 35°53'06.1"W	VIGOLVINO WANDERLEY

FOTO 06



COORDENADAS:	RUA:
7°12'46.3"S 35°53'03.9"W	VIGOLVINO WANDERLEY

FOTO 07



COORDENADAS:	RUA:
7°12'60.0"S 35°53'00.3"W	ALEXANDRINO CAVALCANTI

FOTO 08



COORDENADAS:	RUA:
7°13'00.5"S 35°53'00.2"W	ALEXANDRINO CAVALCANTI

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
Eng.º C.M. - CREA-PB Nº 180.283634-2

Adriano Gomes do Nascimento
Coordenador de Planejamento Obras
SECOB/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
Eng.º João Neto de Oliveira
CREA: 1806055208 D/PB



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA
CONTRATO: 2.08.022/2020
PERÍODO LÍQUIDO: 04/03/2021 A 07/04/2021

MEDIÇÃO: 09ª

FOTO 09



COORDENADAS:	RUA:
7°12'49.3"S 35°53'03.0"W	JOÃO ALVES DE OLIVEIRA

FOTO 10



COORDENADAS:	RUA:
7°12'46.9"S 35°53'03.6"W	JOÃO ALVES DE OLIVEIRA

FOTO 11



COORDENADAS:	RUA:
7°13'00.4"S 35°52'56.3"W	CRISTIANO LAURITZEN

FOTO 12



COORDENADAS:	RUA:
7°13'01.5"S 35°52'57.8"W	CRISTIANO LAURITZEN

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
Eng.º Civil - CREA-PB Nº 180.283534-2

Adriano Gomes do Nascimento
Coordenador de Planejamento Obras
SECOB/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
Eng.º João Neto de Oliveira
CREA. 1608055208-D/PB



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA
CONTRATO: 2.08.022/2020
PERÍODO LÍQUIDO: 04/03/2021 A 07/04/2021

MEDIÇÃO: 09ª

FOTO 13



COORDENADAS:	RUA:
7°13'05.0"S 35°52'49.3"W	PEREGRINO DE CARVALHO

FOTO 14



COORDENADAS:	RUA:
7°13'05.7"S 35°52'48.7"W	PEREGRINO DE CARVALHO

FOTO 15



COORDENADAS:	RUA:
7°12'56.9"S 35°53'10.1"W	BARÃO DO ABIAÍ

FOTO 16



COORDENADAS:	RUA:
7°13'00.8"S 35°53'01.9"W	BARÃO DO ABIAÍ

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Eduardo de Jesus C. Xavier
Eng.º C.M. - CREA-PB Nº 180.283594-2

Adriano Gomes do Nascimento
Coordenador de Planejamento Obras
SECOB/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
Eng.º João Neto de Oliveira
CREA: 1606055208 D/PB



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA
CONTRATO: 2.08.022/2020
PERÍODO LÍQUIDO: 04/03/2021 A 07/04/2021

MEDIÇÃO: 09ª

FOTO 17



COORDENADAS:

7°13'11.5"S
35°53'13.4"W

RUA:

CORONEL JOSÉ ANDRÉ

FOTO 18



COORDENADAS:

7°13'11.8"S
35°53'13.5"W

RUA:

CORONEL JOSÉ ANDRÉ

FOTO 19



COORDENADAS:

7°13'14.6"S
35°53'14.4"W

RUA:

CORONEL JOSÉ ANDRÉ

FOTO 20



COORDENADAS:

7°13'10.5"S
35°53'13.2"W

RUA:

CORONEL JOSÉ ANDRÉ

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
Eng.º CREA-PB Nº 180.283694-2

Adriano Gomes do Nascimento
Coordenador de Planejamento Obras
SECOB/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
Eng.º João Neto de Oliveira
CREA. 1608055208 D/PB



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA
CONTRATO: 2.08.022/2020
PERÍODO LÍQUIDO: 04/03/2021 A 07/04/2021

MEDIÇÃO: 09ª

FOTO 21



COORDENADAS:	RUA:
7°12'53.9"S 35°53'15.2"W	EPITÁCIO PESSOA

FOTO 22



COORDENADAS:	RUA:
7°12'53.3"S 35°53'15.9"W	EPITÁCIO PESSOA

FOTO 23



COORDENADAS:	RUA:
7°12'53.0"S 35°53'14.0"W	PROFESSOR MAURO LUNA

FOTO 24



COORDENADAS:	RUA:
7°12'53.3"S 35°53'14.2"W	PROFESSOR MAURO LUNA

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
Eng.º Civil - CREA-PB Nº 180.283534-2

Adriano Gomes do Nascimento
Coordenador de Planejamento Obras
SECOB/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
Eng. João Neto de Oliveira
CREA. 1806055208 DMB



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA
CONTRATO: 2.08.022/2020
PERÍODO LÍQUIDO: 04/03/2021 A 07/04/2021

MEDIÇÃO: 09ª

FOTO 25



COORDENADAS:	RUA:
7°12'43.6"S 35°53'28.2"W	DESEMBARGADOR AZEVEDO

FOTO 26



COORDENADAS:	RUA:
7°12'43.2"S 35°53'28.4"W	DESEMBARGADOR AZEVEDO

FOTO 27



COORDENADAS:	RUA:
7°12'53.3"S 35°53'32.2"W	ANTENOR NAVARRO

FOTO 28



COORDENADAS:	RUA:
7°12'56.2"S 35°53'33.0"W	ANTENOR NAVARRO

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
Eng.º Civil - CREA-PB Nº 180.283594-2

Adriano Gomes do Nascimento
Coordenador de Planejamento Obras
SECOB/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

Eng. João Neto de Oliveira
CREA 1606855208 D/PB



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS


EMPRESA: **CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA**
 CONTRATO: **2.08.022/2020**
 PERÍODO LÍQUIDO: **04/03/2021 A 07/04/2021**

MEDIÇÃO: **09ª**

FOTO 29



FOTO 30

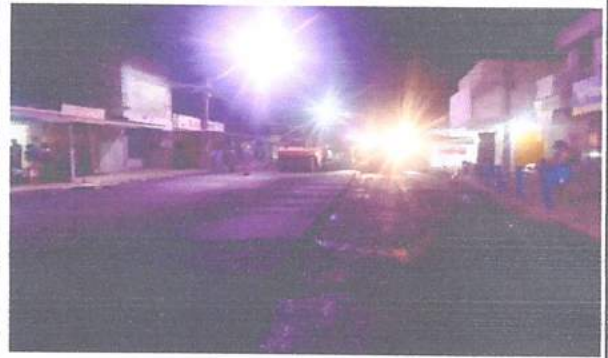

COORDENADAS:	RUA:
7°14'51.6"S 35°54'48.9"W	PROFESSOR LUIZ GILLIARD

COORDENADAS:	RUA:
7°14'48.3"S 35°54'49.2"W	PROFESSOR LUIZ GILLIARD

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng.º Civil - CREA-PB Nº T80.283694-2

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Urbas
 SECOB/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
Eng. João Neto de Oliveira
 CREA 180855208-D/PB
