

Nº OPERAÇÃO 1.065.600-37	Nº SCONV 69933022019	GESTOR Ministério do Desenv. Regional - MDR	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO	RECURSO OGU não-PAC
PROPORANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB	MUNICÍPIO / UF CAMPINA GRANDE/PB	LOCALIDADE / ENDEREÇO Diversas ruas de diversos bairros	VALORES CONTRATADOS (R\$)		
OBJETO Recapamento Asfáltico e Requalificação das Calçadas	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapamento Asfáltico e Humanização de Calçadas em Campina Grande - PB	REPASSSE 19.296.907,63	CONTRAPARTIDA 799.016,79	INVESTIMENTO 20.094.924,42	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: fev-21	100,00%
Medição nº:	7	Saldo a Reprogramar:
		Repassse (R\$) 127.584,37
		Contrapartida (R\$) 5.276,21

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.
									Acum. Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período	
	TOTAL							19.169.323,26	8.851.570,47	1.222.169,32	10.073.739,79	52,55%
								792.740,58	366.053,56	50.542,38	416.595,94	
								0,00	0,00	0,00	0,00	
								19.962.063,84	9.217.624,03	1.272.711,70	10.490.335,73	
1	Meta 1.	Serviços Preliminares	Licitado / Em Execução	80,00	m²	2.08.022/2020	1	37.667,20	-	-	-	-
1	Meta 2.	Recapamento Asfáltico	Licitado / Em Execução	287.724,69	m²	2.08.022/2020	7	18.187.979,23	9.142.418,22	1.272.711,70	10.415.129,92	57,26%
1	Meta 3.	Requalificação de Calçadas	Licitado / Em Execução	9.465,69	m²		1	1.679.473,03	75.205,81	-	75.205,81	4,48%
1	Meta 4.	Requalificação de Calçadas	Licitado / Em Execução	44,48	m		1	56.944,38	-	-	-	-

Acumulado Anterior: 46,16%

PREFE MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
Eng. Civil - CREA-PB nº 180.285941-2

Adriano Gomes do Nascimento
PMCG/SECOP - Coordenador
de Planejamento de Obras

PMCG
Secretaria de Obras
Recebido em 10/02/21
Odeti Silveira
SECRETARIA

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
Eng. João Neto de Oliveira
CREA - 1606035208-DIPB

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período	Física Acum.
-------	-----------------	------------------------------	----------	------------	-------	-----------------------------	----------	-------------------	------------------------	------------	---------------------------	--------------

Observações:

Local: CAMPINA GRANDE-PB

Francisco de Jesus C. Xavier

Responsável Técnico
 Nome: FRANCISCO DE JESUS C. XAVIER
 Cargo: RESPONSÁVEL TÉCNICO
 ART/IRRT Fiscal: PB20180221411

Data: 05 de fevereiro de 2021

Suzanne P. S. Albuquerque

Representante Tomador / Agente Promotor
 Nome: FERNANDA RIBEIRO BARBOZA
 Cargo: SECRETÁRIA DE OBRAS

Responsável Social

Nome:
 Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:
 Cargo:

Francisco de Jesus C. Xavier
 PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
 FRANCISCO DE JESUS C. XAVIER
 Eng. Civil - CREA-PB Nº 140.205/2014

Adriano Gompes do Nascimento
 Adriano Gompes do Nascimento
 PMCG/SECOB - Coordenador
 de Planejamento de Obras

Suzanne P. S. Albuquerque
 Conselheira Rocha Cavalcante Ltda.
 Eng. João Neto de Oliveira
 CREA 160605508-6/PB



Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

CNPJ: 09.323.098/0001-92 -Insc. Estadual:16.056.310-0

Rua Álvaro de Araújo Pereira, N° 255 – Jardim Tavares – CEP: 58.402-300 – Campina Grande – PB
Fone: (83) 3341-1471 Fax: (83) 3322-6933 CREA: 821 – 16ª

À

Prefeitura Municipal de Campina Grande – PB

A/C: Eng. (a).Fernanda Ribeiro Barboza – Secretária Municipal de Obras

Ref.: 07ª Medição da obra de recapeamento asfáltico nos bairros Centro, Bela Vista, Alto Branco, Conceição, Estação Velha, Palmeira, Prata, Bodocongó, Santa Cruz, Dinamérica, Catolé, Centenário, Cruzeiro, Jardim Tavares, Jeremias, José Pinheiro, Mirante, Novo Bodocongó, Santo Antônio, São José, Serrotão, Malvinas, Monte Santo e Universitário, no município de Campina Grande, estado da Paraíba.

Assunto: Solicitação de Análise Técnica da medição de serviços nº 07

Senhora Secretária,

Encaminhamos, em anexo, o **Boletim da Medição de Serviços nº 07 – Revisado e demais elementos técnicos integrantes**, relativo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 2.08.022/2020, referente ao período de 18 de dezembro/2020 a 29 de janeiro/2021, para aprovação da fiscalização da obra e providencias cabíveis no tocante à liberação dos recursos.

Campina Grande, 05 de fevereiro de 2021.

Atenciosamente,

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

Eng. João Neto de Oliveira
CREA: 160655208-0/PA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIROS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTAÇÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCONGÓ, SANTA CRUZ, DINAMÉRICA, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCONGÓ, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTÃO, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA

07ª MEDIÇÃO
CONTRATO 2.08.022/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIROS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTAÇÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCONGÓ, SANTA CRUZ, DINAMÉRICA, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCONGÓ, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTÃO, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA

FÍSICO-FINANCEIRO



Nº da CTRF (Contrato Execução/Execução) 2.08.022/2020 data de obra - data 29/06/2020 Valor total (R\$) 18.225.646,43	Nº da CTRF 7 Empresa Contratada CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA Objeto da CTRF (resumido) RECAPAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIRROS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTÁÇÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCONGO, SANTA CRUZ, DUMMÊCA, CATOLÉ, CENTEÃO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JERÔNIMAS, JOSÉ FERREIRO, MIRANTE, NOVO BODOCONGO, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERRODÃO, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA	Nº da CT 1.065.660-37 Tomador/Outorgante ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Agente Financiador ou Ag. Operadora Financeira CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Grau de Serviço ENR 45-CT
Nº da CTRF 29/06/2020 Valor total (R\$) 18.225.646,43	Nº da CTRF 26/07/2021 Valor total (R\$) 18.225.646,43	Nº da CTRF 18/12/2020 a 29/01/2021 Valor total (R\$) 09.323.098/0001-92	Nº da CTRF 05/02/2021 Valor total (R\$) 09.323.098/0001-92
CITEF - Valor atual (R\$) 18.225.646,43	CITEF - De último mês 18.225.646,43	CITEF - De último mês 18.225.646,43	CITEF - De último mês 18.225.646,43

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PREÇO UNITÁRIO ORÇAMENTO		PREÇO TOTAL		ENCARGOS FÍSICO (PREÇO UNITÁRIO)			ENCARGOS FINANCEIRO (R\$)			DEVEDOR	
		QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ADICIONAIS (R\$) PREÇO UNITÁRIO	MÉDIO DO PERÍODO	ADICIONAIS INCLUIDOS NO PERÍODO	ADICIONAIS PREVIOUSOS	MÉDIO DO PERÍODO	ADICIONAIS INCLUIDOS NO PERÍODO			
1.0	RUA ÍNDIOS CARIBÍS			273.489,56									
2.0	RUA IREMAR VILLARIM			82.917,71									
3.0	RUA FÉLIX ARAÚJO			169.697,61									
4.0	RUA MIGUEL BARRETO			37.699,60									
5.0	RUA TEODÓSIO DE OLIVEIRA LEDO			43.369,83									
6.0	RUA FREI CAIECA			158.074,51									
7.0	RUA MAIOR JOVINO DO Ó			156.136,81									
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			747,85									
7.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	0,33	2.266,20	0,33	747,85	2.266,20			2.266,20		747,85	
7.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			124.928,04									
7.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	2,36	2.035,55	2,36	4.877,83	2.035,55			2.035,55		4.877,83	
7.2.2	CBUQ												
7.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017 - Cepa	m³	103,24	1.147,56	103,24	118.474,09	87,53			87,53		100.445,93	15,22
7.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	3,87	399,54	3,87	1.544,48	87,53			87,53		338,74	15,22
7.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1,09	1.181,58	1,09	1.288,72	919,07			919,07		1.001,79	15,22
7.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA			460,92									
7.3.1	Nivelamento de tampão de Poço de Visita	unidade	4,00	115,23	4,00	460,92	3,00			3,00		345,69	25,00
8.0	RUA VIGOLVINO WANDERLEY			258.870,62									
9.0	RUA ALEXANDRINO CAVALCANTE			19.772,34									
10.0	RUA JOÃO ALVES DE OLIVEIRA			216.876,69									
11.0	RUA CRISTIANO LAURITZEN			70.564,81									
12.0	RUA FERREIRO DE CARVALHO			213.691,01									
13.0	RUA BENTO VIÂNIA			45.431,55									
13.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			273,08									
13.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	0,33	273,08	0,33	273,08	827,50			827,50		273,08	
13.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			46.043,24									
13.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	2,36	1.796,67	2,36	46.043,24	761,30			761,30		40.416,51	
13.2.2	CBUQ												
13.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017 - Cepa	m³	38,06	1.147,56	38,06	43.676,13	33,22			33,22		38.121,94	12,72
13.2.2.2	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	3,87	399,54	3,87	1.544,48	33,22			33,22		128,55	12,72
13.2.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1,09	1.181,58	1,09	1.288,72	338,84			338,84		369,34	12,72
13.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA			115,23									
13.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	115,23	115,23	115,23	115,23	115,23			115,23			100,00
14.0	RUA CEL. JOÃO LOURENÇO PORTO			168.546,24									

Adriano Gomes do Nascimento
 PMCG/SECOB - Coordenador
 de Planejamento de Obras

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Eng. João Neto de Oliveira
 CREA-1606055208-DPR

CAIXA		W do CTEH (Contrato Especializado)		EM - admissão		EM - Data emissão		EM - Período de referência da medição		Nº de CT		Grau de Selo	
2.08.02/2020		29/06/2020		7		05/02/2021		de 18/12/2020 a 29/01/2021		1.065.660-37		01/07/20	
da obra - data		Previsto Término da obra		Empresa Contratada		Data do CTEH (assinado)		CNPJ		Tomador/da Promotor ou Tomador		Data do CT	
18.225.646/43		26/07/2021		CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA		09/03/2021		09.323.098/0001-92		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE			
CTEF -		CTEF - de assinatura		RECAPAMENTO ASFÁLTICO NOS BARRIOS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTACÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCONGÓ, SANTA CRUZ, DUARTEFERREIRA, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ FINHEIRO, MIRANTE, ROVO BODOCONGÓ, SMTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERRODÃO, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agente Financeiro ou Ag. Operador Pagador		Fonte de Recursos		outra (descrever)	
CTEF -		CTEF - Ex última AEA		PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO									

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBRAMENTO	PRESTIÇO OBRAMENTO			EXECUÇÃO FÍSICA (PARTE MATERIAIS)			EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$)			EMPENHO	
		UNID.	QTD	PREÇO UNID.	ACUMULADO até o período anterior	MÉDIO DO PERÍODO	ACUMULADO no período anterior	MÉDIO DO PERÍODO	ACUMULADO no período	ACUMULADO no período		
15.0	RUA FEDRO AMÉRICO											
15.1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
15.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e gride	m²	688,60	0,33	37.240,04	227,30	688,60	227,30	227,30	227,30	227,30	31.463,20
15.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO											
15.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	610,03	2,36	36.897,51	1.439,79	610,03	1.439,79	1.439,79	1.439,79	1.439,79	31.235,90
15.2.2	CBUQ											
15.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	30,50	1.147,56	35.000,58	25,63	25,63	25,63	25,63	25,63	25,63	29.411,96
15.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibrador-abastecedor	m³	30,50	3,87	118,04	261,43	25,63	25,63	25,63	25,63	25,63	99,19
15.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	311,10	1,09	339,10	261,43	261,43	261,43	261,43	261,43	261,43	284,96
15.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA											
15.3.1	Nivelamento de Tambo de Poço de Visita	unidade	1,00	115,23	115,23	115,23	115,23	115,23	115,23	115,23	115,23	115,23
16.0	RUA DEP. ALVARO GAUDÊNCIO											
16.1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
16.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e gride	m²	3.771,80	0,33	207.174,99	1.245,02	3.654,67	3.654,67	3.654,67	3.654,67	3.654,67	178.352,32
16.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO											
16.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	3.395,52	2,36	205.353,82	8.013,43	3.288,10	3.288,10	3.288,10	3.288,10	3.288,10	177.146,28
16.2.2	CBUQ											
16.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	169,78	1.147,56	194.837,74	145,73	145,73	145,73	145,73	145,73	145,73	167.233,92
16.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibrador-abastecedor	m³	169,78	3,87	657,05	587,35	145,73	145,73	145,73	145,73	145,73	563,98
16.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.697,60	1,09	1.850,60	1.457,30	1.457,30	1.457,30	1.457,30	1.457,30	1.457,30	1.588,46
16.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA											
16.3.1	Nivelamento de Tambo de Poço de Visita	unidade	5,00	115,23	576,15	576,15	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	576,15
17.0	RUA VILA NOVA DA BAINHA											
17.1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
17.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e gride	m²	6.105,72	0,33	371.856,94	2.014,89	5.867,35	5.867,35	5.867,35	5.867,35	5.867,35	276.787,48
17.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO											
17.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	6.105,72	2,36	369.190,67	14.469,50	5.485,62	5.485,62	5.485,62	5.485,62	5.485,62	274.851,25
17.2.2	CBUQ											
17.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	305,29	1.147,56	350.338,59	225,37	225,37	225,37	225,37	225,37	225,37	258.625,60

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
 PLANO DE OBRAS 2017
 FOLHA Nº 09 DE 130
 Emissão: 15/09/2017

Adriano Gomes do Nascimento
 PMCG/SECOB - Coordenador
 de Planejamento de Obras

CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA.
 Eng. João Azeiteiro de Oliveira
 CREA 460665208-DPB

CAIXA	W de CTEF (Contrato de Prestação de Serviços)	29/06/2020	26/07/2021	EM - número	05/07/2021	EM - Data emitida	18/12/2020 a 29/01/2021	EM - Período de referência da medição	1.055.660-37	W de CTEF	01/07/20	Grav de Selo
	W de CTEF (Contrato de Prestação de Serviços)	29/06/2020	26/07/2021	Empresa Contratada	05/07/2021	05/07/2021	18/12/2020 a 29/01/2021	de	1.055.660-37	W de CTEF	01/07/20	Grav de Selo
				CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA								
				CPF: 18.225.646/43								
				Valor total (R\$)								
				18.225.646/43								
				Valor em R\$								
				18.225.646/43								
				Valor em R\$								
				18.225.646/43								
				Valor em R\$								
				18.225.646/43								

ITEM	MTR	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO EMPENHO	RECEITO DO EMPENHO			PREÇO TOTAL	EMPENHO FEITO (QUANTIDADE)			EMPENHO FINANCEIRO (R\$)			EMPENHO
			UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.		ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MÉDIO NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MÉDIO NO PERÍODO	ACUMULADO RECORRIDO PERÍODO	
17.2.3	m³	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora		305,29	3,87	1.181,47	225,37		225,37	872,18		872,18	26,18
17.2.4	m³ x km	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana		2.991,84	1,09	3.261,11	2.108,63		2.108,63	2.407,41		2.407,41	26,18
17.3	unidade	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA		6,00	115,23	691,38							100,00
17.3.1	unidade	Nivelamento de Tampao de Poço de Visita		6,00	115,23	691,38							100,00
18.0		RUA PADRE BIAPINA				45.042,32							
19.0		RUA ELIAS ASFORA				191.836,38							
19.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				924,41							
19.1.1	m²	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e		2.801,25	0,33	924,41	2.706,63		2.706,63	184.877,65	460,92	185.338,57	
19.2	m²	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		5.104,50	2,36	190.451,05	4.931,32		4.931,32	893,19		893,19	3,38
19.2.1	m²	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte		5.104,50	2,36	12.046,62	4.931,32		4.931,32	183.984,46		183.984,46	3,39
19.2.2	m²	CBUQ								11.637,92		11.637,92	
19.2.2.1	m³	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Cepa		76,57	1.207,08	92.426,12	73,97		73,97	89.287,71		89.287,71	3,40
19.2.2.2	m³	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Repersilamento		76,57	1.093,55	83.735,12	73,97		73,97	60.889,89		60.889,89	3,40
19.2.3	m³	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora		153,14	3,87	592,65	147,94		147,94	572,53		572,53	3,39
19.2.4	m³ x km	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana		1.516,09	1,09	1.652,54	1.464,60		1.464,60	1.596,41		1.596,41	3,40
19.3	unidade	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA		4,00	115,23	460,92			4,00	460,92		460,92	
19.3.1	unidade	Nivelamento de Tampao de Poço de Visita		4,00	115,23	460,92			4,00	460,92		460,92	
20.0		RUA BARÃO DO ABAI				234.608,87							
21.0		RUA JOSÉ BONIFÁCIO				72.355,08							
21.1	m²	SERVIÇOS PRELIMINARES				441,56							
21.1.1	m²	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e		1.338,05	0,33	441,56	1.338,05		1.338,05	441,56		441,56	
21.2	m²	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		1.185,13	2,36	71.683,06	1.185,13		1.185,13	67.475,02		67.475,02	
21.2.1	m²	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte		1.185,13	2,36	2.786,91	1.185,13		1.185,13	2.786,91		2.786,91	
21.2.2	m²	CBUQ											
21.2.2.1	m³	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Cepa		59,26	1.147,55	68.004,41	55,64		55,64	63.850,24		63.850,24	6,11
21.2.3	m³	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora		59,26	3,87	229,34	55,64		55,64	215,33		215,33	6,11
21.2.4	m³ x km	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana		598,53	1,09	652,40	551,96		551,96	612,54		612,54	6,11
21.3	unidade	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA		2,00	115,23	230,46			2,00	230,46		230,46	
21.3.1	unidade	Nivelamento de Tampao de Poço de Visita		2,00	115,23	230,46			2,00	230,46		230,46	


Adriano Gomes do Nascimento
 PMCG/SECOB - Coordenador
 de Planejamento de Obras

RUA JOSÉ BONIFÁCIO
 Fone: (11) 2012-0910
 E-mail: adriano@seco.org.br

CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA.
 Emp. João Neto de Oliveira
 CREA: 1606055/08 DPB

CAIXA		EM - número 7		EM - Data emissão 05/02/2021		Nº do CT 1.085.660-37		Grau de Selo	
Nº do CTE (contorno Envasamento)		Empresa Contratada		Data do CT		Tomador/Ag. Promotor ou Tomador		Data do CT	
2.08.02/2020		CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA		05/02/2021		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE		01/07/20	
Início da obra - data		Previsão término da obra		Objeto do CTE (resumido)		Agente Intermediário e Ag. Operador Pagador			
29/06/2020		26/07/2021		RECAPAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIRROS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, COKEIÇÃO, ESTACÃO VELHA, PALMEIRA, PRAIA, BODOCONGO, SANTA CRUZ, DINAMÉRICA, CATEL, CEMITÉRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCONGO, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERGIATO, MALVIAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA					
Valor total licitação (R\$)		CTE - de anulação							
18.225.646,43									
Valor total (R\$)		CTE - de último APL							
18.225.646,43									
Local da obra (Município/UF)								Fonte de Recursos	
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO								conta (descrição)	
								CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	


ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO EMPENDIMENTO	PREVISTO NO EMPENDIMENTO			EXECUÇÃO PERÍODO DE ANTERIORES			EXECUÇÃO PERÍODO EM ANTERIORES			EXECUÇÃO PERÍODO EM SEQUÊNCIA			TOTAL	
		UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MÉDIO NO PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MÉDIO NO PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MÉDIO NO PERÍODO		ACUMULADO PERÍODO PERÍODO
22.0	RUA JOÃO TAVARES				241.197,71										
22.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.412,00										
22.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	4,278,78	0,33	1.412,00	3,323,04		3,323,04							
22.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				238.853,87										
22.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	3,947,34	2,36	9,315,72	2,920,92		2,920,92							
22.2.2	CBUQ														
22.2.2.1	Constituição de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusiva transporte. AF - 03/2017 - Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	197,37	1,147,56	226.493,92	119,64		119,64							
22.2.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	2,092,12	1,09	2.280,41	1.268,18		1.268,18							
22.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				921,84										
22.3.1	Nivelamento de Tampeo de Poço de Visita	unidade	8,00	115,23	921,84	5,00		5,00							
23.0	RUA CORONEL JOSÉ ANDRÉ				150.822,84										
24.0	RUA MANOEL PEREIRA DE ARAÚJO				175.904,31										
24.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.043,66										
24.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	3,162,60	0,33	1.043,66	980,50		980,50							
24.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				174.284,50										
24.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	2,851,48	2,36	6.800,23	6.827,76		6.827,76							
24.2.2	CBUQ														
24.2.2.1	Constituição de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusiva transporte. AF - 03/2017 - Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	144,08	1,147,56	165.340,44	44,14		44,14							
24.2.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1,455,21	1,09	1.586,18	445,81		445,81							
24.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				576,15										
24.3.1	Nivelamento de Tampeo de Poço de Visita	unidade	5,00	115,23	576,15	5,00		5,00							
25.0	RUA CAPITÃO JOÃO DE SÁ				256.656,37										
25.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.511,24										
25.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	4,579,50	0,33	1.511,24	4.238,27		4.238,27							
25.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				254.799,44										
25.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	4,213,14	2,36	9.943,01	3.837,46		3.837,46							
25.2.2	CBUQ														



Adriano Gomes do Nascimento

 PMCG/SECOB - Coordenador

 de Planejamento de Obras



Eng. Junio Nilton de Oliveira

 CREA 1066055208 DPB

CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA.

CAIXA		W da CTEF (Contrato Execução/Execução)		EM - número		EM - Data emissão		EM - Período de referência da medição		Nº da CT		Grau de Siglo	
2.08.02/2020		29/06/2020		7		05/09/2021		de 18/12/2020 a 29/01/2021		1.055.660-37		01/07/20	
Início da obra - data		Previsão término da obra		Empresa Contratada		Objeto do CTEF (resumido)		CNEI		Tomador/Pag Promotor ou Tomador		Data da CT	
26/07/2021		26/07/2021		CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA		09.323.099/0001-92		09.323.099/0001-92		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE		01/07/20	
CTEF: Valor total (R\$)		CTEF - de assinatura		RECAPAMENTO ASFÁLTICO NOS BARRIOS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRAUNCO, COQUEÇÃO, ESTACÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCONGÓ, SANTA CRUZ, DINAMÉRICA, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, IREMIAS, JOSÉ PIHIEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCONGÓ, SAMTO ANTONIO, SÃO JOSÉ, SERODIÃO, MANUIHAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA		CAUSA ECONÔMICA FEDERAL		Fonte de Recursos		e/ou (descrever)			
18.225.646,43		CTEF - de último mês		Local da obra (Imp/Município/UF)		PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO							
18.225.646,43													

ITEM	DESCR. DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PREÇO DO ORÇAMENTO			PREÇO DO PERÍODO ANTERIOR			PREÇO DO PERÍODO PRESENTES			PREÇO DO PERÍODO POSTERIOR			QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR TOTAL	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO PRESENTES	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO POSTERIOR	MÉDIA DO PERÍODO	ACUMULADO ANUAL DO PERÍODO	SERVIDOR (N)
		QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL									
25.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017 - Capa	m³	210,66	1.147,56	241.744,99	168,05	192.847,46	168,05	192.847,46	168,05	192.847,46	168,05	192.847,46	20,23	m³	192.847,46				192.847,46	20,23	
25.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	210,66	3,87	815,25	168,05	650,35	168,05	650,35	168,05	650,35	168,05	650,35	20,23	m³	650,35				650,35	20,23	
25.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	2.106,60	1,09	2.296,19	1.680,50	1.831,75	1.680,50	1.831,75	1.680,50	1.831,75	1.680,50	1.831,75	20,23	m³ x km	1.831,75				1.831,75	20,23	
25.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	3,00	115,23	345,69	2,00	230,46	2,00	230,46	2,00	230,46	2,00	230,46	33,33	unidade	230,46				230,46	33,33	
26.0	RUA CRISTOVÃO COLOMBO				96.110,74		91.626,41		91.626,41		91.626,41		91.626,41									
26.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				558,06		532,95		532,95		532,95		532,95									
26.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	1.691,10	0,33	558,06	1.614,99	532,95	1.614,99	532,95	1.614,99	532,95	1.614,99	532,95	4,50	m²	532,95				532,95	4,50	
26.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				95.437,45		91.093,46		91.093,46		91.093,46		91.093,46									
26.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	1.581,74	2,36	3.732,91	1.569,79	3.563,10	1.569,79	3.563,10	1.569,79	3.563,10	1.569,79	3.563,10	4,55	m²	3.563,10				3.563,10	4,55	
26.2.2	CBUQ																					
26.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017 - Capa	m³	79,09	1.147,56	90.760,52	75,49	86.629,30	75,49	86.629,30	75,49	86.629,30	75,49	86.629,30	4,55	m³	86.629,30				86.629,30	4,55	
26.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	79,09	3,87	306,08	75,49	292,15	75,49	292,15	75,49	292,15	75,49	292,15	4,55	m³	292,15				292,15	4,55	
26.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	585,27	1,09	637,94	558,63	608,91	558,63	608,91	558,63	608,91	558,63	608,91	4,55	m³ x km	608,91				608,91	4,55	
26.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	1,00	115,23	115,23																	
26.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita				115,23																	
27.0	RUA DR. CARLOS AGRA				205.820,16		170.415,95		170.415,95		170.415,95		170.415,95									
27.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.201,17		1.010,68		1.010,68		1.010,68		1.010,68									
27.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	3.639,50	0,33	1.201,17	3.062,66	1.010,68	3.062,66	1.010,68	3.062,66	1.010,68	3.062,66	1.010,68	15,85	m²	1.010,68				1.010,68	15,85	
27.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				203.697,15		169.405,27		169.405,27		169.405,27		169.405,27									
27.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	3.375,18	2,36	7.965,42	2.806,83	6.624,12	2.806,83	6.624,12	2.806,83	6.624,12	2.806,83	6.624,12	16,84	m²	6.624,12				6.624,12	16,84	
27.2.2	CBUQ																					
27.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017 - Capa	m³	168,76	1.147,56	193.662,23	140,35	161.060,05	140,35	161.060,05	140,35	161.060,05	140,35	161.060,05	16,83	m³	161.060,05				161.060,05	16,83	
27.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	168,76	3,87	653,10	140,35	543,15	140,35	543,15	140,35	543,15	140,35	543,15	16,84	m³	543,15				543,15	16,84	
27.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.259,45	1,09	1.416,40	1.080,69	1.177,95	1.080,69	1.177,95	1.080,69	1.177,95	1.080,69	1.177,95	16,83	m³ x km	1.177,95				1.177,95	16,83	
27.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	8,00	115,23	921,84	7,00	806,61	7,00	806,61	7,00	806,61	7,00	806,61	12,50	unidade	806,61				806,61	12,50	
27.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita				921,84		806,61		806,61		806,61		806,61									
28.0	RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL				67.138,89		62.048,03		62.048,03		62.048,03		62.048,03									

Adriano Gomes do Nascimento
 PMCG/SECOB - Coordenador
 de Planejamento de Obras

PRF. MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE
 FRANCISCO DE ASSIS G. XAVIER
 Eng.º Civil - CRETA 261140/2013-01/3

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
 Eng.º João Nilo de Oliveira
 CREA 140655/2028 DPEB

CAIXA	Nº do CTR (Contrato Empreitada/Processamento)		Nº do CTR (Contrato Empreitada)		Nº do CTR (Contrato Empreitada)		Nº do CTR (Contrato Empreitada)		Nº do CTR (Contrato Empreitada)		Nº do CTR (Contrato Empreitada)	
	2.08.022/2020	29/06/2020	26/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	26/07/2021
	Inicio da obra - data	Finalização da obra	Finalização da obra	Finalização da obra	Finalização da obra	Finalização da obra	Finalização da obra	Finalização da obra	Finalização da obra	Finalização da obra	Finalização da obra	Finalização da obra
	Valor total líquido (R\$)	Valor total líquido (R\$)	Valor total líquido (R\$)	Valor total líquido (R\$)	Valor total líquido (R\$)	Valor total líquido (R\$)	Valor total líquido (R\$)	Valor total líquido (R\$)	Valor total líquido (R\$)	Valor total líquido (R\$)	Valor total líquido (R\$)	Valor total líquido (R\$)
	18.225.646,43	18.225.646,43	18.225.646,43	18.225.646,43	18.225.646,43	18.225.646,43	18.225.646,43	18.225.646,43	18.225.646,43	18.225.646,43	18.225.646,43	18.225.646,43
	Valor atual (R\$)	Valor atual (R\$)	Valor atual (R\$)	Valor atual (R\$)	Valor atual (R\$)	Valor atual (R\$)	Valor atual (R\$)	Valor atual (R\$)	Valor atual (R\$)	Valor atual (R\$)	Valor atual (R\$)	Valor atual (R\$)
	18.225.646,43	18.225.646,43	18.225.646,43	18.225.646,43	18.225.646,43	18.225.646,43	18.225.646,43	18.225.646,43	18.225.646,43	18.225.646,43	18.225.646,43	18.225.646,43

ITEM	DESCR. SERVIÇOS	REGISTRO DO SERVIÇO			REGISTRO DO PREÇO			REGISTRO DO VALOR			REGISTRO FINANCEIRO (R\$)			ESTADO (N)	
		UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ATUAL	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ATUAL	MÉDIO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	MÉDIO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO		
28.1	SERVIÇOS PRELIMINARES														
28.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e gride	m²	1.200,00	0,33	396,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00
28.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO														
28.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	1.104,00	2,36	2.605,44	1.104,00	1.104,00	1.104,00	2.605,44	2.605,44	2.605,44	2.605,44	2.605,44	2.605,44	2.605,44
28.2.2	CBUQ														
28.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	55,20	1.147,56	63.345,31	50,91	50,91	50,91	58.422,28	58.422,28	58.422,28	58.422,28	58.422,28	58.422,28	58.422,28
28.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	55,20	3,87	213,62	463,29	50,91	50,91	197,02	197,02	197,02	197,02	197,02	197,02	197,02
28.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	425,04	1,09	463,29	392,01	392,01	392,01	427,29	427,29	427,29	427,29	427,29	427,29	427,29
28.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA														
28.3.1	Nivelamento de Tampeo de Poço de Visita	unidade	1,00	115,23	115,23	115,23	115,23	115,23	115,23	115,23	115,23	115,23	115,23	115,23	115,23
29.0	RUA LUISSES GOMES														
29.1	SERVIÇOS PRELIMINARES														
29.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e gride	m²	1.054,80	0,33	351,38	1.054,80	1.054,80	1.054,80	351,38	351,38	351,38	351,38	351,38	351,38	351,38
29.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO														
29.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	958,32	2,36	2.261,64	958,32	958,32	958,32	2.261,64	2.261,64	2.261,64	2.261,64	2.261,64	2.261,64	2.261,64
29.2.2	CBUQ														
29.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	47,92	1.147,56	54.931,08	42,33	42,33	42,33	48.576,21	48.576,21	48.576,21	48.576,21	48.576,21	48.576,21	48.576,21
29.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	47,92	3,87	185,45	185,45	42,33	42,33	163,82	163,82	163,82	163,82	163,82	163,82	163,82
29.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	340,23	1,09	370,85	370,85	300,54	300,54	327,59	327,59	327,59	327,59	327,59	327,59	327,59
29.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA														
29.3.1	Nivelamento de Tampeo de Poço de Visita	unidade	1,00	115,23	115,23	115,23	115,23	115,23	115,23	115,23	115,23	115,23	115,23	115,23	115,23
30.0	RUA DESEMBARGADOR TRINDADE														
30.1	SERVIÇOS PRELIMINARES														
30.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e gride	m²	2.034,00	0,33	671,22	1.787,45	1.787,45	1.787,45	559,86	559,86	559,86	559,86	559,86	559,86	559,86
30.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO														
30.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	3.742,56	2,36	8.832,44	3.256,52	3.256,52	3.256,52	7.655,39	7.655,39	7.655,39	7.655,39	7.655,39	7.655,39	7.655,39
30.2.2	CBUQ														
30.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	56,14	207,08	67.655,47	48,85	48,85	48,85	58.565,85	58.565,85	58.565,85	58.565,85	58.565,85	58.565,85	58.565,85
30.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperflamento	m³	56,14	1.093,55	61.391,90	48,85	48,85	48,85	53.419,92	53.419,92	53.419,92	53.419,92	53.419,92	53.419,92	53.419,92



Adriano Gomes do Nascimento
 PMCG/SECOB - Coordenador
 de Planejamento de Obras



Eng. João Neto de Oliveira
 CREA - 180885208 D/PB



Prof. Manoel de Faria
 Engenheiro Civil - CREA 180885208 D/PB

	Nº do CTRF (Contrato de Prestação de Serviços) 2.085.022/2020	Nº do CT 1.065.660-37	Grau de Siglo 01/07/20
	Data de início da obra - obra - obra 29/06/2020	Data de referência da medição de 18/12/2020 a 29/01/2021	Data do CT
CTEF - Valor total (R\$) 18.225.646,43	Previsão Termino da obra 26/07/2021	Tomador/PA Promotor ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Agente Financeiro ou Ag. Operador Financeiro	
CTEF - Valor atual (R\$) 18.225.646,43	CTEF - de último ADL	Fonte de Recursos CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	outra (descrever)
Local da obra (Estado/Município/UF) PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO			

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	PREÇO UNITÁRIO			EXECUÇÃO PERÍODO ANTERIOR			EXECUÇÃO PERÍODO PRESENTATIVO			ACUMULADO INCLUSIVE O PERÍODO ANTERIOR	ACUMULADO INCLUSIVE O PERÍODO	ERRO (%)
		UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	ACUMULADO INCLUSIVE O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	ACUMULADO INCLUSIVE O PERÍODO				
302.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	112,28	3,87	434,52	97,70	378,10	97,70	378,10	378,10	12,98		
302.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	509,47	1,09	559,32	791,38	852,60	791,38	852,60	852,60	12,98		
303	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	5,00	115,23	576,15						100,00		
303.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita				576,15								
31.0	RUA EPIFÂNIO FESSOA				224.095,66								
32.0	RUA AFONSO CAMPOS				224.864,26								
32.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.335,02								
32.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	4.045,50	0,33	1.335,02	4.002,26	4.002,26	4.002,26	4.002,26	4.002,26	1,07		
32.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				222.261,71								
32.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	3.655,50	2,36	8.628,72	3.645,20	8.605,03	3.645,20	8.605,03	198.747,82	1,08		
32.2.2	CBUQ									8.605,03			
32.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_09/2017. - Capa	m³	184,29	1.147,56	211.483,83	164,08	168.291,64	164,08	168.291,64	168.291,64	10,97		
32.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	184,29	3,87	713,20	164,08	634,59	164,08	634,59	634,59	10,97		
32.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.253,17	1,09	1.365,96	1.115,74	1.216,16	1.115,74	1.216,16	1.216,16	10,97		
32.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	11,00	115,23	1.267,53						100,00		
32.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita				1.267,53								
33.0	RUA BENEDITO HOITA				160.122,51								
33.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				900,87								
33.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	2.729,92	0,33	900,87	2.434,59	803,41	2.434,59	803,41	803,41	10,82		
33.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				188.991,18								
33.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	5.057,66	2,36	11.936,55	4.669,18	11.491,26	4.669,18	11.491,26	11.491,26	3,73		
33.2.2	CBUQ												
33.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	75,87	1.207,08	91.581,16	73,04	88.165,12	73,04	88.165,12	88.165,12	3,73		
33.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_09/2017. - Reperfilamento	m³	75,87	1.093,55	82.967,64	72,33	78.987,12	72,33	78.987,12	78.987,12	4,60		
33.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	151,74	3,87	587,23	145,27	562,19	145,27	562,19	562,19	4,26		
33.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.760,18	1,09	1.918,60	1.685,13	1.836,79	1.685,13	1.836,79	1.836,79	4,26		
33.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	2,00	115,23	230,46								
33.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita				230,46	2,00	230,46	2,00	230,46	230,46			

PAPEL MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE
 FOLHA Nº 09 DE 09 - JACQUES C. XAVIER
 ELS Nº 01 - 01/2020 - 11/2020/2020

Adriano Gomes do Nascimento
 PMCG/SECOB - Coordenador
 de Planejamento de Obras

Consistoria Rocha Cavalcante Ltda.
 Emp. Juicio Nevalde Oliveira
 CREA-1606055208 DIPP

CAIXA		Nº do CTRF (Contrato de Execução/Execução)		EM - número		EM - data emissão		EM - período de validade da medição		Nº do CT		Grau de Sigilo	
2.08.022/2020		29/06/2020		7		05/02/2021		de 18/12/2020 a 29/01/2021		1.055.660-37		01/07/20	
Início da obra - data		Previsão término da obra		Empresa Contratada		Objeto do CTRF (remod.)		Data de início da obra		Título do CTRF		Data de fim da obra	
26/07/2021		26/07/2021		CONSTRUTORA BOCHA CAVALCANTE LTDA		Pavimentação de diversas ruas no município		09/02/2021		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE		01/07/20	
CTRF - Valor total (R\$)		CTRF - de assinatura		Local da obra (Bairro/Município/UF)		Descrição da obra		Valor do contrato		Assinatura do responsável		Assinatura do responsável	
18.225.646,43		18.225.646,43		CAMPINA GRANDE - PB		Pavimentação de diversas ruas no município		18.225.646,43		Adriano Gomes do Nascimento		Adriano Gomes do Nascimento	

ITEM	DESCRiÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PREÇO UNIT.			VALOR TOTAL			ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR			ACUMULADO INCLUSIVE DO PERÍODO			EMP. (N)
		QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	QUANT. NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUSIVE DO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	QUANT. NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUSIVE DO PERÍODO				
34.0	RUA PEDRO II			349.189,55										
35.0	RUA PROFESSOR MAURO LUNA			276.279,99			254.238,74					254.238,74		
35.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			1.418,18			1.120,21					1.120,21		
35.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	0,33	4.297,50			3.394,57					3.394,57		21,01
35.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			274.285,66			252.532,38					252.532,38		
35.2.1	Pintura de ligação com emissão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	2,36	7.311,70			6.789,14					6.789,14		7,15
35.2.2	CBUQ													
35.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	118,61	1.207,08			101,84					101,84		14,14
35.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017. - Reperilamento	m³	100,74	1.093,55			100,74					100,74		
35.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com camião/bastão de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	219,35	3,87			200,21					200,21		8,73
35.2.4	Transporte com camião/bastão de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	2.610,26	1,09			2.423,60					2.423,60		7,14
35.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA			576,15			576,15					576,15		
35.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	5,00	115,23			5,00					5,00		
36.0	RUA CAZUZA BARRETO			44.922,03										
37.0	RUA BENJAMIM COISTANT			31.901,56			16.288,70					16.288,70		
37.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			151,01			151,01					151,01		
37.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	457,60	0,33			457,60					457,60		
37.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			31.635,32			16.137,69					16.137,69		
37.2.1	Pintura de ligação com emissão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	848,64	2,36			848,64					848,64		
37.2.2	CBUQ													
37.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	12,73	1.207,08			15,77					15,77		100,00
37.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017. - Reperilamento	m³	12,73	1.093,55			12,73					12,73		
37.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com camião/bastão de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	25,46	3,87			15,77					15,77		38,06
37.2.4	Transporte com camião/bastão de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	226,59	1,09			140,35					140,35		38,06
37.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA			115,23			115,23					115,23		
37.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	1,00	115,23			1,00					1,00		100,00
38.0	RUA PRUDENTE DE MORAIS			360.222,03										

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
 Eng. João Neto de Oliveira
 CREA/1606055208-DPB

Adriano Gomes do Nascimento
 PMCG/SECOB - Coordenador
 de Planejamento de Obras

PAV. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
 20/09/2020
 PAULO ROCHA CAVALCANTE

CAIXA		EM - número 7		EM - Data emissão 05/02/2021		EM - Período de referência da medição do 18/12/2020 a 29/01/2021		Nº do CT 1.065.660-37		Data do CT 01/07/20	
Nº do CDTI (Contrato de prestação de serviços)		Empresa Contratada CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA		Objeto do CDTI (resumo)		Objeto do CDTI (resumo)		Tomador/da Promotor ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE		Agente Passivo ou Ag. Operador Passivo	
Lição 2.08.02/2020		Preço da obra - data 26/07/2021		CITEF - de assinatura		CITEF - de emissão de obra - data		CITEF - de emissão de obra - data		CITEF - de emissão de obra - data	
Valor total licitat (R\$)		Valor atualizado (R\$)		CITEF - de emissão de obra - data		CITEF - de emissão de obra - data		CITEF - de emissão de obra - data		CITEF - de emissão de obra - data	
18.225.646,43		18.225.646,43		CITEF - de emissão de obra - data		CITEF - de emissão de obra - data		CITEF - de emissão de obra - data		CITEF - de emissão de obra - data	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PREÇO DO ORÇAMENTO			PREÇO FICADO REALIZADO (R\$)			PREÇO FICADO INVIABILIZADO (R\$)			CETRO (N)
		UNID.	QTDDE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MÉDIO DO PERÍODO	ACUMULADO DO PERÍODO	MÉDIO DO PERÍODO	ACUMULADO INVIABILIZADO DO PERÍODO	
39.0	RUA DESEMBARGADOR AZEVEDO				482.133,33						
39.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.429,30						
39.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e gride	m²	7,361,50	0,33	2.429,30	4.641,68	4.641,68	1.531,75	1.531,75	1.531,75	36,95
39.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				478.551,73						
39.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	11.570,38	2,36	27.306,10	9.283,36	9.283,36	21.908,73	21.908,73	21.908,73	19,77
39.2.2	CBUQ				113.310,07						
39.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	98,74	1.147,56	113.310,07						100,00
39.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	143,93	1.207,08	173.735,02	139,25	139,25	168.085,69	168.085,69	168.085,69	3,25
39.2.2.3	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017. - Repetimento	m³	143,93	1.093,55	157.394,65	139,25	139,25	152.276,84	152.276,84	152.276,84	3,25
39.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em viário-acabadora	m³	386,61	3,87	1.496,18	278,50	278,50	1.077,80	1.077,80	1.077,80	27,96
39.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	4.871,29	1,09	5.309,71	3.509,10	3.509,10	3.824,92	3.824,92	3.824,92	27,96
39.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				1.152,30						
39.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita	unidade	10,00	115,23	1.152,30	6,00	6,00	691,38	691,38	691,38	40,00
40.0	RUA DUQUE DE CAMIÁS				148.557,74						
40.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				690,69						
40.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e gride	m²	2.093,00	0,33	690,69	2.093,00	2.093,00	690,69	690,69	690,69	
40.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				147.636,59						
40.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	3.961,52	2,36	9.349,19	3.753,75	3.753,75	130.167,70	130.167,70	130.167,70	5,24
40.2.2	CBUQ				71.736,76						
40.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	59,43	1.207,03	71.736,76	59,41	59,41	71.712,62	71.712,62	71.712,62	0,03
40.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017. - Repetimento	m³	59,43	1.093,55	64.983,68	44,11	44,11	48.236,49	48.236,49	48.236,49	25,78
40.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em viário-acabadora	m³	118,84	3,87	459,91	103,52	103,52	400,62	400,62	400,62	12,83
40.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.010,14	1,09	1.101,05	879,93	879,93	959,12	959,12	959,12	12,89
40.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				230,46						
40.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita	unidade	2,00	115,23	230,46	2,00	2,00	230,46	230,46	230,46	
41.0	RUA ANTÔNIO NAVARRO				785.789,19						
42.0	RUA SEBASTIÃO MARTINS DE OLIVEIRA				83.944,02						

Adriano Gomes do Nascimento
 PMCG/SECOB - Coordenador
 de Planejamento de OBRAS

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
 Rua José de Jesus C. Xavier
 Fone: (31) 3363-3811 - 3363-3777


Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
 Eng. João Neto de Oliveira
 CREA: 160665508 DFB

CAIXA		Grav de Selo	
№ da CTEP (contorno físico/funcionamento)	2.08.02/2020	№ da CTEP	1.085.660-37
Inicio da obra - data	29/06/2020	Previsão término da obra	26/07/2021
CTEP	Vitor total (habitantes)	CTEP - de assinatura	
18.225-646.A3			
CTEP	Valor atual (R\$)	CTEP - Em último A.D.A.	
	18.225.646.A3		
Empresa Contratada CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA (Objeto do CTEP resumido)		Nº de CTEP 1.085.660-37 Tomador/Previdente ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Agente Financeiro ou Ag. Operador Financeiro	
Local da obra (Bairro/Município/UF)		Fonte de Recursos CAIXA ECONÔMICA FEDERAL outra (descrever)	
Recuperação Asfáltico nos Bairros Centro, Bela Vista, Alto Braúco, Conceição, Estação Velha, Palmeira, Prata, Bodocongó, Santa Cruz, Dinamêsa, Catolé, Centenário, Cruzeiro, Jardim Tavares, Jeremias, José Figueiro, Mirante, Novo Bodocongó, Santo Antônio, São José, Serrotaó, Malvinas, Monte Santo e Universitário, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba			
Local da obra (Bairro/Município/UF)			
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO			

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PREVISTO NO ORÇAMENTO			ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR			ACUMULADO PERÍODO ATUAL			ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR			ACUMULADO PERÍODO ATUAL		
		UNID.	QTDDE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	PREÇO UNIT. PERÍODO ANTERIOR	PREÇO TOTAL PERÍODO ANTERIOR	PREÇO UNIT. PERÍODO ATUAL	PREÇO TOTAL PERÍODO ATUAL	PREÇO UNIT. PERÍODO ANTERIOR	PREÇO TOTAL PERÍODO ANTERIOR	PREÇO UNIT. PERÍODO ATUAL	PREÇO TOTAL PERÍODO ATUAL			
43.0	RUA FLORÍDEES COUTINHO				739.697,48											
44.0	RUA PROFESSOR LUIZ GILLIARD				157.918,18											
45.0	RUA DAS TRÊS IRMÃS				211.439,22											
45.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.022,21											
45.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	3,097,60	0,33	1.022,21			3,097,60				3,097,60				
45.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				209.610,40											
45.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	5.632,03	2,36	13.291,71			3.195,83				2.436,25				
45.2.2	CBUQ															
45.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	84,48	1.207,08	101.974,12			84,48				84,48				
45.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017. - Reperflamento	m³	84,48	1.093,55	92.383,10			84,48				84,48				
45.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vitor-escabadora	m³	168,96	3,87	653,88			95,87				73,09				
45.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.199,62	1,09	1.307,59			680,68				518,94				
45.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				805,61											
45.3.1	Nivelamento de Tampeo de Poço de Visita	unidade	7,00	115,23	805,61											
46.0	RUA DR. JOÃO ARUNDO CORREIA				123.899,22											
46.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				578,92											
46.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	1.754,31	0,33	578,92			1.754,31				1.754,31				
46.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				122.964,61											
46.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	3.294,62	2,36	7.775,30			1.663,72				1.630,90				
46.2.2	CBUQ															
46.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	49,42	1.207,08	59.653,89			49,42				49,42				
46.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017. - Reperflamento	m³	49,42	1.093,55	54.043,24			48,25				48,25				
46.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vitor-escabadora	m³	98,84	3,87	382,51			48,25				49,93				
46.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.018,05	1,09	1.109,67			496,98				514,28				
46.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				345,69											
46.3.1	Nivelamento de Tampeo de Poço de Visita	unidade	3,00	115,23	345,69											
47.0	RUA JOÃO LUIS				385.044,84											
47.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.873,25											

Adriano Gomes do Nascimento
 PMCG/SECOB - Coordenador
 de Planejamento de Obras

CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA.
 Eng. João Neto de Oliveira
 CREA 160985/200 DPB

		CAIXA - Programa 7		EM - Data emissão 05/07/2021		EM - Período de referência da prestação de 18/12/2020 a 29/01/2021		Grau de Sigilo Baixa	
Moeda CTEF (Código de Funcionamento) 2.08.023/2020		Moeda CTEF (Código de Funcionamento) 26/07/2021		Moeda CTEF (Código de Funcionamento) 1.065.650-37		Moeda CTEF (Código de Funcionamento) 01/07/20		Moeda CTEF (Código de Funcionamento) 01/07/20	
Banco 48.000-0000		Previdência Terceira de Idade 26/07/2021		Empresa Contratada CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA		Tomador/De Promotor ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE		Tomador/De Promotor ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	
CTEF - Valor total (R\$) 18.225.616,43		CTEF - de anterior		Código do CTEF (remetente)		Agência Financiadora ou de Operação Financeira CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência Financiadora ou de Operação Financeira CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
CTEF - Valor total (R\$) 18.225.616,43		CTEF - De último mês		Local da obra (Bairro/Município/UF) PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO		Fonte de Recurso obra (descrever)		Fonte de Recurso obra (descrever)	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBRAS	PREÇO DO OBRAMENTO			PREÇO FÍSICO (PARA OBRAS DE OBRAS)			PREÇO TOTAL (PARA OBRAS DE OBRAS)			ACUMULADO (PARA OBRAS DE OBRAS)			SERVIDO N°
		UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDA DE PERÍODO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDA DE PERÍODO	ACUMULADO INCLUSIVE PERÍODO	ACUMULADO INCLUSIVE PERÍODO	SERVIDO N°		
47.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	5.935,00	0,33	1.833,25	5.010,13	5.010,13	1.833,25	1.833,25	1.833,25	1.833,25	1.833,25	9,32	
47.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				382.530,21			382.530,21		382.530,21		382.530,21		
47.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	10.264,40	2,36	24.223,58	10.019,69	10.019,69	24.223,58	24.223,58	23.616,47	23.616,47	23.616,47	2,38	
47.2.2	CBUQ													
47.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	153,97	1.207,08	185.854,11	150,29	150,29	185.854,11	185.854,11	181.412,05	181.412,05	181.412,05	2,39	
47.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017. - Reperflamento	m³	153,97	1.093,55	168.373,89	150,30	150,30	168.373,89	168.373,89	164.360,57	164.360,57	164.360,57	2,38	
47.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	307,93	3,87	1.191,69	300,59	300,59	1.191,69	1.191,69	1.163,28	1.163,28	1.163,28	2,38	
47.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	2.648,20	1,09	2.886,54	2.585,16	2.585,16	2.886,54	2.886,54	2.817,82	2.817,82	2.817,82	2,38	
47.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				691,38			691,38		691,38		691,38		
47.3.1	Nivelamento de Tampeo de Poço de Visita	unidade	6,00	115,23	691,38	6,00	6,00	691,38	691,38	691,38	691,38	691,38		
48.0	RUA LUIZ SOBRÉ FILHO				159.803,52			159.803,52		159.803,52		159.803,52		
48.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				593,47			593,47		593,47		593,47		
48.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	2.919,60	0,33	563,47	2.645,61	2.645,61	563,47	563,47	563,47	563,47	563,47	9,38	
48.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				158.033,44			158.033,44		158.033,44		158.033,44		
48.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	5.320,16	2,36	12.555,55	5.288,31	5.288,31	12.555,55	12.555,55	12.450,41	12.450,41	12.450,41	0,60	
48.2.2	CBUQ													
48.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	79,80	1.207,08	56.324,93	79,28	79,28	56.324,93	56.324,93	55.697,30	55.697,30	55.697,30	0,65	
48.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017. - Reperflamento	m³	79,80	1.093,55	87.265,29	76,72	76,72	87.265,29	87.265,29	83.897,16	83.897,16	83.897,16	3,86	
48.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	159,60	3,87	617,65	156,00	156,00	617,65	617,65	603,72	603,72	603,72	2,26	
48.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.165,08	1,09	1.269,94	1.138,80	1.138,80	1.269,94	1.269,94	1.241,29	1.241,29	1.241,29	2,26	
48.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				805,61			805,61		805,61		805,61		
48.3.1	Nivelamento de Tampeo de Poço de Visita	unidade	7,00	115,23	805,61	7,00	7,00	805,61	805,61	805,61	805,61	805,61	100,00	
49.0	RUA LADISLAU RODRIGUES DE SOUZA				137.669,10			137.669,10		137.669,10		137.669,10		
49.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				656,70			656,70		656,70		656,70		
49.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	1.990,00	0,33	656,70	1.698,54	1.698,54	656,70	656,70	656,70	656,70	656,70	14,65	
49.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				136.781,94			136.781,94		136.781,94		136.781,94		
49.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	3.651,60	2,36	8.641,38	1.698,54	1.698,54	8.641,38	8.641,38	8.003,55	8.003,55	8.003,55	7,29	
49.2.2	CBUQ													

Adriano Gomes do Nascimento
 PMCG/SECOB - Coordenador
 de Planejamento de Obras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 PREFEITO: DR. JACIR C. XAVIER
 SECRETÁRIO: DR. EDUARDO DE SOUZA

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
 Eng. João Neto de Oliveira
 CREA - 160605208 DDPB



Nº do CTEP (Contrato Executivo/Processamento) 2.08.02/2020		IM - Número 7		IM - Data emitida 09/02/2021		Nº do CT 1.065.660-37		Grau de Selo Data do CT	
Início 29/06/2020		Empresa Construtora CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA		IM - Período de referência da medição de 18/12/2020 a 29/01/2021		Tomador/Objeto PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE		Data do CT	
CTEP - Valor total (R\$) 18.225.646,43		Prazo de entrega 26/07/2021		COT 09.323.099/0001-92		Agência Executora ou Ag. Operadora Pápass CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do CT	
CTEP - Valor atual (R\$) 18.225.646,43		CTEP - De último A.E.A.		Local da obra (Rua/Av/Quilombo)		Descrição da obra		Forma de Pagamento	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PREÇO NO ORÇAMENTO			EVOLUÇÃO PREÇO EXECUTIVO (R\$)			EVOLUÇÃO PREÇO FEITO (R\$)			COTAÇÃO INICIAL DO PERÍODO	COTAÇÃO ATUAL DO PERÍODO
		QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MÉDIO NO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MÉDIO NO PERÍODO	ACUMULADO INICIAL DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL DO PERÍODO		
51.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-escabadora	m³	264,64	3,87	1.024,16	134,94	129,70	264,64	522,22	501,94	1.024,16	1.024,16
51.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.323,20	1,09	1.442,29	674,70	648,50	1.323,20	755,42	705,87	1.442,29	1.442,29
51.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	10,00	115,23	1.152,30							100,00
51.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita				1.152,30							
52.0	RUA SALUSTIANO BEZERRA CABRAL				266.312,38			119.665,06		125.718,68	245.383,74	
52.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.306,80			1.238,89		1.238,89	1.238,89	
52.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e gréide	m²	3.960,00	0,33	1.306,80	3.754,20		1.238,89		1.238,89	1.238,89	5,20
52.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				264.775,12			118.426,17		125.718,69	244.144,85	
52.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	7.128,00	2,36	16.822,08	3.341,27	3.340,85	6.682,12	7.855,40	7.854,41	15.769,81	6,26
52.2.2	CBUQ											
52.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exlusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	106,92	1.207,08	129.660,99		96,88	56,88		116.941,91	116.941,91	9,39
52.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exlusive transporte. AF_03/2017. - Reperflamento	m³	106,92	1.093,55	116.922,37	100,24		100,24	109.617,45		109.617,45	6,25
52.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-escabadora	m³	213,84	3,87	827,55	100,24	56,88	197,12	387,93	374,93	762,85	7,82
52.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.047,82	1,09	1.142,12	491,18	474,71	965,89	535,39	517,43	1.052,82	7,82
52.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	2,00	115,23	230,46							100,00
52.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita				230,46							
53.0	RUA ALCEBIADES GONÇALVES DA ROCHA				222.475,30			90.933,85		95.616,94	186.550,80	
53.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.074,10			836,34		836,34	836,34	22,14
53.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e gréide	m²	3.254,85	0,33	1.074,10	2.534,37		2.534,37	836,34	836,34	185.714,46	
53.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				220.640,28			90.097,52		95.616,94	185.714,46	
53.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	5.931,06	2,36	13.997,30	2.534,37	2.533,71	5.068,08	5.931,11	5.975,56	11.960,67	14,55
53.2.2	CBUQ											
53.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exlusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	88,56	1.207,08	107.381,84		73,48	73,48	88.656,24		88.656,24	17,40
53.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exlusive transporte. AF_03/2017. - Reperflamento	m³	88,56	1.093,55	97.282,21	76,03		76,03	83.142,61		83.142,61	14,53
53.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-escabadora	m³	177,93	3,87	688,59	76,03	73,48	149,51	294,24	284,37	578,61	15,97
53.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.459,03	1,09	1.580,34	623,45	602,54	1.225,99	679,56	655,77	1.336,33	15,97
53.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	4,00	115,23	460,92							100,00
53.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita				460,92							

Adriano Gomes do Nascimento
 PMCG/SECOB - Coordenador
 de Planejamento de Obras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE OBRAS

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
 Eng. João Neto de Oliveira
 CREA: TA0855208-8/DF


		W 65 CTEI (Centro Técnico de Ferramentas) RUA 4 de abril - data: 29/06/2020 26/07/2021 CTEI - de assinatura:		EM - número: 7 Empresa Contratada: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA (Objeto do CTEI resumido)		EM - período de validade do orçamento: 06/12/2020 a 29/01/2021 Nº de CT: 1.065.660-37 Tomador do Pagamento ou Remetente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Agência Financeira ou Ag. Operadora Pagante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		GRU de Sigilo Data de CT: 01/07/20	
CTEI - Valor atual (R\$): 18.225.646,43		Local de entrega: Rua Manoel de Araújo (Município)		Recuperação Asfáltico nos Bairros Centro, Bela Vista, Alto Branco, Cordeção, Estação Velha, Palmeira, Prata, Bodocongó, Santa Cruz, Dinâmica, Catalé, Centeirão, Cruzeiro, Jardim Tavares, Jeremias, José Figueiro, Mirante, Novo Bodocongó, Santo Antônio, São José, Serrotoão, Malvinas, Monte Santo e Universitário, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba		Fonte de Recursos: outra (descrever)			
CTEI - Valor atual (R\$): 18.225.646,43		CTEI - Descrição da Obra: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO							

ITEM	DESCR. SERVIÇOS E/OU MATERIAIS	PREÇO UNIT. DE OBRAMENTO				PREÇO TOTAL	EVOLUÇÃO PRECISO QUANTITATIVO				EVOLUÇÃO PRECISO PIS					
		UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL		ADQUIRIDO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	PRECISO PERÍODO ANTERIOR	ADQUIRIDO INCLUSIVE O PERÍODO	PRECISO PERÍODO	ADQUIRIDO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEIO DO PERÍODO	ADQUIRIDO INCLUSIVE O PERÍODO	PRECISO (N)		
54.0	RUA FRANCISCO ERNESTO DO RÊGO				159.547,62					71.327,69				71.327,69		
54.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				764,28					717,41				717,41		
54.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e gride	m²		0,33	764,28				2.173,97					717,41		6,13
54.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				158.207,19				10.057,00					70.610,28		
54.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C. Inclusive aquisição e transporte	m²		2,36	4.261,44				1.993,34					4.704,28		53,22
54.2.2	CBUQ															
54.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³		63,92	77.155,55											100,00
54.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperifamento	m³		63,92	69.899,72				59,80					65.394,29		6,45
54.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³		127,84	494,74				59,80					231,43		53,22
54.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km		549,71	599,18				257,14					280,28		53,22
54.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				576,15											
54.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade		5,00	576,15											100,00
55.0	RUA MARIA VIEIRA CÉSAR				373.042,21											
55.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.539,95									308.633,38		
55.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e gride	m²		4.665,50	1.539,95				4.110,56					1.356,48		
55.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				310.810,89									307.161,67		
55.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C. Inclusive aquisição e transporte	m²		8.586,35	20.263,81				8.221,12					19.401,84		4,25
55.2.2	CBUQ															
55.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³		128,80	155.471,50				123,32					148.857,11		4,25
55.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperifamento	m³		128,80	140.849,24				123,32					134.858,59		4,25
55.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³		257,60	998,91				246,64					954,50		4,25
55.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km		2.592,40	3.219,02				2.836,36					3.091,63		4,25
55.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				691,38									115,23		
55.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade		6,00	691,38				1,00					115,23		83,33
56.0	RUA SÃO LUCAS				447.409,26									211.577,29		
56.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.148,59									2.148,53		
56.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e gride	m²		6.510,70	2.148,53				6.510,70					2.148,53		

Adriano Gomes do Nascimento
 PMCG/SECOB - Coordenador
 de Planejamento de Obras

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
 Prefeitura de Jeremias Xavier
 CPM - 2020 - 100.2022.240

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
 Eng. João Neto de Oliveira
 CREA 160955208-DPE

		Grau de Sigilo Grau de CT	
Nº do CHH (Número de processo licitatório) 2.08.022/2020	Nº do CT 1.055.600-37	Data do CT 01/07/20	Data do CT 01/07/20
Início de obra - data 29/06/2020	Nº do CT 1.055.600-37	Data do CT 01/07/20	Data do CT 01/07/20
CTEF - Valor total (R\$) 18.225.646,43	Tipo de obra Construção de infraestrutura	Nome do contratante Prefeitura Municipal de Campina Grande	Nome do contratado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CTEF - Valor atual (R\$) 18.225.646,43	CTEF - de anterior CTEF - de último AdA.	Endereço Rua J. N. de Albuquerque, 100 - Centro - Campina Grande - PB	Fonte de Recursos caixa (descontar)

ITEM	DESCR. MANEJO DOS SERVIÇOS DO EMPANHO	PERÍODO DE QUANTIDADE			PERÍODO DE PREÇO (R\$) UNITÁRIO			PERÍODO DE PREÇO (R\$) TOTAL			PERÍODO DE PREÇO (R\$) ACUMULADO			ADICIONAL INFLUÊNCIA DO PERÍODO	CUSTO (R\$)
		UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ADICIONAL DE PERÍODO	PREÇO NO PERÍODO	ADICIONAL DE PERÍODO ANTERIOR	ADICULADO INFLUÊNCIA DO PERÍODO	ADICULADO INFLUÊNCIA DO PERÍODO	ADICULADO INFLUÊNCIA DO PERÍODO	ADICULADO INFLUÊNCIA DO PERÍODO	ADICULADO INFLUÊNCIA DO PERÍODO		
56.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				443.762,74			443.762,74			209.438,76		209.438,76		50,56
56.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	11.854,84	2,36	27.977,42	5,661,28		27.977,42	5,661,28		13.832,62		13.832,62		50,56
56.2.2	CBUQ														
56.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m³	177,82	1.207,08	214.642,97			214.642,97							100,00
56.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Reperflamento	m³	377,82	1.093,55	194.455,06	175,84		194.455,06	175,84		192.269,83		192.269,83		1,11
56.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	355,65	3,87	1.376,37	175,84		1.376,37	175,84		660,50		660,50		50,56
56.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	4.872,40	1,09	5.310,92	2.409,00		5.310,92	2.409,00		2.625,81		2.625,81		50,56
56.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				1.497,99			1.497,99							100,00
56.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita	unidade	13,00	115,23	1.497,99			1.497,99							100,00
57.0	RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ				266.855,16			266.855,16			266.853,30		266.853,30		
57.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.270,17			1.270,17			1.238,31		1.238,31		
57.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	3.849,00	0,33	1.270,17	3.752,45		1.270,17	3.752,45		1.238,31		1.238,31		2,51
57.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				264.778,38			264.778,38			264.778,38		264.778,38		
57.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	7.119,00	2,36	16.800,84	7.119,00		16.800,84	7.119,00		16.800,84		16.800,84		
57.2.2	CBUQ														
57.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m³	106,78	1.207,08	128.892,00	106,78		128.892,00	106,78		128.892,00		128.892,00		
57.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Reperflamento	m³	106,78	1.093,55	116.769,27	106,78		116.769,27	106,78		116.769,27		116.769,27		
57.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	213,55	3,87	826,48	213,55		826,48	213,55		826,48		826,48		
57.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.365,78	1,09	1.483,79	1.365,78		1.483,79	1.365,78		1.483,79		1.483,79		
57.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				805,61			805,61			805,61		805,61		
57.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita	unidade	7,00	115,23	805,61	7,00		805,61	7,00		805,61		805,61		
58.0	RUA JOANA D'ARC DE ARRUDA - TRECHO 01				314.117,23			314.117,23							
59.0	RUA JOANA D'ARC DE ARRUDA - TRECHO 02				199.773,34			199.773,34			197.694,85		197.694,85		
59.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				953,54			953,54			833,38		833,38		
59.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	2.849,50	0,33	953,54	2.676,90		953,54	2.676,90		833,38		833,38		7,36
59.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				198.308,89			198.308,89			196.350,56		196.350,56		
59.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	5.316,68	2,36	12.547,36	4.465,88		12.547,36	4.465,88		10.559,04		10.559,04		15,61
59.2.2	CBUQ														

Adriano Gomes do Nascimento
 PMCG/SECOB - Coordenador
 de Planejamento de Obras

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
 Eng. Jairo Neto de Oliveira
 CREA 160655/208 D/PR

Consulora Trocha Cavalcante Ltda.
 Eng. Jairo Neto de Oliveira
 CREA 160655/208 D/PR

CAIXA Nº do CTEF (contrato de prestação de serviços) 2.08.02/2020 Início da obra - data 29/06/2020 Fim da obra - data 26/07/2021 Valor total (R\$) 18.225.646,43 CTEF - de assinatura		EM - número 7 Empresa Contratada CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA (Órgão do CTEF responsável)		EM - Período de referência da medição de 19/12/2020 a 29/01/2021 CUIJ 09.323.098/0001-92		Nº do CT 1.065.660-37 Tomador/Ag. Promotor ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Agente Fiscalizador ou Ag. Operador Payara		Grau de Siglo Data do CT 01/07/20	
RECAPAMENTO ASFÁLTICO NOS BARRIOS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTACÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCONGÓ, SANTA CRUZ, DINAMÉRICA, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ FINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCONGÓ, SANTO ANTONIO, SÃO JOSÉ, SERROTIÃO, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA		Local da obra (bairro/Município/UF)		Fonte de Recursos		caixa econômica federal		obra (fornecim)	
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO		CTEF - de término da obra		CTEF - de término da obra		CTEF - de término da obra		CTEF - de término da obra	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU EQUIPAMENTO	PREÇO UNIT. DO EQUIPAMENTO				PREÇO TOTAL	DESEMPENHO FÍSICO (QUANTITATIVO)				DESEMPENHO FINANCEIRO (R\$)		DESCRIÇÃO
		UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL		ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	DESCRIÇÃO	
59.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	79,75	1.207,08	98.264,63	79,75	79,75	98.264,63	98.264,63	98.264,63	98.264,63	98.264,63	
59.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017. - Repetimento	m³	79,75	1.093,55	87.210,61	79,75	79,75	87.210,61	87.210,61	87.210,61	87.210,61	87.210,61	
59.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	159,50	3,87	617,27	159,50	159,50	617,27	617,27	617,27	617,27	617,27	
59.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.531,20	1,09	1.669,01	1.531,20	1.531,20	1.669,01	1.669,01	1.669,01	1.669,01	1.669,01	
59.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	4,00	115,23	460,92	460,92	460,92	460,92	460,92	460,92	460,92	460,92	
59.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	4,00	115,23	460,92	460,92	460,92	460,92	460,92	460,92	460,92	460,92	
60.0	RUA FERNANDES VIEIRA				218.658,73			218.658,73	218.658,73	218.658,73	218.658,73	218.658,73	
60.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.002,54			1.002,54	1.002,54	1.002,54	1.002,54	1.002,54	
60.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e gride	m²	3.038,00	0,33	1.002,54	1.002,54	1.002,54	1.002,54	1.002,54	1.002,54	1.002,54	1.002,54	
60.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				216.964,81			216.964,81	216.964,81	216.964,81	216.964,81	216.964,81	
60.2.1	Pinura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	5.832,56	2,36	13.765,73	2.643,89	2.643,89	16.409,62	16.409,62	16.409,62	16.409,62	16.409,62	
60.2.2	CBUQ												
60.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	87,49	1.207,08	105.607,43	87,49	87,49	105.607,43	105.607,43	105.607,43	105.607,43	105.607,43	
60.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017. - Repetimento	m³	87,49	1.093,55	95.674,69	87,49	87,49	95.674,69	95.674,69	95.674,69	95.674,69	95.674,69	
60.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	174,98	3,87	677,17	174,98	174,98	677,17	677,17	677,17	677,17	677,17	
60.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.137,37	1,09	1.239,73	1.137,37	1.137,37	1.239,73	1.239,73	1.239,73	1.239,73	1.239,73	
60.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	6,00	115,23	691,38	691,38	691,38	691,38	691,38	691,38	691,38	691,38	
60.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	6,00	115,23	691,38	691,38	691,38	691,38	691,38	691,38	691,38	691,38	
61.0	RUA ALFREDO GODOFREDO DE SANTANA				64.587,68			64.587,68	64.587,68	64.587,68	64.587,68	64.587,68	
61.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				3.092,21			3.092,21	3.092,21	3.092,21	3.092,21	3.092,21	
61.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e gride	m²	937,00	0,33	3.092,21	3.092,21	3.092,21	3.092,21	3.092,21	3.092,21	3.092,21	3.092,21	
61.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				64.163,54			64.163,54	64.163,54	64.163,54	64.163,54	64.163,54	
61.2.1	Pinura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	1.724,03	2,36	4.068,83	1.590,19	1.590,19	5.659,02	5.659,02	5.659,02	5.659,02	5.659,02	
61.2.2	CBUQ												
61.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	25,66	1.207,08	31.215,09	25,66	25,66	31.215,09	31.215,09	31.215,09	31.215,09	31.215,09	
61.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017. - Repetimento	m³	25,66	1.093,55	28.279,20	25,66	25,66	28.279,20	28.279,20	28.279,20	28.279,20	28.279,20	

Adriano Gomes do Nascimento
 PMCG/SECOB - Coordenador
 Planejamento de Obras

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
 FRANCISCO DE ASSIS C. Xavier
 Diretor Geral de Obras - 150264642

Construtora Rocha Cavalcante Ltda
 Eng. João Neto de Oliveira
 CREA 1606055208 DPE

CAIXA		Nº do CTR (contra-rendimento)		Nº do CTR		Grau de Selo	
2.08.02/2020		29/06/2020		1.065.660.37		01/07/20	
licença de obra - obra		Prestação de serviços de obra		Tomador da Prestação de Trabalho		Data do CT	
Vigência: 18.225.6464.3		CTF - de estrutura		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE			
				Agência Financiadora: F. G. Operadora Financeira			
				CAUSA ECONÔMICA FEDERAL			
				Fonte de Recursos		outra (descrever)	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS	PREÇO DO ORÇAMENTO			ORÇAMENTO FÍSICO (PARÂMETROS)			ORÇAMENTO FINANCEIRO (R\$)			CUBO (M³)
		UNID.	QTD.	PREÇO UNT.	ACABAMENTO DE PAVIMENTO	MÉDIO DO PAVIMENTO	ACABAMENTO DE PAVIMENTO ANTERIOR	ACABAMENTO DE PAVIMENTO ANTERIOR	ACABAMENTO DE PAVIMENTO ANTERIOR	ACABAMENTO DE PAVIMENTO ANTERIOR	
61.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	51,72	3,87	200,16	47,40	183,44	183,44	183,44	8,35	
61.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	367,21	1,09	400,26	322,32	351,33	351,33	351,33	12,22	
61.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	1,00	115,23	115,23	1,00	115,23	115,23	115,23		
61.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita	unidade	1,00	115,23	115,23	1,00	115,23	115,23	115,23		
62.0	TRAVESSA JOÃO FLORENTINO DE CARVALHO				79.643,92		75.195,72	75.195,72	75.195,72		
62.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				380,82		331,87	331,87	331,87		
62.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e gride	m²	1.154,00	0,33	380,82	1.005,67	331,87	331,87	331,87	12,85	
62.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				79.032,64		74.863,85	74.863,85	74.863,85		
62.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	2.123,26	2,26	5.011,13	2.011,35	4.746,79	4.746,79	4.746,79	5,28	
62.2.2	CBUQ										
62.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Cspa	m³	31,85	1.207,08	38.445,50	30,17	36.417,60	36.417,60	36.417,60	5,27	
62.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Repesfamento	m³	31,85	1.093,55	34.829,57	30,17	32.692,40	32.692,40	32.692,40	5,27	
62.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	63,70	3,87	245,52	60,34	233,52	233,52	233,52	5,27	
62.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	458,64	1,09	499,92	434,44	473,54	473,54	473,54	5,28	
62.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				230,46						
62.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita	unidade	2,00	115,23	230,46					100,00	
63.0	RUA DUALMA MIGUEL DE MORAIS				193.918,95		187.775,50	187.775,50	187.775,50		
63.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				947,50		825,99	825,99	825,99		
63.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e gride	m²	2.871,20	0,33	947,50	2.503,01	825,99	825,99	825,99	12,82	
63.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				192.510,54		186.489,59	186.489,59	186.489,59		
63.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	5.168,16	2,26	12.195,65	5.006,33	11.814,94	11.814,94	11.814,94	3,13	
63.2.2	CBUQ										
63.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Cspa	m³	77,52	1.207,08	93.572,84	75,10	90.651,71	90.651,71	90.651,71	3,12	
63.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Repesfamento	m³	77,52	1.093,55	84.772,00	75,09	82.114,67	82.114,67	82.114,67	3,13	
63.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	155,04	3,87	600,00	150,19	581,24	581,24	581,24	3,13	
63.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.258,82	1,09	1.368,84	1.216,54	1.316,03	1.316,03	1.316,03	3,13	
63.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				460,92		460,92	460,92	460,92		
63.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita	unidade	4,00	115,23	460,92	4,00	460,92	460,92	460,92		

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
 Avenida João Neto de Oliveira
 CEP: 57.120-000 - Campina Grande - PB

Adriano Gomes do Nascimento
 PMCG/SECOB - Coordenador
 de Planejamento de Obras

Consórcio Rocha Cavalcante Ltda.
 Eng. João Neto de Oliveira
 CREA: 150605208-D/PB

CAIXA	Empresário	07	05/07/2021	01/07/20	Grav de Sglo
Nº da CTEF (Contrato de Prestação de Serviços)	Empresa Contratada	7	05/07/2021	Nº da CT	Data da CT
2.08.02/2020	CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA	7	05/07/2021	1.065.660-37	01/07/20
Idade da obra - dia	Objeto do CTEF (resumido)	7	05/07/2021	Tomador/Prestador ou Tomador	
29/06/2020	RECAPAMENTO ASFÁLTICO NOS BARRIOS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTACÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCONGO, SANTA CRUZ, DINAMIRICA, CATOLÉ, CENTEÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCONGO, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERRODÃO, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA	7	05/07/2021	Agente Ilustrado ou Ag. Operador Papéis	
Valor total líquido (R\$)	Local de obra (município/estado)	7	05/07/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
18.225.666,43	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO	7	05/07/2021	Fonte de Recursos	outra (descrever)
Valor atual (R\$)		7	05/07/2021		
18.225.666,43		7	05/07/2021		

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO EMPENHO	PERÍODO DE EMPENHO				RESP. UNT.	RESP. TOTAL	PERÍODO FECHO (PARCIALIZADO)			PERÍODO FINANCEIADO (R\$)			SERVIDO	
		UNID.	QTD.	RESP. UNT.	RESP. TOTAL			ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO ANTERIOR	MEDIO PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	MEDIO PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO		SERVIDO
64.0	RUAS DAS BARROUNHAS				239.422,91		99.538,79								
64.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.134,67		997,09								
64.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	3.438,40	0,33	1.134,67	3.021,49	997,09	3.021,49	997,09	997,09	997,09	997,09	997,09	12,13	
64.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				238.172,41		98.541,70								
64.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C. Inclusive aquisição e transporte	m²	6.348,72	2,36	14.982,98	2.765,03	6.525,47	2.765,03	6.525,47	6.525,47	6.525,47	6.525,47	6.525,47	56,45	
64.2.1.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	95,23	1,207,68	114.950,23									100,00	
64.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperfilamento	m³	95,23	1,093,55	104.138,77									13,35	
64.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em viro-acabadora	m³	190,47	3,87	737,12									56,68	
64.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	3.085,61	1,69	3.363,31									56,68	
64.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				115,23										
64.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	1,00	115,23	115,23									100,00	
65.0	RUAS ALICE GAUDÊNCIO				302.279,44		302.134,55								
65.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.400,07		1.370,41								
65.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	4.242,65	0,33	1.400,07	4.152,77	1.370,41	4.152,77	1.370,41	1.370,41	1.370,41	1.370,41	1.370,41	2,12	
65.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				300.764,14		300.764,14								
65.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C. Inclusive aquisição e transporte	m²	8.073,14	2,36	19.052,61	8.073,14	19.052,61	8.073,14	19.052,61	19.052,61	19.052,61	19.052,61	19.052,61		
65.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	121,09	1,207,68	146.165,32									146,165,32	
65.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperfilamento	m³	121,09	1,093,55	132.417,97									132,417,97	
65.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em viro-acabadora	m³	242,18	3,87	937,24									937,24	
65.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	2.010,69	1,69	2.191,00									2.191,00	
65.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				115,23										
65.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	1,00	115,23	115,23									100,00	
66.0	RUAS PINO COLAÇO				54.413,01		25.277,73								
66.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				259,38		232,74								
66.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	766,00	0,33	259,38	705,27	232,74	705,27	232,74	232,74	232,74	232,74	232,74	10,27	

Adriano Gomes do Nascimento
PMCG/SECOB - Coordenador
de Planejamento de Obras

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE
RUA JOSÉ PINHEIRO, 111 - JARDIM TAVARES
CAMPINA GRANDE - PB

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
Eng. João Neto de Oliveira
CREA 466065208 DPEB

CAIXA		Módulo CTEF (Contrato Execução/Financiamento)		EM - Número		EM - Período de referência da medição		Grav de Selo	
2.08.02/2020		29/06/2020		7		de 18/12/2020 a 29/01/2021		Data do CT	
Início da obra - data		Fev/2020		Empresa Contratada		05/09/2021		1.065.660-37	
CTEF - Valor total líquido (R\$)		CTEF - de assinatura		CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA		09.323.098/0001-92		01/07/20	
18.225.646,43		CTEF - De último adit.		Objeto do CTEF (resumido)		RECAPAMENTO ASFÁLTICO NOS BARRIOS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, COQUEÇÃO, ESTACÇÃO VELHA, PALMEIRA, FRATA, BODOCONGÓ, SANTA CRUZ, DINHÁMÉRICA, CATOLÉ, CENTEÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ FINHEIRO, MIRAPANTE, NOVO BODOCONGÓ, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTIÃO, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA		Tomador/Pag Promotor ou Tomador	
18.225.646,43		CTEF - De último adit.		Local da obra (Estado/Município/UF)		PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO		Agência Financiadora ou Ag. Operadora Pagante	
18.225.646,43		CTEF - De último adit.		Fonte de Recursos		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Prestador de Serviços	
18.225.646,43		CTEF - De último adit.		Fonte de Recursos		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Outra (descrever)	

ITEM	MUN	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E O EQUIPAMENTO	PREÇO UNITÁRIO				ESTIMATIVA DE VALORES				ESTIMATIVA DE VALORES		ESTIMATIVA DE VALORES		
			UNID	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	ACUMULADO INCLUSIVE PERÍODO	MÉDIO DO PERÍODO	ACUMULADO INCLUSIVE O PERÍODO	ESTIM. IN				
66.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				53.807,94				25.044,99			25.044,99		
66.2.1		Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aplicação e transporte	m²	1.445,24	2,36	3.413,13				1.654,44			1.654,44		51,23
66.2.2		CBUQ													
66.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	21,69	1.207,08	26.181,57									100,00
66.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017. - Reperifamento	m³	21,69	1.093,55	23.719,10									2,44
66.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibrador-acabadora	m³	43,38	3,87	167,88									51,22
66.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	299,32	1,09	326,26									51,22
66.3		NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				345,69									100,00
66.3.1		Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	3,00	115,23	345,69									
67.0		RUA PROFESSOR CAPIBA				119.521,65									
67.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				618,42									
67.1.1		Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	1.874,00	0,33	618,42									
67.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				128.327,08									
67.2.1		Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aplicação e transporte	m²	3.448,16	2,36	8.137,65									
67.2.2		CBUQ													
67.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	51,72	1.207,08	62.430,18									100,00
67.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017. - Reperifamento	m³	51,72	1.093,55	56.558,41									11,33
67.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibrador-acabadora	m³	103,44	3,87	400,31									55,66
67.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	734,42	1,09	800,52									55,67
67.3		NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				576,15									100,00
67.3.1		Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	5,00	115,23	576,15									
68.0		RUA RAFAELA DE SOUZA E SILVA				797.192,55									
68.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				3.846,99									
68.1.1		Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	11.657,55	0,33	3.846,99									
68.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				791.982,80									
68.2.1		Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aplicação e transporte	m²	21.204,62	2,36	50.047,50									
68.2.2		CBUQ													
68.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	318,07	1.207,08	383.935,94									4,69

Adriano Gomes do Nascimento
 PMCG/SECOB - Coordenador
 Planejamento de Obras

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
 RUA JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA, 100 - CENTRO
 CEP: 53.010-000 - CAMPINA GRANDE - PB

Constutora Rocha Cavalcante Ltda.
 Rua João Neto de Oliveira
 CEP: 160605208 DIBP

		Grav de Selo Nº do CT: 1.055.660-37 Data do CT: 01/07/20	
Nº do CTE (Contrato de Execução de Obras): 2.08.022/2020 Data de emissão: 29/06/2020 Prazo de validade: 26/07/2021		Nº do CTE: 09/02/2021 Data de emissão: 18/12/2020 a 29/01/2021	
CTEF: Valor total (R\$): 18.225.646,43 Valor atual (R\$): 18.225.646,43		Nome do Contratado: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA CNPJ: 09.323.095/0001-92 Endereço: Rua de Selo, 7 - Vila Brasilândia - São Paulo/SP	
Objeto do CTE (resumo): RECAPAMENTO ASFÁLTICO NOS BARRIOS CENTRO, BEA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTACÃO VELHA, PALMEIRA, FRATA, BODOCONGÓ, SANTA CRUZ, DINAMÉRICA, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JERÔNIMAS, JOSÉ FINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCONGÓ, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTIÃO, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA		Nome do Contratante: CAMA ECONÔMICA FEDERAL Endereço: Rua de Selo, 7 - Vila Brasilândia - São Paulo/SP	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO EMPÍREO	PREÇO UNIT. DO EMPÍREO			PREÇO TOTAL DO EMPÍREO			PREÇO UNIT. DO EMPÍREO			PREÇO TOTAL DO EMPÍREO			
		UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ADQUIRIÇÃO ANTERIOR	INDICADOR DO PERÍODO	ADQUIRIÇÃO DO PERÍODO	ADQUIRIÇÃO ANTERIOR	MÉDIA DO PERÍODO	ADQUIRIÇÃO DO PERÍODO	ADQUIRIÇÃO ANTERIOR	MÉDIA DO PERÍODO	ADQUIRIÇÃO DO PERÍODO
68.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperfilamento	m²	318,07	1.093,55	347.825,45	303,57	303,57	331.968,97	303,57	303,57	331.968,97	303,57	303,57	331.968,97
68.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	636,14	3,87	2.461,85	303,16	303,16	1.174,82	303,16	303,16	1.174,82	303,16	303,16	1.174,82
68.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	7.061,15	1,09	7.695,65	3.369,62	3.369,62	3.672,69	3.369,62	3.369,62	3.672,69	3.369,62	3.369,62	3.672,69
68.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	12,00	115,23	1.382,76									
69.0	RUA JOSÉ DA GUIA FERREIRA				182.232,35			87.126,41			87.126,41			176.562,29
69.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				896,64			896,64			896,64			896,64
69.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	2.686,60	0,33	886,64	2.686,60	2.686,60	886,64	2.686,60	2.686,60	886,64	2.686,60	2.686,60	886,64
69.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				180.539,10			86.239,77			86.239,77			175.675,65
69.2.1	Pinura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	4.836,24	2,36	11.413,53	2.449,28	2.449,28	5.720,30	2.449,28	2.449,28	5.720,30	2.449,28	2.449,28	5.720,30
69.2.2	CBUQ													
69.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	72,54	1.207,08	87.561,58	68,55	68,55	82.745,33	68,55	68,55	82.745,33	68,55	68,55	82.745,33
69.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperfilamento	m²	72,54	1.093,55	79.326,12	72,54	72,54	79.326,12	72,54	72,54	79.326,12	72,54	72,54	79.326,12
69.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	145,09	3,87	561,50	73,48	73,48	284,37	73,48	73,48	284,37	73,48	73,48	284,37
69.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.537,95	1,09	1.676,37	726,63	726,63	848,98	726,63	726,63	848,98	726,63	726,63	848,98
69.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				806,61			806,61			806,61			806,61
69.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	7,00	115,23	806,61									
70.0	RUA DR. JOSÉ MOISÉS DE MEDEIROS NETO				160.975,26			69.561,89			69.561,89			142.632,59
70.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				784,08			716,87			716,87			716,87
70.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	2.376,00	0,33	784,08	2.172,34	2.172,34	716,87	2.172,34	2.172,34	716,87	2.172,34	2.172,34	716,87
70.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				159.150,11			68.845,02			68.845,02			141.915,72
70.2.1	Pinura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	4.276,60	2,36	10.093,25	1.938,69	1.938,69	4.575,31	1.938,69	1.938,69	4.575,31	1.938,69	1.938,69	4.575,31
70.2.2	CBUQ													
70.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	64,15	1.207,08	77.431,18	56,21	56,21	67.849,97	56,21	56,21	67.849,97	56,21	56,21	67.849,97
70.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperfilamento	m²	64,15	1.093,55	70.151,23	58,16	58,16	63.600,87	58,16	58,16	63.600,87	58,16	58,16	63.600,87
70.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	128,30	3,87	496,52	58,16	58,16	225,03	58,16	58,16	225,03	58,16	58,16	225,03

Adriano Gomes do Nascimento
 F/MCG/SECOB - Coordenador
 de Planejamento de Obras

Eng. Luiz Vitor de Oliveira
 CREA - 1606055/08 D1PB
 Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

CAIXA		Grão de Sigo	
Nº do CTE (Contrato Executivo/Execução) 2.08.022/2020 Início da obra - dia 29/06/2020 Vistor total final (SI) 18.225.646/43	Nº do CTE 7 Empresa Contratada CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA Endereço do CTE (município) Grão de Sigo	Nº do CT 1.053.660-37 Tomador do Promotor ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Agente Passivo ou Ag. Operador Regime CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Data de referência da medição de 18/12/2020 a 29/01/2021 Data do CTE 01/07/20
Recuperação Asfáltico nos Bairros Centro, Bela Vista, Alto Branco, Conceição, Estação Velha, Palmeira, Prata, Bodocongó, Santa Cruz, Dinâmica, Catoilé, Centenário, Cruzeiro, Jardim Tavares, Jeremias, José Pinheiro, Mirante, Novo Bodocongó, Santo Antônio, São José, Serrotaó, Malvinas, Monte Santo e Universitário, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba	Recuperação Asfáltico nos Bairros Centro, Bela Vista, Alto Branco, Conceição, Estação Velha, Palmeira, Prata, Bodocongó, Santa Cruz, Dinâmica, Catoilé, Centenário, Cruzeiro, Jardim Tavares, Jeremias, José Pinheiro, Mirante, Novo Bodocongó, Santo Antônio, São José, Serrotaó, Malvinas, Monte Santo e Universitário, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba	Recuperação Asfáltico nos Bairros Centro, Bela Vista, Alto Branco, Conceição, Estação Velha, Palmeira, Prata, Bodocongó, Santa Cruz, Dinâmica, Catoilé, Centenário, Cruzeiro, Jardim Tavares, Jeremias, José Pinheiro, Mirante, Novo Bodocongó, Santo Antônio, São José, Serrotaó, Malvinas, Monte Santo e Universitário, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba	Recuperação Asfáltico nos Bairros Centro, Bela Vista, Alto Branco, Conceição, Estação Velha, Palmeira, Prata, Bodocongó, Santa Cruz, Dinâmica, Catoilé, Centenário, Cruzeiro, Jardim Tavares, Jeremias, José Pinheiro, Mirante, Novo Bodocongó, Santo Antônio, São José, Serrotaó, Malvinas, Monte Santo e Universitário, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba
Vistor total (R\$) 18.225.646/43	CTE - R\$ (valor total) 18.225.646/43	CTE - R\$ (valor total) 18.225.646/43	CTE - R\$ (valor total) 18.225.646/43

ITEM	RELEVANTE NO ORÇAMENTO	EMPENHO FÍSICO QUANTITATIVO				EMPENHO FÍSICO FINANCEIRO				CENSO Nº	
		UNID.	QTD'S	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUSIVE O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO		ACUMULADO INCLUSIVE O PERÍODO
702.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	898,10	1,09	978,93	407,12	393,47	443,76	428,83	872,64	10,66
703	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	9,00	115,23	1.037,07						100,00
703.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	9,00	115,23	1.037,07						100,00
71.0	RUA FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA				2.270.847,37			1.780.845,02		1.780.845,02	
71.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				12.859,83			11.294,10		11.294,10	
71.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e frete	m²	38.939,49	0,33	12.859,83	34.224,56		11.294,10		11.294,10	12,24
71.1.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				2.258.987,54			1.751.647,29		1.751.647,29	
71.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	40.324,17	2,36	95.165,04	37.448,60		76.578,70		76.578,70	19,53
71.2.2	CBUQ				1.856.270,10	1.193,59		1.376.601,50		1.376.601,50	25,84
71.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	119,59	1.207,08	144.354,70	119,47		144.209,85		144.209,85	0,10
71.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017. - Reparelamento	m²	119,59	1.093,55	130.777,64	119,59		130.777,64		130.777,64	
71.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-escaladora	m³	1.858,76	3,87	7.185,65	1.440,82		5.575,97		5.575,97	22,40
71.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	21.167,06	1,09	23.022,10	16.425,35		17.503,63		17.503,63	22,40
71.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	10,00	115,23	1.152,30						100,00
71.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	10,00	115,23	1.152,30						100,00
72.0	RUA OLINDINA P. DOS SANTOS				253.968,79			100.696,91		100.696,91	
72.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.223,03			1.041,54		1.041,54	
72.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e frete	m²	3.706,15	0,33	1.223,03	3.156,19		1.041,54		1.041,54	14,84
72.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				252.650,53			99.655,37		99.655,37	
72.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	6.781,18	2,36	16.003,58	2.802,74		6.614,47		6.614,47	58,67
72.2.2	CBUQ				122.772,11						100,00
72.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	101,71	1.207,08	122.772,11	84,03		91.945,68		91.945,68	17,33
72.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017. - Reparelamento	m²	101,71	1.093,55	111.224,97	84,03		325,39		325,39	58,67
72.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-escaladora	m³	203,43	3,87	787,27	84,03		769,83		769,83	58,67
72.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.703,8	1,09	1.862,60	706,27		769,83		769,83	58,67
72.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				115,23						

Eng. João Nilton de Oliveira
 CREA - 666053208 DPB

Adriano Gomes do Nascimento
 PMCG/SECOB - Coordenador
 de Planejamento de Obras


PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
 SECRETARIA DE OBRAS, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
 Eng. CIVIL - CREA/PB Nº 130.2010-20-2

CAIXA		Grau de Sigilo	
NR do CITEI (Contrato Executivo/Forçatombamento)	2.08.022/2020	EM - Data emissão	05/02/2021
Início	29/06/2020	EM - Período de referência da medição de 18/12/2020 a 29/01/2021	01/07/20
CITEI - Valor total (R\$)	18.225.646,43	EM - Número	7
		Empresa Contratada	CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA
		Objeto do CITEI (resumido)	RECAPAMENTO ASFÁLTICO NOS BARRIOS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTACÇÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCOINGÓ, SANTA CRUZ, DINAMÉRICA, CATOLÉ, CENTEINÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCOINGÓ, SANTO ANTONIO, SÃO JOSÉ, SERROFRÃO, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA
		Local da obra (Bairro/Município/UF)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
		CITEI - Início e Término	05/02/2021 a 29/01/2021
		Fonte de Recursos	outros (descrever)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO DOCUMENTO	REQUERIDO NO DOCUMENTO			EXECUÇÃO FEITA QUANTITATIVAMENTE			EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$)		
		UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.	ADQUIRIDAS ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEASURAS FEITAS PERÍODO	ADQUIRIDAS ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEASURAS NO PERÍODO	ADQUIRIDAS INCLUINDO O PERÍODO	DEVIDO N°
72.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	1,00	115,23						100,00
73.0	RUA ANTONIETA CAVALCANTE				245.714,58		238.200,45		238.200,45	
73.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.151,70		1.047,32		1.047,32	
73.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e gride	m²	3.490,00	0,33	1.151,70	3.173,70	1.047,32	3.173,70	1.047,32	9,06
73.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				243.871,50		236.461,75		236.461,75	
73.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	6.421,60	2,36	15.154,93	6.347,40	14.979,85	6.347,40	14.979,85	1,16
73.2.2	CBUQ									
73.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	98,32	1.207,08	118.680,11	95,21	114.926,09	95,21	114.926,09	3,16
73.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperflamento	m³	98,32	1.093,55	107.517,84	95,21	104.116,50	95,21	104.116,50	3,16
73.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vitro-acabadora	m³	196,64	3,87	761,00	190,42	736,93	190,42	736,93	3,16
73.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.612,45	1,09	1.757,57	1.561,44	1.701,97	1.561,44	1.701,97	3,16
73.3	NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA				691,38		691,38		691,38	
73.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	6,00	115,23	691,38	6,00	691,38	6,00	691,38	
74.0	RUA JOÃO JUIÃO MARTINS				259.834,30		124.310,93		124.310,93	
74.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.269,03		1.269,03		1.269,03	
74.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e gride	m²	3.845,55	0,33	1.269,03	3.845,55	1.269,03	3.845,55	1.269,03	
74.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				257.873,89		123.041,90		123.041,90	
74.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	6.923,10	2,36	16.338,52	3.461,55	8.169,26	3.461,55	8.169,26	50,00
74.2.2	CBUQ									
74.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	103,85	1.207,08	125.355,26					100,00
74.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperflamento	m³	103,85	1.093,55	113.585,17	103,85	113.585,17	103,85	113.585,17	
74.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vitro-acabadora	m³	207,70	3,87	803,80	103,85	401,90	103,85	401,90	50,00
74.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.651,60	1,09	1.811,14	830,80	905,57	830,80	905,57	50,00
74.3	NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA				691,38					
74.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	6,00	115,23	691,38					100,00
75.0	RUA JOSÉ GONÇALVES DE MELO				149.467,13		70.542,59		70.542,59	
75.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				711,69		68.949,44		68.949,44	
							692,76		692,76	

Adriano Gomes do Nascimento
PMCG/SECOB - Coordenador
de Planejamento de Obras

Constâncio Rocha Cavalcante Ltda.
Eng. João Neto de Oliveira
CREA - 180058708-DPB

		Grav de Selo Data de CT: 01/07/20	
W do CTE (Contorno Escudo/for escudo) 2.08.02/2020		W de CT 1.065.660-37	
licença de obra - obra 29/06/2020		Remetente Promotor ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	
CTEF - Valor total licitação (R\$) 18.225.646,43		Agente Financeiro ou Ag. Operador Financeiro CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
CTEF - Valor atual (R\$) 18.225.646,43		Fonte de Recursos outra (Estrutura)	

ITEM	EXEMPLO DE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PREÇO DO ORÇAMENTO			DESEMPENHO FÍSICO REALIZADO			DESEMPENHO FINANCEIRO (R\$)		
		UNID.	QTDDE	PREÇO UNIT.	ACABADOS REALIZADOS ANTERIORE	MÉDIO DO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	ACABADOS REALIZADOS ANTERIORE	MÉDIO DO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
75.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	2.156,60	0,33	711,68	2.068,96	2.068,96	682,76	682,76	4,06
75.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				148.524,99		68.265,68		68.265,68	
75.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m³	3.920,08	2,36	9.416,59	1.908,92	4.505,05	4.505,05	4.505,05	57,16
75.2.2	CBUQ									
75.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017. - Cega	m³	59,85	1.207,08	72.243,74					100,00
75.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017. - Reperilamento	m³	59,85	1.093,55	65.448,97	57,27	57,27	62.627,61	62.627,61	4,31
75.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em viário-acabadora	m³	119,70	3,87	463,24	57,27	57,27	221,63	221,63	52,16
75.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	873,81	1,09	952,45	836,14	836,14	911,39	911,39	4,31
75.3	NIVELAMENTO DE TAMPAÇO DE POÇO DE VISITA				230,46					
75.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	2,00	115,23	230,46					100,00
76.0	FLACAS DE OBRAS (R2,0 m - 10 FLACAS)				37.667,20					
76.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				37.667,20					
76.1.1	Placa da Obra	m²	80,00	470,84	37.667,20	80,00	80,00	37.667,20	37.667,20	
77.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (12 MESES DE OBRA)				296.890,62					
77.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				296.890,62					
77.1.1	Administração Local da Obra (12 meses de obra)	unidade	1,00	296.890,62	296.890,62	0,4926	0,5511	146.243,39	20.336,32	166.579,71
78.0	LABORATÓRIO DE BETUME (BDI DE 26,85%)				50.466,24					
78.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				50.466,24					
78.1.1	Laboratório de Betume (BDI de 26,85%)	mês	12,00	4.205,52	50.466,24	0,4926	0,5511	24.708,27	3.456,94	28.165,21
TOTAL										
										18.225.646,43
										9.142.418,22
										1.272.711,70
										10.415.129,92
										42,85

Campina Grande, 05 de Fevereiro de 2021

LOCAL E DATA

Adriano Gomes do Nascimento
 PMCG/SECOB - Coordenador
 de Planejamento de Obras

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
 Eng. João Neto de Oliveira
 OMEIA-18886639/010

Assinatura do Agente Promotor/Monitório



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIROS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTAÇÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCONGÓ, SANTA CRUZ, DINAMÉRICA, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCONGÓ, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTÃO, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO
MEMÓRIA DE CÁLCULO



ITEM	SERVIÇOS	ESTACA				Área (AutoCAD)	Larg. (média)	Altura	Volume	N.V.	dm	QUANTIDADES		OBSERVAÇÃO
		Inicial	Final	Comp. (AutoCAD)	Total									
7.0	RUA MAIOR JOVINO DO Ó													
7.3	NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA													
7.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita								3,00			3,00	Trecho 01 unidade	
												Executado:	3,00	
16.0	RUA DEP. ÁLVARO GAUDÊNCIO													
16.3	NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA													
16.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita								5,00			5,00	Trecho 01 unidade	
												Executado:	5,00	
19.0	RUA ELIAS ASFORA													
19.3	NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA													
19.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita								4,00			4,00	Trecho 01 unidade	
												Executado:	4,00	
21.0	RUA JOSÉ BONIFÁCIO													
21.3	NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA													
21.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita								2,00			2,00	Trecho 01 unidade	
												Executado:	2,00	
22.0	RUA JOÃO TAVARES													
22.3	NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA													
22.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita								5,00			5,00	Trecho 01 unidade	
												Executado:	5,00	
25.0	RUA CAPITÃO JOÃO DE SÁ													
25.3	NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA													
25.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita								2,00			2,00	Trecho 01 unidade	
												Executado:	2,00	
27.0	RUA DR. CARLOS AGRA													
27.3	NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA													
27.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita								7,00			7,00	Trecho 01 unidade	
												Executado:	7,00	
29.0	RUA ULISSES GOMES													
29.3	NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA													
29.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita								2,00			2,00	Trecho 01 unidade	
												Executado:	2,00	
45.0	RUA DAS TRÊS IRMÃS													
45.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO													
45.2.1	Pintura de ligação com emissão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	0,00	+ 0,00	19,00	+ 6,85	356,85	8,26	3194,09		1,00		3194,09	Trecho 01 m²	
												Executado:	3194,09	
45.2.2	CRUQ													

Adriano Gomes do Nascimento
PMCG/SECOB - Coordenador
de Planejamento de Obras

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO
Eduardo de Jesus C. Xavier
19/05/2015 14:42:01:00

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
Eng. João Nivaldo Oliveira
CREA 1895655208 DPB

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO
MEMÓRIA DE CÁLCULO



ITEM	SERVIÇOS	ESTACA				QUANTIDADES				OBSERVAÇÃO		
		Inicial	Final	Comp. (AutoCAD)	Larg. (m-tds)	Área (AutoCAD)	Altura	Volume	N.V.		dmt	Parciais
45.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	0,00 + 0,00	19,00 + 6,85	356,85	8,26	3194,09	0,03	95,82	1,00		95,82	Trecho 01 95,82 m³
45.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora							95,82	1,00		95,82	[VIDE CBUQ, CAPA] 95,82 m³
45.2.4	Transporte local de material betuminoso						7,10	680,32			680,32	[VIDE CBUQ, CAPA] 680,32 m³ x km
46.0	RUA DR. JOÃO ARUNDO CORREIA											
46.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO											
46.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	0,00 + 0,00	6,00 + 14,64	134,64	12,36	1664,17		1664,17	1,00		1664,17	Trecho 01 1664,17 m³
46.2.2	CBUQ											
46.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	0,00 + 0,00	6,00 + 14,64	134,64	12,36	1664,17	0,03	49,93	1,00		49,93	Trecho 01 49,93 m³
46.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora							49,93	1,00		49,93	[VIDE CBUQ, CAPA] 49,93 m³
46.2.4	Transporte local de material betuminoso						10,30	514,28			514,28	[VIDE CBUQ, CAPA] 514,28 m³ x km
49.0	RUA LADISLAU RODRIGUES DE SOUZA											
49.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO											
49.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	0,00 + 0,00	8,00 + 17,77	177,77	9,19	1632,66		1632,66	1,00		1632,66	Trecho 01 1632,66 m³
49.2.2	CBUQ											
49.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	0,00 + 0,00	8,00 + 17,77	177,77	9,19	1632,66	0,029	47,35	1,00		47,35	Trecho 01 47,35 m³
49.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora							47,35	1,00		47,35	Trecho 01 47,35 m³

Eng. João Neto de Oliveira
CREA - 10605208 D/PB

Adriano Gomes do Nascimento
PMCG/SECOB - Coordenador
de Planejamento de Obras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO
MEMÓRIA DE CÁLCULO



ITEM	SERVIÇOS	ESTACA						QUANTIDADES			OBSERVAÇÃO		
		Inicial	Final	Comp. (AutoCAD)	Larg. (médias)	Área (AutoCAD)	Altura	Volume	N.V.	dm		Parcelas	Totais
49.2.4	Transporte local de material betuminoso									11,40	560,08	560,08	[VIDE CBUQ CAPA] m² x km
50.0	RUA FRANCISCO LOPES												
50.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO												
50.2.1	Pintura de ligação com emissão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	0,00 + 0,00	6,00 + 14,63	134,63	10,62	1430,35	0,03	42,91	1,00	1430,35	60,78	1491,13	Trecho 01 Rua Vicente Correia LE + LD
				3,00	10,13	30,39	0,03	0,91	2,00				
50.2.2	CBUQ												
50.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	0,00 + 0,00	6,00 + 14,63	134,63	10,62	1430,35	0,03	42,91	1,00	42,91	1,82	44,73	Trecho 01 Rua Vicente Correia LE + LD
				3,00	10,13	30,39	0,03	0,91	2,00				
50.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora							44,73	1,00				[VIDE CBUQ CAPA] m³
50.2.4	Transporte local de material betuminoso							44,73		11,40	509,92	509,92	[VIDE CBUQ CAPA] m³ x km
51.0	RUA DR. FLORIANO MENDES FREIRE												
51.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO												
51.2.1	Pintura de ligação com emissão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	0,00 + 0,00	30,00 + 14,11	614,11	7,20	4418,99	0,03	132,57	1,00	4418,99	23,34	4668	Trecho 01 Rua Gibão José de Oliveira
				3,00	7,78	23,34	0,025	0,58	1,00				
				3,00	7,78	23,34	0,026	0,61	1,00				Rua Vinte e três
				3,00	7,78	23,34	0,025	0,58	2,00				Rua Manoel Adolfo da Costa LE + LD
51.2.2	CBUQ												
51.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	0,00 + 0,00	30,00 + 14,11	614,11	7,20	4418,99	0,03	132,57	1,00	4418,99	23,34	4668	Trecho 01 Rua Gibão José de Oliveira
				3,00	7,78	23,34	0,025	0,58	1,00				
				3,00	7,78	23,34	0,026	0,61	1,00				Rua Vinte e três
				3,00	7,78	23,34	0,025	0,58	2,00				Rua Manoel Adolfo da Costa LE + LD
51.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora							134,92	1,00		134,92	674,60	[VIDE CBUQ CAPA] m³
51.2.4	Transporte local de material betuminoso							134,92		5,00	674,60	674,60	[VIDE CBUQ CAPA] m³ x km
52.0	RUA SALUSTIANO BEZERRA CABRAL												
52.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO												

Adriano Gomes do Nascimento
MCG/SECOB - Coordenador
de Planejamento de Obras

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
Eng. João Marcelo Oliveira
CREA - 1504695208-DPB



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO
MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	SERVIÇOS	ESTACA						QUANTIDADES			OBSERVAÇÃO			
		Inicial	Final	Comp. (AutoCAD)	Larg. (média)	Área (AutoCAD)	Altura	Volume	N.V.	dmt		Parciais	Totais	
52.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	0,00 + 0,00	25,00 + 13,57	513,57	6,51	3340,65				1,00				Trecho 01 3340,65 m² Executado:
52.2.2	CBUQ													
52.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	0,00 + 0,00	25,00 + 13,57	513,57	6,51	3340,65	0,029	96,68	1,00					Trecho 01 96,68 m² Executado:
52.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora							96,68	1,00					(VIDE CBUQ/CAPA) 96,68 m³ Executado:
52.2.4	Transporte local de material betuminoso							96,68		4,90				(VIDE CBUQ/CAPA) 474,71 m³ x km Executado:
53.0	RUA ALCEBIADES GONÇALVES DA ROCHA													
53.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO													
53.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	0,00 + 0,00	18,00 + 0,44	360,44	7,03	2533,71			1,00					Trecho 01 2533,71 m² Executado:
53.2.2	CBUQ													
53.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	0,00 + 0,00	18,00 + 0,44	360,44	7,03	2533,71	0,029	73,48	1,00					Trecho 01 73,48 m³ Executado:
53.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora							73,48	1,00					(VIDE CBUQ/CAPA) 73,48 m³ Executado:
53.2.4	Transporte local de material betuminoso							73,48		8,20				(VIDE CBUQ/CAPA) 602,54 m³ x km Executado:
68.0	RUA RAFAELA DE SOUZA E SILVA													
68.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO													
68.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	0,00 + 0,00	54,00 + 16,68	1096,68	8,15	8940,03			1,00					Trecho 01 8940,03 m² Executado:
		0,00 + 0,00	0,00 + 11,32	11,32	7,60	88,33			1,00					Trecho 02 88,33 m² Executado:
		0,00 + 0,00	0,00 + 8,00	8,00	6,84	54,70			1,00					Trecho 03 54,70 m² Executado:
		0,00 + 0,00	9,00 + 13,19	193,19	7,15	1350,75			1,00					Trecho 04 1350,75 m² Executado:
68.2.2	CBUQ													
68.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	0,00 + 0,00	54,00 + 16,68	1096,68	8,15	8940,03	0,029	259,26	1,00					Trecho 01 259,26 m³ Executado:
		0,00 + 0,00	0,00 + 11,32	11,32	7,60	88,33		2,28	1,00					Trecho 02 2,28 m³ Executado:
		0,00 + 0,00	0,00 + 8,00	8,00	6,84	54,70		1,48	1,00					Trecho 03 1,48 m³ Executado:
		0,00 + 0,00	9,00 + 13,19	193,19	7,15	1350,75		40,04	1,00					Trecho 04 40,04 m³ Executado:

Adriano Gomes do Nascimento
PMCG/SECOB - Coordenador
de Planejamento de Obras

DEP. MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
RUA RAFAELA DE SOUZA E SILVA, 100 - JARDIM
CAMPINA GRANDE - PB

Constutora Rocha Cavalcante Ltda.
Eng. João Marcelo Oliveira
CREA: 606055208 D1PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO
MEMÓRIA DE CÁLCULO



ITEM	SERVIÇOS	ESTACA						QUANTIDADES		OBSERVAÇÃO		
		Inicial	Final	Comp. (AutoCAD)	Larg. (médias)	Área (AutoCAD)	Altura	Volume	N.V.		dmt	Parciais
68.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m ³ , descarga em vibro-acabadora										303,16 Executado:	303,16 m ³ (VIDE CBUQ/CAPA)
68.2.4	Transporte local de material betuminoso										3365,03 Executado:	3365,03 m ³ x km (VIDE CBUQ/CAPA)
69.0	RUA JOSÉ DA GUIA FERREIRA											
69.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO											
69.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	0,00 + 0,00	17,00 + 2,67	342,67	7,14	2448,07				1,00	2448,07 Executado:	Trecho 01 2448,07 m ³
69.2.2	CBUQ											
69.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	0,00 + 0,00	17,00 + 2,67	342,67	7,14	2448,07	0,028			1,00	68,55 Executado:	Trecho 01 68,55 m ³
69.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m ³ , descarga em vibro-acabadora										68,55 Executado:	68,55 m ³ (VIDE CBUQ/CAPA)
69.2.4	Transporte local de material betuminoso										726,63 Executado:	726,63 m ³ x km (VIDE CBUQ/CAPA)
70.0	RUA DR. JOSÉ MOISÉS DE MEDEIROS NETO											
70.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO											
70.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	0,00 + 0,00	14,00 + 13,61	293,61	6,60	1938,27				1,00	1938,27 Executado:	Trecho 01 1938,27 m ³
70.2.2	CBUQ											
70.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	0,00 + 0,00	14,00 + 13,61	293,61	6,60	1938,27	0,039			1,00	56,21 Executado:	Trecho 01 56,21 m ³
70.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m ³ , descarga em vibro-acabadora										56,21 Executado:	56,21 m ³ (VIDE CBUQ/CAPA)
70.2.4	Transporte local de material betuminoso										393,47 Executado:	393,47 m ³ x km (VIDE CBUQ/CAPA)
77.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (12 MESES DE OBRA)											
77.1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
77.1.1	Administração local da Obra (12 meses de obra)									6,85%	6,8500%	6,8500% unidade
78.0	LABORATÓRIO DE BETUME (BDI DE 76,85%)											

Adriano Gomes do Nascimento
PMCG/SECOB - Coordenador
de Planejamento de Obras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

Constelava Rocha Cavalcante Ltda.

Eng. João Neto de Oliveira
CREA 160965208 DPB



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO
MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	SERVIÇOS	ESTACA					QUANTIDADES		OBSERVAÇÃO						
		Inicial	Final	Comp. (AutoCAD)	Larg. (média)	Área (AutoCAD)	Altura	Volume		N.V.	dmt	Parciais	Totais		
78.1	SERVIÇOS PRELIMINARES														
79.1.1	Laboratório de Betume (BDI de 26,85%)											0,0685			
												Executado:			0,0685 %

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
Adriano Gomes do Nascimento
 Eng.º de Engenharia Civil - CREA 16089/53208 DPB

Adriano Gomes do Nascimento
 PMCG/SECOB - Coordenador
 de Planejamento de Obras

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
Eng. Jocio Nely de Oliveira
 CREA 16089/53208 DPB




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIROS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTAÇÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCONGÓ, SANTA CRUZ, DINAMÉRICA, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCONGÓ, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTÃO, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA

PLANTA (CROQUI)




01 - Planta Baixa Estaqueamento

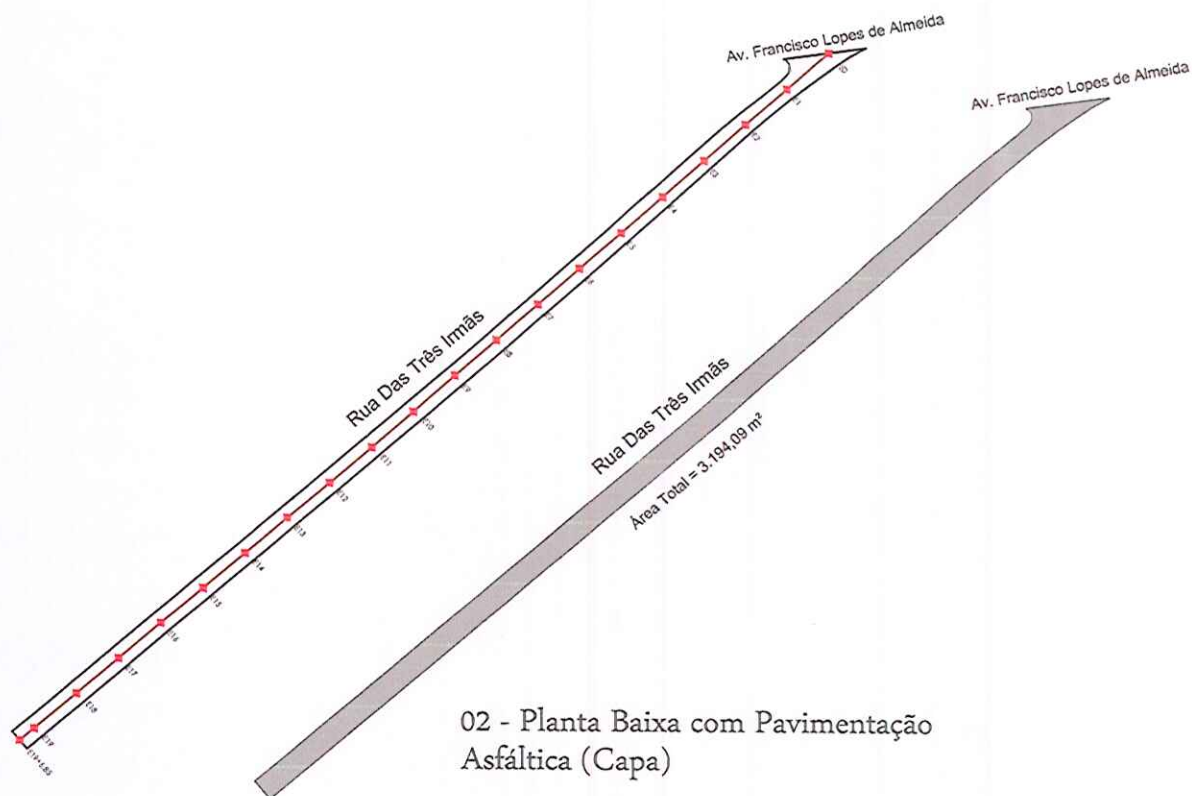

02 - Planta Baixa com Pavimentação Asfáltica (Capa)

Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: Das Três Irmãs	
Bairro: Santa Cruz	
Data/Ano: janeiro/2021	Prancha: 1/1
RUA DAS TRÊS IRMÃS	
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²
ÁREA DA RUA – CAPA	3.194,09 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	386,85 m
LARGURA DA RUA (média)	8,26 m

03 – Planta de Situação

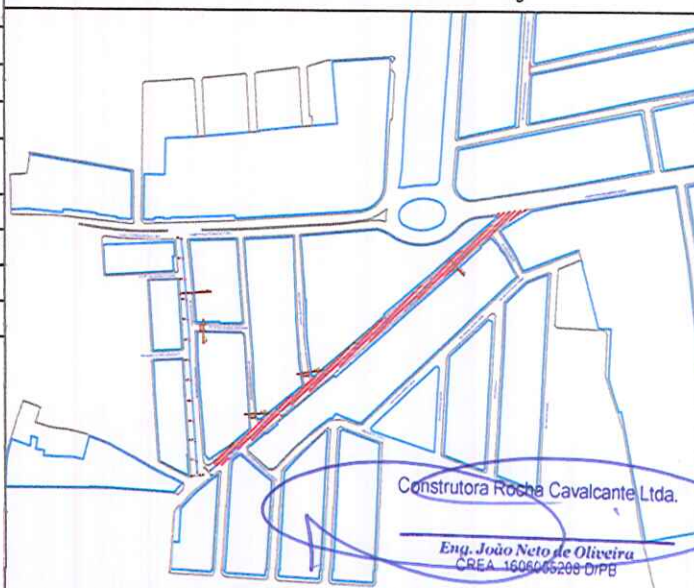


PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
Eng.º Civil - CREA-PB Nº 180.293534-2


Adriano Gomes do Nascimento
PMCG/SECOB - Coordenador
de Planejamento de Obras

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

Eng. João Neto de Oliveira
CREA 160505208 DPB

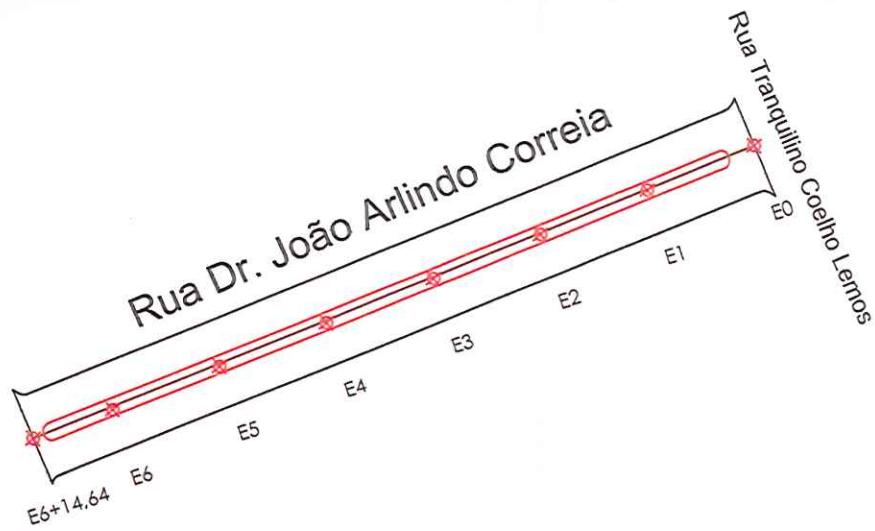

01 - Planta Baixa Estaqueamento

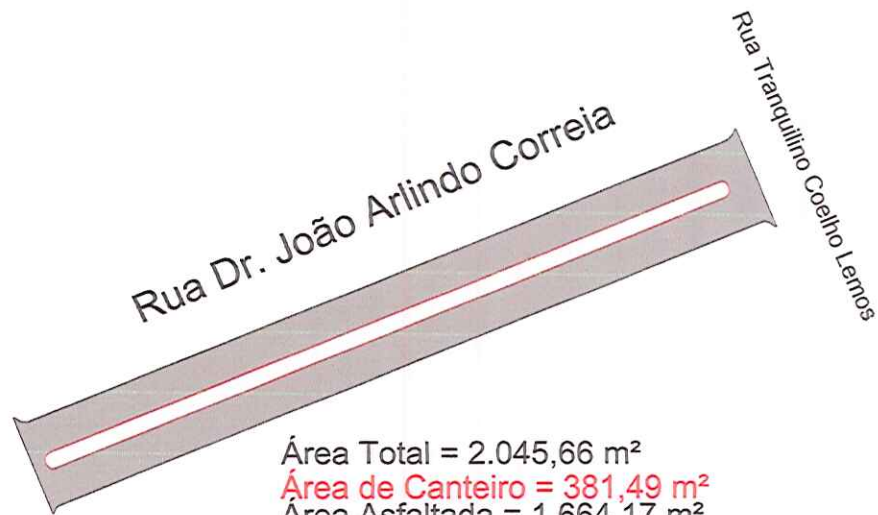


Área Total = 2.045,66 m²
 Área de Canteiro = 381,49 m²
 Área Asfaltada = 1.664,17 m²

02 - Planta Baixa com Pavimentação Asfáltica (Capa)

Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: Dr. João Arlindo Correia	
Bairro: Dinamérica	
Data/Ano: janeiro/2021	Prancha: 1/1
RUA DR. JOÃO ARLINDO CORREIA	
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²
ÁREA DA RUA – CAPA	1.664,17 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	134,64 m
LARGURA DA RUA (média)	12,36 m



03 - Planta de Situação

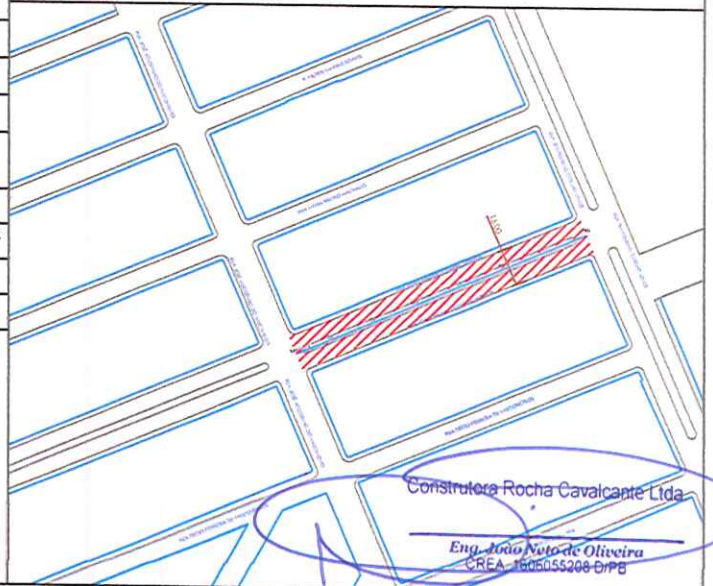


PRÉ-FUNDO DE C. GRANDE
 Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng. Civil - CRE - PB Nº 160.283534-2

Adriano Gomes do Nascimento
 PMCG/SECOB - Coordenador
 de Planejamento de Obras

Construtora Rocha Cavalcante Ltda
 Eng. João Neto de Oliveira
 CREA 1606055268-0/PB




01 - Planta Baixa Estaqueamento



02 - Planta Baixa com Pavimentação Asfáltica (Capa)

Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: Ladislau Rodrigues de Souza	
Bairro: Centenário	
Data/Ano: janeiro/2021	Prancha: 1/1
RUA LADISLAU RODRIGUES DE SOUZA	
ÁREA DA BOCA DE RUA	63,43 m ²
ÁREA DA RUA – CAPA	1.632,86 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	177,77 m
LARGURA DA RUA (média)	9,19 m

03 – Planta de Situação



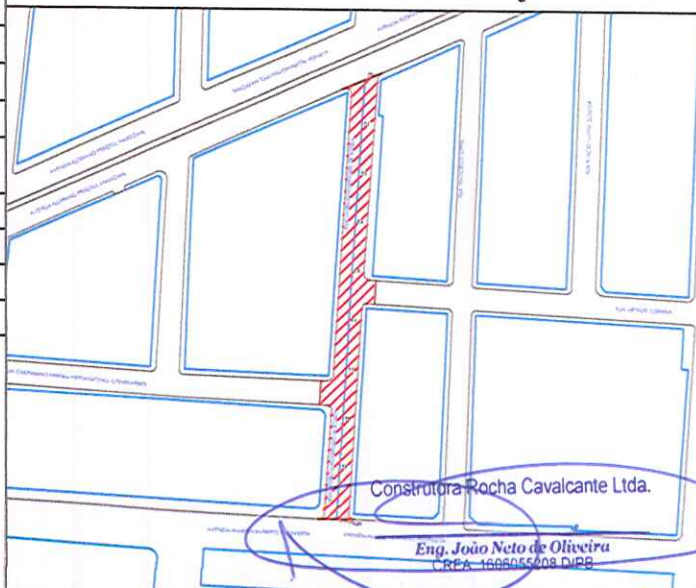


PREF. MUN. DE C. GRANDE
 Eng.º Danilo CREA-PB Nº 150.283534-2

Adriano Gomes do Nascimento
 PMCG/SECOB - Coordenador
 de Planejamento de Obras

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

Eng.º João Neto de Oliveira
 CREA 150605509 DIBP




01 - Planta Baixa Estaqueamento

02 - Planta Baixa com Pavimentação Asfáltica (Capa)

Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: Francisco Lopes	
Bairro: Centenário	
Data/Ano: janeiro/2021	Prancha: 1/1
RUA FRANCISCO LOPES	
ÁREA DA BOCA DE RUA	60,78 m ²
ÁREA DA RUA – CAPA	1.430,35 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	199,26 m
LARGURA DA RUA (média)	7,18 m

03 – Planta de Situação


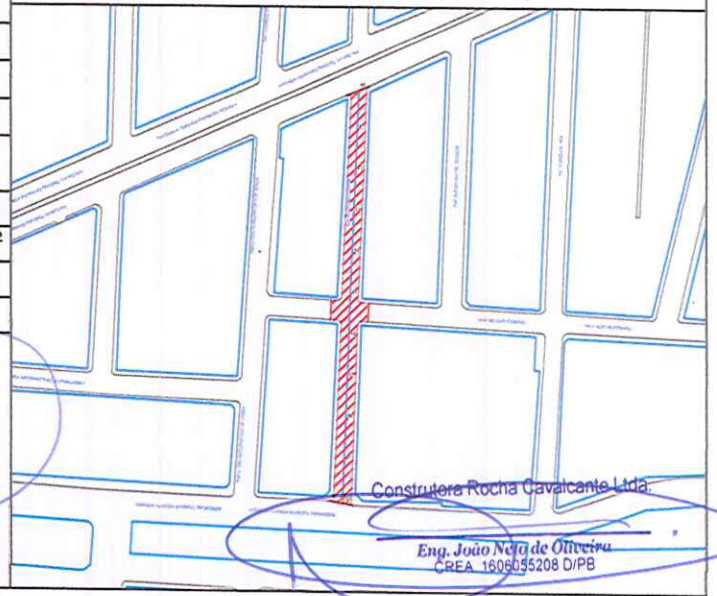


PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
 Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng.º Civil - CREA - PB Nº 160.283534-2


Adriano Gomes do Nascimento
 PMCG/SECOB - Coordenador
 de Planejamento de Obras

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

Eng. João Neto de Oliveira
 CREA 1605055208 D/PB



01 - Planta Baixa Estaqueamento



02 - Planta Baixa com Pavimentação Asfáltica (Capa)

Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: Dr. Floriano Mendes Freire	
Bairro: Cruzeiro	
Data/Ano: janeiro/2021	França: 1/1
RUA DR. FLORIANO MENDES FREIRE	
ÁREA DA BOCA DE RUA	93,35 m ²
ÁREA DA RUA – CAPA	4.418,99 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	614,11 m
LARGURA DA RUA (média)	7,20 m

03 – Planta de Situação




PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
Eng. CIVIL CREA-PB Nº 160.293594-2

Adriano Gomes do Nascimento
PMCG/SECOB - Coordenador
de Planejamento de Obras

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

Eng. João Neto de Oliveira
CREA. 1606055208 D/PB


01 - Planta Baixa Estaqueamento

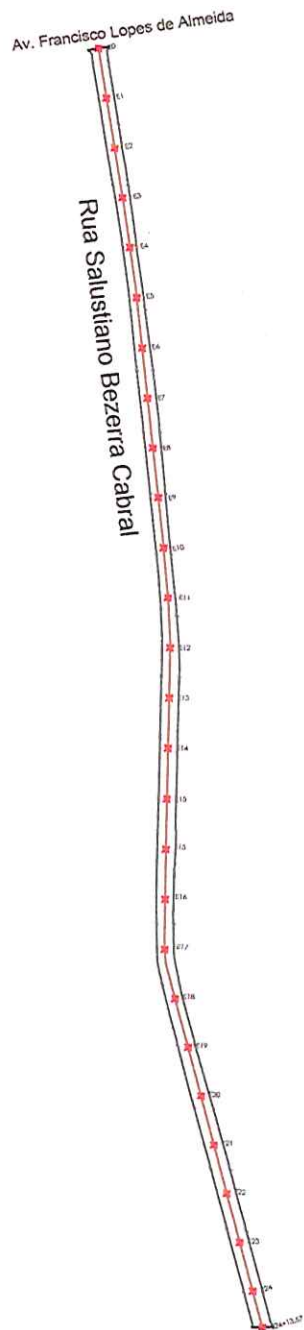

Av. Francisco Lopes de Almeida

Rua Salustiano Bezerra Cabral


Area Total = 3.340,85 m²



02 - Planta Baixa com Pavimentação Asfáltica (Capa)

Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: Salustiano Bezerra Cabral	
Bairro: Cruzeiro	
Data/Ano: janeiro/2021	Prancha: 2/2
RUA SALUSTIANO BEZERRA CABRAL	
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²
ÁREA DA RUA – CAPA	3.340,85 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	513,57 m
LARGURA DA RUA (média)	6,51 m

03 – Planta de Situação


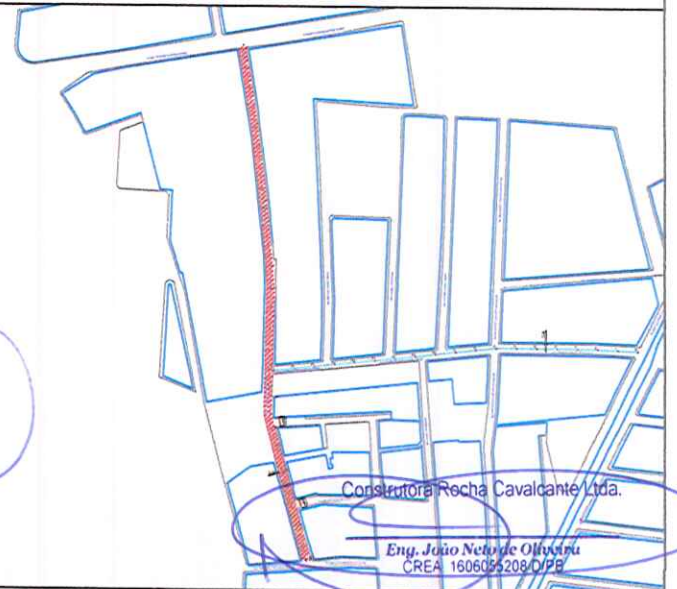


PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
Eng. Civil - CREA-PB Nº 160.293/94-2


Adriano Gomes do Nascimento
PMCG/SECOB - Coordenador
de Planejamento de Obras

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

Eng. João Neto de Oliveira
CREA 160605208/0/PB




01 - Planta Baixa Estaqueamento



02 - Planta Baixa com Pavimentação Asfáltica (Capa)

Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: Alcebiades Gonçalves da Rocha	
Bairro: Cruzeiro	
Data/Ano: janeiro/2021	Prancha: 1/1
RUA ALCEBIADES GONÇALVES DA ROCHA	
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²
ÁREA DA RUA – CAPA	2.533,71 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	360,44 m
LARGURA DA RUA (média)	7,03 m

03 – Planta de Situação

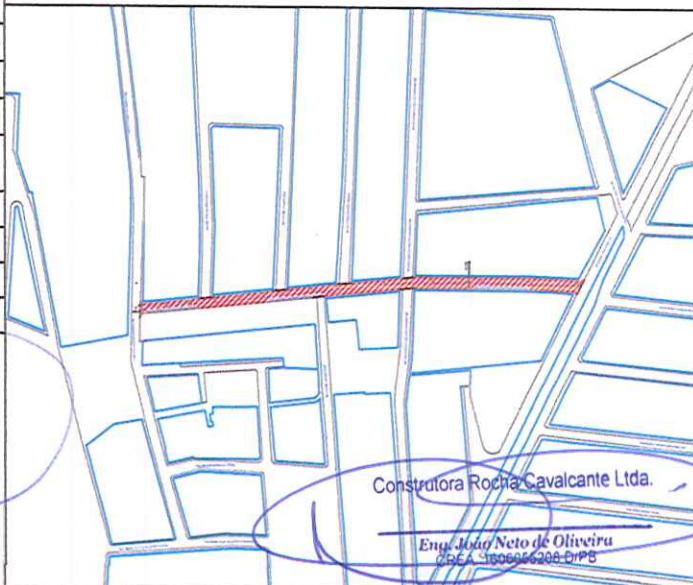


PREF. MUN. C. DE C. GRANDE
 Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng.º Civil - CREA-PB Nº 150.283/534-2

Adriano Gomes do Nascimento
 PMCG/SECOB - Coordenador
 de Planejamento de Obras

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

Eng.º João Neto de Oliveira
 CREA - 100554/2008-0/RS

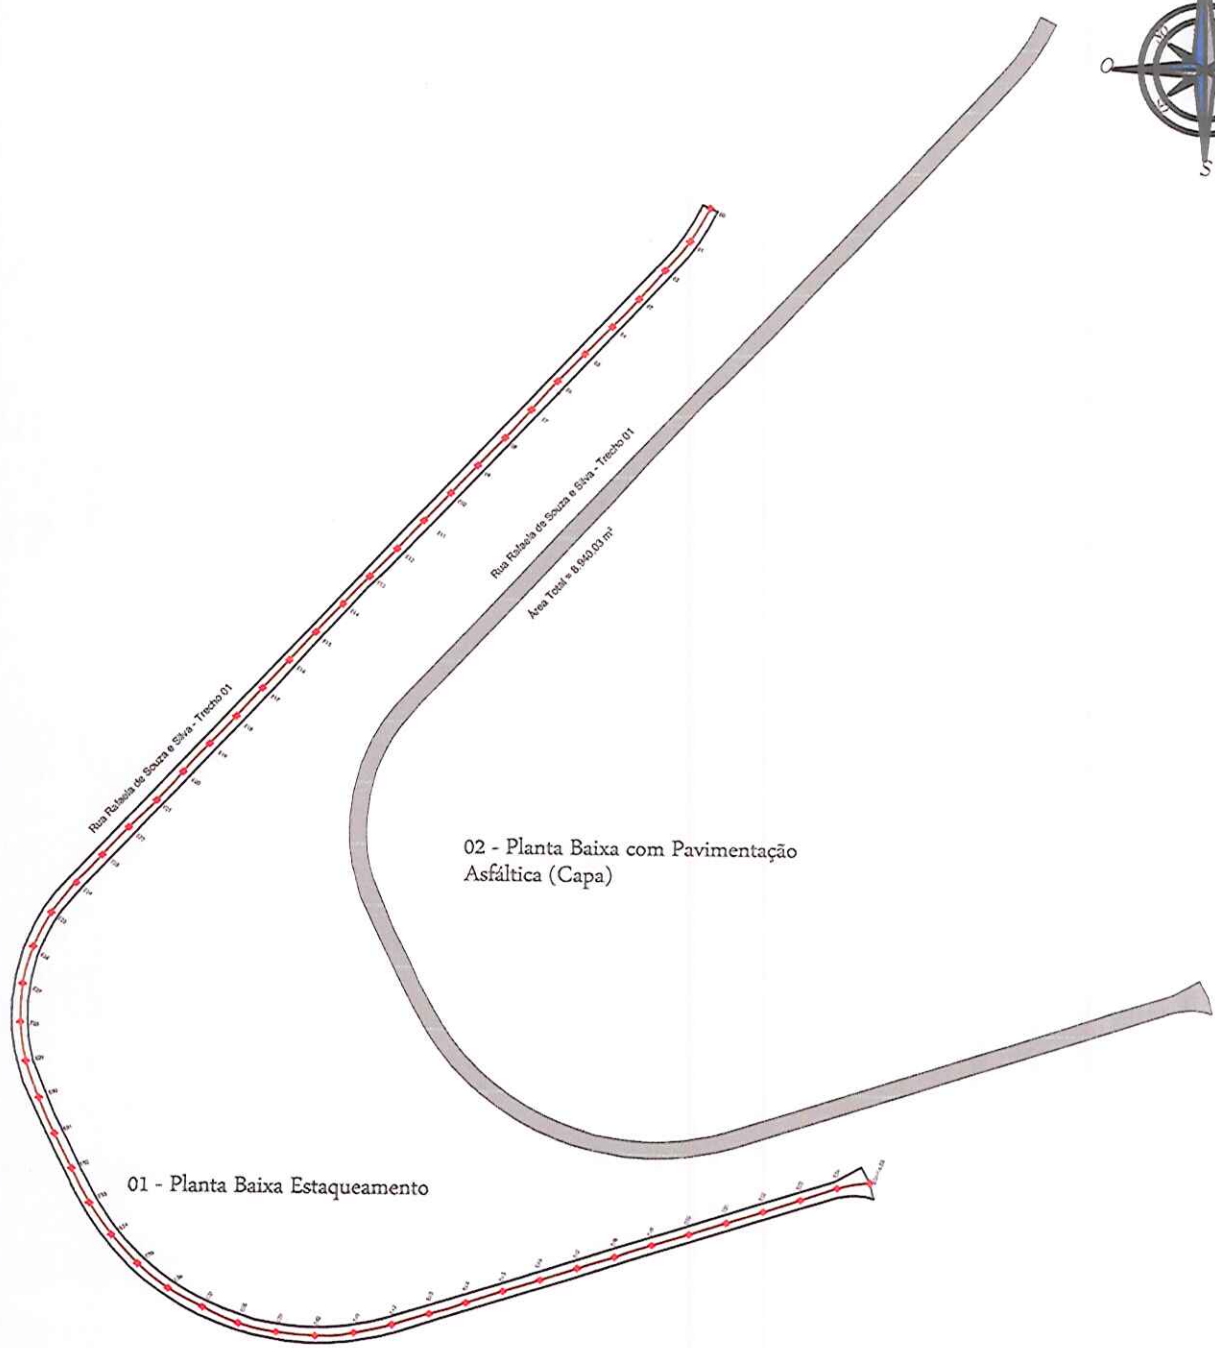


02 - Planta Baixa com Pavimentação Asfáltica (Capa)

01 - Planta Baixa Estaqueamento

Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: Rafaela de Souza e Silva – Trecho 01	
Bairro: Serrotão	
Data/Ano: janeiro/2021	Prancha: 1/4
RUA RAFAELA DE SOUZA E SILVA – TRECHO 01	
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²
ÁREA DA RUA – CAPA	8.940,03 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	1.096,88 m
LARGURA DA RUA (média)	8,15 m


03 – Planta de Situação

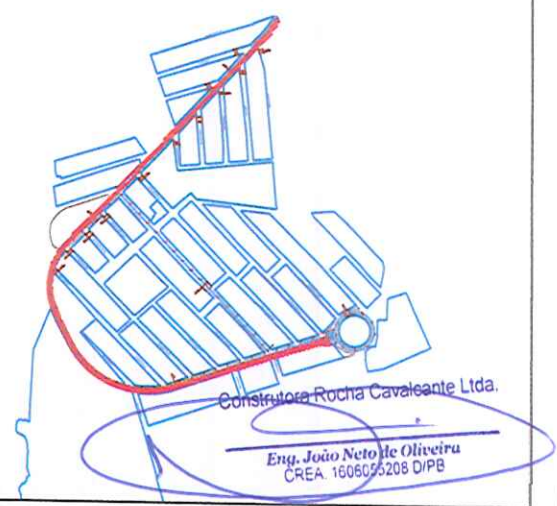


PRÉF. MUNIC. DE C. GRANDE
[Signature]
 Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng.º Civil - CREA - PB Nº 50.293534-2

Adriano Gomes do Nascimento
 PMCG/SECOB - Coordenador
 de Planejamento de Obras


Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
 Eng. João Neto de Oliveira
 CREA 1606055208 D/PE



Rua Rafaela de Souza e Silva - Trecho 02

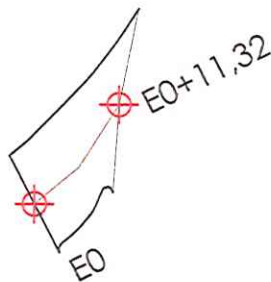

01 - Planta Baixa Estaqueamento



Área Total = 88,33 m²

02 - Planta Baixa com Pavimentação Asfáltica (Capa)


Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA		03 - Planta de Situação	
Projeto: Pavimentação Asfáltica			
Rua: Rafaela de Souza e Silva - Trecho 02			
Bairro: Serrotão			
Data/Ano: janeiro/2021	Prancha: 2/4		
RUA RAFAELA DE SOUZA E SILVA - TRECHO 02			
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²		
ÁREA DA RUA - CAPA	88,33 m ²		
COMPRIMENTO DO EIXO	11,32 m		
LARGURA DA RUA (média)	7,80 m		
Adriano Gomes do Nascimento PMCG/SECOB - Coordenador de Planejamento de Obras			
Eng. João Neto de Oliveira CREA 1606053208 DfPB			

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Flavio de Jesus C. Xavier
Eng. Civil - CREA-PB nº 20.293534-2

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.



Rua Rafaela de Souza e Silva - Trecho 03



01 - Planta Baixa Estaqueamento




Área Total = 54,70 m²

02 - Planta Baixa com Pavimentação Asfáltica (Capa)

Proprietário:	Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto:	Pavimentação Asfáltica	
Rua:	Rafaela de Souza e Silva - Trecho 03	
Bairro:	Serrotão	
Data/Ano:	janeiro/2021	Prancha: 3/4
RUA RAFAELA DE SOUZA E SILVA - TRECHO 03		
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²	
ÁREA DA RUA - CAPA	54,70 m ²	
COMPRIMENTO DO EIXO	8,00 m	
LARGURA DA RUA (média)	6,84 m	

03 - Planta de Situação

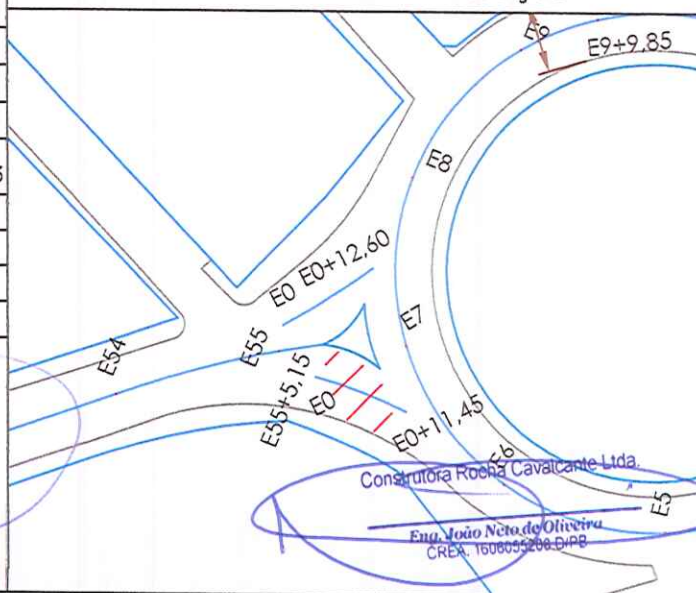



PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
Eng. Civil - CR. 1A-PB Nº 90 283534-2

Adriano Gomes do Nascimento
PMCG/SECOB - Coordenador
de Planejamento de Obras


Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

Eng. João Neto de Oliveira
CREA. 1608055208-DPB

Rua Rafaela de Souza e Silva - Trecho 04

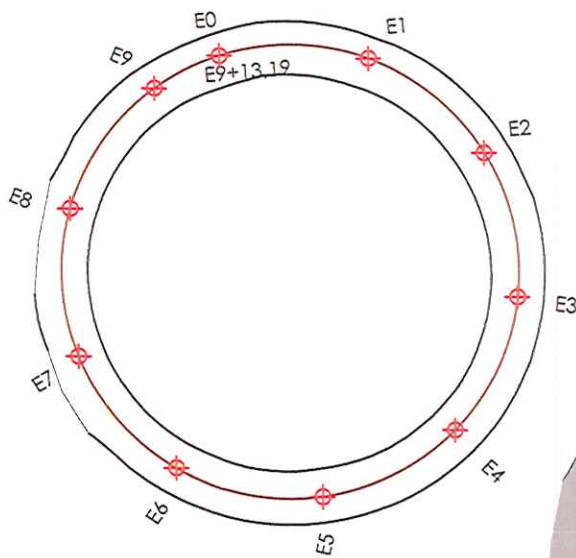


01 - Planta Baixa Estaqueamento

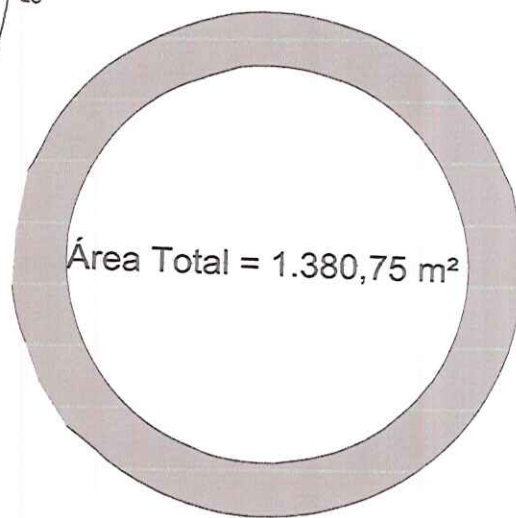

02 - Planta Baixa com Pavimentação Asfáltica (Capa)

Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: Rafaela de Souza e Silva - Trecho 04	
Bairro: Serrotão	
Data/Ano: janeiro/2021	Prancha: 4/4
RUA RAFAELA DE SOUZA E SILVA - TRECHO 04	
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²
ÁREA DA RUA - CAPA	1.380,75 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	193,19 m
LARGURA DA RUA (média)	7,15 m

03 - Planta de Situação

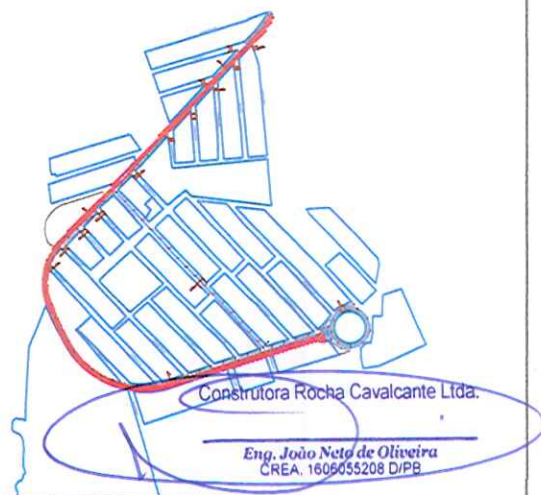


PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
 Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng. Civil - CREA-PB Nº 180.283594-2

Adriano Gomes do Nascimento
 PMCG/SECOB - Coordenador
 de Planejamento de Obras

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
 Eng. João Neto de Oliveira
 CREA. 1609055208 D/PB




02 - Planta Baixa com Pavimentação
Asfáltica (Reperfilamento)

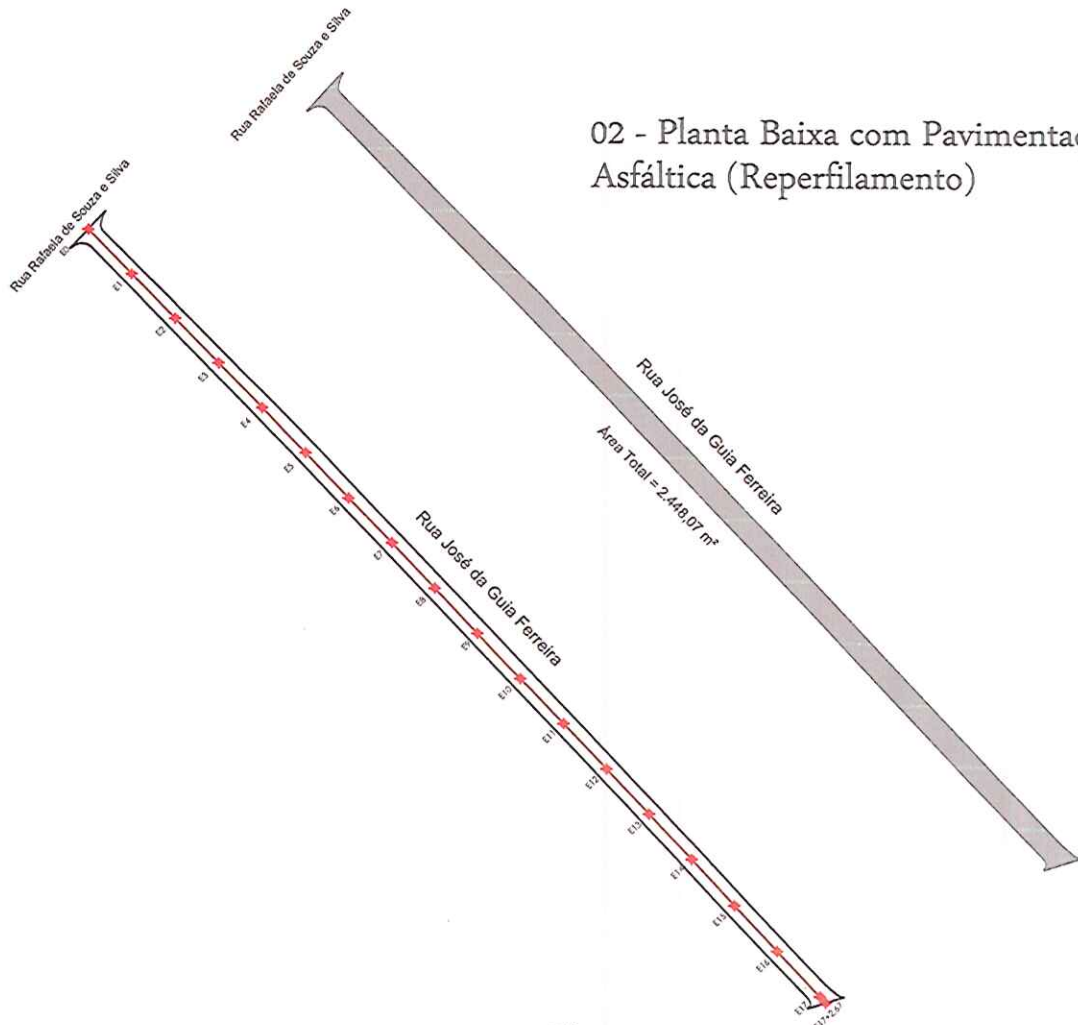

01 - Planta Baixa Estaqueamento


Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: José da Guia Ferreira	
Bairro: Serrotão	
Data/Ano: janeiro/2021	Prancha: 1/1
RUA JOSÉ DA GUIA FERREIRA	
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²
ÁREA DA RUA – CAPA	2.448,07 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	342,67 m
LARGURA DA RUA (média)	7,14 m

03 – Planta de Situação

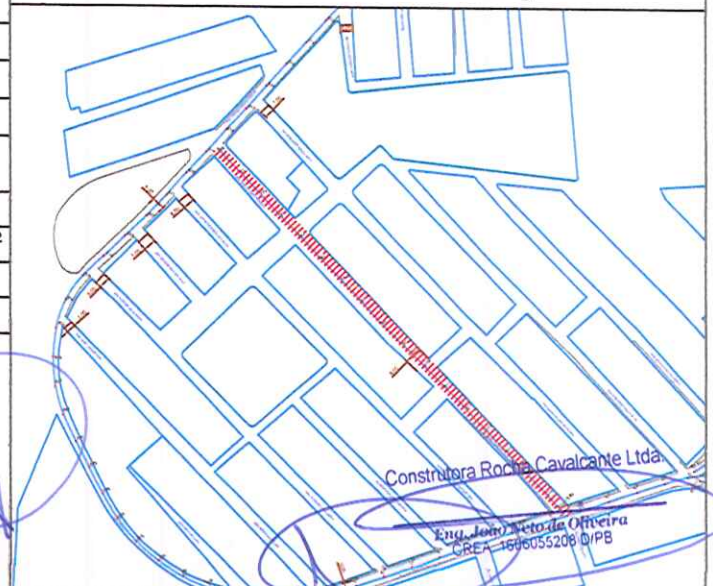


PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
Eng.º Civil - CREA-PB Nº 150.293534-2

Adriano Gomes do Nascimento
PMCG/SECOB - Coordenador
de Planejamento de Obras

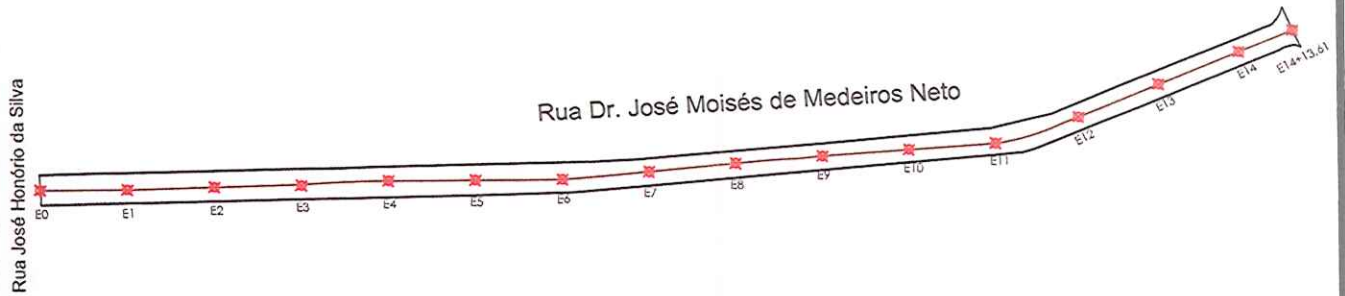


01 - Planta Baixa Estaqueamento

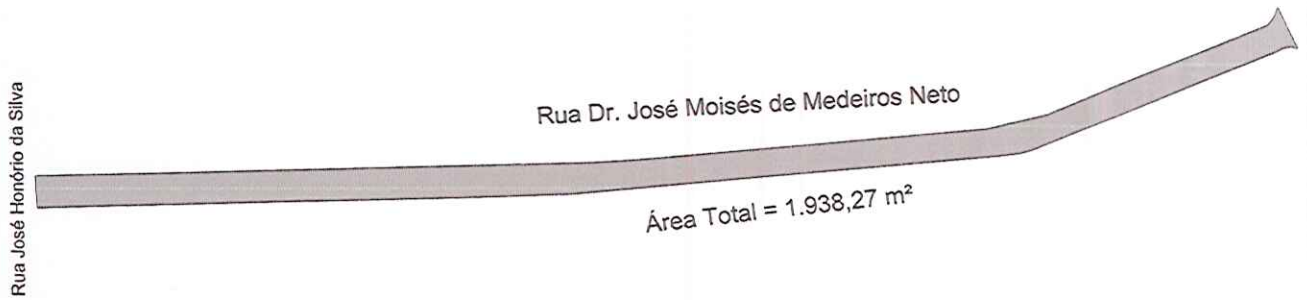

02 - Planta Baixa com Pavimentação Asfáltica (Capa)

Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: Dr. José Moisés de Medeiros Neto	
Bairro: Malvinas	
Data/Ano: janeiro/2021	Prancha: 1/1
RUA DR. JOSÉ MOISÉS DE MEDEIROS NETO	
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²
ÁREA DA RUA – CAPA	1.938,27 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	293,61 m
LARGURA DA RUA (média)	6,60 m

03 – Planta de Situação

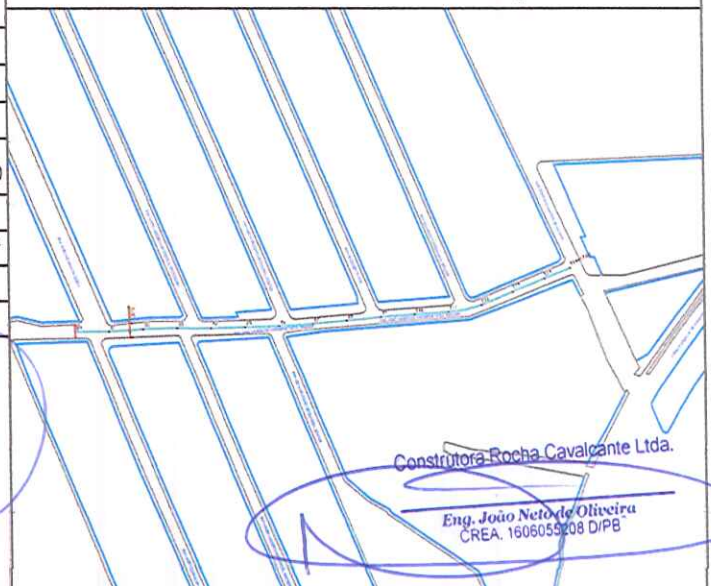

PREF. MUNIC. DE G. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
Eng. CIVIL - CREA-PB Nº 150.283/534-2

Adriano Gomes do Nascimento
PMCG/SECOB - Coordenador
de Planejamento de Obras

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

Eng. João Neto de Oliveira
CREA. 1606059208 D/PB



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIROS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTAÇÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCONGÓ, SANTA CRUZ, DINAMÉRICA, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCONGÓ, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTÃO, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA
CONTRATO: 2.08.022/2020
PERÍODO LÍQUIDO: 18/12/2020 À 29/01/2020


MEDIÇÃO: 07ª

FOTO 01



COORDENADAS:	RUA:
7°13'14.9"S 35°53'01.2"W	MAJOR JUVINO DO Ó

FOTO 02

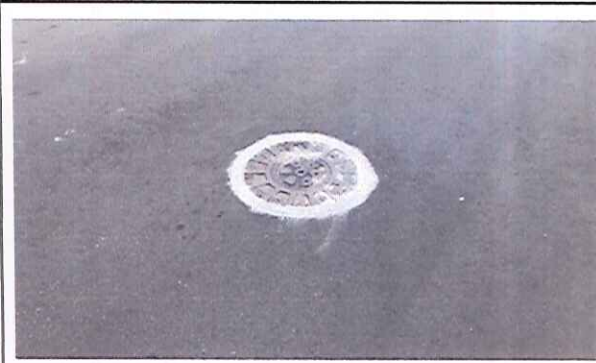

COORDENADAS:	RUA:
7°13'16.9"S 35°53'01.3"W	MAJOR JUVINO DO Ó

FOTO 03



COORDENADAS:	RUA:
7°13'25.1"S 35°52'48.4"W	DEPUTADO ALVARO GAUDÊNCIO

FOTO 04



COORDENADAS:	RUA:
7°13'23.3"S 35°52'48.6"W	DEPUTADO ALVARO GAUDÊNCIO

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
Engº Civil - CREA-PB Nº 160.283534-2

Adriano Gomes do Nascimento
PMCG/SECOB - Coordenador
de Planejamento de Obras

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

Eng. João Neto de Oliveira
CREA 1606055208-D/PB



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA
CONTRATO: 2.08.022/2020
PERÍODO LÍQUIDO: 18/12/2020 À 29/01/2020

MEDIÇÃO: 07ª

FOTO 05



COORDENADAS:	RUA:
7°13'23.9"S 35°52'46.9"W	ELIAS ASFORA

FOTO 06



COORDENADAS:	RUA:
7°13'25.4"S 35°52'46.9"W	ELIAS ASFORA

FOTO 07



COORDENADAS:	RUA:
7°13'20.4"S 35°52'55.3"W	JOSÉ BONIFÁCIO

FOTO 08



COORDENADAS:	RUA:
7°13'20.4"S 35°52'55.3"W	JOSÉ BONIFÁCIO

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
Eng.º Civil - CREA-PB Nº 150.293534-2

Adriano Gomes do Nascimento
PMCG/SECOB - Coordenador
de Planejamento de Obras

Construtora Rocha Cavalcante Ltda
Eng. João Neto de Oliveira
CREA. 1606055208 DIPB




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA
CONTRATO: 2.08.022/2020
PERÍODO LÍQUIDO: 18/12/2020 À 29/01/2020

MEDIÇÃO: 07ª

FOTO 09

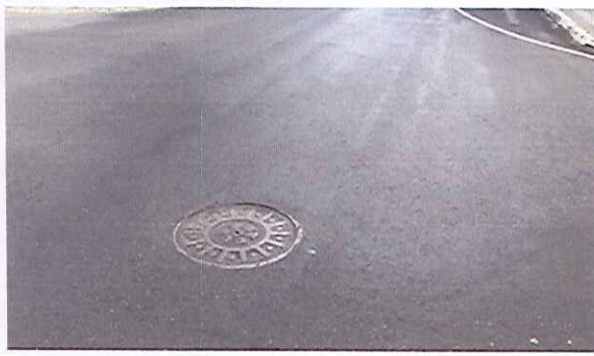

COORDENADAS:	RUA:
7°13'26.6"S 35°52'55.1"W	JOÃO TAVARES

FOTO 10



COORDENADAS:	RUA:
7°13'26.5"S 35°52'55.0"W	JOÃO TAVARES

FOTO 11



COORDENADAS:	RUA:
7°13'17.6"S 35°52'32.3"W	CAPITÃO JOÃO DE SÁ

FOTO 12



COORDENADAS:	RUA:
7°13'15.0"S 35°52'32.9"W	CAPITÃO JOÃO DE SÁ

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus E. Xavier
Eng. Civil - CREA-PB Nº 150.283534-2

Adriano Gomes do Nascimento
PMCG/SECOB - Coordenador
de Planejamento de Obras

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

Eng. João Neto de Oliveira
CREA 160605200-6/PB



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA
CONTRATO: 2.08.022/2020
PERÍODO LÍQUIDO: 18/12/2020 À 29/01/2020

MEDIÇÃO: 07ª

FOTO 13



COORDENADAS:	RUA:
7°13'11.0"S 35°52'32.0"W	DR. CARLOS AGRA

FOTO 14



COORDENADAS:	RUA:
7°13'11.0"S 35°52'32.3"W	DR. CARLOS AGRA

FOTO 15



COORDENADAS:	RUA:
7°13'18.3"S 35°52'35.3"W	ULISSES GOMES

FOTO 16



COORDENADAS:	RUA:
7°13'17.3"S 35°52'35.6"W	ULISSES GOMES

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
Eng.º Civil - CREA-PB Nº 150.293534-2

Adriano Gomes do Nascimento
PMCG/SECOB - Coordenador
de Planejamento de Obras

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
Eng. João Neto de Oliveira
CREA, 1606055/08 D/PE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: **CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA**
 CONTRATO: **2.08.022/2020**
 PERÍODO LÍQUIDO: **18/12/2020 À 29/01/2020**


MEDIÇÃO: **07ª**

FOTO 17



COORDENADAS:	RUA:
7°14'53.3"S 35°54'46.6"W	TRÊS IRMÃS

FOTO 18

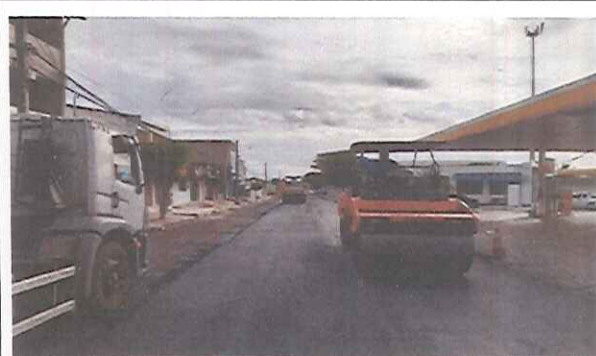

COORDENADAS:	RUA:
7°14'47.7"S 35°54'39.9"W	TRÊS IRMÃS

FOTO 19



COORDENADAS:	RUA:
7°14'21.7"S 35°55'05.1"W	DR. JOÃO ARLINDO CORREIA

FOTO 20



COORDENADAS:	RUA:
7°14'20.9"S 35°55'03.2"W	DR. JOÃO ARLINDO CORREIA

Francisco de Jesus C. Xavier
 PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
 Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng.º Civil - CREA-PB Nº 150.293534-2

Adriano Gomes do Nascimento
 PMCG/SECOB - Coordenador
 de Planejamento de Obras

João Neto de Oliveira
 Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
 Eng. João Neto de Oliveira
 CREA. 160605/200 D/PB



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA
CONTRATO: 2.08.022/2020
PERÍODO LÍQUIDO: 18/12/2020 À 29/01/2020

MEDIÇÃO: 07ª

FOTO 21



FOTO 22



COORDENADAS:	RUA:
7°13'42.7"S 35°54'06.3"W	LADISLAU RODRIGUES DE SOUZA

COORDENADAS:	RUA:
7°13'45.6"S 35°54'06.5"W	LADISLAU RODRIGUES DE SOUZA

FOTO 23



FOTO 24



COORDENADAS:	RUA:
7°13'45.6"S 35°54'05.0"W	FRANCISCO LOPES

COORDENADAS:	RUA:
7°13'45.9"S 35°54'04.9"W	FRANCISCO LOPES

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
Eng. Civil - CREA-PB Nº 150.283534-2

Adriano Gomes do Nascimento
PMCG/SECOB - Coordenador
de Planejamento de Obras

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

Eng. João Neto de Oliveira
CREA. 160505208 D/1PB



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA
CONTRATO: 2.08.022/2020
PERÍODO LÍQUIDO: 18/12/2020 À 29/01/2020


MEDIÇÃO: 07ª

FOTO 25



COORDENADAS:	RUA:
7°15'06.3"S 35°54'09.7"W	DR. FLORIANO MENDES FREIRE

FOTO 26

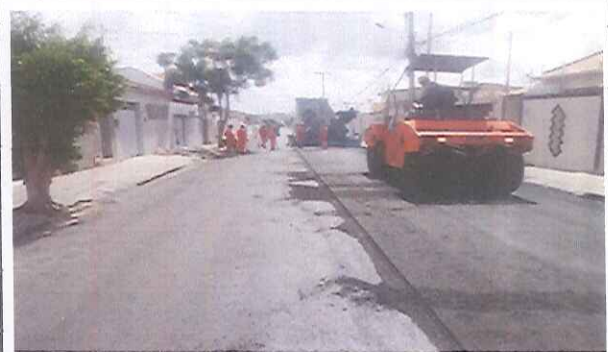

COORDENADAS:	RUA:
7°15'05.8"S 35°54'14.4"W	DR. FLORIANO MENDES FREIRE

FOTO 27



COORDENADAS:	RUA:
7°14'56.0"S 35°54'32.4"W	SALUSTIANO BEZERRA CABRAL

FOTO 28



COORDENADAS:	RUA:
7°14'56.0"S 35°54'32.4"W	SALUSTIANO BEZERRA CABRAL

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
Eng.º Civil - CREA-PB Nº 150.283534-2

Adriano Gomes do Nascimento
PMCG/SECOB - Coordenador
de Planejamento de Obras

Construtora Rocha Cavalcante Ltda
Eng.º João Neto de Oliveira
CREA. 160805/208 D/PE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: **CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA**
 CONTRATO: **2.08.022/2020**
 PERÍODO LÍQUIDO: **18/12/2020 À 29/01/2020**

MEDIÇÃO: **07ª**

FOTO 29



COORDENADAS:	RUA:
7°14'55.7"S 35°54'20.8"W	ALCEBÍADES GONÇALVES DA ROCHA

FOTO 30



COORDENADAS:	RUA:
7°14'55.8"S 35°54'25.4"W	ALCEBÍADES GONÇALVES DA ROCHA

FOTO 31



COORDENADAS:	RUA:
7°13'43.4"S 35°56'52.3"W	RAFAELA DE SOUZA E SILVA

FOTO 32



COORDENADAS:	RUA:
7°13'42.3"S 35°56'52.5"W	RAFAELA DE SOUZA E SILVA

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
 Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng.º Civil - CREA-PB Nº 190.283534-2

Adriano Gomes do Nascimento
 PMCG/SECOB - Coordenador
 de Planejamento de Obras

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

Eng.º João Neto de Oliveira
 CREA 1606085208 DIPP



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA
CONTRATO: 2.08.022/2020
PERÍODO LÍQUIDO: 18/12/2020 À 29/01/2020

MEDIÇÃO: 07ª

FOTO 33



FOTO 34



COORDENADAS:	RUA:
7°13'41.8"S 35°56'58.0"W	JOSÉ DA GUIA FERREIRA

COORDENADAS:	RUA:
7°13'41.1"S 35°56'58.7"W	JOSÉ DA GUIA FERREIRA

FOTO 35



FOTO 36



COORDENADAS:	RUA:
7°13'56.2"S 35°55'12.2"W	DR. JOSÉ MOISÉS DE MEDEIROS NETO

COORDENADAS:	RUA:
7°13'57.0"S 35°55'15.5"W	DR. JOSÉ MOISÉS DE MEDEIROS NETO

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
Eng.º Civil - CREA-PB Nº 160.283534-2

Adriano Gomes do Nascimento
PMCG/SECOB - Coordenador
de Planejamento de Obras

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

Eng. João Neto de Oliveira
CREA. 1608055208 D/PB
