

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período	Física Acum.
-------	-----------------	------------------------------	----------	------------	-------	-----------------------------	----------	-------------------	------------------------	------------	---------------------------	--------------

Observações:

Local: CAMPINA GRANDE-PB

Responsável Técnico: FRANCISCO DE JESUS C. XAVIER
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ART/RRRT Fiscal: PB20180221411

Data: 05 de maio de 2021

Representante Tomador / Agente Promotor: FERNANDA RIBEIRO BARBOZA
Nome: FERNANDA RIBEIRO BARBOZA
Cargo: SECRETARIA DE OBRAS

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro


Nome:

Cargo:

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
Eng. CIVIL - CREA-PB Nº 180.283534-2

Adriano Gomes do Nascimento
Coordenador de Planejamento Obras
SECOB/PMCG

Consulтора Rocha Cavalcante Ltda.
Eng. João Neto de Oliveira
CREA 1606655208 DIPB



Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

CNPJ: 09.323.098/0001-92 -Insc. Estadual:16.056.310-0

Rua Álvaro de Araújo Pereira, N° 255 – Jardim Tavares – CEP: 58.402-300 – Campina Grande – PB
Fone: (83) 3341-1471 Fax: (83) 3322-6933 CREA: 821 – 16ª

À

Prefeitura Municipal de Campina Grande – PB

A/C: Eng. (a).Fernanda Ribeiro Barboza – Secretária Municipal de Obras

Ref.: 10ª Medição da obra de recapeamento asfáltico nos bairros Centro, Bela Vista, Alto Branco, Conceição, Estação Velha, Palmeira, Prata, Bodocongó, Santa Cruz, Dinamérica, Catolé, Centenário, Cruzeiro, Jardim Tavares, Jeremias, José Pinheiro, Mirante, Novo Bodocongó, Santo Antônio, São José, Serrotão, Malvinas, Monte Santo e Universitário, no município de Campina Grande, estado da Paraíba.

Assunto: Solicitação de Análise Técnica da medição de serviços nº 10

Senhora Secretária,

Encaminhamos, em anexo, o **Boletim da Medição de Serviços nº 10 – Revisado e demais elementos técnicos integrantes**, relativo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 2.08.022/2020, referente ao período de 25 de março/2021 a 29 de abril/2021, para aprovação da fiscalização da obra e providencias cabíveis no tocante à liberação dos recursos.

Campina Grande, 05 de maio de 2021.

Atenciosamente,


Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
Eng. João Neto de Oliveira
CREA 1606055208 D/PB



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIROS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTAÇÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCONGÓ, SANTA CRUZ, DINAMÉRICA, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCONGÓ, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTÃO, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARÁIBA


10ª MEDIÇÃO
CONTRATO 2.08.022/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIRROS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTAÇÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCONGÓ, SANTA CRUZ, DINAMÉRICA, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCONGÓ, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTÃO, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARÁÍBA

FÍSICO-FINANCEIRO

		RM - número 10		RM - Data emissão 05/05/2021		RM - Período de referência da prestação de serviços de 25/03/2021 a 29/04/2021		Nº do CT 1.065.660-37		Grav de Sigilo Data do CT 01/07/20	
RM - número 10		Empresa Contratada CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA		Objeto do CTEF (escudo) RECAPAMENTO ASFÁLTICO NOS BARRIOS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTACÇÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCONGO, SANTA CRUZ, DIMAMÉRICA, CATOLÉ, CEMITÉRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, ROVO BODOCONGO, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTIJO, MALVINAS, MONTE SANTO e UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA		Tomador/Prestador ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE		Fonte de Recursos outra (descrever)		Fonte de Recursos outra (descrever)	
Valor atual (R\$) 18.225.646,43		Valor total (R\$) 18.225.646,43		Local de entrega (bairro/município/UF) PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO		Valor total (R\$) 18.225.646,43		Valor total (R\$) 18.225.646,43		Valor total (R\$) 18.225.646,43	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS NO ORÇAMENTO	PRESTADOR ORÇAMENTO				ENCARGOS FÍSICO (ADMINISTRATIVOS)				ENCARGOS FINANCEIRO (R\$)					
		UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	Acumulado até o período anterior	Método no período	Acumulado no período	Acumulado até período anterior	Valor no período	Acumulado (Incluído o período)	ESVIO (%)			
1.0	RUA ÍNDIOS CARIBIS				273.489,56						186.678,82	186.678,82			
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.592,06						1.172,17	1.172,17			
1.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	4,826,25	0,33	1.592,06			3.552,04			1.172,17	1.172,17			26,40
1.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				271.205,52						185.506,65	185.506,65			
1.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	4.475,25	2,36	10.561,59			3.201,06			7.354,50	7.354,50			28,47
1.2.2	CBUQ														
1.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF. 03/2017. - Capa	m³	223,76	1.147,56	256.778,03			152,77			176.312,74	176.312,74			31,73
1.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	223,76	3,87	865,95			152,77			591,22	591,22			31,73
1.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	2.752,25	1,09	2.999,95			1.879,07			2.048,19	2.048,19			31,73
1.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				691,38										
1.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita	unidade	6,00	115,23	691,38										100,00
2.0	RUA IREMAR VILLARIM				87.917,71						74.077,91	74.077,91			
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				483,52						435,88	435,88			
2.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	1.465,20	0,33	483,52			1.320,86			435,88	435,88			9,85
2.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				82.318,96						73.642,03	73.642,03			
2.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	1.318,64	2,36	3.206,39			1.215,31			2.868,13	2.868,13			10,55
2.2.2	CBUQ														
2.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF. 03/2017. - Capa	m³	67,93	1.147,56	77.959,75			60,77			69.737,22	69.737,22			10,54
2.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	67,93	3,87	262,89			60,77			235,18	235,18			10,54
2.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	821,95	1,09	895,93			735,32			801,50	801,50			10,54
2.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				115,23										
2.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita	unidade	1,00	115,23	115,23										100,00
3.0	RUA FÉLIX ARAÚJO				168.987,61						153.123,44	153.123,44			
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				990,00						923,55	923,55			
3.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	3.000,00	0,33	990,00			2.798,63			923,55	923,55			6,71
3.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				167.306,23						152.199,89	152.199,89			
3.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	2.760,00	2,36	6.513,60			2.560,05			6.041,72	6.041,72			7,24
3.2.2	CBUQ														
3.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF. 03/2017. - Capa	m³	138,00	1.147,56	158.383,28			125,44			143.949,93	143.949,93			9,10
3.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	138,00	3,87	534,06			125,44			485,45	485,45			9,10

Adriano Gomes do Nascimento
Coordenador de Planejamento Obras
SECOB/PMCG

PREF. MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
Francisco dos Santos C. Xavier

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
Edu. José Neto de Oliveira


CAIXA Nº do CTEC (contrato/convênio/financiamento) 2.08.02/2020 Data de início - data 29/06/2020 Valor total inicial (R\$) 18.225.646,43	Nº do CTE 1.055.660-37 Transmissão de bens/Prêmios ou Tombador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Agente (financiante ou Ag. Operador Repasse) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Grau de Sigilo Data do CT 01/07/20
Empresa Contratada CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA Objeto do CTEC (resumo) RECAPAMENTO ASFÁLTICO NOS BARRIOS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTAÇÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCONGÓ, SANTA CRUZ, DINAMÉRICA, CATOLÉ, CENTEÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCONGÓ, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTIÃO, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA	IM - Data emissão 05/05/2021 IM - Período de referência da melhoria de 25/03/2021 a 29/04/2021 CWP 09.323.0987/0001-92	Nº do CTE 1.055.660-37 Transmissão de bens/Prêmios ou Tombador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Agente (financiante ou Ag. Operador Repasse) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Local da obra (bairro/rua/interseção/UF) PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO	Fonte de Recursos outros (descrever)	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ORÇAMENTAL	PREÇO DO ORÇAMENTO			EXECUÇÃO FÍSICA (QUANTITATIVOS)			RECURSOS FINANCEIROS (R\$)			SERVIÇOS (€)
		UNID.	QNTD.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ATÉ FIM DO ANTERIOR	MÉDIA DO PERÍODO	ACUMULADO INICIAL DO PERÍODO	MÉDIA DO PERÍODO	ACUMULADO INICIAL DO PERÍODO	
3.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.738,80	1,09	1.895,29	1.580,54	1.580,54	1.722,79	1.722,79	1.722,79	9,10
3.3	NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	unidade	6,00	115,23	691,38						100,00
3.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	6,00	115,23	691,38						100,00
4.0	RUA MIGUEL BARRETO				37.698,60					37.698,60	
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				206,18					206,18	
4.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	624,80	0,33	206,18	624,80	624,80	16,37	16,37	206,18	
4.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				37.377,19					37.156,77	
4.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	999,68	2,36	2.359,24	999,68	999,68	2,36	2,36	2.359,24	
4.2.2	CBUQ										
4.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m³	15,00	1.207,08	18.106,20	15,00	15,00	1,14	1,14	18.106,20	
4.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Reperflamento	m³	15,00	1.093,55	16.403,25	14,97	14,97	1,14	1,14	16.370,44	0,20
4.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	30,00	3,87	116,10	30,00	30,00	1,14	1,14	116,10	
4.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	360,00	1,09	392,40	188,72	188,72	1,14	1,14	206,79	47,30
4.3	NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	unidade	1,00	115,23	115,23						100,00
4.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	1,00	115,23	115,23						100,00
5.0	RUA TEODÓSIO DE OLIVEIRA LEO				43.369,83					43.139,37	
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				209,87					209,87	
5.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	817,80	0,33	269,87	817,80	817,80	0,33	0,33	269,87	
5.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				42.869,50					42.869,50	
5.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	708,76	2,36	1.672,67	708,76	708,76	2,36	2,36	1.672,67	
5.2.2	CBUQ										
5.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m³	35,44	1.147,56	40.669,53	35,44	35,44	1,14	1,14	40.669,53	
5.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	35,44	3,87	137,15	35,44	35,44	3,87	3,87	137,15	
5.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	357,94	1,09	390,15	357,94	357,94	1,09	1,09	390,15	
5.3	NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	unidade	2,00	115,23	230,46						100,00
5.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	2,00	115,23	230,46						100,00
6.0	RUA FREI CANECA				158.074,51					153.807,62	
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				984,95					984,24	
6.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	2.984,70	0,33	984,95	2.921,94	2.921,94	0,33	0,33	964,24	2,10
6.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				156.998,18					152.843,38	

CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA
 RUA ...
 ...
 ...

PREF. MUNIC. DE S. GRANDE
 FRANCISCO JOSÉ DE JESUS C. XAVIER
 ...


Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SCSRB/DM/CRG


		RE de CTE (Contrato Execução/Execução) 2.08/022/2020		RM - número 20		RM - Data emissão 05/05/2021		RM - Período de referência da medição de 25/03/2021 a 29/04/2021		RM do CT 1.065.660-37		Grav de Sigilo 01/07/20	
Início 29/06/2020		Período Fim da obra 26/07/2021		Empresa Contratada CONSTRITORA ROCHA CAVALCANTE LTDA				Tomador/Ag. Promotor ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE					
CTE - Valor total inicial (R\$) 18.225.646,43		CTE - R\$ atualizada 18.225.646,43		Objeto do CTE (sumário) RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS BARRIOS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTAÇÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCONGÓ, SANTA CRUZ, DIMAMÉICA, CATOLÉ, CENTEÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCONGÓ, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTIÃO, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA				Agente (financiamento ou Ag. Operador Repasse) CONTA ECONÔMICA FEDERAL					
CTE - Valor atual (R\$) 18.225.646,43		CTE - R\$ último Adit. 18.225.646,43		Local da obra (bairro/Município/UF) PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO				Fonte de Recursos outra (descrever)					

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBRAS	PREÇO NO EMPRÉTIMO			PREÇO TOTAL	ACUMULADO Até o período anterior	EXERCÍCIO PRECATORIO (R\$)		ACUMULADO ACUMULADO O PERÍODO	DESAFO (%)
		unidade	qtd.	preço unit.			ACUMULADO Até o período anterior	PRECATORIO		
6.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2c, inclusive aquisição e transporte	m²	2.586,74	2,36	6.104,71		2.528,05	5.966,20	5.966,20	2,27
6.2.2	CBUQ									
6.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF- 09/2017. - Capa	m²	129,34	1.147,56	148.425,41		126,40	145.051,58	145.051,58	2,27
6.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	129,34	3,87	500,55		126,40	489,17	489,17	2,27
6.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.254,60	1,09	1.367,51		1.226,08	1.336,43	1.336,43	2,27
6.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	6,00	115,23	691,38					100,00
6.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita				691,38					
7.0	RUA MAJOR LOVINO DO Ó				126.136,81			107.683,90	107.683,90	
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				747,85			747,85	747,85	
7.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	2.866,20	0,33	747,85		2.866,20	747,85	747,85	
7.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				124.928,04			106.590,36	106.590,36	
7.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	2.064,76	2,36	4.872,83		2.035,55	4.803,90	4.803,90	1,41
7.2.2	CBUQ									
7.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF- 03/2017. - Capa	m²	103,24	1.147,56	118.474,09		87,53	100.445,93	100.445,93	15,22
7.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	103,24	3,87	399,54		87,53	338,74	338,74	15,22
7.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.084,02	1,09	1.181,58		919,07	1.001,79	1.001,79	15,22
7.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	4,00	115,23	460,92		3,00	345,69	345,69	25,00
7.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita				460,92			345,69	345,69	
8.0	RUA VIGOLVINO WANDERLEY				258.870,62			252.777,42	252.777,42	
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.511,40			1.511,40	1.511,40	
8.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	4.580,00	0,33	1.511,40		4.580,00	1.511,40	1.511,40	
8.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				256.667,84			251.266,02	251.266,02	
8.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	4.237,60	2,36	10.000,74		4.237,60	10.000,74	10.000,74	
8.2.2	CBUQ									
8.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF- 09/2017. - Capa	m²	211,88	1.147,56	243.145,01		207,24	237.820,33	237.820,33	2,19
8.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	211,88	3,87	819,98		207,24	802,02	802,02	2,19
8.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	2.479,00	1,09	2.702,11		2.424,71	2.642,93	2.642,93	2,19
8.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	6,00	115,23	691,38					100,00
8.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita				691,38					
9.0	RUA ALEXANDRINO CAVALCANTI				19.772,94			19.657,11	19.657,11	


Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SECOB/PMCG


PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
Francisco dos Jesus C. Xavier


Consistore Rocha Cavalcante Ltda.
 Rua João Vitor de Alencar

		Nº do CTEI (Contato Executivo/Financiamento) 2.08.022/2020		Nº do CTEI 1.065.660-37		Grau de Sigilo Livre de CT	
Início da obra - data 29/06/2020		Prazo Final da obra 26/07/2021		Nº do CTEI 1.065.660-37		Data do CT 01/07/20	
Valor atual (R\$) 18.225.646,43		CTEI - II - assinatura		Tomador/Ag. Promotor ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE		Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Valor atual (R\$) 18.225.646,43		CTEI - Di último Adm.		Fonte de Recursos outra (descrever)		Fonte de Recursos outra (descrever)	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS NO ORÇAMENTO	PREVISTO NO ORÇAMENTO			EXCULSIDO FÍSICO (PAVIMENTAÇÃO)			RECORRIDO FINANCEIRO (R\$)			DESCRIÇÃO
		unidade	qtde.	PREÇO UNIT.	REALIZADO ATÉ O MESMO ANTES	MUNICÍPIO NO FISCALDO	REALIZADO EM FISCALDO ANTERIOR	MUNICÍPIO NO FISCALDO	ACUMULADO RECORRIDO A FISCALDO		
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
9.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m³	384,75	0,33	384,75	384,75	126,97	384,75	126,97	126,97	126,97
9.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO										
9.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	323,19	2,36	323,19	323,19	19.530,14	323,19	19.530,14	19.530,14	762,73
9.2.2	CBUQ										
9.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF. 03/2017. - Capa	m³	16,16	1.147,56	16,16	16,16	18.544,57	16,16	18.544,57	18.544,57	18.544,57
9.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	16,16	3,87	16,16	16,16	62,54	16,16	62,54	62,54	62,54
9.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	147,06	1,09	147,06	147,06	160,30	147,06	160,30	160,30	160,30
9.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA										
9.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	1,00	115,23	1,00	115,23	115,23	1,00	115,23	115,23	115,23
10.0	RUA JOÃO ALVES DE OLIVEIRA										
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
10.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	3.856,00	0,33	3.856,00	3.856,00	1.272,48	3.856,00	1.272,48	1.272,48	1.272,48
10.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO										
10.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	3.547,52	2,36	3.547,52	3.547,52	213.739,58	3.547,52	213.739,58	213.739,58	8.372,15
10.2.2	CBUQ										
10.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF. 03/2017. - Capa	m³	177,38	1.147,56	177,38	177,38	205.554,19	177,38	205.554,19	205.554,19	205.554,19
10.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	177,38	3,87	177,38	177,38	686,46	177,38	686,46	686,46	686,46
10.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	2.004,39	1,09	2.004,39	2.004,39	2.184,79	2.004,39	2.184,79	2.184,79	2.184,79
10.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA										
10.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	7,00	115,23	7,00	7,00	806,61	7,00	806,61	806,61	806,61
11.0	RUA CRISTIANO LAURITZEN										
11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
11.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	1.280,00	0,33	1.280,00	1.280,00	422,40	1.280,00	422,40	422,40	422,40
11.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO										
11.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	1.152,00	2,36	1.152,00	1.152,00	69.681,49	1.152,00	69.681,49	69.681,49	69.681,49
11.2.2	CBUQ										
11.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF. 03/2017. - Capa	m³	57,60	1.147,56	57,60	57,60	66.099,46	57,60	66.099,46	66.099,46	66.099,46
11.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	57,60	3,87	57,60	57,60	222,91	57,60	222,91	222,91	222,91
11.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	587,52	1,09	587,52	587,52	640,40	587,52	640,40	640,40	640,40

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
 FRANCISCO DE JESUS C. XAVIER
 Eng.º Civil - CREA-PR Nº 1401 08231-1

CONSTRUTORA RECHA CAVALCANTE LTDA.
 Eng.º Sérgio Nogueira de Oliveira

Adriaño Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento-Obras
 SECOP/PMCC

CAIXA Nº do CEE (Contrato/Execução/Cancelamento) 2.08.02/2020 Início da obra - data 29/06/2020 Previsão término da obra 26/07/2021 CTE - Valor total licitação (R\$) 18.225.646,43 18.225.646,43		Nº do CTE (Contrato/Execução/Cancelamento) 1.065.460-37 Nº de CT 01/07/20 Tomador/Ag.Prestador ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Agente Financiador ou Ag. Operador Pagador	
BM - Data emissão 05/05/2021 BM - Período de referência da emissão de 25/05/2021 a 29/04/2021 CNPJ 09.321.098/0001-92		Grau do Sigilo Data do CT	
Empresa Contratada CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA Objeto do CTE (resumido)		Nº de CT Tomador/Ag.Prestador ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Agente Financiador ou Ag. Operador Pagador	
Local da obra (bairro/Município/UF) PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO		Fonte de Recursos CAIXA ECONÔMICA FEDERAL outra (descrever)	

ITEM	DESCRIÇÃO	PREVISTO NO ORÇAMENTO			EXECUÇÃO FÍSICA (QUANTITATIVOS)			EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$)			DESMO (R\$)
		UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.	ANULADO NO PRELIMINAR	MINIMO NO PRELIMINAR	REALIZADO O PRELIMINAR	ANULADO NO PRELIMINAR	MINIMO NO PRELIMINAR	REALIZADO O PRELIMINAR	
11.3	PERMANÊNCIAS DOS SERVIÇOS DE EMPILHAMENTO										
11.3.1	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA										
	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita	unidade	4,00	115,23	460,92	460,92					100,00
12.0	RUA PEREGRINO DE CARVALHO				213.691,01					213.691,01	
12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.266,56					1.266,56	
12.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e gride	m²	3.838,05	0,33	1.266,56	3.839,19	3.829,19			1.263,63	0,23
12.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				211.607,84					211.607,84	
12.2.1	Pinura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	3.496,89	2,36	8.232,46	3.487,95	3.487,95			8.231,56	0,26
12.2.2	CBUQ										
12.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF - 03/2017 - Capa	m³	174,84	1.147,56	200.639,39	174,40	174,40			200.134,46	0,25
12.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	174,84	3,87	676,63	174,40	174,40			674,93	0,25
12.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.870,79	1,09	2.039,16	1.866,08	1.866,08			2.034,03	0,25
12.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				806,61					806,61	
12.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita	unidade	7,00	115,23	806,61					806,61	100,00
13.0	RUA BENTO VIANA				46.431,55					46.431,55	
13.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				273,08					273,08	
13.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e gride	m²	827,50	0,33	273,08	827,50	827,50			273,08	
13.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				46.043,24					46.043,24	
13.2.1	Pinura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	761,30	2,36	1.796,67	761,30	761,30			1.796,67	
13.2.2	CBUQ										
13.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF - 03/2017 - Capa	m³	38,06	1.147,56	43.676,13	33,22	33,22			38.121,94	12,72
13.2.2	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	38,06	3,87	147,29	33,22	33,22			128,56	12,72
13.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	368,21	1,09	423,15	338,84	338,84			369,34	12,72
13.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				115,23					115,23	
13.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita	unidade	1,00	115,23	115,23					115,23	100,00
14.0	RUA DEL. JOÃO LOURENÇO PORTO				168.546,24					168.546,24	
15.0	RUA PEDRO AMÉRICO				37.240,04					37.240,04	
15.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				227,30					227,30	
15.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e gride	m²	688,00	0,33	227,30	688,00	688,00			227,30	
15.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				36.897,51					36.897,51	
15.2.1	Pinura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	610,08	2,36	1.439,79	610,08	610,08			1.439,79	
15.2.2	CBUQ										

Eng. Adriano Gomes do Nascimento
 CREA 186185/RS-1000
 Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
 Francisco dos Jesus C. Xavier

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SECOP/PMCC


CAIXA Nº do CTE (Contrato de Execução/funcionamento) 2.08.022/2020 Início de obra - data 29/06/2020 CTEF- de assinatura 26/07/2021 Valor total inicial (R\$) 18.225.646,43 CTEF- Valor atual (R\$) 18.225.646,43	RH - número 10 Empresa Contratada CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA Objeto do CTE (resumido)	RM - período de referência da medição (CM) de 25/03/2021 a 29/04/2021 (09.323.098/0001-92)	RP do CT 3.065.660-37 Tomador/Ag. Promotor ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Agente financeiro ou Ag. Operador Repasse CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Grau de Sigilo Livre do CT 01/07/20
Recuperação asfáltico nos bairros Centro, Bela Vista, Alto Branco, Conceição, Estação Velha, Palmeira, Prata, Bodocongó, Santa Cruz, Dinâmica, Catolé, Centenário, Cruzeiro, Jardim Tavares, Jeremias, José Pinheiro, Mirante, Novo Bodocongó, Santo Antônio, São José, Serriotão, Malvinas, Monte Santo e Universitário, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba.		Fonte de Recursos outra (descrever)		

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PREÇO DO ORÇAMENTO			DESEMPENHO QUANTITATIVO			DESEMPENHO FINANCEIRO			DESEMPENHO (%)
		unidade	QTD.	PREÇO UNIT.	ACUMULADO até período anterior	MESES DO PERÍODO	ACUMULADO até período anterior	MÉDIA DO PERÍODO	ACUMULADO até período anterior	DESEMPENHO (%)	
15.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	30,50	1.147,56	35.000,58	25,63	29.411,96	29.411,96	15,97		
15.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	30,50	3,87	118,04	25,63	99,19	99,19	15,97		
15.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	311,10	1,09	339,10	261,43	284,96	284,96	15,97		
15.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	1,00	115,23	115,23				100,00		
16.0	RUA DEP. ÁVARO GAUDINCO										
16.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	3.772,80	0,33	1.245,02	3.654,67	178.928,47	178.928,47			
16.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	3.772,80	0,33	1.245,02	3.654,67	1.206,04	1.206,04	3,13		
16.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	3.395,52	2,36	205.353,82	3.288,10	177.146,28	177.146,28	3,16		
16.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2c, inclusive aquisição e transporte	m²	3.395,52	2,36	8.013,43		7.759,92	7.759,92			
16.2.2	CBUQ										
16.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	169,78	1.147,56	194.032,74	145,73	167.233,92	167.233,92	14,17		
16.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	169,78	3,87	657,05	145,73	563,98	563,98	14,16		
16.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.697,80	1,09	1.850,60	1.457,30	1.588,46	1.588,46	14,17		
16.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	5,00	115,23	576,15	5,00	576,15	576,15			
16.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita										
17.0	RUA VILA NOVA DA RAINHA										
17.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	6.105,72	0,33	371.896,94	5.867,35	276.787,48	276.787,48			
17.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	6.105,72	0,33	2.014,89	5.867,35	1.936,23	1.936,23	3,90		
17.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	6.105,72	2,36	369.190,67	5.485,62	274.851,25	274.851,25	10,16		
17.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2c, inclusive aquisição e transporte	m²	6.105,72	2,36	14.409,50		12.946,06	12.946,06			
17.2.2	CBUQ										
17.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	305,29	1.147,56	350.338,59	225,37	258.625,60	258.625,60	26,18		
17.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	305,29	3,87	1.181,47	225,37	872,18	872,18	26,18		
17.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	2.991,84	1,09	3.261,11	2.208,63	2.407,41	2.407,41	26,18		
17.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	6,00	115,23	691,38				100,00		
17.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita										
18.0	RUA PADRE IBIAPINA										

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
 Engenheiro de Obras

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
 Francisco de Jesus C. Xavier


Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obra
 SECOP/DIMC


		R\$ do CHTF (Contrato Execução/Planejamento) 2.08.022/2020		Grau de Sigilo Data do CT	
Início da obra - data 29/06/2020		Prazo estimado da obra 26/07/2021		Nº do CT 1.085.660-37	
Valor total inicial (R\$) 18.225.646,43		CTEF - de abertura CTEF - de último Adit.		Tomador/Ag. Promotor ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	
Valor atual (R\$) 18.225.646,43		CTEF - de último Adit.		Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Descrição dos serviços do orçamento PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO		Local da obra (bairro/Município/UF)		Fonte de Recursos outra (descrever)	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PREÇO NO ORÇAMENTO			PREÇO TOTAL	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	ACUMULADO INCLUSIVE O PERÍODO	RATIO (%)
		UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.					
19.0	RUA ELIAS ASFORA				191.896,38				
19.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				924,41			185.338,57	
19.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	2.801,25	0,33	924,41			893,19	
19.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				190.451,05			893,19	3,38
19.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	5.104,50	2,36	12.046,62			185.984,46	
19.2.2	CBUQ							11.637,92	3,39
19.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m²	76,57	1.207,08	92.426,12			89.287,71	3,40
19.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Repertimento	m²	76,57	1.093,55	83.733,12			80.889,89	3,40
19.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	153,14	3,87	592,65			572,53	3,39
19.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.516,09	1,09	1.652,54			1.596,41	3,40
19.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				460,92			460,92	
19.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	4,00	115,23	460,92			460,92	
20.0	RUA BARÃO DO ABIAÍ				234.608,87			209.470,58	
20.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.365,80			1.293,83	
20.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	4.136,80	0,33	1.365,80			1.293,83	5,27
20.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				232.666,92			208.176,75	
20.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	3.844,88	2,36	9.073,92			8.496,94	6,36
20.2.2	CBUQ								
20.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m²	192,24	1.147,56	220.606,93			197.013,10	10,69
20.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	192,24	3,87	743,97			664,40	10,70
20.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	2.056,97	1,09	2.242,10			2.002,31	10,69
20.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				576,15				
20.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	5,00	115,23	576,15				100,00
21.0	RUA JOSÉ BONIFÁCIO				71.355,08			68.147,04	
21.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				441,56			441,56	
21.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	1.338,05	0,33	441,56			441,56	
21.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				71.689,08			67.475,02	
21.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	1.185,13	2,36	2.796,91			2.796,91	
21.2.2	CBUQ								
21.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m²	59,26	1.147,56	68.004,41			63.850,24	6,11


 Eng. João Neto de Oliveira


 PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
 FRANCISCO DE JESUS C. XAVIER
 Eng. Civil - CREA Nº 10.121/2017


 Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 CREA Nº 10.121/2017

		W do CTE (Contrato Execução/consórcio)		BM - número		BM - Data emissão		BM - Período de referência da medição		Nº do CT		Grau de Sigilo	
2.08.022/2020		29/06/2020		20		05/05/2021		de 25/03/2021 a 29/04/2021		1.065.660-37		Data do CT	
Início		Término		Empresa Contratada		05/05/2021		26/07/2021		Tomador/Ag.Prestador ou Tomador		01/07/20	
29/06/2020		26/07/2021		CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA		05/05/2021		26/07/2021		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE		01/07/20	
Valor total inicial (R\$)		CTE - Di. exatidão		CTE - Di. exatidão		CTE - Di. último Adit.		CTE - Di. último Adit.		Agente financeiro ou Ag. Operador Repasse		09.323.098/0001-92	
18.225.646,43		18.225.646,43		18.225.646,43		18.225.646,43		18.225.646,43		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		09.323.098/0001-92	
Valor atual (R\$)		CTE - Di. último Adit.		CTE - Di. último Adit.		CTE - Di. último Adit.		CTE - Di. último Adit.		Fonte de Recursos		outra (descreva)	
18.225.646,43		18.225.646,43		18.225.646,43		18.225.646,43		18.225.646,43		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		outra (descreva)	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU INSTALAÇÃO	PREÇO NO EMPACOTAMENTO			EXCUTIDO PELA CONTRATADA			EXCUTIDO PELA PRECATORIA			EXCUTIDO PELA PRECATORIA		DEBITO (%)
		UNID.	QTD.	PREÇO UNID.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO AT. CREDENCIADA	ACUMULADO AT. PRECATORIA	ACUMULADO AT. PRECATORIA	ACUMULADO AT. PRECATORIA	ACUMULADO AT. PRECATORIA	ACUMULADO AT. PRECATORIA	ACUMULADO AT. PRECATORIA	
21.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	59,26	3,87	229,34	55,64	229,34	55,64	215,33	215,33	215,33	6,11	
21.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	598,53	1,09	652,40	561,96	652,40	561,96	612,54	612,54	612,54	6,11	
21.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	2,00	115,23	230,46	2,00	230,46	2,00	230,46	230,46	230,46		
21.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	2,00	115,23	230,46	2,00	230,46	2,00	230,46	230,46	230,46		
22.0	RUA JOÃO TAVARES				241.187,71		241.187,71		147.870,73	147.870,73	147.870,73		
22.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.412,00		1.412,00		1.096,60	1.096,60	1.096,60		
22.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	4.278,78	0,33	1.412,00	3.323,04	1.412,00	3.323,04	1.096,60	1.096,60	1.096,60	22,34	
22.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				238.853,87		238.853,87		146.197,98	146.197,98	146.197,98		
22.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C. Inclusive aquisição e transporte	m²	3.947,34	2,36	9.315,72	2.990,92	9.315,72	2.990,92	7.058,57	7.058,57	7.058,57	24,23	
22.2.2	CBUQ												
22.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m²	197,37	1.147,56	226.993,92	119,64	226.993,92	119,64	137.294,08	137.294,08	137.294,08	39,38	
22.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	197,37	3,87	763,82	119,64	763,82	119,64	463,01	463,01	463,01	39,38	
22.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	2.092,12	1,09	2.280,41	1.268,18	2.280,41	1.268,18	1.382,32	1.382,32	1.382,32	39,38	
22.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	8,00	115,23	921,84	5,00	921,84	5,00	576,15	576,15	576,15	37,50	
22.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	8,00	115,23	921,84	5,00	921,84	5,00	576,15	576,15	576,15	37,50	
23.0	RUA CORONEL JOSÉ ANDRÉ				150.822,84		150.822,84		146.771,63	146.771,63	146.771,63		
23.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				704,22		704,22		704,22	704,22	704,22		
23.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	2.134,00	0,33	704,22	2.134,00	704,22	2.134,00	704,22	704,22	704,22		
23.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				148.772,93		148.772,93		146.067,41	146.067,41	146.067,41		
23.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C. Inclusive aquisição e transporte	m²	4.012,96	2,36	9.470,59	4.012,96	9.470,59	4.012,96	9.470,59	9.470,59	9.470,59		
23.2.2	CBUQ												
23.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m²	60,20	1.207,08	72.666,22	58,61	72.666,22	58,61	70.746,96	70.746,96	70.746,96	2,64	
23.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Reperfilamento	m²	60,20	1.093,55	65.831,71	58,61	65.831,71	58,61	64.092,97	64.092,97	64.092,97	2,64	
23.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	120,39	3,87	465,91	117,22	465,91	117,22	453,64	453,64	453,64	2,63	
23.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.227,98	1,09	1.338,50	1.195,64	1.338,50	1.195,64	1.303,25	1.303,25	1.303,25	2,63	
23.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	3,00	115,23	345,69	3,00	345,69	3,00	345,69	345,69	345,69		
23.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	3,00	115,23	345,69	3,00	345,69	3,00	345,69	345,69	345,69		
24.0	RUA MANOEL PEREIRA DE ARAÚJO				175.904,31		175.904,31		53.716,93	53.716,93	53.716,93		
24.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.043,66		1.043,66		323,57	323,57	323,57		

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SEC0B/PMCC

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
 Francisco de Jesus C. Xavier
 Engº Civil - CREA-PB Nº 160.283534-2

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
 Eng. João Neto de Oliveira
 CREA 1608055208 R-04

CAIXA Nº do CTE (Constituinte/funcionário) 2.08.022/2020 Início da obra - data 29/06/2020 CTEF - Valor total licitada (R\$) 18.225.646,43		IM - número 10 Empresa contratada CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA Objeto do CTE (resumo)		IM - Data emissão 05/05/2021 IM - Período de referência de medição de 25/05/2021 a 29/04/2021 CNPJ 09.324.098/0001-92		Nº de CT 1.065.660-37 Transmissão/Ag. Promotor ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Agente Financiador ou Ag. Operador Resposta CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Grau de Sigilo Data do CT 01/07/20	
CTEF - Valor atual (R\$) 18.225.646,43		Proibição Termino de obra 26/07/2021 CTEF - de assinatura		RECAPAMENTO ASFÁLTICO NOS BARRIOS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTAÇÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCONGÓ, SANTA CRUZ, DINAMÉRICA, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCONGÓ, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTIÃO, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA		Fonte de Recursos outra (descrever)			
CTEF - De último Adit.		Local de obra (Bairro/Município/UF)		PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO					

ITEM	EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PREÇO DO SERVIÇO			EXECUÇÃO FÍSICA (QUANTITATIVOS)			EXECUÇÃO FÍSICA (VALORES)		VALOR DO FÓRULO	VALOR DO FÓRULO	VALOR DO FÓRULO
		Unid.	qtd.	PREÇO UNIT.	ACUMULADO até o período anterior	ACUMULADO até o período atual	VALOR DO FÓRULO	VALOR DO FÓRULO	ACUMULADO até o período anterior			
24.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	3.162,60	0,33	1.043,66	980,50	980,50	323,57	323,57	69,00	323,57	69,00
24.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				174.284,50			53.393,36	53.393,36	69,36	53.393,36	69,36
24.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	2.881,48	2,36	6.800,29	882,76	882,76	2.083,31	2.083,31	69,36	2.083,31	69,36
24.2.2	CBUQ											
24.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF. 03/2017. - Capa	m³	144,08	1.147,56	165.340,44	44,14	44,14	50.659,30	50.659,30	69,36	50.659,30	69,36
24.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³ x km	144,08	3,87	557,59	44,14	44,14	170,82	170,82	69,36	170,82	69,36
24.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.455,21	1,09	1.586,18	445,81	445,81	485,93	485,93	69,36	485,93	69,36
24.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				576,15					100,00		100,00
24.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	5,00	115,23	576,15							
25.0	RUA CAPITÃO JOÃO DE SÁ				256.656,37			206.133,06	206.133,06	7,45	206.133,06	7,45
25.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.511,24			1.396,63	1.396,63		1.396,63	
25.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	4.579,50	0,33	1.511,24	4.238,27	4.238,27	1.396,63	1.396,63	7,45	1.396,63	7,45
25.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				254.799,44			204.503,97	204.503,97		204.503,97	
25.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	4.213,14	2,36	9.943,01	3.887,46	3.887,46	9.174,41	9.174,41	7,73	9.174,41	7,73
25.2.2	CBUQ											
25.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF. 03/2017. - Capa	m³	210,66	1.147,56	241.744,09	168,05	168,05	192.847,46	192.847,46	20,23	192.847,46	20,23
25.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	210,66	3,87	815,25	168,05	168,05	650,35	650,35	20,23	650,35	20,23
25.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	2.106,60	1,09	2.296,19	1.680,50	1.680,50	1.831,75	1.831,75	20,23	1.831,75	20,23
25.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				345,69			230,46	230,46		230,46	
25.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	3,00	115,23	345,69	2,00	2,00	230,46	230,46	33,33	230,46	33,33
26.0	RUA CRISTÓVÃO COLOMBO				96.110,74			91.626,41	91.626,41	4,55	91.626,41	4,55
26.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				558,06			532,95	532,95		532,95	
26.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	1.691,10	0,33	558,06	1.614,99	1.614,99	532,95	532,95	4,50	532,95	4,50
26.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				95.437,05			91.093,46	91.093,46		91.093,46	
26.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	1.581,74	2,36	3.732,91	1.509,79	1.509,79	3.563,10	3.563,10	4,55	3.563,10	4,55
26.2.2	CBUQ											
26.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF. 03/2017. - Capa	m³	79,09	1.147,56	90.760,32	75,49	75,49	86.629,30	86.629,30	4,55	86.629,30	4,55
26.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	79,09	3,87	306,08	75,49	75,49	292,15	292,15	4,55	292,15	4,55
26.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	865,27	1,09	637,94	598,63	598,63	608,91	608,91	4,55	608,91	4,55

Adiriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SCCR/PMMCG

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
 Francisco de Jesus C. Xavier

Consórcio Rocha Cavalcante Ltda.
 Eng. Responsável: Oliveira

CAIXA Nº do CEF (Conta Especial/Financiamento) 2.08.02/2020		Nº do CEF 1.085.660-37		Grau de Sigilo Data do CT 01/07/20	
Início de obra - data 29/06/2020		Empresa Contratada CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA Objeto do CEF (resumo)		Nº do CEF Promotor ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Agente Financiador ou Ad. Operador Repasse CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Valor total inicial (R\$) 18.225.616,43		IM - Data emissão 05/05/2021		IM - Instituto de referência da medição de 25/03/2021 a 29/04/2021	
Valor atual (R\$) 18.225.616,43		CEF - Dt último Adit. CEF - Dt último Adit.		Fonte de Recursos outros (descrever)	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU EMPENHO	PREÇO NO EMPENHO			EXCLUSÃO (R\$) QUANTITATIVOS			EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$)			DESEJO (%)
		UNID.	QTD.	PREÇO UNIF.	ADICIONADO À COTAÇÃO ANTERIOR	MENOS DO PERÍODO	REAJUSTADO INCLUINDO O PERÍODO	ACRÉSCIMO DE PREÇO ADICIONADO	MENOS DO PERÍODO	ADICIONADO INCLUINDO O PERÍODO	
26.3	NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	unidade	1,00	115,23							100,00
26.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita										
27.0	RUA DR. CARLOS AGRA										
27.1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
27.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	3.639,90	0,33	205.820,16						
27.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO										
27.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	3.375,18	2,36	1.203,17						
27.2.2	CBUQ				203.697,15						
27.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusivo transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	166,76	1,147,56	1.201,17						
27.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	166,76	3,87	2.806,83						
27.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.299,45	1,09	1.403,35						
27.3	NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA										
27.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	8,00	115,23	653,10						
28.0	RUA PEDRO ALVARES CABRAL										
28.1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
28.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	1.100,00	0,33	1.416,40						
28.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO										
28.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	1.104,00	2,36	921,84						
28.2.2	CBUQ				921,84						
28.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusivo transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	55,20	1,147,56	1.080,69						
28.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	55,20	3,87	1.200,00						
28.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	425,04	1,09	396,00						
28.3	NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA										
28.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	1,00	115,23	66.627,66						
29.0	RUA ULISSES GOMES										
29.1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
29.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	1.064,80	0,33	2.805,44						
29.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO										
29.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	958,32	2,36	1.104,00						
29.2.2	CBUQ				1.104,00						

Eng. João Neto de Oliveira
 SOA - 100000000-0
 Eng. Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SFCOR/PMCG
 PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
 Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng.ª Cív. - CREA-PB Nº 160.283534-2


CAIXA Nº do CTE (Comissão de Execução/Orçamento) 2.00.02/2020		Início de obra - data 29/06/2020		Prazo final da obra 26/07/2021		Grau do Sigilo Data do CT 01/07/20	
CTE - Valor total inicial (R\$) 18.225.646,43		CTE - de outros (R\$) 18.225.646,43		CTE - de outros Adit. 18.225.646,43		Nº do CT 1.065.660-37	
Empresa Contratada CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA Objeto do CTE (resumo)		BM - Data emissão 05/05/2021		BM - Período de referência da medição de 25/03/2021 a 29/04/2021		Tomador/Obj. Promotor ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	
local de obra (bairro/município)		RECAPAMENTO ASFÁLTICO NOS BARRIOS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, COICEÇÃO, ESTACÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCONGÓ, SANTA CRUZ, DINAMÉRICA, CATOLÉ, CENTEÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCONGÓ, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTAÓ, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA		CNPJ 09.323.099/0001-92		Agente Habilitado na Obra Operador Responsável CNIA ECONÔMICA FEDERAL	
Valor atual (R\$) 18.225.646,43		Valor atual (R\$) 18.225.646,43		Valor atual (R\$) 18.225.646,43		Fonte de Recursos outra (descrever)	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E ENQUANTO	RESULTADO DO ENCAMBIO			PREÇO TOTAL	EXECUÇÃO FISCAL (CUMENTATIVOS)		ACUMULADO DE PREÇOS ANTERIORES	ACUMULADO DE PREÇOS ANTERIORES	PREÇO NO PRELIMINAR	ACUMULADO DE PREÇOS ANTERIORES	PREÇO (%)
		UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.		ACUMULADO EM PREÇOS ANTERIORES	MÉDIA NO PRELIMINAR					
29.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	47,92	1.147,56	54.991,08	42,33	42,33	48.576,21	48.576,21	48.576,21	11,67	
29.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	47,92	3,87	185,45	42,33	42,33	163,82	163,82	163,82	11,66	
29.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	340,23	1,09	370,85	300,54	300,54	327,59	327,59	327,59	11,67	
29.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	1,00	115,23	115,23	1,00	1,00	115,23	115,23	115,23	11,67	
29.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	1,00	115,23	115,23	1,00	1,00	115,23	115,23	115,23	11,67	
30.0	RUA DESEMBARGADOR TRINDADE				140.663,02							
30.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				671,22							
30.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	2.094,00	0,33	671,22	1.787,45	1.787,45	589,86	589,86	589,86	12,12	
30.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				139.415,65							
30.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2c, inclusive aquisição e transporte	m²	3.742,56	2,36	8.832,44	3.256,52	3.256,52	7.685,39	7.685,39	7.685,39	12,99	
30.2.2	CBUQ				67.765,47							
30.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ,	m³	56,14	1.207,08	67.765,47	48,85	48,85	58.965,86	58.965,86	58.965,86	12,99	
30.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reporfilamento	m³	56,14	1.093,55	61.391,90	48,85	48,85	53.419,92	53.419,92	53.419,92	12,99	
30.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de	m³	112,28	3,87	434,52	97,70	97,70	378,10	378,10	378,10	12,98	
30.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	909,47	1,09	991,32	791,38	791,38	862,60	862,60	862,60	12,98	
30.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				576,15							
30.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	5,00	115,23	576,15	576,15	576,15				100,00	
31.0	RUA EPIFÂNIO PESSOA				224.095,66							
31.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.284,82							
31.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	3.893,40	0,33	1.284,82	3.893,40	3.893,40	1.284,82	1.284,82	1.284,82	11,66	
31.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				221.889,00							
31.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2c, inclusive aquisição e transporte	m²	3.670,92	2,36	8.663,37	3.670,92	3.670,92	221.889,00	221.889,00	221.889,00	100,00	
31.2.2	CBUQ				210.634,64							
31.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	183,55	1.147,56	210.634,64	183,55	183,55	210.634,64	210.634,64	210.634,64	100,00	
31.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	183,55	3,87	710,34	183,55	183,55	710,34	710,34	710,34	11,66	
31.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.725,37	1,09	1.880,65	1.725,37	1.725,37	1.880,65	1.880,65	1.880,65	11,66	
31.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				921,84							
31.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	8,00	115,23	921,84	921,84	921,84				100,00	
32.0	RUA AFONSO CAMPOS				224.869,26							
32.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.335,02							
					200.069,57			200.069,57	200.069,57	200.069,57	100,00	
					1.320,25			1.320,25	1.320,25	1.320,25	100,00	

Eng. Junio Nogueira Oliveira
 CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
 Francisco de Jesus C. Xavier

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SFCR/P/MRCC

		Nº do CTEF (contrato de prestação de serviços)		Nº do CTEF		Grau de Sigilo	
2.08.027/2020		29/06/2020		1.065.660-37		Data do CT	
Início da obra - data		25/07/2021		Função/Ass. Promotor ou Tomador		01/07/20	
Valor total licitat (R\$)		CTEF - dt assinatura		09.323.098/0001-92		Prefeitura Municipal de Campina Grande	
18.225.646,43		CTEF - Dt último Adm.		Agente Financeiro ou Ag. Operador Financeiro		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Valor anual (R\$)		CTEF - Dt último Adm.		Fonte de Recursos		outra (descrever)	
18.225.646,43		CTEF - Dt último Adm.		Fonte de Recursos		outra (descrever)	

ITEM	SITUAÇÃO/DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS NO EMPÍTERO	INDICADOR DE OPORTUNIDADE			DESCRITORES TÉCNICOS (QUANTITATIVOS)			DESCRITORES FINANCEIROS			DÍVIDA (R\$)
		unidade	qtd.	preço unit.	Acumulado até o mês anterior	Mês do mês anterior	Acumulado até o mês anterior	Mês do mês anterior	Acumulado até o mês anterior		
32.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e gride	m²	4.045,50	0,33	4.002,26	4.002,26	1.320,75	1.320,75	1.320,75	1,07	
32.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO										
32.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	3.685,90	2,36	3.646,20	3.646,20	198.747,82	198.747,82	198.747,82	1,08	
32.2.2	CBUQ										
32.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	184,29	1.147,56	164,08	164,08	188.291,64	188.291,64	188.291,64	10,97	
32.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	184,29	3,87	164,08	164,08	634,99	634,99	634,99	10,97	
32.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.253,17	1,09	1.115,74	1.115,74	1.216,16	1.216,16	1.216,16	10,97	
32.3	NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA										
32.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	11,00	115,23	1.267,53	1.267,53	11.491,26	11.491,26	11.491,26	100,00	
33.0	RUA BENEDITO MOTTA										
33.1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
33.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e gride	m²	2.729,92	0,33	2.434,59	2.434,59	803,41	803,41	803,41	10,82	
33.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	5.057,86	2,36	4.869,18	4.869,18	181.042,48	181.042,48	181.042,48	3,73	
33.2.2	CBUQ										
33.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	75,87	1.207,08	73,04	73,04	88.165,12	88.165,12	88.165,12	3,73	
33.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperflamento	m³	75,87	1.093,55	72,23	72,23	78.987,12	78.987,12	78.987,12	4,80	
33.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	151,74	3,87	145,27	145,27	562,19	562,19	562,19	4,26	
33.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.760,18	1,09	1.685,13	1.685,13	1.836,79	1.836,79	1.836,79	4,26	
33.3	NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA										
33.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	2,00	115,23	230,46	230,46	230,46	230,46	230,46		
34.0	RUA PEDRO II										
34.1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
34.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e gride	m²	6.260,85	0,33	2.066,08	2.066,08	2.066,08	2.066,08	2.066,08		
34.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO										
34.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	5.704,23	2,36	5.704,23	5.704,23	345.510,25	345.510,25	345.510,25		
34.2.2	CBUQ										
34.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	285,22	1.147,56	285,22	285,22	327.307,06	327.307,06	327.307,06		
34.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	285,22	3,87	285,22	285,22	1.103,80	1.103,80	1.103,80		

Adriaño Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento-Obras
 CECAD/INMPC

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
 FRANCISCO DE JESUS C. XAVIER
 FUND. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

CONSTRUTORA ROSA CAVALCANTE Ltda.
 Eng. João Nogueira Oliveira

CAIXA
 Nº do CTE (Comando Especial de Execução) 2.08.02/2020
 Início de obra - data 29/06/2020
 Previsão Término da obra 26/07/2021
 CTE - Valor total inicial (R\$) 18.225.646,43
 CTE - Valor atual (R\$) 18.225.646,43
 CTE - De último Adit.

RM - número 30
 Empresa Contratada CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA
 Objeto do CTE (resumo) RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIRROS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTATION VELHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCONGO, SANTA CRUZ, DINAMÉRICA, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCONGO, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTAO, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA

RM - Data emissão 05/05/2021
 RM - Índice de referência da medição de 25/03/2021 a 29/04/2021
 CNPJ 09.323.098/0001-92

Nº do CT 1.065.660-37
 Tomador/Ag.Prestador ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 Agente Ilustração ou Ag. Operante Ilustração CANA ECONÔMICA FEDERAL

Fonte de Recursos contra (descrever)

Gran do Sigilo Data do CT 01/07/20

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PREÇO NO ORÇAMENTO					ENCARGOS (RISCO PAVIMENTATIVO)					ENCARGOS FINANCEIRO (R\$)		DESCRIÇÃO	
		UNID.	QTDDES.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO até o período anterior	PREÇO NO PERÍODO	ACUMULADO até o período ANTERIOR	PREÇO NO PERÍODO	ACUMULADO até o período ANTERIOR	PREÇO NO PERÍODO	ACUMULADO até o período ANTERIOR	PREÇO NO PERÍODO		ACUMULADO até o período ANTERIOR
34.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	3.337,07	1,09	3.637,41		3.337,07	3.337,07				3.637,41	3.637,41	3.637,41	
34.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	14,00	115,23	1.613,22										100,00
34.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita				1.613,22										
35.0	RUA PROFESSOR MAURO LUNA				276.279,99										276.198,53
35.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.416,18										1.341,44
35.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	4.397,50	0,33	1.416,18		4.064,97	4.064,97							1.341,44
35.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				274.280,66										274.280,94
35.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	7.311,70	2,36	17.255,61		7.311,70	7.311,70							17.255,61
35.2.2	CBUCQ														
35.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUCQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	118,61	1,207,08	143.171,76		118,61	118,61							143.171,76
35.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUCQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperfilamento	m³	100,74	1,093,55	110.164,23		100,74	100,74							110.164,23
35.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	219,35	3,87	848,88		219,35	219,35							844,16
35.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	2.610,26	1,09	2.845,18		2.610,26	2.610,26							2.845,18
35.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	5,00	115,23	576,15										576,15
35.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita				576,15										576,15
36.0	RUA CAZEZA BAURETO				44.922,03										44.308,80
36.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				264,00										264,00
36.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	800,00	0,33	264,00		800,00	800,00							264,00
36.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				44.542,80										44.542,80
36.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	736,00	2,36	1.736,96		736,00	736,00							1.736,96
36.2.2	CBUCQ														
36.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUCQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	36,80	1,147,56	42.230,21		36,80	36,80							42.230,21
36.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	36,80	3,87	142,42		36,80	36,80							142,42
36.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	397,44	1,09	433,21		397,44	397,44							433,21
36.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	1,00	115,23	115,23										115,23
36.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita				115,23										115,23
37.0	RUA BEUJAMIM CONSTANT				31.901,56										31.786,33
37.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				151,01										151,01
37.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	457,60	0,33	151,01		457,60	457,60							151,01
37.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				31.635,32										31.635,32
37.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	848,64	2,36	2.002,79		848,64	848,64							2.002,79

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Urbanístico

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
 Francisco de Jesus C. Xavier

Consulтора Rocha Cavalcante Ltda.
 Ruy-Luiz Nogueira Oliveira


CAIXA Nº do CEF (Contrato Escopo/Contratante) 2.08.02/2020		Grau de Sigilo Data do C.T. 01/07/20	
Início de obra - data 29/06/2020		Nº do C.T. 1.065.660-37	
C.T.E.F. Valor total licitação (R\$) 18.225.646,43		Tomador/Ag. Promotor ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	
C.T.E.F. Valor atual (R\$) 18.225.646,43		Agente Financeiro ou Ag. Operador Pagador CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Prazo de entrega do trabalho 26/07/2021		Fonte de Recursos outra (descrever)	
C.T.E.F. - de assinatura C.T.E.F. - de último Adit.		Objeto do CEF (resumido) RECAPAMENTO ASFÁLTICO NOS BARRIOS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTAÇÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCONGÓ, SANTA CRUZ, DINAMÉRICA, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCONGÓ, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTIÃO, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA	
Descrição dos serviços do orçamento PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO		Local da obra (bairro/município/UF)	

ITEM	EXCUSAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PREÇO POR QUANTIDADE			EXCUSAÇÃO FÍSICA (QUANTIDADES)			EXCUSAÇÃO FINANCEIRA (R\$)			SERVIÇOS (N)
		unidade	quant.	preço unit.	preço total	quantidade atual	preço unit.	preço total	quantidade atual	preço unit.	
37.2.2	CBUQ										
37.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m³	12,73	1.207,08	15.366,13	12,73	1.207,08	15.366,13	12,73	15.366,13	15.366,13
37.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Reperflamento	m³	12,73	1.093,55	13.920,89	12,73	1.093,55	13.920,89	12,73	13.920,89	13.920,89
37.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	25,46	3,87	98,53	25,46	3,87	98,53	25,46	98,53	98,53
37.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	226,59	1,09	246,98	226,59	1,09	246,98	226,59	246,98	246,98
37.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	1,00	115,23	115,23						100,00
38.0	RUA PRUDENTE DE MORAIS										
38.1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
38.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	5.877,28	0,33	1.939,50	4.287,89	0,33	1.415,00	4.287,89	1.415,00	233.499,70
38.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO										
38.2.1	Pinura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	5.931,55	2,36	13.920,89	5.931,55	2,36	13.920,89	5.931,55	13.920,89	1.415,00
38.2.2	CBUQ										
38.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m³	296,68	1.147,56	340.458,10	191,90	1.147,56	220.216,76	191,90	220.216,76	35,32
38.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	296,68	3,87	1.148,15	191,90	3,87	742,65	191,90	742,65	35,32
38.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	2.670,12	1,09	2.910,43	1.727,10	1,09	1.882,54	1.727,10	1.882,54	35,32
38.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA										
38.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	9,00	115,23	1.037,07	1.037,07					100,00
39.0	RUA DESEMBARGADOR AZEVEDO										
39.1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
39.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	7.361,50	0,33	2.429,30	6.219,84	0,33	2.052,55	6.219,84	2.052,55	15,51
39.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO										
39.2.1	Pinura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	11.570,38	2,36	27.306,10	10.717,65	2,36	25.293,65	10.717,65	25.293,65	7,37
39.2.2	CBUQ										
39.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m³	88,74	1.147,56	113.340,07	71,72	1.147,56	82.303,00	71,72	82.303,00	27,36
39.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m³	143,83	1.207,08	173.735,02	139,25	1.207,08	168.085,89	139,25	168.085,89	3,25
39.2.2.3	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Reperflamento	m³	143,93	1.093,55	157.394,65	139,25	1.093,55	152.276,84	139,25	152.276,84	3,25

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
 Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng.º Civil - CREA/PB nº 10.500/2017

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
 Eng. João Neto de Oliveira

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SECOP/PMCG



		Nº do CTEF (Contrato e Licitação/Contratamento) 2.08.027/2020		Nº do CTEF 1.065.660-37		Grau de Sigilo Data do CT 01/07/20	
Início 29/06/2020		Previsão Término da obra 26/07/2021		Nº do CTEF 1.065.660-37		Tomador/Ag Promotor ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	
CTEF Valor total licitat (R\$) 18.225.646,43		CTEF - Obra acabada 18.225.646,43		Objeto do CTEF (resumo) 09.323.098/0001-92		Agência Financiadora ou Ag. Operadora Financeira CIMA ECONÔMICA FEDERAL	
CTEF- Valor atual (R\$) 18.225.646,43		CTEF - Da obra Adit. 18.225.646,43		Fonte de Recursos outra (descrever)			

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	RELEVANTE NO ORÇAMENTO			PREÇO UNITÁRIO (QUANTITATIVOS)			ACUMULADO ATÉ O PREÇO ANTERIOR			ACUMULADO ATÉ O PREÇO ATUAL			DESVIO (%)
		UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ATÉ O PREÇO ANTERIOR	MEDIDA NO PREÇO	ACUMULADO ATÉ O PREÇO ANTERIOR	MINUTO DO PREÇO	ACUMULADO ATÉ O PREÇO ATUAL	MINUTO DO PREÇO	ACUMULADO ATÉ O PREÇO ATUAL		
39.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	386,61	3,87	1.496,18	350,22	350,22	1.355,35	1.355,35	350,22	1.355,35	9,41		
39.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	4.871,29	1,09	5.309,71	4.412,77	4.412,77	4.809,92	4.809,92	4.412,77	4.809,92	9,41		
39.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	10,00	115,23	1.152,30	6,00	6,00	691,38	691,38	6,00	691,38	40,00		
39.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita	unidade	10,00	115,23	1.152,30	6,00	6,00	691,38	691,38	6,00	691,38	40,00		
40.0	RUA DUQUE DE CAXIAS				148.557,74			131.088,85	131.088,85		131.088,85			
40.1	SERVÇOS PRELIMINARES	m²	2.093,00	0,33	690,69	2.093,00	2.093,00	690,69	690,69	2.093,00	690,69			
40.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	2.093,00	0,33	690,69	2.093,00	2.093,00	690,69	690,69	2.093,00	690,69			
40.2	SERVÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	147.636,59	2,36	346.422,35	3.753,75	3.753,75	130.167,70	130.167,70	3.753,75	130.167,70	5,24		
40.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	3.961,52	2,36	9.349,19	3.753,75	3.753,75	8.858,85	8.858,85	3.753,75	8.858,85	5,24		
40.2.2	CBUQ	m²	59,43	1.207,08	71.736,76	59,43	59,43	71.712,62	71.712,62	59,43	71.712,62	0,03		
40.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ,	m²	59,43	1.207,08	71.736,76	59,43	59,43	71.712,62	71.712,62	59,43	71.712,62	0,03		
40.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017 - Reperflamento	m²	59,43	1.098,55	64.989,68	44,11	44,11	48.236,49	48.236,49	44,11	48.236,49	25,78		
40.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	116,84	3,87	451,91	103,52	103,52	400,62	400,62	103,52	400,62	12,89		
40.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.010,14	1,09	1.101,05	879,93	879,93	959,12	959,12	879,93	959,12	12,89		
40.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	2,00	115,23	230,46	2,00	2,00	230,46	230,46	2,00	230,46			
40.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita	unidade	2,00	115,23	230,46	2,00	2,00	230,46	230,46	2,00	230,46			
41.0	RUA ANTERIOR NAVARRO				785.789,19			737.274,05	737.274,05		737.274,05			
41.1	SERVÇOS PRELIMINARES	m²	4.619,39	0,33	1.532,39	4.619,39	4.619,39	1.532,39	1.532,39	4.619,39	1.532,39			
41.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	4.619,39	0,33	1.532,39	4.619,39	4.619,39	1.532,39	1.532,39	4.619,39	1.532,39			
41.2	SERVÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	12.869,15	2,36	30.371,19	12.869,15	12.869,15	732.654,66	732.654,66	12.869,15	732.654,66			
41.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	12.869,15	2,36	30.371,19	12.869,15	12.869,15	30.371,19	30.371,19	12.869,15	30.371,19			
41.2.2	CBUQ	m²	643,46	1.147,56	738.408,96	603,92	603,92	693.034,44	693.034,44	603,92	693.034,44	6,14		
41.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017 - Capa	m²	643,46	1.147,56	738.408,96	603,92	603,92	693.034,44	693.034,44	603,92	693.034,44	6,14		
41.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	643,46	3,87	2.490,19	603,92	603,92	2.337,17	2.337,17	603,92	2.337,17	6,14		
41.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	6.341,16	1,09	6.911,86	6.341,16	6.341,16	6.911,86	6.911,86	6.341,16	6.911,86	6,14		
41.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	22,00	115,23	2.535,06	22,00	22,00	2.535,06	2.535,06	22,00	2.535,06			
41.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita	unidade	22,00	115,23	2.535,06	22,00	22,00	2.535,06	2.535,06	22,00	2.535,06			
42.0	RUA SEBASTIÃO MARTINS DE OLIVEIRA				83.944,02			155.486,24	155.486,24		155.486,24			
43.0	RUA FLORIPÉDIES COUTINHO				739.697,88			912,58	912,58		912,58			
44.0	RUA PROFESSOR LUIZ GILLIARD				157.918,18			912,58	912,58		912,58			
44.1	SERVÇOS PRELIMINARES	m²	2.765,40	0,33	912,58	2.765,40	2.765,40	154.573,66	154.573,66	2.765,40	154.573,66			
44.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	2.765,40	0,33	912,58	2.765,40	2.765,40	154.573,66	154.573,66	2.765,40	154.573,66			
44.2	SERVÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				156.890,37									

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
 Francisco de Jesus C. Xavier
 Engº Civl - CREA-PB Nº 160.295.24.2

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras

Eng. João Víto de Oliveira
 Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

		Nº do CTE (Cadastro Técnico Especializado/Fornecimento) 2.082/2020		Nº de CT 1.065.660-37		Grau de Sigilo 01/07/20	
Início da obra - data 29/06/2020		Previsão término da obra 26/07/2021		Data de emissão 05/05/2021		Data do CT 01/07/20	
Valor atual (R\$) 18.225.646,43		CTEF: em assinatura 		Empresa Contratada CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA		Nº de CT 1.065.660-37	
Valor atual (R\$) 18.225.646,43		CTEF: em último ABR.		Objeto do CTEF (resumo) RECAMBAMENTO ASFÁLTICO NOS BARRIOS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTACÇÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCONEGÓ, SANTA CRUZ, DIMAMÉRICA, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCONEGÓ, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTAÓ, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA		Transmissão/Ag. Promotor ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	
Valor atual (R\$) 18.225.646,43		CTEF: em último ABR.		local da obra(Bairro/Município/UF)		Agente Financiador ou Ag. Operadora Requisante CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Valor atual (R\$) 18.225.646,43		CTEF: em último ABR.		Fonte de Recursos outra (descrever)		Fonte de Recursos outra (descrever)	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO	PREÇO NO ORÇAMENTO				EXECUÇÃO (PREÇO PLANEJADO)				EXECUÇÃO (PREÇO REAL)			DESMO (%)
		UNID.	QTDDE.	PREÇO UNID.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ATÉ PRECISO ANTERIOR	ACUMULADO ATÉ PRECISO ATUAL	PRECISO REALIZADO	PRECISO INCLUIDO	ACUMULADO INCLUIDO ATÉ PRECISO	PRECISO REALIZADO	ACUMULADO INCLUIDO ATÉ PRECISO	
44.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	2.612,24	2,36	6.164,89	6.164,89	2.612,24	2.612,24	6.164,89	6.164,89	6.164,89	6.164,89	1,55
44.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	129,05	1.147,56	148.992,62	148.992,62	127,05	127,05	145.797,50	145.797,50	145.797,50	145.797,50	1,55
44.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	0,47	1.207,08	567,33	567,33	0,47	0,47	567,33	567,33	567,33	567,33	1,55
44.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017. - Reperflamento	m³	0,47	1.093,55	513,97	513,97	0,47	0,47	513,97	513,97	513,97	513,97	1,55
44.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	129,99	3,87	503,06	503,06	128,18	128,18	496,06	496,06	496,06	496,06	1,39
44.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	961,93	1,09	1.048,50	1.048,50	948,54	948,54	1.033,91	1.033,91	1.033,91	1.033,91	1,39
44.3	NIVELAMENTO DE TAMPAÇO DE POÇO DE VISITA	unidade	1,00	115,23	115,23	115,23	1,00	115,23	115,23	115,23	115,23	115,23	100,00
44.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	1,00	115,23	115,23	115,23	1,00	115,23	115,23	115,23	115,23	115,23	100,00
45.0	RUA DAS TRÊS IRMÃS				211.439,22	211.439,22			210.632,61	210.632,61	210.632,61	210.632,61	
45.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.022,21	1.022,21			1.022,21	1.022,21	1.022,21	1.022,21	
45.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	3.097,60	0,33	1.022,21	1.022,21	3.097,60	3.097,60	1.022,21	1.022,21	1.022,21	1.022,21	
45.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				209.610,40	209.610,40			209.610,40	209.610,40	209.610,40	209.610,40	
45.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	5.632,08	2,36	13.291,71	13.291,71	5.632,08	5.632,08	13.291,71	13.291,71	13.291,71	13.291,71	
45.2.2	CBUQ												
45.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	84,48	1.207,08	101.974,12	101.974,12	84,48	84,48	101.974,12	101.974,12	101.974,12	101.974,12	
45.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017. - Reperflamento	m³	84,48	1.093,55	92.383,10	92.383,10	84,48	84,48	92.383,10	92.383,10	92.383,10	92.383,10	
45.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	168,96	3,87	653,88	653,88	168,96	168,96	653,88	653,88	653,88	653,88	
45.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.199,62	1,09	1.307,59	1.307,59	1.199,62	1.199,62	1.307,59	1.307,59	1.307,59	1.307,59	
45.3	NIVELAMENTO DE TAMPAÇO DE POÇO DE VISITA	unidade	7,00	115,23	806,61	806,61	7,00	806,61	806,61	806,61	806,61	806,61	
45.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	7,00	115,23	806,61	806,61	7,00	806,61	806,61	806,61	806,61	806,61	
46.0	RUA DR. JOÃO ARLINDO CORREIA				123.889,22	123.889,22			122.254,13	122.254,13	122.254,13	122.254,13	
46.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				578,92	578,92			578,92	578,92	578,92	578,92	
46.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	1.754,31	0,33	578,92	578,92	1.754,31	1.754,31	578,92	578,92	578,92	578,92	
46.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				122.964,61	122.964,61			121.675,21	121.675,21	121.675,21	121.675,21	
46.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	3.294,62	2,36	7.775,30	7.775,30	3.294,62	3.294,62	7.775,30	7.775,30	7.775,30	7.775,30	
46.2.2	CBUQ												



 PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE

 Adriano Gomes do Nascimento

 Coordenador de Planejamento Urbano

 CREA 13847/PB




 Eng. João Neto de Oliveira

 CREA 16084/PB

CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA.

 Eng. João Neto de Oliveira


 CREA 16084/PB

		Nº do CTE (Contrato Executivo/Contratado)		Grau de Sigilo	
2.08.02/2020		29/06/2020		Nº de CT 1.065.660-37	
Início da obra - obra		Provisão Fornecedor/obra 26/07/2021		Data do CT 01/07/20	
Valor total licitação (R\$)		CTE - Di assinatura		Nº de CT Promotor ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	
18.225.646,43		CTE - R\$ último Adit.		Agente Financeiro ou Ag. Operador Inpassare	
Valor atual (R\$)		CTE - R\$ último Adit.		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
18.225.646,43		CTE - R\$ último Adit.		Fonte de Recursos outra (Decreto)	

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENCAMERO	PREVISTO NO ORÇAMENTO			EXECUÇÃO FÍSICA (PARCIAL/ATIVO)			EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$)			DESAIO (%)
		UNID.	QTDDES.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	PERÍODO DO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PERÍODO DO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	
46.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	49,42	1.207,08	59.653,89	49,42	59.653,89	59.653,89		59.653,89	2,37
46.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperfilamento	m³	98,84	3,87	382,54	48,25	379,96	379,96		379,96	0,67
46.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descargada em vibro-acabadora	m³ x km	1.018,05	1,09	1.109,67	1.011,26	1.102,27	1.102,27		1.102,27	0,67
46.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 m³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	unidade	3,00	115,23	345,69						100,00
46.3.1	NIVELAMENTO DE TAMPAÇÃO DE POÇO DE VISITA										
47.0	RUA JOÃO LÉIS										
47.1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
47.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	5.525,00	0,33	1.823,25	5.010,13	1.653,34	1.653,34		1.653,34	9,32
47.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO										
47.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	30.264,40	2,36	382.590,21	10.019,69	23.646,47	23.646,47		23.646,47	2,38
47.2.2	CBUQ										
47.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	153,87	1.207,08	185.854,11	150,29	181.412,05	181.412,05		181.412,05	2,39
47.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperfilamento	m³	153,97	1.093,55	168.373,89	150,30	164.360,57	164.360,57		164.360,57	2,38
47.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descargada em vibro-acabadora	m³	307,83	3,87	1.191,69	300,59	1.163,28	1.163,28		1.163,28	2,38
47.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	2.648,20	1,09	2.886,54	2.585,16	2.817,82	2.817,82		2.817,82	2,38
47.3	NIVELAMENTO DE TAMPAÇÃO DE POÇO DE VISITA										
47.3.1	Nivelamento de Tampação de Poço de Visita	unidade	6,00	115,23	691,38	6,00	691,38	691,38		691,38	
48.0	RUA LUIZ SODRÉ FILHO										
48.1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
48.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	2.919,80	0,33	963,47	2.645,61	873,05	873,05		873,05	9,38
48.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO										
48.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	5.320,16	2,36	198.093,44	5.288,31	193.919,88	193.919,88		193.919,88	0,60
48.2.2	CBUQ										
48.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	79,80	1.207,08	96.374,98	79,28	95.697,30	95.697,30		95.697,30	0,65
48.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperfilamento	m³	79,80	1.093,55	87.265,29	76,72	83.897,16	83.897,16		83.897,16	3,86
48.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descargada em vibro-acabadora	m³	1.599,00	3,87	617,65	1.56,00	603,72	603,72		603,72	2,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 FRANCISCO DOS SANTOS XAVIER
 Coordenador de Planejamento Obras

CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA.
 FRANCISCO VIANA DE OLIVEIRA
 CREA 168005-5/2018 PIVOT

		Nº do CTE (Comando Executivo/Função)		Grau de Sigilo	
Início da obra - data: 29/05/2020		Prazo estimado de obra: 26/07/2021		Data do CTE	
Valor total local (R\$): 18.225.646,43		CTE - di. assinatura		Nº de CTE: 1.005.660-37	
CTE - Valor atual (R\$): 18.225.646,43		CTE - Di. último Adm.		Tomador/Ap. Promotor ou Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	
CTE - Valor atual (R\$): 18.225.646,43		CTE - Di. último Adm.		Agente Financeiro em Alg. Operador Repasse: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Local da obra (bairro/Município/UF):		IM - Data emissão: 05/05/2021		IM - Período de referência da medição: de 29/03/2021 a 29/04/2021	
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO		Empresa Contratada: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA		CNU: 09.323.089/0001-92	
Descrição dos serviços no orçamento:		Recuperação asfáltico nos bairros Centro, Bela Vista, Alto Branco, Conceição, Estação Velha, Palmeira, Prata, Bodocongó, Santa Cruz, Dinâmica, Catolé, Centroário, Cruzeiro, Jardim Tavares, Jeremias, José Pinheiro, Mirante, Novo Bodocongó, Santo Antônio, São José, Serrotão, Malvinas, Monte Santo e Universitário, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba		Fonte de Recursos:	
CTE - Valor atual (R\$): 18.225.646,43		CTE - Di. último Adm.		Fonte de Recursos:	

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ORÇAMENTO	PREÇO NO ORÇAMENTO			DESCRIÇÃO FÍSICO QUANTITATIVA			DESCRIÇÃO FINANCEIRA (R\$)		
		UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.	ACUMULADO NA MESMA UNIDADE	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADO NA UNIDADE ANTERIOR	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUIDO O PERÍODO	SERVIDO (M)
48.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.165,08	1,09	1.269,94	1.138,80	1.241,29	1.241,29	1.241,29	2,26
48.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	7,00	115,23	806,61					100,00
48.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita				806,61					
49.0	RUA LADISLAU RODRIGUES DE SOUZA				137.689,10		125.453,87	125.453,87	125.453,87	
49.1	SERVICOS PRELIMINARES				656,70		560,52	560,52	560,52	
49.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	1.990,00	0,33	656,70	1.698,54	1.698,54	1.698,54	1.698,54	14,65
49.2	SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO				136.781,94		124.662,89	124.662,89	124.662,89	
49.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	3.661,60	2,36	8.641,38	3.394,82	8.011,78	8.011,78	8.011,78	7,29
49.2.2	CBUQ									
49.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusivo transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	54,92	1.207,08	66.292,83	49,13	59.303,84	59.303,84	59.303,84	10,54
49.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusivo transporte. AF_03/2017. - Reparamento	m²	54,92	1.093,55	60.057,77	50,95	55.716,37	55.716,37	55.716,37	7,23
49.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	109,84	3,87	425,08	100,08	387,31	387,31	387,31	8,89
49.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.252,16	1,09	1.364,88	1.140,91	1.243,59	1.243,59	1.243,59	8,89
49.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	2,00	115,23	230,46		230,46	230,46	230,46	
49.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita				230,46		230,46	230,46	230,46	
50.0	RUA FRANCISCO LOPES				112.352,05		112.352,86	112.352,86	112.352,86	
50.1	SERVICOS PRELIMINARES				528,00		494,35	494,35	494,35	
50.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	1.600,00	0,33	528,00	1.498,03	494,35	494,35	494,35	6,37
50.2	SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO				111.479,36		111.029,05	111.029,05	111.029,05	
50.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	2.984,40	2,36	7.043,18	2.984,40	7.043,18	7.043,18	7.043,18	
50.2.2	CBUQ									
50.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusivo transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	44,76	1.207,08	54.028,90	44,73	53.092,69	53.092,69	53.092,69	0,07
50.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusivo transporte. AF_03/2017. - Reparamento	m²	44,76	1.093,55	48.947,20	44,93	48.133,20	48.133,20	48.133,20	(0,38)
50.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	89,53	3,87	346,48	89,53	346,48	346,48	346,48	
50.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.020,64	1,09	1.112,50	1.020,64	1.112,50	1.112,50	1.112,50	
50.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	3,00	115,23	345,69		345,69	345,69	345,69	
50.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita				345,69		345,69	345,69	345,69	
51.0	RUA DR. FLORIANO MENDES FREIRE				330.473,98		329.321,68	329.321,68	329.321,68	
51.1	SERVICOS PRELIMINARES				1.617,26		1.617,26	1.617,26	1.617,26	

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
 FRANCISCO DE JESUS C. XAVIER
 Eng. Civil - CREA-PR Nº 183.283-2/2012

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
 Eng. Antonio Neto de Oliveira

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras

		PREMIO - Valor em reais 10		RECEITA - Valor em reais 10		GRUPO - Grau de Sigilo 1.065.660-37	
DATA DE INÍCIO - 29/06/2020 DATA DE FIM - 26/07/2021		EMPRESA CONTRATADA CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LIDA <small>(Registro de CNPJ (venalidade))</small>		RECEITA - Valor em reais 18.225.646,43		EMPRESA CONTRATADA CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LIDA <small>(Registro de CNPJ (venalidade))</small>	
VALOR ANUAL - 18.225.646,43		VALOR ANUAL - 18.225.646,43		VALOR ANUAL - 18.225.646,43		VALOR ANUAL - 18.225.646,43	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PREÇO UNIT.			PREÇO TOTAL			EXECUÇÃO (PREÇO QUANTITATIVOS)			EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$)			RESERVA (%)
		UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	PREÇO UNIT.	QTD.	PREÇO UNIT.	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	PREÇO UNIT.	QTD.	PREÇO UNIT.	
51.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	4.900,80	0,33	1.617,26	4.900,80	4.900,80	1.617,26	4.900,80	1.617,26	1.617,26	4.900,80	1.617,26	9,39
51.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				327.704,42		327.704,42	327.704,42		327.704,42	327.704,42	327.704,42	327.704,42	6,25
51.2.1	Pinura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	8.821,44	2,36	20.818,60	8.821,44	8.821,44	20.818,60	8.821,44	20.818,60	20.818,60	8.821,44	20.818,60	7,82
51.2.2	CBUQ													100,00
51.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m²	132,32	1.207,08	159.720,83	132,32	132,32	159.720,83	132,32	159.720,83	159.720,83	132,32	159.720,83	7,82
51.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Reperflamento	m²	132,32	1.093,55	144.696,54	132,32	132,32	144.696,54	132,32	144.696,54	144.696,54	132,32	144.696,54	7,82
51.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em viltro-acabadora	m³	264,64	3,87	1.024,16	264,64	264,64	1.024,16	264,64	1.024,16	1.024,16	264,64	1.024,16	7,82
51.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.323,20	1,09	1.442,29	1.323,20	1.323,20	1.442,29	1.323,20	1.442,29	1.442,29	1.323,20	1.442,29	7,82
51.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				1.152,30		1.152,30	1.152,30		1.152,30	1.152,30	1.152,30	1.152,30	7,82
51.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita	unidade	10,00	115,23	1.152,30	10,00	10,00	115,23	10,00	115,23	115,23	10,00	115,23	7,82
52.0	RUA SALUSTIANO BEZERRA CABRAL				266.312,38		266.312,38	266.312,38		266.312,38	266.312,38	266.312,38	266.312,38	7,82
52.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.306,80		1.306,80	1.306,80		1.306,80	1.306,80	1.306,80	1.306,80	7,82
52.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	3.960,00	0,33	1.306,80	3.960,00	3.960,00	1.306,80	3.960,00	1.306,80	1.306,80	3.960,00	1.306,80	7,82
52.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				264.775,12		264.775,12	264.775,12		264.775,12	264.775,12	264.775,12	264.775,12	7,82
52.2.1	Pinura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	7.128,00	2,36	16.822,08	7.128,00	7.128,00	16.822,08	7.128,00	16.822,08	16.822,08	7.128,00	16.822,08	7,82
52.2.2	CBUQ													100,00
52.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m²	105,92	1.207,08	129.060,99	105,92	105,92	129.060,99	105,92	129.060,99	129.060,99	105,92	129.060,99	7,82
52.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Reperflamento	m²	105,92	1.093,55	116.922,37	105,92	105,92	116.922,37	105,92	116.922,37	116.922,37	105,92	116.922,37	7,82
52.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em viltro-acabadora	m³	213,84	3,87	827,56	213,84	213,84	827,56	213,84	827,56	827,56	213,84	827,56	7,82
52.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.047,82	1,09	1.142,12	1.047,82	1.047,82	1.142,12	1.047,82	1.142,12	1.142,12	1.047,82	1.142,12	7,82
52.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				230,46		230,46	230,46		230,46	230,46	230,46	230,46	7,82
52.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita	unidade	2,00	115,23	230,46	2,00	2,00	115,23	2,00	115,23	115,23	2,00	115,23	7,82
53.0	RUA ALCEBARES GONCALVES DA ROCHA				222.475,50		222.475,50	222.475,50		222.475,50	222.475,50	222.475,50	222.475,50	7,82
53.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.074,40		1.074,40	1.074,40		1.074,40	1.074,40	1.074,40	1.074,40	7,82
53.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	3.254,85	0,33	1.074,40	3.254,85	3.254,85	1.074,40	3.254,85	1.074,40	1.074,40	3.254,85	1.074,40	7,82
53.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				220.940,28		220.940,28	220.940,28		220.940,28	220.940,28	220.940,28	220.940,28	7,82
53.2.1	Pinura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	5.931,06	2,36	13.997,30	5.931,06	5.931,06	13.997,30	5.931,06	13.997,30	13.997,30	5.931,06	13.997,30	7,82
53.2.2	CBUQ													100,00
53.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m²	88,96	1.207,08	107.381,84	88,96	88,96	107.381,84	88,96	107.381,84	107.381,84	88,96	107.381,84	7,82

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
 Coordenador de Planejamento Obras


CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LIDA.
Eng. Arq. ...

CAIXA Nº do CTE (Contrato Específico/Planejamento) 2.08.022/2020		Grau de Sigilo Data do CT 01/07/20	
Início da obra - data 29/06/2020		Nº do CT 1.065.660-37	
Previsão Término da obra - CTE - de assinatura 28/09/2021		Tomador/Ag Promotor ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	
Valor total líquido (R\$) 18.225.646,43		Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Valor atual (R\$) 18.225.646,43		Fonte de Recursos outra (descrever)	
Local da obra (Bairro/Município(UF))		BIM - Data emissão 05/05/2021	
Pavimentação de Diversas Ruas no Município		BIM - Período de referência da medição de 25/03/2021 a 29/04/2021	
Empresa Contratada CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA		CRP 09.323.098/0001-92	
Objeto do CTE (resumo)		RECAPAMENTO ASFÁLTICO NOS BARRIOS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTÁÇÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCONGO, SANTA CRUZ, DINAMÉRICA, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCONGO, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTIÃO, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PREVISTO NO ORÇAMENTO			PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	RECORRIDO FÍSICO (QUANTITATIVOS)		RECORRIDO FINANCEIRO (R\$)		REVENO (%)
		UNID.	QTD.	QTD.			ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ATUALIZADO	ACUMULADO RECORRIDO O PERÍODO		
53.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Repetimento	m³	88,96	1.093,55	97.282,21	76,03	76,03	83.142,61	83.142,61	14,53	
53.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	177,95	3,87	688,59	149,51	149,51	578,60	578,60	15,97	
53.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.459,03	1,09	1.590,34	1.225,99	1.225,99	1.336,33	1.336,33	15,97	
53.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	4,00	115,23	460,92	460,92				100,00	
53.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita										
54.0	RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO				159.547,62			148.714,08	148.714,08		
54.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				764,28			717,41	717,41		
54.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	2.316,00	0,33	764,28	2.173,97	2.173,97	717,41	717,41	6,13	
54.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				158.207,19			147.996,67	147.996,67		
54.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	4.261,44	2,36	10.057,00	3.986,33	3.986,33	9.407,74	9.407,74	6,46	
54.2.2	CBUQ										
54.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	63,92	1.207,08	77.156,55	59,79	59,79	72.171,31	72.171,31	6,46	
54.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Repetimento	m²	63,92	1.093,55	69.899,72	59,80	59,80	65.394,29	65.394,29	6,45	
54.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	127,84	3,87	494,74	119,59	119,59	462,81	462,81	6,45	
54.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	549,71	1,09	599,18	514,24	514,24	560,52	560,52	6,45	
54.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	5,00	115,23	576,15	576,15				100,00	
54.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita										
55.0	RUA MARIA VIEIRA CÉSAR				373.042,21			308.693,38	308.693,38		
55.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.539,95			1.356,48	1.356,48		
55.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	4.666,50	0,33	1.539,95	4.110,56	4.110,56	1.356,48	1.356,48	11,91	
55.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				370.810,88			307.161,67	307.161,67		
55.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	8.590,36	2,36	20.263,81	8.221,12	8.221,12	19.401,84	19.401,84	4,25	
55.2.2	CBUQ										
55.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	128,80	1.207,08	155.471,90	123,32	123,32	146.857,11	146.857,11	4,25	
55.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Repetimento	m²	128,80	1.093,55	140.840,24	123,32	123,32	134.856,59	134.856,59	4,25	
55.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	257,60	3,87	995,91	246,64	246,64	954,50	954,50	4,25	
55.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	2.962,40	1,09	3.229,02	2.836,36	2.836,36	3.091,63	3.091,63	4,25	
55.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				691,38			115,23	115,23		
55.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita										

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 Francisco dos Jesus C. Xavier
 Engº Civil - CREA-PB Nº 160.2835/04-2

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
 Engº. João Neto de Oliveira


		Nº do CTEI (contato Caixa - Funcionário)		Grau de Sigilo	
Início da obra - data 28/02/2020	29/06/2020	EM - Data emissão 05/05/2021	Nº do CTEI 1.065.660-37	Data do CT 01/07/20	
CTEI - Valor total (R\$) 18.225.646,43	Previsão término da obra 26/07/2021	Empresa Contratada CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA		Tomador/Obj. Promotor ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	
	CTEI - Dt. assinatura	Objeto do CTEI (resumo)		Agente Financeiro ou Ag. Operacional Repasse	
		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS BARRIOS CENTRO, BEIA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTAÇÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCONGÓ, SANTA CRUZ, DINAMÉRICA, CATOLÉ, CENTEÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCONGÓ, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTAÓ, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
CTEI - Valor atual (R\$) 18.225.646,43	CTEI - Dt. último Adit.	Local da obra (bairro/Município/UF)		Fonte de Recursos outra (descreva)	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PREVISTO NO ORÇAMENTO			EXECUÇÃO FÍSICA QUANTITATIVOS			EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$)		DESEJO (%)
		UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.	ACUMULADO até o período anterior	PERÍODO DO PERÍODO	ACUMULADO até PERÍODO ANTERIOR	MUNDO DO PERÍODO	ACUMULADO INCLUSIVE O PERÍODO	
55.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	6,00	115,23	691,38	1,00	1,00	115,23	115,23	83,33
56.0	RUA SÃO LUCAS				447.409,26			439.423,82	439.423,82	
56.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.148,53			2.148,53	2.148,53	
56.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	6.510,70	0,33	2.148,53	6.510,70	6.510,70	2.148,53	2.148,53	
56.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				443.762,74			437.275,29	437.275,29	
56.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	11.854,84	2,36	27.977,42	11.820,94	11.820,94	27.897,42	27.897,42	0,29
56.2.2	CBUQ									
56.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	177,82	1.207,08	214.642,97	174,39	174,39	210.502,68	210.502,68	1,93
56.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperflamento	m³	177,82	1.093,55	194.455,06	175,84	175,84	192.289,83	192.289,83	1,11
56.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	355,65	3,87	1.376,37	350,23	350,23	1.355,39	1.355,39	1,52
56.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	4.872,40	1,09	5.310,92	4.798,14	4.798,14	5.229,97	5.229,97	1,52
56.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				1.497,99					
56.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	13,00	115,23	1.497,99					100,00
57.0	RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ				266.855,16			266.823,30	266.823,30	
57.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.270,17			1.238,31	1.238,31	
57.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	3.849,00	0,33	1.270,17	3.752,45	3.752,45	1.238,31	1.238,31	2,51
57.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				264.778,38			264.778,38	264.778,38	
57.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	7.119,00	2,36	16.800,84	7.119,00	7.119,00	16.800,84	16.800,84	
57.2.2	CBUQ									
57.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	106,78	1.207,08	128.892,00	106,78	106,78	128.892,00	128.892,00	
57.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperflamento	m³	106,78	1.093,55	116.769,27	106,78	106,78	116.769,27	116.769,27	
57.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	213,56	3,87	826,48	213,56	213,56	826,48	826,48	
57.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.366,78	1,09	1.489,79	1.366,78	1.366,78	1.489,79	1.489,79	
57.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				806,61			806,61	806,61	
57.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	7,00	115,23	806,61	7,00	7,00	806,61	806,61	
58.0	RUA DONA D'ARC DE ARRUDA - TRECHO 01				314.117,23			293.407,24	293.407,24	
58.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.848,00			1.746,45	1.746,45	
58.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	5.600,00	0,33	1.848,00	5.292,26	5.292,26	1.746,45	1.746,45	5,50
58.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				311.462,82			291.660,79	291.660,79	


 PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
 Francisco de Jesus C. Xavier
 Engenheiro Civil - R. 100055308-DPE
 CREA: 180805308-DPE


 PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
 Francisco de Jesus C. Xavier
 Engenheiro Civil - R. 100055308-DPE
 CREA: 180805308-DPE

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Urbano
 SFCOR/DMRCC


		Grau de Sigilo Data do CT	
Nº do CT 1.065.660-37		Nº do CT 01/07/20	
Tomador/Ag. Promotor ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE		Tomador/Ag. Promotor ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	
Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Fonte de Recursos outra (descrever)		Fonte de Recursos outra (descrever)	
Nº do CT 06.25/03/2021 a 29/04/2021		Nº do CT 06.25/03/2021 a 29/04/2021	
Local da obra(Ins/Município/UF) PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO		Local da obra(Ins/Município/UF) PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO	
IM - número 10		IM - data emitida 05/05/2021	
Legenda Construção CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA		IM - Início de referência da medição 06.25/03/2021 a 29/04/2021	
Objeto do CTEI (remissão) RECAPAMENTO ASFÁLTICO NOS BARRIOS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTÁÇÃO VELHA, PALMEIRA PRATA, BODOCORNÓ, SANTA CRUZ, DIMANÊMICA, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ FERREIRO, MIRANTE, NOVO BODOCORNÓ, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERRODÃO, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA		CTEI 09.323.098/0001-92	
Valor atual (R\$) 18.225.646,43		Valor atual (R\$) 18.225.646,43	
CTEI - Data de emissão 26/07/2021		CTEI - Data de emissão 26/07/2021	
Valor total inicial (R\$) 29/06/2020		Valor total inicial (R\$) 29/06/2020	
CTEI - Início de emissão 29/06/2020		CTEI - Início de emissão 29/06/2020	
CTEI - Data de emissão 26/07/2021		CTEI - Data de emissão 26/07/2021	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO EMPRÉTIMO	PREÇO DO EMPRÉTIMO			EXCUTADO FÍSICO (QUANTITATIVOS)			EXCUTADO FINANCEIRO (R\$)		
		UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO FÍSICO ANTERIOR	ACUMULADO FÍSICO PERÍODO	ACUMULADO FÍSICO ANTERIOR	MÉDIO DO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
58.2.1	Plintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	5.152,00	2,36	12.158,72	4.874,96	4.874,96	11.504,91	11.504,91	5,38
58.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m²	257,60	1.147,56	295.611,46	241,12	241,12	276.699,67	276.699,67	6,40
58.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	257,60	3,87	996,91	241,12	241,12	933,13	933,13	6,40
58.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	2.472,96	1,09	2.695,53	2.314,75	2.314,75	2.525,08	2.525,08	6,40
58.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	7,00	115,23	806,61					100,00
58.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	7,00	115,23	806,61					100,00
59.0	RUA JOANA D'ARC DE ARRUDA - TRECHO 02				199.723,34			197.694,86	197.694,86	
59.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				953,54			883,38	883,38	
59.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	2.889,50	0,33	953,54	2.676,90	2.676,90	883,38	883,38	7,36
59.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				198.308,88			196.350,56	196.350,56	
59.2.1	Plintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	5.316,68	2,36	12.547,36	4.486,88	4.486,88	10.589,04	10.589,04	15,61
59.2.2	CBUQ									
59.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m²	79,75	1.207,08	96.264,63	79,75	79,75	96.264,63	96.264,63	
59.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Repetimento	m²	79,75	1.093,55	87.210,61	79,75	79,75	87.210,61	87.210,61	
59.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	159,50	3,87	617,27	159,50	159,50	617,27	617,27	
59.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.531,20	1,09	1.669,01	1.531,20	1.531,20	1.669,01	1.669,01	
59.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	4,00	115,23	460,92	4,00	4,00	460,92	460,92	
59.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	4,00	115,23	460,92	4,00	4,00	460,92	460,92	
60.0	RUA FERNANDES VIEIRA				218.658,73			98.792,91	98.792,91	
60.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.002,54			435,70	435,70	
60.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	3.038,00	0,33	1.002,54	1.320,30	1.320,30	435,70	435,70	56,54
60.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				216.964,81			98.357,21	98.357,21	
60.2.1	Plintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	5.832,96	2,36	13.765,79	2.643,89	2.643,89	6.239,58	6.239,58	54,67
60.2.2	CBUQ									
60.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m²	87,49	1.207,08	105.607,43	39,71	39,71	47.933,15	47.933,15	54,61
60.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Repetimento	m²	87,49	1.093,55	95.674,69	39,61	39,61	43.315,52	43.315,52	54,73
60.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	174,96	3,87	677,47	79,32	79,32	306,97	306,97	54,67
60.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.137,27	1,09	1.239,73	515,59	515,59	561,99	561,99	54,67

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
 FRANCISCO CESAR S. XAVIER
 Eng. Civil - CREA PB 018.200.000/0001-00

CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA.
 FRANCISCO CESAR S. XAVIER
 Eng. Civil - CREA PB 018.200.000/0001-00

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras


		GRUPO DE SERVIÇOS 10 - Subgrupo 10 - Subgrupo		GRUPO DE SERVIÇOS 10 - Subgrupo 10 - Subgrupo		GRUPO DE SERVIÇOS 10 - Subgrupo 10 - Subgrupo	
Nº do CTA (Contrato Executivo/Contratamento) 2.08.022/2020		Nº do CTA (Contrato Executivo/Contratamento) 2.08.022/2020		Nº do CTA (Contrato Executivo/Contratamento) 2.08.022/2020		Nº do CTA (Contrato Executivo/Contratamento) 2.08.022/2020	
Início da obra - data 29/06/2020		Início da obra - data 26/07/2021		Início da obra - data 26/07/2021		Início da obra - data 26/07/2021	
Valor total inicial (R\$) 18.225.646,43		Valor total inicial (R\$) 18.225.646,43		Valor total inicial (R\$) 18.225.646,43		Valor total inicial (R\$) 18.225.646,43	
CTEF - Início da obra CTEF - Início da obra		CTEF - Início da obra CTEF - Início da obra		CTEF - Início da obra CTEF - Início da obra		CTEF - Início da obra CTEF - Início da obra	
CTEF - Valor atual (R\$) 18.225.646,43		CTEF - Valor atual (R\$) 18.225.646,43		CTEF - Valor atual (R\$) 18.225.646,43		CTEF - Valor atual (R\$) 18.225.646,43	
CTEF - Valor atual (R\$) 18.225.646,43		CTEF - Valor atual (R\$) 18.225.646,43		CTEF - Valor atual (R\$) 18.225.646,43		CTEF - Valor atual (R\$) 18.225.646,43	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PREVISTO NO ORÇAMENTO				EXECUÇÃO FÍSICA QUANTITATIVA				EXECUÇÃO FÍSICA (R\$)				
		UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO O PRESTADO	PRESTADO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MÉDIO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	MÉDIO (R\$)	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	MÉDIO (R\$)	
60.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA													
60.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita	unidade	6,00	115,23	691,38									100,00
61.0	RUA ALFREDO GODOFREDO DE SANTANA													
61.1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
61.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	937,00	0,33	309,21									
61.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO													
61.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	1.724,08	2,36	4.068,83									
61.2.2	CBUQ													
61.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m³	25,86	1.207,08	31.215,09									
61.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CRUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Reperflamento	m³	25,86	1.099,55	28.279,20									
61.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	51,72	3,87	200,16									
61.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	367,21	1,09	400,26									
61.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA													
61.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita	unidade	1,00	115,23	115,23									
62.0	TRAVESSA JOÃO FLORENTINO DE CARVALHO													
62.1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
62.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	1.154,00	0,33	380,82									
62.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO													
62.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	2.123,36	2,36	5.011,13									
62.2.2	CBUQ													
62.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m³	31,85	1.207,08	38.445,50									
62.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Reperflamento	m³	31,85	1.099,55	34.829,57									
62.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	63,70	3,87	246,52									
62.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	458,64	1,09	499,92									
62.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA													
62.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita	unidade	2,00	115,23	230,46									
63.0	RUA DIALMA MIGUEL DE MORAIS													
63.1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
63.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	2.871,20	0,33	947,50									
63.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO													
63.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	5.169,46	2,36	12.196,26									


PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng.º Civil - CRE-AP Nº 160.203534-2


Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 CREA PB 03/2017

Construtora Reete Cavalcante Ltda.
 Eng.º João Neto de Oliveira


		RM - Referência 10		RM - Data emissão 05/05/2021		RM - Período de referência da medição de 25/03/2021 a 29/04/2021		RM - Grau de Sigilo Data do CT 01/07/20	
RM - Descrição 10 Empreitada Contratada: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA <small>(Órgão do CITEI (resumido))</small>		RM - Valor total básico (R\$) 18.225.646,43		RM - Valor total líquido (R\$) 18.225.646,43		RM - Nº de CT 1.065.660-37 <small>Tomador/Ag. Promotor ou Emissor</small> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE <small>Agente Financeiro ou Ag. Operador Pagador</small>		RM - Fonte de Recursos CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <small>outra (descrever)</small>	
Objeto do CITEI (resumido) RECAPAMENTO ASFÁLTICO NOS BARRIOS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTAÇÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCONGO, SANTA CRUZ, DIMIÁMERICA, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCONGO, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTAÓ, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA		Local da obra (Bairro/Município/UF) PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO							
CPF - Início da obra - data 29/06/2020 <small>Previdido término de obra</small> 26/07/2021		CPF - Valor total líquido (R\$) 18.225.646,43		CPF - Data emissão 05/05/2021		CPF - Período de referência da medição de 25/03/2021 a 29/04/2021		CPF - Grau de Sigilo Data do CT 01/07/20	
CPF - Valor total líquido (R\$) 18.225.646,43		CPF - Data emissão 05/05/2021		CPF - Período de referência da medição de 25/03/2021 a 29/04/2021		CPF - Grau de Sigilo Data do CT 01/07/20		CPF - Fonte de Recursos CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <small>outra (descrever)</small>	

ITEM	EXCERTEMENTO DOS SERVIÇOS NO ORÇAMENTO	PRESTADO NO ORÇAMENTO			RECORRIDO (CICLO PREVIATIVOS)			RECORRIDO FINANCIADO (R\$)	
		UNID.	QTD.	PREÇO UNID.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	PERÍODO DO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PERÍODO (R\$)
63.2.2	CBUQ								
63.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	77,52	1.207,08	98.572,84	75,10	75,10	90.651,71	3.42
63.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperflamento	m³	77,52	1.093,55	84.772,00	75,09	75,09	82.114,67	3,13
63.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	155,04	3,87	600,00	150,19	150,19	581,24	3,13
63.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.255,82	1,09	1.368,84	1.216,54	1.216,54	1.326,03	3,13
63.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				460,92	4,00	4,00	460,92	460,92
63.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	4,00	115,23	460,92	4,00	4,00	460,92	460,92
64.0	RUA DAS BARAUNAS				239.422,31			207.440,39	
64.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.134,67			997,09	
64.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	3.438,40	0,33	1.134,67	3.021,49	3.021,49	997,09	12,13
64.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				238.172,41			206.443,30	
64.2.1	Pinura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	6.348,72	2,36	14.982,98	5.516,00	5.516,00	13.017,76	13,12
64.2.2	CBUQ								
64.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	95,23	1.207,08	114.950,23	82,54	82,54	99.632,38	13,33
64.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperflamento	m³	95,23	1.093,55	104.138,77	82,52	82,52	90.239,75	13,35
64.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	190,47	3,87	737,12	165,06	165,06	638,78	13,34
64.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	3.085,61	1,09	3.363,31	2.673,97	2.673,97	2.914,63	13,34
64.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				115,23				
64.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	1,00	115,23	115,23				100,00
65.0	RUA ALICE GAUDÊNCIO				302.279,44			302.134,55	
65.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.400,07			1.370,41	
65.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	4.242,65	0,33	1.400,07	4.152,77	4.152,77	1.370,41	2,12
65.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				300.764,14			300.769,14	
65.2.1	Pinura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	8.073,14	2,36	19.052,01	8.073,14	8.073,14	19.052,01	13,12
65.2.2	CBUQ								
65.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	121,09	1.207,08	146.165,32	121,09	121,09	146.165,32	13,33
65.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperflamento	m³	121,09	1.093,55	132.417,97	121,09	121,09	132.417,97	13,34


Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Orç.
 SECOP/PMCG


Francisco dos Jesus C. Xavier
 Eng.º Civil - CREA-PB Nº 160.283534-2
 SECOP/PMCG


Consutora Rocha Cavalcante Ltda.
 Eng.º João Neto de Oliveira
 CREA - 1688855204-0988


		Grau de Sigilo Data do CT 01/07/20	
Nº do CTE (Contato Execução/Encerramento) 2.08.02/2020		Nº de CT 1.065.660-37	
Início 29/06/2020		Tomador/Prestador ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	
Data de entrega da obra - data 26/07/2021		Agente Fiscal do Ag. Operador Repasse CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
CTEF - Valor total (incluindo IBS) 18.225.646,43		Descrição do Objeto do CTEF (resumido) RECAPAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIRROS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTACÇÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCONGÓ, SANTA CRUZ, DINAMERICA, CATOLE, CENENTÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCONGÓ, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROZÃO, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA	
CTEF - Valor atual (IBS) 18.225.646,43		Fonte de Recursos outra (descreva)	

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PREÇO NO ORÇAMENTO				EXECUÇÃO FÍSICA QUANTITATIVA				EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$)	
		UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	PERÍODO DO PERÍODO	ACUMULADO INCLUIDO O PERÍODO	PERÍODO (R\$)	DESEJO (R\$)
65.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	242,18	3,87	937,24	242,18	242,18	937,24	937,24		
65.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	2.010,09	1,09	2.191,00	2.010,09	2.010,09	2.191,00	2.191,00		
65.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	1,00	115,23	115,23						100,00
66.0	RUA SUIPINO COLAÇO				54.413,01			54.413,01	54.413,01		
66.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				259,38			259,38	259,38		
66.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	786,00	0,33	259,38	705,27	705,27	232,74	232,74		10,27
66.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				53.807,94			53.807,94	53.807,94		
66.2.1	Pinura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	1.446,24	2,36	3.413,13	1.409,85	1.409,85	50.748,23	50.748,23		
66.2.2	CBUQ							3.327,25	3.327,25		2,52
66.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m³	21,69	1.207,08	26.181,57	19,73	19,73	23.815,69	23.815,69		9,04
66.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Reperfilamento	m³	21,69	1.093,55	23.719,10	21,16	21,16	23.139,52	23.139,52		2,44
66.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	43,38	3,87	167,88	40,89	40,89	158,24	158,24		5,74
66.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	299,32	1,09	326,26	282,14	282,14	307,53	307,53		5,74
66.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	3,00	115,23	345,69	2,00	2,00	230,46	230,46		33,33
66.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita										
67.0	RUA PROFESSOR CARIBA				129.521,65			114.597,69	114.597,69		
67.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				618,42			560,51	560,51		
67.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	1.874,00	0,33	618,42	1.696,50	1.696,50	560,51	560,51		9,36
67.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				128.327,08			113.806,72	113.806,72		
67.2.1	Pinura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	3.448,16	2,36	8.137,66	3.318,73	3.318,73	7.832,20	7.832,20		3,75
67.2.2	CBUQ										
67.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m³	51,72	1.207,08	62.430,18	45,37	45,37	54.765,22	54.765,22		12,28
67.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Reperfilamento	m³	51,72	1.093,55	56.558,41	45,86	45,86	50.150,20	50.150,20		11,33
67.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	103,44	3,87	400,31	91,23	91,23	353,06	353,06		11,80
67.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	734,42	1,09	800,52	647,74	647,74	706,04	706,04		11,80
67.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	5,00	115,23	576,15	2,00	2,00	230,46	230,46		60,00
67.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita										
68.0	RUA RAFAELA DE SOUZA E SILVA				797.492,55			760.804,38	760.804,38		

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
 Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng.º Civil - CREA DE BA 100.000.000/0001-00

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
 Coordenador de Planejamento Obras
 SECOP/IPMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
 RUA SUIPINO COLAÇO

		Grau de Sigilo Grau de Sigilo	
Nº do CTE (Contrato Execução/Contratante) 2.08.022/2020		Nº do CT 1.065.660-37	
Data de início - data 29/06/2020		Data do CT 01/07/20	
Previsão término da obra 26/07/2021		Tomador/Prestatador ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	
Valor total (incluindo IBS) 38.225.646,43		Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
CTEF - de assinatura CTEF - de assinatura		Fonte de Recursos outra (descrever)	
Local da obra (bairro/Município/UF) PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO		Fonte de Recursos outra (descrever)	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PRELIMINÁRIO DO ORÇAMENTO			EXECUÇÃO FÍSICA (QUANTITATIVOS)			EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$)			DESEJO (%)	
		unidade	qtdts.	preço unit.	preço total	acomodação (m³/tonelada)	montado no período	acumulado até período anterior	medido no período	acumulado incluindo o período		
68.1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
68.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	11.657,55	0,33	3.846,99	11.513,83	3.846,99	3.799,56	3.799,56	3.799,56	1,23	
68.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO											
68.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	21.204,62	2,36	791.962,80	20.935,85	791.962,80	757.004,82	757.004,82	757.004,82	1,27	
68.2.2	CBUQ											
68.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	318,07	1.207,08	383.935,94	303,16	383.935,94	365.938,37	365.938,37	365.938,37	4,69	
68.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reporfilamento	m³	318,07	1.083,55	347.825,45	303,57	347.825,45	331.968,97	331.968,97	331.968,97	4,56	
68.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	636,14	3,87	2.461,86	606,73	2.461,86	2.348,05	2.348,05	2.348,05	4,62	
68.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	7.061,15	1,09	7.696,65	6.734,70	7.696,65	7.340,82	7.340,82	7.340,82	4,62	
68.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA											
68.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	12,00	115,23	1.382,76		1.382,76				100,00	
69.0	RUJA JOSÉ DA GUJA FERREIRA											
69.1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
69.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	2.686,80	0,33	886,64	2.686,80	886,64	886,64	886,64	886,64		
69.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO											
69.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	4.836,24	2,36	180.539,10	4.836,24	180.539,10	175.675,65	175.675,65	175.675,65		
69.2.2	CBUQ											
69.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	72,54	1.207,08	87.561,56	68,55	87.561,56	82.745,33	82.745,33	82.745,33	5,50	
69.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reporfilamento	m³	72,54	1.093,55	79.326,12	72,54	79.326,12	79.326,12	79.326,12	79.326,12	2,11	
69.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	145,08	3,87	561,50	142,03	561,50	549,66	549,66	549,66	2,11	
69.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.537,95	1,09	1.676,37	1.505,51	1.676,37	1.641,01	1.641,01	1.641,01	2,11	
69.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA											
69.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	7,00	115,23	806,61		806,61				100,00	
70.0	RUJA DR. JOSÉ MOISÉS DE MEDEIROS NETO											
70.1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
70.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	2.376,00	0,33	789,08	2.172,34	789,08	716,87	716,87	716,87	8,57	
70.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO											
70.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	4.276,80	2,36	159.154,11	3.876,96	159.154,11	141.915,72	141.915,72	141.915,72	9,35	
70.2.2	CBUQ											
70.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	64,15	1.207,08	77.434,18	56,21	77.434,18	67.849,97	67.849,97	67.849,97	12,38	

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SECOP/PMCG

PREF. MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng.º Civil - PCCA nº 011.111/2011

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
 Engenharia, Arquitetura e Obras

CAIXA		RFB - número 10		RFB - Data emissão 05/05/2021		RFB - Período de validade de emissão de 25/03/2021 a 29/04/2021		Via do CT 01/07/20	
RFB - Contrato Específico (financiamento) 2.08.022/2020		Empresa Contratada CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA		Objeto do CFTF resumido		Número/UF do promotor ou tomador 1.095.660-37		Prestador de serviços	
Início da obra - data 29/06/2020		Previsão término da obra 26/07/2021		CFTF - Valor total inicial (R\$) 18.225.646,43		CFTF - Valor atual (R\$) 18.225.646,43		CFTF - Valor atual (R\$) 18.225.646,43	
CFTF - Valor atual (R\$) 18.225.646,43		CFTF - Valor atual (R\$) 18.225.646,43		CFTF - Valor atual (R\$) 18.225.646,43		CFTF - Valor atual (R\$) 18.225.646,43		CFTF - Valor atual (R\$) 18.225.646,43	
CFTF - Valor atual (R\$) 18.225.646,43		CFTF - Valor atual (R\$) 18.225.646,43		CFTF - Valor atual (R\$) 18.225.646,43		CFTF - Valor atual (R\$) 18.225.646,43		CFTF - Valor atual (R\$) 18.225.646,43	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO EMPENHO	PRESTADO NO EMPENHO			DESCRIÇÃO FÍSICO QUANTITATIVA			EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$)			CUSTO (R\$)
		UNID.	QTDZ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MÉDIO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MÉDIO NO PERÍODO	
70.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Reperflamento	m³	64,15	1.093,55	70.151,23	58,16	58,16	63.600,87	63.600,87	63.600,87	9,34
70.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	128,30	3,87	496,52	114,37	114,37	442,61	442,61	442,61	10,86
70.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	898,10	1,09	978,93	800,59	800,59	872,64	872,64	872,64	10,86
70.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	9,00	115,23	1.037,07	1.037,07	1.037,07				100,00
71.0	RUA FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA				2.270.847,37			1.780.895,02		1.780.895,02	
71.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				12.869,83			11.294,10		11.294,10	
71.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e gride	m²	38.999,49	0,33	12.869,83	34.224,56	34.224,56	11.294,10	11.294,10	11.294,10	12,24
71.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				2.256.825,24			1.751.647,29		1.751.647,29	
71.2.1	Pinura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	40.324,17	2,36	95.165,04	32.448,60	32.448,60	76.578,70	76.578,70	76.578,70	19,53
71.2.2	CBUQ										
71.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m³	1.617,58	1.147,56	1.856.270,10	1.199,59	1.199,59	1.376.601,50	1.376.601,50	1.376.601,50	25,84
71.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m³	119,59	1.207,08	144.354,70	119,47	119,47	144.209,85	144.209,85	144.209,85	0,10
71.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Reperflamento	m³	119,59	1.093,55	130.777,64	119,59	119,59	130.777,64	130.777,64	130.777,64	22,40
71.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	1.856,76	3,87	7.185,66	1.440,82	1.440,82	5.575,97	5.575,97	5.575,97	22,40
71.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	21.167,06	1,09	23.072,10	16.425,35	16.425,35	17.903,63	17.903,63	17.903,63	22,40
71.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	10,00	115,23	1.152,30						100,00
71.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita										
72.0	RUA OLINDINA P. DOS SANTOS				253.988,79			209.103,20		209.103,20	
72.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.223,03			1.041,54		1.041,54	
72.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e gride	m²	3.706,15	0,33	1.223,03	3.156,19	3.156,19	1.041,54	1.041,54	1.041,54	14,84
72.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				252.650,59			208.061,66		208.061,66	
72.2.1	Pinura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	6.781,18	2,36	16.003,58	5.625,47	5.625,47	13.276,11	13.276,11	13.276,11	17,04
72.2.2	CBUQ										
72.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m³	101,71	1.207,08	122.772,11	83,39	83,39	100.658,40	100.658,40	100.658,40	18,01
72.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Reperflamento	m³	101,71	1.093,55	111.224,97	84,08	84,08	91.945,68	91.945,68	91.945,68	17,33

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco dos Jesus C. Xavier
 Eng.º Civil - CREA nº 160.285/94-2

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obra
 SECOP/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
 Eng.º João Neto de Oliveira
 CREA 160.285/94-2

CAIXA		Nº do CTE (Contrato Executivo/funcionamento)		Nº do CTE		Grau de Sigilo	
2.08/02/2020		29/06/2020		1.065.600-37		Data do CT	
Início		Previsão término da obra		Comitê/CPA Promotor em Tomada de Preços		Data do CT	
26/07/2021		26/07/2021		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE		01/07/20	
CTE-		CTE - de assinatura		Agente Financeiro em Reg. Operador Repasse			
18.225.646/43				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
Valor atual (R\$)		CTE - de último Adm.		Fonte de Recursos		conta (descrição)	
18.225.646/43				Fonte de Recursos		conta (descrição)	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PREÇO NO EMPÍRICO			ENCARGO FÍSICO QUANTITATIVO			ENCARGO FINANCEIRO (R\$)			DEBITO (R)
		unidade	QTD	PREÇO UNIT.	Quantidade de Serviço Análise	Medida no Projeto	ACABADO INCLUINDO O PRELIMINAR	ACABADO INCLUINDO O PRELIMINAR	ACABADO INCLUINDO O PRELIMINAR		
72.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	203,43	3,87	787,27	167,47	167,47	648,11	648,11	17,68	
72.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.708,81	1,09	1.862,60	1.406,75	1.406,75	1.533,36	1.533,36	17,68	
72.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	1,00	115,23	115,23					100,00	
73.0	RUA ANTONIETA CAVALCANTE				245.714,58			239.200,45	239.200,45		
73.1	SERVÇOS PRELIMINARES				1.151,70			1.047,32	1.047,32		
73.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	3.490,00	0,33	1.151,70	3.173,70	3.173,70	1.047,32	1.047,32	9,06	
73.2	SERVÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				243.874,50			236.461,75	236.461,75		
73.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	6.421,60	2,36	15.154,98	6.347,40	6.347,40	14.979,86	14.979,86	1,16	
73.2.2	CBUC										
73.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUC, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Caixa	m³	98,32	1.207,08	118.680,11	95,21	95,21	114.926,09	114.926,09	3,16	
73.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUC, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperflamento	m³	98,32	1.093,55	107.517,84	95,21	95,21	104.116,90	104.116,90	3,16	
73.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	196,64	3,87	761,00	190,42	190,42	736,93	736,93	3,16	
73.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.612,45	1,09	1.757,57	1.561,44	1.561,44	1.701,97	1.701,97	3,16	
73.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	6,00	115,23	691,38	6,00	6,00	691,38	691,38		
73.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita				691,38			691,38	691,38		
74.0	RUA JOÃO JULIANO MARTINS				259.854,30			259.142,92	259.142,92		
74.1	SERVÇOS PRELIMINARES				1.269,03			1.269,03	1.269,03		
74.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	3.845,55	0,33	1.269,03	3.845,55	3.845,55	1.269,03	1.269,03		
74.2	SERVÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				257.873,89			257.873,89	257.873,89		
74.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	6.923,10	2,36	16.338,52	6.923,10	6.923,10	16.338,52	16.338,52		
74.2.2	CBUC										
74.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUC, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Caixa	m³	103,85	1.207,08	125.355,26	103,85	103,85	125.355,26	125.355,26		
74.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUC, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperflamento	m³	103,85	1.093,55	113.565,17	103,85	103,85	113.565,17	113.565,17		
74.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	207,70	3,87	803,80	207,70	207,70	803,80	803,80		
74.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.661,60	1,09	1.811,14	1.661,60	1.661,60	1.811,14	1.811,14		
74.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	6,00	115,23	691,38	6,00	6,00	691,38	691,38		
74.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita				691,38			691,38	691,38		
74.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita				691,38			691,38	691,38	100,00	

Constulora Rocha-Cavalcante Ltda.
 Eng. João Neto de Oliveira
 CREA 161645/BA-014

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
 FRANCISCO DE JESUS C. XAVIER
 Eng.º Cívil - CREA-PB Nº 160.293534-2

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 CREA 161645/BA-014

CAIXA Nº do CTE (Contrato Escrito)/fornecimento) 2.08.027/2020		Grau de Sigilo Data do CTE 01/07/20	
Início da obra - data 29/06/2020		Nº do CTE 1.065.600-37	
Previsão término da obra 26/07/2021		Inscricao/inscrição no Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	
Valor total inicial (R\$) 18.225.646,43		Agência Financiadora em R\$ Operadora Repasse CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
CTE - 18.225.646,43		Fonte de Recursos outa (descrever)	
CTE - 18.225.646,43		outa (descrever)	

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PREÇO POR QUANTIDADE			ESCALONAMENTO FÍSICO (QUANTITATIVOS)			ESCALONAMENTO FINANCEIRO (R\$)			
		UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ANULAÇÃO DE EMISSÃO ANTERIOR	MÉDIO DO PERÍODO	ACUMULADO INCLUIDO O PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	MÉDIO DO PERÍODO	ACUMULADO INCLUIDO O PERÍODO
75.0	RUA JOSÉ GONÇALVES DE MELO				149.467,13				142.791,50		142.791,50
75.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				711,68				682,76		682,76
75.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	2.156,60	0,33	711,68	2.068,96	2.068,96		682,76		682,76
75.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				148.524,99				142.108,74		142.108,74
75.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	3.990,08	2,36	9.416,59	3.817,42	3.817,42		9.009,11		9.009,11
75.2.2	CBUQ										4,33
75.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m³	59,85	1.207,08	72.243,74	57,26	57,26		69.117,40		69.117,40
75.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Reperflamento	m³	59,85	1.093,55	65.448,97	57,27	57,27		62.627,61		62.627,61
75.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com cariminhão basculante de 10 m³, descarrega em vibro-acaibadora	m³	119,70	3,87	463,24	114,53	114,53		443,23		443,23
75.2.4	Transporte com cariminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	873,81	1,09	952,45	836,14	836,14		911,39		911,39
75.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				230,46						100,00
75.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	2,00	115,23	230,46						100,00
76.0	PLACAS DE OBRAS (42,0 m - 10 PLACAS)				37.667,20				37.667,20		37.667,20
76.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				37.667,20				37.667,20		37.667,20
76.1.1	Placa da Obra	m²	80,00	470,84	37.667,20	80,00	80,00		37.667,20		37.667,20
77.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (12 MESES DE OBRA)				296.880,62				224.027,59		243.820,62
77.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				296.880,62				224.027,59		243.820,62
77.1.1	Administração Local da Obra (12 meses de obra)	unidade	1,00	296.880,62	296.880,62	0,7546	0,8213		19.793,03		243.820,62
78.0	LABORATÓRIO DE BETUME (BID DE 26,85%)				50.466,24				38.349,54		41.714,12
78.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				50.466,24				38.349,54		41.714,12
78.1.1	Laboratório de Betume (BID de 26,85%)	mês	12,00	4.205,52	50.466,24	0,7629	0,8206		3.364,58		41.714,12
				TOTAL	18.225.646,43				14.009.336,52		15.247.591,90
				TOTAL					1.238.258,38		16,34

Campina Grande, 05 de maio de 2021

LOCAL DATA
PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng. Civil - CREA-PE nº 169.700-7

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SECOP/PMCG

Assinatura do Agente Promotor/Matutino
Constineira Rocha Cavalcante Ltda.
 Emp. Junta Neto de Offheira
 CREA 169605509DPE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIROS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTAÇÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCONGÓ, SANTA CRUZ, DINAMÉRICA, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCONGÓ, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTÃO, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	SERVIÇOS	ESTACA					Área (AutoCAD)	Altura	Volume	N.V.	dmt	QUANTIDADES		OBSERVAÇÃO
		Inicial	Final	Comp. (AutoCAD)	Larg. (média)	Final						Parcial	Total	
1.0	RUA ÍNDIOS CABIRIS													
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	0,00 + 0,00	10,00 + 0,08	200,08	8,03	1606,64						1606,64	Trecho 01	
		0,00 + 0,00	5,00 + 18,67	118,67	8,12	963,60						963,60	Trecho 02	
		0,00 + 0,00	6,00 + 1,51	121,51	8,06	981,80						981,80	Trecho 03	
												Executado: 3552,04 m²		
1.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO													
1.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	0,00 + 0,00	10,00 + 0,08	200,08	7,23	1447,03			1,00			1447,03	Trecho 01	
		0,00 + 0,00	5,00 + 18,67	118,67	7,32	868,98			1,00			868,98	Trecho 02	
		0,00 + 0,00	6,00 + 1,51	121,51	7,28	885,05			1,00			885,05	Trecho 03	
												Executado: 3201,06 m²		
1.2.2	CRUQ													
1.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	0,00 + 0,00	10,00 + 0,08	200,08	7,23	1447,03	0,048	69,46	1,00			69,46	Trecho 01	
		0,00 + 0,00	5,00 + 18,67	118,67	7,32	868,98	0,048	41,71	1,00			41,71	Trecho 02	
		0,00 + 0,00	6,00 + 1,51	121,51	7,28	885,05	0,047	41,60	1,00			41,60	Trecho 03	
												Executado: 152,77 m³		
1.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora													
									1,00			152,77	(VIDE CBUQ/CAPA)	
												Executado: 152,77 m³		
1.2.4	Transporte local de material betuminoso									12,30				
												1879,07	(VIDE CBUQ/CAPA)	
												Executado: 1879,07 m³ x km		
3.0	RUA FÉLIX ARAÚJO													
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
3.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	0,00 + 0,00	14,00 + 19,96	299,96	9,33	2798,63						2798,63	Trecho 01	
												Executado: 2798,63 m²		
3.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO													
3.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	0,00 + 0,00	14,00 + 19,96	299,96	8,53	2560,05			1,00			2560,05	Trecho 01	
												Executado: 2560,05 m²		
3.2.2	CBUQ													
3.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	0,00 + 0,00	14,00 + 19,96	299,96	8,53	2560,05	0,049	125,44	1,00			125,44	Trecho 01	
												Executado: 125,44 m³		
3.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora													
									1,00			125,44	(VIDE CBUQ/CAPA)	
												Executado: 125,44 m³		

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Urban
 SFCOR/PMCC

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng. Civil - CREA/PB nº 150.208/2012

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
Eng. João Neto de Oliveira
 CREA - 150.208/2012



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO
MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	SERVIÇOS	ESTACA				Comp. (AutoCAD)	Larg. (média)	Área (AutoCAD)	Altura	Volume	N.V.	dnt	QUANTIDADES		OBSERVAÇÃO
		Inicial	Final	Comp. (AutoCAD)	Parciais								Totais		
3.2.4	Transporte local de material betuminoso								125,44		12,60	1580,54 Executado:		(VIDE CBUQ, CAPA) 1580,54 m² x km	
4.0	RUA MIGUEL BARRETO														
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES														
4.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	0,00 + 0,00	4,00 + 12,67	92,67	4,08	378,09						378,09		Trecho 01	
		0,00 + 0,00	3,00 + 8,61	68,61	4,04	277,18						277,18		Trecho 02	
												655,27		655,27 m²	
4.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO														
4.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	0,00 + 0,00	4,00 + 12,67	92,67	3,28	304,26						608,52		Trecho 01	
		0,00 + 0,00	3,00 + 8,61	68,61	3,24	222,57						445,14		Trecho 02	
												1053,66		1053,66 m²	
4.2.2	CBUQ														
4.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	0,00 + 0,00	4,00 + 12,67	92,67	3,28	304,26	0,03		9,13	1,00		9,13		Trecho 01	
		0,00 + 0,00	3,00 + 8,61	68,61	3,24	222,57	0,03		6,68	1,00		6,68		Trecho 02	
												15,81		15,81 m³	
4.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_05/2017. - Reperfilamento	0,00 + 0,00	4,00 + 12,67	92,67	3,28	304,26	0,028		8,52	1,00		8,52		Trecho 01	
		0,00 + 0,00	3,00 + 8,61	68,61	3,24	222,57	0,029		6,45	1,00		6,45		Trecho 02	
												14,97		14,97 m³	
4.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora														
									15,81	1,00		15,81		(VIDE CBUQ, CAPA)	
									14,97	1,00		14,97		(VIDE CBUQ, REPERFILAMENTO)	
												30,78		30,78 m³	
4.2.4	Transporte local de material betuminoso														
									15,81	1,00		15,81		(VIDE CBUQ, CAPA)	
									14,97	1,00		14,97		(VIDE CBUQ, REPERFILAMENTO)	
												189,72		189,72 m² x km	
5.0	RUA TEODÓSIO DE OLIVEIRA LIDO														
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES														
5.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	0,00 + 0,00	5,00 + 11,57	111,57	6,45	719,63						719,63		Trecho 01	
		0,00 + 0,00	1,00 + 4,83	24,83	7,23	179,52						179,52		Trecho 02	
												899,15		899,15 m²	
5.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO														
5.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	0,00 + 0,00	5,00 + 11,57	111,57	5,85	630,90						630,90		Trecho 01	
		0,00 + 0,00	1,00 + 4,83	24,83	6,43	159,77						159,77		Trecho 02	
												790,67		790,67 m²	

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SECOP/PMCG

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
Francisco dos Jesus C. Xavier
 Eng. Civil - CREA/PB Nº 180.203534-2

Consulora Rocha Cavalcante Ltda.
 Eng. João Neto de Oliveira
 PDEA - Engenharia



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO
MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	SERVIÇOS	ESTACA					QUANTIDADES			OBSERVAÇÃO				
		Inicial	Final	Comp. (AutoCAD)	Larg. (média)	Área (AutoCAD)	Altura	Volume	N.V.		dint	Parciais	Totais	
5.2.2	CBUQ													
5.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_09/2017. - Capa	0,00 + 0,00	5,00 + 11,57	111,57	5,65	630,90	0,047	29,65	1,00		29,65	Trecho 01		
		0,00 + 0,00	1,00 + 4,83	24,83	6,43	159,77	0,049	7,83	1,00		7,83	Trecho 02		
											37,48	Executado:	37,48 m³	
5.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora							37,48	1,00		37,48	Executado:	37,48 m³	
5.2.4	Transporte local de material betuminoso							37,48	10,10		378,55	Executado:	378,55 m³ x km	
6.0	RUA FRIE CANECA													
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
6.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	0,00 + 0,00	2,00 + 10,83	50,83	5,36	272,45		272,45	1,00		272,45	Trecho 01		
		0,00 + 0,00	22,00 + 3,80	443,80	5,97	2649,49		2649,49	1,00		2649,49	Trecho 02		
											2921,94	Executado:	2921,94 m³	
6.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO													
6.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	0,00 + 0,00	2,00 + 10,83	50,83	4,56	231,56		231,56	1,00		231,56	Trecho 01		
		0,00 + 0,00	22,00 + 3,80	443,80	5,17	2296,49		2296,49	1,00		2296,49	Trecho 02		
											2528,05	Executado:	2528,05 m³	
6.2.2	CBUQ													
6.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_09/2017. - Capa	0,00 + 0,00	2,00 + 10,83	50,83	4,56	231,56	0,05	11,58	1,00		11,58	Trecho 01		
		0,00 + 0,00	22,00 + 3,80	443,80	5,17	2296,49	0,05	114,82	1,00		114,82	Trecho 02		
											126,40	Executado:	126,40 m³	
6.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora							126,40	1,00		126,40	Executado:	126,40 m³	
6.2.4	Transporte local de material betuminoso							126,40	9,70		1226,08	Executado:	1226,08 m³ x km	
34.0	RUA PEDRO II													
34.1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
34.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	0,00 + 0,00	28,00 + 9,66	569,66	9,95	5668,12		5668,12	1,00		5668,12	Trecho 01		
		0,00 + 0,00	6,00 + 6,65	126,05	10,04	1271,57		1271,57	1,00		1271,57	Trecho 02		
											6939,69	Executado:	6939,69 m³	
34.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO													

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SECOP/PMCC

PROF. MUNIC. DE GRANDE CAMPINA GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng.º Civil - CREA-PB Nº 160.293534-2

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
Eng. João Neto de Oliveira
 CREA - 468895268-DF/PB



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS


RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIROS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTAÇÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCONGÓ, SANTA CRUZ, DINAMÉRICA, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCONGÓ, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTÃO, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA

PLANTA (CROQUI)



Rua João Pessoa

Rua Índios Cariris - Trecho 01



01 - Planta Baixa Estaqueamento

Rua João Pessoa

Rua Índios Cariris - Trecho 01


Area Total = 1.447,03 m²

02 - Planta Baixa com Pavimentação Asfáltica (Capa)

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SECOB/PMCG

Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: Índios Cariris - Trecho 01	
Bairro: Centro	
Data/Ano: abril/2021	Prancha: 1/3
RUA ÍNDIOS CARIRIS - TRECHO 01	
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²
ÁREA DA RUA - CAPA	1.447,03 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	200,08 m
LARGURA DA RUA (média)	7,23 m

03 - Planta de Situação

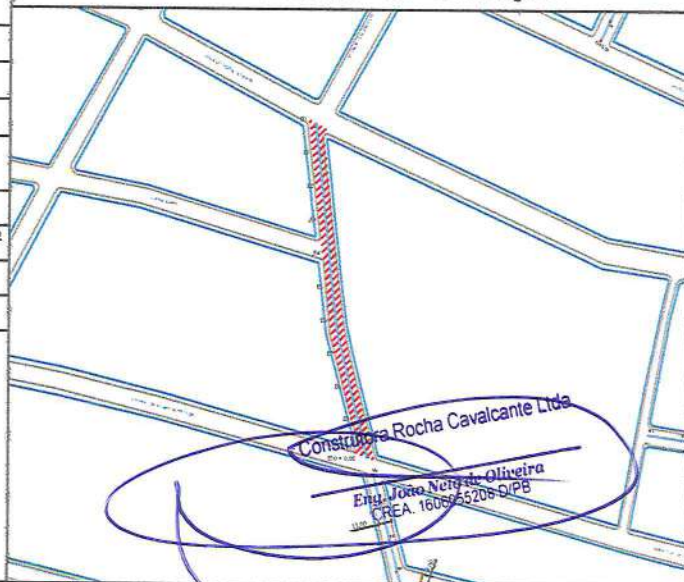


PREF. MUNIC. DE G. GRANDE
 Francisco de Jesus C. Xavier
 1º Cmt. - CREA-PB Nº 160.293534-2

Construtora Rocha Cavalcante Ltda
 Eng. João Neto de Oliveira
 CREA. 160855208-D/PB




Av. Presidente Getúlio Vargas

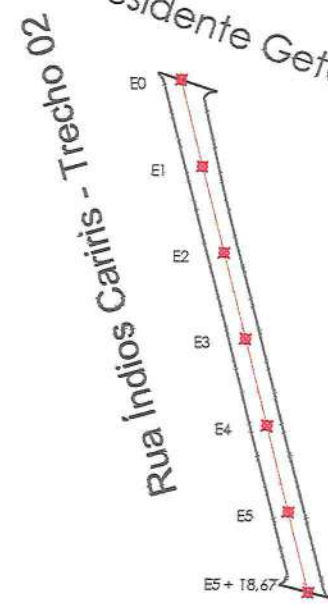

01 - Planta Baixa Estaqueamento

Av. Presidente Getúlio Vargas

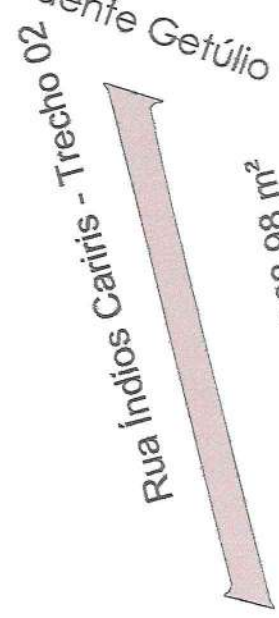


Área Total = 868,98 m²

02 - Planta Baixa com Pavimentação Asfáltica (Capa)


Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SECOB/PMCG

Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: Índios Cariris - Trecho 02	
Bairro: Centro	
Data/Ano: abril/2021	Prancha: 2/3
RUA ÍNDIOS CARIRIS - TRECHO 02	
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²
ÁREA DA RUA - CAPA	868,98 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	118,67 m
LARGURA DA RUA (média)	7,32 m

03 - Planta de Situação

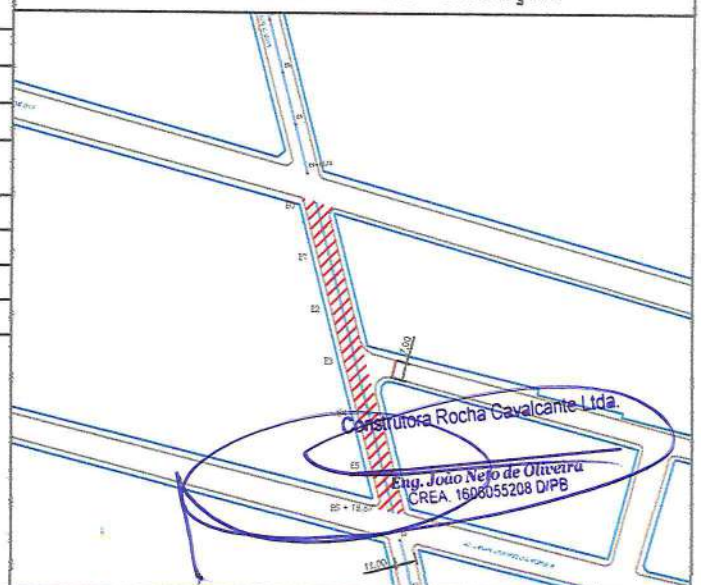

REF. MUNIC. DE C. GRANDE
 Francisco da Jesus C. Xavier
 CREA-PB Nº 160.283534-2

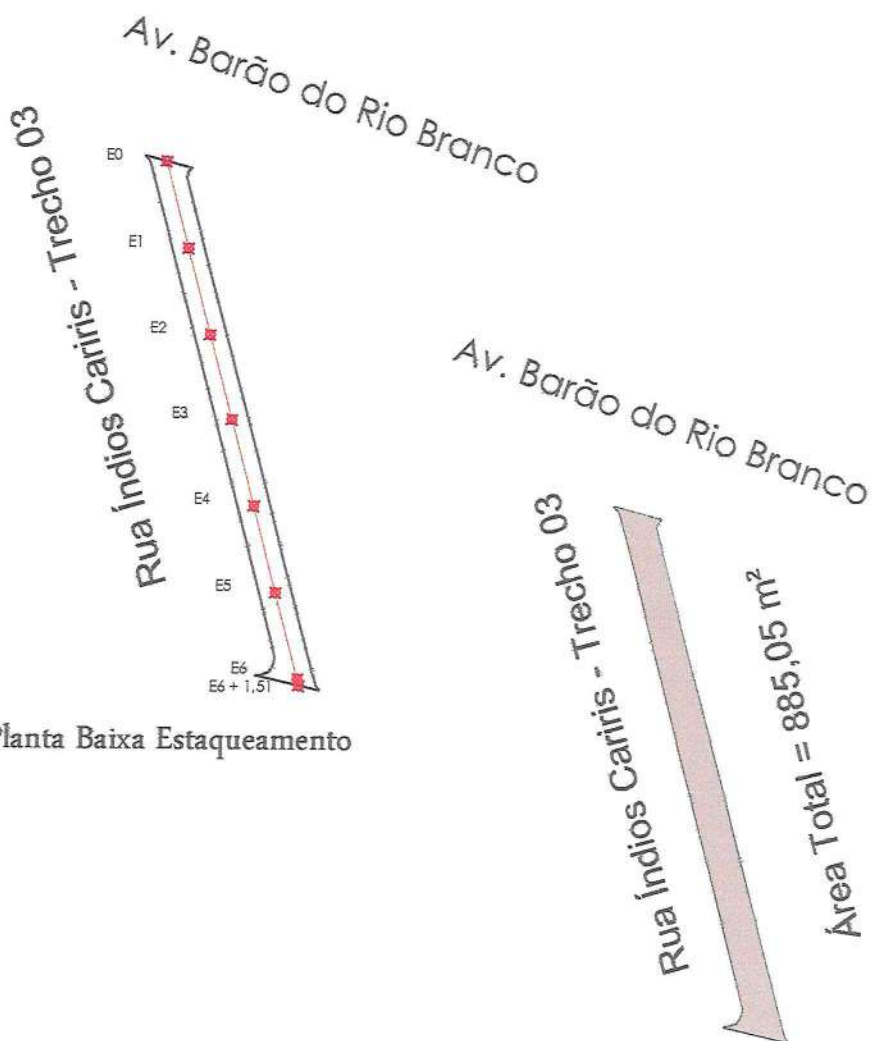


01 - Planta Baixa Estaqueamento

02 - Planta Baixa com Pavimentação Asfáltica (Capa)

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SECOB/PMCG


Proprietário:	Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto:	Pavimentação Asfáltica	
Rua:	Índios Cariris - Trecho 03	
Bairro:	Centro	
Data/Ano:	abril/2021	Prancha: 3/3
RUA ÍNDIOS CARIRIS - TRECHO 03		
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²	
ÁREA DA RUA - CAPA	885,05 m ²	
COMPRIMENTO DO EIXO	121,51 m	
LARGURA DA RUA (média)	7,28 m	

03 - Planta de Situação

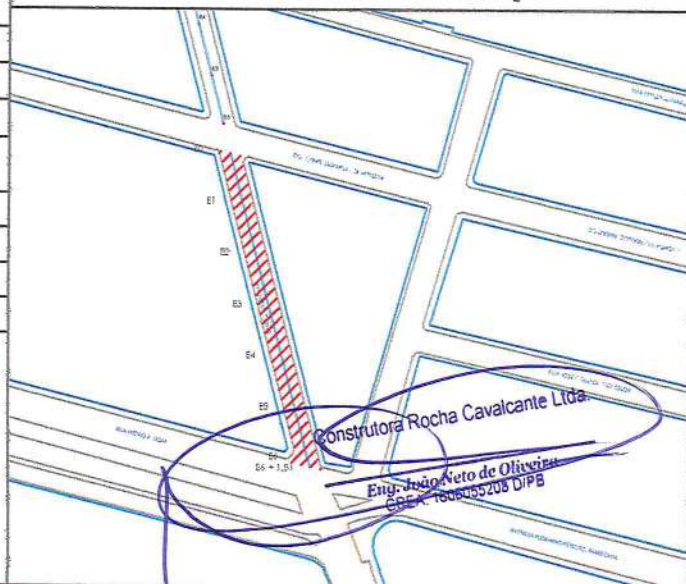


PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
 Francisco de Jesus C. Xavier
 Engº Civil - CREA-PB Nº 160.283534-2

Construtora Rocha Cavalcante Ltda
 Eng. João Neto de Oliveira
 CREA - 160655208 D/PE



01 - Planta Baixa Estaqueamento




Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SECOB/PMCG

02 - Planta Baixa com Pavimentação Asfáltica (Capa)




Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: Félix Araújo	
Bairro: Centro	
Data/Ano: abril/2021	Prancha: 1/1
RUA FÉLIX ARAÚJO	
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²
ÁREA DA RUA – CAPA	2.560,05 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	299,96 m
LARGURA DA RUA (média)	8,53 m

03 – Planta de Situação

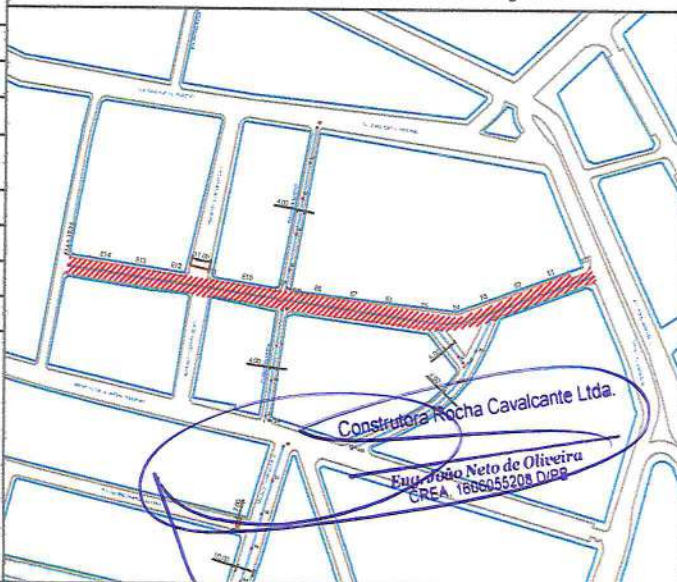

[Signature]
 PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
 Eng. João C. Xavier
 CREA-PA Nº 160.28351-1

01 - Planta Baixa Estaqueamento

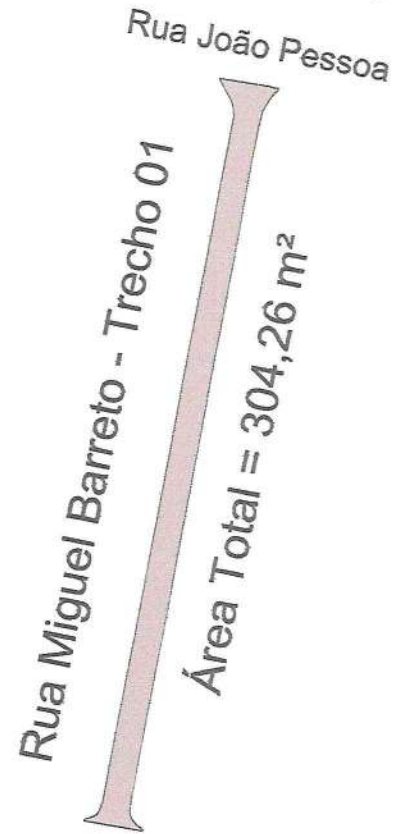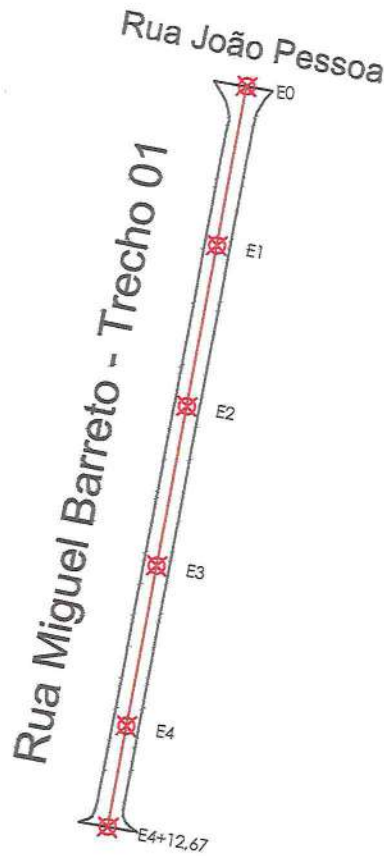


02 - Planta Baixa com Pavimentação Asfáltica (Reperfilamento e Capa)

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SECOP/PMCG



Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: Miguel Barreto - Trecho 01	
Bairro: Centro	
Data/Ano: abril/2021	Francha: 1/2
RUA MIGUEL BARRETO - TRECHO 01	
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²
ÁREA DA RUA - REPERFILAMENTO E CAPA	304,26 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	92,67 m
LARGURA DA RUA (média)	3,28 m

PREF. MUNIC. DE C. GRANL.
 Francisco de Jesus C. Xavier
 Engº Civil - CREA-PB Nº 160 29352-4-7

03 - Planta de Situação

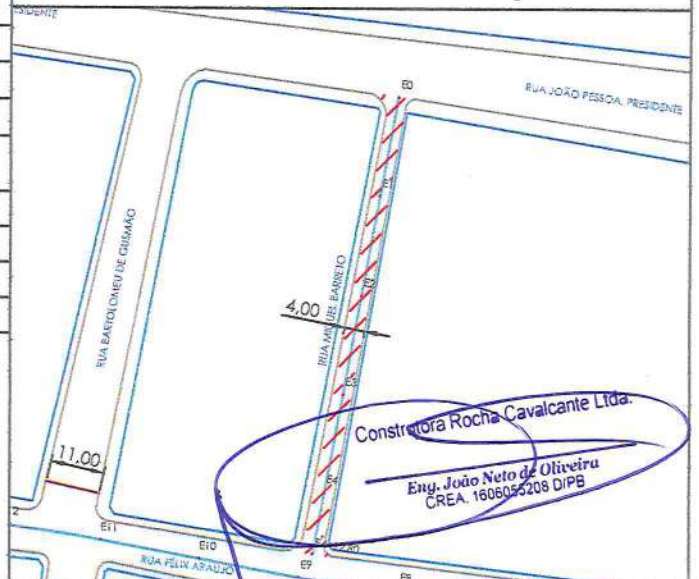

01 - Planta Baixa Estaqueamento

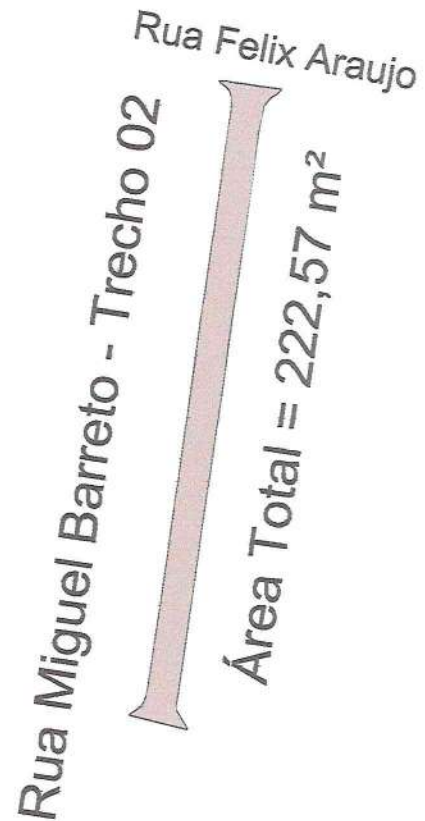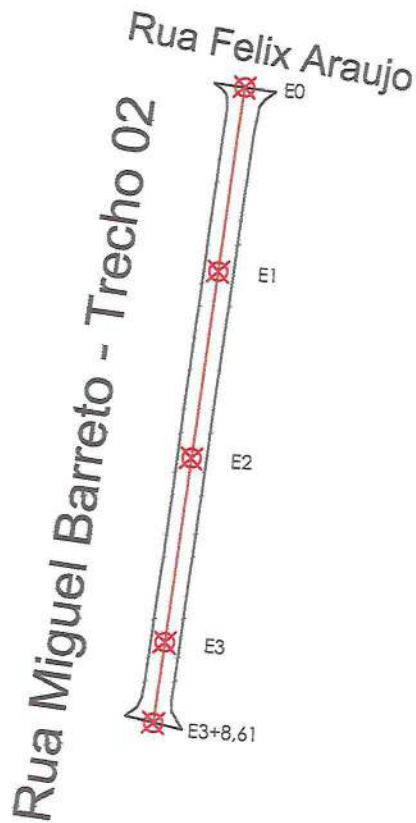


02 - Planta Baixa com Pavimentação Asfáltica (Reperfilamento e Capa)


Adriano Gomes do Nascimento
Coordenador de Planejamento Obras
SECOB/PMCS

Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: Miguel Barreto - Trecho 02	
Bairro: Centro	
Data/Ano: abril/2021	Prancha: 2/2
RUA MIGUEL BARRETO - TRECHO 02	
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²
ÁREA DA RUA - REPERFILAMENTO E CAPA	222,57 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	68,61 m
LARGURA DA RUA (média)	3,24 m

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
Eng.º Cível - CREA-PB Nº 160 283534-2

03 - Planta de Situação

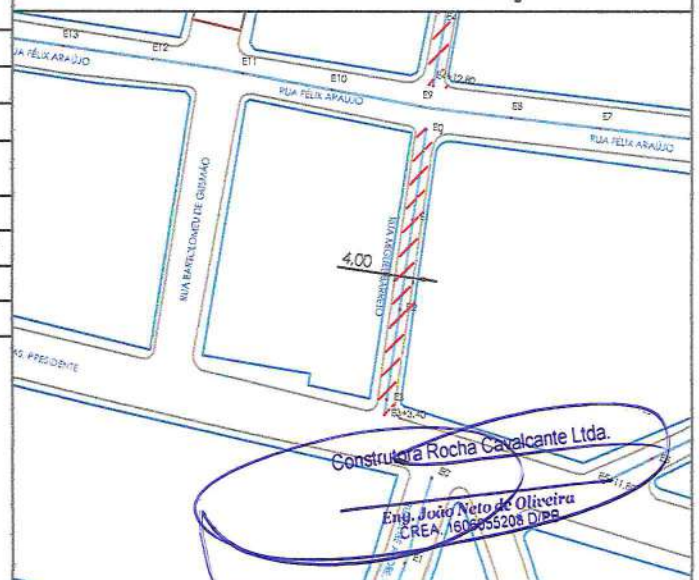

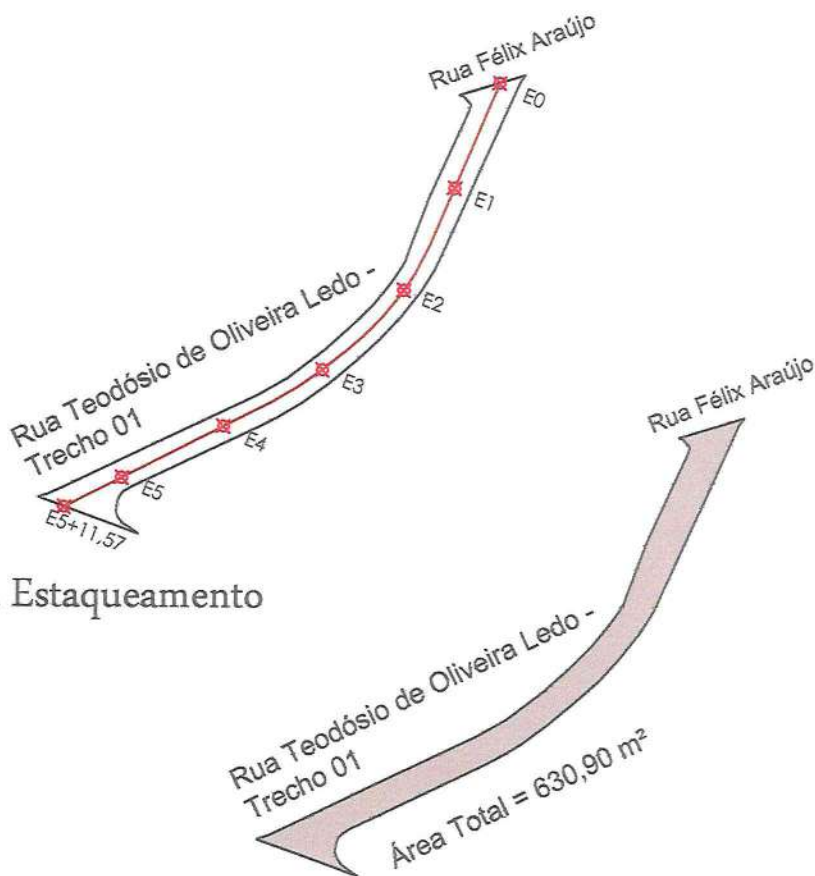


01 - Planta Baixa Estaqueamento

02 - Planta Baixa com Pavimentação Asfáltica (Capa)

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SECOB/PMCG

Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: Teodósio de Oliveira Ledo – Trecho 01	
Bairro: Centro	
Data/Ano: abril/2021	Prancha: 1/2
RUA TEODÓSIO DE OLIVEIRA LEDO – TRECHO 01	
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²
ÁREA DA RUA – CAPA	630,90 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	111,57m
LARGURA DA RUA (média)	5,65 m


03 – Planta de Situação

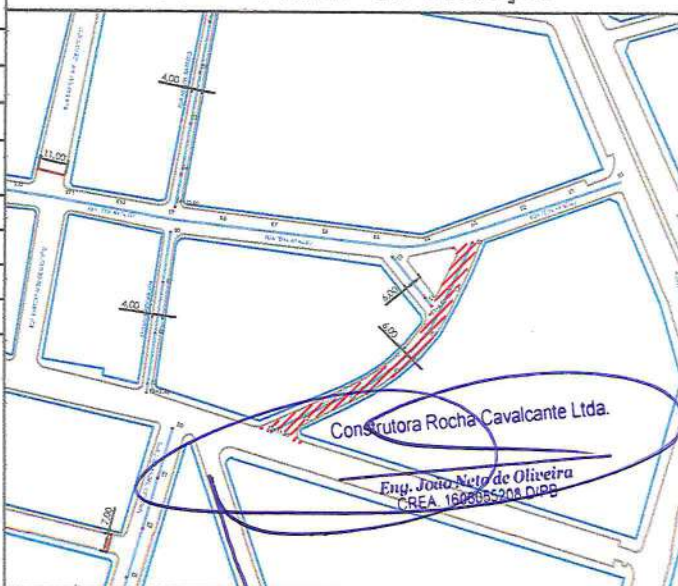

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
 Francisco de Jesus C. Xavier
 Engº Cmtl. - CREA-PB Nº 160.283524-2




Rua Félix Araújo

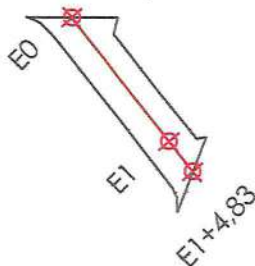

Rua Teodósio de Oliveira Ledo -
Trecho 02

01 - Planta Baixa Estaqueamento

Rua Félix Araújo



Área Total = 159,77 m²


Rua Teodósio de Oliveira Ledo -
Trecho 02

02 - Planta Baixa com Pavimentação Asfáltica (Capa)

Adriano Gomes do Nascimento
Coordenador de Planejamento Obras
SECOB/PMCG

Proprietário:	Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto:	Pavimentação Asfáltica	
Rua:	Teodósio de Oliveira Ledo - Trecho 02	
Bairro:	Centro	
Data/Ano:	abril/2021	Prancha: 2/2
RUA TEODÓSIO DE OLIVEIRA LEDO - TRECHO 02		
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²	
ÁREA DA RUA - CAPA	159,77 m ²	
COMPRIMENTO DO EIXO	24,83 m	
LARGURA DA RUA (média)	6,43 m	

03 - Planta de Situação


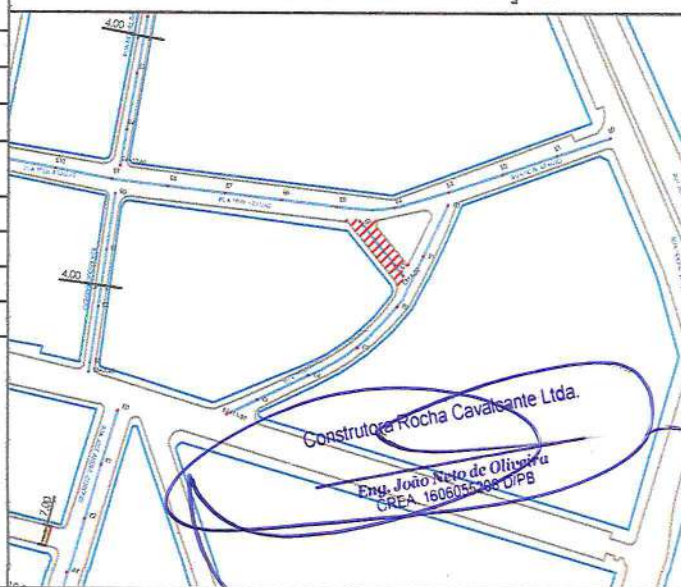


PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
Eng.º Civil - CREA-PB Nº 160.283534-2

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
Eng.º João Neto de Oliveira
CREA 1606056288-0/PPB



01 - Planta Baixa Estaqueamento

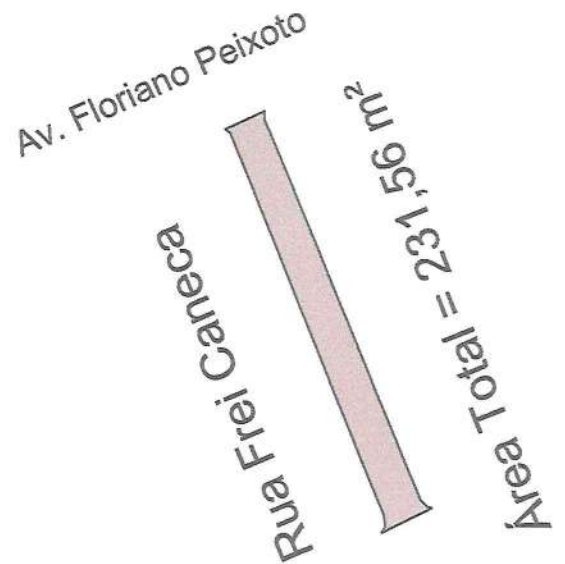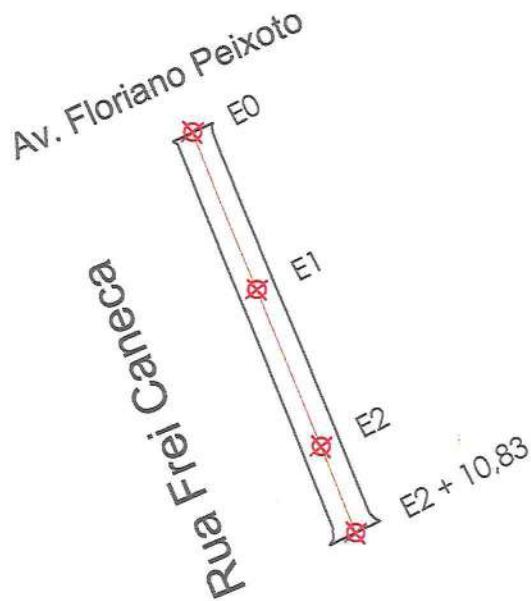


02 - Planta Baixa com Pavimentação Asfáltica (Capa)

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SECOB/PMCG


Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: Frei Caneca – Trecho 01	
Bairro: Centro	
Data/Ano: abril/2021	Prancha: 1/2
RUA FREI CANECA – TRECHO 01	
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²
ÁREA DA RUA – CAPA	231,56 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	50,83 m
LARGURA DA RUA (média)	4,55 m

03 – Planta de Situação

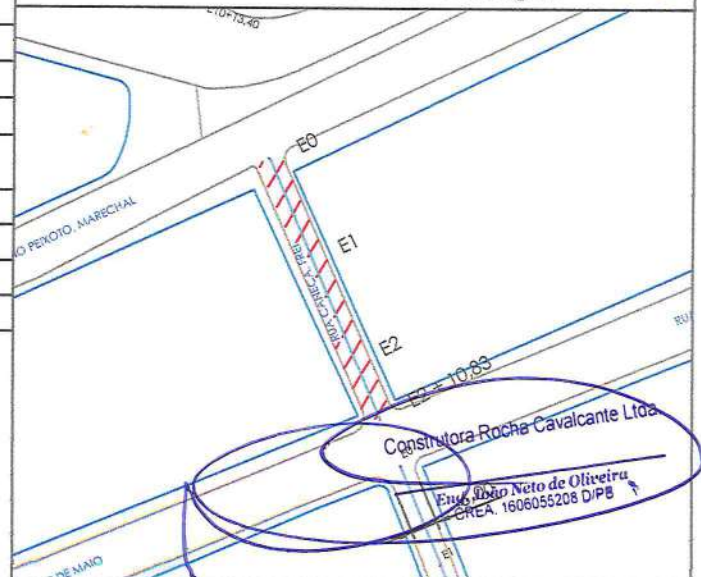


PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
 Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng.º Cmt. - CREA-PB Nº 160.283534-2

Eng.º Fábio Neto de Oliveira
 CREA. 1606055208 D/IPB

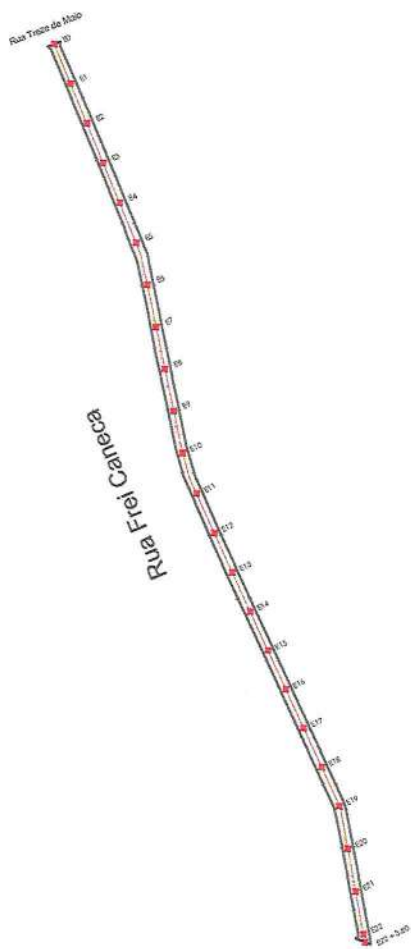

01 - Planta Baixa Estaqueamento

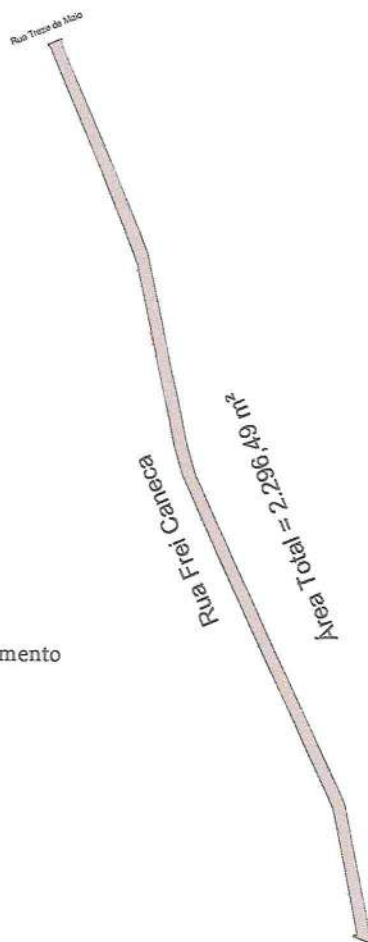


02 - Planta Baixa com Pavimentação Asfáltica (Capa)

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SECOB/PMCG

Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: Frei Caneca - Trecho 02	
Bairro: Centro	
Data/Ano: abril/2021	Prancha: 2/2
RUA FREI CANECA - TRECHO 02	
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²
ÁREA DA RUA - CAPA	2.296,49 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	443,80 m
LARGURA DA RUA (média)	5,17 m

03 - Planta de Situação

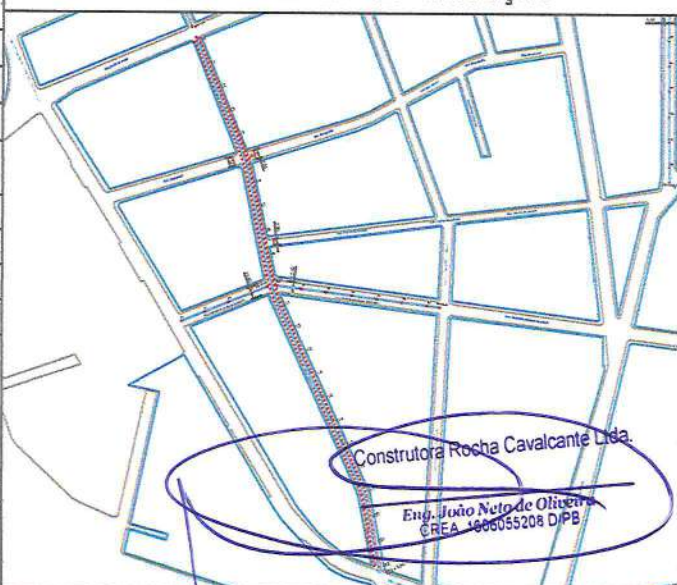


PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
 FRANCISCO DE JESUS C. XAVIER
 Lag. CMI - CREA-PB Nº 180.8935-34-2

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
 Eng. João Neto de Oliveira
 CREA 3066055208 D/PB



01 - Planta Baixa Estaqueamento

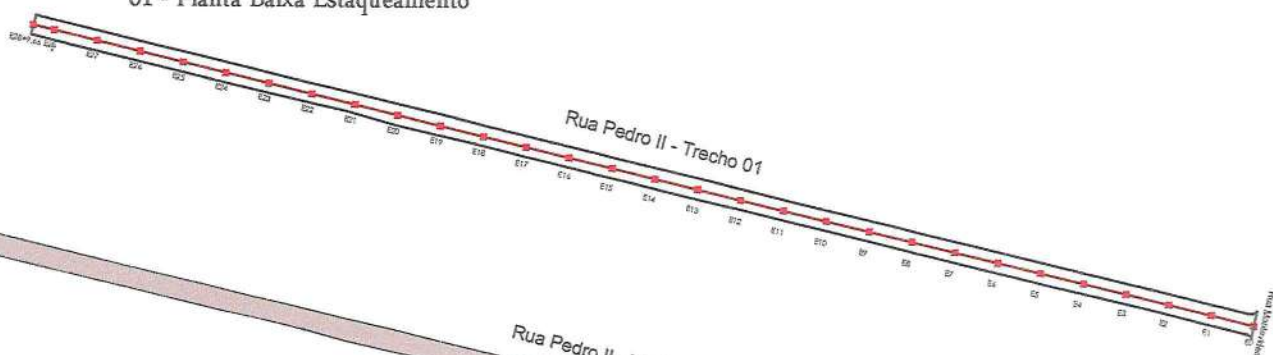


02 - Planta Baixa com Pavimentação Asfáltica (Capa)

Rua Pedro II - Trecho 01
 Área Total = 5.214,76 m²

Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SECOB/PMCG

Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: Pedro II - Trecho 01	
Bairro: Bela Vista	
Data/Ano: abril/2021	Prancha: 1/2
RUA PEDRO II - TRECHO 01	
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²
ÁREA DA RUA - CAPA	5.214,76 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	569,66 m
LARGURA DA RUA (média)	9,15 m

03 - Planta de Situação


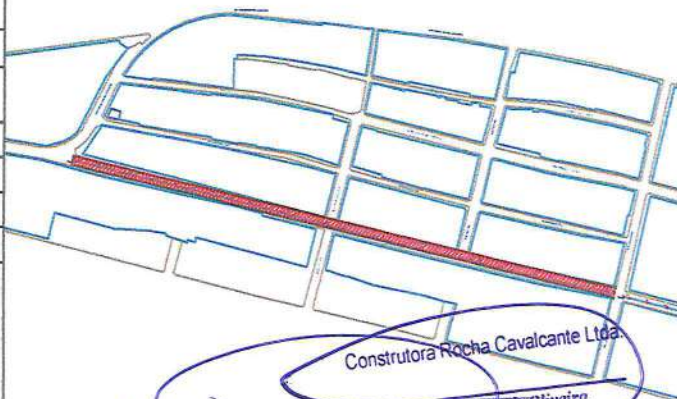


PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco da Jesus C. Xavier
 Eng^o Civil - CREA-PB Nº 160.293534-2

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

Eng. João Neto de Oliveira
 CREA. 1586056208 D/1PB

01 - Planta Baixa Estaqueamento

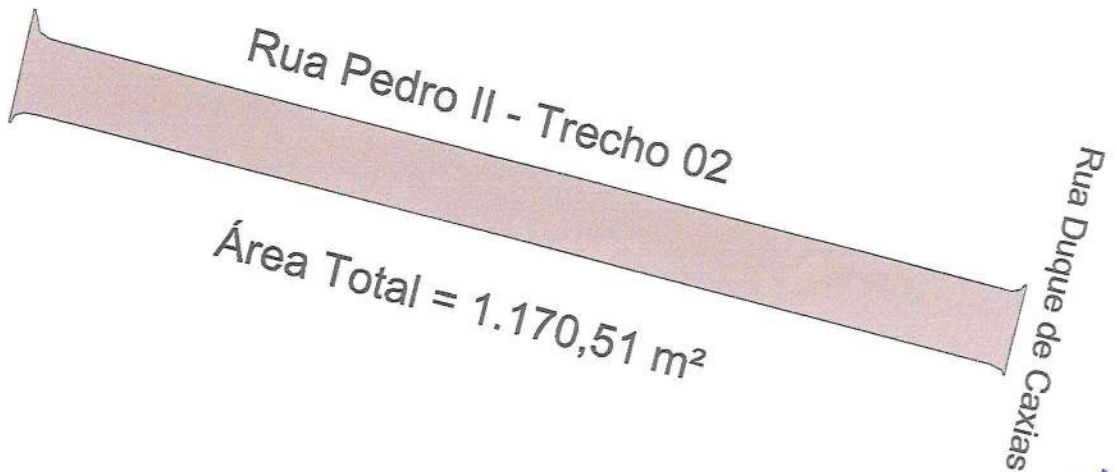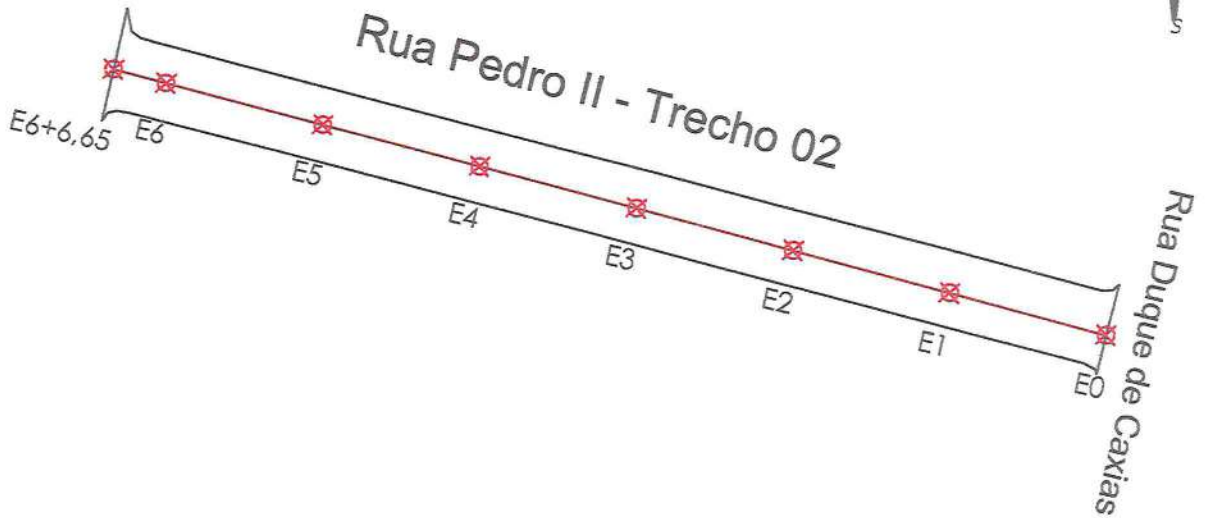


02 - Planta Baixa com Pavimentação Asfáltica (Capa)


Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SECOB/PMCG

Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: Pedro II - Trecho 02	
Bairro: Bela Vista	
Data/Ano: abril/2021	Prancha: 2/2
RUA PEDRO II - TRECHO 02	
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²
ÁREA DA RUA - CAPA	1.170,51 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	126,65 m
LARGURA DA RUA (média)	9,24 m


PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
 Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng.º Civil - CREA-PB Nº 100.293534-2

03 - Planta de Situação

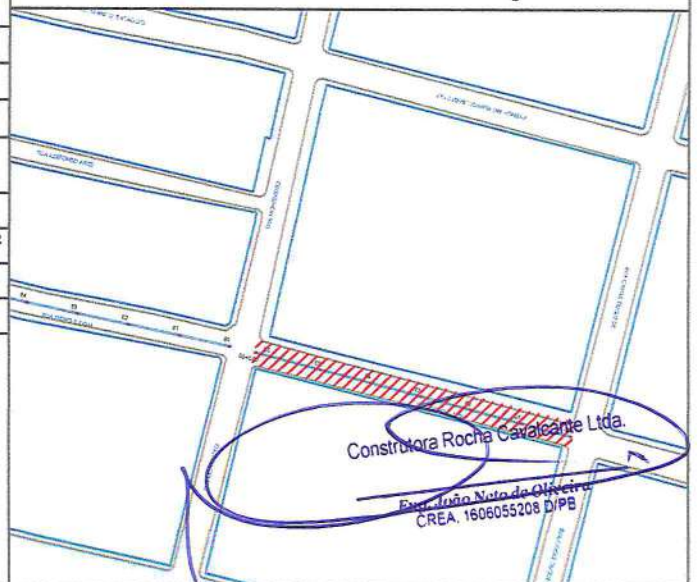

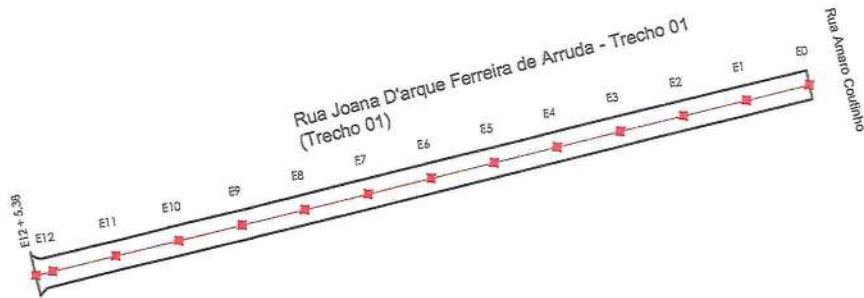

01 - Planta Baixa Estaqueamento

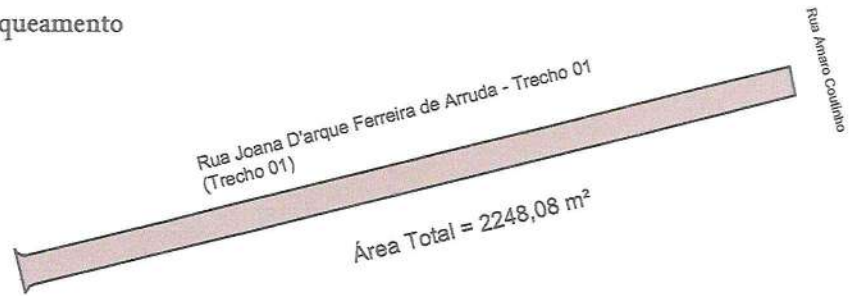


02 - Planta Baixa com Pavimentação Asfáltica (Capa)


Adriano Gomes do Nascimento
 Coordenador de Planejamento Obras
 SECOB/PMCG

Proprietário:	Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto:	Pavimentação Asfáltica	
Rua:	Rua Joana D'arque Ferreira de Arruda Trecho 01 (Trecho 01)	
Bairro:	José Pinheiro	
Data/Ano:	abril/2021	Prancha: 1/2
JOANA D'ARC DE ARRUDA – TRECHO 01 (TRECHO 01)		
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²	
ÁREA DA RUA – CAPA	2.248,08 m ²	
COMPRIMENTO DO EIXO	245,38 m	
LARGURA DA RUA (média)	9,16 m	

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
 Francisco de Jesus C. Xavier
 Engº Cml. - CREA-PB Nº 160.283534-2

03 – Planta de Situação

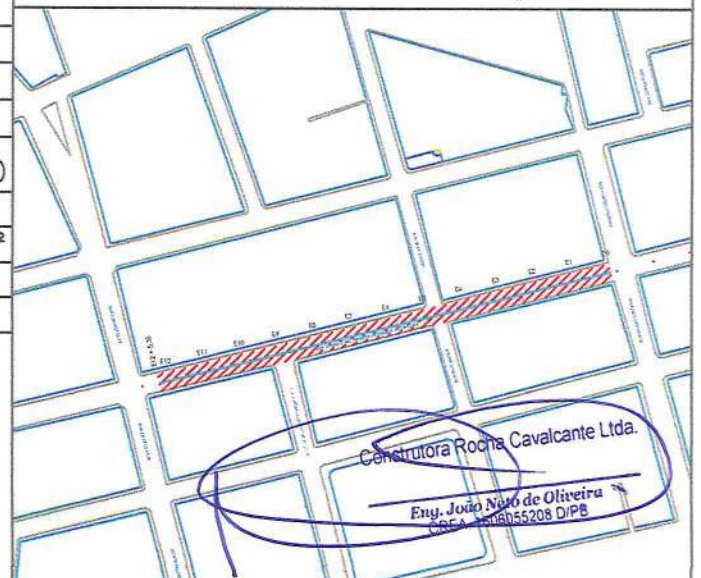

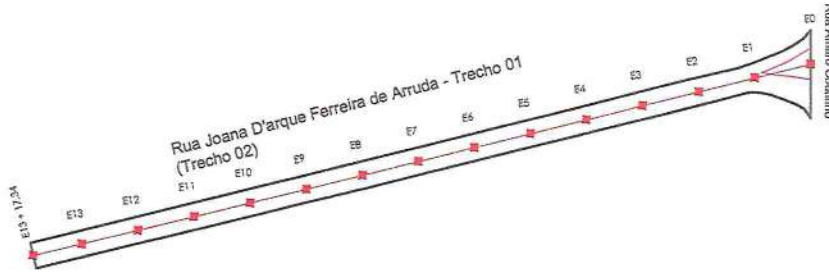

01 - Planta Baixa Estaqueamento




02 - Planta Baixa com Pavimentação
Asfáltica (Capa)

Adriano Gomes do Nascimento
Coordenador de Planejamento Obras
SECOB/PMCG

Proprietário:	Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto:	Pavimentação Asfáltica	
Rua:	Rua Joana D'arque Ferreira de Arruda Trecho 01 (Trecho 02)	
Bairro:	José Pinheiro	
Data/Ano:	abril/2021	Prancha: 2/2
JOANA D'ARC DE ARRUDA – TRECHO 01 (TRECHO 02)		
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²	
ÁREA DA RUA – CAPA	2.626,88 m ²	
COMPRIMENTO DO EIXO	277,34 m	
LARGURA DA RUA (média)	9,47 m	

03 – Planta de Situação

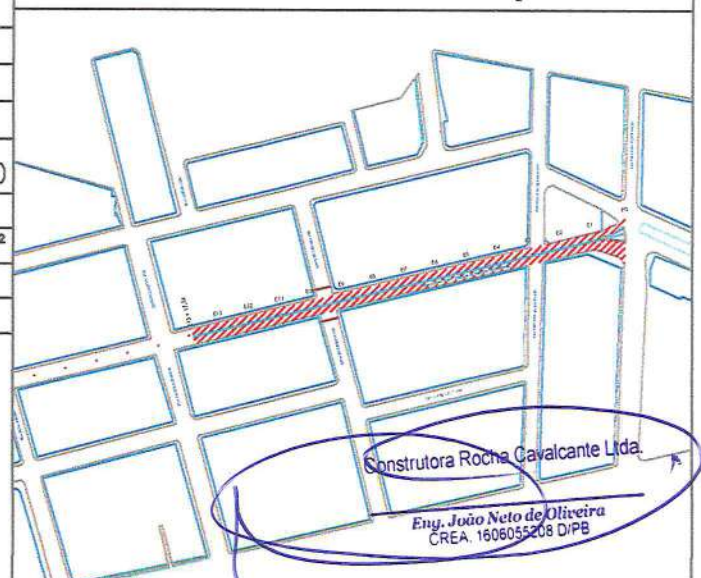

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
Engº Cívil - CREA-PB Nº 160.283534-2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIROS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTAÇÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCONGÓ, SANTA CRUZ, DINAMÉRICA, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCONGÓ, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTÃO, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS


EMPRESA: **CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA**

CONTRATO: **2.08.022/2020**

MEDIÇÃO: **10ª**

PERÍODO LÍQUIDO: **25/03/2021 A 29/04/2021**

FOTO 01

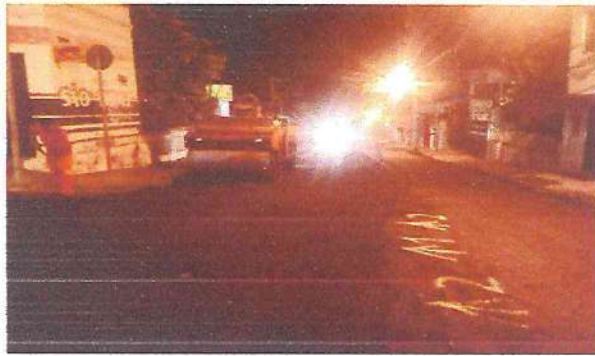


COORDENADAS:

7°13'05.6"S
35°53'22.1"W

RUA:

ÍNDIOS CARIRIS

FOTO 02

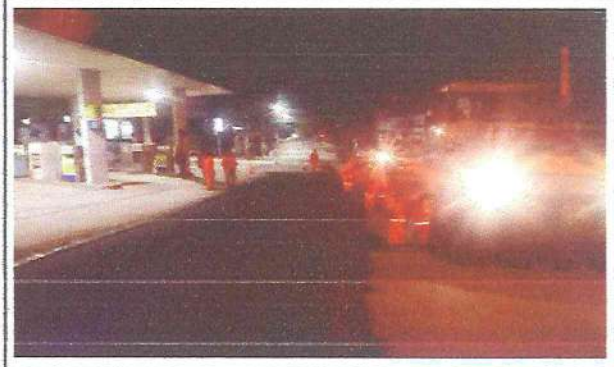

COORDENADAS:

7°13'13.6"S
35°53'19.9"W

RUA:

ÍNDIOS CARIRIS

FOTO 03




COORDENADAS:

7°13'05.8"S
35°53'13.8"W

RUA:

FÉLIX ARAÚJO

FOTO 04

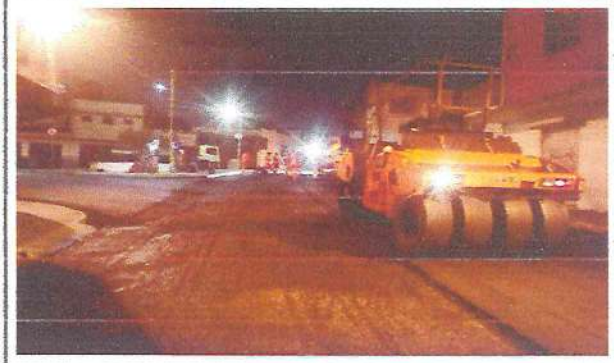

COORDENADAS:

7°13'06.1"S
35°53'08.7"W

RUA:

FÉLIX ARAÚJO

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
Engº Cml - CREA-PB Nº 160.283534-2

Adriano Gomes do Nascimento
Coordenador de Planejamento Obras
SECOB/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

Eng. João Neto de Oliveira
CREA 1600055208 D/PB



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA
CONTRATO: 2.08.022/2020
PERÍODO LÍQUIDO: 25/03/2021 A 29/04/2021

MEDIÇÃO: 10ª

FOTO 05



COORDENADAS:

7°13'04.8"S
35°53'12.4"W

RUA:

MIGUEL BARRETO

FOTO 06




COORDENADAS:

7°13'07.7"S
35°53'12.9"W

RUA:

MIGUEL BARRETO

FOTO 07

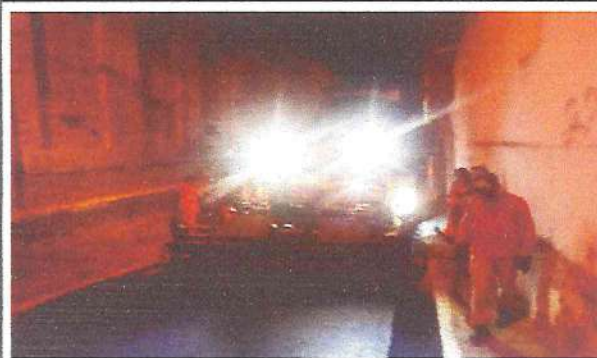

COORDENADAS:

7°13'06.4"S
35°53'12.7"W

RUA:

MIGUEL BARRETO

FOTO 08



COORDENADAS:

7°13'04.7"S
35°53'12.4"W

RUA:

MIGUEL BARRETO

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
Eng.º Civil - CREA-PB 1ª 160.293534-2

Adriano Gomes do Nascimento
Coordenador de Planejamento Obras
SECOB/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

Eng. João Nery de Oliveira
CREA 1606055208 D/ PB



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA
CONTRATO: 2.08.022/2020
PERÍODO LÍQUIDO: 25/03/2021 A 29/04/2021


MEDIÇÃO: 10ª

FOTO 09



COORDENADAS:	RUA:
7°13'07.3"S 35°53'12.8"W	TEODÓSIO DE OLIVEIRA LEDO

FOTO 10

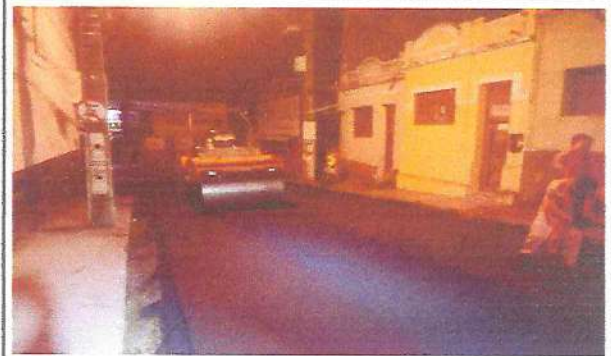

COORDENADAS:	RUA:
7°13'08.4"S 35°53'10.7"W	TEODÓSIO DE OLIVEIRA LEDO

FOTO 11



COORDENADAS:	RUA:
7°13'16.5"S 35°53'14.2"W	FREI CANECA

FOTO 12



COORDENADAS:	RUA:
7°13'16.5"S 35°53'14.2"W	FREI CANECA

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
Engº Civil - CREA-PB Nº 160 283524-2

Adriano Gomes do Nascimento
Coordenador de Planejamento Obras
SECOB/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
Eng. João Neto de Oliveira
CREA. 1606054208 D/PB



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA
CONTRATO: 2.08.022/2020
PERÍODO LÍQUIDO: 25/03/2021 A 29/04/2021

MEDIÇÃO: 10^m

FOTO 13



COORDENADAS:

7°13'05.6"S
35°53'52.8"W

RUA:

PEDRO II

FOTO 14



COORDENADAS:

7°13'05.6"S
35°53'52.8"W

RUA:

PEDRO II

FOTO 15



COORDENADAS:

7°13'21.2"S
35°52'16.2"W

RUA:

JOANA D'ARC DE ARRUDA

FOTO 16



COORDENADAS:

7°13'18.7"S
35°52'06.1"W

RUA:

JOANA D'ARC DE ARRUDA

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
Engº Civil - CREA-PB Nº 169.293524-2

Adriano Gomes do Nascimento
Coordenador de Planejamento Obras
SECOB/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
Eng. João Neto de Oliveira
CREA. 1606055208 D-2B
