

Nº OPERAÇÃO 1.065.800-37	Nº SCONV 886.302/2019	GESTOR Ministério do Desenv. Regional - MDR	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE INFRAE-STRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO	RECURSO OGU não-FAC
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB	MUNICÍPIO / UF CAMPINA GRANDE/PB	LOCALIDADE / ENDEREÇO Diversas ruas de diversos bairros		VALORES CONTRATADOS (R\$)	
OBJETO Recapeamento, Asfáltico e Requalificação das Calçadas	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapeamento Asfáltico e Humanização de Calçadas em Campina Grande- PB	REPARSE 19.296.907,63	CONTRAPARTIDA 798.016,79	INVESTIMENTO 20.094.924,42	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: Jun-21	100,00%
---------------------------------------	--	----------------

Medição nº:	11	Saldo a Reprogramar:	127.584,37	Reparse (R\$)	127.584,37	Contrapartida (R\$)	5.276,21
--------------------	-----------	-----------------------------	-------------------	----------------------	-------------------	----------------------------	-----------------

Acumulado Anterior: 76,76%

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.
									Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluinto o Período	
	TOTAL							19.169.323,26	14.714.293,32	686.815,63	15.401.108,95	80,34%
1	Meta 1.	Serviços Preliminares	Licitado / Em Execução	80,00	m ²		Reparse	792.740,58	608.404,39	28.403,02	636.907,41	
							CP. Financ. Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Investimento	19.962.063,84	15.322.797,71	715.218,65	16.038.016,36	
								37.667,20	-	-	-	
1	Meta 2.	Recapeamento Asfáltico	Licitado / Em Execução	287.724,69	m ²	2.08.022/2020	11	18.187.979,23	15.247.591,90	715.218,65	15.962.810,55	87,77%
1	Meta 3.	Requalificação de Calçadas	Licitado / Em Execução	9.495,69	m ²		1	1.679.473,03	75.205,81	-	75.205,81	4,48%
1	Meta 4.	Requalificação de Calçadas	Licitado / Em Execução	44,48	m		1	56.944,38	-	-	-	
								-	-	-	-	
								-	-	-	-	
								-	-	-	-	
								-	-	-	-	
								-	-	-	-	
								-	-	-	-	
								-	-	-	-	

Adriano Gomes do Nascimento
PMCG/SECOB - Coordenador
de Planejamento de Obras

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
FRANCISCO DE JESUS C. XAVIER
ALUG. CIVIL - CREA/PB Nº. 190.20334-2

Construtora Bezerra Gasalcaante Ltda.
Eng. João Neto de Oliveira
CREA 160805268 D/PB

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Acum. Período Anterior	No Período	Acum. Incluindo o Período	Física Acum.
-------	-----------------	------------------------------	----------	------------	-------	-----------------------------	----------	-------------------	------------------------	------------	---------------------------	--------------

Observações:

Local: CAMPINA GRANDE-PB

Data: 17 de junho de 2021

Responsável Técnico

Nome: FRANCISCO DE JESUS C. XAVIER
 Cargo: RESPONSÁVEL TÉCNICO
 ART/RRT Fiscal.: PB20180221411

Zenilde P. B. Albuquerque
 Representante Tomador / Agente Promotor
 Nome: FERNANDA RIBEIRO BARBOZA
 Cargo: SECRETÁRIA DE OBRAS

Responsável Social

Nome:
 Cargo:


Responsável Financeiro

Nome:
 Cargo:

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
 FRANCISCO DE JESUS C. Xavier
 3º Civil - CREA-PB nº 199.283594-3

Adriano Gomes do Nascimento
 Adriano Gomes do Nascimento
 PMCG/SECOB - Coordenador
 de Planejamento de Obras

Construtora Rocha Cevalcante Ltda.
 Eng. João Neto de Oliveira
 CREA 1608055208 DFPB



Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

CNPJ: 09.323.098/0001-92 -Insc. Estadual:16.056.310-0

Rua Álvaro de Araújo Pereira, N° 255 – Jardim Tavares – CEP: 58.402-300 – Campina Grande – PB

Fone: (83) 3341-1471

Fax: (83) 3322-6933

CREA: 821 – 16ª

À

Prefeitura Municipal de Campina Grande – PB

A/C: Eng. (a).Fernanda Ribeiro Barboza – Secretária Municipal de Obras

Ref.: 11ª Medição da obra de recapeamento asfáltico nos bairros Centro, Bela Vista, Alto Branco, Conceição, Estação Velha, Palmeira, Prata, Bodocongó, Santa Cruz, Dinamérica, Catolé, Centenário, Cruzeiro, Jardim Tavares, Jeremias, José Pinheiro, Mirante, Novo Bodocongó, Santo Antônio, São José, Serrotão, Malvinas, Monte Santo e Universitário, no município de Campina Grande, estado da Paraíba.

Assunto: Solicitação de Análise Técnica da medição de serviços nº 11

Senhora Secretária,

Encaminhamos, em anexo, o **Boletim da Medição de Serviços nº 11 – Revisado e demais elementos técnicos integrantes**, relativo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 2.08.022/2020, referente ao período de 26 de abril/2021 a 31 de maio/2021, para aprovação da fiscalização da obra e providencias cabíveis no tocante à liberação dos recursos.

Campina Grande, 31 de maio de 2021.

Atenciosamente,

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
Eng. João Neto de Oliveira
CREA 1606055208 D/PB



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIROS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTAÇÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCONGÓ, SANTA CRUZ, DINAMÉRICA, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCONGÓ, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTÃO, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA

11ª MEDIÇÃO


CONTRATO 2.08.022/2020



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIROS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTAÇÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCONGÓ, SANTA CRUZ, DINAMÉRICA, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCONGÓ, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTÃO, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA

FÍSICO-FINANCEIRO


		Grau de Sigilo	
Nº do CTE (Contrato Terceirização/Contratamento)	Nº do CTE	Nº do CTE	Data do CT
2.08.022/2020	11	1.055.600-37	01/07/20
Início da obra - data	Prazo Final da obra	Tomador/Previdor ou Tomador	
29/06/2020	26/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	
Valor total inicial (R\$)	CTE - de assinatura	Agente Responsável	
18.225.646,43	CTE - de rubrica	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Valor atual (R\$)	CTE - de rubrica Adit.	Fonte de Recurso	
18.225.646,43	CTE - de rubrica Adit.	outra (descrever)	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PREÇO NO ORÇAMENTO				EXECUÇÃO FÍSICA QUANTITATIVA				EXECUÇÃO FINANCEIRA		DESTINO	
		UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ADQUIRIÇÃO DE SERVIÇOS ANTERIOR	INICIANDO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	MEIO DO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO			
1.0	RUJA RUIOS CABIRIS				273.489,56				186.678,82			186.678,82	
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.592,66				1.172,17			1.172,17	
1.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e gride	m²	4.826,25	0,33	1.592,66			3.552,04	1.172,17			1.172,17	26,40
1.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				271.205,52				185.506,65			185.506,65	
1.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	4.475,25	2,36	10.561,39			3.201,06	7.551,50			7.551,50	28,47
1.2.2	CRUQU												
1.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m³	223,76	1.147,56	256.778,03			152,77	175.312,74			175.312,74	31,73
1.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	223,76	3,87	865,95			152,77	591,22			591,22	31,73
1.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	2.752,25	1,09	2.999,95			1.879,07	2.048,19			2.048,19	31,73
1.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				691,38								100,00
1.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita	unidade	6,00	115,23	691,38								
2.0	RUJA IREMAR VILLARIM				82.917,71				74.077,91			74.077,91	
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				493,52				435,88			435,88	
2.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e gride	m²	1.465,20	0,33	483,32			1.320,86	435,88			435,88	9,85
2.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				82.318,96				73.642,03			73.642,03	
2.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	1.358,64	2,36	3.206,39			1.215,31	2.868,13			2.868,13	10,55
2.2.2	CBUQ												
2.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m³	67,93	1.147,56	77.953,75			60,77	69.737,22			69.737,22	10,54
2.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	67,93	3,87	262,89			60,77	235,18			235,18	10,54
2.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	821,95	1,09	895,93			735,32	801,50			801,50	10,54
2.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				115,23								100,00
2.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita	unidade	1,00	115,23	115,23								
3.0	RUJA FELIX ARAÚJO				168.987,61				153.123,44			153.123,44	
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				990,00				923,55			923,55	
3.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e gride	m²	3.000,00	0,33	990,00			2.798,63	923,55			923,55	6,71
3.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				167.906,23				152.199,89			152.199,89	
3.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	2.760,00	2,36	6.513,80			2.560,05	6.041,72			6.041,72	7,24
3.2.2	CBUQ												
3.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m³	138,00	1.147,56	158.363,28			125,44	143.949,93			143.949,93	9,10
3.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	138,00	3,87	534,06			125,44	485,45			485,45	9,10

Eng. João Victor Oliveira
 CREA 195005-2/06 DPE

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
 Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng. Civ. - CREA-RN nº 160.283534-2

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

		Grau de Sigilo Dia de CT	
Nº do CITEI (Contrato Executivo/Consorcio)		Nº do CT	
2.08.022/2020		1.065.600-37	
Início da obra - obra		Tomador/Pag Promotor ou Tomador	
29/06/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	
Período Término da obra		Agente Financeiro ou Ag. Operador Pagasse	
26/07/2021		01/07/20	
CITEI - de assinatura		BIA - Data emissão	
CITEI - de assinatura		31/05/2021	
Valor total inicial (R\$)		BIA - Período de referência da medição (CIEI)	
18.225.646,43		05.323.098/0001-92	
Valor atual (R\$)		Empresa Contratada	
18.225.646,43		CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA	
CITEI - de última Adm.		Objeto do CITEI (resumido)	
CITEI - de última Adm.		RECAPAMENTO ASFÁLTICO NOS BARRIOS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, COICEÇÃO, ESTACÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCORGÓ, SANTA CRUZ, DINAMÉRICA, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CRUZEIRO, ARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ FINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCORGÓ, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTÃO, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA	
Fonte de Recursos		Fonte de Recursos	
contra (descrever)		CONTRA ECONÔMICA FEDERAL	

ITEM	ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PARÂMETROS DO SERVIÇO			PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	CÁLCULO FÍSICO QUANTITATIVO			MEDIDA NO FÍSICO	VALOR DO INÍCIO DO FÍSICO	VALOR DO FIM DO FÍSICO	DIFERENÇA
		QUANT.	UNID.	PREÇO UNIT.			ATUALIZADO DE ACORDO COM O FÍSICO	MEDIDA NO FÍSICO	ATUALIZADO DE ACORDO COM O FÍSICO				
3.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	1.738,80	m³ x km	1,09	1.895,29	1.500,54	1.500,54	1.500,54	1.722,79		1.722,79	9,10	
3.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				691,38								
3.3.1	Nivelamento de Tambo de Poço de Visita	6,00	unidade	115,23	691,38							100,00	
4.0	RUA MIGUEL BARRIETO				37.698,60								
4.1	SERVICOS PRELIMINARES				206,18							37.364,95	
4.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	634,80	m²	0,33	206,18	624,80	624,80	624,80	206,18		206,18	206,18	
4.2	SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO				37.377,19							37.158,77	
4.2.1	Pinura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	999,68	m²	2,36	2.359,24	999,68	999,68	999,68	2.359,24		2.359,24	2.359,24	
4.2.2	CBUQ				18.106,20							18.106,20	
4.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Cepa	15,00	m³	1.207,08	18.106,20	15,00	15,00	15,00	18.106,20		18.106,20	18.106,20	
4.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Reperilamento	15,00	m³	1.093,55	16.403,25	14,97	14,97	14,97	16.370,44		16.370,44	16.370,44	
4.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	30,00	m³	3,87	116,10	30,00	30,00	30,00	116,10		116,10	116,10	
4.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	360,00	m³ x km	1,09	392,40	189,72	189,72	189,72	206,79		206,79	206,79	
4.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				115,23								
4.3.1	Nivelamento de Tambo de Poço de Visita	1,00	unidade	115,23	115,23							100,00	
5.0	RUA TEODÓSIO DE OLIVEIRA LIDO				43.369,83								
5.1	SERVICOS PRELIMINARES				269,87							43.139,37	
5.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	817,80	m²	0,33	269,87	817,80	817,80	817,80	269,87		269,87	269,87	
5.2	SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO				42.869,50							42.869,50	
5.2.1	Pinura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	708,76	m²	2,36	1.672,67	708,76	708,76	708,76	1.672,67		1.672,67	1.672,67	
5.2.2	CBUQ				40.669,53							40.669,53	
5.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Cepa	35,44	m³	1.147,56	40.669,53	35,44	35,44	35,44	40.669,53		40.669,53	40.669,53	
5.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	35,44	m³	3,87	137,15	35,44	35,44	35,44	137,15		137,15	137,15	
5.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	357,94	m³ x km	1,09	390,15	357,94	357,94	357,94	390,15		390,15	390,15	
5.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				290,46								
5.3.1	Nivelamento de Tambo de Poço de Visita	2,00	unidade	115,23	230,46							100,00	
6.0	RUA FREI CANECA				158.074,51								
6.1	SERVICOS PRELIMINARES				994,95							153.807,62	
6.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	2.984,70	m	0,33	994,95	2.921,94	2.921,94	2.921,94	964,24		964,24	964,24	
6.2	SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO				152.849,38							152.849,38	

CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA.
 Eng.º Cristiano Neto de Oliveira
 CREA 160965/2018 DFR

CAIXA		RFB - primeiro		RFB - Data emissão		RFB - Período de referência da medição		RFB - Grau de Sigilo	
RFB - Contrato (Execução/Arquitetura)		11		31/05/2021		de 26/04/2021 a 31/05/2021		Data do CT	
2.08.02/2020		Empresa Contratada		CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA		1.055.660-37		01/07/20	
Início da obra - data		26/07/2021		Objeto do CT (resumido)		Tomador/Pag. Promotor ou Tomador		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	
29/06/2020		Prestação de serviços de obra		CITEF - de assinatura		Agente Executor ou Ag. Operador Preposto		CANA ECONÔMICA FEDERAL	
CITEF - Valor total inicial (R\$)		18.225.646,43		Local da obra (Estado/Município/UF)		Fonte de Recursos		conta (discriminar)	
CITEF - Valor atual (R\$)		18.225.646,43		CITEF - R\$ (último Adit.)					


ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PREÇO NO ENCOMENDADO				VALORES FÍZICOS (quantitativos)				VALORES MONETÁRIOS (R\$)		UNIDADE
		QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACRESCIM. DE SERVIÇOS ADICIONAIS	MÉDIO DO PREÇO	ACRESCIM. DE SERVIÇOS ADICIONAIS	MÉDIO DO PREÇO	ACRESCIM. DE SERVIÇOS ADICIONAIS	MÉDIO DO PREÇO	ACRESCIM. DE SERVIÇOS ADICIONAIS	
9.1	SERVICIOS PRELIMINARES											
9.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e gride	m²	384,75	126,97		384,75		126,97		126,97		126,97
9.2	SERVICIOS DE PAVIMENTAÇÃO											
9.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	323,19	19.530,14		323,19		19.530,14		19.530,14		19.530,14
9.2.2	CRUQU											
9.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF. 03/2017 - Capa	m³	16,16	18.544,57		16,16		18.544,57		18.544,57		18.544,57
9.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	16,16	62,54		16,16		62,54		62,54		62,54
9.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	147,06	160,30		147,06		160,30		160,30		160,30
9.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA											
9.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	1,00	115,23		1,00		115,23		115,23		115,23
10.0	RUA JOÃO ALVES DE OLIVEIRA											
10.1	SERVICIOS PRELIMINARES											
10.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e gride	m²	3.856,00	1.272,48		3.856,00		1.272,48		1.272,48		1.272,48
10.2	SERVICIOS DE PAVIMENTAÇÃO											
10.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	3.547,52	214.797,59		3.547,52		214.797,59		214.797,59		214.797,59
10.2.2	CRUQU											
10.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF. 03/2017 - Capa	m³	177,38	203.554,19		177,38		203.554,19		203.554,19		203.554,19
10.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	177,38	686,46		177,38		686,46		686,46		686,46
10.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	2.004,39	2.184,79		2.004,39		2.184,79		2.184,79		2.184,79
10.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA											
10.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	7,00	806,61		7,00		806,61		806,61		806,61
11.0	RUA CRISTIANO LAURITZEN											
11.1	SERVICIOS PRELIMINARES											
11.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e gride	m²	1.280,00	422,40		1.280,00		422,40		422,40		422,40
11.2	SERVICIOS DE PAVIMENTAÇÃO											
11.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	1.152,00	69.681,49		1.152,00		69.681,49		69.681,49		69.681,49
11.2.2	CRUQU											
11.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF. 03/2017 - Capa	m³	57,60	66.099,46		57,60		66.099,46		66.099,46		66.099,46
11.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	57,60	222,91		57,60		222,91		222,91		222,91
11.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	587,52	640,40		587,52		640,40		640,40		640,40

PREF. MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 Eng. João Nery de Oliveira
 CREA: 040055208 DPEB
 Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

CAIXA		RFB - Número 11		RFB - Data emissão 31/05/2021		RFB - Período de referência da aplicação de 26/04/2021 a 31/05/2021		RFB - CT 1.065.660-37		Grau de Sigilo	
RFB - Número 2.08.022/2020		RFB - Descrição da obra - obra 26/07/2021		RFB - Data emissão 31/05/2021		RFB - Período de referência da aplicação de 26/04/2021 a 31/05/2021		RFB - CT 1.065.660-37		Data do CT 01/07/20	
Início da obra - data 29/06/2020		Previsão término da obra 26/07/2021		RFB - Data emissão 31/05/2021		RFB - Período de referência da aplicação de 26/04/2021 a 31/05/2021		RFB - CT 1.065.660-37		Data do CT 01/07/20	
Valor total inicial (R\$)		CTF - de assinatura		RFB - Data emissão 31/05/2021		RFB - Período de referência da aplicação de 26/04/2021 a 31/05/2021		RFB - CT 1.065.660-37		Data do CT 01/07/20	
18.225.646,43		CTF - de assinatura		RFB - Data emissão 31/05/2021		RFB - Período de referência da aplicação de 26/04/2021 a 31/05/2021		RFB - CT 1.065.660-37		Data do CT 01/07/20	
Valor atual (R\$)		CTF - de assinatura		RFB - Data emissão 31/05/2021		RFB - Período de referência da aplicação de 26/04/2021 a 31/05/2021		RFB - CT 1.065.660-37		Data do CT 01/07/20	
18.225.646,43		CTF - de assinatura		RFB - Data emissão 31/05/2021		RFB - Período de referência da aplicação de 26/04/2021 a 31/05/2021		RFB - CT 1.065.660-37		Data do CT 01/07/20	
Valor atual (R\$)		CTF - de assinatura		RFB - Data emissão 31/05/2021		RFB - Período de referência da aplicação de 26/04/2021 a 31/05/2021		RFB - CT 1.065.660-37		Data do CT 01/07/20	
18.225.646,43		CTF - de assinatura		RFB - Data emissão 31/05/2021		RFB - Período de referência da aplicação de 26/04/2021 a 31/05/2021		RFB - CT 1.065.660-37		Data do CT 01/07/20	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PRESTÍO DO ORÇAMENTO				DESEMPENHO GOVERNAMENTAL				RECURSOS HUMANOS (R\$)		DESCRIÇÃO
		UNID.	QTDDE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ATENDIMENTO DESEMPENHO ANTERIOR	MÉDIO DO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ FÉRIAS ANTERIOR	ACUMULADO ATÉ FÉRIAS ATUAL	MÉDIO DO PERÍODO	ACUMULADO HASTA O FÉRIAS	
11.3	NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA											
11.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	4,00	115,23	460,92							100,00
12.0	RUA PEREGRINO DE CARVALHO											
12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				213.681,01							212.338,61
12.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	3.838,05	0,33	1.266,56	3.829,19		1.263,63				1.263,63
12.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				211.607,84							211.074,98
12.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	3.496,69	2,36	8.252,65	3.487,95		8.231,56				8.231,56
12.2.2	CBUQ											
12.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Caixa	m³	174,84	1.147,56	200.639,39	174,40		200.134,46				200.134,46
12.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	174,84	3,87	676,63	174,40		674,93				674,93
12.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.870,79	1,09	2.039,16	1.866,08		2.034,03				2.034,03
12.3	NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA											
12.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	7,00	115,23	806,61							100,00
13.0	RUA BENTO VIANA											
13.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				46.491,55							40.689,59
13.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	827,50	0,33	273,08	827,50		273,08				273,08
13.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				46.048,24							40.416,51
13.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	761,30	2,36	1.796,67	761,30		1.796,67				1.796,67
13.2.2	CBUQ											
13.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Caixa	m³	38,06	1.147,56	43.676,13	33,22		36.121,94				36.121,94
13.2.2.2	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	38,06	3,87	147,29	33,22		128,56				128,56
13.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	389,21	1,09	423,15	336,64		369,34				369,34
13.3	NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA											
13.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	1,00	115,23	115,23							100,00
14.0	RUA CELSO LOURENÇO PORTO											
14.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				168.546,24							109.176,48
14.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	2.752,45	0,33	908,31	2.038,71		2.038,71				672,77
14.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				166.485,63							672,77
14.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	2.752,45	2,36	6.495,78	1.828,88		1.828,88				4.316,16
14.2.2	CBUQ											
14.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Caixa	m³	137,92	1.147,56	157.977,21	89,62		102.844,33				102.844,33


 PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
 Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng. Civil - CREA/RN nº 160.291534-2
 Consórcio Rocha Cavalcante Ltda.
 Eng. João Neto de Oliveira
 CREA 160055/208-DPE

		Grau de Sigilo Nº do CT 1.065.660-37 Data do CT 01/07/20	
Nº do Contrato 2.08.022/2020 Data da obra - data 29/06/2020 Valor total inicial (R\$) 18.225.646,43		Data de entrega da obra 26/07/2021 CITE - de assinatura 18.225.646,43	
Empresa Contratada CONSTRUTORA NOCHIA CAVALCANTE LIDA Objeto do CITE (resumo) RECAPAMENTO ASFÁLTICO NOS BARRIOS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTÁÇÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCONEJO, SANTA CRUZ, DINÂMICA, CATOLÉ, CENTEIRÃO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCONEJO, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTIÃO, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA		Nº do CT 1.065.660-37 Tomador/Ass. Promotor ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Agência Financeira ou Ag. Operadora Financeira CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Valor atual (R\$) 18.225.646,43		Fonte de Recursos outra (descrever)	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PREÇO UNITÁRIO				PREÇO TOTAL	DESCRIÇÃO FÍSICO QUANTITATIVO			DESCRIÇÃO MONETÁRIO (R\$)			DESCRIÇÃO
		UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL		ANEXO DE SERVIÇOS ANTERIORES	QUANTIDADE FÍSICA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ANEXO DE SERVIÇOS ANTERIORES	VALOR UNITÁRIO	
14.2.2	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	137,62	3,87	522,89		89,62	89,62		346,83	346,83	34,88	
14.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.403,72	1,09	1.530,05		914,12	914,12		996,39	996,39	34,88	
14.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	10,00	115,23	1.152,30							100,00	
14.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	10,00	115,23	1.152,30							100,00	
15.0	RUA PEDRO AMÉRICO				37.240,04							31.463,20	
15.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				227,30							227,30	
15.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	688,80	0,33	227,30		688,80	688,80		227,30	227,30		
15.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				36.897,31							31.235,90	
15.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	610,08	2,36	1.439,79		610,08	610,08		1.439,79	1.439,79		
15.2.2	CBUQ											29.411,96	
15.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF. 03/2017. - Capa	m³	30,50	1.147,56	35.000,88		25,63	25,63		99,19	99,19	15,97	
15.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	30,50	3,87	118,04		25,63	25,63		284,96	284,96	15,97	
15.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	311,10	1,09	339,10		261,43	261,43				100,00	
15.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	1,00	115,23	115,23							178.928,47	
15.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	1,00	115,23	115,23							1.206,04	
16.0	RUA DEP. ALVARO GAUDÊNCIO				207.174,59							178.928,47	
16.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.245,02							1.206,04	
16.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	3.772,80	0,33	1.245,02		3.654,67	3.654,67		1.206,04	1.206,04	3,13	
16.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				205.353,82							177.146,28	
16.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	3.395,52	2,36	8.013,43		3.288,10	3.288,10		7.739,92	7.739,92	3,16	
16.2.2	CBUQ											167.233,92	
16.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF. 03/2017. - Capa	m³	169,78	1.147,56	194.832,74		145,73	145,73		563,98	563,98	14,16	
16.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	169,78	3,87	657,05		145,73	145,73		1.588,46	1.588,46	14,17	
16.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.697,80	1,09	1.850,60		1.457,30	1.457,30		576,15	576,15		
16.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	5,00	115,23	576,15		5,00	5,00					
16.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	5,00	115,23	576,15								
17.0	RUA VILA NOVA DA RAINHA				371.896,84							276.787,48	
17.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.014,89							1.936,23	
17.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	6.105,72	0,33	2.014,89		5.867,35	5.867,35		1.936,23	1.936,23	3,90	



 PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE


 Eng. J. J. C. Xavier

 E-mail: SFEA@PB.LO.201534-2


 Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

 Eng. J. J. C. Xavier

 CAEXA 1800052001-0001

		CPF - número 11		RM - Data emissão 31/05/2021		RM - Período de referência da medição de 26/04/2021 a 31/05/2021		Grau de Sigilo 01/07/20	
RM do CTE (contrato de fornecimento) 2.080.027.2020		Empresa contratada CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA		RM do CT 1.065.660.37		Transferência/Ag. Promotor ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE		Data do CT	
Medida da obra - data 29/06/2020		Previsão término da obra 26/07/2021		CPF 09.323.009/0001-92		Agente Inscrição ou Ag. Operador Pagasse CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
CTE - Valor total inicial (R\$) 18.225.646,43		CTE - di assinatura							
CTE - Valor atual (R\$) 18.225.646,43		CTE - Di último Adm.							

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS OU DESCRIÇÃO	PRESTÍCIO DE SERVIÇO			DESCRIÇÃO DE PREÇO (QUANTITATIVOS)			DESCRIÇÃO DE PREÇO (VALORES)			MÉDIA DO PREÇO	ADJUDICADO INCLUINDO O PREÇO	ADJUDICADO INCLUINDO O PREÇO	DESCRIÇÃO
		UNID.	QTD	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ADJUDICADO ANTES DO PREÇO	ADJUDICADO DEPOIS DO PREÇO	ADJUDICADO INCLUINDO O PREÇO	ADJUDICADO ANTES DO PREÇO	ADJUDICADO DEPOIS DO PREÇO				
FISCO - FINANCIAMENTO														
17.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO													
17.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	6.105,72	2,36	369.190,87	5.485,62	14.409,50	274.851,25	12.946,06	274.851,25	12.946,06	10,16		
17.2.2	CBUQ													
17.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	305,29	1.147,56	350.338,89	225,37		225,37		225,37		26,18		
17.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	305,29	3,87	1.181,47	225,37		225,37		225,37		26,18		
17.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	2.991,84	1,09	3.261,11	2.208,63		2.208,63		2.208,63		26,18		
17.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA													
17.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	6,00	115,23	691,38	691,38		691,38		691,38		100,00		
18.0	RUA PADRE INAPINA				45.042,32									
19.0	RUA ELIAS ASFORA				191.836,38									
19.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				924,41									
19.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	2.801,25	0,33	924,41	2.706,63		2.706,63		2.706,63		3,38		
19.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				190.451,05									
19.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	5.104,50	2,36	12.046,82	4.931,32		4.931,32		4.931,32		3,39		
19.2.2	CBUQ													
19.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	76,57	1.207,08	92.426,12	73,97		73,97		73,97		3,40		
19.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperfilamento	m³	76,57	1.093,55	83.733,12	73,97		73,97		73,97		3,40		
19.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	153,14	3,87	592,45	147,94		147,94		147,94		3,39		
19.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.516,09	1,09	1.652,34	1.464,60		1.464,60		1.464,60		3,40		
19.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				460,92					460,92				
19.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	4,00	115,23	460,92	4,00		4,00		4,00				
20.0	RUA BARÃO DO ABIAÍ				234.608,87									
20.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.365,80									
20.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e gride	m²	4.138,80	0,33	1.365,80	3.920,71		3.920,71		3.920,71		5,27		
20.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				232.666,92									
20.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	3.844,88	2,36	9.073,92	3.600,40		3.600,40		3.600,40		6,36		
20.2.2	CBUQ													
20.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	192,24	1.147,56	220.606,93	171,68		171,68		171,68		10,69		
20.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	192,24	3,87	743,97	171,68		171,68		171,68		10,70		



Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

 Rua João Neto de Oliveira

 CRGA. 160605208 DPFB



PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE

JOÃO NETO DE OLIVEIRA

 CPF: 041.378.478-00

CAIXA		RUA - número		RUA - data início		RUA - data de referência da medição		RUA - data de CT		Grau de Sigilo	
2.08.022/2020		11		31/05/2021		de 26/05/2021 a 31/05/2021		1.065.660-37		01/07/20	
Início da obra - obra		Empresas Contratada		Objeto do CITEF (resumido)		CITEF - Descrição de referência da medição		Tomador/Prestador ou Beneficiário		Data do CT	
29/06/2020		CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA		Obras de CITEF (resumido)		de 26/05/2021 a 31/05/2021		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE		Data do CT	
Valor total inicial (R\$)		CITEF - de assinatura		Local de obra (bairro/Município/UF)		CITEF - de início da obra		Agente Executor ou Ag. Operador Responsável		Data do CT	
18.225.646,43		CITEF - de assinatura		CAMPINA GRANDE - PB		CITEF - de início da obra		CAMA ECONÔMICA FEDERAL		Data do CT	
Valor atual (R\$)		CITEF - de início da obra		CAMPINA GRANDE - PB		CITEF - de início da obra		CAMA ECONÔMICA FEDERAL		Data do CT	
18.225.646,43		CITEF - de início da obra		CAMPINA GRANDE - PB		CITEF - de início da obra		CAMA ECONÔMICA FEDERAL		Data do CT	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU MATERIAIS	PREÇO UNITÁRIO				QUANTIDADE				VALORES				UNIDADE	VALOR TOTAL	ACUMULADO PRELIMINAR	ACUMULADO REALIZADO	ACUMULADO INDEVIDO	RENTES (%)	
		QTD	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT.	QTD	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT.	QTD	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT.							
20.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana		2.056,97	1,09	2.242,10	1.836,98														
20.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				576,15															
20.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita		5,00	115,23	576,15															
21.0	RUA JOSÉ BONIFÁCIO				72.385,08															
21.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				441,56															
21.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e gride		1.338,05	0,33	441,56	1.338,05														
21.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				71.693,06															
21.2.1	Plitura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte		1.185,13	2,36	2.796,91	1.185,13														
21.2.2	CBUQ				68.004,41															
21.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusivo transporte. AF. 03/2017 - Capa		59,26	1.147,56	68.004,41	55,64														
21.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora		59,26	3,87	229,34	55,64														
21.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana		598,53	1,09	652,40	561,96														
21.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				230,46															
21.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita		2,00	115,23	230,46	2,00														
22.0	RUA JOÃO TAVARES				241.197,71															
22.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.412,00															
22.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e gride		4.278,76	0,33	1.412,00	3.323,04														
22.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				238.883,87															
22.2.1	Plitura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte		3.947,34	2,36	9.315,72	2.990,92														
22.2.2	CBUQ				216.483,92															
22.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusivo transporte. AF. 03/2017 - Capa		197,37	1.147,56	226.483,92	119,64														
22.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora		197,37	3,87	763,82	119,64														
22.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana		2.092,12	1,09	2.280,41	1.268,18														
22.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				921,84															
22.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita		8,00	115,23	921,84	5,00														
23.0	RUA CORONEL JOSÉ ANDRÉ				150.822,84															
23.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				704,22															
23.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e gride		2.134,00	0,33	704,22	2.134,00														
23.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				149.772,93															
23.2.1	Plitura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte		4.012,96	2,36	9.470,59	4.012,96														
23.2.2	CBUQ				140.302,34															

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
 FRANCISCO JOSÉ JACQUES C. XAVIER
 Eng. Civil - CREA-PB nº 180.263.694-2
 Contadora Rochas Cavalcante Ltda.
 Eng. Arno Soares Oliveira
 CREA-PB nº 000055208 DFB

		RA - número 11		RA - Data emissão 31/05/2021		RA - Período de referência da medição de 26/04/2021 a 31/05/2021		RA - Número 1.065.660-37		RA - Data de Selo 01/07/20	
RA - Descrição (complementar) 2.08.022/2020		Empresa Contratada CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA		CPF 09.339.099/0001-92		Tomador/Agr. Promotor ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE		Tomador/Agr. Promotor ou Tomador Agente Fisco ou Ag. Operador Fisco		Fonte de Recurso CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Nota 4 de Abril - 414		Período Técnico da obra 26/07/2021		Objeto do CTEF (resumido) RECAPAMENTO ASFÁLTICO NOS BARRIOS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTACÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCONGÓ, SANTA CRUZ, DINAMÉRICA, CATOLÉ, CENTEINÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TANARIÉS, JEREMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCONGÓ, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERRIOTO, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA		Fonte de Recurso CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Fonte de Recurso CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Fonte de Recurso CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
CTEF - Valor total inicial (R\$) 18.225.646,43		CTEF - de anterior CTEF - de anterior		CTEF - de anterior CTEF - de anterior		CTEF - de anterior CTEF - de anterior		CTEF - de anterior CTEF - de anterior		CTEF - de anterior CTEF - de anterior	
CTEF - Valor atual (R\$) 18.225.646,43		CTEF - de anterior CTEF - de anterior		CTEF - de anterior CTEF - de anterior		CTEF - de anterior CTEF - de anterior		CTEF - de anterior CTEF - de anterior		CTEF - de anterior CTEF - de anterior	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PREÇO NO ORÇAMENTO		PREÇO TOTAL (QUANTITATIVOS)		PREÇO NO PERÍODO		EXECUÇÃO PERÍODO (R\$)		DÍVIDA (R\$)
		UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ADIVANÇADO AT O PERÍODO ANTERIOR	ADIVANÇADO AT O PERÍODO ATUAL	ACUMULADO AT PERÍODO ANTERIOR	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	
26.0	RUA CRISTOVÃO COLOMBO				96.110,74					91.626,41
26.1	SERVICIOS PRELIMINARES				558,06					532,95
26.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	1.691,10	0,33	558,06	1.614,99	1.614,99	592,95	592,95	532,95
26.2	SERVICIOS DE PAVIMENTAÇÃO				95.437,45					91.093,46
26.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	1.541,74	2,36	3.732,91	1.509,79	1.509,79	3.563,10	3.563,10	3.563,10
26.2.2	CBUQ									
26.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF. 03/2017. - Capa	m³	79,09	1.147,56	90.760,52	75,49	75,49	86.629,30	86.629,30	86.629,30
26.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibracabadora	m³	79,09	3,87	306,08	75,49	75,49	292,15	292,15	292,15
26.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	585,27	1,09	637,94	558,63	558,63	608,91	608,91	608,91
26.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				115,23					
26.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	1,00	115,23	115,23					100,00
27.0	RUA DR. CARLOS AGRA				205.820,16					171.222,56
27.1	SERVICIOS PRELIMINARES				1.201,17					1.010,68
27.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	3.639,90	0,33	1.201,17	3.082,66	3.082,66	1.010,68	1.010,68	1.010,68
27.2	SERVICIOS DE PAVIMENTAÇÃO				203.697,15					169.405,27
27.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	3.375,18	2,36	7.965,42	2.806,83	2.806,83	6.624,12	6.624,12	6.624,12
27.2.2	CBUQ									
27.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF. 03/2017. - Capa	m³	168,76	1.147,56	193.662,23	140,35	140,35	161.060,05	161.060,05	161.060,05
27.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibracabadora	m³	168,76	3,87	653,10	140,35	140,35	543,15	543,15	543,15
27.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.299,45	1,09	1.416,40	1.080,69	1.080,69	1.177,95	1.177,95	1.177,95
27.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				921,84					806,61
27.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	8,00	115,23	921,84	7,00	7,00	806,61	806,61	806,61
28.0	RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL				67.136,89					62.048,03
28.1	SERVICIOS PRELIMINARES				396,00					396,00
28.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	1.200,00	0,33	396,00	1.200,00	1.200,00	396,00	396,00	396,00
28.2	SERVICIOS DE PAVIMENTAÇÃO				66.627,66					61.652,03
28.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	1.104,00	2,36	2.605,44	1.104,00	1.104,00	2.605,44	2.605,44	2.605,44
28.2.2	CBUQ									
28.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF. 03/2017. - Capa	m³	55,20	1.147,56	63.346,31	50,91	50,91	58.422,28	58.422,28	58.422,28

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
PROFESSOR DR. JACQUES C. XAVIER
CPF: 036.295.475-11 / 03.29.5.830

Gerente Rocha Cavalcante Ltda.
Eng. José Vitor de Oliveira
CREA: 109405088-8

CAIXA		RPA do CITEF (Comunidade Local/Projeto/Execução)		RPA - Projeto de referência da medição		Grau de Sigilo	
2.08.022/2020		29/06/2020		1.065.660-37		01/07/20	
Início da obra - data		Permissão Temporária de obra		Tomador/Objeto Promotor ou Tomador		Data do CT	
26/07/2021		CITEF - 4ª ANILHEIRA		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE			
Valor total inicial (R\$)		CITEF - 4ª ANILHEIRA		Agência Executora ou Ag. Operadora Prestadora			
18.225.646,43				CANVA ECONÔMICA FEDERAL			
Valor atual (R\$)		CITEF - 4ª ANILHEIRA		Fonte de Recursos		Fonte de Recursos	
18.225.646,43				Cidade (descrição)			
CITEF - 4ª ANILHEIRA		CITEF - 4ª ANILHEIRA		Município			
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO		PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO		Estado			
Local (na obra/ano/Município/UF)		Local (na obra/ano/Município/UF)		Município			
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO		PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO		Município			

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PREÇO NO ORÇAMENTO			ESTIMADO FÍSICO (QUANTIAÇÃO)			ESTIMADO PRECATORIAL (R\$)			RÉSTIO (N)
		UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.	QUANTIDADE ESTIMADA FÍSICA	MÉDIA NO PREÇO	ACUMULADO FÍSICO (PRECATORIAL)	MÉDIA NO PREÇO	ACUMULADO PRECATORIAL (R\$)		
28.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	55,20	3,87	213,02	50,91	50,91	197,02	197,02	7,77	
28.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	475,04	1,09	463,29	392,01	392,01	427,29	427,29	7,77	
28.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	1,00	115,23	115,23	115,23	115,23			100,00	
28.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	1,00	115,23	115,23	115,23	115,23			100,00	
29.0	RUA ULISSES GOMES				58.275,03			51.795,87	51.795,87		
29.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				351,38			351,38	351,38		
29.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e gride	m²	1.064,80	0,33	351,38	1.064,80	1.064,80	351,38	351,38		
29.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				57.809,02			51.329,26	51.329,26		
29.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	958,32	2,36	2.261,64	958,32	958,32	2.261,64	2.261,64		
29.2.2	CRUQ										
29.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	47,92	1.147,56	54.991,08	42,33	42,33	48.576,21	48.576,21	11,67	
29.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	47,92	3,87	185,45	42,33	42,33	163,82	163,82	11,66	
29.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	340,23	1,09	370,85	300,54	300,54	327,59	327,59	11,67	
29.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	1,00	115,23	115,23	1,00	1,00	115,23	115,23		
29.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	1,00	115,23	115,23	1,00	1,00	115,23	115,23		
30.0	RUA DESEMBARGADOR TRINDADE				140.693,02			121.901,73	121.901,73		
30.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				671,22			589,86	589,86		
30.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e gride	m²	2.034,00	0,33	671,22	1.787,45	1.787,45	589,86	589,86	12,12	
30.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				139.415,65			121.311,87	121.311,87		
30.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	3.742,56	2,36	8.832,44	3.256,52	3.256,52	7.685,39	7.685,39	12,99	
30.2.2	CRUQ										
30.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperilamento	m³	56,14	1.207,08	67.765,47	48,85	48,85	58.965,66	58.965,66	12,99	
30.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperilamento	m³	56,14	1.093,55	61.391,90	48,85	48,85	53.419,92	53.419,92	12,99	
30.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	112,28	3,87	434,52	97,70	97,70	378,10	378,10	12,98	
30.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	909,47	1,09	991,32	791,38	791,38	862,60	862,60	12,98	
30.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	5,00	115,23	576,15	576,15	576,15			100,00	
30.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	5,00	115,23	576,15	576,15	576,15			100,00	
31.0	RUA ERITÁCIO PESSOA				224.095,66			223.173,82	223.173,82		
31.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.284,82			1.284,82	1.284,82		
31.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e gride	m²	3.893,40	0,33	1.284,82	3.893,40	3.893,40	1.284,82	1.284,82		
31.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				221.899,00			221.899,00	221.899,00		

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
 FORTES DO S. J. J. C. XAVIER
 Eng.º Civil - CREAB-PE nº 100.233.5-2
 Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
 Eng.º João Nilton de Oliveira
 CREA - 160.655-0/6-0/PE

CAIXA		Re de CTEF (Contrato Especial/Financiamento)		Grau de Sigilo	
Início da obra - data		29/06/2020		Data do CT	
Previsão Término da obra		26/07/2021		1.065.660-37	
CTEF - Valor total inicial (R\$)		18.225.646,43		Tomador/Ag. Promotor ou Tomador	
CTEF - Valor atual (R\$)		18.225.646,43		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	
CTEF - Valor atual (R\$)		18.225.646,43		Agente Financeiro ou Ag. Operador Financeiro	
CTEF - Valor atual (R\$)		18.225.646,43		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
CTEF - Valor atual (R\$)		18.225.646,43		Fonte de Recursos	
CTEF - Valor atual (R\$)		18.225.646,43		Conta (descrever)	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBRAS	PREÇO UNITÁRIO				PREÇO TOTAL				PREÇO UNITÁRIO				PREÇO TOTAL			
		QTD.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	QTD.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	QTD.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	QTD.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
31.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	3.670,92	2,36	8.663,37	3.670,92	2,36	8.663,37	3.670,92	2,36	8.663,37	3.670,92	2,36	8.663,37	3.670,92	2,36	8.663,37
31.2.2	CBUQ	m³	163,55	1.147,56	210.634,64	163,55	1.147,56	210.634,64	163,55	1.147,56	210.634,64	163,55	1.147,56	210.634,64	163,55	1.147,56	210.634,64
31.2.3	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	163,55	3,87	710,34	163,55	3,87	710,34	163,55	3,87	710,34	163,55	3,87	710,34	163,55	3,87	710,34
31.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.725,37	1,09	1.880,65	1.725,37	1,09	1.880,65	1.725,37	1,09	1.880,65	1.725,37	1,09	1.880,65	1.725,37	1,09	1.880,65
31.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	8,00	115,23	921,84	8,00	115,23	921,84	8,00	115,23	921,84	8,00	115,23	921,84	8,00	115,23	921,84
31.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	8,00	115,23	921,84	8,00	115,23	921,84	8,00	115,23	921,84	8,00	115,23	921,84	8,00	115,23	921,84
32.0	RUA AFONSO CAMPOS				224.864,26			224.864,26			224.864,26			224.864,26			224.864,26
32.1	SERVICOS PRELIMINARES				1.935,02			1.935,02			1.935,02			1.935,02			1.935,02
32.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e gride	m²	4.045,50	0,33	1.335,02	4.045,50	0,33	1.335,02	4.045,50	0,33	1.335,02	4.045,50	0,33	1.335,02	4.045,50	0,33	1.335,02
32.2	SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO				222.261,71			222.261,71			222.261,71			222.261,71			222.261,71
32.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	3.665,90	2,36	8.663,37	3.665,90	2,36	8.663,37	3.665,90	2,36	8.663,37	3.665,90	2,36	8.663,37	3.665,90	2,36	8.663,37
32.2.2	CBUQ	m³	164,29	1.147,56	210.634,64	164,29	1.147,56	210.634,64	164,29	1.147,56	210.634,64	164,29	1.147,56	210.634,64	164,29	1.147,56	210.634,64
32.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	164,29	3,87	710,34	164,29	3,87	710,34	164,29	3,87	710,34	164,29	3,87	710,34	164,29	3,87	710,34
32.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.253,17	1,09	1.365,96	1.253,17	1,09	1.365,96	1.253,17	1,09	1.365,96	1.253,17	1,09	1.365,96	1.253,17	1,09	1.365,96
32.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	11,00	115,23	1.267,53	11,00	115,23	1.267,53	11,00	115,23	1.267,53	11,00	115,23	1.267,53	11,00	115,23	1.267,53
32.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	11,00	115,23	1.267,53	11,00	115,23	1.267,53	11,00	115,23	1.267,53	11,00	115,23	1.267,53	11,00	115,23	1.267,53
33.0	RUA BENEDITO MOTTA				190.122,51			190.122,51			190.122,51			190.122,51			190.122,51
33.1	SERVICOS PRELIMINARES				900,87			900,87			900,87			900,87			900,87
33.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e gride	m²	2.729,92	0,33	900,87	2.729,92	0,33	900,87	2.729,92	0,33	900,87	2.729,92	0,33	900,87	2.729,92	0,33	900,87
33.2	SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO				188.991,18			188.991,18			188.991,18			188.991,18			188.991,18
33.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	5.057,66	2,36	11.936,55	5.057,66	2,36	11.936,55	5.057,66	2,36	11.936,55	5.057,66	2,36	11.936,55	5.057,66	2,36	11.936,55
33.2.2	CBUQ	m³	75,67	1.207,08	91.581,16	75,67	1.207,08	91.581,16	75,67	1.207,08	91.581,16	75,67	1.207,08	91.581,16	75,67	1.207,08	91.581,16
33.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	75,67	3,87	292,76	75,67	3,87	292,76	75,67	3,87	292,76	75,67	3,87	292,76	75,67	3,87	292,76
33.2.2.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.760,18	1,09	1.918,60	1.760,18	1,09	1.918,60	1.760,18	1,09	1.918,60	1.760,18	1,09	1.918,60	1.760,18	1,09	1.918,60
33.2.3	CBUQ	m³	151,74	3,87	587,23	151,74	3,87	587,23	151,74	3,87	587,23	151,74	3,87	587,23	151,74	3,87	587,23
33.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.760,18	1,09	1.918,60	1.760,18	1,09	1.918,60	1.760,18	1,09	1.918,60	1.760,18	1,09	1.918,60	1.760,18	1,09	1.918,60
33.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	280,46		280,46	280,46		280,46	280,46		280,46	280,46		280,46	280,46		280,46
33.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	280,46		280,46	280,46		280,46	280,46		280,46	280,46		280,46	280,46		280,46

PEEF. MUNIC. DE C. GRANDE
 PREFEITO: DR. JERSON C. XAVIER
 Rua - 2053-925 - 11-100-2303-0-2
 Constituinte Ericha Cavalcante Ltda.
 Eng. Responsável Técnica
 Eng. Responsável Técnica

CAIXA		RFB - número 11		RFB - Data emissão 31/05/2021		RFB - Período de referência da medição de 26/04/2021 a 31/05/2021		RFB - Grau de Sigilo	
RFB - Inscrição (Cadastro/Conhecimento) 2.08.027/2020		RFB - Inscrição 11		RFB - Data emissão 31/05/2021		RFB - Período de referência da medição de 26/04/2021 a 31/05/2021		RFB - Grau de Sigilo	
Início da obra - data 29/06/2020		Previsão Término da obra 26/01/2021		RFB - Data emissão 31/05/2021		RFB - Período de referência da medição de 26/04/2021 a 31/05/2021		RFB - Grau de Sigilo	
Valor total inicial (R\$) 18.225.646,43		CTEF - de assinatura		RFB - Data emissão 31/05/2021		RFB - Período de referência da medição de 26/04/2021 a 31/05/2021		RFB - Grau de Sigilo	
Valor atual (R\$) 18.225.646,43		CTEF - de último Adit.		RFB - Data emissão 31/05/2021		RFB - Período de referência da medição de 26/04/2021 a 31/05/2021		RFB - Grau de Sigilo	
RFB - Inscrição 11		RFB - Inscrição 11		RFB - Data emissão 31/05/2021		RFB - Período de referência da medição de 26/04/2021 a 31/05/2021		RFB - Grau de Sigilo	
RFB - Inscrição 11		RFB - Inscrição 11		RFB - Data emissão 31/05/2021		RFB - Período de referência da medição de 26/04/2021 a 31/05/2021		RFB - Grau de Sigilo	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBRAS	PREÇO NO OCORRIMENTO			EXECUÇÃO PARCIAL (R\$)			ACUMULADO INICIAL DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL DO PERÍODO
		UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO NO PERÍODO		
36.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m²	36,80	1.147,56	42.230,21	36,80	42.230,21	42.230,21	42.230,21
36.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	36,80	3,87	142,42	36,80	142,42	142,42	142,42
36.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	397,44	1,09	433,21	397,44	433,21	433,21	433,21
36.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	1,00	115,23	115,23				
36.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita	unidade	1,00	115,23	115,23				100,00
37.0	RUA BENJAMIN CONSTANT				31.901,56		31.901,56	31.901,56	31.901,56
37.1	SERVICOS PRELIMINARES				151,01		151,01	151,01	151,01
37.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	457,60	0,33	151,01	457,60	151,01	151,01	151,01
37.2	SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO				31.635,32		31.635,32	31.635,32	31.635,32
37.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	848,64	2,36	2.002,79	848,64	2.002,79	2.002,79	2.002,79
37.2.2	CBUQ				15.366,13		15.366,13	15.366,13	15.366,13
37.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m²	12,73	1.207,08	13.970,89	12,73	13.970,89	13.970,89	13.970,89
37.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Repetimento	m²	12,73	1.093,55	13.970,89	12,73	13.970,89	13.970,89	13.970,89
37.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	25,46	3,87	98,53	25,46	98,53	98,53	98,53
37.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	226,59	1,09	246,98	226,59	246,98	246,98	246,98
37.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	1,00	115,23	115,23				
37.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita	unidade	1,00	115,23	115,23				100,00
38.0	RUA PRUDENTE DE MORAIS				360.222,03		360.222,03	360.222,03	360.222,03
38.1	SERVICOS PRELIMINARES				1.939,50		1.939,50	1.939,50	1.939,50
38.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	5.877,28	0,33	1.939,50	5.877,28	1.939,50	1.939,50	1.939,50
38.2	SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO				357.245,46		357.245,46	357.245,46	357.245,46
38.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	5.393,55	2,36	12.728,78	5.393,55	12.728,78	12.728,78	12.728,78
38.2.2	CBUQ				344.516,68		344.516,68	344.516,68	344.516,68
38.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m²	286,68	1.147,56	344.516,68	286,68	344.516,68	344.516,68	344.516,68
38.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	296,68	3,87	1.148,15	296,68	1.148,15	1.148,15	1.148,15
38.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	2.670,12	1,09	2.910,43	2.670,12	2.910,43	2.910,43	2.910,43
38.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	9,00	115,23	1.037,07				
38.3.1	Nivelamento de Tampa de Poço de Visita	unidade	9,00	115,23	1.037,07				100,00

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
 RUA PRUDENTE DE MORAIS, 100 - JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCONEGÓ, SANTO ANTONIO, SÃO JOSÉ, SERROTAO, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITARIO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA
 Fonte de Pagamentos: outra (despovo)
 Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
 Rua José Augusto de Oliveira, 100 - J. Bodoconego - PB

CAIXA		RFB - número 11		RFB - Data emissão 31/05/2021		RFB - Período de referência da medição de 26/04/2021 a 31/05/2021		RFB - Data do CT 01/07/20	
RFB - Contrato (Emprego/Contratamento) 2.08.027/2020		Empresas Contratadas CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA		Objeto do CITE (ou objeto)		CITE - nº 1.085.660-37		Tomador/Para Promotor ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	
Início da obra - data 29/06/2020		Previsão Término da obra 26/07/2021		CITE - data assinatura		Agente Responsável ou Ag. Operacional Responsável			
Valor total licita (R\$) 18.225.646,43		CITE - R\$ último Adm.		CITE - R\$ último Adm.		CANA ECONÔMICA FEDERAL			
Valor total (R\$) 18.225.646,43		CITE - R\$ último Adm.		CITE - R\$ último Adm.		CANA ECONÔMICA FEDERAL			
CITE - Valor total (R\$) 18.225.646,43		CITE - R\$ último Adm.		CITE - R\$ último Adm.		CANA ECONÔMICA FEDERAL			

ITEM	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS			EXECUÇÃO DE MATERIAIS			EXECUÇÃO DE OBRAS							
					QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL					
39.0				482.133,33														
39.1				2.429,30														
39.1.1	m²		0,33	7.381,50														
39.2				478.551,73														
39.2.1	m²		2,36	11.570,38														
39.2.3				27.306,10														
39.2.3.1	m³		1,147,56	98,74														
39.2.3.2	m³		1,207,08	143,93														
39.2.3.3	m³		1,093,55	143,93														
39.2.3	m³		3,87	386,61														
39.2.4	m² x km		1,09	4.871,29														
39.3				1.152,30														
39.3.1	unidade		115,23	10,00														
40.0				148.557,74														
40.1				690,69														
40.1.1	m²		0,33	2.093,00														
40.2				147.636,59														
40.2.1	m²		2,36	3.941,52														
40.2.2				9.349,19														
40.2.2.1	m³		59,43	71.736,76														
40.2.2.2	m³		59,43	1.093,55														
40.2.3	m³		3,87	118,84														
40.2.4	m² x km		1,09	1.010,14														
40.3				230,46														
40.3.1	unidade		2,00	115,23														
41.0				785.789,19														
41.1				4.619,39														
41.1.1	m²		0,33	13.998,15														
42				778.634,74														
42.1	m²		2,36	30.371,19														

CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA.
 Rua: ...
 ...
 ...

CAIXA		RPA do CTE (Contrato Escopo/forneçimento)		RPA do CT		Grau de Sigilo	
2.08.027/2020		26/07/2021		1.065.660-37		01/07/20	
Início da obra - data		Previsto término da obra		Tombamento/Arquitetura em Transferência			
29/06/2020		26/07/2021		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE			
Valor total inicial (R\$)		CTE - à estimativa		Agente Financeiro ou P.S. Operador Registro			
18.225.646,43		CTE - à estimativa		CMA ECONÔMICA FEDERAL			
Valor atual (R\$)		CTE - Trânsito Adm.		Fonte de Recursos		outra (descrever)	
18.225.646,43		CTE - Trânsito Adm.		outra (descrever)			

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU DEPOSITO	FAZENDA NO QUANTITARIO				FAZENDA NO PREÇO				FAZENDA NO VALOR				ACUMULADO INICIAL DO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MÓDULO DO PERÍODO	ACUMULADO INICIAL DO PERÍODO	DESVIO (%)
		UNID.	QTD	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MÓDULO DO PERÍODO	ACUMULADO INICIAL DO PERÍODO	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MÓDULO DO PERÍODO	ACUMULADO INICIAL DO PERÍODO	DESVIO (%)					
41.2.2	CBUQ	m²	643,46	1.147,56	738.408,96	603,92	693.034,44	603,92	693.034,44	603,92	693.034,44	603,92	693.034,44	603,92	693.034,44	603,92	693.034,44	6,14
41.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	643,46	3,87	2.490,19	603,92	2.337,17	603,92	2.337,17	603,92	2.337,17	603,92	2.337,17	603,92	2.337,17	603,92	2.337,17	6,14
41.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³ x km	6.756,33	1,09	7.364,40	6.341,16	6.911,86	6.341,16	6.911,86	6.341,16	6.911,86	6.341,16	6.911,86	6.341,16	6.911,86	6.341,16	6.911,86	6,14
41.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	unidade	22,00	115,23	2.535,06	2.535,06	2.535,06	2.535,06	2.535,06	2.535,06	2.535,06	2.535,06	2.535,06	2.535,06	2.535,06	2.535,06	2.535,06	100,00
41.3.1	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA																	
42.0	RUA SEBASTIÃO MARTINS DE OLIVEIRA				83.944,02		83.944,02		83.944,02		83.944,02		83.944,02		83.944,02		83.944,02	
42.1	SERVICOS PRELIMINARES				415,80		415,80		415,80		415,80		415,80		415,80		415,80	
42.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	1.260,00	0,33	415,80	1.260,00	415,80	1.260,00	415,80	1.260,00	415,80	1.260,00	415,80	1.260,00	415,80	1.260,00	415,80	
42.2	SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO				83.412,99		83.412,99		83.412,99		83.412,99		83.412,99		83.412,99		83.412,99	
42.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	2.232,00	2,36	5.267,52	2.232,00	5.267,52	2.232,00	5.267,52	2.232,00	5.267,52	2.232,00	5.267,52	2.232,00	5.267,52	2.232,00	5.267,52	
42.2.2	CBUQ																	
42.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	33,48	1.207,08	40.413,04	33,39	40.304,40	33,39	40.304,40	33,39	40.304,40	33,39	40.304,40	33,39	40.304,40	33,39	40.304,40	0,27
42.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperilamento	m³	33,48	1.093,55	36.612,05	31,09	33.998,47	31,09	33.998,47	31,09	33.998,47	31,09	33.998,47	31,09	33.998,47	31,09	33.998,47	7,14
42.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	66,96	3,87	259,14	64,48	249,54	64,48	249,54	64,48	249,54	64,48	249,54	64,48	249,54	64,48	249,54	3,70
42.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	790,13	1,09	861,24	760,86	829,34	760,86	829,34	760,86	829,34	760,86	829,34	760,86	829,34	760,86	829,34	3,70
42.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				115,23		115,23		115,23		115,23		115,23		115,23		115,23	
42.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	1,00	115,23	115,23	1,00	115,23	1,00	115,23	1,00	115,23	1,00	115,23	1,00	115,23	1,00	115,23	
43.0	RUA FLORIPES COUTINHO				739.697,48		739.697,48		739.697,48		739.697,48		739.697,48		739.697,48		739.697,48	
43.1	SERVICOS PRELIMINARES				4.263,60		4.263,60		4.263,60		4.263,60		4.263,60		4.263,60		4.263,60	
43.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	12.920,00	0,33	4.263,60	7.994,81	7.994,81	7.994,81	7.994,81	7.994,81	7.994,81	7.994,81	7.994,81	7.994,81	7.994,81	7.994,81	7.994,81	
43.2	SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO				732.888,82		732.888,82		732.888,82		732.888,82		732.888,82		732.888,82		732.888,82	
43.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	32.605,20	2,36	76.755,76	7.099,05	16.755,76	7.099,05	16.755,76	7.099,05	16.755,76	7.099,05	16.755,76	7.099,05	16.755,76	7.099,05	16.755,76	43,68
43.2.2	CBUQ																	
43.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	584,76	1.147,56	671.047,19	322,42	369.996,30	322,42	369.996,30	322,42	369.996,30	322,42	369.996,30	322,42	369.996,30	322,42	369.996,30	44,86
43.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperilamento	m³	19,50	1.093,55	21.324,23	19,50	21.324,23	19,50	21.324,23	19,50	21.324,23	19,50	21.324,23	19,50	21.324,23	19,50	21.324,23	
43.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	604,26	3,87	2.338,49	341,94	1.323,31	341,94	1.323,31	341,94	1.323,31	341,94	1.323,31	341,94	1.323,31	341,94	1.323,31	43,41
43.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	7.794,53	1,09	8.430,64	4.376,84	4.770,76	4.376,84	4.770,76	4.376,84	4.770,76	4.376,84	4.770,76	4.376,84	4.770,76	4.376,84	4.770,76	43,41
43.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				2.535,06		2.535,06		2.535,06		2.535,06		2.535,06		2.535,06		2.535,06	

Eng. João Neto de Oliveira
 CREA 199/0557-1/DFB
 Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

CAIXA		RPM - número 11		RPM - Data emissão 31/05/2021		RPM - Período de referência da medição de 26/04/2021 a 31/05/2021		RPM - Grau de Sítio 19/07/20	
RPM do CTEE (Contrato Executivo/funcionário) 2.08.022/2020		Empresa Contratada CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA		COP 09.323.098/0001.92		Tomador/Obj. Promotor ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE		Data do CT	
Início da obra - data 29/06/2020		Previsão Término da obra 26/07/2021		Objeto do CTEE (resumido)		Agente Financeiro ou Ag. Operador Pagasse			
CTEE - Valor total inicial (R\$) 18.225.646,43		CTEE - de assinatura		RECAPAMENTO ASFÁLTICO NOS BARRIOS CENTRO, ILELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTAÇÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, JODOCOCK O, SANTA CRUZ, DINAMERICA, CATOLÉ, CENTERÁRIO, CRUZEIRO, JARJIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCÓNGO, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTIÃO, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
CTEE - Valor atual (R\$) 18.225.646,43		CTEE - Tr. último /de.		local da obra (bairro/Município/UF)		Fonte de Recursos		outra (descrever)	
		PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO							

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO EMPENDIMENTO	PARCELAS DO ORÇAMENTO				EXECUÇÃO FÍSICA (QUANTITATIVOS)				EXECUTIVO FINANCEIRO (R\$)		DESEJO (%)
		UNID.	QTDDE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	RECORRIDO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	PERÍODO DO PERÍODO	ADICIONADO INCLUSIVE O PERÍODO	ADICIONADO INCLUSIVE O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	ACUMULADO INCLUSIVE O PERÍODO	
48.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Conc eto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	79,80	1.207,08	96.324,68	79,28		79,28		95.637,30		0,65
48.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017. - Reperfilamento	m³	79,80	1.093,55	87.265,29	76,72		76,72		83.897,16		3,86
48.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	159,60	3,87	617,65	156,00		156,00		603,72		2,26
48.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.165,08	1,09	1.269,94	1.138,80		1.138,80		1.241,29		2,26
48.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	7,00	115,23	806,61							100,00
48.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	7,00	115,23	806,61							100,00
49.0	RUA LADISLAU RODRIGUES DE SOUZA				137.669,10					125.433,87		
49.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				656,70					530,52		
49.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	1.990,00	0,33	656,70	1.696,54		1.696,54		1.696,54		14,65
49.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				136.781,94					124.692,89		
49.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C inclusive aquisição e transporte	m²	3.651,60	2,36	8.641,96	3.394,82		3.394,82		8.011,78		7,29
49.2.2	CBUQ											
49.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Conc eto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	54,92	1.207,08	66.292,83	49,13		49,13		59.303,84		10,54
49.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017. - Reperfilamento	m³	54,92	1.093,55	60.057,77	50,95		50,95		55.716,37		7,23
49.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	109,84	3,87	425,08	100,08		100,08		387,31		8,89
49.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.252,18	1,09	1.364,88	1.140,91		1.140,91		1.243,59		8,89
49.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	2,00	115,23	230,46	2,00		2,00		230,46		
49.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	2,00	115,23	230,46	2,00		2,00		230,46		
50.0	RUA FRANCISCO LOPES				112.352,05					112.334,15		
50.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				528,00					494,35		
50.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	1.600,00	0,33	528,00	1.498,03		1.498,03		494,35		6,37
50.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				111.479,36					111.628,05		
50.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C inclusive aquisição e transporte	m²	2.984,40	2,36	7.043,18	2.984,40		2.984,40		7.043,18		
50.2.2	CBUQ											
50.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	44,76	1.207,08	54.028,90	44,73		44,73		53.912,69		0,97
50.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusiva transporte. AF_03/2017. - Reperfilamento	m³	44,76	1.093,55	48.947,30	44,93		44,93		49.173,20		0,07
50.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	89,53	3,87	346,48	89,53		89,53		346,48		


PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
Eng. Civ. - CREA-PB Nº 150.283534-2

Adriano Gomes do Nascimento
PMCG/SECOB - Coordenador
de Planejamento de Obras


Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
Eng. João Aécio de Oliveira
CREA 180695208 DPE

CAIXA		RUA - número		RUA - Para emissão		RUA - Início de existência da medição		Grau de Sigilo	
Rf do CTE (Contrato Escopo/Função)		11		31/05/2021		de 26/04/2021 a 31/05/2021		Data do CT	
Início de obra - dia		29/06/2020		Prestação Termino da obra		20/07/2021		1.065.660-37	
CTEF - Valor total inicial (R\$)		18.225.646,43		CTEF - In último Adit.		18.225.646,43		Tomador/Ag Promotor ou Tomador	
CTEF - Valor atual (R\$)		18.225.646,43		CTEF - In último Adit.		18.225.646,43		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	
CTEF - Valor atual (R\$)		18.225.646,43		CTEF - In último Adit.		18.225.646,43		Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse	
CTEF - Valor atual (R\$)		18.225.646,43		CTEF - In último Adit.		18.225.646,43		CINEMA ECONÔMICA FEDERAL	
CTEF - Valor atual (R\$)		18.225.646,43		CTEF - In último Adit.		18.225.646,43		Fonte de Recursos	
CTEF - Valor atual (R\$)		18.225.646,43		CTEF - In último Adit.		18.225.646,43		outra (discreev)	

ITEM	UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ESCALONAMENTO FÍSICO (QUANTITATIVOS)		ESCALONAMENTO FINANCEIRO (R\$)		DESCRIÇÃO (R\$)
					ADICIONADO ANTERIOR	ADICIONADO ATÉ O MESMO PERÍODO	ADICIONADO ANTERIOR	ADICIONADO ATÉ O MESMO PERÍODO	
53.1									
53.1.1	m²	3.254,85	0,33	1.074,10	2.534,37	2.534,37	836,34	836,34	836,34
53.2	m²	5.931,06	2,36	13.977,30	5.068,08	11.960,67	185.714,45	185.714,45	185.714,45
53.2.1	m²	5.931,06	2,36	13.977,30	5.068,08	11.960,67	185.714,45	185.714,45	185.714,45
53.2.2	m²	5.931,06	2,36	13.977,30	5.068,08	11.960,67	185.714,45	185.714,45	185.714,45
53.2.3	m²	5.931,06	2,36	13.977,30	5.068,08	11.960,67	185.714,45	185.714,45	185.714,45
53.2.4	m²	5.931,06	2,36	13.977,30	5.068,08	11.960,67	185.714,45	185.714,45	185.714,45
53.2.5	m²	5.931,06	2,36	13.977,30	5.068,08	11.960,67	185.714,45	185.714,45	185.714,45
53.3	m³	88,96	1.207,08	107.381,84	73,48	88.696,24	88.696,24	88.696,24	88.696,24
53.3.1	m³	88,96	1.207,08	107.381,84	73,48	88.696,24	88.696,24	88.696,24	88.696,24
53.3.2	m³	88,96	1.207,08	107.381,84	73,48	88.696,24	88.696,24	88.696,24	88.696,24
53.3.3	m³	88,96	1.207,08	107.381,84	73,48	88.696,24	88.696,24	88.696,24	88.696,24
53.3.4	m³	88,96	1.207,08	107.381,84	73,48	88.696,24	88.696,24	88.696,24	88.696,24
53.3.5	m³	88,96	1.207,08	107.381,84	73,48	88.696,24	88.696,24	88.696,24	88.696,24
54.0	m²	159.517,62	0,33	52.450,81	159.517,62	159.517,62	576,15	576,15	576,15
54.1	m²	159.517,62	0,33	52.450,81	159.517,62	159.517,62	576,15	576,15	576,15
54.1.1	m²	159.517,62	0,33	52.450,81	159.517,62	159.517,62	576,15	576,15	576,15
54.1.2	m²	159.517,62	0,33	52.450,81	159.517,62	159.517,62	576,15	576,15	576,15
54.1.3	m²	159.517,62	0,33	52.450,81	159.517,62	159.517,62	576,15	576,15	576,15
54.1.4	m²	159.517,62	0,33	52.450,81	159.517,62	159.517,62	576,15	576,15	576,15
54.1.5	m²	159.517,62	0,33	52.450,81	159.517,62	159.517,62	576,15	576,15	576,15
54.2	m²	4.201,44	2,36	10.057,00	3.986,33	9.407,74	9.407,74	9.407,74	9.407,74
54.2.1	m²	4.201,44	2,36	10.057,00	3.986,33	9.407,74	9.407,74	9.407,74	9.407,74
54.2.2	m²	4.201,44	2,36	10.057,00	3.986,33	9.407,74	9.407,74	9.407,74	9.407,74
54.2.3	m²	4.201,44	2,36	10.057,00	3.986,33	9.407,74	9.407,74	9.407,74	9.407,74
54.2.4	m²	4.201,44	2,36	10.057,00	3.986,33	9.407,74	9.407,74	9.407,74	9.407,74
54.2.5	m²	4.201,44	2,36	10.057,00	3.986,33	9.407,74	9.407,74	9.407,74	9.407,74
54.2.6	m²	4.201,44	2,36	10.057,00	3.986,33	9.407,74	9.407,74	9.407,74	9.407,74
54.2.7	m²	4.201,44	2,36	10.057,00	3.986,33	9.407,74	9.407,74	9.407,74	9.407,74
54.2.8	m²	4.201,44	2,36	10.057,00	3.986,33	9.407,74	9.407,74	9.407,74	9.407,74
54.2.9	m²	4.201,44	2,36	10.057,00	3.986,33	9.407,74	9.407,74	9.407,74	9.407,74
54.2.10	m²	4.201,44	2,36	10.057,00	3.986,33	9.407,74	9.407,74	9.407,74	9.407,74
54.2.11	m²	4.201,44	2,36	10.057,00	3.986,33	9.407,74	9.407,74	9.407,74	9.407,74
54.2.12	m²	4.201,44	2,36	10.057,00	3.986,33	9.407,74	9.407,74	9.407,74	9.407,74
54.2.13	m²	4.201,44	2,36	10.057,00	3.986,33	9.407,74	9.407,74	9.407,74	9.407,74
54.2.14	m²	4.201,44	2,36	10.057,00	3.986,33	9.407,74	9.407,74	9.407,74	9.407,74
54.2.15	m²	4.201,44	2,36	10.057,00	3.986,33	9.407,74	9.407,74	9.407,74	9.407,74
54.2.16	m²	4.201,44	2,36	10.057,00	3.986,33	9.407,74	9.407,74	9.407,74	9.407,74
54.2.17	m²	4.201,44	2,36	10.057,00	3.986,33	9.407,74	9.407,74	9.407,74	9.407,74
54.2.18	m²	4.201,44	2,36	10.057,00	3.986,33	9.407,74	9.407,74	9.407,74	9.407,74
54.2.19	m²	4.201,44	2,36	10.057,00	3.986,33	9.407,74	9.407,74	9.407,74	9.407,74
54.2.20	m²	4.201,44	2,36	10.057,00	3.986,33	9.407,74	9.407,74	9.407,74	9.407,74
54.2.21	m²	4.201,44	2,36	10.057,00	3.986,33	9.407,74	9.407,74	9.407,74	9.407,74
54.2.22	m²	4.201,44	2,36	10.057,00	3.986,33	9.407,74	9.407,74	9.407,74	9.407,74
54.2.23	m²	4.201,44	2,36	10.057,00	3.986,33	9.407,74	9.407,74	9.407,74	9.407,74
54.2.24	m²	4.201,44	2,36	10.057,00	3.986,33	9.407,74	9.407,74	9.407,74	9.407,74
54.2.25	m²	4.201,44	2,36	10.057,00	3.986,33	9.407,74	9.407,74	9.407,74	9.407,74
54.2.26	m²	4.201,44	2,36	10.057,00	3.986,33	9.407,74	9.407,74	9.407,74	9.407,74
54.2.27	m²	4.201,44	2,36	10.057,00	3.986,33	9.407,74	9.407,74	9.407,74	9.407,74
54.2.28	m²	4.201,44	2,36	10.057,00	3.986,33	9.407,74	9.407,74	9.407,74	9.407,74
54.2.29	m²	4.201,44	2,36	10.057,00	3.986,33	9.407,74	9.407,74	9.407,74	9.407,74
54.2.30	m²	4.201,44	2,36	10.057,00	3.986,33	9.407,74	9.407,74	9.407,74	9.407,74
54.2.31	m²	4.201,44	2,36	10.057,00	3.986,33	9.407,74	9.407,74	9.407,74	9.407,74
54.2.32	m²	4.201,44	2,36	10.057,00	3.986,33	9.407,74	9.407,74	9.407,74	9.407,74
54.2.33	m²	4.201,44	2,36	10.057,00	3.986,33	9.407,74	9.407,74	9.407,74	9.407,74
54.2.34	m²	4.201,44	2,36	10.057,00	3.986,33	9.407,74	9.407,74	9.407,74	9.407,74
54.2.35	m²	4.201,44	2,36	10.057,00	3.986,33	9.407,74	9.407,74	9.407,74	9.407,74
54.2.36	m²	4.201,44	2,36	10.057,00	3.986,33	9.407,74	9.407,74	9.407,74	9.407,74
54.2.37	m²	4.201,44	2,36	10.057,00	3.986,33	9.407,74	9.407,74	9.407,74	9.407,74
54.2.38	m²	4.201,44	2,36	10.057,00	3.986,33	9.407,74	9.407,74	9.407,74	9.407,74
54.2.39	m²	4.201,44	2,36	10.057,00	3.986,33	9.407,74	9.407,74	9.407,74	9.407,74
54.2.40	m²	4.201,44	2,36	10.057,00	3.986,33	9.407,74	9.407,74	9.407,74	9.407,74
54.2.41	m²	4.201,44	2,36	10.057,00	3.986,33	9.407,74	9.407,74	9.407,74	9.407,74
54.2.42	m²	4.201,44	2,36	10.057,00	3.986,33	9.407,74	9.407,74	9.407,74	9.407,74
54.2.43	m²	4.201,44	2,36	10.057,00	3.986,33	9.407,74	9.407,74	9.407,74	9.407,74
54.2.44	m²	4.201,44	2,36	10.057,00	3.986,33	9.407,74	9.407,74	9.407,74	9.407,74
54.2.45	m²	4.201,44	2,36	10.057,00	3.986,33	9.407,74	9.407,74	9.407,74	9.407,74
54.2.46	m²	4.201,44	2,36	10.057,00	3.986,33	9.407,74	9.407,74	9.407,74	9.407,74
54.2.47	m²	4.201,44	2,36	10.057,00	3.986,33	9.407,74	9.407,74	9.407,74	9.407,74
54.2.48	m²	4.201,44	2,36	10.057,00	3.986,33	9.407,74	9.407,74	9.407,74	9.407,74
54.2.49	m²	4.201,44	2,36	10.057,00	3.986,33	9.407,74	9.407,74	9.407,74	9.407,74
54.2.50	m²	4.201,44	2,36	10.057,00	3.986,33	9.407,74	9.407,74	9.407,74	9.407,74
54.2.51	m²	4.201,44	2,36	10.057,00	3.986,33	9.407,74	9.407,74	9.407,74	9.407,74
54.2.52	m²	4.201,44	2,36	10.057,00	3.986,33	9.407,74	9.407,74	9.407,74	9.407,74
54.2.53	m²	4.201,44	2,36	10.057,00	3.986,33	9.407,74	9.407,74	9.407,74	9.407,74
54.2.54	m²	4.201,44	2,36	10.057,00	3.986,33	9.407,74	9.407,74	9.407,74	9.407,74
54.2.55	m²	4.201,44	2,36	10.057,00	3.986,33	9.407,74	9.407,74	9.407,74	9.407,74
54.2.56	m²	4.201,44	2,36	10.057,00	3.986,33	9.407,74	9.407,74	9.407,74	9.407,74
54.2.57	m²	4.201,44	2,36	10.057,00	3.986,33	9.407,74	9.407,74	9.407,74	9.407,74
54.2.58	m²	4.201,44	2,36	10.057,00	3.986,33	9.407,74	9.407,74	9.407,74	9.407,74
54.2.59	m²	4.201,44	2,36	10.057,00	3.986,33	9.407,74	9.407,74	9.407,74	9.407,74
54.2.60	m²	4.201,44	2,36	10.057,00	3.986,33	9.407,74	9.407,74	9.407,74	9.407,74
54.2.61	m²	4.201,44	2,36	10.057,00	3.986,33	9.407,74	9.407,74	9.407,74	9.407,74</

		BM - número 11		BM - Data emissão 31/05/2021		BM - Período de referência da medição de 26/04/2021 a 31/05/2021		RF do CT 1.065.660-37		Grav de Sigilo 01/07/20	
RF do CTEI (Contrato Execução/Obramento) 2.08.022/2020		Empresa Contratada CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA		CPFI 09.323.099/0001-92		Tomador/Ag. Passante ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE		Agente Financeiro ou Ag. Operador Passante CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Data do CT 01/07/20	
Início da obra - data 29/06/2020		Previsão Término da obra 26/07/2021		Objeto do CTEI (resumo) RECAPAMENTO ASFÁLTICO NOS BARRIOS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTAÇÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCONGÓ, SANTA CRUZ, DINÂMICA, CATOLÉ, CENTEÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCONGÓ, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTAO, MALVINAS, MONTE SARTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA		Fonte de Recursos contra (descrever)					
CTEF - Valor total inicial (R\$) 18.225.646,43		CTEF - de ajustes									
CTEF - Valor atual (R\$) 18.225.646,43		CTEF - de último Adm.									

ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	REQUISITO DE QUANTIDADE			REQUISITO DE PREÇO UNITÁRIO			REQUISITO DE PREÇO TOTAL			REQUISITO DE PREÇO QUANTITATIVO			REQUISITO DE PREÇO ACUMULADO			DESCRIÇÃO
		UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	PERÍODO ATUAL	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	PERÍODO ATUAL	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	PERÍODO ATUAL	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	PERÍODO ATUAL	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	PERÍODO ATUAL		
57.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	7,00	115,23	806,61		7,00	806,61		7,00		806,61		806,61			
58.0	RUA JOANA D'ARC DE ARRUDA - TRECHO 01				314.117,23							293.407,24		293.407,24			
58.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.848,00							1.746,45		1.746,45			
58.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e gride	m²	5.600,00	0,33	1.848,00		5.292,26					1.746,45		1.746,45	5,50		
58.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				311.462,62							291.660,79		291.660,79			
58.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	5.152,00	2,36	12.158,72		4.874,96					11.504,91		11.504,91	5,38		
58.2.2	CBUQ				295.611,46							276.699,67		276.699,67	6,40		
58.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	257,60	1.147,56			241,12					2.523,08		2.523,08	6,40		
58.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	257,60	3,87	996,91		241,12					933,13		933,13	6,40		
58.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	2.472,96	1,09	2.695,53		2.314,75					2.523,08		2.523,08	6,40		
58.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				806,61							576,15		576,15			
58.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	7,00	115,23	806,61		5,00					576,15		576,15	28,57		
59.0	RUA JOANA D'ARC DE ARRUDA - TRECHO 02				199.723,34							197.694,86		197.694,86			
59.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				953,54							883,38		883,38			
59.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	2.869,50	0,33	953,54		2.676,90					883,38		883,38	7,36		
59.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				198.309,88							186.350,56		186.350,56			
59.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m³	5.316,68	2,36	12.547,36		4.486,88					10.589,04		10.589,04	15,61		
59.2.2	CBUQ				96.264,63							96.264,63		96.264,63			
59.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	79,75	1.207,08			79,75					87.210,61		87.210,61			
59.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperflamento	m³	79,75	1.093,55			79,75					617,27		617,27			
59.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	159,50	3,87	617,27		159,50					1.669,01		1.669,01			
59.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.531,20	1,09	1.669,01		1.531,20					460,92		460,92			
59.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				460,92							460,92		460,92			
59.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	4,00	115,23	460,92		4,00					460,92		460,92			
60.0	RUA FERNANDES VIEIRA				218.658,73							98.792,91		98.792,91			
60.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.002,54							435,70		435,70			
60.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	3.038,00	0,33	1.002,54		1.320,30					435,70		435,70	56,54		
60.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				216.964,81							98.357,21		98.357,21			
60.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m³	5.832,96	2,36	13.765,79		2.643,89					6.239,58		6.239,58	54,67		
60.2.2	CBUQ																



PROF. MUNIC. DE C. GRANDE

FRANCISCO DE ASSIS C. Xavier

 Rua... 100.33.05.3-2




Constitoria Rocha Cavalcante Ltda.

 Rua... 100.33.05.3-2

CAIXA		R\$ - número: 11		R\$ - Data emissão: 31/05/2021		R\$ - Início de referência da medição: 26/04/2021 a 31/05/2021		R\$ - Valor do CT: 1.065.660,37		Grau de Sigilo	
R\$ do CTE (Contrato Execução/Execução)		2.08.022/2020		Empresa contratada: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA		Objeto do CTE (resumido)		Tomador/Pró-Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE		Data do CT: 01/07/20	
Início da obra - data		29/06/2020		Previsão Término da obra: 26/07/2021		CTE - de assinatura		Agente financeiro ou Ag. Operador Pagador			
Valor total inicial (R\$)		18.225.646,43		CTE - de assinatura		R\$ - Valor atual (R\$): 18.225.646,43		CANA ECONÔMICA FEDERAL			
CTE - de assinatura		CTE - de assinatura		CTE - de assinatura		CTE - de assinatura		Fonte de Recursos		contra (descrever)	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PREÇO UNITÁRIO				EXECUÇÃO FÍSICA (QUANTIDADE)				EXECUÇÃO MONETÁRIA (R\$)				RESERVA (%)
		UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACABAMENTO COMPLETO	MEZURADO	ACABAMENTO INCOMPLETO	ACABAMENTO INCOMPLETO	MEZURADO	ACABAMENTO INCOMPLETO	ACABAMENTO INCOMPLETO	MEZURADO	
60.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	87,49	1.207,08	105.607,43	39,71		39,71	47.933,15		47.933,15		54,61	
60.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperfilamento	m³	87,49	1.093,55	95.674,89	39,61		39,61	43.315,52		43.315,52		54,73	
60.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	174,98	3,87	677,17	79,32		79,32	306,97		306,97		54,67	
60.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.137,37	1,09	1.239,73	515,59		515,59	561,99		561,99		54,67	
60.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	6,00	115,23	691,38	691,38		691,38					100,00	
61.0	RUA ALFREDO GODOFREDO DE SÁNTANA				64.587,98									
61.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				309,21									
61.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	937,00	0,33	309,21	790,37		790,37	260,82		260,82		15,65	
61.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				64.163,94									
61.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	1.724,08	2,36	4.068,83	1.580,19		1.580,19	3.729,25		3.729,25		8,35	
61.2.2	CBUQ													
61.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	25,86	1.207,08	31.215,09	23,69		23,69	28.595,73		28.595,73		8,39	
61.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperfilamento	m³	25,86	1.093,55	28.279,20	23,71		23,71	25.928,07		25.928,07		8,31	
61.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	51,72	3,87	200,16	47,40		47,40	183,44		183,44		8,35	
61.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	367,21	1,09	400,26	322,32		322,32	351,33		351,33		12,22	
61.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	1,00	115,23	115,23	1,00		1,00	115,23		115,23			
61.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita													
62.0	TRAVESSA JOÃO FLORENTINO DE CARVALHO				79.643,92									
62.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				380,82									
62.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	1.154,00	0,33	380,82	1.005,67		1.005,67	331,87		331,87		12,85	
62.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				79.032,64									
62.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	2.123,36	2,36	5.011,13	2.011,35		2.011,35	4.746,79		4.746,79		5,28	
62.2.2	CBUQ													
62.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	31,85	1.207,08	38.445,50	30,17		30,17	36.417,60		36.417,60		5,27	
62.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperfilamento	m³	31,85	1.093,55	34.825,57	30,17		30,17	33.992,40		33.992,40		5,27	
62.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	63,70	3,87	246,52	60,34		60,34	233,52		233,52		5,27	

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
 PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
 Eng.º Roberto Neto de Oliveira
 CREA: 1059055/308 DPEB
 Constituidora Rocha Cavalcante Ltda.

		Grau de Sigilo Data do CT	
Nº do CTEI (Contrato Executivo/Contratado) 2.08.022/2020		Nº do CT 1.065.660-37	
Início da obra - data 29/06/2020		Data de 25/06/2021 a 31/05/2021	
Valor total inicial (R\$) 18.225.646,43		Tomador/Ag. Promotor ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	
CTEI -		Agente Financeiro ou Ag. Operador Financeiro CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Valor atual (R\$) 18.225.646,43		Fonte de Recursos emita (descreva)	
Empresa contratada CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA		BA - Data emitida 31/05/2021	
Objeto do CTEI (resumido) RECAPAMENTO ASFÁLTICO NOS BARRIOS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, COICEÇÃO, ESTACÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCONGO, SANTA CRUZ, DINÂMICA, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, FERMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCONGO, SANTO ANTONIO, SÃO JOSÉ, SERROTIÃO, MALVINAS, MORTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA		BA - Período de referência da medição de 25/06/2021 a 31/05/2021 CPF 091.323.099/0001-92	
local da obra (bairro/Município/UF) PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO		Empresa contratada CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PREÇO UNITÁRIO DO ORÇAMENTO			PREÇO TOTAL	EXECUÇÃO PREÇO QUANTITATIVO			ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	MÓDULO DO PERÍODO	MÓDULO DO PERÍODO	COTAÇÃO (M)
		UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.		ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MÓDULO DO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO					
62.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	458,64	1,09	499,92	434,44	434,44	473,54	473,54			473,54	5,28
62.3	NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	unidade	2,00	115,23	230,46								100,00
62.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	2,00	115,23	230,46								100,00
63.0	RUA DIALMA MIGUEL DE MORAIS				193.918,96				197.775,50				197.775,50
63.1	SERVÇOS PRELIMINARES				947,50				825,99				825,99
63.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	2.871,20	0,33	947,50	2.503,01	2.503,01	2.503,01	2.503,01				12,82
63.2	SERVÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				192.510,54				186.489,59				186.489,59
63.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	5.168,16	2,36	12.196,86	5.006,33	5.006,33	11.814,94	11.814,94				3,13
63.2.2	CBUQ												
63.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	77,52	1.207,08	93.572,84	75,10	75,10	90.651,71	90.651,71				3,12
63.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Repetimento	m²	77,52	1.093,55	84.772,00	75,09	75,09	82.114,67	82.114,67				3,13
63.2.3	Carga, manobras e descargas de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	155,04	3,87	600,00	150,19	150,19	581,24	581,24				3,13
63.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.255,82	1,09	1.368,84	1.216,54	1.216,54	1.326,03	1.326,03				3,13
63.3	NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	unidade	4,00	115,23	460,92	460,92	460,92	460,92	460,92				460,92
63.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	4,00	115,23	460,92	460,92	460,92	460,92	460,92				460,92
64.0	RUA DAS BARAUNAS				239.822,31				207.440,39				207.440,39
64.1	SERVÇOS PRELIMINARES				1.134,67				997,09				997,09
64.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	3.438,40	0,33	1.134,67	3.021,49	3.021,49	3.021,49	3.021,49				12,13
64.2	SERVÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				238.172,41				206.443,30				206.443,30
64.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	6.348,72	2,36	14.982,98	5.516,00	5.516,00	13.017,76	13.017,76				13,12
64.2.2	CBUQ												
64.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	95,23	1.207,08	114.950,23	82,54	82,54	99.632,38	99.632,38				13,33
64.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Repetimento	m²	95,23	1.093,55	104.138,77	82,52	82,52	90.239,75	90.239,75				13,35
64.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	190,47	3,87	737,12	165,06	165,06	638,78	638,78				13,34
64.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	3.085,61	1,09	3.365,31	2.673,97	2.673,97	2.914,63	2.914,63				13,34
64.3	NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	unidade	1,00	115,23	115,23								100,00
64.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	1,00	115,23	115,23								100,00
65.0	RUA ALICE BONDÉNGIO				302.279,44				302.134,55				302.134,55
65.1	SERVÇOS PRELIMINARES				1.600,07				1.370,41				1.370,41
65.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	4.242,65	0,33	1.400,07	4.152,77	4.152,77	1.370,41	1.370,41				3,12




 PREF. MUNIC. DE C. GRANDE

 Eng. João Nogueira de Oliveira

 CREA 188055/04 DPB

 Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

		Grau de Sigilo 01/07/20	
Nº do CTEFF (Contrato Escrito/Formosamento) 2.08.022/2020		RP do CT 1.065.660-37	
Início da obra - data 29/06/2020		Tomador/Ag. Promotor ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	
CTEFF - Valor total inicial (R\$) 18.225.646,43		Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
CTEFF - Valor atual (R\$) 18.225.646,43		Nome de Fornecedor (outra abreviatura)	
CTEFF - Valor atual (R\$) 18.225.646,43		Nome de Fornecedor (outra abreviatura)	


ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS	PERÍODO DE OBRAS			PERÍODO DE OBRAS EQUIVOCATIVOS			PERÍODO DE OBRAS ANTERIORES			PERÍODO DE OBRAS ANTERIORES			ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	DEBITO (R\$)
		UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ANTERIORES	ACUMULADO ANTERIORES	ACUMULADO ANTERIORES	ACUMULADO ANTERIORES	ACUMULADO ANTERIORES	ACUMULADO ANTERIORES	ACUMULADO ANTERIORES				
65.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO															
65.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	8.073,14	2,36	300.764,14	8.073,14	300.764,14	8.073,14	300.764,14	8.073,14	300.764,14	8.073,14	300.764,14	19.935,61		
65.2.2	CBUQ															
65.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m³	121,09	1.207,08	146.165,32	121,09	146.165,32	121,09	146.165,32	121,09	146.165,32	121,09	146.165,32	146.165,32		
65.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Reperfilamento	m³	121,09	1.093,55	132.417,97	121,09	132.417,97	121,09	132.417,97	121,09	132.417,97	121,09	132.417,97	132.417,97		
65.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	242,18	3,87	937,24	242,18	937,24	242,18	937,24	242,18	937,24	242,18	937,24	937,24		
65.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	2.010,09	1,09	2.191,00	2.010,09	2.191,00	2.010,09	2.191,00	2.010,09	2.191,00	2.010,09	2.191,00	2.191,00		
65.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA															
65.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	1,00	115,23	115,23		115,23		115,23		115,23		115,23			100,00
66.0	RUA SUIPINO COLAÇO															
66.1	SERVIÇOS PRELIMINARES															
66.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	786,60	0,33	259,38	786,60	259,38	786,60	259,38	786,60	259,38	786,60	259,38	232,74		
66.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO															
66.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	1.446,24	2,36	3.413,13	1.446,24	3.413,13	1.446,24	3.413,13	1.446,24	3.413,13	1.446,24	3.413,13	50.748,23		
66.2.2	CBUQ															
66.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m³	21,69	1.207,08	26.184,57	21,69	26.184,57	21,69	26.184,57	21,69	26.184,57	21,69	26.184,57	23.815,69		9,04
66.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Reperfilamento	m³	21,69	1.093,55	23.719,10	21,69	23.719,10	21,69	23.719,10	21,69	23.719,10	21,69	23.719,10	23.139,52		2,44
66.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	43,38	3,87	167,88	43,38	167,88	43,38	167,88	43,38	167,88	43,38	167,88	158,24		5,74
66.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	299,32	1,09	326,26	299,32	326,26	299,32	326,26	299,32	326,26	299,32	326,26	307,53		5,74
66.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA															
66.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	3,00	115,23	345,69	3,00	345,69	3,00	345,69	3,00	345,69	3,00	345,69	230,46		33,33
67.0	RUA PROFESSOR CAPIBA															
67.1	SERVIÇOS PRELIMINARES															
67.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	1.874,00	0,33	619,42	1.874,00	619,42	1.874,00	619,42	1.874,00	619,42	1.874,00	619,42	560,51		9,36
67.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO															
67.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	3.448,16	2,36	8.137,66	3.448,16	8.137,66	3.448,16	8.137,66	3.448,16	8.137,66	3.448,16	8.137,66	113.806,72		3,75
67.2.2	CBUQ															
67.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m³	51,72	1.207,08	62.430,18	51,72	62.430,18	51,72	62.430,18	51,72	62.430,18	51,72	62.430,18	54.765,22		12,28

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
 RUA DO SENHOR DEUS, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - CAMPINA GRANDE - PB
 53.011-900
 (35) 3333-1111
 www.campinagrande.pb.gov.br

Assinatura: *[Assinatura]*
 Nome: *[Nome]*
 Cargo: *[Cargo]*

Assinatura: *[Assinatura]*
 Nome: *[Nome]*
 Cargo: *[Cargo]*


Assinatura: *[Assinatura]*
 Nome: *[Nome]*
 Cargo: *[Cargo]*

		Grau de Sigilo B1 - Público de referência da prestação de serviços	
Nº do CT 1.065.660-37	Nº do CT 1.065.660-37	Data de emissão 31/05/2021	Data do CT 01/07/20
Nº do Contrato 2.08.022/2020	Empresa Contratada CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA	Objeto do CT RECAPAMENTO ASFÁLTICO NOS BARRIOS CENTRO, REIA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTACÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, RODOCENGO, SANTA CRUZ, DINAMÉICA, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, FERREIAS, JOSÉ PIRINEIRO, MIRABITE, NOVO BODOCONGO, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTEÃO, MILVIANAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA	Tomador do Contrato PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
Valor total inicial (R\$) 18.225.646,43	Valor atual (R\$) 18.225.646,43	Valor atualizado em 31/05/2021 56.558,41	Agente Financeiro ou Ag. Operador Financeiro CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Valor atual (R\$) 18.225.646,43	Valor atual (R\$) 18.225.646,43	Valor atualizado em 31/05/2021 56.558,41	Fonte de Recursos contra (discreto)

ITEM	EXTENSÃO QUANTIDADE DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS				PÚBLICO (R\$) QUANTITATIVOS				EXERCÍCIO ANTERIOR (R\$)			ACRÉSCIMO INCLUSIVE O PERÍODO	RECEITA (%)
		unidade	qtd	preço unit.	preço total	ACRÉSCIMO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	ACRÉSCIMO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	ACRÉSCIMO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	ACRÉSCIMO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEIO DO PERÍODO	ACRÉSCIMO INCLUSIVE O PERÍODO	RECEITA (%)		
67.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Repetimento	m²	51,72	1.093,55	56.558,41	45,86				45,86	50.150,20		50.150,20	11,33
67.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	103,44	3,87	400,31	91,23				91,23	353,06		353,06	11,80
67.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	734,42	1,09	800,92	647,74				647,74	706,04		706,04	11,80
67.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	5,00	115,23	576,15	2,00				2,00	230,46		230,46	60,00
68.0	RUA RAFAELA DE SOUZA E SILVA				797.192,55						760.804,38		760.804,38	
68.1	SERVICIOS PRELIMINARES				3.846,99						3.799,56		3.799,56	
68.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	11.637,25	0,33	3.846,99	11.513,83				11.513,83	3.799,56		3.799,56	1,23
68.2	SERVICIOS DE PAVIMENTAÇÃO				791.962,00						757.004,82		757.004,82	
68.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	21.204,62	2,36	50.042,90	20.935,85				20.935,85	49.408,61		49.408,61	1,27
68.2.2	CBUQ				383.635,94						365.938,37		365.938,37	4,69
68.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	318,07	1.207,08	383.635,94	303,16				303,16	331.968,97		331.968,97	4,58
68.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Repetimento	m²	318,07	1.093,55	347.825,45	303,57				303,57	2.348,05		2.348,05	4,62
68.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	636,14	3,87	2.461,86	606,73				606,73	7.340,82		7.340,82	4,62
68.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	7.061,15	1,09	7.696,65	6.734,70				6.734,70	82.745,33		82.745,33	5,50
68.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	12,00	115,23	1.382,76						79.326,12		79.326,12	2,11
68.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	12,00	115,23	1.382,76	1.505,51				1.505,51	1.641,01		1.641,01	2,11
69.0	RUA JOSÉ DA GUIA FERREIRA				182.232,35						176.562,29		176.562,29	
69.1	SERVICIOS PRELIMINARES				886,64						886,64		886,64	
69.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	2.686,80	0,33	886,64	2.686,80				2.686,80	886,64		886,64	
69.2	SERVICIOS DE PAVIMENTAÇÃO				180.539,10						175.675,65		175.675,65	
69.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	4.836,24	2,36	11.413,53	4.836,24				4.836,24	11.413,53		11.413,53	
69.2.2	CBUQ				87.561,58						82.745,33		82.745,33	
69.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	72,54	1.207,08	87.561,58	68,55				68,55	79.326,12		79.326,12	2,11
69.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Repetimento	m²	72,54	1.093,55	79.326,12	72,54				72,54	549,66		549,66	2,11
69.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	145,09	3,87	561,50	142,03				142,03	1.505,51		1.505,51	2,11
69.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.537,95	1,09	1.676,37	1.505,51				1.505,51	1.641,01		1.641,01	2,11
69.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA				809,61									

CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA
 Rua José do Vale de Oliveira
 CEP: 53023-322

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
 RUA JOSÉ DO VALE DE OLIVEIRA
 CEP: 53023-322

		 Grau de Sigilo Data do CT: 01/07/20	
Nº do CTE (contato Licitação/contratante) 2.08.027/2020		Nº do CT 1.055.660-37	
Início da obra - data 29/05/2020		Data de referência da medição de 26/04/2021 a 31/05/2021	
Valor total licit. (R\$) 18.225.646,43		Tomador/Obj. Promotor ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	
CTEF - Valor anual (R\$) 18.225.646,43		Agente Financiador ou Ag. Operador Repasse CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
CTEF - Valor anual (R\$) 18.225.646,43		Fonte de Recursos outra (descrever)	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBRAS	PREÇO DE OBRAS			PREÇO UNIT.			EXERCÍCIOS ANTERIORES			EXERCÍCIO EM CURSO (2021)			EXERCÍCIOS ANTERIORES (R\$)			TOTAL (R\$)
		UNID.	QTDDE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ANUALIZADO E RECORRIDO ANTERIOR	RECORRIDO ANTERIOR	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ANTERIOR		
72.1	SERVIÇOS PRELIMINARES																
72.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	3.706,15	0,33	1.223,03	3.156,19	1.223,03	1.041,54	1.041,54	1.041,54	1.041,54	1.041,54	1.041,54	1.041,54	1.041,54	1.041,54	14,84
72.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO																
72.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	6.781,18	2,36	252.650,43	5.625,47	16.003,58	13.276,11	208.061,66	208.061,66	13.276,11	13.276,11	13.276,11	13.276,11	13.276,11	17,04	
72.2.2	CBUQ																
72.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	101,71	1.207,08	122.772,11	83,39			100.658,40	100.658,40							18,01
72.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperilamento	m³	101,71	1.093,55	111.224,97	84,08			91.945,68	91.945,68							17,33
72.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	203,43	3,87	787,27	167,47			648,11	648,11							17,68
72.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.708,81	1,09	1.882,60	1.406,75			1.533,36	1.533,36							17,68
72.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA																
72.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	1,00	115,23	115,23												100,00
73.0	RUA ANTONIETA CAVALCANTE																
73.1	SERVIÇOS PRELIMINARES																
73.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	3.490,00	0,33	1.151,70	3.173,70	243.871,50	243.871,50	238.200,45	238.200,45	238.200,45	238.200,45	238.200,45	238.200,45	238.200,45	238.200,45	9,06
73.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO																
73.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	6.421,60	2,36	151.544,98	6.347,40			14.979,86	14.979,86							1,16
73.2.2	CBUQ																
73.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	98,32	1.207,08	118.680,11	95,21			114.926,09	114.926,09							3,16
73.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperilamento	m³	98,32	1.093,55	107.517,84	95,21			104.116,90	104.116,90							3,16
73.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	196,64	3,87	761,00	190,42			736,93	736,93							3,16
73.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.612,45	1,09	1.757,57	1.561,44			1.701,97	1.701,97							3,16
73.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA																
73.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	6,00	115,23	691,38	6,00			691,38	691,38							
74.0	RUA JOÃO JULIANO MARTINS																
74.1	SERVIÇOS PRELIMINARES																
74.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e	m²	3.845,55	0,33	1.269,03	3.845,55	257.873,89	257.873,89	259.142,92	259.142,92	259.142,92	259.142,92	259.142,92	259.142,92	259.142,92	259.142,92	1,29
74.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO																
74.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	6.923,10	2,36	16.338,52	6.923,10			16.338,52	16.338,52							1,29
74.2.2	CBUQ																
74.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	103,85	1.207,08	125.355,26	103,85			125.355,26	125.355,26							1,29

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
 RUA JOÃO JULIANO MARTINS, 100 - JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCOINGÓ, SANTO ANTONIO, SÃO JOSÉ, SERRAÔTO, MALVINHAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA

Local da obra (bairro/município/UF)
 PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO

Eng. João Neto de Oliveira
 CREA - 100000000-0/PA

Eng. João Neto de Oliveira
 CREA - 100000000-0/PA

CAIXA		Grau de Sigilo	
RP do CTEH (contato Executivo/funcionário)	RP do CT	Data do CT	
2.08.02/2020	1.055.660-37	01/07/20	
Início da obra - data	Tomador/Ag. Promotor ou Tomador		
29/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE		
Provisão Término da obra	Agente Financiador ou Ag. Operador Repasse		
26/07/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
CTEH - Valor total (incluindo IBS)	Fonte de Recursos		
18.225.646,43	outros (descrever)		
CTEH - Valor atual (IBS)	Fonte de Recursos		
18.225.646,43	outros (descrever)		

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PRESTÍCIO ORÇAMENTO			BENEFÍCIO FISCAL (QUANTITATIVOS)			ESCÓRPIO FINANCIERO (R\$)			
		QTD	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	AVANÇADO ATÉ FIM DO ANTERIOR	RECEBIDO FISCAL	ACUMULADO FISCAL (PRELIMINAR)	ACUMULADO FISCAL (PRELIMINAR)	RECIBO NO PERÍODO	COMISSÃO INCLUÍDO NO PERÍODO	DEBITO (%)
74.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperfilamento	m³	103,85	113.565,17	103,85	103,85	103,85	113.565,17	113.565,17	113.565,17	
74.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	207,70	803,80	207,70	207,70	207,70	803,80	803,80	803,80	
74.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1,09	1.811,14	1.811,14	1.811,14	1.811,14	1.811,14	1.811,14	1.811,14	
74.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	6,00	691,38	691,38	691,38	691,38	691,38	691,38	691,38	
74.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	115,23	691,38	691,38	691,38	691,38	691,38	691,38	691,38	100,00
75.0	RUA JOSÉ GONÇALVES DE MELO			149.467,13				149.467,13	149.467,13	149.467,13	
75.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			711,68				711,68	711,68	711,68	
75.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e gride	m²	2.156,60	711,68	2.068,96	2.068,96	2.068,96	2.068,96	682,76	682,76	4,06
75.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			148.524,99				148.524,99	148.524,99	148.524,99	
75.2.1	Plitura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	3.990,08	9.416,59	3.817,42	3.817,42	3.817,42	3.817,42	9.009,11	9.009,11	4,33
75.2.2	CBUQ			72.243,74				72.243,74	69.117,40	69.117,40	4,33
75.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	59,85	1.207,08	59,85	59,85	59,85	1.207,08	62.627,61	62.627,61	4,31
75.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperfilamento	m³	59,85	1.093,55	59,85	59,85	59,85	1.093,55	443,23	443,23	4,32
75.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	119,70	3,87	463,24	114,53	114,53	114,53	911,39	911,39	4,31
75.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	873,81	1,09	952,45	836,14	836,14	836,14	37.667,20	37.667,20	100,00
75.3	NIVELAMENTO DE TAMPAO DE POÇO DE VISITA	unidade	2,00	115,23	230,46	230,46	230,46	230,46	37.667,20	37.667,20	
75.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita	unidade	80,00	470,84	37.667,20	37.667,20	37.667,20	37.667,20	37.667,20	37.667,20	
76.0	PLACAS DE OBRAS (12,0 m - 10 PLACAS)			296.880,62				296.880,62	255.236,46	255.236,46	
76.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			296.880,62				296.880,62	255.236,46	255.236,46	
76.1.1	Placa da Obra	m²	80,00	470,84	37.667,20	37.667,20	37.667,20	37.667,20	37.667,20	37.667,20	
77.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (12 MESES DE OBRA)			296.880,62				296.880,62	255.236,46	255.236,46	
77.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			296.880,62				296.880,62	255.236,46	255.236,46	
77.1.1	Administração Local da Obra (12 meses de obra)	unidade	1,00	296.880,62	0,82113	0,82113	0,82113	0,82113	11.435,84	11.435,84	14,02

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
 Eng.º Roberto Nilton de Oliveira
 CREA 106040508-7/PA

Consulência Rocha Cavalcanti Ltda.
 Eng.º Roberto Nilton de Oliveira
 CREA 106040508-7/PA

CAIXA		Grav de Sigilo	
HP da CTEI (contrato Execução/forneção em%)	2,08.00/2/2020	NR do CT	1.065.660-37
Início da obra - data	29/06/2020	Data do CT	01/07/21
Valor unitário (R\$)	18.225.646/43	Formador/Ag Promotor ou tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	
Valor atual (R\$)	18.225.646/43	Agente Executor ou Ag. Operador Repasse	
CTEF - Valor atual (R\$)	18.225.646/43	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
CTEF - Valor atual (R\$)	18.225.646/43	Fonte de Recursos	
CTEF - Valor atual (R\$)	18.225.646/43	Outra (descrever)	

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	DESCR. DE MATERIAIS E SERVIÇOS	PREÇO UNIT.		PREÇO TOTAL	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS (R\$)		MUNICÍPIO NO PERÍODO	MUNICÍPIO ANTERIOR	AC. PERÍODO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MUNICÍPIO NO PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	ACUMULADO INCLUSIVE O PERÍODO	ORÇ. (R\$)
				PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT.		A. MATERIAIS E SERVIÇOS ANTERIOR	MUNICÍPIO NO PERÍODO							
78.0			LABORATÓRIO DE BETUME (BDI DE 26,85%)			50.466,24				41.714,12		1.943,96	43.659,03		
78.1			SERVIÇOS PRELIMINARES			50.466,24				41.714,12		1.943,96	43.659,03		
78.1.1		mês	Laboratório de Betume (BDI de 26,85%)			50.466,24	0,8296	0,038520		41.714,12		1.943,96	43.659,03		13,49
TOTAL						18.225.646,43				15.747.591,90		715.211,65	15.962.810,55		12,42

Camp na Grande, 31 de maio de 2021

LOCAL E DATA

Assinatura do Agente Promotor/Notário

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
Eng. Civil - CREA-PB Nº 160.283/1-2

Adriano Gomes do Nascimento
MCG/SECOB - Coordenador
de Planejamento de Obras

Constutora Rocha Cavalcante Ltda.

Eng. João Neto de Oliveira
CREA 190905509 DP5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIROS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTAÇÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCONGÓ, SANTA CRUZ, DINAMÉRICA, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCONGÓ, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTÃO, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA

MEMÓRIA DE CÁLCULO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO
MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	SERVIÇOS	ESTACA					QUANTIDADES			OBSERVAÇÃO				
		Inicial	Final	Comp. (AutoCAD)	Larg. (módulo)	Área (AutoCAD)	Altura	Volume	N.V.		dm	Parcial	Totais	
14.0	CEL. JOÃO LOURENÇO PORTO													
14.1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
14.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	0,00 + 0,00	13,00 + 3,74	263,74	7,73	2038,71					2038,71	2038,71	Trecho 01	
											Executado:	2038,71		
14.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO													
14.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	0,00 + 0,00	13,00 + 3,74	263,74	6,93	1828,88					1828,88	1828,88	Trecho 01	
											Executado:	1828,88		
14.2.2	CBUQ													
14.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	0,00 + 0,00	13,00 + 3,74	263,74	6,93	1828,88	0,049	89,62	1,00		89,62	89,62	Trecho 01	
											Executado:	89,62		
14.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora													(VIDE CBUQ, CAPA)
											Executado:	89,62		
14.2.4	Transporte local de material betuminoso													(VIDE CBUQ, CAPA)
											Executado:	914,12	10,20	
22.0	JOÃO TAVARES													
22.1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
22.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	0,00 + 0,00	11,00 + 0,00	220,00	6,18	1359,60					1359,60	1359,60	Trecho 01	
											Executado:	1359,60		
22.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO													
22.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	0,00 + 0,00	11,00 + 0,00	220,00	5,38	1183,06					1183,06	1183,06	Trecho 01	
											Executado:	1183,06		
22.2.2	CBUQ													
22.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	0,00 + 0,00	11,00 + 0,00	220,00	5,38	1183,06	0,05	59,15	1,00		59,15	59,15	Trecho 01	
											Executado:	59,15		
22.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora													(VIDE CBUQ, CAPA)
											Executado:	626,99		
22.2.4	Transporte local de material betuminoso													(VIDE CBUQ, CAPA)
											Executado:	626,99	10,60	
24.0	MANOEL PEREIRA DE ARAÚJO													
24.1	SERVIÇOS PRELIMINARES													

[Handwritten signature]

PREFE. MUNIC. DE C. GRANDE
 MANOEL PEREIRA DE ARAÚJO
 SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO URBANO

CONSTRUTORA REBEZ CAVALCANTE LTDA.
 RUA...
 CREA: 166045/208 D/PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO
MEMÓRIA DE CÁLCULO



ITEM	SERVIÇOS	ESTACA				QUANTIDADES				OBSERVAÇÃO		
		Inicial	Final	Comp. (AutoCAD)	Larg. (média)	Área (AutoCAD)	Altura	Volume	N.V.		dim	Parciais
24.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	0,00 + 0,00	3,00 + 0,46	60,46	6,60	399,04					399,04	Trecho 01 m²
24.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO											
24.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	0,00 + 0,00	3,00 + 0,46	60,46	5,80	350,83			1,00		350,83	Trecho 01 m²
24.2.2	CBUQ											
24.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	0,00 + 0,00	3,00 + 0,46	60,46	5,80	350,83	0,048	16,84	1,00		16,84	Trecho 01 m³
24.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora											(VIDE CBUQ CAPA) m³
24.2.4	Transporte local de material betuminoso								10,10		170,08	(VIDE CBUQ CAPA) m³ x km
42.0	SEBASTIÃO MARTINS DE OLIVEIRA											
42.1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
42.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	0,00 + 0,00	9,00 + 0,00	180,00	7,20	1296,00					1296,00	Trecho 01 m²
42.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO											
42.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	0,00 + 0,00	9,00 + 0,00	180,00	6,40	1151,33			2,00		2302,66	Trecho 01 m²
42.2.2	CBUQ											
42.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	0,00 + 0,00	9,00 + 0,00	180,00	6,40	1151,33	0,029	33,39	1,00		33,39	Trecho 01 m³
42.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperfilamento	0,00 + 0,00	9,00 + 0,00	180,00	6,40	1151,33	0,027	31,09	1,00		31,09	Trecho 01 m³
42.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora											(VIDE CBUQ CAPA) m³
42.2.4	Transporte local de material betuminoso										394,00	(VIDE CBUQ REPERFILAMENTO) m³
											362,86	(VIDE CBUQ REPERFILAMENTO) m³

PROF. MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FELICIANO DOS REIS C. XAVIER
CPF: 036.378.618-11 / 150.23.05.32-2

Construtora Resbo Cavalcante Ltda.
Rua: ...
CNEA: 109900208 DTRB

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO
MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	SERVIÇOS	ESTACA					QUANTIDADES			OBSERVAÇÃO			
		Inicial	Final	Comp. (AutoCAD)	Lang. (módulo)	Área (AutoCAD)	Altura	Volumo	N.V.		dmt	Parcelas	Totais
43.0	FLORÍPEDES COUTINHO											750,86 m² x km	
43.1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
43.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	0,00 + 0,00	42,00 + 16,76	856,76	8,33	7136,81					7136,81	Trecho 03	
		0,00 + 0,00	33,00 + 0,00	260,00	3,30	856,00					856,00	Trecho 04	
											Executado:	7994,81 m²	
43.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO												
43.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	0,00 + 0,00	42,00 + 16,76	856,76	7,53	6448,45					6448,45	Trecho 03	
		0,00 + 0,00	33,00 + 0,00	260,00	2,50	650,60					650,60	Trecho 04	
											Executado:	7099,05 m²	
43.2.2	CBUQ												
43.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ , camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	0,00 + 0,00	42,00 + 16,76	856,76	7,53	6448,45	0,05	322,42	1,00		322,42	Trecho 03	
											Executado:	322,42 m³	
43.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ , BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperfilamento	0,00 + 0,00	33,00 + 0,00	260,00	2,50	650,60	0,03	19,52	1,00		19,52	Trecho 04	
											Executado:	19,52 m³	
43.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-sacabadora												
													(VIDE CBUQ CAPA)
													(VIDE CBUQ REPERFILAMENTO)
											Executado:	341,84 m³	
43.2.4	Transporte local de material betuminoso												
													(VIDE CBUQ CAPA)
													(VIDE CBUQ REPERFILAMENTO)
											Executado:	4376,84 m³ x km	
51.0	RUA DR. FLORIANO MENDES FREIRE												
51.3	NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA												
51.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita												
													Trecho 01
											Executado:	14,00 unidade	
52.0	RUA SALUSTIANO BEZERRA CABRAL												
52.3	NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA												
52.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita												
													Trecho 01
											Executado:	8,00 unidade	
53.0	RUA ALCERIADES GONÇALVES DA ROCHA												
53.3	NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA												
53.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita												
													Trecho 01
											Executado:	5,00 unidade	

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
PROF. DR. JOSIAS C. Xavier
E-mail: jcx@campinagr.pe.pb.gov.br
140.333.33-2

[Handwritten signature]

Construtora Archo Construções Ltda.
CREA 196503208 D/PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO
MEMÓRIA DE CÁLCULO



ITEM	SERVIÇOS	ESTACA				QUANTIDADES				OBSERVAÇÃO		
		Inicial	Final	Comp. (AutoCAD)	Lang. (módulo)	Área (AutoCAD)	Altura	Volumo	N.V.		dm	Parciais
54.0	RUA FRANCISCO ERNESTO DO RÊGO											
54.3	NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA											
54.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita								7,00	Executado:	7,00	Trecho 01 unidade
58.0	RUA JOANA D'ARC DE ARRUDA - TRECHO 01											
58.3	NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA											
58.3.1	Nivelamento de Tampão de Poço de Visita								5,00	Executado:	5,00	Trecho 01 unidade
77.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (12 MESES DE OBRA)											
77.1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
77.1.1	Administração Local da Obra (12 meses de obra)								3,8520%	Executado:	3,8520%	unidade
78.0	LABORATÓRIO DE BETUME (BDI DE 26,85%)											
78.1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
78.1.1	Laboratório de Betume (BDI de 26,85%)								0,03852	Executado:	0,038520	%

PREF. MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 FIGUEIREDO JUNIOR, JERONIMO C. Xavier
 CPF: 030.001.258-91 - PB: 51.000.23.000-12


Constelara Rocha Cavalcante Lida.
 ARQUITETA E URBANISTA
 CREA: 160605506-0/PB




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIROS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTAÇÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCONGÓ, SANTA CRUZ, DINAMÉRICA, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCONGÓ, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTÃO, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA

PLANTA (CROQUI)




01 - Planta Baixa Estaqueamento



02 - Planta Baixa com Pavimentação Asfáltica (Capa)

Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: Cel. João Lourenço Porto	
Bairro: Centro	
Data/Ano: maio/2021	Prancha: 1/1
RUA CEL. JOÃO LOURENÇO PORTO	
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²
ÁREA DA RUA – CAPA	1.828,88 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	263,74 m
LARGURA DA RUA (média)	6,93 m

03 – Planta de Situação

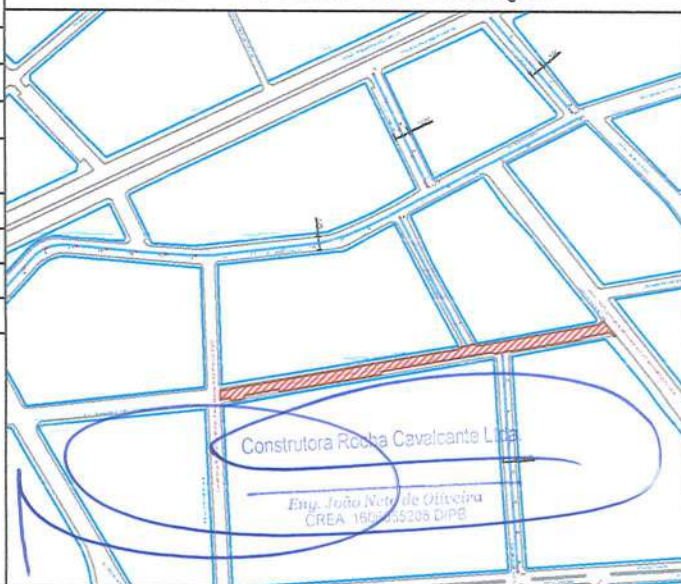


PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
Eng. Civil - CREA 190.23.05-0/02

Rua Afonso Campos

Rua Afonso Campos



Rua Doutor João Tavares - Trecho 02



Rua Doutor João Tavares - Trecho 02

Área Total = 1.183,06 m²




01 - Planta Baixa Estaqueamento



02 - Planta Baixa com Pavimentação Asfáltica (Capa)

Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: João Tavares - Trecho 02	
Bairro: Centro	
Data/Ano: maio/2021	Prancha: 2/2
RUA JOÃO TAVARES - TRECHO 02	
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²
ÁREA DA RUA - CAPA	1.183,06 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	220,00 m
LARGURA DA RUA (média)	5,38 m

03 - Planta de Situação

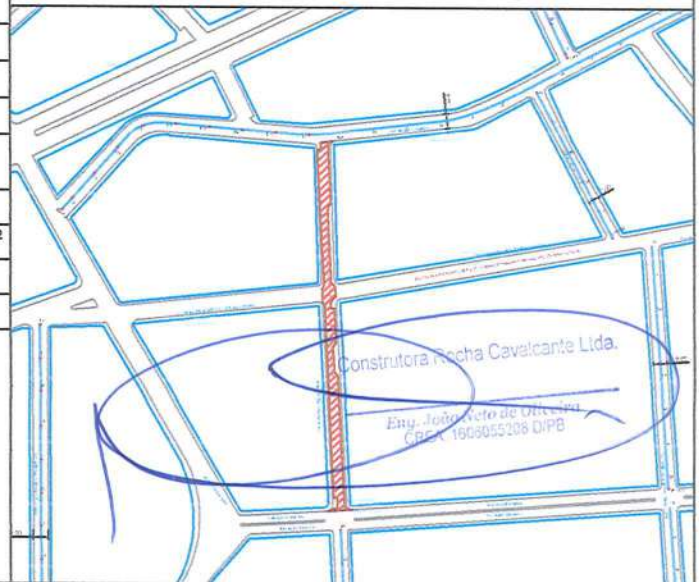

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
Eng. Civil - CREA-PE nº 160.230.534-2

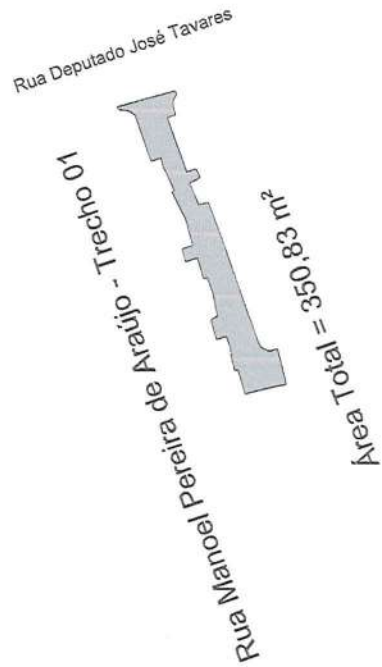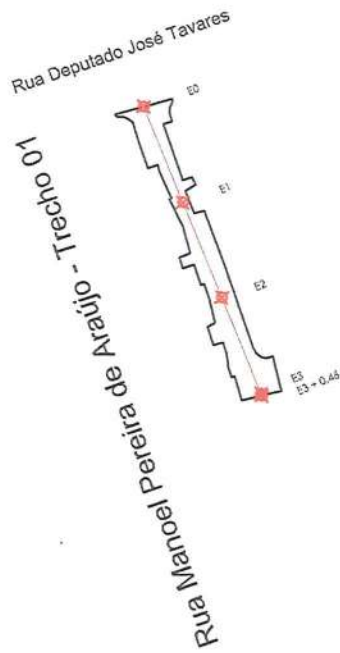



01 - Planta Baixa Estaqueamento

02 - Planta Baixa com Pavimentação Asfáltica (Capa)



Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: Manoel Pereira de Araújo – Trecho 01	
Bairro: Centro	
Data/Ano: maio/2021	Prancha: 1/2
RUA MANOEL PEREIRA DE ARAÚJO – TRECHO 01	
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²
ÁREA DA RUA – CAPA	350,83 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	60,46 m
LARGURA DA RUA (média)	5,80 m

03 – Planta de Situação

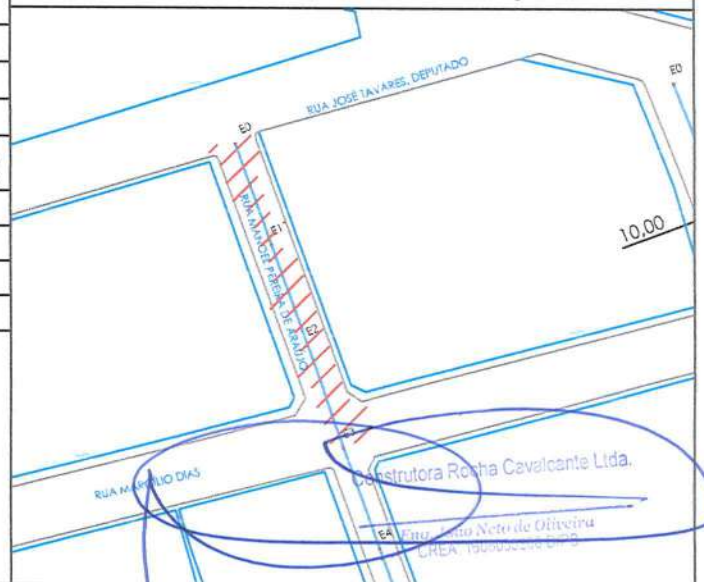



 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
 Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng. Civil - CREA-PB Nº 160.280534-2

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
 EA Francisco Neto de Oliveira
 CREA 150000000-0/PA

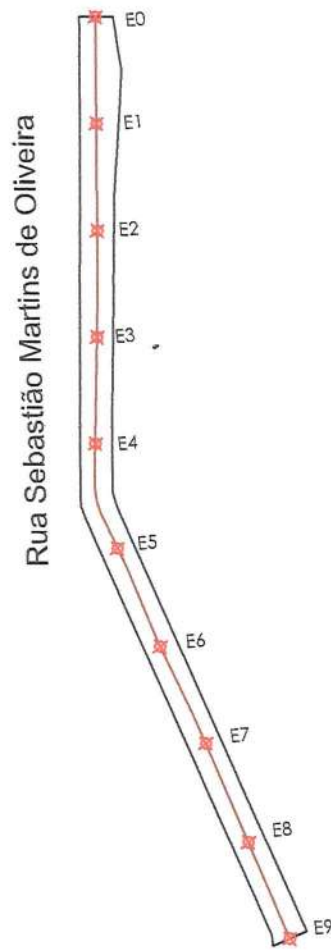


01 - Planta Baixa Estaqueamento

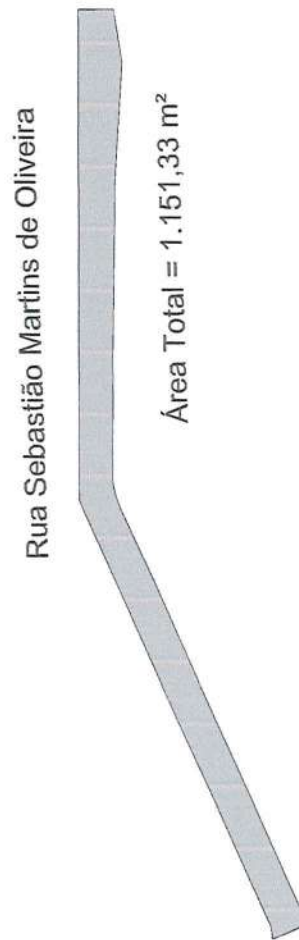


02 - Planta Baixa com Pavimentação Asfáltica (Capa)

Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: Sebastião Martins de Oliveira	
Bairro: Bodocongó	
Data/Ano: maio/2021	Prancha: 1/1
RUA SEBASTIÃO MARTINS DE OLIVEIRA	
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²
ÁREA DA RUA – CAPA	1.151,33 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	180,00 m
LARGURA DA RUA (média)	6,40 m


03 – Planta de Situação

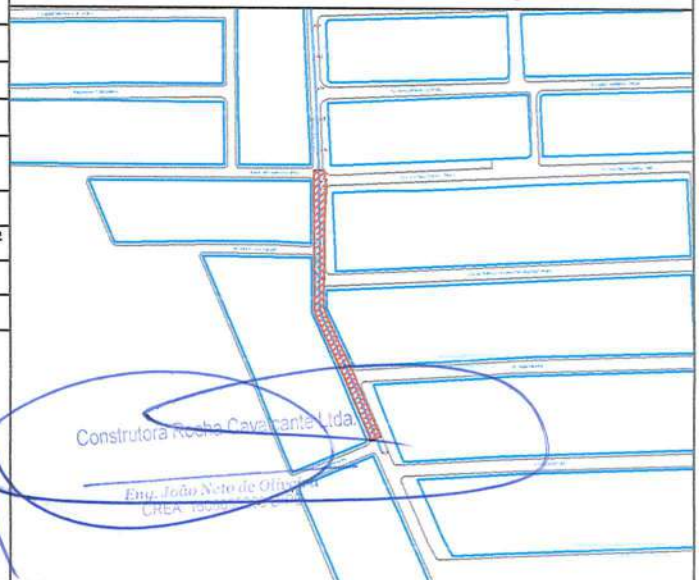


 Eng. João Neto de Oliveira
 CREA-PB nº 160.283/534-2




01 - Planta Rua com Topografia




02 - Planta Rua com Pavimentação Asfáltica (Capa)

Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: Florípedes Coutinho - Trecho 03	
Bairro: Bodocongó	
Data/Ano: maio/2021	Prancha: 3/4
RUA FLORÍPEDES COUTINHO - TRECHO 03	
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²
ÁREA DA RUA - CAPA	6.448,45 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	856,76 m
LARGURA DA RUA (média)	7,53 m

03 - Planta de Situação

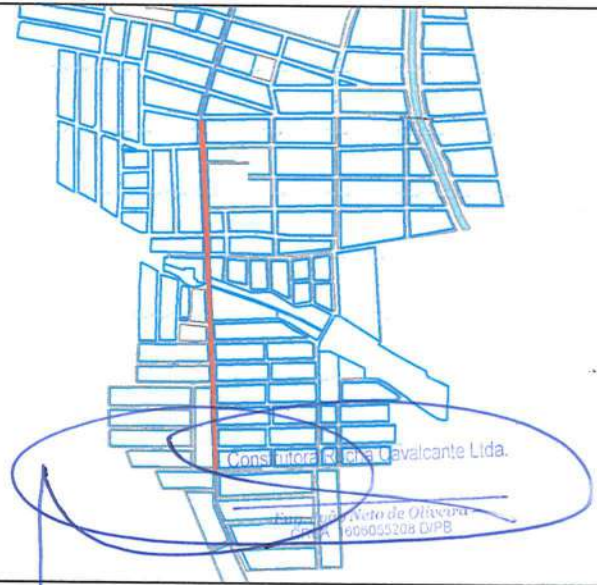

Francisco José Jesus C. Xavier
 Eng. Civil - CREA - PB Nº 160.283534-2



01 - Planta Baixa Estaqueamento



02 - Planta Baixa com Pavimentação Asfáltica (Reperfilamento)

Área LD = 364,22 m²
 Área LE = 286,44 m²
 Área Total = 650,66 m²



Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: Florípedes Coutinho – Trecho 03	
Bairro: Bodocongó	
Data/Ano: maio/2021	Prancha: 4/4
RUA FLORÍPEDES COUTINHO – TRECHO 03	
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²
ÁREA DA RUA – REPERFILAMENTO	650,60 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	260,00 m
LARGURA DA RUA (média)	2,50 m

03 – Planta de Situação



Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng. Civil - CREA/PB Nº 180.283534-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIRROS CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTAÇÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, BODOCONGÓ, SANTA CRUZ, DINAMÉRICA, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TAVARES, JEREMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCONGÓ, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTÃO, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: **CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA**
 CONTRATO: **2.08.022/2020**
 PERÍODO LÍQUIDO: **26/04/2021 A 31/05/2021**

MEDIÇÃO: **11ª**

FOTO 01



FOTO 02



COORDENADAS:	RUA:
7°13'11.8"S 35°52'50.1"W	CEL. JOÃO LOURENÇO PORTO

COORDENADAS:	RUA:
7°13'12.6"S 35°52'54.4"W	CEL. JOÃO LOURENÇO PORTO

FOTO 03



FOTO 04



COORDENADAS:	RUA:
7°13'11.8"S 35°52'55.9"W	JOÃO TAVARES

COORDENADAS:	RUA:
7°13'10.0"S 35°52'55.8"W	JOÃO TAVARES

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
 Eng.º Civil - CREA-PB Nº 159.283534-2

(Handwritten signature)

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
 Eng.º João Neto de Oliveira
 CREA 150095/208 D/PB



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: **CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA**
 CONTRATO: **2.08.022/2020**
 PERÍODO LÍQUIDO: **26/04/2021 A 31/05/2021**

MEDIÇÃO: **11ª**

FOTO 05



FOTO 06



COORDENADAS:	RUA:
7°13'05.0"S 35°52'39.5"W	MANOEL PEREIRA DE ARAÚJO

COORDENADAS:	RUA:
7°13'05.0"S 35°52'39.5"W	MANOEL PEREIRA DE ARAÚJO

FOTO 07



FOTO 08



COORDENADAS:	RUA:
7°13'43.6"S 35°55'17.0"W	SEBASTIÃO MARTINS DE OLIVEIRA

COORDENADAS:	RUA:
7°13'43.6"S 35°55'17.0"W	SEBASTIÃO MARTINS DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng.º Civil - CREA-PB nº 180.203534-2

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
 Eng.º João Neto de Oliveira
 CREA 180805208/PB



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: **CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA**
CONTRATO: **2.08.022/2020**
PERÍODO LÍQUIDO: **26/04/2021 A 31/05/2021**

MEDIÇÃO: **11ª**

FOTO 09



COORDENADAS:	RUA:
7°13'45.6"S 35°55'16.6"W	SEBASTIÃO MARTINS DE OLIVEIRA

FOTO 10



COORDENADAS:	RUA:
7°13'44.3"S 35°55'17.0"W	SEBASTIÃO MARTINS DE OLIVEIRA

FOTO 11



COORDENADAS:	RUA:
7°13'18.3"S 35°55'17.9"W	FLORÍPEDES COUTINHO

FOTO 12



COORDENADAS:	RUA:
7°13'21.4"S 35°55'17.7"W	FLORÍPEDES COUTINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
Eng. Civil - CREA-PB Nº 160.283/2013

[Handwritten signature]

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
Eng. João Neto de Oliveira
CREA 150052208 D/PB



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: **CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA**
 CONTRATO: **2.08.022/2020**
 PERÍODO LÍQUIDO: **26/04/2021 A 31/05/2021**

MEDIÇÃO: **11ª**

FOTO 13



COORDENADAS:	RUA:
7°13'16.0"S 35°55'17.9"W	FLORÍPEDES COUTINHO

FOTO 14



COORDENADAS:	RUA:
7°13'15.3"S 35°55'18.0"W	FLORÍPEDES COUTINHO

FOTO 15



COORDENADAS:	RUA:
7°13'31.1"S 35°55'17.4"W	FLORÍPEDES COUTINHO

FOTO 16



COORDENADAS:	RUA:
7°13'26.6"S 35°55'17.6"W	FLORÍPEDES COUTINHO

Francisco de Jesus C. Xavier
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng.º Civil - CREA-PB Nº 190.293/34-2

[Handwritten signature]

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
 Eng.º João Paulo de Oliveira
 CREA: 160505208 D/PB



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA
CONTRATO: 2.08.022/2020
PERÍODO LÍQUIDO: 26/04/2021 A 31/05/2021

MEDIÇÃO: 11ª

FOTO 17



COORDENADAS:	RUA:
7°15'06.2"S 35°54'10.4"W	DR. FLORIANO MENDES FREIRE

FOTO 18



COORDENADAS:	RUA:
7°15'05.7"S 35°54'15.0"W	DR. FLORIANO MENDES FREIRE

FOTO 19



COORDENADAS:	RUA:
7°15'06.2"S 35°54'10.4"W	DR. FLORIANO MENDES FREIRE

FOTO 20



COORDENADAS:	RUA:
7°15'05.7"S 35°54'15.0"W	DR. FLORIANO MENDES FREIRE

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
Eng. Civil - CREA-PB Nº 150.2935-11-7

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
Eng. João Vinícius de Oliveira
CREA - 100000000-0/000000000-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA
CONTRATO: 2.08.022/2020
PERÍODO LÍQUIDO: 26/04/2021 A 31/05/2021

MEDIÇÃO: 11ª

FOTO 21



COORDENADAS:	RUA:
7°15'04.7"S 35°54'24.0"W	DR. FLORIANO MENDES FREIRE

FOTO 22



COORDENADAS:	RUA:
7°15'06.6"S 35°54'07.8"W	DR. FLORIANO MENDES FREIRE

FOTO 23



COORDENADAS:	RUA:
7°14'56.2"S 35°54'32.5"W	SALUSTIANO BEZERRA CABRAL

FOTO 24



COORDENADAS:	RUA:
7°14'58.0"S 35°54'32.4"W	SALUSTIANO BEZERRA CABRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
Eng.º CIVIL - CREA-PB Nº 190.293534-2

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

Eng.º de Projeto de Obra
CPA Nº 100003208 DPB



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: **CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA**
 CONTRATO: **2.08.022/2020**
 PERÍODO LÍQUIDO: **26/04/2021 A 31/05/2021**

MEDIÇÃO: **11ª**

FOTO 25



COORDENADAS:	RUA:
7°14'56.2"S 35°54'32.5"W	SALUSTIANO BEZERRA CABRAL

FOTO 26



COORDENADAS:	RUA:
7°14'58.0"S 35°54'32.4"W	SALUSTIANO BEZERRA CABRAL

FOTO 27



COORDENADAS:	RUA:
7°14'46.4"S 35°54'33.2"W	SALUSTIANO BEZERRA CABRAL

FOTO 28



COORDENADAS:	RUA:
7°14'53.5"S 35°54'32.3"W	SALUSTIANO BEZERRA CABRAL

Francisco de Jesus C. Xavier
 PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 E.O. 001 - CREA/PB Nº 160.283/534-2

[Handwritten signature]

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
 Eng. João Neto de Oliveira
 CREA 160055208 DPB



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: **CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA**
 CONTRATO: **2.08.022/2020**
 PERÍODO LÍQUIDO: **26/04/2021 A 31/05/2021**

MEDIÇÃO: **11ª**

FOTO 29



COORDENADAS:	RUA:
7°14'55.8"S 35°54'28.7"W	ALCEBÍADES GONÇALVES DA ROCHA

FOTO 30



COORDENADAS:	RUA:
7°14'55.7"S 35°54'27.6"W	ALCEBÍADES GONÇALVES DA ROCHA

FOTO 31



COORDENADAS:	RUA:
7°14'55.8"S 35°54'28.7"W	ALCEBÍADES GONÇALVES DA ROCHA

FOTO 32



COORDENADAS:	RUA:
7°14'55.7"S 35°54'27.6"W	ALCEBÍADES GONÇALVES DA ROCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 Engenheiro de Jesus S. Xavier
 5.º Of. - CREA-PB Nº 160.253534-2

[Handwritten signature]

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
 Engenheiro Neto de Oliveira
 CREA 160605206 DF/B



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA
CONTRATO: 2.08.022/2020
PERÍODO LÍQUIDO: 26/04/2021 A 31/05/2021

MEDIÇÃO: 11ª

FOTO 33



COORDENADAS:	RUA:
7°14'56.0"S 35°54'30.5"W	ALCEBÍADES GONÇALVES DA ROCHA

FOTO 34



COORDENADAS:	RUA:
7°14'55.5"S 35°54'25.2"W	ALCEBÍADES GONÇALVES DA ROCHA

FOTO 35



COORDENADAS:	RUA:
7°14'48.8"S 35°53'40.9"W	FRANCISCO ERNESTO DO RÊGO

FOTO 36



COORDENADAS:	RUA:
7°14'48.8"S 35°53'40.9"W	FRANCISCO ERNESTO DO RÊGO

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
Eng.º Civil - CREA-PB Nº 196.263/34-2

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
Eng.º João Neto de Oliveira
CREA 160605208 DPB



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: **CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA**
 CONTRATO: **2.08.022/2020**
 PERÍODO LÍQUIDO: **26/04/2021 A 31/05/2021**

MEDIÇÃO: **11ª**

FOTO 37



COORDENADAS:	RUA:
7°14'48.2"S 35°53'35.5"W	FRANCISCO ERNESTO DO RÊGO

FOTO 38



COORDENADAS:	RUA:
7°14'49.1"S 35°53'43.2"W	FRANCISCO ERNESTO DO RÊGO

FOTO 39



COORDENADAS:	RUA:
7°13'20.0"S 35°52'11.5"W	JOANA D'ARC DE ARRUDA - TRECHO 01

FOTO 40



COORDENADAS:	RUA:
7°13'20.8"S 35°52'14.7"W	JOANA D'ARC DE ARRUDA - TRECHO 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng.º Civil - CREA-PB Nº 180.293534-2

[Handwritten signature]

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
 Eng.º João Paulo de Oliveira
 CREA-PB Nº 180.293534-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: **CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA**
 CONTRATO: **2.08.022/2020**
 PERÍODO LÍQUIDO: **26/04/2021 A 31/05/2021**

MEDIÇÃO: **11ª**

FOTO 41



FOTO 42



COORDENADAS:	RUA:
7°13'20.0"S 35°52'11.5"W	JOANA D'ARC DE ARRUDA - TRECHO 01

COORDENADAS:	RUA:
7°13'20.8"S 35°52'14.7"W	JOANA D'ARC DE ARRUDA - TRECHO 01

--

--

COORDENADAS:	RUA:

COORDENADAS:	RUA:

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
 Francisco de Jesus C. Xavier
 Engº Civil - CREA-PB Nº 180.283534-2

[Handwritten signature]

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
 Rua...
 CREA 1806055200 DIPE
