

ALPER

À
Prefeitura Municipal de Campina Grande
Secretaria de Obras
Depto. Iluminação Pública
Ofício Nº 02/2023

Senhor secretário,

Com meus cumprimentos, dirijo-me a Vossa Senhoria para solicitar-lhes a autorização para liberação de emissão de nota fiscal referente à respectiva medição do mês de FEVEREIRO de 2023.

29ª Medição mês FEVEREIRO/ 2023 – Valor R\$ 260.558,64 conforme serviços realizados de expansão e modernização da iluminação pública no município de Campina Grande.

Sem mais para o momento e certo de sua atenção, subscrevo-me.

ALPER ENERGIA S.A

Carlos Lavini Sanjar
ALPER ENERGIA S.A

Carlos Lavini Sanjar
CPF: 282.187.708-01
RG: 26.164.000-8 SSP/SP
CREA/SP: 5061075872

09.388.615/0001-0

ALPER ENERGIA S.A

Rua São Bento 452 Quadra 88

CEP 06186 140 Bairro São Pedro

Osasco SP

Alper

Alper Energia S.A.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 201 - Loja Faria Lima, Piso Térreo, Pinheiros – CEP 05426-100 – São Paulo – SP – Brasil
Tel./Fax: (55 11) 3265-6400

www.alper.com.br
alper@alper.com.br

CS
Carlos Lavini Sanjar
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187.708-01



À
Prefeitura Municipal de Campina Grande
Secretaria de Obras
Depto. Iluminação Pública
Ofício Nº 02/2023

Senhor secretário,

Com meus cumprimentos, dirijo-me a Vossa Senhoria para solicitar-lhes a autorização para liberação de emissão de nota fiscal referente à respectiva medição do mês de FEVEREIRO de 2023.

29ª Medição mês FEVEREIRO/ 2023 – Valor R\$ 260.558,64 conforme serviços realizados de expansão e modernização da iluminação pública no município de Campina Grande.

Sem mais para o momento e certo de sua atenção, subscrevo-me.

ALPER ENERGIA S.A

Carlos L. Sanjar
ALPER ENERGIA S.A

Carlos Lavini Sanjar
CPF: 282.187.708-01
RG: 26.164.000-8 SSP/SP
CREA/SP: 5061075872

09.388.615/0001-01

ALPER ENERGIA SA

Rua São Bento 452 Quadra 88 A
CEP 06186 140 Bairro São Pedro
Osasco SP

Alper

Alper Energia S.A.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 201 - Loja Faria Lima, Piso Térreo, Pinheiros – CEP 05426-100 – São Paulo – SP – Brasil
Tel./Fax: (55 11) 3265-6400

www.alper.com.br
alper@alper.com.br

CS
Carlos Lavini Sanjar
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187708-01

ALPER

À
Prefeitura Municipal de Campina Grande
Secretaria de Obras

Ref.: Faturamento – Contrato – Nº 2.08.020/2020

Segue documentação referente à 29ª Medição de Expansão 2020 Contrato Nº
2.08.020/2020 Sendo:

- 1) PLANILHA DE MEDIÇÃO
- 2) MEMORIAL DE CALCULO
- 3) CD COM ARQUIVOS DIGITAIS

Barueri 27 de Março de 2023.

ALPER ENERGIA S.A

Carlos Lavini Sanjar
ALPER ENERGIA S.A

Carlos Lavini Sanjar
CPF: 282.187.708-01
RG: 26.164.000-8 SSP/SP
CREA/SP: 5061075872

09.388.615/0001-01

ALPER ENERGIA SA

Rua São Bento 452 Quadra 88 A
CEP 06186 140 Bairro São Pedro
Osasco SP

Alper

Alper Energia S.A.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 201 - Loja Faria Lima, Piso Térreo, Pinheiros – CEP 05426-100 – São Paulo – SP – Brasil
Tel./Fax: (55 11) 3265-6400

www.alper.com.br
alper@alper.com.br

Carlos Lavini Sanjar
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187708-01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS - SECOP
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS

PERÍODO 01 DE FEVEREIRO DE 2023 À 28 DE FEVEREIRO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: EFICIENTIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Certifico que os materiais ou serviços constantes do presente recibo foram integralmente recebidos ou prestados

Em, 29/03/2023

29ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE OBRAS Nº 2.08.020/2020 - SECOP/PMCG - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032.020/2020/CPLE/SECOP/PMCG

Genildo da Silva Oliveira
CREA 1601488/29 - UND 298-PMCG-SECOP

DISCRICÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	1	LUMINÁRIA LED			
1.1		Luminária em LED para iluminação pública, 50W, bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000K, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w gar. 5 anos, modelo GL216 G-light ou similar	un		212,00
1.2		Luminária em LED para iluminação pública, 80W, bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000K, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w gar. 5 anos, modelo GL216 G-light ou similar	un		108,00
1.3		Luminária em LED para iluminação pública, 120W, bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000K, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w gar. 5 anos, modelo GL216 G-light ou similar	un		
1.4		Luminária em LED para iluminação pública, 150W, bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000K, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w gar. 5 anos, modelo GL216 G-light ou similar	un		
1.5		Luminária em LED para iluminação pública, 180W, bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000K, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 120 lm/w gar. 5 anos, modelo GL216 G-light ou similar	un		
1.6		Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot. anti vandalismo contra impacto IK09, 249Watts, 31500Lumens, 4000K, IRC>70, base p/ relê fotocélula/telegestão 7PIN, corpo alum injet. pint. políester a pó. 220V IP66 vida útil 100 mil horas	un		
2		PROJETORES LED			
2.1		Projeto à LED, IP 67, perfil de alumínio extrudado, com 36 LED's de alta potência (1,2W/LED), com lentes de abertura de 30°, ref. CHROMADEL RGB ou similar	un		
2.2		Refletor simples LED 150W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	un		16,00
2.3		Refletor LED Ultra 500W, chip Led CREE drive MEANWELL Proteção IP67, Voltagem AC 100-240V, temp de cor branco frio 5000K, vida útil 60.000h, da Leox ou similar	un		
3		CABOS			
3.1		Cabo de alumínio 0,6/1kv multiplexados 1x1x16 +16mm²	m		
3.2		Cabo de alumínio 0,6/1kv multiplexados 3x1x16 +16mm²	m		215,00
3.3		Cabo de alumínio 0,6/1kv multiplexados 3x1x25 +25mm²	m		
3.4		CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M		1.479,00
3.5		CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	M		
3.6		CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	M		
3.7		CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	M		
3.8		CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	M		
3.9		CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	M		

Carlos Lavini Sanjar
Diretor

CREA 5061075872



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS - SEC OB
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS
PERÍODO 01 DE FEVEREIRO DE 2023 À 28 DE FEVEREIRO DE 2023
MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: EFICIENTIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

29ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE OBRAS Nº 2.08.020/2020 - SEC OB/PMCG - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032.020/2020/CPL/SEC OB/PMCG

ITEM	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADES	
		UND	QUANT
3.10	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	M	
4	RELÉ FOTOELÉTRICO		
4.1	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	
4.2	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UN	
5	POSTES METÁLICOS		
5.1	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM	UN	
5.2	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPL0, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM	UN	
5.3	Poste de aço galvanizado a fogo SBP - 800/100 - 5030-J-GF cônico contínuo reto, diâmetro superior de 60,3mm, diâmetro da base 114,3mm, altura total 10m, com base de fixação, Shomei iluminação ou similar	un	
5.4	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior de 76mm, diâmetro da base 208mm, altura total 12m, com base de fixação, Conipost ref. Série 3012/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar	un	3,00
6	POSTES CONCRETO		
6.1	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H = 10 M (NBR 8451)	UN	
6.2	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451)	UN	
6.3	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451)	UN	
6.4	Poste concreto duplo T (DT) 9/150	UN	
6.5	Poste concreto duplo T (DT) 10/ 300	UN	
6.6	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 11 M (NBR 8451)	UN	
6.7	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 14 M (NBR 8451)	UN	
7	SUPORTE E BRAÇOS E COMPONENTES ELÉTRICOS		
7.1	Braço para luminária padrão energia 1 1/2" x 2.00m, Galvanizado a fogo	und	361,00
7.2	Braço para luminária padrão energia 2" x 3.00m, Galvanizado a fogo	UND	29,00
7.3	Suporte de luminária tipo mod- Delta em tubo de ferro de 2", galvanizado a fogo, tipo delta para duas luminária com lateral de 2 metros	und	3,00
7.4	Suporte de luminária tipo mod- Delta em tubo de ferro de 2", galvanizado a fogo, tipo delta para duas luminária com lateral de 3 metros	und	
7.5	Cruzeta de concreto tipo T 1900 mm	Un	
7.6	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	976,00
7.7	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM	UN	762,00
7.8	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	21,00
7.9	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)	UN	
7.10	CONCRETO PARA RECOMPOSIÇÃO DE PISO ACIMENTADO E/OU ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTOS	m³	
7.11	SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA PARA NIVELAMENTO DE TERRENO OU REMOÇÃO DE AREIA	CHI	
7.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM, TÁLICA 30 X 30	UN	

Carlos Lavini-Sant'Ana
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187.708-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS - SECOP
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS
PERÍODO 01 DE FEVEREIRO DE 2023 À 28 DE FEVEREIRO DE 2023
MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: EFICIENTIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

29ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE OBRAS Nº 2.08.020/2020 - SECOP/PMCG - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032.020/2020/CPL/SECOP/PMCG

ITEM	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADES	
		UND	QUANT
9.6	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA	M	
9.7	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2", SEM LUVA	M	
9.8	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m	un	
9.9	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m	un	
9.10	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/2" x 3m	un	
10	EQUIPE TÉCNICA		
10.1	Equipe técnica de apoio	Mês	0,30
11	VEICULO LEVE		
11.1	Veiculo de Fiscalização	Mês	0,30
12	EQUIPE E VEÍCULOS OPERACIONAIS		
12.1	EQUIPES OPERACIONAIS E EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS	Mês	0,30

Certifico que os materiais ou serviços constantes do presente recibo foram integralmente recebidos ou prestados

Em, 29/03/2023

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOP/PMCG

Genildo da Silva Oliveira - Engenheiro
CREA 1601438729 - Mat. 23286/PMCG / SECOP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SECOP COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS				CONTRATADA OBRA		ALPER ENERGIA S.A EFICIENTIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE				01 DE FEVEREIRO DE 2023 À 28 DE FEVEREIRO DE 2023 CAMPINA GRANDE/PE MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032.020/2020/CPL/SECOP/PMCG					
29ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE OBRAS Nº 2.08.020/2020 - SECOP/PMCG - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032.020/2020/CPL/SECOP/PMCG										QUANTIDADES REALIZADAS					
QUANTIDADES										QUANTIDADES REALIZADAS					
CONTRATO										Saldo					
P. UNIT.										Acum. Período					
S-TOTAL										Acum. Período					
QUANT										Acum. Período					
UND										Acum. Período					
DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS										Acum. Período					
ITEM										Acum. Período					
1 LUMINÁRIA LED										232.030,68					
Luminária em LED para iluminação pública 50W bivolt, Selo A Imetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000K, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w gar. 5 anos, modelo GL216 G-light ou similar										232.030,68					
1.1										232.030,68					
Luminária em LED para iluminação pública 80W bivolt, Selo A Imetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000K, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w gar. 5 anos, modelo GL216 G-light ou similar										232.030,68					
1.2										232.030,68					
Luminária em LED para iluminação pública 120W bivolt, Selo A Imetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000K, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w gar. 5 anos, modelo GL216 G-light ou similar										232.030,68					
1.3										232.030,68					
Luminária em LED para iluminação pública 150W bivolt, Selo A Imetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000K, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w gar. 5 anos, modelo GL216 G-light ou similar										232.030,68					
1.4										232.030,68					
Luminária em LED para iluminação pública 180W bivolt, Selo A Imetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000K, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w gar. 5 anos, modelo GL216 G-light ou similar										232.030,68					
1.5										232.030,68					
Luminária em LED para iluminação pública 180W bivolt, Selo A Imetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000K, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w gar. 5 anos, modelo GL216 G-light ou similar										232.030,68					
1.6										232.030,68					
Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot. anti vandalismo contra impacto IK09, 249Watts, 31500Lumens, 4000K, IRC>70, base p/ relé fotocélular/telegestão 7PIN, corpo alum injet, pint. poliéster a pó, 220V IP66 vida útil 100 mil horas										232.030,68					
2 PROJETORES LED										18.312,00					
2.1										18.312,00					
Projetor à LED, IP 67, perfil de alumínio extrudado, com 36 LEDs de alta potência (1,2W/LED), com lentes de abertura de 30°, ref. CHROMADEL RGB ou similar										18.312,00					
2.2										18.312,00					
Refletor simples LED 150W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar										18.312,00					
2.3										18.312,00					
Refletor LED Ultra 500W, chip Led CREE drive MEANWELL Proteção IP67, Voltagem AC 100-240V, temp de cor branco frio 5000K, vida útil 50.000h, da Leox ou similar										18.312,00					
3 CABOS										24.374,98					

Raimundo Antonio S. Carvalho
RUA-160 Nº 517/4
Coordenador de Obras
SECOP/PMCG

Certifico que os materiais ou serviços constantes do presente recibo foram integralmente recebidos ou prestados

Em 29/03/2023

Genildo da Silva Oliveira - Engenheiro
CREA 1601438729 - NRE 25985-PMCG/SECOP

CS

Carlos Lavini Sanjar
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187708-01

QUANTIDADES REALIZADAS																	
QUANTIDADES																	
CONTRATO																	
DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS		UND	QUANT	P.UNIT.	S-TOTAL	Acum.	Medido no	Acum. período		Saldo		Valor do		Acum. Período	Saldo		
						Anter.	Período	Quant.	%	Quant.	%	Período	Valor	%	Valor	%	
1	Cabo de alumínio 0,6/1kv multiplexados 1x1x16 +16mm²	m	4.000	1,92	7.680,00	4.000,00		4.000,00	100%		-	0%	-	7.680,00	100%	-	0%
2	Cabo de alumínio 0,6/1kv multiplexados 3x1x16 +16mm²	m	13.006	3,86	50.177,15	9.070,00	215,00	9.285,00	71%	3.721,00	29%	829,47	35.821,53	71%	14.355,62	29%	
3	Cabo de alumínio 0,6/1kv multiplexados 3x1x25 +25mm²	m	16.721	6,32	105.643,28	16.721,00		16.721,00	100%		-	0%	-	105.643,28	100%	(0,00)	0%
4	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	35.456	0,96	33.860,66	23.488,00	1.479,00	24.987,00	70%	10.469,00	30%	1.412,45	23.843,61	70%	10.017,05	30%	
5	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	6.000	1,37	8.220,00	6.000,00		6.000,00	100%		-	0%	-	8.220,00	100%	-	0%
6	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	5.000	1,88	9.375,00	5.000,00		5.000,00	100%		-	0%	-	9.375,00	100%	-	0%
7	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	4.000	3,01	12.020,00	4.000,00		4.000,00	100%		-	0%	-	12.020,00	100%	-	0%
8	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	3.109,85	4,61	14.336,39	3.109,85		3.109,85	100%		-	0%	-	14.336,39	100%	(0,00)	0%
9	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	M	856	7,72	6.607,72	855,70		855,70	100%	0,30	0%	-	6.605,40	100%	2,32	0%	
10	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	M		10,64	-			0,00		-	100%	-	-	-	-	100%	
4	RELÉ FOTOELÉTRICO				107.828,91										-		
4.1	RELE FOTOELETTRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	8.700	10,67	92.866,41	8.700,00		8.700,00	100%		-	0%	-	92.866,41	100%	-	0%
4.2	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UN	2.500	5,99	14.962,50	2.500,00		2.500,00	100%		-	0%	-	14.962,50	100%	-	0%
5	POSTES METÁLICOS				294.618,54										62.211,31		

Raimundo Antonio S. Carvalho
RM-20.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOP/PMCG

Certifico que os materiais ou serviços constantes do presente recibo foram integralmente recebidos ou prestados

Em, 29/03/2023

Genildo da Silva Oliveira - Engenheiro
CREA 1601438729 - MA 20285-PMCG / SECOP

Carlos Lavini Sanjar
Diretor
CREA 5061075872
CPE: 282.187708-01

1000 JOURNAL OF CLIMATE

QUANTIDADES REALIZADAS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADES															
		CONTRATO				Acum.	Medido no	Acum. período		Saldo		Valor do	Acum. Período		Saldo		
		UNO	QUANT	P. UNIT.	S-TOTAL			Período	Quant.	%	Quant.		%	Valor	%	Valor	%
8	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	700	32,03	22.417,50	602,00	21,00		623,00	89%	77,00	11%	672,53	19.951,58	89%	2.465,93	11%
9	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMÍNIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)	UN	820	2,80	2.291,90	820,00			820,00	100%	-	0%	-	2.291,90	100%	-	0%
10	CONCRETO PARA RECOMPOSIÇÃO DE PISO ACIDENTADO E/OU ENVELOPAMENTO DE ELETRÓDUTOS	m²	15	356,10	5.341,56	15,00			15,00	100%	-	0%	-	5.341,56	100%	-	0%
11	SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA PARA NIVELAMENTO DE TERRENO OU REMOÇÃO DE AREIA	CH	200	22,98	4.596,00	200,00			200,00	100%	-	0%	-	4.596,00	100%	-	0%
12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30 X 30	UN	4	23,89	95,58	4,00			4,00	100%	-	0%	-	95,58	100%	(0,00)	0%
13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 40 X 40	UN	0	43,27	-				0,00		-	100%	-	-		-	100%
14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSÃO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	0	64,42	-				0,00		-	100%	-	-		-	100%
15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *22* A, TENSÃO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	0	78,99	-				0,00		-	100%	-	-		-	100%
16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *38* A, TENSÃO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	0	166,40	-				0,00		-	100%	-	-		-	100%
17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSÃO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	0	318,06	-				0,00		-	100%	-	-		-	100%
18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 95 A, TENSÃO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	0	632,94	-				0,00		-	100%	-	-		-	100%
19	Conector ampact para cabo 35mm2 CADC 405 (ou similar)	un	1.800	10,54	18.964,80	1.640,00	90,00		1.730,00	96%	70,00	4%	948,24	18.227,28	96%	737,52	4%
20	Conector ampact para cabo 70mm2 CADC 401 (ou similar)	un	980	47,17	46.222,68	841,00	52,00		893,00	91%	87,00	9%	2.452,63	42.119,24	91%	4.103,44	9%
21	Conector cunha II série verde	un	900	1,98	1.782,00	900,00			900,00	100%	-	0%	-	1.782,00	100%	-	0%
22	Fornecimento de luminária completa para iluminação pública - 70w - Vapor Sódio	und	0	223,40	-				0,00		-	100%	-	-		-	100%
23	Fornecimento de luminária completa para iluminação pública - 150w - Vapor Sódio	UND	0	236,50	-				0,00		-	100%	-	-		-	100%

EM 29/03/2023

Genildo da Silva Oliveira - Engenheiro
CREA 1601438729 - Matr. 20285-PMCG / SECOP

63
Carlos Lavini Sanjar
Diretor
CREA 5061075872
CREA 502 107708 01

[illegible]

Certifico que os materiais ou serviços constantes do presente recibo foram integralmente recebidos ou prestados

28/03/2023

Genildo da Silva Oliveira - Engenheiro
CREA 1601438729 - Mat. 29283 - PMCG / SECOB

57

Carlos Lavini Sanjar
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187708-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SECOP COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS				CONTRATADA OBRA		ALPER ENERGIA S.A EFICIENTIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE									
UNIDADE QUE TRANSFORMA				PERÍODO CIDADE		01 DE FEVEREIRO DE 2023 À 28 DE FEVEREIRO DE 2023 CAMPINA GRANDE/PB									
29ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE OBRAS Nº 2.08.020/2020 - SECOP/PMCG - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032.020/2020/CPL/SECOP/PMCG															
QUANTIDADES				QUANTIDADES REALIZADAS											
CONTRATO				Acum.		Medido no		Acum. período		Saldo		Acum. Período		Saldo	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				Anter.		Período		Quant.		%		Valor		%	
VEICULO LEVE				S-TOTAL		14.165,62									
1 Veículo de Fiscalização				P.UNIT.		14.165,62		12,97		0,40		317,85		97%	
EQUIPE E VEÍCULOS OPERACIONAIS				QUANT.		1.537.618,71								46.347,16	
1 EQUIPES OPERACIONAIS E EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS				UND		1.537.618,71		12,97		0,40		34.501,54		97%	
														46.347,16	
TOTAL GERAL						9.136.999,21						207.055,50		8.602.427,12	
BDI 25,84%						2.361.000,60						53.503,14		2.222.867,17	
TOTAL GLOBAL COM BDI RS						11.497.999,82						260.558,64		10.825.294,29	
														94%	
														534.572,28	
														138.133,47	
														672.705,75	
														6%	

Importa a presente medição em R\$ 260.558,64 (Duzentos e sessenta mil quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos)

Certifico que os materiais ou serviços constantes do presente recibo foram integralmente recebidos ou prestados

Em, 29/03/2023

Raimundo Antônio de Siqueira
Nº 1601438729 - Matr. 2265-PMCG / SECOP
Coordenador de Obras

Genildo da Silva Oliveira - Engenheiro
CREA 1601438729 - Matr. 2265-PMCG / SECOP

Prefeitura Municipal de CAMPINA GRANDE

PLANILHA MEDIÇÃO

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CONTRATO NUMERO: 01/02/2023 a 28/02/2023
DATA DA MEDIÇÃO: 2.08.020/2020

EMPRESA: ALPER ENERGIA S.A.
ENDEREÇO: RUA SAO BENTO, 452 QUADRA 88A, SAO PEDRO - OSASCO - SP
CNPJ: 09.388.615/0001-01

OBJETO: EFICIENTIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
MEDIÇÃO: 29ª MEDIÇÃO

ORÇAMENTO BASE

UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT. ESTIMADO	CUSTO UNIT. (R\$)	CUSTO UNIT. (R\$) COM BDI%	QUANTIDADE 29ª MEDIÇÃO	QTD ACUMULADA	SALDO QTD	VALOR TOTAL (R\$)	VALOR 29ª MEDIÇÃO	SALDO R\$	SALDO PERCENTUAL %
	LUMINÁRIA LED	12.473				11.805	668	5.518.127,12	R\$ 116.169,04	R\$ 232.030,67	4,20%
un	Luminária em LED para iluminação pública, 50W, bivolt, Selo A Immetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000K, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar	5.515	339,69	427,47	212,00	4921,00	594,00	1.873.398,07	R\$ 72.014,58	R\$ 201.776,69	10,77%
un	Luminária em LED para iluminação pública, 80W, bivolt, Selo A Immetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000K, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar	2.450	408,84	514,48	108,00	2376,00	74,00	1.001.652,12	R\$ 44.154,46	R\$ 30.253,98	3,02%
un	Luminária em LED para iluminação pública, 120W, bivolt, Selo A Immetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000K, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar	1.620	449,76	565,98	0,00	1620,00	0,00	728.616,38	R\$ -	R\$ 0,00	0,00%
un	Luminária em LED para iluminação pública, 150W, bivolt, Selo A Immetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000K, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar	1.835	623,40	784,49	0,00	1835,00	0,00	1.143.947,81	R\$ -	R\$ 0,00	0,00%
un	Luminária em LED para iluminação pública, 180W, bivolt, Selo A Immetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000K, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 120 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar	1.053	731,73	920,81	0,00	1053,00	0,00	770.512,74	R\$ -	R\$ 0,00	0,00%
un	Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot. anti vandalismo contra impacto IK09, 249Watts, 31500lumens, 4000K, IRC>70, base p/ relé fotocélula/telegestão 7PIN, corpo alum injet. pint. pollester a pó. 220V IP66 vida útil100 mil horas	0	934,04	1.175,40		0,00	0,00		R\$ -	R\$ -	0,00%
	PROJETORES LED					225		74.864,13	R\$ 2.790,40	R\$ 18.312,00	24,46%
un	Projektor à LED, IP 67, perfil de alumínio extrudado, com 36 LED's de alta potência (1,2W/LED), com lentes de abertura de 30°, ref. CHROMADEL RGB ou similar	0	2.886,13	3.631,91		0,00	0,00		R\$ -	R\$ -	0,00%
un	Refletor simples LED 150W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	320	174,40	219,46	16,00	215,00	105,00	55.808,00	R\$ 2.790,40	R\$ 18.312,00	32,81%
un	Refletor LED Ultra 500W, chip Led CREE drive MEANWELL Proteção IP67, Voltagem AC 100-240V, temp de cor branco frio 5000K, vida útil 60.000h, da Leox ou similar	10	1.905,61	2.398,02		10,00	0,00	19.056,13	R\$ -	R\$ 0,00	0,00%

Certifico que os materiais ou serviços constantes do presente recibo foram integralmente recebidos ou prestados

Em, 29/08/2023

Genildo da Silva Oliveira - Engenheiro
CREA 1601438728 - Matr. 23085-RN - SECOP

Carlos Lavini Sanjar
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187708-01

Raimundo Antonio S. Cavalcante
RN-160.104-517-09-05
Coordenador de Obras
SECOP/PMCC

24	un	200	90,25	113,57		152,00	48,00	R\$	18.049,50	R\$	-	R\$	4.331,88	24,00%
Suporte em tubo de aço galvanizado para fixação de luminária 01 pétala (Faet Luce, ref. Mira VTP ou similar) Suporte em tubo de aço galvanizado para fixação de luminária Faet Luce, ref. Mira VTP, 01 pétala														
25	un	80	106,27	133,73		46,00	34,00	R\$	8.501,76	R\$	-	R\$	3.613,25	42,50%
Suporte em tubo de aço galvanizado para fixação de luminária 02 pétalas (Faet Luce, ref. Mira VTP ou similar) Suporte em tubo de aço galvanizado para fixação de luminária Faet Luce, ref. Mira VTP, 02 pétalas														
26	un	0	125,32	157,70		0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
Suporte em tubo de aço galvanizado para fixação de luminária 03 pétalas (Faet Luce - ref. Mira VTP ou similar) Suporte em tubo de aço galvanizado para fixação de luminária Faet Luce, ref. Mira VTP, 03 pétalas														
27	un	0	142,36	179,14		0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
Suporte em tubo de aço galvanizado para fixação de luminária 04 pétalas (Faet Luce - ref. Mira VTP ou similar) Suporte em tubo de aço galvanizado para fixação de luminária Faet Luce, ref. Mira VTP, 04 pétalas														
28	un	0	10,92	13,74		0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
Suporte metálico para fixação de projetor SUPORTE METÁLICO PARA FIXAÇÃO DE PROJETO														
8								R\$	3.494,16			R\$	-	0,00%
CHAVA MAGNÉTICA														
8.1	UN	0	63,99	80,53		0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR MONOFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)														
8.2	UN	0	125,48	157,91		0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)														
8.3	und	9	388,24	488,56		9,00	0,00	R\$	3.494,16			R\$	-	0,00%
Fornecimento de Chave magnetica de 2 x 60A para comando de iluminação pública, acionada por relê fotoeletrico NA, 220V, 60Hz														
9								R\$	307,40			R\$	0,00	0,00%
ELETRODUTOS														
9.1	m	0	3,80	4,78		0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
Eletroduto corrugado flexível em PEAD Ø = 1 1/2", tipo Kanalex ou similar														
9.2	m	40	2,95	3,72		40,00	0,00	R\$	118,14			R\$	-	0,00%
Eletroduto corrugado flexível em PEAD Ø = 2", tipo Kanalex ou similar														
9.3	M	0	1,37	1,72		0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 " , SEM LUVA														
9.4	M	0	2,14	2,69		0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 " , SEM LUVA														
9.5	M	0	2,85	3,59		0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 " , SEM LUVA														
9.6	M	37	5,12	6,44		37,00	0,00	R\$	189,26			R\$	0,00	0,00%
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 " , SEM LUVA														
9.7	M	0	7,46	9,39		0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 " , SEM LUVA														
9.8	un	0	41,97	52,81		0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m														
9.9	un	0	52,91	66,58		0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/2" x 3m														
9.10	un	0	49,49	62,28		0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/2" x 3m														
10								R\$	569.858,84	R\$	12.786,66	R\$	17.177,40	3,01%
EQUIPE TÉCNICA														
10.1	Mês	13	42.622,20	53.635,78	0,30	12,97	0,40	R\$	569.858,84	R\$	12.786,66	R\$	17.177,40	3,01%
Equipe técnica de apoio														
11								R\$	14.165,62	R\$	317,85	R\$	427,00	3,01%
VFIGIJI Q I FVF														
11.1	Mês	13	1.059,51	1.333,28	0,30	12,97	0,40	R\$	14.165,62	R\$	317,85	R\$	427,00	3,01%
Veiculo de Fiscalização														
12								R\$	1.537.618,71	R\$	34.501,54	R\$	46.348,83	3,01%
EQUIPE E VEICULOS OPERACIONAIS														
12.1	Mês	13	115.005,14	144.722,47	0,30	12,97	0,40	R\$	1.537.618,71	R\$	34.501,54	R\$	46.348,83	3,01%
EQUIPES OPERACIONAIS E EQUIPAMENTOS/VEICULOS														
RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO NA 1ª MEDIÇÃO														
TOTAL GERAL														
BDI 25,84%														
TOTAL GLOBAL COM BDI														
EXECUÇÃO DO CONTRATO														
100,00%														
2,27%														
5,85%														
5,85%														
5,85%														

Certifico que os materiais ou serviços constantes do presente recibo foram integralmente recebidos ou prestados


Em 27/03/2023

Reinaldo Antonio S. Carvalho
Coordenador de Obras
RM-160-100-517-14
SECOB/PMCG

CS
Carlos Lavini Saijar
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 287 187708-01

Genildo da Silva Oliveira - Engenheiro
CREA 1601438729 - Matr. 28285-PMCG/SECOB

RUA SANTA CECILIA

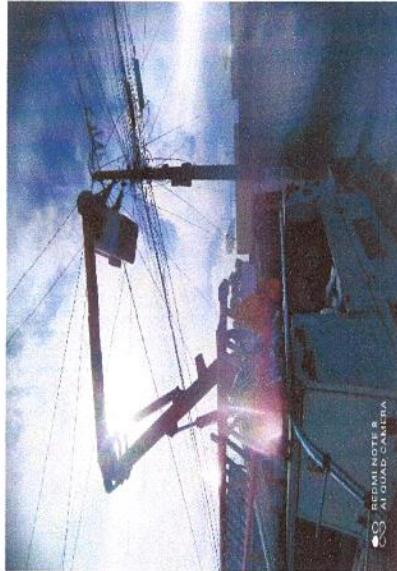

Raimundo Antonio S. Carvalho
RUI-160.143.174
Coordenador de Obras
COM/PMCG


Certifico que os materiais ou serviços
constantes do presente recibo foram
integralmente recebidos ou prestados

Em, 27/03/2023

Genildo da Silva Oliveira - Engenheiro
CREA 1601438729 - Matr. 242285/PMCG / SECOB

CS
Carlos Latini Sampaio
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187708-01

RUA RUBENS SALDANHA

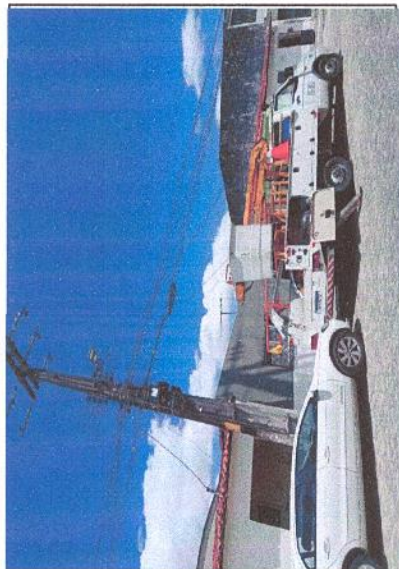

Raimundo Antonio S. Cruz
RUA-160.104.517
Coordenador das Obras
SECOB/PMCG

Certifico que os materiais ou serviços
constantes do presente recibo foram
integralmente recebidos ou prestados

Em, 24/03/2023

Genildo da Silva Oliveira - Engenheiro
CREA 16014387/29 - Matr. 291286-PMCG / SECOB

Carlos Latini Saljal
CREA 50610758/2
Diretor
CPF: 282.18708-01

RUA PROF JOSE DA MATA



Reinaldo Antonio S. Carvalho
NW-160103874
Coordenador de Obras
SECOB / PMCG

certifico que os materiais ou serviços
constantes do presente recibo foram
integralmente recebidos ou prestados

Em, 29/03/2023

Genildo da Silva Oliveira - Engenheiro
CREA 1601438720 - Matr 20285-PMCG / SECOB

Carlos Latini Saljal
Diretor
CREA 306107872
CPF: 282.18708-01

RUA PROF FABIO FREITAS



Raimundo Antonio S. Carvalho
CREA 160.164.517/4
Coordenador de Obras
SECOB / PMMG

Certifico que os materiais ou serviços
constantes do presente recibo foram
integralmente recebidos ou prestados

Em, 29/03/2023

Genildo da Silva Oliveira - Engenheiro
CREA 1601438729 - Matr. 20155-PMCG / SECOB

CS
Carlos Latini Sallier
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187708-01

RUA PEDRO XAVIER



Raimundo Antônio S. Carvalho
Rui-1504-5174
Coordenador de Obras
SECUBRIPWCG

Certifico que os materiais ou serviços
constantes do presente recibo foram
integralmente recebidos ou prestados

Em, 27/03/2023

Genildo da Silva Oliveira - Engenheiro
CREA 1601438729 - Matr. 22285 PMCG / SEC08

Carlos Lavini Salazar
CREA 5061075872
Dir. Ger. 282.18770801

RUA PAULO GOMES PERICO



Re: Rte. 160, 104, 517, 4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG
Rafael Antonio S. Carvalho

Certifico que os materiais ou serviços
constantes do presente recibo foram
integralmente recebidos ou prestados

Em, 29/03/2023

Genildo da Silva Oliveira - Engenheiro
CREA 1601438729 - M.d. 88235-PMCG / SECOB

Carlos Lami Sanyal
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187108-01

RUA NILO PEÇANHA



Reinaldo Antonio S. Carvalho
Coordenador de Obras
PMCG 160143872-4

Certifico que os materiais ou serviços
constantes do presente recibo foram
integralmente recebidos ou prestados

Em, 27/03/2023

Genildo da Silva Oliveira - Engenheiro
CREA 160143872 - Matr 29282-PMCG / SECOB

Carlos Latini Sanjar
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187708-01

RUA MOACIR FARIAS LEITE



Reinaldo Antonio S. Carvalho
IME-16/2014
CRC/PA/PMCG

Certifico que os materiais ou serviços constantes do presente recibo foram integralmente recebidos ou prestados

Em, 23/03/2023

Genildo da Silva Oliveira - Engenheiro
CREA 1601438726 - Matr. 20205-PMCG / SEC08

Carlos Lavini Saljar
CREA 5061075872
CPF: 282.18.7108-01

RUA MARIA ESTELITA REGIS



Contratado
Raimundo Antonio da Silva
Rua 1601 - 1.º andar - Oitavas
Contador - OAB/PA 1.º CG

Certifico que os materiais ou serviços
constantes do presente recibo foram
integralmente recebidos ou prestados

Em, 27/03/2023

Genildo da Silva Oliveira - Engenheiro
CREA 1601438728 - Mat. 20185-PMCG / SECOB

Carlos Latini Salazar
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187108-01

RUA JOSE VITORINO



Raimundo Antonio S. Carvalho
RUA-160.103-1714
Cidade de Ovaras
SUCOSU-PMCG

Certifico que os materiais ou serviços
constantes do presente recibo foram
integralmente recebidos ou prestados

Em, 29/03/2023

Genildo da Silva Oliveira - Engenheiro
CREA 1601438729 - Mat. 23285 PMCG / SEC08

Carlos Latini Saljal
Diretor
CREA 306107372
CPF: 282.187708-01

RUA JOSE VIRGINIO DE LIMA



Reinaldo Antonio
Ribeiro da Silva
Coordenador de Obras
SECOOP/PMCG

Certifico que os materiais ou serviços
constantes do presente recibo foram
integralmente recebidos ou prestados

Em 29/03/2023

Genildo da Silva Oliveira - Engenheiro
CREA 1601438729 - Matr. 292065-PMCG / SECOB

Carlos Lavini Sallier
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187708-01

RUA JOSE ARANHA



Raimundo A. S. Carvalho
104.517/4
Fornecedor de Obras
COP 50 COBIPWCG

Certifico que os materiais ou serviços
constantes do presente recibo foram
integralmente recebidos ou prestados

Em, 29/03/2023

Genildo da Silva Oliveira - Engenheiro
CREA 1601438729 - Matr. 29285-PMCG / SEC08

CS
Carlos Lavini Saitjar
CREA 5061075872
CPF: 282.18708-01

RUA JOSAFÁ CESAR FALCAO



Renildo Antonio S. Falcao
Coordenador de obras
RUA-160-104
SECOP/PR-203

Certifico que os materiais ou serviços
constantes do presente recibo foram
integralmente recebidos ou prestados

Em, 27 / 03 / 2023

Genildo da Silva Oliveira - Engenheiro
CREA 1601438729 - Matr. 192857/MCG / SECOP

Carlos Latini Saljar
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.1870801

RUA IVALDO MARQUES



Reinaldo Antonio S. Cardillo
RUA 104, 104, 104
Coordenador PMCG / SEC08

Certifico que os materiais ou serviços
constantes do presente recibo foram
integralmente recebidos ou prestados

Em: 29/03/2023

Genildo da Silva Oliveira - Engenheiro
CREA 1601438729 - Matr. 28289-PMCG / SEC08

Carlos Lavini Saitjar
CREA 5061075872
CPF: 282.187108-01

RUA GETULIO CAVALCANTI



Raimundo Antonio S. Carvalho
RTE-160, 104, Box 4
Coordenador de Obras
SECTOP/PMCG

Certifico que os materiais ou serviços
constantes do presente recibo foram
integralmente recebidos ou prestados

Em, 29/03/2013

Genildo da Silva Oliveira, Engenheiro
CREA 1601438729 - Matr. 25085-PMCG / SEC08

CS
Carlos Lavini Saitjat
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187708-01

RUA EDGAR BARBOSA COSTA



Reinundo Antonio S. Garbalho
R. 1517/4
Cidade de O Queres
Cidade de O Queres
Cidade de O Queres

Certifico que os materiais ou serviços
constantes do presente recibo foram
integralmente recebidos ou prestados

Em, 29/03/2023

Genildo da Silva Oliveira - Engenheiro
CREA 1601438729 - MPE/2025 - PMCG / SECOR

Carlos Lavini Sanjar
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187108-01

RUA DOS JUCAIS



Raimundo Antônio S. Carvalho
Rte-120, 0001517-A
Serra
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Certifico que os materiais ou serviços
constantes do presente recibo foram
integralmente recebidos ou prestados

Em, 29/03/2023

Genildo da Silva Oliveira - Engenheiro
CREA 1601438729 - Mat. 20285-PMCG / SECOP

Carlos Lavini Senijar
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187108-01

RUA CECI RAMOS DE QUEIROZ



Valmir do Amaral S. Carvalho
Rt-100, 517/4
Cooperativa de Obras
SECOB PMCG

Certifico que os materiais ou serviços
constantes do presente recibo foram
integralmente recebidos ou prestados

Em, 29/03/2023

Genildo da Silva Oliveira - Engenheiro
CREA 1601438729 - Matr. 29285-PMCG / SECOB

3
Carlos Lavinio Santiago
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187708-10

RUA CASTRO PINTO



Raimundo Antônio S. Carvalho
RUA 161004-5174
Construtor de Obras
S.C.OB/PMCG

Certifico que os materiais ou serviços
constantes do presente recibo foram
integralmente recebidos ou prestados

Em, 29/03/2023

Genildo da Silva Oliveira Engenheiro
CREA 1601438729 - MAT 78085-PMCG / SEC08

CS
Carlos Lavini Saitjer
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187108-01

RUA CARLOS CHAGAS



Raimundo Antônio Corvalho
RUA-160143872-01
Coordenador de Obras
ECC/DA/PMCG


Certifico que os materiais ou serviços
constantes do presente recibo foram
integralmente recebidos ou prestados

Em, 29/08/2023

Genildo da Silva Oliveira - Engenheiro
CREA 160143872-01 - Matr 24445-PMCG / SEC0B

Carlos Lavini Sanjar
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187108-01

RUA BRANCO RIBEIRO

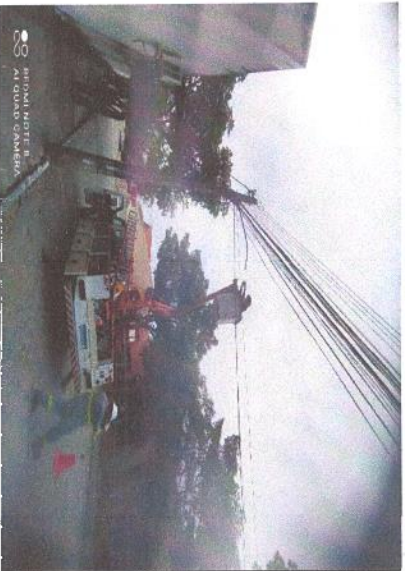

Raimundo Antônio S. Cervalho
CPF: 104.517.14
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Certifico que os materiais ou serviços constantes do presente recibo foram integralmente recebidos ou prestados

Em, 23/03/2023

Genildo da Silva Oliveira - Engenheiro
CREA 1601438729 - Matr. 47188 - PMCG / SECOB

CS
Carlos Lavini Sanjar
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187708-01

RUA ARIUS



Reinhold Antônio S. Carvalho
CPF: 004.517.74
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Certifico que os materiais ou serviços
constantes do presente recibo foram
integralmente recebidos ou prestados

Em, 27/08/2023

Genildo da Silva Oliveira Engenheiro
CREA 1601438729 - MEI 19285/PMCG / SECOB

CS
Carlos Lavini Sanjar
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187708-01

RUA ANTENOR NAVARRO



Raimundo Antonio Cortalho
RUE-160.100
Coordenador de Obras
SISTEMA PIMCG

Certifico que os materiais ou serviços
constantes do presente recibo foram
integralmente recebidos ou prestados

Em, 21/08/2023

Genildo da Silva Oliveira - Engenheiro
CREA 1601438729 - NRE 282/85 PIMCG / SECOP

65
Carlos Lavini Sanjar
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187708-01

PRAÇA VILA SANDRA CAVALCANTE



Raimundo José
Ribeiro
Coordenador
SEPLAN

Certifico que os materiais ou serviços
constantes do presente recibo foram
integralmente recebidos ou prestados

Em, 29/08/2023

Genildo da Silva Oliveira - Engenheiro
CREA 1601438729 - Matr. 28285/PMCG/SECOB

Carlos Lavini Sanjar
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187708-01

PRAÇA BAIRRO DAS CIDADES



Raimundo Antonio S. Galvão
Rt-160.104.51714
Coordenador de OBRAS
SECOPRICE

Certifico que os materiais ou serviços
constantes do presente recibo foram
integralmente recebidos ou prestados

Em, 29/08/2023

Genildo da Silva Oliveira - Engenheiro
CREA 1601438729 - Matr. 149085-PMCG/SECOB

CS
Carlos Lavini Sanjar
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187708-01

PRAÇA ALUISIO CAMPOS



Raimundo Antonio de Carvalho
Elt-160.100.17174
Coordenador de Obras
SECOP/PMCG


Certifico que os materiais ou serviços
constantes do presente recibo foram
integralmente recebidos ou prestados

Em, 29/08/2023

Genildo da Silva Oliveira - Engenheiro
CREA 1601438729 - MA/28285-PMCG / SEC08

Carlos Lavini Sanjar
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187708-01

HOSPITAL ISEA



Certifico que os materiais ou serviços constantes do presente recibo foram integralmente recebidos ou prestados

Em _____ 29/03/2023



Gerido da Silva Oliveira - Engenheiro

CREA 1601438729 - Matr. 29288 - P/MCG / SECOR

Carlos Lavini Sanjar
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187708-01
