

ALPER

À
Prefeitura Municipal de Campina Grande
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
Depto. Iluminação Pública
Ofício N° 03/2020

Senhora secretária,

Com meus cumprimentos, dirijo-me a Vossa Senhoria para solicitar-lhes a autorização para liberação de emissão de nota fiscal referente à respectiva medição do mês Setembro de 2020.

3ª Medição mês SET/ 2020 – Valor R\$ 319.999,57 conforme serviços realizados de expansão e modernização da iluminação pública no município de Campina Grande.

Sem mais para o momento e certo de sua atenção, subscrevo-me.

ALPER ENERGIA S.A

Carlos D. Sanjar
ALPER ENERGIA S.A

Carlos Lavini Sanjar
CPF: 282.187.708-01
RG: 26.164.000-8 SSP/SP
CREA/SP: 5061075872

09.388.615/0001-01

ALPER ENERGIA SA

Rua São Bento 452 Quadra 88 A
CEP 06186 140 Bairro São Pedro
Osasco SP

Alper

Alper Energia S.A.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 201 - Loja Faria Lima, Piso Térreo, Pinheiros – CEP 05426-100 – São Paulo – SP – Brasil
Tel./Fax: (55 11) 3265-6400

www.alper.com.br
alper@alper.com.br



À

Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Serviços Urbanos

A/C.: Sr.ª Secretária de Obras Fernanda Ribeiro B.S. Albuquerque

Ref.: Faturamento – Contrato – Nº 2.08.020/2020

Segue documentação referente à 3ª Medição de Expansão 2020 Contrato Nº 2.08.020/2020 Sendo:

- 1) 2 vias -Planilha da Medição
- 2) 2 vias - Memória de cálculos
- 3) 2 vias – Relatório Fotográfico
- 4) CD- Com arquivo em KML do GPS E EXXCEL
- 5) Ofício solicitando autorização para emissão de nota fiscal

Osasco, 01 de outubro de 2020.

ALPER ENERGIA S.A

Carlos Lavini Sanjar

ALPER ENERGIA S.A

Carlos Lavini Sanjar

CPF: 282.187.708-01

RG: 26.164.000-8 SSP/SP

CREA/SP: 5061075872

09.388.615/0001-01

ALPER ENERGIA SA

Rua São Bento 452 Quadra 88 A

CEP 06186 140 Bairro São Pedro

Osasco SP

Alper

Alper Energia S.A.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 201 - Loja Faria Lima, Piso Térreo, Pinheiros – CEP 05426-100 – São Paulo – SP – Brasil
Tel./Fax: (55 11) 3265-6400

www.alper.com.br
alper@alper.com.br

CONTRATO Nº 2.08.020/2020

ALPER ENERGIA S.A

3ª MEDIÇÃO

324.020

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

2.08.020/2020

MODALIDADE PREGAO ELETRONICO
SECRETARIA:

CONTRATO NUMERO:

DATA DA MEDIÇÃO:

EMPRESA:

ENDERECO:

CNPJ:

OBJETO:

MEDIÇÃO:

24/08/2020 A 30/09/2020

ALPER ENERGIA S.A

RUA SAO BENTO, 452 QUADRA 88A, SAO PEDRO - OSASCO - SP

09.388.615/0001-01

EFICIENTIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3ª MEDIÇÃO

ORÇAMENTO BASE

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT. ESTIMADO	CUSTO UNIT. (R\$)	CUSTO UNIT. (R\$) COM BDI%	QUANTIDADE 3ª MEDIÇÃO	QTD ACUMULADA	SALDO QTD	VALOR TOTAL (R\$)	VALOR 3ª MEDIÇÃO	SALDO R\$	SALDO PERCENTUAL %
1	LUMINÁRIA LED para iluminação pública, 50W, bivolt, Selo A Immetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000K, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w gar. 5 anos, modelo GL216 G-light ou similar	un	3.000	339,69	427,47	296	608,00	2.392,00	R\$ 1.019.074,20	R\$ 100.548,65	R\$ 812.541,83	79,73%
1.1	Luminária em LED para iluminação pública, 80W, bivolt, Selo A Immetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000K, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w gar. 5 anos, modelo GL216 G-light ou similar	un	2.000	408,84	514,48	60	491,00	1.509,00	R\$ 817.675,20	R\$ 24.530,26	R\$ 616.935,94	75,45%
1.2	Luminária em LED para iluminação pública, 120W, bivolt, Selo A Immetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000K, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w gar. 5 anos, modelo GL216 G-light ou similar	un	1.000	449,76	565,98	57	155,00	845,00	R\$ 449.763,20	R\$ 25.636,50	R\$ 380.049,90	84,50%
1.3	Luminária em LED para iluminação pública, 150W, bivolt, Selo A Immetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000K, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w gar. 5 anos, modelo GL216 G-light ou similar	un	1.500	623,40	784,49	13	15,00	1.485,00	R\$ 935.107,20	R\$ 8.104,26	R\$ 925.756,13	99,00%
1.4	Luminária em LED para iluminação pública, 180W, bivolt, Selo A Immetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000K, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 120 lm/w gar. 5 anos, modelo GL216 G-light ou similar	un	900	731,73	920,81	0	0,00	900,00	R\$ 658.557,90	R\$ -	R\$ 658.557,90	100,00%
1.5	Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot. anti vandalismo contra impacto IK09, 249Watts, 31500Lumens, 4000K, IRC>70, base p/ relé fotocélula/telegestão 7PIN, corpo alum injet, pint. poliester a pó. 220V IP66 vida útil 100 mil horas	un	100	934,04	1.175,40	0	0,00	100,00	R\$ 93.403,96	R\$ -	R\$ 93.403,96	100,00%
2	PROJETORES LED								R\$ 303.328,56	R\$ -	R\$ 303.328,56	100,00%
2.1	Projeto a LED, IP 67, perfil de alumínio extrudado, com 36 LEDs de alta potência (1.2W/LED), com lentes de abertura de 30°, ref. CHROMADEL RGB ou similar	un	60	2.886,13	3.631,91	0	0,00	60,00	R\$ 173.167,92	R\$ -	R\$ 173.167,92	100,00%
2.2	Refletor simples LED 150W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	un	200	174,40	219,46	0	0,00	200,00	R\$ 34.880,00	R\$ -	R\$ 34.880,00	100,00%
2.3	Refletor LED Ultra 500W, chip Led CREE drive MEANWELL Proteção IP67, Voltagem AC 100-240V, temp de cor branco frio 5000K, vida útil 50.000h, da Leox ou similar	un	50	1.905,61	2.398,02	0	0,00	50,00	R\$ 95.280,64	R\$ -	R\$ 95.280,64	100,00%

Rafael Gomes Leite
Engenheiro Civil
CPF 062.483.244-92
CREA 16142979-3

Certifico que os materiais ou serviços constantes do presente recibo foram integralmente recebidos ou prestados Em, 05/10/2020

Genildo da Silva
Engenheiro
CREA 160143872B - MEX 1166-FMCG/SECOB


Carlos Lavini Sanjar
Diretor
CPF: 282.187708-01
CREA 5061075872

24	Suporte em tubo de aço galvanizado para fixação de luminária 01 pétala (Fael Luce, ref. Mira VTP ou similar) Suporte em tubo de aço galvanizado para fixação de luminária Fael Luce, ref. Mira VTP, 01 pétala	un	1	90,25	113,57	0	0,00	1.100,00	R\$ 99.272,25	R\$ -	R\$ 99.272,25	100,00%
7 25	Suporte em tubo de aço galvanizado para fixação de luminária 02 pétalas (Fael Luce, ref. Mira VTP ou similar) Suporte em tubo de aço galvanizado para fixação de luminária Fael Luce, ref. Mira VTP, 02 pétalas	un	980	106,27	133,73	0	0,00	980,00	R\$ 104.146,56	R\$ -	R\$ 104.146,56	100,00%
7 26	Suporte em tubo de aço galvanizado para fixação de luminária 03 pétalas (Fael Luce - ref. Mira VTP ou similar) Suporte em tubo de aço galvanizado para fixação de luminária Fael Luce, ref. Mira VTP, 03 pétalas	un	550	125,32	157,70	0	0,00	550,00	R\$ 68.923,80	R\$ -	R\$ 68.923,80	100,00%
7 27	Suporte em tubo de aço galvanizado para fixação de luminária 04 pétalas (Fael Luce - ref. Mira VTP ou similar) Suporte em tubo de aço galvanizado para fixação de luminária Fael Luce, ref. Mira VTP, 04 pétalas	un	200	142,36	179,14	0	0,00	200,00	R\$ 28.471,50	R\$ -	R\$ 28.471,50	100,00%
7 28	Suporte metálico para fixação de projetor SUPORTE METALICO PARA FIXAÇÃO DE PROJETOR	un	160	10,92	13,74	0	0,00	160,00	R\$ 1.747,20	R\$ -	R\$ 1.747,20	100,00%
8	CHAVA MAGNETICA								R\$ 86.192,13	R\$ -	R\$ 84.639,17	98,20%
8.1	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA 1 MEDIDOR MONOFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	250	63,99	80,53	0	0,00	250,00	R\$ 15.997,50	R\$ -	R\$ 15.997,50	100,00%
8.2	CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	250	125,48	157,91	0	0,00	250,00	R\$ 31.370,63	R\$ -	R\$ 31.370,63	100,00%
8.3	Fornecimento de Chave magnetica de 2 x 60A para comando de iluminação publica, acionada por relé fotoeletrico NA, 220V, 60Hz	und	100	388,24	488,56	0	4,00	96,00	R\$ 38.824,00	R\$ -	R\$ 37.271,04	96,00%
9	ELETRÓDUTOS								R\$ 74.751,05	R\$ -	R\$ 74.622,68	99,83%
9.1	Eletroduto corrugado flexivel em PEAD Ø = 1,1/2", tipo Kanalex ou similar	m	6.000	3,80	4,78	0	0,00	6.000,00	R\$ 22.770,00	R\$ -	R\$ 22.770,00	100,00%
9.2	Eletroduto corrugado flexivel em PEAD Ø = 2", tipo Kanalex ou similar	m	6.000	2,95	3,72	0	40,00	5.960,00	R\$ 17.121,00	R\$ -	R\$ 17.602,86	99,33%
9.3	ELETRÓDUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 " SEM LUVA	M	4.000	1,37	1,72	0	0,00	4.000,00	R\$ 5.478,00	R\$ -	R\$ 5.478,00	100,00%
9.4	ELETRÓDUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 " SEM LUVA	M	4.000	2,14	2,69	0	0,00	4.000,00	R\$ 8.558,00	R\$ -	R\$ 8.558,00	100,00%
9.5	ELETRÓDUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 " SEM LUVA	M	1.500	2,85	3,59	0	0,00	1.500,00	R\$ 4.273,50	R\$ -	R\$ 4.273,50	100,00%
9.6	ELETRÓDUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 " SEM LUVA	M	150	5,12	6,44	0	2,00	148,00	R\$ 767,25	R\$ -	R\$ 757,02	98,67%
9.7	ELETRÓDUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 " SEM LUVA	M	100	7,46	9,39	0	0,00	100,00	R\$ 746,35	R\$ -	R\$ 746,35	100,00%
9.8	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m	un	100	41,97	52,81	0	0,00	100,00	R\$ 4.196,50	R\$ -	R\$ 4.196,50	100,00%
9.9	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m	un	100	52,91	66,58	0	0,00	100,00	R\$ 5.291,00	R\$ -	R\$ 5.291,00	100,00%
9.10	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/2" x 3m	un	100	49,49	62,28	0	0,00	100,00	R\$ 4.949,45	R\$ -	R\$ 4.949,45	100,00%
10	EQUIPE TÉCNICA								R\$ 511.466,42	R\$ 14.234,57	R\$ 437.134,45	85,47%
10.1	Equipe técnica de apoio	Mês	12	42.622,20	53.635,78	0,33	1,74	10,26	R\$ 12.714,10	R\$ 353,84	R\$ 10.866,35	85,47%
11	VEICULO LEVE								R\$ 12.714,10	R\$ 353,84	R\$ 10.866,35	85,47%
11.1	Veiculo de Fiscalização	Mês	12	1.059,51	1.333,28	0,33	1,74	10,26	R\$ 1.380.061,67	R\$ 38.408,34	R\$ 1.179.495,80	85,47%
12	EQUIPE E VEÍCULOS OPERACIONAIS								R\$ 9.136.999,22	R\$ 254.290,82	R\$ 8.235.576,01	90,13%
12.1	EQUIPES OPERACIONAIS E EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS	Mês	12	115.005,14	144.722,47	0,33	1,74	10,26	R\$ 2.361.000,60	R\$ 65.708,75	R\$ 2.128.072,84	90,13%
TOTAL GERAL									R\$ 11.497.999,82	R\$ 319.999,57	R\$ 10.363.648,85	90,13%
BDI 25,84%												
TOTAL GLOBAL COM BDI									100,00%	2,78%	90,13%	


EXECUÇÃO DO CONTRATO


Rafael Gomes Leite
 Engenheiro Civil
 CPF 062.483.244-92
 CREA 1514297940

Certifico que os materiais ou serviços constantes do presente recibo foram integralmente recebidos ou prestados
 Em, 05/10/2020


Genildo da Silva
 Engenheiro
 CREA 1601438129 - MGO - 1058-PMC/SECOB


Carlos Lavini Sanjar
 Diretor
 CREA 5061075872
 CPF: 282.187108-01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEC
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS

CONTRATADA
OBRA

ALPER ENERGIA S.A


EFICIENTE, AO, MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

PERÍODO
CIDADE

25 DE AGOSTO DE 2020 À 30 DE SETEMBRO DE 2020
CAMPINA GRANDE/PB

3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE OBRAS Nº 2.08.020/2020 - SECOP/PMCG - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032.020/2020/CPL/SECOP/PMCG

		QUANTIDADES					QUANTIDADES REALIZADAS									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	P.UNIT.	S-TOTAL	Acum.	Medido no	Acum. período	Quant.	%	Quant.	%	Valor do	Acum. Período	%	Saldo
1	LUMINÁRIA LED				3.973.581,66											
1.1	Luminária em LED para iluminação pública, 50W, bivolt, Selo A Imetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar	un	3.000	339,69	1.019.074,20	312,00	296,00	608,00	20%	2.392,00	80%	100.548,65	206.532,37	20%	812.541,83	
1.2	Luminária em LED para iluminação pública, 80W, bivolt, Selo A Imetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar	un	2.000	408,84	817.675,20	431,00	60,00	491,00	25%	1.509,00	75%	24.530,26	200.739,26	25%	616.935,94	
1.3	Luminária em LED para iluminação pública, 120W, bivolt, Selo A Imetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar	un	1.000	449,76	449.763,20	98,00	57,00	155,00	16%	845,00	85%	25.636,50	69.713,30	16%	380.049,90	
1.4	Luminária em LED para iluminação pública, 150W, bivolt, Selo A Imetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar	un	1.500	623,40	935.107,20	2,00	13,00	15,00	1%	1.485,00	99%	8.104,26	9.351,07	1%	925.756,13	
1.5	Luminária em LED para iluminação pública, 180W, bivolt, Selo A Imetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 120 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar	un	900	731,73	658.557,90			0,00	0%	900,00	100%	-	-	0%	658.557,90	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEC
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS

CONTRATADA
OBRA

ALPER ENERGIA S.A

EFICIENTIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

PERÍODO
CIDADE


25 DE AGOSTO DE 2020 À 30 DE SETEMBRO DE 2020
CAMPINA GRANDE/PB

3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE OBRAS Nº 2.08.020/2020 - SECOP/PMCG - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032.020/2020/CP/SECOP/PMCG

QUANTIDADES					QUANTIDADES REALIZADAS										
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	P.UNIT.	S-TOTAL	Acum.	Medido no	Acum.	Saldo	Valor do	Acum. Período	Saldo			
						Anter.	Período	período		Quant.	%		Quant.	%	Período
1.6	Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot. anti vandalismo contra impacto IK09, 249Watts, 31500Lumens, 4000K, IRC>70, base p/ relê fotocélula/telegestão 7PIN, corpo alum injet. pint. políester a pó. 220V IP66 vida útil 100 mil horas	un	100	934,04	93.403,96			0,00	0%		100,00	100%	-	0%	93.403,96
2	PROJETORES LED				303.328,56								Certifico que os materiais ou serviços constantes do presente recibo foram entregues e aceitos recebidos ou prestados		
2.1	Projeto à LED, IP 67, perfil de alumínio extrudado, com 36 LED's de alta potência (1,2W/LED), com lentes de abertura de 30°, ref. CHROMADEL RGB ou similar	un	60	2.886,13	173.167,92			0,00	0%		60,00	100%	-	0%	173.167,92
2.2	Refletor simples LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	200	174,40	34.880,00			0,00	0%		200,00	100%	-	0%	34.880,00
2.3	Refletor LED Ultra 500W, chip Led CREE drive MEANWELL Proteção IP67, Voltagem AC 100-240V, temp de cor branco frio 5000K, vida útil 60.000h, da Leox ou similar	un	50	1.905,61	95.280,64			0,00	0%		50,00	100%	-	0%	95.280,64
3	CABOS				246.816,25										
3.1	Cabo de alumínio 0,6/1kv multiplexados 1x1x16 + 16mm²	m	4.000	1,92	7.680,00	555,00	1.260,00	1.815,00	45%	2.185,00	2.419,20	3.484,80	45%		4.185,20
3.2	Cabo de alumínio 0,6/1kv multiplexados 3x1x16 + 16mm²	m	6.000	3,86	23.148,00	1.080,00		1.080,00	18%	4.920,00	-	4.166,64	18%		18.981,36
3.3	Cabo de alumínio 0,6/1kv multiplexados 3x1x25 + 25mm²	m	21.000	6,32	132.678,00			0,00	0%	21.000,00	100%	-	0%		132.678,00

Rafael Gomes Leite
Engenheiro Civil
CPF 062.483.244-92
CREA 1614297940

Carlos Lavina Sanjar
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187708-01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEC
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS

CONTRATADA
OBRA

ALPER ENERGIA S.A
EFICIENTE, AO, MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

PERÍODO
CIDADE

25 DE AGOSTO DE 2020 À 30 DE SETEMBRO DE 2020
CAMPINA GRANDE/PB

3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE OBRAS Nº 2.08.020/2020 - SECOP/PMCG - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032.020/2020/CP/SECOP/PMCG

		QUANTIDADES				QUANTIDADES REALIZADAS									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	P. UNIT.	S-TOTAL	Acum.	Medido no período	Acum. período	Quant.	%	Quant.	%	Valor do período	Acum. Período	Saldo
3.4	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	20.000	0,96	19.100,00	9.612,00	4.401,00	14.013,00	70%	5.987,00	30%	4.202,96	13.382,42	70%	5.717,58
3.5	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	6.000	1,37	8.220,00			0,00	0%	6.000,00	100%	-		0%	8.220,00
3.6	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	5.000	1,88	9.375,00			0,00	0%	5.000,00	100%	-		0%	9.375,00
3.7	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	4.000	3,01	12.020,00			0,00	0%	4.000,00	100%	-		0%	12.020,00
3.8	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	3.000	4,61	13.830,00			0,00	0%	3.000,00	100%	-		0%	13.830,00
3.9	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	M	2.000	7,72	15.444,00			0,00	0%	2.000,00	100%	-		0%	15.444,00

Rafael Gomes Leite
Engenheiro Civil
CPF 082.483.244-92
CREA 1614297-9/00

Carlos Davini Sanjar
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187708-01

Em, 05/10/2020

Genildo da Silva Oliveira - Engenheiro
CREA 1601438729 - MAT 216051-PIM/O/CEC08


Certifico que os materiais ou serviços constantes do presente recibo foram integralmente recebidos ou prestados

Rafael
Engenheiro Civil
CPF 062.483.244-92
CREA 16142971-00

Carlos
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187708-01

Genildo da Silva
Engenheiro
CREA 16014387-29

Certifico que os materiais ou serviços constantes do presente recibo foram integralmente recebidos ou prestados
Em, 05/10/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEC
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS

CONTRATADA
OBRA


ALPER ENERGIA S.A
EFICIENTE, AO, MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

PERÍODO
CIDADE

25 DE AGOSTO DE 2020 À 30 DE SETEMBRO DE 2020
CAMPINA GRANDE/ PB

3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE OBRAS Nº 2.08.020/2020 - SECOP/PMCG - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032.020/2020/CPL/SECOP/PMCG

QUANTIDADES			QUANTIDADES REALIZADAS									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	P.UNIT.	S-TOTAL	Acum.	Medido no	Acum.	Saldo	Valor do	Acum. Período	Saldo
						Anter.	Período	Quant.	Quant.	%	Período	Valor
3.10	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	M	500	10,64	5.321,25			0,00	500,00	0%		5.321,25
4	RELE FOTOELETRICO				105.694,05							
4.1	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	8.500	10,67	90.731,55	844,00	426,00	1.270,00	7.230,00	85%		77.175,19
4.2	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UN	2.500	5,99	14.962,50	56,00		56,00	2.444,00	2%		14.627,34
5	POSTES METALICOS				806.584,40							
5.1	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM	UN	100	392,86	39.286,00	17,00	1,00	18,00	82,00	82%		32.214,52
5.2	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPL0, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM	UN	100	538,65	53.865,00			0,00	100,00	100%		53.865,00
5.3	800/100 - 5030-J-GF cônico contínuo reto, diâmetro superior de 60,3mm, diâmetro da base 114,3mm, altura total 10m, com base de fixação, Shomei	un	200	693,94	138.787,00			0,00	200,00	100%		138.787,00
5.4	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior de 76mm, diâmetro da base 208mm, altura total 12m, com base de fixação, Conipost ref. Série 3012B/JG+CH, classe 100 da Conipost ou similar	un	450	1.276,99	574.646,40	7,00		7,00	443,00	98%		565.707,46
6	POSTES CONCRETO				136.562,16							
6.1	POSTE DE CONCRETO DUPL0 T, TIPO B, 300 KG, H = 10 M (NBR 8451)	UN	30	433,66	13.009,68			0,00	30,00	100%		13.009,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEC
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS

CONTRATADA
OBRA

ALPER ENERGIA S.A
EFICIENTE, AO, MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE


PERÍODO
CIDADE

25 DE AGOSTO DE 2020 À 30 DE SETEMBRO DE 2020
CAMPINA GRANDE/PB

3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE OBRAS Nº 2.08.020/2020 - SEC0B/PMCG - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032.020/2020/CPL/SEC0B/PMCG

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADES				QUANTIDADES REALIZADAS									
		UND	QUANT	P UNIT.	S-TOTAL	Acum.	Medido no período	Acum. período	Quant.	%	Quant.	%	Valor do período	Acum. Período	Saldo
7.8	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	700	32,03	22.417,50	24,00		24,00	3%		676,00	97%	-	768,60	3%
7.9	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMÍNIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)	UN	820	2,80	2.291,90	39,00	66,00	105,00	13%		715,00	87%	184,47	293,48	13%
7.10	CONCRETO PARA RECOMPOSIÇÃO DE PISO ACIMENTADO E/OU ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTOS	m³	15	356,10	5.341,56	2,56		2,56	17%		12,44	83%	Certifico que os materiais ou serviços constantes do presente recibô foram integralmente recebidos ou prestados Em, 05/10/2020		
7.11	SERVIÇO DE RETROSCAVADEIRA PARA NIVELAMENTO DE TERRENO OU REMOÇÃO DE ÁREA	CHI	200	22,98	4.595,00			0,00	0%		200,00	100%	Gerido da Silva Oliveira Engenharia 4.595,00 CREA 1601438729 - Matr 21038-PMCG/SEC0B		
7.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30 X 30	UN	700	23,89	16.726,29	4,00		4,00	1%		696,00	99%	-	95,58	1%
7.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 40 X 40	UN	60	43,27	2.596,19			0,00	0%		60,00	100%		-	0%
7.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSÃO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	25	64,42	1.610,40			0,00	0%		25,00	100%	Carlos Larini Sanjar Diretor CREA 5061075872 CREA 282.187708-01		
7.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *22* A, TENSÃO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	10	78,99	789,90			0,00	0%		10,00	100%		-	0%

Rafael Carlos Leitão
Diretor Civil
CPF 000.483.244-92
CREA 161438729



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEC
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS

CONTRATADA
OBRA

ALPER ENERGIA S.A
EFICIENTE, AO, MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

PERÍODO
CIDADE

25 DE AGOSTO DE 2020 À 30 DE SETEMBRO DE 2020
CAMPINA GRANDE/PB

3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE OBRAS Nº 2.08.020/2020 - SECOP/PMCG - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032.020/2020/CPL/SECOP/PMCG


		QUANTIDADES					QUANTIDADES REALIZADAS									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	P. UNIT.	S-TOTAL	Acum.	Medido no	Acum.	Saldo		Valor do		Acum. Período		Saldo	
						Anter.	Período	Quant.	%	Quant.	%	Período	Valor	Valor	Valor	
7.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *38* A, TENSÃO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	35	166,40	5.823,93			0,00	0%	35,00	100%	-	-	0%	5.823,93	
7.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSÃO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	50	318,06	15.903,00			0,00	0%	50,00	100%	Certifico que os materiais ou serviços constantes do presente recibo foram integralmente recebidos ou prestados				
7.18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 95 A, TENSÃO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	40	632,94	25.317,60			0,00	0%	40,00	100%	Em 05/10/2020				
7.19	Conector ampact para cabo 35mm2 CADC 405 (ou similar)	un	1.800	10,54	18.964,80			0,00	0%	1.800,00	100%	-	-	0%	18.964,80	
7.20	Conector ampact para cabo 70mm2 CADC 401 (ou similar)	un	980	47,17	46.222,68			0,00	0%	980,00	100%	-	-	0%	46.222,68	
7.21	Conector cunha II série verde	un	900	1,98	1.782,00	900,00		900,00	100%	-	0%	-	1.782,00	100%	-	
7.22	Forneimento de luminária completa para iluminação pública - 70w - Vapor Sódio	und	700	223,40	156.380,00			0,00	0%	700,00	100%	-	-	0%	156.380,00	
7.23	Forneimento de luminária completa para iluminação pública - 150w - Vapor Sódio	UND	500	236,50	118.248,00			0,00	0%	500,00	100%	-	-	0%	118.248,00	
7.24	Suporte em tubo de aço galvanizado para fixação de luminária 01 pétala (Fael Luce, ref. Mira VTP ou similar) Suporte em tubo de aço galvanizado para fixação de luminária Fael Luce, ref. Mira VTP, 01 pétala	un	1.100	90,25	99.272,25			0,00	0%	1.100,00	100%	Carlos Lavini Sanjar Diretor CREA 5061075872 CPF: 282.187708-01				
7.25	Suporte em tubo de aço galvanizado para fixação de luminária 02 pétalas (Fael Luce, ref. Mira VTP ou similar) Suporte em tubo de aço galvanizado para fixação	un	980	106,27	104.146,56			0,00	0%	980,00	100%	-	-	0%	104.146,56	

Rafael Gomes de Lenc
Engenheiro Civil
CPF: 062.483.244-92
CREA 1614297940

Carlos Lavini Sanjar
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187708-01

100%
Gerido da Sma Oprea-Engenharia
CREA 1601438729
Nº 21058-PMCG/SECOPB

Certifico que os materiais ou serviços
constantes do presente recibo foram
integralmente recebidos ou prestados
Em 05/10/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEC
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS

CONTRATADA
OBRA
CIDADE


ALPER ENERPIA S.A
EFICIENTIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE
25 DE AGOSTO DE 2020 À 30 DE SETEMBRO DE 2020
CAMPINA GRANDE/PB

3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE OBRAS Nº 2.08.020/2020 - SECOP/PMCG - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032.020/2020/CP/SECOP/PMCG

QUANTIDADES										QUANTIDADES REALIZADAS									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	P.UNIT.	S-TOTAL	Acum.	Medido no período	Acum. período	Quant.	%	Saldo	Quant.	%	Valor do período	Acum. Período	%	Valor		
7.26	suporte em tubo de aço galvanizado para fixação de luminária 03 pétalas (Fael Luce - ref. Mira VTP ou similar) Suporte em tubo de aço galvanizado para fixação de luminária 04 pétalas (Fael Luce - ref. Mira VTP ou similar) Suporte em tubo de aço galvanizado para fixação	un	550	125,32	68.923,80			0,00	0,00	0%	550,00	100%	100%	68.923,80		68.923,80			
7.27	fixação de luminária 04 pétalas (Fael Luce - ref. Mira VTP ou similar) Suporte em tubo de aço galvanizado para fixação	un	200	142,36	28.471,50			0,00	0,00	0%	200,00	100%	100%	28.471,50		28.471,50			
7.28	Suporte metálico para fixação de projetor SUPORTE METÁLICO PARA FIXAÇÃO DE PROJETOR	un	160	10,92	1.747,20			0,00	0,00	0%	160,00	100%	100%	1.747,20		1.747,20			
8	CHAVA MAGNÉTICA				86.192,13														
8.1	CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR MONOFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	250	63,99	15.997,50			0,00	0,00	0%	250,00	100%	100%	15.997,50		15.997,50			
8.2	CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	250	125,48	31.370,63			0,00	0,00	0%	250,00	100%	100%	31.370,63		31.370,63			
8.3	Fornecimento de Chave magnetica de 2 x 60A para comando de iluminação pública, acionada por relé fotoelétrico NA, 220V, 60Hz	und	100	388,24	38.824,00	4,00		4,00	4%	96%	96,00		96%	1.552,96		37.271,04			
9	ELETRODUTOS				74.751,05														
9.1	Eletroduto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/2", tipo Kanalex ou similar	m	6.000	3,80	22.770,00			0,00	0%	0%	6.000,00	100%	100%	-	-	22.770,00			
9.2	Eletroduto corrugado flexível em PEAD Ø = 2", tipo Kanalex ou similar	m	6.000	2,95	17.721,00	40,00		40,00	1%	99%	5.960,00		99%	118,14	1%	17.602,86			
9.3	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	M	4.000	1,37	5.478,00			0,00	0%	0%	4.000,00	100%	100%	-	-	5.478,00			
9.4	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	M	4.000	2,14	8.558,00			0,00	0%	0%	4.000,00	100%	100%	-	-	8.558,00			

Rafael G. Silva
Engenheiro Civil
CPF: 062.483.444-62
CREA 164.1297940

Carlos Lavín Sanjar
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187708-01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEC
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS

CONTRATADA
OBRA

ALPER ENERGIA S.A
EFICIENTIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

PERÍODO
CIDADE

25 DE AGOSTO DE 2020 À 30 DE SETEMBRO DE 2020
CAMPINA GRANDE/PB

3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE OBRAS Nº 2.08.020/2020 - SECOP/PMCG - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032.020/2020/CP/PMCG

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADES				QUANTIDADES REALIZADAS									
		UND	QUANT	P.UNIT.	S-TOTAL	Acum.	Medido no período	Acum. período	%	Quant.	%	Saldo	Valor do período	Acum. Período	Saldo
9.5	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	M	1.500	2,85	4.273,50			0,00	0%	1.500,00	100%	-	-	-	4.273,50
9.6	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA	M	150	5,12	767,25	2,00		2,00	1%	148,00	99%	-	10,23	10,23	757,02
9.7	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2", SEM LUVA	M	100	7,46	746,35			0,00	0%	100,00	100%	-	-	-	746,35
9.8	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m	un	100	41,97	4.196,50			0,00	0%	100,00	100%	-	-	-	4.196,50
9.9	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m	un	100	52,91	5.291,00			0,00	0%	100,00	100%	-	-	-	5.291,00
9.10	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/2" x 3m	un	100	49,49	4.949,45			0,00	0%	100,00	100%	-	-	-	4.949,45
10	EQUIPE TÉCNICA				511.466,42										
10.1	Equipe técnica de apoio	Mês	12	42.622,20	511.466,42	2,00	0,33	2,33	19%	9,67	81%	14.234,57	99.478,97	19%	411.987,45
11	VEICULO LEVE				12.714,10										
11.1	Veiculo de Fiscalização	Mês	12	1.059,51	12.714,10	2,00	0,33	2,33	19%	9,67	81%	353,84	2.472,86	19%	10.241,24
12	EQUIPE E VEÍCULOS OPERACIONAIS				1.380.061,67										
12.1	EQUIPES OPERACIONAIS E EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS	Mês	12	115.005,14	1.380.061,67	2,00	0,33	2,33	19%	9,67	81%	38.408,34	268.418,61	19%	1.111.643,06
TOTAL GERAL					9.136.999,22										
BDI 25,84%					2.361.000,60										
TOTAL GLOBAL COM BDI R\$					11.497.999,82										

Importa a presente medição em R\$ 319.999,57 (Trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e sete centavos)


Em, 05/10/2020

Genildo da Silva Junior - Engenheiro
CREA 16014387-23 - Mat. 21056-PMCG/SECOP

Rafael Gomes Leite
Engenheiro Civil
CPF 082.483.244-92
CREA 116142979-40

Carlos Layni Sanjar
Diretor
CPF: 252.107.00-01

932.168,92 319.999,57
319.999,57 9.925.831,77
1.252.168,49 10.245.831,33



OBRA: EFICIENTIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Certifico que os materiais ou serviços constantes do presente recibo foram integralmente recebidos ou prestados

Em, 05/10/2020

Assinatura


DISCRICÃO DOS SERVIÇOS

QUANTIDADES - QUANT

Assinatura do Responsável Técnico

Assinatura do Responsável Administrativo

3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE OBRAS Nº 2.08.020/2020 - SECOP/PMCG - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032.020/2020/CPL/SECOP/PMCG			
ITEM	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADES - QUANT	
1	LUMINÁRIA LED		
1.1	5000K, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar	un	296,00
1.2	Luminária em LED para iluminação pública, 80W, bivolt, Selo A Imetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000K, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar	un	60,00
1.3	Luminária em LED para iluminação pública, 120W, bivolt, Selo A Imetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000K, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar	un	57,00
1.4	Luminária em LED para iluminação pública, 150W, bivolt, Selo A Imetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000K, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar	un	13,00
1.5	Luminária em LED para iluminação pública, 180W, bivolt, Selo A Imetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000K, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 120 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar	un	
1.6	Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot. anti vandalismo contra impacto IK09, 249Watts, 31500Lumens, 4000K, IRC>70, base p/ relé fotocélula/telegestão 7PIN, corpo alum injet. pint. poliéster a pó. 220V IP66 vida útil100 mil horas	un	
2	PROJETORES LED		
2.1	Projektor à LED, IP 67, perfil de alumínio extrudado, com 36 LED's de alta potência (1,2W/LED),com lentes de abertura de 30°, ref. CHROMADEL RGB ou similar	un	
2.2	Refletor simples LED 150W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	un	
2.3	Refletor LED Ultra 500W, chip Led CREE drive MEANWELL Proteção IP67, Voltagem AC 100-240V, temp de cor branco frio 5000K, vida útil 60.000h, da Leox ou similar	un	
3	CABOS		
3.1	Cabo de alumínio 0,6/1kv multiplexados 1x1x16 +16mm²	m	1.260,00
3.2	Cabo de alumínio 0,6/1kv multiplexados 3x1x16 +16mm²	m	
3.3	Cabo de alumínio 0,6/1kv multiplexados 3x1x25 +25mm²	m	
3.4	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	4.401,00
3.5	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	
3.6	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	
3.7	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	
3.8	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	
3.9	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	
3.10	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	
4	RELE FOTOELETRICO		
4.1	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	426,00
4.2	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UN	
5	POSTES METÁLICOS		
5.1	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM	UN	1,00



OBRA: EFICIENTIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE OBRAS Nº 2.08.020/2020 - SECOB/PMCG - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032.020/2020/CPL/SECOB/PMCG

ITEM	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADES	
		UND	QUANT
5.2	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPL0, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM	UN	
5.3	total 10m, com base de fixação, Shomei iluminação ou similar	UN	
5.4	Poste de aço galvanizado comico contínuo reto, diâmetro superior de 70mm, diâmetro da base 200mm, altura total 12m, com base de fixação,	un	
6	POSTES CONCRETO	un	
6.1	POSTE DE CONCRETO DUPL0 T, TIPO B, 300 KG, H = 10 M (NBR 8451)	UN	
6.2	POSTE DE CONCRETO DUPL0 T, TIPO B, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451)	UN	
6.3	POSTE DE CONCRETO DUPL0 T, TIPO D, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451)	UN	
6.4	Poste concreto duplo T (DT) 9/150	un	18,00
6.5	Poste concreto duplo T (DT) 10/ 300	un	
6.6	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 11 M (NBR 8451)	UN	
6.7	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 14 M (NBR 8451)	UN	
7	SUPORTE E BRAÇOS E COMPONENTES ELÉTRICOS	UN	
7.1	Braço para luminária padrão energisa 1 1/2" x 2.00m, Galvanizado a fogo	und	264,00
7.2	Braço para luminária padrão energisa 2" x 3.00m, Galvanizado a fogo	UND	60,00
7.3	Suporte de luminária tipo mod- Delta em tubo de ferro de 2", galvanizado a fogo, tipo delta para duas luminária com lateral de 2 metros	und	
7.4	Suporte de luminária tipo mod- Delta em tubo de ferro de 2", galvanizado a fogo, tipo delta para duas luminária com lateral de 3 metros	und	
7.5	Cruzeta de concreto tipo T 1900 mm	Un	
7.6	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	677,00
7.7	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM	UN	677,00
7.8	CONECTOR DE ALUMINIO EM ACO COM 0,50" DE COMPRIMENTO E DN = 30, REVESTIDA COM BRANCA CAMADA DE COBRE, COM	UN	
7.9	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)	UN	66,00
7.10	CONCRETO PARA RECOMPOSIÇÃO DE PISO ACIMENTADO E/OU ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTOS	m³	
7.11	SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA PARA NIVELAMENTO DE TERRENO OU REMOÇÃO DE AREIA	CHI	
7.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA 30 X 30	UN	
7.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA 40 X 40	UN	
7.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSÃO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	
7.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 22 A, TENSÃO NOMINAL DE 220 V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	
7.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 30 A, TENSÃO NOMINAL DE 200 V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	
7.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 50 A, TENSÃO NOMINAL DE 200 V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	
7.18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 95 A, TENSÃO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	
7.19	Conector ampact para cabo 35mm2 CADC 405 (ou similar)	un	
7.20	Conector ampact para cabo 70mm2 CADC 401 (ou similar)	un	
7.21	Conector cunha II série verde	un	
7.22	Fornecimento de luminária completa para iluminação pública - 70w - Vapor Sódio	und	
7.23	Fornecimento de luminária completa para iluminação pública - 150w - Vapor Sódio	UND	

Carlos Daniel Sanjar
Diretor
CREA 506107591/2
CPF: 282.187708-01

Engenheiro Civil
CPF 062.483.244-92
CREA 1614297940



OBRAS: EFICIENTIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE OBRAS Nº 2.08.020/2020 - SECOP/PMCG - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032.020/2020/CPL/SECOP/PMCG

ITEM	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADES	
		UND	QUANT
7.24	Suporte em tubo de aço galvanizado para fixação de luminária de pétaia (ref. LUCE, ref. Mira VTP ou similar) suporte em tubo de aço galvanizado	un	
7.25	Suporte em tubo de aço galvanizado para fixação de luminária de pétaia (ref. LUCE, ref. Mira VTP ou similar) suporte em tubo de aço galvanizado	un	
7.26	Suporte em tubo de aço galvanizado para fixação de luminária de pétaia (ref. LUCE, ref. Mira VTP ou similar) suporte em tubo de aço galvanizado	un	
7.27	Suporte em tubo de aço galvanizado para fixação de luminária de pétaia (ref. LUCE, ref. Mira VTP, 04 pétaia)	un	
7.28	Suporte metálico para fixação de projetor SUPORTE METÁLICO PARA FIXAÇÃO DE PROJETOR	un	
8	CHAVA MAGNÉTICA		
8.1	CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR MONOFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	
8.2	CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	
8.3	Fornecimento de Chave magnetica de 2 x 60A para comando de iluminação pública, acionada por relé fotoelétrico NA, 220V, 60Hz	und	
9	ELETRODUTOS		
9.1	Eletroduto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/2", tipo Kanalex ou similar	m	
9.2	Eletroduto corrugado flexível em PEAD Ø = 2", tipo Kanalex ou similar	m	
9.3	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	M	
9.4	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	M	
9.5	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	M	
9.6	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA	M	
9.7	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2", SEM LUVA	M	
9.8	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m	un	
9.9	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m	un	
9.10	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/2" x 3m	un	
10	EQUIPE TÉCNICA		
10.1	Equipe técnica de apoio	Mês	0,33
11	VEICULO LEVE		
11.1	Veiculo de Fiscalização	Mês	0,33
12	EQUIPE E VEÍCULOS OPERACIONAIS		
12.1	EQUIPES OPERACIONAIS E EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS	Mês	0,33

Certifico que os materiais ou serviços constantes do presente recibô foram integralmente recebidos ou prestados


Em, 05/10/2020

Engenheiro Civil
CPF 062.483.244-92
CREA 16142979-40

Engenheiro
CPF 062.483.244-92
CREA 16142979-40

Carlos Lavini Sanjar
Diretor
CPF: 282.187708-01


AV. DINAMERICA



Certifico que os materiais ou serviços constantes do presente recibo foram integralmente recebidos ou prestados

Em, 05 / 10 / 20

Genildo da Silva Oliveira Engenheiro
CREA 1001438729 - MTD 20088-PMC/SECOB




Rafael Soares Leite
Engenheiro Civil
CPF 062.483.244-92
CREA 1614297940


Carlos Lavini Sanjar
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187708-01

AV. JUSCELINO KUBITSCHCK



Certifico que os materiais ou serviços constantes do presente recibo foram integralmente recebidos ou prestados





Em, 05 / 10 / 20

Gonildo da Silva Oliveira - Engenheiro
CREA 1601438729 - N° 1858-PMCG/SEC08

Rafael Carlos Leite
Engenheiro Civil
CPF 062.483.244-92
CREA 1614297940


Carlos Lavini Sanjar
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282187708-01

AV. RONALDO JOSÉ DA CUNHA LIMA

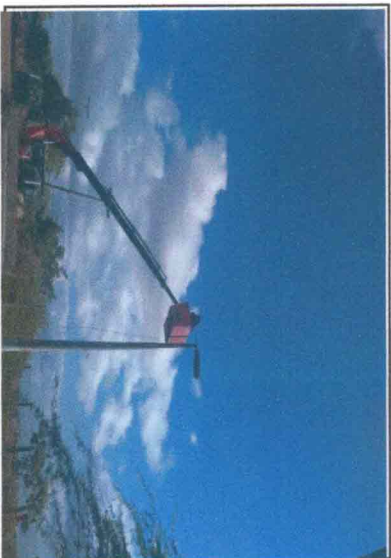

Certifico que os materiais ou serviços
constantes do presente recibo foram
integralmente recebidos ou prestados
Em, 05 / 10 / 20 20



Genildo da Silva Oliveira - Engenheiro
CREA 1601438729 - PMCG/SECOB






Rafael Soares Leal
Engenheiro Civil
CPF 062.483.244-92
CREA 1614297940


Carlos Lavini Sanjar
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187708-01

COMPLEXO PLINIO LEMOS

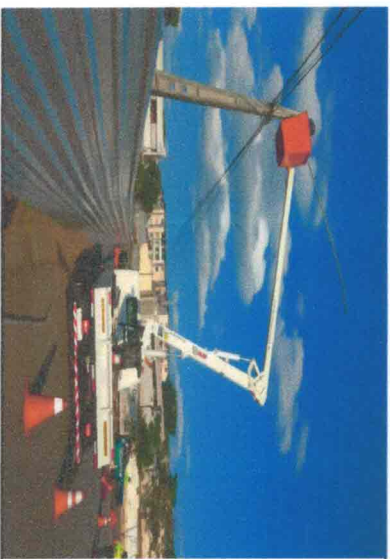


Certifico que os materiais ou serviços
constantes do presente recibo foram
integralmente recebidos ou prestados
Em, 05 / 10 / 2020

Genildo da Silva Oliveira-Engenheiro
CREA 1601436/29-Mat 21068-PMC/SECOB




Rafael Soares Lemos
Engenheiro Civil
CPF 062.483.244-92
CREA 1614297940


Carlos Takini Sanjar
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187708-01

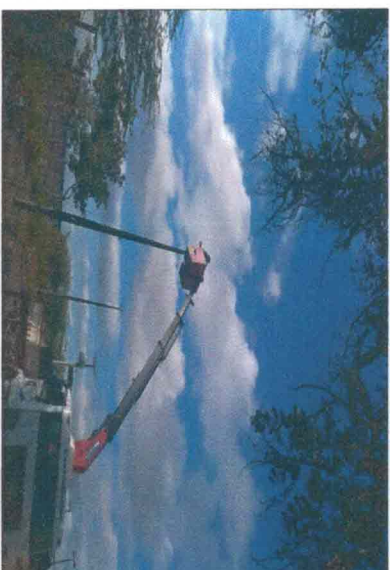GINÁSIO O MENINÃO





Certifico que os materiais ou serviços constantes do presente recibo foram integralmente recebidos ou prestados Em, 05 / 10 / 20 20

Genildo da Silva Oliveira - Engenheiro
CREA 1601436729 - NRE 21058-PMCG/SEC08

Rafael
Engenheiro Civil
CPF 062.483.244-92
CREA 1614297940

Carlos Lawini Sanjar
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187708-01

PARQUE DA CRIANÇA





Certifico que os materiais ou serviços
constantes do presente recibo foram
integralmente recebidos ou prestados
Em, 05/10/2020

Genildo da Silva Oliveira - Engenheiro
CREA 16014387/29 - Mdt 21058-PMC/SECCB


Rafael Soares Leão
Engenheiro Civil
CPF: 062.483.244-92
CREA 1614297940


Carlos Lauro Sanjar
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187708-01

RUA ANTONIETA CAVALCANTE

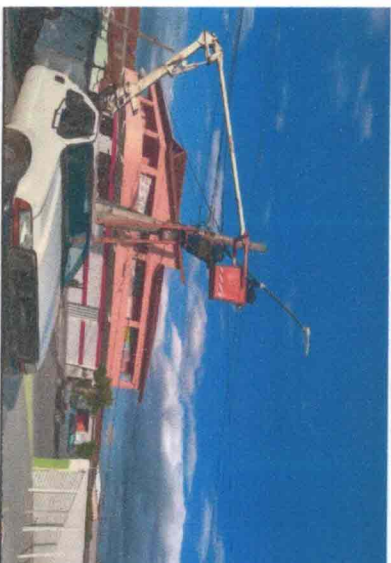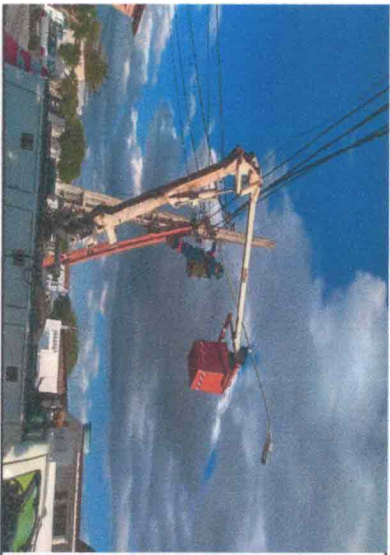

Certifico que os materiais ou serviços constantes do presente recibo foram integralmente recebidos ou prestados

Em, 05 / 10 / 20 20






Genildo da Silva Oliveira - Engenheiro
CREA 1601438729 - MA/AM58-FMCG/CELO

Carlos Lavini Sanjar
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187708-01

Rafael Lopes Leiva
Engenheiro Civil
CPF 062.483.244-92
CREA 1614297940

Carlos Lavini Sanjar
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187708-01



RUA ANTÔNIO TELHA

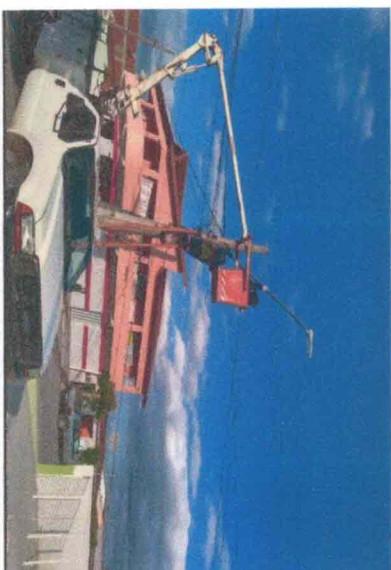



Roberto dos Reis Leal
Engenheiro CIVIL
CPF 062.483.244-92
CREA 1614297940

Carlos Lavini Sanjar
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187708-01

RUA ARROJADO LISBOA



Certifico que os materiais ou serviços
constantes do presente recibo foram
integralmente recebidos ou prestados
Em, 05 / 10 / 20
Genildo da Silva Oliveira-Engenheiro
CREA 1601438729 TMA 21058-PNCC/STC03



Rafael Lopes Leite
Engenheiro Civil
CPF 062.483.244-92
CREA 1614297940

Carlos Laxini Sanjar
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187708-01


RUA BELARMINO BARBOSA




Certifico que os materiais ou serviços
constantes do presente recibo foram
integralmente recebidos ou prestados

Em, 05 / 10 / 20 20


Genildo da Silva Almeida - Engenheiro
CREA 1601438729 - M21/058-PMCG/SEC08




Genildo da Silva Almeida - Engenheiro Civil
CPF 062.483.244-92
CREA 1614297940


Carlos Leiva Sanjar
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187708-01

RUA CLAUDIO GABINO DE OLIVEIRA

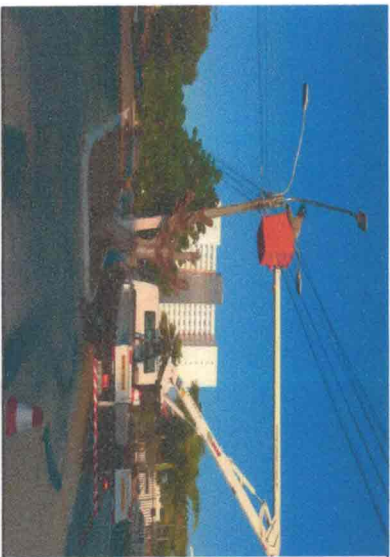

Certifico que os materiais ou serviços
constantes do presente recibo foram
integralmente recebidos ou prestados


Em, 05 / 10 / 20 20

Genildo da Silva Oliveira-Engenheiro
CREA 1601438729 - Matr 27008-PMOC/35003

Assinado por: 
Engenheiro Civil
CPF 062.483.244-92
CREA 1614297940


Carlos Lavini Sanjar
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187708-01

RUA DAMIÃO JOSÉ RODRIGUES

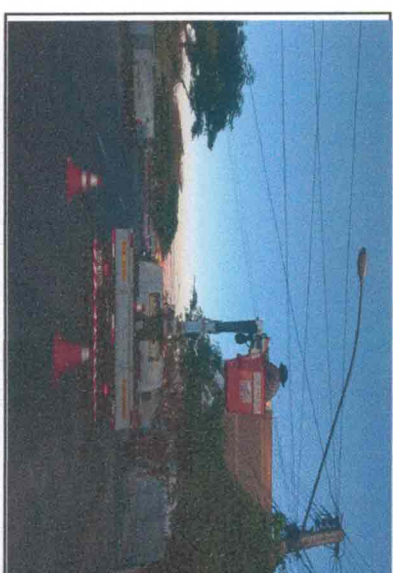

Certifico que os materiais ou serviços
constantes do presente recibo foram
integralmente recebidos ou prestados



Em, 05 / 10 / 20 20

Genildo da Silva Oliveira - Engenheiro
CREA 1601438729 - NRE 0036-PMCG/SECOB


Rafael Gomes Leite
Engenheiro Civil
CPF 062.483.244-92
CREA 1614297940



Carlos Lavini Sanjar
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187708-01

RUA DIOGO COSTA



Certifico que os materiais ou serviços constantes do presente recibo foram integralmente recebidos ou prestados Em, 05 / 10 / 20 20





Carido da Silva Oliveira - Engenheiro
CREA 1601433729 - MDT/0658-PMC/SEC08



Rafael Gomes Leite
Engenheiro Civil
CPF 062.483.244-92
CREA 1614237940

Carlos Lavini Sanjar
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187708-01

RUA DR. ACÁCIO FIGUEIREDO

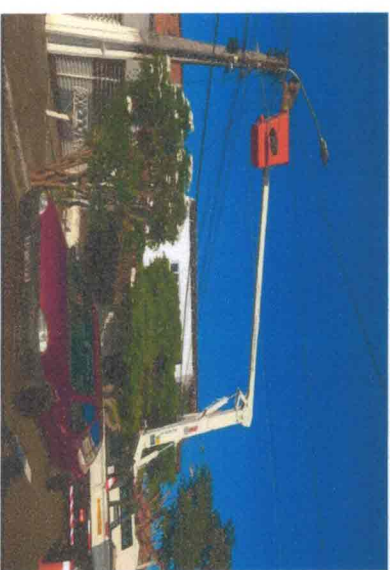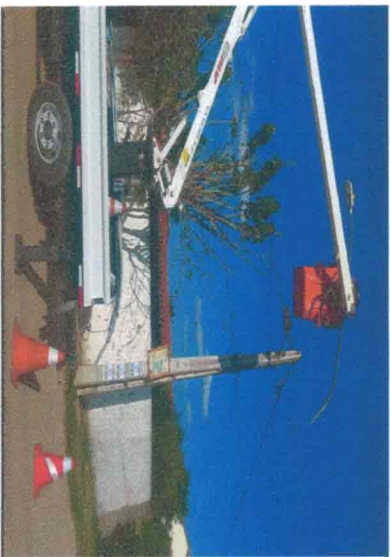




Certifico que os materiais ou serviços
constantes do presente recibo foram
integralmente recebidos ou prestados
Em, 05 / 10 / 2020

Genildo da Silva Oliveira - Engenheiro
CREA 1601438729 - RUA 1058-PMCG/SECOB


Karaci Bonfins Leite -
Engenheiro Civil
CPF 062.483.244-92
CREA 1614297940


Carlos Laviní Sanjar
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187708-01

RUA EUFRASIO CAMARA

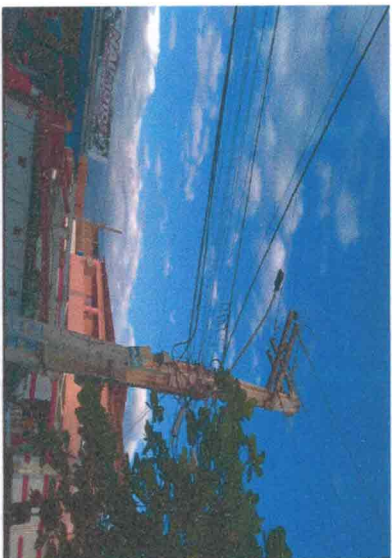



Certifico que os materiais ou serviços
constantes do presente recibo foram
integralmente recebidos ou prestados
Em, 05 / 10 / 2020

Gonildo da Silva Oliveira-Engenheiro
CREA 1601438729 - MPM-058-PMCG/SEC08

Rafael Soares Leite
Engenheiro CIVIL
CPF 062.483.244-92
CREA 1614297940




Carlos Lavini Sanjar
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187708-01

RUA FABIO DE SOUZA OLIVEIRA




Genildo da Silva Oliveira-Engenheiro Civil
CPF 062.483.244-92
CREA 1614297940

RUA EUFRASIO CAMARA

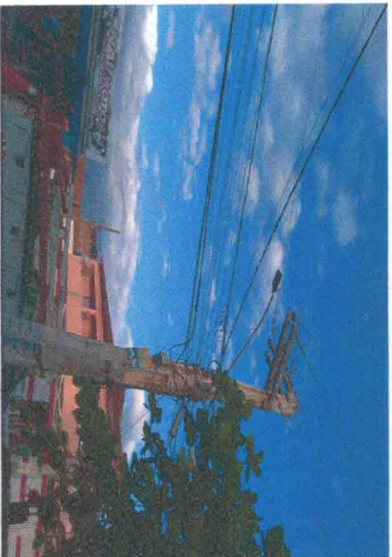



Certifico que os materiais ou serviços
constantes do presente recibo foram
integralmente recebidos ou prestados
Em, 05 / 10 / 20 20

Genildo da Silva Oliveira - Engenheiro
CREA 1601433729 / M68-PMC/SEC08

Rafael
Engenheiro Civil
CPF 062.483.244-92
CREA 1614297940

Carlos Lavini Sanjar
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187708-01


RUA FABIO DE SOUZA OLIVEIRA




Rafael de Jesus Lima
Engenheiro Civil
CPF: 062.483.244-92
CREA 1614297940


Carlos Lavini Sanjar
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187708-01

RUA FRANCISCO CALIXTO

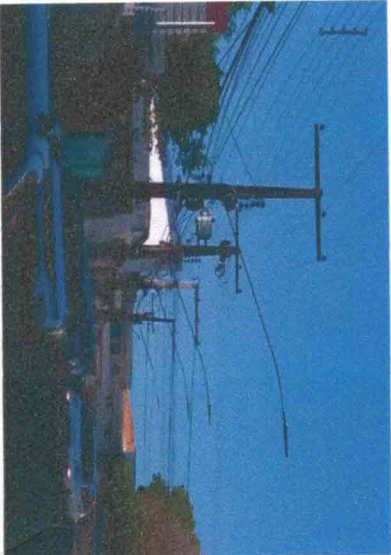


Certifico que os materiais ou serviços constantes do presente recibo foram integralmente recebidos ou prestados Em, 05 / 10 / 20 20

Genildo da Silva Oliveira-Engenheiro
CREA 1601436729 - MEX/2058-PMC/SECOB

Rafael Leite
Engenheiro Civil
CPF 062.483.244-92
CREA 1614297940

Carlos Sanjar
Diretor
CPF 5061075872
CREA 5061075872
CPF: 282.187708-01

RUA FRANCISCO MARIA DE OLIVEIRA

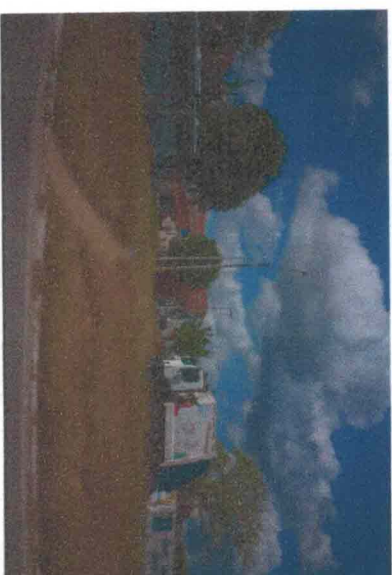




Certifico que os materiais ou serviços
constantes do presente recibo foram
integralmente recebidos ou prestados
Em, 05/10/2020

Genildo da Silva Oliveira-Engenheiro
CREA 1601438729 - MEX/M058-PMC/SEC08


Carlos Lavini Sanjar
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187708-01


Carlos Lavini Sanjar
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187708-01

RUA HUMBERTO BATISTA LIMA

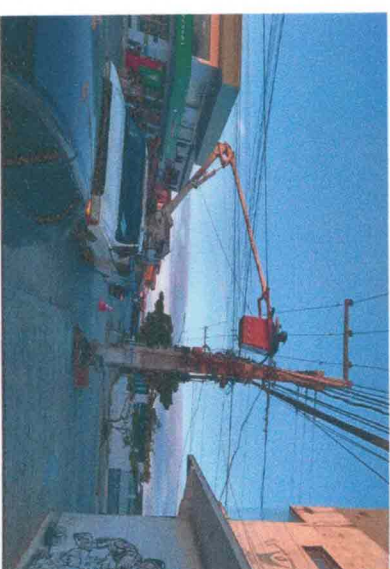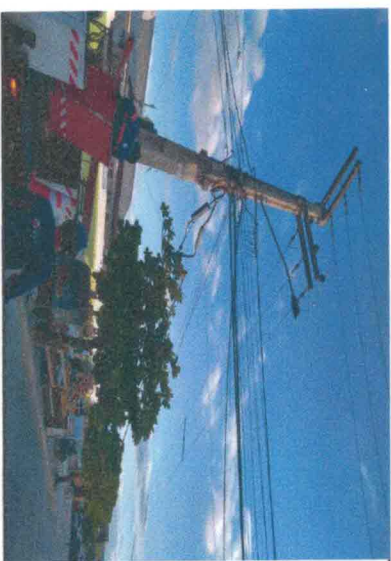
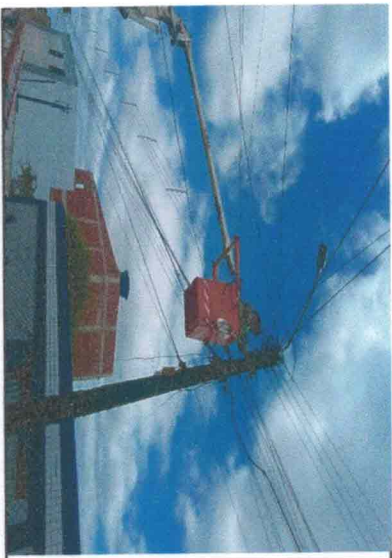


Certifico que os materiais ou serviços
constantes do presente recibo foram
integralmente recebidos ou prestados
Em, 05 / 10 / 20 20
Genildo da Silva Oliveira - Engenheiro
CREA 1601438729 - M645058-PMCG/SEC08

Rafael Gomes Leite
Engenheiro Civil
CPF: 062.483.244-52
CREA 1814237940

Carlos Lavini Sanjar
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187708-01

RUA JOÃO FLORENTINO DE CARVALHO

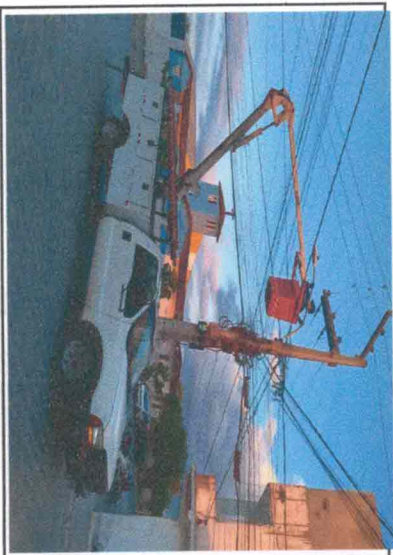

Atesto que os materiais ou serviços
constantes do presente recibo foram
integralmente recebidos ou prestados
Em, 05 / 10 / 20 20




Rui da Silva Oliveira - Engenheiro
CREA 161430/29 - MAT 47008-PMCG/SEC08

Rui da Silva Oliveira - Engenheiro
CREA 161430/29 - MAT 47008-PMCG/SEC08

Rui da Silva Oliveira - Engenheiro
CREA 161430/29 - MAT 47008-PMCG/SEC08


Carlos Lavini Sanjar
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187708-01

RUA JOSE LINS DO REGO

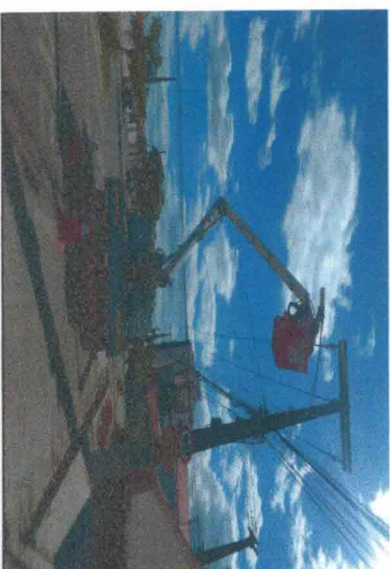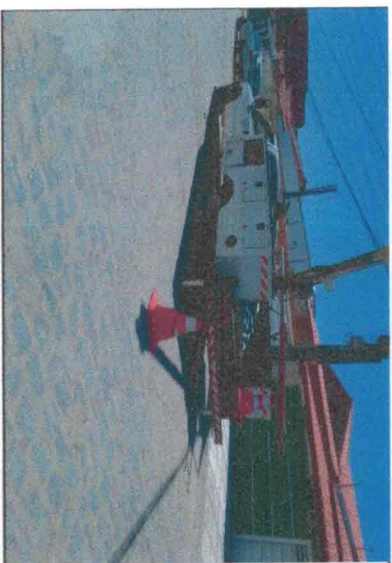

Certifico que os materiais ou serviços
constantes do presente recibo foram
integralmente recebidos ou prestados
Em, 05 / 10 / 20 20





Genildo da Silva Oliveira - Engenheiro
CREA 1601438729 - Matr. 21058-PMCG/SEC08




Carlos Cavini Sanjar
Engenheiro Civil
CPF 082.483.244-92
CREA 1514297940


Carlos Cavini Sanjar
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187708-01


RUA LUIZA BEZERRA MOTA

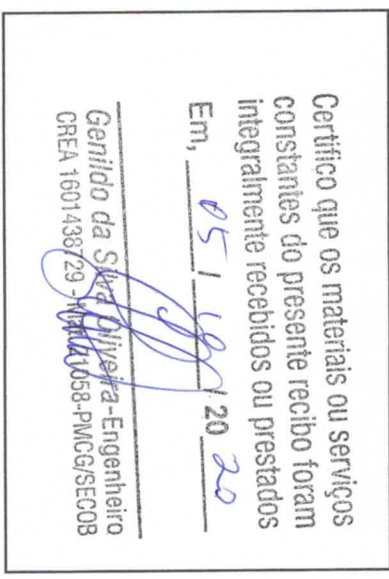


Rafael Gomes Leite
Engenheiro Civil
CPF 062.483.244-92
CREA 1614237949



Carlos Lavini Sanjar
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187708-01

RUA NASINHA GOES DE ALBUQUERQUE



Certifico que os materiais ou serviços
constantes do presente recibo foram
integralmente recebidos ou prestados
Em, 05 / 10 / 20 20



Genildo da Silva Oliveira-Engenheiro
CREA 1601438/29 MAT 21058-PMCG/SECOB




Rafael Borges Leite
Engenheiro Civil
CPF 062.483.244-92
CREA 1614297945


Carlos Lavini Sanjar
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187708-01

RUA NILO PEÇANHA

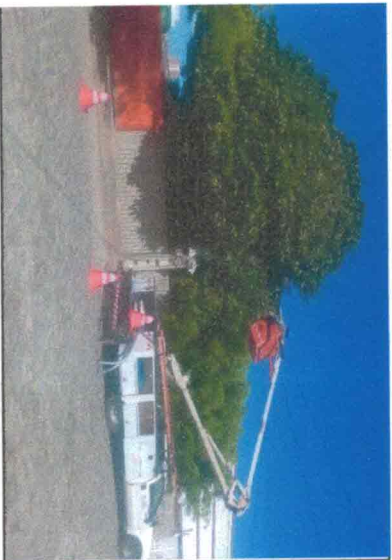

Certifico que os materiais ou serviços
constantes do presente recibo foram
integralmente recebidos ou prestados

Em, 05 / 10 / 20 20

Conício da Silva Oliveira - Engenheiro
CREA 1031430/29 - MDT 0058-PMCG/SEC08


Rafael Borges Leite
Engenheiro Civil
CPF: 062.483.244-92
CREA 1614297949


Carlos Lavini Sanjar
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187708-01

RUA OLEGARIO MACIEL



Certifico que os materiais ou serviços
constantes do presente recibo foram
integralmente recebidos ou prestados


Em, 05 / 10 / 20

Gonildo da Silva Oliveira-Engenheiro
CREA 1601438729 (MTR/1068-PMCG/SECOB)


Rafael Gomes Leão
Engenheiro Civil
CPF 062.483.244-92
CREA 1614297940


Carlos Lami Sanjar
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187708-01

RUA PERSEU DANTAS

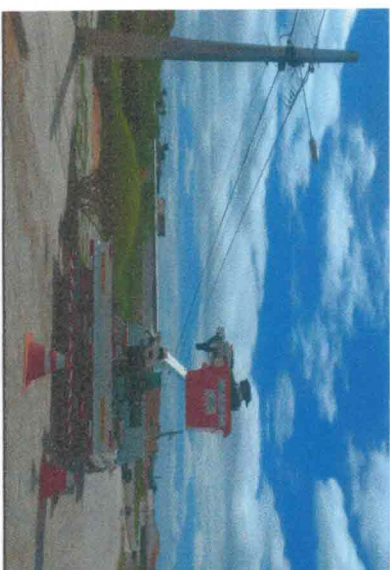


Certifico que os materiais ou serviços
constantes do presente recibo foram
integralmente recebidos ou prestados




Em, 05 / 10 / 20 20


Genildo da Silva Oliveira-Engenheiro
CREA 1601438729 - Matr. 44058-PMC/SEC08




Rafael Gomes Leite
Engenheiro Civil
CPF: 062.483.244-92
CREA 1614337945


Carlos Kavinli Sanjar
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187708-01

RUA PROBU CAMARA

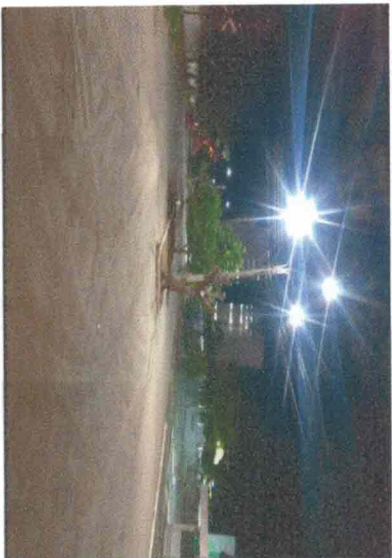





Certifico que os materiais ou serviços
constantes do presente recibo foram
integralmente recebidos ou prestados
Em, 05 / 10 / 2020

Genildo da Silva Oliveira-Engenheiro
CREA 1601438729 - MDE 27058-PMCG/SEC08




Rafael Gomes Leite
Engenheiro Civil
CPF 062.483.244-92
CREA 1614297946


Carlos Lami Sanjar
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187708-01



RUA TRÊS IRMÃS




Rafael Mendes Leite
Engenheiro Civil
CPF 062.483.244-92
CREA 1614237940

Carlos Lavini Sanjar
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187708-01

RUA ZACARIAS SOUZA DO Ó







Certifico que os materiais ou serviços
constantes do presente recibo foram
integralmente recebidos ou prestados
Em, 05/10/2020
Carildo da Silva Oliveira-Engenheiro
CREA 1601436729 - Matr. 21058-PMCG/SECOB




Rafael Borges Leite
Engenheiro Civil
CPF 062.483.244-92
CREA 1874237940


Carlos Lavini Sanjar
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187708-01

TRAV. PROF. HORTÊNCIO RIBEIRO




Rafael Gomes Leite
Engenheiro Civil
CPF 062.483.244-62
CREA 484.0777963


Carlos Lavini Sanjar
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187708-01

AGOSTO/SETEMBRO, 2020										COORD.		AS GPS				1.0 - Luminárias LED Aplicadas		4.0 - Relé		Postes Metálicos - Postes Concretos		7.0 - Suportes e Braços e Componentes Elétricos				
Nº de OS	Rua	Bairro	Data	Barramento	S	W	Potência Retirada	1.1 LED 50W	1.2 LED 80W	1.3 LED 120W	1.4 LED 150W	3.1 Cabo Multiplex 1x1x16 + 16mm²	3.4 Cabo Flexível 2,5mm²	4.1 Relé Fotocélula	5.1 Poste Metálico 7m	6.4 Poste Concreto Duplo 1,9/1,50	7.1 Braço 2m	7.2 Braço 3m	7.6 Parelho MATE 200mm	7.7 Arruela Quadrada	7.9 Alça Prenhaçada					
08-2020 / 0001	RUA FABIO DE SOUZA OLIVEIRA	MAVINAS	24/08/2020	S/B	-7.25104	-35.92844	IMPLANTACAO	1					12	1			1			2	2					
08-2020 / 0001	RUA FABIO DE SOUZA OLIVEIRA	MAVINAS	24/08/2020	S/B	-7.25075	-35.92851	150 W V.M	1					12	1			1			2	2					
08-2020 / 0001	RUA FABIO DE SOUZA OLIVEIRA	MAVINAS	24/08/2020	S/B	-7.25045	-35.92862	150 W V.M	1					12	1			1			2	2					
08-2020 / 0001	RUA FABIO DE SOUZA OLIVEIRA	MAVINAS	24/08/2020	S/B	-7.25004	-35.92862	150 W V.M	1					12	1			1			2	2					
08-2020 / 0001	RUA FABIO DE SOUZA OLIVEIRA	MAVINAS	24/08/2020	S/B	-7.24982	-35.92885	150 W V.M	1					12	1			1			2	2					
08-2020 / 0001	RUA FABIO DE SOUZA OLIVEIRA	MAVINAS	24/08/2020	S/B	-7.24957	-35.92901	150W V.S	1					12	1			1			2	2					
08-2020 / 0001	RUA FABIO DE SOUZA OLIVEIRA	MAVINAS	24/08/2020	S/B	-7.24916	-35.92919	70W V.S	1					12	1			1			2	2					
08-2020 / 0001	RUA FABIO DE SOUZA OLIVEIRA	MAVINAS	24/08/2020	S/B	-7.24887	-35.92924	70W V.S	1					12	1			1			2	2					
08-2020 / 0001	RUA FABIO DE SOUZA OLIVEIRA	MAVINAS	24/08/2020	S/B	-7.24864	-35.92928	70W V.S	1					12	1			1			2	2					
08-2020 / 0001	RUA FABIO DE SOUZA OLIVEIRA	MAVINAS	24/08/2020	S/B	-7.24838	-35.92943	70W V.S	1					12	1			1			2	2					
08-2020 / 0001	RUA FABIO DE SOUZA OLIVEIRA	MAVINAS	24/08/2020	S/B	-7.24808	-35.92946	70W V.S	1					12	1			1			2	2					
08-2020 / 0001	RUA FABIO DE SOUZA OLIVEIRA	MAVINAS	24/08/2020	S/B	-7.24777	-35.92963	70W V.S	1					12	1			1			2	2					
08-2020 / 0001	RUA FABIO DE SOUZA OLIVEIRA	MAVINAS	24/08/2020	S/B	-7.24749	-35.92975	70W V.S	1					12	1			1			2	2					
08-2020 / 0001	RUA FABIO DE SOUZA OLIVEIRA	MAVINAS	24/08/2020	S/B	-7.24719	-35.92987	70W V.S	1					12	1			1			2	2					
08-2020 / 0001	RUA FABIO DE SOUZA OLIVEIRA	MAVINAS	24/08/2020	S/B	-7.24697	-35.92997	70W V.S	1					12	1			1			2	2					
08-2020 / 0001	RUA FABIO DE SOUZA OLIVEIRA	MAVINAS	24/08/2020	S/B	-7.24663	-35.93007	70W V.S	1					12	1			1			2	2					
08-2020 / 0001	RUA FABIO DE SOUZA OLIVEIRA	MAVINAS	24/08/2020	S/B	-7.24635	-35.9302	70W V.S	1					12	1			1			2	2					
08-2020 / 0001	RUA FABIO DE SOUZA OLIVEIRA	MAVINAS	24/08/2020	S/B	-7.24602	-35.93033	70W V.S	1					12	1			1			2	2					
08-2020 / 0001	RUA FABIO DE SOUZA OLIVEIRA	MAVINAS	24/08/2020	S/B	-7.24567	-35.93043	150W V.S	1					12	1			1			2	2					
08-2020 / 0001	RUA FABIO DE SOUZA OLIVEIRA	MAVINAS	24/08/2020	S/B	-7.24531	-35.93058	150 W V.M	1					12	1			1			2	2					
08-2020 / 0001	RUA FABIO DE SOUZA OLIVEIRA	MAVINAS	24/08/2020	S/B	-7.25102	-35.92858	70W V.S	1					12	1			1			2	2					
08-2020 / 0002	RUA JOSE LINS DO REGO	PALMEIRA	24/08/2020	S/B	-7.21234	-35.89185	250W V.S	1					12	1												
08-2020 / 0002	RUA JOSE LINS DO REGO	PALMEIRA	24/08/2020	S/B	-7.21273	-35.89101	250W V.S	1					12	1												
08-2020 / 0002	RUA JOSE LINS DO REGO	PALMEIRA	24/08/2020	S/B	-7.21286	-35.899074	250W V.S	1					12	1												
08-2020 / 0003	RUA JOSE LINS DO REGO	PALMEIRA	24/08/2020	S/B	-7.21222	-35.89216	250W V.S	1					12	1												
08-2020 / 0003	RUA JOSE LINS DO REGO	PALMEIRA	24/08/2020	S/B	-7.21247	-35.89158	250W V.S	1					12	1												
08-2020 / 0003	RUA JOSE LINS DO REGO	PALMEIRA	24/08/2020	S/B	-7.21257	-35.89133	250W V.S	1					12	1												
08-2020 / 0003	RUA JOSE LINS DO REGO	PALMEIRA	24/08/2020	S/B	-7.21298	-35.89054	250W V.S	1					12	1												
08-2020 / 0003	RUA JOSE LINS DO REGO	PALMEIRA	24/08/2020	S/B	-7.2131	-35.89028	250W V.S	1					12	1												
08-2020 / 0003	RUA JOSE LINS DO REGO	PALMEIRA	24/08/2020	S/B	-7.21321	-35.8899	250W V.S	1					12	1												
08-2020 / 0003	RUA JOSE LINS DO REGO	PALMEIRA	24/08/2020	S/B	-7.21344	-35.88964	250W V.S	1					12	1												
08-2020 / 0003	RUA JOSE LINS DO REGO	PALMEIRA	24/08/2020	S/B	-7.21335	-35.88943	2*250W V.S	2					24	2												
08-2020 / 0003	RUA JOSE LINS DO REGO	PALMEIRA	24/08/2020	S/B	-7.21027	-35.89752	70W V.S	1					12	1												
08-2020 / 0003	RUA JOSE LINS DO REGO	PALMEIRA	24/08/2020	S/B	-7.21007	-35.89718	70W V.S	1					12	1												
08-2020 / 0003	RUA JOSE LINS DO REGO	PALMEIRA	24/08/2020	S/B	-7.21018	-35.8968	70W V.S	1					12	1												
08-2020 / 0004	RUA JOSE LINS DO REGO	MONTE SANTO	25/08/2020	S/B	-7.21014	-35.89657	70W V.S	1					12	1												
08-2020 / 0004	RUA JOSE LINS DO REGO	MONTE SANTO	25/08/2020	S/B	-7.21021	-35.89629	70W V.S	1					12	1												
08-2020 / 0004	RUA JOSE LINS DO REGO	MONTE SANTO	25/08/2020	S/B	-7.21036	-35.89598	70W V.S	1					12	1												
08-2020 / 0004	RUA JOSE LINS DO REGO	MONTE SANTO	25/08/2020	S/B	-7.21056	-35.89563	70W V.S	1					12	1												
08-2020 / 0004	RUA JOSE LINS DO REGO	MONTE SANTO	25/08/2020	S/B	-7.21073	-35.89527	70W V.S	1					12	1												

Genio da Silva Oliveira Engenheiro

CREA 4061074872

CPF: 262.187108-01

Carlos Lavini Sanjar

Diretor

Confirmando que os materiais ou serviços constantes do presente recibo foram integralmente recebidos ou prestados.

Em, 05 de 1991/2020

Carlos Lavin Sanjar
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282-187108-01

Rafael Gomes Leite
Engenheiro Civil
CPF 062.483.244-92
CREA 1614297940

08-2020 / 0004	RUA JOSE LINS DO REGO	MONTESANTO	25/08/2020	S/B	-7.21084	-35.89502	70W V.S	1		12	1		1		2	2
08-2020 / 0004	RUA JOSE LINS DO REGO	MONTESANTO	25/08/2020	S/B	-7.2108	-35.89478	70W V.S	1		12	1		1		2	2
08-2020 / 0004	RUA JOSE LINS DO REGO	MONTESANTO	25/08/2020	S/B	-7.21108	-35.89462	70W V.S	1		12	1		1		2	2
08-2020 / 0004	RUA JOSE LINS DO REGO	MONTESANTO	25/08/2020	S/B	-7.21119	-35.89433	70W V.S	1		12	1		1		2	2
08-2020 / 0004	RUA JOSE LINS DO REGO	MONTESANTO	25/08/2020	S/B	-7.21122	-35.89411	70W V.S	1		12	1		1		2	2
08-2020 / 0004	RUA JOSE LINS DO REGO	MONTESANTO	25/08/2020	S/B	-7.21148	-35.89384	70W V.S	1		12	1		1		2	2
08-2020 / 0004	RUA JOSE LINS DO REGO	MONTESANTO	25/08/2020	S/B	-7.21161	-35.89359	70W V.S	1		12	1		1		2	2
08-2020 / 0004	RUA JOSE LINS DO REGO	MONTESANTO	25/08/2020	S/B	-7.21168	-35.89333	70W V.S	1		12	1		1		2	2
08-2020 / 0004	RUA JOSE LINS DO REGO	MONTESANTO	25/08/2020	S/B	-7.21184	-35.893	150 W.V.M	1		12	1		1		2	2
08-2020 / 0004	RUA JOSE LINS DO REGO	MONTESANTO	25/08/2020	S/B	-7.21205	-35.89268	150 W.V.M	1		12	1		1		2	2
08-2020 / 0004	RUA JOSE LINS DO REGO	MONTESANTO	25/08/2020	S/B	-7.21214	-35.89252	IMPLANTACAO	1		12	1		1		2	2
08-2020 / 0005	RUA PROBU CAMARA	MONTESANTO	25/08/2020	S/B	-7.20945	-35.89843	70W V.S	1		12	1		1		2	2
08-2020 / 0005	RUA PROBU CAMARA	MONTESANTO	25/08/2020	S/B	-7.20919	-35.89827	70W V.S	1		12	1		1		2	2
08-2020 / 0005	RUA PROBU CAMARA	MONTESANTO	25/08/2020	S/B	-7.20916	-35.89813	70W V.S	1		12	1		1		2	2
08-2020 / 0005	RUA PROBU CAMARA	MONTESANTO	25/08/2020	S/B	-7.20889	-35.89815	70W V.S	1		12	1		1		2	2
08-2020 / 0005	RUA PROBU CAMARA	MONTESANTO	25/08/2020	S/B	-7.20877	-35.89791	70W V.S	1		12	1		1		2	2
08-2020 / 0005	RUA PROBU CAMARA	MONTESANTO	25/08/2020	S/B	-7.20854	-35.89773	70W V.S	1		12	1		1		2	2
08-2020 / 0006	RUA OLEGARIO MACIEL	MONTESANTO	25/08/2020	S/B	-7.20572	-35.90388	150 W.V.M	1					1			
08-2020 / 0006	RUA OLEGARIO MACIEL	MONTESANTO	25/08/2020	S/B	-7.20582	-35.9038	150 W.V.M	1					1			
08-2020 / 0006	RUA OLEGARIO MACIEL	MONTESANTO	25/08/2020	S/B	-7.20594	-35.90356	150 W.V.M	1					1			
08-2020 / 0006	RUA OLEGARIO MACIEL	MONTESANTO	25/08/2020	S/B	-7.20609	-35.90316	150 W.V.M	1					1			
08-2020 / 0006	RUA OLEGARIO MACIEL	MONTESANTO	25/08/2020	S/B	-7.2062	-35.90285	150 W.V.M	1					1			
08-2020 / 0006	RUA OLEGARIO MACIEL	MONTESANTO	25/08/2020	S/B	-7.20638	-35.90256	150 W.V.M	1					1			
08-2020 / 0006	RUA OLEGARIO MACIEL	MONTESANTO	25/08/2020	S/B	-7.20643	-35.90233	150 W.V.M	1					1			
08-2020 / 0006	RUA OLEGARIO MACIEL	MONTESANTO	25/08/2020	S/B	-7.2065	-35.902	150 W.V.M	1					1			
08-2020 / 0006	RUA OLEGARIO MACIEL	MONTESANTO	25/08/2020	S/B	-7.20678	-35.90177	150 W.V.M	1					1			
08-2020 / 0006	RUA OLEGARIO MACIEL	MONTESANTO	25/08/2020	S/B	-7.2069	-35.90146	150 W.V.M	1					1			
08-2020 / 0006	RUA OLEGARIO MACIEL	MONTESANTO	25/08/2020	S/B	-7.2071	-35.90115	150 W.V.M	1					1			
08-2020 / 0006	RUA OLEGARIO MACIEL	MONTESANTO	25/08/2020	S/B	-7.20723	-35.90087	150 W.V.M	1					1			
08-2020 / 0006	RUA OLEGARIO MACIEL	MONTESANTO	25/08/2020	S/B	-7.20762	-35.90059	150 W.V.M	1					1			
08-2020 / 0006	RUA OLEGARIO MACIEL	MONTESANTO	25/08/2020	S/B	-7.20782	-35.90029	150 W.V.M	1					1			
08-2020 / 0006	RUA OLEGARIO MACIEL	MONTESANTO	25/08/2020	S/B	-7.20808	-35.90012	150 W.V.M	1					1			
08-2020 / 0006	RUA OLEGARIO MACIEL	MONTESANTO	25/08/2020	S/B	-7.20836	-35.89982	150 W.V.M	1					1			
08-2020 / 0006	RUA OLEGARIO MACIEL	MONTESANTO	25/08/2020	S/B	-7.20857	-35.89955	150 W.V.M	1					1			
08-2020 / 0006	RUA OLEGARIO MACIEL	MONTESANTO	25/08/2020	S/B	-7.20883	-35.8994	150 W.V.M	1					1			
08-2020 / 0006	RUA OLEGARIO MACIEL	MONTESANTO	25/08/2020	S/B	-7.20912	-35.89911	150 W.V.M	1					1			
08-2020 / 0006	RUA OLEGARIO MACIEL	MONTESANTO	25/08/2020	S/B	-7.20929	-35.89896	150 W.V.M	1					1			
08-2020 / 0006	RUA OLEGARIO MACIEL	MONTESANTO	25/08/2020	S/B	-7.20949	-35.89876	150 W.V.M	1					1			
08-2020 / 0006	RUA OLEGARIO MACIEL	MONTESANTO	25/08/2020	S/B	-7.20971	-35.89856	150 W.V.M	1					1			
08-2020 / 0007	RUA PROBU CAMARA	MONTESANTO	26/08/2020	S/B	-7.20601	-35.89586	150 W.V.M	1		12	1		1		2	2
08-2020 / 0007	RUA PROBU CAMARA	MONTESANTO	26/08/2020	S/B	-7.20628	-35.89604	70W V.S	1		12	1		1		2	2
08-2020 / 0007	RUA PROBU CAMARA	MONTESANTO	26/08/2020	S/B	-7.20655	-35.89666	70W V.S	1		12	1		1		2	2
08-2020 / 0007	RUA PROBU CAMARA	MONTESANTO	26/08/2020	S/B	-7.20678	-35.89647	70W V.S	1		12	1		1		2	2
08-2020 / 0007	RUA PROBU CAMARA	MONTESANTO	26/08/2020	S/B	-7.20709	-35.8968	IMPLANTACAO	1		12	1		1		2	2
08-2020 / 0007	RUA PROBU CAMARA	MONTESANTO	26/08/2020	S/B	-7.20725	-35.89674	70W V.S	1		12	1		1		2	2

Cartilho que os materiais ou serviços constantes do presente recibo foram integralmente recebidos ou prestados

Carlos Lavini Sanjar
Diretor
CREA 50610756/2
CPF: 82.18708-01

Em 05/10/2020
Concluido da Silva Leticia - Engenheiro
CREA 1601438/23 - MAT 2008 - PIME/CECOP

Letícia da Silva
Engenheiro Civil
CPF 062.483.244-92
CREA 16142979-40

0	2020 / 0007	RUA PROBU CAMARA	MONTTE SANTO	26/08/2020	S/B	-7.20742	-35.89688	70W V.S	1				12	1			1	1	2	2
	2020 / 0007	RUA PROBU CAMARA	MONTTE SANTO	26/08/2020	S/B	-7.20757	-35.89708	70W V.S	1				12	1			1	1	2	2
	2020 / 0007	RUA PROBU CAMARA	MONTTE SANTO	26/08/2020	S/B	-7.20799	-35.89729	70W V.S	1				12	1			1	1	2	2
	2020 / 0007	RUA PROBU CAMARA	MONTTE SANTO	26/08/2020	S/B	-7.20818	-35.89744	70W V.S	1				12	1			1	1	2	2
	2020 / 0007	RUA PROBU CAMARA	MONTTE SANTO	26/08/2020	S/B	-7.20984	-35.89869	70W V.S	1				12	1			1	1	2	2
	2020 / 0007	RUA PROBU CAMARA	MONTTE SANTO	26/08/2020	S/B	-7.21094	-35.89898	70W V.S	1				12	1			1	1	2	2
	2020 / 0007	RUA PROBU CAMARA	MONTTE SANTO	26/08/2020	S/B	-7.20914	-35.589828	70W V.S	1				12	1			1	1	2	2
	2020 / 0007	RUA PROBU CAMARA	MONTTE SANTO	26/08/2020	S/B	-7.21022	-35.9876	70W V.S	1				12	1			1	1	2	2
	2020 / 0008	RUA TRÊS IRMÃS	TRÊS IRMÃS	26/08/2020	S/B	-7.2627	-35.9213	IMPLANTAÇÃO		1			15	1			1	2	2	2
	2020 / 0008	RUA TRÊS IRMÃS	TRÊS IRMÃS	26/08/2020	S/B	-7.2629	-35.92162	IMPLANTAÇÃO		1			15	1			1	2	2	2
	2020 / 0009	RUA OLEGARIO MACIEL	MONTTE SANTO	26/08/2020	S/B	-7.20993	-35.89837	150 W.V.M	1				12	1						
	2020 / 0009	RUA OLEGARIO MACIEL	MONTTE SANTO	26/08/2020	S/B	-7.21023	-35.89813	150 W.V.M	1				12	1						
	2020 / 0009	RUA OLEGARIO MACIEL	MONTTE SANTO	26/08/2020	S/B	-7.21051	-35.89785	150 W.V.M	1				12	1						
	2020 / 0009	RUA OLEGARIO MACIEL	MONTTE SANTO	26/08/2020	S/B	-7.21078	-35.89761	150 W.V.M	1				12	1						
	2020 / 0009	RUA OLEGARIO MACIEL	MONTTE SANTO	26/08/2020	S/B	-7.21103	-35.8974	150 W.V.M	1				12	1						
	2020 / 0009	RUA OLEGARIO MACIEL	MONTTE SANTO	26/08/2020	S/B	-7.21124	-35.89735	150 W.V.M	1				12	1						
	2020 / 0009	RUA OLEGARIO MACIEL	MONTTE SANTO	26/08/2020	S/B	-7.21364	-35.89557	70W V.S	1				12	1			1	1	2	2
	2020 / 0009	RUA OLEGARIO MACIEL	MONTTE SANTO	26/08/2020	S/B	-7.21351	-35.89587	70W V.S	1				12	1			1	1	2	2
	2020 / 0009	RUA OLEGARIO MACIEL	MONTTE SANTO	26/08/2020	S/B	-7.21334	-35.89609	70W V.S	1				12	1			1	1	2	2
	2020 / 0009	RUA OLEGARIO MACIEL	MONTTE SANTO	26/08/2020	S/B	-7.21314	-35.8864	70W V.S	1				12	1			1	1	2	2
	2020 / 0009	RUA OLEGARIO MACIEL	MONTTE SANTO	26/08/2020	S/B	-7.21287	-35.88657	70W V.S	1				12	1			1	1	2	2
	2020 / 0009	RUA OLEGARIO MACIEL	MONTTE SANTO	26/08/2020	S/B	-7.21258	-35.89668	70W V.S	1				12	1			1	1	2	2
	2020 / 0009	RUA OLEGARIO MACIEL	MONTTE SANTO	26/08/2020	S/B	-7.21211	-35.89705	70W V.S	1				12	1			1	1	2	2
	2020 / 0009	RUA OLEGARIO MACIEL	MONTTE SANTO	26/08/2020	S/B	-7.21179	-35.89723	70W V.S	1				12	1			1	1	2	2
	2020 / 0009	RUA OLEGARIO MACIEL	MONTTE SANTO	26/08/2020	S/B	-7.21153	-35.89729	70W V.S	1				12	1			1	1	2	2
	2020 / 0009	RUA OLEGARIO MACIEL	MONTTE SANTO	26/08/2020	S/B	-7.21237	-35.89692	70W V.S	1				12	1			1	1	2	2
	2020 / 0009	RUA HUMBERTO BATISTA LIMA	CATOLÉ	26/08/2020	S/B	-7.24569	-35.88388	70W V.S	1				12	1			1	1	2	2
	2020 / 0010	RUA HUMBERTO BATISTA LIMA	CATOLÉ	26/08/2020	S/B	-7.24573	-35.88416	70W V.S	1				12	1			1	1	2	2
	2020 / 0010	RUA HUMBERTO BATISTA LIMA	CATOLÉ	26/08/2020	S/B	-7.24566	-35.88451	70W V.S	1				12	1			1	1	2	2
	2020 / 0010	RUA HUMBERTO BATISTA LIMA	CATOLÉ	26/08/2020	S/B	-7.24581	-35.88477	70W V.S	1				12	1			1	1	2	2
	2020 / 0010	RUA HUMBERTO BATISTA LIMA	CATOLÉ	26/08/2020	S/B	-7.24594	-35.88471	70W V.S	1				12	1			1	1	2	2
	2020 / 0010	RUA HUMBERTO BATISTA LIMA	CATOLÉ	26/08/2020	S/B	-7.24584	-35.88444	70W V.S	1				12	1			1	1	2	2
	2020 / 0010	RUA HUMBERTO BATISTA LIMA	CATOLÉ	26/08/2020	S/B	-7.24586	-35.88426	70W V.S	1				12	1			1	1	2	2
	2020 / 0010	RUA HUMBERTO BATISTA LIMA	CATOLÉ	26/08/2020	S/B	-7.24579	-35.8839	70W V.S	1				12	1			1	1	2	2
	2020 / 0010	RUA HUMBERTO BATISTA LIMA	CATOLÉ	26/08/2020	S/B	-7.21059	-35.89891	70W V.S	1				12	1			1	1	2	2
	2020 / 0011	RUA PROBU CAMARA	MONTTE SANTO	27/08/2020	S/B	-7.21119	-35.89901	70W V.S	1				12	1			1	1	2	2
	2020 / 0011	RUA PROBU CAMARA	MONTTE SANTO	27/08/2020	S/B	-7.21138	-35.89911	70W V.S	1				12	1			1	1	2	2
	2020 / 0011	RUA PROBU CAMARA	MONTTE SANTO	27/08/2020	S/B	-7.21168	-35.8991	70W V.S	1				12	1			1	1	2	2
	2020 / 0011	RUA PROBU CAMARA	MONTTE SANTO	27/08/2020	S/B	-7.21199	-35.89903	70W V.S	1				12	1			1	1	2	2
	2020 / 0011	RUA PROBU CAMARA	MONTTE SANTO	27/08/2020	S/B	-7.21225	-35.89924	70W V.S	1				12	1			1	1	2	2
	2020 / 0011	RUA PROBU CAMARA	MONTTE SANTO	27/08/2020	S/B	-7.21251	-35.89936	70W V.S	1				12	1			1	1	2	2
	2020 / 0012	RUA DR. ACÁCIO FIGUEIREDO	MONTTE SANTO	27/08/2020	S/B	-7.21348	-35.9021	150W V.S	1				12	1			1	1	2	2
	2020 / 0012	RUA DR. ACÁCIO FIGUEIREDO	MONTTE SANTO	27/08/2020	S/B	-7.21358	-35.90182	150W V.S	1				12	1			1	1	2	2
	2020 / 0012	RUA DR. ACÁCIO FIGUEIREDO	MONTTE SANTO	27/08/2020	S/B	-7.21391	-35.90126	150W V.S	1				12	1			1	1	2	2

Certifico que os materiais ou serviços constantes do presente recibô foram integralmente recebidos ou prestados

05/10/2020

Getulio da Silva Oliveira Engenheiro Civil
CREA 16014387-29

Rafael de Jesus Leite

Engenheiro Civil
CPF 062.483.244-92
CREA 16142979-40

Carlos Lavini Sanjar
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187708-01

2020 / 0012	RUA DR. ACÁCIO FIGUEIREDO	MONTE SANTO	27/08/2020	S/B	-7.2141	-35.91121	150W V.S	1				12	1	1			1	2	2
2020 / 0012	RUA DR. ACÁCIO FIGUEIREDO	MONTE SANTO	27/08/2020	S/B	-	-35.9009	IMPLANTAÇÃO	1				12	1	1			1	2	2
2020 / 0012	RUA DR. ACÁCIO FIGUEIREDO	MONTE SANTO	27/08/2020	S/B	-7.21441	-35.90063	70W V.S	1				12	1	1			1	2	2
2020 / 0012	RUA DR. ACÁCIO FIGUEIREDO	MONTE SANTO	27/08/2020	S/B	-7.21465	-35.90015	70W V.S	1				12	1	1			1	2	2
2020 / 0012	RUA DR. ACÁCIO FIGUEIREDO	MONTE SANTO	27/08/2020	S/B	-7.21479	-35.89987	70W V.S	1				12	1	1			1	2	2
2020 / 0013	RUA DR. ACÁCIO FIGUEIREDO	MONTE SANTO	27/08/2020	S/B	-7.2138	-35.90157	70W V.S	1				12	1	1			1	2	2
2020 / 0013	RUA DR. ACÁCIO FIGUEIREDO	MONTE SANTO	27/08/2020	S/B	-7.21385	-35.90142	70W V.S	1				12	1	1			1	2	2
2020 / 0013	RUA DR. ACÁCIO FIGUEIREDO	MONTE SANTO	27/08/2020	S/B	-7.21403	-35.90106	70W V.S	1				12	1	1			1	2	2
2020 / 0013	RUA DR. ACÁCIO FIGUEIREDO	MONTE SANTO	27/08/2020	S/B	-7.21428	-35.9008	70W V.S	1				12	1	1			1	2	2
2020 / 0013	RUA DR. ACÁCIO FIGUEIREDO	MONTE SANTO	27/08/2020	S/B	-7.21457	-35.90031	70W V.S	1				12	1	1			1	2	2
2020 / 0014	RUA DR. ACÁCIO FIGUEIREDO	MONTE SANTO	27/08/2020	S/B	-7.21479	-35.89982	70W V.S	1				12	1	1			1	2	2
2020 / 0014	RUA FRANCISCO CALIXTO	MONTE SANTO	27/08/2020	S/B	-7.21142	-35.9015	70W V.S	1				12	1	1			1	2	2
2020 / 0014	RUA FRANCISCO CALIXTO	MONTE SANTO	27/08/2020	S/B	-7.2116	-35.90167	150 W V.M	1				12	1	1			1	2	2
2020 / 0014	RUA FRANCISCO CALIXTO	MONTE SANTO	27/08/2020	S/B	-7.21173	-35.9017	150 W V.M	1				12	1	1			1	2	2
2020 / 0014	RUA FRANCISCO CALIXTO	MONTE SANTO	27/08/2020	S/B	-7.21208	-35.90181	150 W V.M	1				12	1	1			1	2	2
2020 / 0014	RUA FRANCISCO CALIXTO	MONTE SANTO	27/08/2020	S/B	-7.21231	-35.90182	150 W V.M	1				12	1	1			1	2	2
2020 / 0014	RUA FRANCISCO CALIXTO	MONTE SANTO	27/08/2020	S/B	-7.21251	-35.90208	150 W V.M	1				12	1	1			1	2	2
2020 / 0014	RUA FRANCISCO CALIXTO	MONTE SANTO	27/08/2020	S/B	-7.21287	-35.90212	150 W V.M	1				12	1	1			1	2	2
2020 / 0014	RUA FRANCISCO CALIXTO	MONTE SANTO	27/08/2020	S/B	-7.21317	-35.90223	150 W V.M	1				12	1	1			1	2	2
2020 / 0014	RUA FRANCISCO CALIXTO	MONTE SANTO	27/08/2020	S/B	-7.21343	-35.90234	150 W V.M	1				12	1	1			1	2	2
2020 / 0014	RUA FRANCISCO CALIXTO	MONTE SANTO	27/08/2020	S/B	-7.21368	-35.90239	150 W V.M	1				12	1	1			1	2	2
2020 / 0014	RUA FRANCISCO CALIXTO	MONTE SANTO	27/08/2020	S/B	-7.21396	-35.90248	150 W V.M	1				12	1	1			1	2	2
2020 / 0014	RUA FRANCISCO CALIXTO	MONTE SANTO	27/08/2020	S/B	-7.21417	-35.90244	150 W V.M	1				12	1	1			1	2	2
2020 / 0014	RUA FRANCISCO CALIXTO	MONTE SANTO	27/08/2020	S/B	-7.21458	-35.9027	150 W V.M	1				12	1	1			1	2	2
2020 / 0014	RUA FRANCISCO CALIXTO	MONTE SANTO	27/08/2020	S/B	-7.21488	-35.90277	150 W V.M	1				12	1	1			1	2	2
2020 / 0014	RUA FRANCISCO CALIXTO	MONTE SANTO	27/08/2020	S/B	-7.21524	-35.90291	150 W V.M	1				12	1	1			1	2	2
2020 / 0014	RUA FRANCISCO CALIXTO	MONTE SANTO	27/08/2020	S/B	-7.21554	-35.90299	150 W V.M	1				12	1	1			1	2	2
2020 / 0015	RUA DR. ACÁCIO FIGUEIREDO	MONTE SANTO	28/08/2020	S/B	-7.21502	-35.89948	150W V.S	1				12	1	1			1	2	2
2020 / 0015	RUA DR. ACÁCIO FIGUEIREDO	MONTE SANTO	28/08/2020	S/B	-7.21514	-35.89921	70W V.S	1				12	1	1			1	2	2
2020 / 0015	RUA DR. ACÁCIO FIGUEIREDO	MONTE SANTO	28/08/2020	S/B	-7.21519	-35.89894	70W V.S	1				12	1	1			1	2	2
2020 / 0015	RUA DR. ACÁCIO FIGUEIREDO	MONTE SANTO	28/08/2020	S/B	-7.21537	-35.89887	70W V.S	1				12	1	1			1	2	2
2020 / 0016	RUA ANTONIETA CAVALCANTE	MONTE SANTO	28/08/2020	S/B	-7.21186	-35.9	70W V.S	1				12	1	1			1	2	2
2020 / 0016	RUA ANTONIETA CAVALCANTE	MONTE SANTO	28/08/2020	S/B	-7.21175	-35.90026	150 W V.M	1				12	1	1			1	2	2
2020 / 0016	RUA ANTONIETA CAVALCANTE	MONTE SANTO	28/08/2020	S/B	-7.21172	-35.90036	150 W V.M	1				12	1	1			1	2	2
2020 / 0016	RUA ANTONIETA CAVALCANTE	MONTE SANTO	28/08/2020	S/B	-7.21154	-35.90084	70W V.S	1				12	1	1			1	2	2
2020 / 0016	RUA ANTONIETA CAVALCANTE	MONTE SANTO	28/08/2020	S/B	-7.21139	-35.9011	70W V.S	1				12	1	1			1	2	2
2020 / 0016	RUA ANTONIETA CAVALCANTE	MONTE SANTO	28/08/2020	S/B	-7.21124	-35.90134	70W V.S	1				12	1	1			1	2	2
2020 / 0016	RUA ANTONIETA CAVALCANTE	MONTE SANTO	28/08/2020	S/B	-7.21117	-35.90167	70W V.S	1				12	1	1			1	2	2
2020 / 0016	RUA ANTONIETA CAVALCANTE	MONTE SANTO	28/08/2020	S/B	-7.2111	-35.9018	70W V.S	1				12	1	1			1	2	2
2020 / 0016	RUA ANTONIETA CAVALCANTE	MONTE SANTO	28/08/2020	S/B	-7.21091	-35.90217	70W V.S	1				12	1	1			1	2	2
2020 / 0016	RUA ANTONIETA CAVALCANTE	MONTE SANTO	28/08/2020	S/B	-7.21082	-35.90238	70W V.S	1				12	1	1			1	2	2
2020 / 0016	RUA ANTONIETA CAVALCANTE	MONTE SANTO	28/08/2020	S/B	-7.21067	-35.90269	70W V.S	1				12	1	1			1	2	2
2020 / 0016	RUA ANTONIETA CAVALCANTE	MONTE SANTO	28/08/2020	S/B	-7.21057	-35.90292	70W V.S	1				12	1	1			1	2	2
2020 / 0017	RUA MASINHA GOES DE ALBUQUERQUE	CATOLÉ	31/08/2020	S/B	-7.24594	-35.87935	70W V.S	1				12	1	1			1	2	2
2020 / 0017	RUA MASINHA GOES DE ALBUQUERQUE	CATOLÉ	31/08/2020	S/B	-7.24588	-35.87975	70W V.S	1				12	1	1			1	2	2

Carlos Laviní Sanjar
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187708-01

Engenheiro Civil
CPF 062.483.244-92
CREA 1614297940

Adriano Pedres Leite

08-2020 / 0020	RUA FRANCISCO MARIA DE OLIVEIRA	PALMEIRA	01/09/2020	S/B	-7,20842	-35,89596	150 W V.M	1				12	1	1	2	2	
08-2020 / 0020	RUA FRANCISCO MARIA DE OLIVEIRA	PALMEIRA	01/09/2020	S/B	-7,2087	-35,89573	150 W V.M	1				12	1	1	2	2	
08-2020 / 0020	RUA FRANCISCO MARIA DE OLIVEIRA	PALMEIRA	01/09/2020	S/B	-7,20882	-35,89525	150 W V.M	1				12	1	1	2	2	
08-2020 / 0020	RUA FRANCISCO MARIA DE OLIVEIRA	PALMEIRA	01/09/2020	S/B	-7,20898	-35,89489	150 W V.M	1				12	1	1	2	2	
08-2020 / 0020	RUA FRANCISCO MARIA DE OLIVEIRA	PALMEIRA	01/09/2020	S/B	-7,20906	-35,89463	150 W V.M	1				12	1	1	2	2	
08-2020 / 0020	RUA FRANCISCO MARIA DE OLIVEIRA	PALMEIRA	01/09/2020	S/B	-7,20919	-35,89426	150 W V.M	1				12	1	1	2	2	
08-2020 / 0020	RUA FRANCISCO MARIA DE OLIVEIRA	PALMEIRA	01/09/2020	S/B	-7,2094	-35,89407	150 W V.M	1				12	1	1	2	2	
08-2020 / 0020	RUA FRANCISCO MARIA DE OLIVEIRA	PALMEIRA	01/09/2020	S/B	-7,20947	-35,89381	150 W V.M	1				12	1	1	2	2	
08-2020 / 0020	RUA FRANCISCO MARIA DE OLIVEIRA	PALMEIRA	01/09/2020	S/B	-7,20963	-35,89362	150 W V.M	1				12	1	1	2	2	
08-2020 / 0020	RUA FRANCISCO MARIA DE OLIVEIRA	PALMEIRA	01/09/2020	S/B	-7,20973	-35,89326	150 W V.M	1				12	1	1	2	2	
08-2020 / 0020	RUA FRANCISCO MARIA DE OLIVEIRA	PALMEIRA	01/09/2020	S/B	-7,20978	-35,89301	150 W V.M	1				12	1	1	2	2	
08-2020 / 0021	RUA FRANCISCO MARIA DE OLIVEIRA	PALMEIRA	01/09/2020	S/B	-7,22111	-35,91848	70W V.S	1				12	1	1	2	2	
08-2020 / 0021	RUA FRANCISCO MARIA DE OLIVEIRA	PALMEIRA	01/09/2020	S/B	-7,22115	-35,91811	70W V.S	1				12	1	1	2	2	
08-2020 / 0021	RUA FRANCISCO MARIA DE OLIVEIRA	PALMEIRA	01/09/2020	S/B	-7,2211	-35,91771	70W V.S	1				12	1	1	2	2	
08-2020 / 0021	RUA FRANCISCO MARIA DE OLIVEIRA	PALMEIRA	01/09/2020	S/B	-7,22109	-35,91737	70W V.S	1				12	1	1	2	2	
08-2020 / 0021	RUA FRANCISCO MARIA DE OLIVEIRA	PALMEIRA	01/09/2020	S/B	-7,22111	-35,91712	70W V.S	1				12	1	1	2	2	
08-2020 / 0021	RUA FRANCISCO MARIA DE OLIVEIRA	PALMEIRA	01/09/2020	S/B	-7,20995	-35,90005	70W V.S	1				12	1	1	2	2	
08-2020 / 0021	RUA FRANCISCO MARIA DE OLIVEIRA	PALMEIRA	01/09/2020	S/B	-7,20967	-35,90007	70W V.S	1				12	1	1	2	2	
08-2020 / 0021	RUA FRANCISCO MARIA DE OLIVEIRA	PALMEIRA	01/09/2020	S/B	-7,21009	-35,90011	70W V.S	1				12	1	1	2	2	
08-2020 / 0021	RUA FRANCISCO MARIA DE OLIVEIRA	PALMEIRA	01/09/2020	S/B	-7,21032	-35,90022	70W V.S	1				12	1	1	2	2	
08-2020 / 0022	RUA FRANCISCO MARIA DE OLIVEIRA	PALMEIRA	01/09/2020	S/B	-7,21057	-35,90037	70W V.S	1				12	1	1	2	2	
08-2020 / 0022	RUA FRANCISCO MARIA DE OLIVEIRA	PALMEIRA	01/09/2020	S/B	-7,21098	-35,90041	70W V.S	1				12	1	1	2	2	
08-2020 / 0022	RUA FRANCISCO MARIA DE OLIVEIRA	PALMEIRA	01/09/2020	S/B	-7,21122	-35,90046	70W V.S	1				12	1	1	2	2	
08-2020 / 0022	RUA FRANCISCO MARIA DE OLIVEIRA	PALMEIRA	01/09/2020	S/B	-7,21146	-35,90052	70W V.S	1				12	1	1	2	2	
08-2020 / 0022	RUA FRANCISCO MARIA DE OLIVEIRA	PALMEIRA	01/09/2020	S/B	-7,21176	-35,90057	70W V.S	1				12	1	1	2	2	
08-2020 / 0022	RUA FRANCISCO MARIA DE OLIVEIRA	PALMEIRA	01/09/2020	S/B	-7,2121	-35,9006	70W V.S	1				12	1	1	2	2	
08-2020 / 0022	RUA FRANCISCO MARIA DE OLIVEIRA	PALMEIRA	01/09/2020	S/B	-7,21243	-35,90082	70W V.S	1				12	1	1	2	2	
08-2020 / 0022	RUA FRANCISCO MARIA DE OLIVEIRA	PALMEIRA	01/09/2020	S/B	-7,21274	-35,90075	70W V.S	1				12	1	1	2	2	
08-2020 / 0022	RUA FRANCISCO MARIA DE OLIVEIRA	PALMEIRA	01/09/2020	S/B	-7,21298	-35,90087	70W V.S	1				12	1	1	2	2	
08-2020 / 0022	RUA FRANCISCO MARIA DE OLIVEIRA	PALMEIRA	01/09/2020	S/B	-7,21323	-35,90051	70W V.S	1				12	1	1	2	2	
08-2020 / 0022	RUA FRANCISCO MARIA DE OLIVEIRA	PALMEIRA	01/09/2020	S/B	-7,21343	-35,90094	70W V.S	1				12	1	1	2	2	
08-2020 / 0022	RUA FRANCISCO MARIA DE OLIVEIRA	PALMEIRA	01/09/2020	S/B	-7,21367	-35,90103	70W V.S	1				12	1	1	2	2	
08-2020 / 0022	RUA FRANCISCO MARIA DE OLIVEIRA	PALMEIRA	01/09/2020	S/B	-7,21373	-35,90107	70W V.S	1				12	1	1	2	2	
08-2020 / 0023	RUA FRANCISCO MARIA DE OLIVEIRA	PALMEIRA	01/09/2020	S/B	-7,21429	-35,89817	70W V.S	1				12	1	1	2	2	
08-2020 / 0023	RUA FRANCISCO MARIA DE OLIVEIRA	PALMEIRA	01/09/2020	S/B	-7,21419	-35,89844	70W V.S	1				12	1	1	2	2	
08-2020 / 0023	RUA FRANCISCO MARIA DE OLIVEIRA	PALMEIRA	01/09/2020	S/B	-7,21405	-35,89867	70W V.S	1				12	1	1	2	2	
08-2020 / 0023	RUA FRANCISCO MARIA DE OLIVEIRA	PALMEIRA	01/09/2020	S/B	-7,21389	-35,89891	70W V.S	1				12	1	1	2	2	
08-2020 / 0023	RUA FRANCISCO MARIA DE OLIVEIRA	PALMEIRA	01/09/2020	S/B	-7,21378	-35,89914	70W V.S	1				12	1	1	2	2	
08-2020 / 0023	RUA FRANCISCO MARIA DE OLIVEIRA	PALMEIRA	01/09/2020	S/B	-7,21361	-35,89945	70W V.S	1				12	1	1	2	2	
08-2020 / 0023	RUA FRANCISCO MARIA DE OLIVEIRA	PALMEIRA	01/09/2020	S/B	-7,21354	-35,89975	70W V.S	1				12	1	1	2	2	
08-2020 / 0023	RUA FRANCISCO MARIA DE OLIVEIRA	PALMEIRA	01/09/2020	S/B	-7,21328	-35,90004	70W V.S	1				12	1	1	2	2	
08-2020 / 0023	RUA FRANCISCO MARIA DE OLIVEIRA	PALMEIRA	01/09/2020	S/B	-7,21317	-35,90033	70W V.S	1				12	1	1	2	2	
08-2020 / 0023	RUA FRANCISCO MARIA DE OLIVEIRA	PALMEIRA	01/09/2020	S/B	-7,21303	-35,90058	70W V.S	1				12	1	1	2	2	
08-2020 / 0023	RUA FRANCISCO MARIA DE OLIVEIRA	PALMEIRA	01/09/2020	S/B	-7,21282	-35,90087	70W V.S	1				12	1	1	2	2	

Certifico que os materiais ou serviços constantes do presente recibo foram integralmente recebidos ou prestados

Em 05/10/2020

Carla da Silva Oliveira Engenheira

CREA 1001450720-0/2018-PMCS/SEC08

Engenheiro Civil

CPF 062.780.244-92

CREA 564.497940

Carlos Laxim Sanjar

Diretor

CREA 5061075872

CPF: 282.187708-01

2020 / 0043	RUA BELARMINO BARBOSA	SÃO JOSÉ DA MATA	24/09/2020	S/B	-7.18133	-35.98503	70W V.S	1				12	1			1		2	2		
2020 / 0043	RUA BELARMINO BARBOSA	SÃO JOSÉ DA MATA	24/09/2020	S/B		-35.98469	70W V.S	1				12	1			1		2	2		
2020 / 0044	COMPLEXO PLINIO LEMOS	JOSÉ PINHEIRO	25/09/2020	S/B	-7.22117	-35.87066	150W V.S	1					1								
2020 / 0044	COMPLEXO PLINIO LEMOS	JOSÉ PINHEIRO	25/09/2020	S/B	-7.22108	-35.87072	150W V.S	1								1					
2020 / 0044	COMPLEXO PLINIO LEMOS	JOSÉ PINHEIRO	25/09/2020	S/B	-7.22101	-35.87061	150W V.S	1								1					
2020 / 0044	COMPLEXO PLINIO LEMOS	JOSÉ PINHEIRO	25/09/2020	S/B	-7.22088	-35.8707	150W V.S	1								1					
2020 / 0044	COMPLEXO PLINIO LEMOS	JOSÉ PINHEIRO	25/09/2020	S/B	-7.22129	-35.87058	150W V.S	1								1					
2020 / 0044	COMPLEXO PLINIO LEMOS	JOSÉ PINHEIRO	25/09/2020	S/B	-7.22042	-35.87066	150W V.S	1			25		1			1				1	
2020 / 0044	COMPLEXO PLINIO LEMOS	JOSÉ PINHEIRO	25/09/2020	S/B	-7.22022	-35.87053	150W V.S	1								1				1	
2020 / 0044	COMPLEXO PLINIO LEMOS	JOSÉ PINHEIRO	25/09/2020	S/B	-7.22045	-35.87041	150W V.S	1					1			1					
2020 / 0044	COMPLEXO PLINIO LEMOS	JOSÉ PINHEIRO	25/09/2020	S/B	-7.22027	-35.87061	150W V.S	1					1			1					
2020 / 0044	COMPLEXO PLINIO LEMOS	JOSÉ PINHEIRO	25/09/2020	S/B	-7.22006	-35.87055	150W V.S	1					1			1					
2020 / 0044	COMPLEXO PLINIO LEMOS	JOSÉ PINHEIRO	25/09/2020	S/B	-7.22063	-35.87043	150W V.S	1					1			1					
2020 / 0044	COMPLEXO PLINIO LEMOS	JOSÉ PINHEIRO	25/09/2020	S/B	-7.22069	-35.87051	150W V.S	1					1			1					
2020 / 0045	RUA MANOEL BATISTA	CATINGUEIRA	25/09/2020	S/B	-7.27336	-35.92438	IMPLANTACÃO	1						1		1		2	2		
2020 / 0045	RUA MANOEL BATISTA	CATINGUEIRA	25/09/2020	S/B	-7.27384	-35.92481	IMPLANTACÃO	1					15	1			1	2	2		
2020 / 0046	RUA MANOEL BATISTA	CATINGUEIRA	25/09/2020	S/B	-7.27285	-35.9239	IMPLANTACÃO			1				1				2	2		
2020 / 0046	RUA MANOEL BATISTA	CATINGUEIRA	25/09/2020	S/B	-7.27267	-35.92391	150W V.S	1						1							
2020 / 0046	RUA MANOEL BATISTA	CATINGUEIRA	25/09/2020	S/B	-7.27316	-35.9243	250W	1						1							
2020 / 0046	RUA MANOEL BATISTA	CATINGUEIRA	25/09/2020	S/B	-7.27354	-35.92454	70W V.S	1					12	1			1	2	2		
2020 / 0047	RUA MANOEL BATISTA	CATINGUEIRA	25/09/2020	S/B	-7.22716	-35.87493	IMPLANTACÃO	1			50		12	1			1	4	4	2	
2020 / 0047	GINÁSIO O MENINÃO	DINAMERICA	28/09/2020	S/B	-7.23612	-35.91402	2° 400W		2		22		2	2						1	
2020 / 0048	GINÁSIO O MENINÃO	DINAMERICA	28/09/2020	S/B	-7.23635	-35.91404	2° 400W		2		22		2	2						1	
2020 / 0048	GINÁSIO O MENINÃO	DINAMERICA	28/09/2020	S/B	-7.2364	-35.91401	2° 400W		2		22		2	2						1	
2020 / 0048	GINÁSIO O MENINÃO	DINAMERICA	28/09/2020	S/B	-7.23657	-35.9139	2° 400W		2		22		2	2						1	
2020 / 0048	GINÁSIO O MENINÃO	DINAMERICA	28/09/2020	S/B	-7.23674	-35.91382	IMPLANTACÃO				22									1	
2020 / 0048	GINÁSIO O MENINÃO	DINAMERICA	28/09/2020	S/B	-7.23671	-35.91362	IMPLANTACÃO				22									1	
2020 / 0048	GINÁSIO O MENINÃO	DINAMERICA	28/09/2020	S/B	-7.23661	-35.913475	IMPLANTACÃO				22									1	
2020 / 0048	GINÁSIO O MENINÃO	DINAMERICA	28/09/2020	S/B	-7.23662	-35.91333	IMPLANTACÃO				22									1	
2020 / 0048	GINÁSIO O MENINÃO	DINAMERICA	28/09/2020	S/B	-7.23656	-35.91324	IMPLANTACÃO				22									1	
2020 / 0048	GINÁSIO O MENINÃO	DINAMERICA	28/09/2020	S/B	-7.23643	-35.91319	IMPLANTACÃO				22									1	
2020 / 0049	COMPLEXO PLINIO LEMOS	JOSÉ PINHEIRO	29/09/2020	S/B	-7.22103	-35.87013	IMPLANTACÃO	2					90	2		1					
TOTAL								296	60	57	13	1260	4401	426	1	18	264	60	677	677	66


Rafael Gomes Leite
 Engenheiro Civil
 CPF 062.483.244-92
 CREA 16143879-0

Certifico que os materiais ou serviços
 constantes do presente recibo foram
 integralmente recebidos ou prestados
 Em, 05/10/2020
Genildo da Silva Oliveira - Engenheiro
 CREA 160143879-0 - Membro PMCG/SECOB


Carlos Lavini Sanjar
 Diretor
 CREA 5061075812
 CPF: 282.187708-01
