

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO

Nº OPERAÇÃO 1079138-20	Nº CONVÊNIO P+B 917556/2021	GESTOR MINISTÉRIO DAS CIDADES	PROGRAMA GESTÃO DE RISCOS E REPOSTAS A DESASTRES	ACÃO / MODALIDADE DRENAGEM URBANA SUSTENTÁVEL E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS	RECURSO OGU FAC
CONVENIENTE/COMPROSSÁRIO/CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB			LOCALIDADE / ENDEREÇO BAIRRO DE DINAMÉRICA EM CAMPINA GRANDE-PB	VALORES CONTRATADOS (R\$)	
OBJETO IMPLANTAÇÃO DE MACRO E MICRO DRENAGEM NA URBANIZAÇÃO E CANALIZAÇÃO DO RIACHO DE BODOCONGO			MUNICÍPIO / UF CAMPINA GRANDE/PB	REPASSE 5.360.733,00	INVESTIMENTO 7.100.377,09
			APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO IMPLANTAÇÃO DE MACRO E MICRO DRENAGEM NA URBANIZAÇÃO E	REPASSE 1.739.644,09	INVESTIMENTO 1.739.644,09

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Etapa	Meta / Submeta	Descrição da Meta / Submeta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	Repasso CP. Financ. Outros Investimento	Valor Total (R\$)	Acum. Período Anterior	Repasso (R\$)	Saldo a Reprogramar:	Valores Medidos (R\$)		Execução Física Acum.
												Medição nº:	6	
	TOTAL							7.100.377,09	2.373.503,64	0,00	0,00	270.326,75	2.643.830,39	37,24%
1	Meta 1.	RECURSOS CAIXA - CONSTRUÇÃO DE 200 METROS DE CANAL, PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS LATERAIS, DRENAGEM PLUVIAL DAS VIAS E A CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E CICLOVIAS		200,00	m			7.100.377,09	2.373.503,64	0,00	0,00	270.326,75	2.643.830,39	37,24%
1	Submeta 1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Licitado / Em Execução	1,00	m	2.08.010/2023 /SECOB/PMCG		310.669,19	148.630,96	-	-	-	148.630,96	47,84%
1	Submeta 1.2	CANAL PRINCIPAL	Licitado / Em Execução	200,00	m	2.08.010/2023 /SECOB/PMCG		5.641.066,22	1.920.181,30	251.566,75	-	-	2.171.748,05	38,50%
1	Submeta 1.3	VIAS DO CANAL - TERRAPLENAGEM	Licitado / Em Execução	200,00	m	2.08.010/2023 /SECOB/PMCG		207.106,78	169.205,67	-	-	-	169.205,67	81,70%
1	Submeta 1.4	VIAS LATERAIS - PAVIMENTAÇÃO	Licitado / Em Execução	4.000,00	m²	2.08.010/2023 /SECOB/PMCG		587.920,00	-	-	-	-	-	-
1	Submeta 1.5	SERVIÇOS DIVERSOS - CONTROLE TECNOLÓGICO	Licitado / Em Execução	1,00	%CT	2.08.010/2023 /SECOB/PMCG		50.917,90	30.550,74	10.183,58	-	-	40.734,32	80,00%
1	Submeta 1.6	SERVIÇOS DIVERSOS - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Licitado / Em Execução	1,00	%CT	2.08.010/2023 /SECOB/PMCG		302.697,00	104.934,97	8.576,42	-	-	113.511,39	37,50%

Acumulado Anterior: 33,43%


Local: Campina Grande-PB

Rafael Gomes Leite
Engenheiro Civil
CPF: 061.483.244-92
CREA: 1614297940

Data: 02 de fevereiro de 2024

João Kleber Lucena Machado
Secretário de Obras

Representante do Convênio: **SECRETARIA DE OBRAS**
Nome: João Kleber L. Machado
Cargo: Secretário de Obras







Etapa	Meta / Submeta	Descrição da Meta / Submeta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período	Física Acum.
-------	----------------	-----------------------------	----------	------------	-------	-----------------------------	----------	-------------------	------------------------	------------	---------------------------	--------------

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:


Rafael Gomes Leite
Engenheiro Civil
CRA-02
CPF: 061.161.42307940
CREA: 161.161.42307940





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3212-5AB5-03C5-0692

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RAFAEL GOMES LEITE (CPF 062.XXX.XXX-92) em 02/02/2024 08:38:56 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO (CPF 203.XXX.XXX-91) em 02/02/2024 08:43:13
(GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JOAB MACHADO (CPF 088.XXX.XXX-70) em 07/02/2024 15:07:24 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/3212-5AB5-03C5-0692>

CONCOMITANCIA N° 002302

OBJETO: CONTINUAÇÃO DE OBRAS ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 281 METROS DE CANAL, PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS LATERAIS, DRENAGEM PLUVIAL DAS VIAS E CONSTRUÇÃO DE BARRIERS CIRCULARES PROMOVENDO LIGAÇÃO ENTRE A AVENIDA RUI BARBOSA FREIXO E RUA FRANCISCO LOPES ATAVIAZ DAS VIAS LATERAIS, CAMPINA GRANDE.

DATA DA ORÇ: 18/05/2018

MESES: 6

PERÍODO SIMPLES: 01/11/2018

PERÍODO ACUMULADO: 18/05/2018

31/12/2018

31/12/2018

INSCRIÇÃO Nº	DATA DA FORMALIZAÇÃO	CONTRATO	Nº 2.08.010/2018	VALOR TOTAL DO CONTRATO (CET) + IPTU	8.778.654,17
VALOR CET	R\$ 7.100.377,69	VALOR DA MEDIÇÃO ANTERIOR CET	R\$ 2.275.593,64	VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL CET	R\$ 279.326,73
VALOR TOTAL DO CONTRATO (CET) + IPTU					R\$ 7.643.007,29

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO	ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NOS MESES		ACUMUL. ATUAL		SAÍDA	
					FISICO	FINANCEIRO	FISICO	FINANCEIRO	FISICO	FINANCEIRO	FISICO	FINANCEIRO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$ 310.800,19		R\$ 148.570,86		R\$ 148.570,86		R\$ 148.570,86		R\$ 148.570,86
1.1	PLACA DA OBRA EM CIMENTA DE AÇO GALVANIZADO	M²	640,94	53,00	R\$ 33.762,00	R\$ 20.576,96		R\$ 33.762,00	R\$ 20.576,96		R\$ 13,00	R\$ 11.520,12
1.2	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTERO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUINDO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DE ALMOXARIFADO EM CANTERO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUINDO PRATELETRAS, AF. 02/2015	M²	1.290,38	58.24	R\$ 74.820,78			R\$ 74.820,78			R\$ 58,24	R\$ 74.600,78
1.3	EXECUÇÃO DE PERFORAÇÃO EM CANTERO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUINDO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, AF. 02/2015	UN	1.112,18	68,04	R\$ 75.672,72			R\$ 75.672,72			R\$ 68,04	R\$ 75.902,33
1.4	AF. 02/2015 DE BARRIERS CIRCULARES EM CANTERO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUINDO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, AF. 02/2015	UN	891,53	16,57	R\$ 11.462,91			R\$ 11.462,91			R\$ 16,57	R\$ 75.902,33
1.5	AF. 02/2015 DE BARRIERS CIRCULARES EM CANTERO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUINDO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, AF. 02/2015	UN	2.129,31	1,00	R\$ 2.129,31			R\$ 2.129,31			R\$ 1,00	R\$ 2.129,31
1.6	LOCALIZAÇÃO DO PÓRTO DE CIMENTO EM CANTERO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUINDO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, AF. 02/2015	UN	46,27	1,00	R\$ 46,27			R\$ 46,27			R\$ 1,00	R\$ 46,27
1.7	LOCALIZAÇÃO DO PÓRTO DE CIMENTO EM CANTERO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUINDO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, AF. 02/2015	UN	445,39	1,00	R\$ 445,39			R\$ 445,39			R\$ 1,00	R\$ 445,39
1.8	LOCALIZAÇÃO DO PÓRTO DE CIMENTO EM CANTERO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUINDO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, AF. 02/2015	UN	130,87	1,00	R\$ 130,87			R\$ 130,87			R\$ 1,00	R\$ 130,87
1.9	AF. 02/2015 DE BARRIERS CIRCULARES EM CANTERO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUINDO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, AF. 02/2015	UN	210,65	1,00	R\$ 210,65			R\$ 210,65			R\$ 1,00	R\$ 210,65
1.10	RESERVATÓRIO DE ENCHIMENTO DO DUCTO DE TUBO TELA, INCLUINDO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, AF. 02/2015	UN	6,40	6,40	R\$ 6,40			R\$ 6,40			R\$ 6,40	R\$ 6,40
1.11	HERMETICO EM 25 (M) X 50 (MM) FOMENTO E INSTALAÇÃO AF. 11/2016	M	207,93	1,00	R\$ 207,93			R\$ 207,93			R\$ 1,00	R\$ 207,93
1.12	CERNA COM MEDIDAS DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPESURA DE 2,5 M, CRAVADOS 60 CM, COM 4 REDES ANIMAIS, INCLUINDO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, AF. 02/2015	M	81,21	14,00	R\$ 1.036,94			R\$ 1.036,94			R\$ 14,00	R\$ 1.036,94
2.0	CANAL PRINCIPAL - SERVIÇOS MECÂNICAS			R\$ 246.996,75		R\$ 246.996,75		R\$ 246.996,75		R\$ 246.996,75		R\$ 246.996,75
2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CANALADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENOS RAMOS DE TROVÃO, DIÂMETRO DE 0,20 M, COM TRATOR DE ESTERNA AF. 05/2018	M	0,44	1.030,00	R\$ 413,20			R\$ 413,20			R\$ 1,030,00	R\$ 413,20
2.2	LIMPEZA MECANIZADA DE CANALADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENOS RAMOS DE TROVÃO, DIÂMETRO DE 0,20 M, COM TRATOR DE ESTERNA AF. 05/2018	M	0,44	1.200,00	R\$ 528,00			R\$ 528,00			R\$ 1,200,00	R\$ 528,00
2.3	CARNA, MANOIA, E DESCARDA DE BENTUNHO EM CANALADA BASCULANTE EM 10 M - CARGA COM ESCAVADORA UNICASTE (CARGA DE 0,08 M³) 11 HP E DESCARDA LIME (UNIDADE 100 L) AF. 07/2018	M	16,33	3.750,00	R\$ 39.487,50			R\$ 39.487,50			R\$ 3,750,00	R\$ 39.487,50
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M, EM VIV. LIBERADA EM LITO NATURAL, UNIDADE MANOIA, AF. 07/2018	M³	3,70	52.667,50	R\$ 194.245,75			R\$ 194.245,75			R\$ 3,750,00	R\$ 194.245,75
2.5	ESPAVAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERNA, AF. 11/2018	M	1,65	2.750,00	R\$ 8.187,50			R\$ 8.187,50			R\$ 1,750,00	R\$ 8.187,50
2.6	CANAL PRINCIPAL - ESCAVAÇÃO MECÂNICA DO CANAL			R\$ 298.242,53		R\$ 298.242,53		R\$ 298.242,53		R\$ 298.242,53		R\$ 298.242,53
3.1	LOCALIZAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS, TOPÓGRAFIAS, INCLUSIVE TOPOGRÁFIA E NIVELAÇÃO	M	4,50	200,00	R\$ 916,00			R\$ 916,00			R\$ 100,00	R\$ 426,00
3.2	ESCALAÇÃO, CANTERA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE, DMT 100 M³, COM ESCAVADORA HIDRÁULICA DE LONCO ALTERNATE	M³	23,35	607,20	R\$ 14.152,10			R\$ 14.152,10			R\$ 607,20	R\$ 13.862,10

(Handwritten signature)

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
M. 15.996
SECOB/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
R. 50.104.517/4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Rafael Gomes Leite
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 012.103.244-92
CREA: 1614297940

CONCÓRDEIA Nº 022831

OBJETO: CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA FORNECER LÍQUIDA, CONSERVADO E EM ANÁLISES DE QUALIDADE EM CÁMERA FRIGÍFICA, LACTÍCIOS PARA LACTAR, DORRADO FLAVIA, DAS ESPÉCIES: 010 DE CALABRAS E 010 COM O PROMOTORIO INDICADO DENTRE A EMPRESA FURNADO PERITO E TUDO FINANCIADO COM RECURSOS DA VISA LATRABE, CAMPINA GRANDE.

DATA DA OS: 14/05/2023
 MENS: 5
 PERÍODO SINALES: 01/12/2023
 PERÍODO ACUMULADO: 14/05/2023

ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	EXECUTADO NO MES	ACUMULADO ATUAL	SALDO	
FISICO	FINANCEIRO	FISICO	FINANCEIRO	FISICO	FINANCEIRO
6					
VALOR CEF:	R\$ 7.160.377,99	VALOR DA MEDIÇÃO ANTERIOR CEF:	R\$ 2.273.250,64	VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL CEF:	R\$ 270.326,75
		VALOR DA MEDIÇÃO ANTERIOR CEF:		VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL CEF:	R\$ 2.623.250,38


BOLETIM DE MEDIÇÃO 06

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PRESTO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MES		ACUMULADO ATUAL		SALDO	
				FISICO	TOTAL	FISICO	FINANCEIRO	FISICO	FINANCEIRO	FISICO	FINANCEIRO	FISICO	FINANCEIRO
52	ESCORPACAO DE UMA TUBO DESCRITIVO COM ESCORPACAO DE 1774 AS 10 LARGURA MAIOR OU IGUAL A 18 E PESADA DE 3,54 AF. 140201	MT	41,10	720,00	R\$ 29.520,00	11.511,44		209,50	R\$ 11.201,56	720,00	R\$ 29.520,00		
60	CANAL PRINCIPAL - SINALIZACAO SINALIZACAO ALTERNATIVA CLIMATIZACAO PERIGUINHA	U	4,00	100,00	R\$ 600,00	600,00				100,00	R\$ 600,00		
61	TRAVAS DO VEICULO PRESENCIAIS	V	8,00	100,00	R\$ 800,00	800,00				100,00	R\$ 800,00		
70	CANAL PRINCIPAL - ESGOTAMENTO	H	7,42	1.100,00	R\$ 8.182,00	5.099,80		280,00	R\$ 1.464,00	1.000,00	R\$ 7.420,00		
71	ESCAVAÇÃO DE 1,00X1,00 M. COM 1,00 M DE PROFUNDIDADE	M	7,42	1.100,00	R\$ 8.182,00	5.099,80		280,00	R\$ 1.464,00	1.000,00	R\$ 7.420,00		
80	CANAL PRINCIPAL - FUNDACAO	M	2,51	3.000,00	R\$ 7.525,50	4.789,12		420,00	R\$ 1.050,00	2.500,00	R\$ 6.289,12		
81	PIRELA DE CIMENTO PORTLAND COM FUBA PARA LANTERNA	M	175,00	3.000,00	R\$ 525.000,00	217.500,00		180,00	R\$ 31.500,00	2.820,00	R\$ 556.500,00		
82	LABORIO COM MATERIAIS GRANULARES PARA LANTERNA	M	175,00	3.000,00	R\$ 525.000,00	217.500,00		180,00	R\$ 31.500,00	2.820,00	R\$ 556.500,00		
83	ENCOBRIMENTO COM FUBA GRANITICA ATRUINADA	M	408,64	374,00	R\$ 154.465,28	154.465,28				374,00	R\$ 154.465,28		
90	CANAL PRINCIPAL - ESTRUTURA DO CANAL	M	872,20	1.380,18	R\$ 1.199.156,72	781.983,13				1.380,18	R\$ 1.199.156,72		
91	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND - 150MPa, 30% DE FUBA DE ALTO VOLUIME FEAL INCLUSIVE LANCAMENTO AF. 1652021	M	612,20	600,00	R\$ 367.320,00	418,50		180,00	R\$ 67.380,00	585,80	R\$ 390.280,95		
92	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND - 150MPa, 30% DE FUBA DE ALTO VOLUIME FEAL INCLUSIVE LANCAMENTO AF. 1652021	M	612,20	600,00	R\$ 367.320,00	418,50		180,00	R\$ 67.380,00	585,80	R\$ 390.280,95		
93	LASTRO COM MATERIAIS GRANULARES PARA LANTERNA	M	175,00	3.000,00	R\$ 525.000,00	217.500,00		180,00	R\$ 31.500,00	2.820,00	R\$ 556.500,00		
94	LABORIO COM MATERIAIS GRANULARES PARA LANTERNA	M	175,00	3.000,00	R\$ 525.000,00	217.500,00		180,00	R\$ 31.500,00	2.820,00	R\$ 556.500,00		
95	LABORIO COM MATERIAIS GRANULARES PARA LANTERNA	M	175,00	3.000,00	R\$ 525.000,00	217.500,00		180,00	R\$ 31.500,00	2.820,00	R\$ 556.500,00		
100	CANAL PRINCIPAL - REVESTIMENTO	M	45,50	5.000,00	R\$ 227.500,00	220.142,00				7.358,00	R\$ 234.858,00		
101	ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND COM FUBA DE ALTO VOLUIME FEAL INCLUSIVE LANCAMENTO AF. 1652021	M	45,50	5.000,00	R\$ 227.500,00	220.142,00				7.358,00	R\$ 234.858,00		
110	CANAL PRINCIPAL - SINALIZACAO	M	33,50	300,00	R\$ 10.050,00	780,00				300,00	R\$ 10.050,00		
111	LABORIO COM MATERIAIS GRANULARES PARA LANTERNA	M	33,50	300,00	R\$ 10.050,00	780,00				300,00	R\$ 10.050,00		

Rafael Gomes Leite
 Engenheiro Civil
 CPF: 018.244.524-92
 CREM: 10142079-0

Rui Barbosa
 FISCAL DE CONTRATOS
 Nº 1.9596
 SEC. OB/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
 RUA: 50, 104, 517/4
 Coordenador de Obras
 SEC. OB/PMCG



CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: CONTABILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 200 METROS DE CANAL, INVESTIGAÇÃO DAS VÁZIAS LATENTES, PREVENÇÃO NATURAL DAS VÁZIAS E A CORREÇÃO DE CALÇADOS E DEGRADAÇÃO PROMOVENDO LIGAÇÃO ENTRE A VÁZIA LATENTE COMBATO PERÍODO E FIM FINANCIADO COM RECURSOS ATRIBUÍDOS PARA O CANAL DE VÁZIAS LATENTES.

DATA DA OBR: 14/05/2023
 MEDIDAS: 8
 PERÍODO SUPLENTE: 01/11/2023
 PERÍODO ACUMULADO: 31/12/2023

MEDIDA Nº:	6	DATA DA EMISSÃO:	02/02/2024	CONTRATO:	Nº 2.06.0102023	VALOR TOTAL DO CONTRATO (CET) - R\$:	8.778.943,77
VALOR CEF:	R\$ 7.190.277,09	VALOR DA APROVAÇÃO ANTERIOR CEF:	R\$ 2.371.500,64	VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL CEF:	R\$ 270.226,75	VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA CEF:	R\$ 2.642.003,39

BOLETIM DE MEDIÇÃO 06

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PRESTIÇO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
12.0	CANAL PRINCIPAL - BUEVEDERA	M3	348,85	128,00	R\$ 44.270,06	44.270,06	44.270,06	-	-	128,00	R\$ 44.270,06	44.270,06	-
12.1	DESCARTE DE CUBOS DE AREIA	M3	348,85	128,00	R\$ 44.270,06	44.270,06	44.270,06	-	-	128,00	R\$ 44.270,06	44.270,06	-
13.0	VÁZIO DO CANAL - TERRAPLENAGEM	M	4,50	405,00	R\$ 1.822,50	1.822,50	1.822,50	-	-	405,00	R\$ 1.822,50	1.822,50	-
13.1	ESCALONAMENTO DE CANTO DE CIMENTOS	M	2,55	922,51	R\$ 2.352,40	2.352,40	2.352,40	-	-	922,51	R\$ 2.352,40	2.352,40	-
13.2	ESCALONAMENTO DE CANTO DE CIMENTOS	M	2,55	922,51	R\$ 2.352,40	2.352,40	2.352,40	-	-	922,51	R\$ 2.352,40	2.352,40	-
13.3	ESCALONAMENTO DE CANTO DE CIMENTOS	M	2,55	922,51	R\$ 2.352,40	2.352,40	2.352,40	-	-	922,51	R\$ 2.352,40	2.352,40	-
14.0	VÁZIO DO CANAL - PONTA FINAL DO MATERIAL	M3	7,97	2.922,51	R\$ 23.392,40	23.392,40	23.392,40	-	-	2.922,51	R\$ 23.392,40	23.392,40	-
14.1	CARGA MÁQUINA E DESCARGA DE SACOS E MATERIAS	M3	7,97	2.922,51	R\$ 23.392,40	23.392,40	23.392,40	-	-	2.922,51	R\$ 23.392,40	23.392,40	-
14.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M, EM	M3	3,17	20.825,76	R\$ 65.320,26	65.320,26	65.320,26	-	-	20.825,76	R\$ 65.320,26	65.320,26	-
14.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M, EM	M3	3,17	20.825,76	R\$ 65.320,26	65.320,26	65.320,26	-	-	20.825,76	R\$ 65.320,26	65.320,26	-
14.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M, EM	M3	3,17	20.825,76	R\$ 65.320,26	65.320,26	65.320,26	-	-	20.825,76	R\$ 65.320,26	65.320,26	-
15.0	VÁZIO LATENTES - PAVIMENTAÇÃO	M3	6,03	1.600,00	R\$ 9.640,00	9.640,00	9.640,00	-	-	1.600,00	R\$ 9.640,00	9.640,00	-
15.1	ESCALONAMENTO DE CANTO DE CIMENTOS	M	2,55	922,51	R\$ 2.352,40	2.352,40	2.352,40	-	-	922,51	R\$ 2.352,40	2.352,40	-
15.2	ESCALONAMENTO DE CANTO DE CIMENTOS	M	2,55	922,51	R\$ 2.352,40	2.352,40	2.352,40	-	-	922,51	R\$ 2.352,40	2.352,40	-
15.3	ESCALONAMENTO DE CANTO DE CIMENTOS	M	2,55	922,51	R\$ 2.352,40	2.352,40	2.352,40	-	-	922,51	R\$ 2.352,40	2.352,40	-
15.4	ESCALONAMENTO DE CANTO DE CIMENTOS	M	2,55	922,51	R\$ 2.352,40	2.352,40	2.352,40	-	-	922,51	R\$ 2.352,40	2.352,40	-
15.5	ESCALONAMENTO DE CANTO DE CIMENTOS	M	2,55	922,51	R\$ 2.352,40	2.352,40	2.352,40	-	-	922,51	R\$ 2.352,40	2.352,40	-
15.6	ESCALONAMENTO DE CANTO DE CIMENTOS	M	2,55	922,51	R\$ 2.352,40	2.352,40	2.352,40	-	-	922,51	R\$ 2.352,40	2.352,40	-
15.7	ESCALONAMENTO DE CANTO DE CIMENTOS	M	2,55	922,51	R\$ 2.352,40	2.352,40	2.352,40	-	-	922,51	R\$ 2.352,40	2.352,40	-
16.0	SENDORES DIVERSOS - CONTROLE TECNOLÓGICO	MES	10,00	3,00	R\$ 30,00	30,00	30,00	-	-	3,00	R\$ 30,00	30,00	-
16.1	SENDORES DIVERSOS - CONTROLE TECNOLÓGICO	MES	10,00	3,00	R\$ 30,00	30,00	30,00	-	-	3,00	R\$ 30,00	30,00	-
17.0	SERVIÇOS DIVERSOS - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	50,00	6,00	R\$ 300,00	300,00	300,00	-	-	6,00	R\$ 300,00	300,00	-
17.1	SERVIÇOS DIVERSOS - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	50,00	6,00	R\$ 300,00	300,00	300,00	-	-	6,00	R\$ 300,00	300,00	-
				TOTAL CEF	R\$ 7.190.277,09		R\$ 2.371.500,64		R\$ 270.226,75		R\$ 2.642.003,39		R\$ 4.458.546,74

(Handwritten signature)

Rui Barbosa
 FISCAL RESPONSÁVEL
 Matr. 1596
 SEC. OB/PMCG

Raimundo Antônio S. Carvalho
 RN-162 04.517/4
 Coordenador de Obras
 SEC. OB/PMCG

Rafael Gomes Leite
 ESCRITÓRIO CIVIL
 CPF 052.483.244-92
 CREA 1614227940

CONCORRÊNCIA Nº 002/2023
 COBRLETO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 200 METROS DE CANAL PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS LATERAIS, DRENAGEM PLUVIAL DAS VIAS E A CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E CICLOVIAS PROMOVENDO UCAÇÃO ENTRE A AVENIDA FLOREANO PEIXOTO E RUA FRANCISCO LOREIS
 ATIVIDADES DAS VIAS LATERAIS, CAMPINA GRANDE.

ITEM	SERVIÇOS	QUANTIDADES						OBSERVAÇÃO								
		Final	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	ALTURA	VOLUME		EMPOLAMENTO	DENSIDADE	PESO	DIET	MES	H	UN	Partida
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES															
1.1	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		8,00			4,00								EXECUTADO:	32,00	M²
1.2	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTIERO DE OBRA EM ALVENARIA NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS AF_07/2015													EXECUTADO:	41,10	M²
1.3	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTIERO DE OBRA EM ALVENARIA INCLUSO PARA ELETRICIS AF_02/2015													EXECUTADO:	58,00	UN
1.4	EXECUÇÃO DE REBERTO EM CANTIERO DE OBRA EM ALVENARIA NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS AF_07/2015				56,00									EXECUTADO:	56,00	UN
1.5	CONTRA DE ENERGIA ELÉTRICA, ABRA, TRIPASCA, COM CAVALETE DE ALUMÍNIO, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DN 50A NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO AF_07/2020													EXECUTADO:	1,00	UN
1.6	UBAÇÃO DOMICILIAR DE ÁGUA DN 20MM, DO CANTIERO DE OBRAS													EXECUTADO:	1,00	UN
1.7	UBAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO TIPO II, DN 150MM, EM CAIXA DE GAXTA													EXECUTADO:	1,00	UN
1.8	CAIXA EM CONCRETO PRELIMINAR PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 200MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2015													EXECUTADO:	1,00	UN
1.9	ART GAVIETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PERMANENTE EM PISCINOLAVEL DN 25 (1") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EXCLUSIVAMENTE HIDRÔMETRO AF_11/2015													EXECUTADO:	1,00	UN
1.10	DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PARA O CANALIZANTE MOVEL, TIPO DO BLOCO DE CONCRETO													EXECUTADO:	80,00	UN
1.11	HIDRÔMETRO DN 25 (1") 1,50 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2015													EXECUTADO:	1,00	M²
1.12	GERAL COM INCLUIÇÕES DE CONCRETO - RETO - H:2,30 M ESPALHAMENTO DE 25 M, CHAVILDO 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_05/2020				354,00									EXECUTADO:	164,00	M
2.0	CANAL - PRINCIPAL - SERVIÇOS INICIAIS															



Rui Barbosa
 FISCAL DE EMPATOS
 Matr. 1659
 SECOR/P/MCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
 R. 1501, 102, 317, 4
 Cd. Operário da OBRAS
 SECOR/P/MCG

Rafael Gomes Leite
 Eng. Civil
 CPF: 52.483.244-92
 CREAT: 1014207940



CONCORRÊNCIA N.º 002/2023
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 200 METROS DE CANAL, PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS LATERAIS, DRENAGEM PLUVIAL DAS VIAS E A CONSTRUÇÃO DE CALÇADOS E CICLOVIAS PROMOVENDO LIGAÇÃO ENTRE A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO E RUA FRANCISCO LOPES
 ATRAVÉS DAS VIAS LATERAIS, CAMPINA GRANDE

ITEM	SERVIÇOS	QUANTIFICADORES										OBSERVAÇÃO						
		Final	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	ALTURA	VOLUME	EMPOLCAMENTO	DENSIDADE	PESO	DMT		MFG	H	UN	Parcela	Totais	
21	LIBREZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PÉCERES ANEXOS (CAMADA DE 10 CM DE ESPESURA) COM TRATOR DE ESTERNA AF 082018				6.213,32												6.213,32	ÁREA NO MAPA DE CUBAÇÃO
22	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PÉCERES ANEXOS (CAMADA DE 10 CM DE ESPESURA) COM TRATOR DE ESTERNA AF 082018				4.566,68												4.566,68	ÁREA NO MAPA DE CUBAÇÃO
23	CANAL, MANEIRA E DEBARRAÇA DE ENTALHO EM CANALIZADO REGULANTE 18" - CANAL COM ESCAVADORA HIDRÁULICA - C/CAMBIA DE 0,83 M ³ (1111)H7 E DESCORREJA LIVRE (UNIDADE MDL AF 07/2022)				1.831,84			1,28									2.277,30	
24	TRANSPORTE COM CAMINHÃO REGULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM LITO VARTUPAL (UNIDADE MDL AF 07/2022)				1.310,29			1,35									1.310,29	
25	ESPALHADOR DE CEMENTO COM TRATOR DE ESTERNA AF 11/2018				2.277,30												2.277,30	
30	CANAL PRINCIPAL - ESCAVAÇÃO MECÂNICA DO CANAL				100,00												100,00	
31	LOCUÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TIPOGRÁFICOS INCLUSIVE TIPOGRÁFO E NIVELADOR		100,00															
32	ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE, LAF R90 A 100MM, COM ESCAVADORA HIDRÁULICA DE 1,00MM AL CANDE				3.322,90			1,21									3.877,50	MAPA DE CUBAÇÃO - ALTIPO - JA TOR CONSIDERANDO O EMPOLCAMENTO PORQUE REALIZADO EM CORTES NA CUBAÇÃO E MANEIRA DO MDT ESPEC.
33	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERNA (159HPL) (AMMIA 3 118M3) AF 07/2018				1.009,75												1.009,75	MAPA DE CUBAÇÃO
34	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONITANTE E ASSINTELADA) COMPOSTO POR TRECHO COM ESCAVADORA (1,2 M) (LARG. DE 1,5 M A 2,5 M) EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, LOCALS COM BARRIO NIVEL INTERFERÊNCIA AF 08/2021				1.009,75												1.009,75	MAPA DE CUBAÇÃO
35	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,6 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONITANTE E ASSINTELADA) COMPOSTO POR TRECHO COM ESCAVADORA (1,2 M) (LARG. DE 1,5 M A 2,5 M) EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, LOCALS COM BARRIO NIVEL INTERFERÊNCIA AF 08/2021				403,90												403,90	MAPA DE CUBAÇÃO

Rui Barbosa
 FISCAL DE CONTAS
 Março/2023
 SEGOB/PMCG

Rafael Gomes Leite
 Engenheiro Civil
 CPF: 012.483.244-02
 CREM: 16142979/0

Assinado em: 20/03/2023
 Raimundo Antonio de Souza Carvalho
 CPF: 012.104.517-4
 Coordenador de Obras
 SEGOB/PMCG

CONCORRÊNCIA Nº 002/2023
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 300 METROS DE CANAL, PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS LATERAIS, DRENAGEM PLUVIAL DAS VIAS E A CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E CICLOVIAS PROMOVENDO LIGAÇÃO ENTRE A AVENIDA FLORESTA PEIXOTO E RUA FRANCISCO LORES
 ATRAVÉS DAS VIAS LATERAIS, CAMPINA GRANDE.

ITEM	SERVIÇOS	Final	CUMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	ALTURA	VOLUME	EMPOLAMENTO	DENSIDADE	PISO	DIAM	MES	H	UN	QUANTIFICADORES		OBSERVAÇÃO	
															Parcelas	Totais		
3.5	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MÁX. DE 3.0 M ATÉ 4.5 V. BORDA MOVENTE E ASSATELADA, COM RECALÇADO POR FERRAGEM, ESCAVADO EM 2.00 M DE LARGURA, EM 2.00 M DE PROFUNDIDADE, LOCALIZADA SOB O NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_0220231		200.00			0.90	403.90								EXECUTADO:	403.90	M	MAPA DE CUBAGEM
3.7	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3º CATEGORIA, COM TEMPORARIEDADE SOBRE ESTEIO, COM BOTA-FORRA		20.00			1.00	403.90								EXECUTADO:	403.90	M3	
3.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO ESCAVANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, LARGURA MÁXIMA AF_07/2020		20.00			1.00	403.90								EXECUTADO:	403.90	M3	
3.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO ESCAVANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA EM LENTO NATURAL (QUILÔMETRO MÁXIMO AF_07/2020)		20.00			1.00	403.90								EXECUTADO:	403.90	M3	
3.10	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM FATOR DE ESTERIAS AF_11/2019		20.00			1.00	403.90								EXECUTADO:	403.90	M3	
3.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO ESCAVANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, LARGURA MÁXIMA AF_07/2020		20.00			1.00	403.90								EXECUTADO:	403.90	M3	
3.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO ESCAVANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA EM LENTO NATURAL, LARGURA MÁXIMA AF_07/2020		20.00			1.00	403.90								EXECUTADO:	403.90	M3	
5.0	CANAL PRINCIPAL - ESCAVAMENTO DE VALAS		200.00			0.90	403.90								EXECUTADO:	403.90	M	

OBSERVAÇÃO: A SOMA DOS VOLUMES ESCAVADOS SEM CONSIDERAR O EMPOLAMENTO NOS ITENS 3.0 E 13.0 CORRESPONDE A AO QUANTITATIVO PRESENTE NO MAPA DE CUBAGEM.

Rui Barbosa
 FISCAL DE CONTRATOS
 Mat. 1.596
 SECOR/P/MCG

Raimundo Antonio de Souza Carvalho
 H-174
 U-4.517.4
 Coordenador de Obras
 SECOR/P/MCG

Rafael Gomes Leite
 Engenheiro Civil
 CPF: 052.965.544-02
 CREA: 101420194D

CONCORRENÇA Nº 003/2013
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ZONETES DE CANAL, PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS LATERAIS, DRENAGEM PLUVIAL DAS VIAS E A CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E CERCIVIAS PROMOVENDO LIGAÇÃO ENTRE A AVENIDA HORIZONAL PRÓXIMO A RUA FRANCISCO LOPES
 ATIVIDADES VAS LATERAIS, CAMPINA GRANDE.
 MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	SERVIÇOS	QUANTIDADES										RESERVAÇÃO								
		Final	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	ALTURA	VOLUME	EMPOLAMENTO	DENSIDADE	PESO	DIET		MES	H	UN	PREÇOS	TOTAL			
6.0	CANAL PRINCIPAL - SINALIZAÇÃO																			
6.1	SINALIZAÇÃO ALBERÇA E LINDAÇÃO PERQUINANÇA TRAVESANDO VEREDAS E PREDIÉTERES		150,00																	
7.0	CANAL PRINCIPAL - ESCOTAMENTO																			
7.1	ESGOTO PLÁSTICO D'ÁGUA E MATEMÁTICA CAPAC. 1.000 L (08 METROS)																			
8.0	CANAL PRINCIPAL - FUNDADO																			
8.1	REGULARIZAÇÃO MANUAL E CONVENCIONADO COM TACAS VERMELHAS		41,90	14,00																
8.2	ESTRUCOÇÃO ALTERNADA (SACULAS, TUBOS, VEREDA, 450x450) EM PEDRETA CAUSCOTE SOLA, (SPENSAIRA DE 10 CM, Nº 07/2019)		40,00	14,00																
8.3	EMPOLAMENTO COM TACAS GRANÍFICAS ASSURADA		100,00	14,00																
9.0	CANAL PRINCIPAL - ESTRUTURA DO CANAL																			
9.1	CONCRETO DE FUNDADO TUBO, A TAMPÃO, NA REGIÃO DE MÃO EY VOLUME REAL INCLUSIVE LANÇAMENTO E ASSURADO		40,00	14,00																
9.2	CONCRETO DE FUNDADO TUBO, TAMPÃO, NA REGIÃO DE MÃO EY VOLUME REAL INCLUSIVE LANÇAMENTO E ASSURADO		180,00	14,00																

[Handwritten signature]

Rui Barbosa
 FISCAL DE CONTRATOS
 Matr: 15986
 SECOB/PMCG

Rafael Gomes Leite
 Engenharia Civil
 CPF: 092.083.244-92
 CREA: 1614207940

RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
 Gerente de Obras
 CPF: 10.415.714
 SECOB/PMCG

CONCORRÊNCIA N.º 002/2023
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 200 METROS DE CANAL PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS LATERAIS, DRENAGEM PLUVIAL DAS VIAS E A CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E CIRCUNVALAÇÕES PROMOVENDO LIGAÇÃO ENTRE A AVENIDA FLOREANO PEIXOTO E RUA FRANCISCO LOPES ATRAVÉS DAS VIAS LATERAIS, CAMPINA GRANDE.
 MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	SERVIÇOS	QUANTIDADES							OBSERVAÇÃO							
		Final	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	ALTURA	VOLUME	EMPLANTAMENTO		DENSIDADE	PESO	DIF.	MES	H	UN	Parcelas
93	ESTRITO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLDO ESPRESSURA 5% (C/M AF 092009)	70,00			2,70									180,00		ESTRITO DE 10% PARA O LADO DA DRENAGEM
94	LUSTRO COM MATERIAL GRANULAR PEDRA BRANCA N.º 2, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLDO ESPRESSURA 5% (C/M AF 092017)	20,00		14,00		0,30								84,00		
95	FABRICAÇÃO, MONTELAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS PARA CONCRETO DE CONCRETO EM CUBOS DE 100X100X100 CM COM JUNTAS DE 1 CM (C/M AF 072019)	200,00				0,70							2,00	140,00		FORMA LITÔNIA PARA A FABRICAÇÃO DO CANAL
			130,00			3,40							1,00	612,00		PARTE DE LADO DIREITO
			130,00			7,54							1,00	402,00		PARTE DE LADO DIREITO
			70,00			3,00							1,00	21,00		PARTE DE LADO DIREITO
			70,00			1,16							1,50	40,00		PARTE DE LADO ESQUERDO
			40,00			1,00							1,50	42,00		PARTE DO LADO ESQUERDO
			40,00			1,95							1,00	42,00		
100	CANAL PRINCIPAL - REVESTIMENTO															
101	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 5,0 CM (PREPARO RECOMENDADO NA NORMA ABNT N.º 082008)															
110	CANAL PRINCIPAL - BARRAGENS															
111	DESENHO GERAL DA OBRA COM MATERIAL DISPONÍVEL AF 072021															
														30,00	900,00	UN
														300,00	300,00	
														400,00	400,00	
														50,00	50,00	
														150,00	150,00	
120	CANAL PRINCIPAL - ENCADERNADA															
121	ENCADERNADA COM SACOS DE AREIA	20,00		0,80		0,80							2,00	25,60		
		70,00		1,00		1,00							1,00	70,00		
		25,34		0,80		0,80							2,00	32,40		
130	VIAS DO CANAL - TERRAPLENAGEM															
131	LOGRADOURO PARA O USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE TOPOGRÁFO E INTELADOR	200,00												200,00		
132	ESCALAÇÃO GERAL DO ESTUDO DE VIAS DA CATEGORIA COM TRATAMENTO ESPECIAL (1:100) PARA A S. 200X1, AF 072020															
133	ESCALAÇÃO GERAL E TRANSPORTE DE SOLO SOBRE OUI 801 A 1000 COM ESCALONAMENTO HORIZONTAL DE 1:100															
														21.745,19		
														2.745,19		

[Handwritten signature]

Rui Barbosa
 FISCAL DO CONTRATO
 Matr. 15.966
 SEC. CO. B/P/M/Z/G

Rafael Gomes Leite
 Eng. Chefe Civil
 CPF: 062.483.244-92
 CREA: 16142979-10

Raimundo Antonio de Souza Carvalho
 Coordenador de Obras
 SEC. CO. B/P/M/Z/G




CONCORRÊNCIA Nº 002/2023
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 200 METROS DE CANAL, PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS LATERAIS, DRENAGEM PLUVIAL DAS VIAS E A CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E CICLOVIAS PROMOVENDO LIGAÇÃO ENTRE A AVENIDA RAIMUNDO PEROTO E RUA FRANCISCO LOPES
 ATRAVÉS DAS VIAS LATERAIS, CAMPINA GRANDE.

ITEM	SERVIÇOS	FINAL	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	ALTURA	VOLUME	EMPOLAMENTO	DENSIDADE	PESO	DMT	MES	H	UN	QUANTIDADES		OBSERVAÇÃO		
															Parcelas	Totais			
140	VIAS DO CANAL - BOTA FORA DO MATERIAL																		
141	CARGA MANOBRAL E DESMONTAGEM DE BLOCOS E MATERIAS COM MANOBRAS DE 1000 KG, MANOBRAS DE 1200 KG COM ESCALONERA HIPOLITE EM CALÇADURA DE 1200 KG 155 MP/ E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3); AF_07/2020																		
142	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M ³ EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM; AF_07/2020)						2745,19				14,00					19.216,32	M3XKM		
143	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M ³ EM VIA URBANA EM LETO NATURAL (UNIDADE: M3XKM, AF_07/2020)						2745,19				14,00					19.216,32	M3XKM		
144	ESPALENAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERNAS M ³ ; AF_07/2020						2745,19									2.745,19	M3		
160	SERVIÇOS DIVERSOS - CONTROLE TECNOLÓGICO																4,00	MES	
161	CONTROLE TECNOLÓGICO (TEMPERATURA, PAVIMENTAÇÃO E CONCRETO)											1,00				1,00			
170	SERVIÇOS DIVERSOS - ADMINISTRAÇÃO LOCAL											0,41				0,41			
171	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MÃO DE OBRA INDIRETA											0,56				0,56			
												0,05				0,05			
												0,32				0,32			
												0,14				0,14			
												0,17				0,17			
																2,25		MES	


Rui Barbosa Leite
 Engenheiro Civil
 CPF: 052.083.244-92
 CREA: 1614297940

Rui Barbosa
 FISCAL DE CONTABILIDADE
 Matr: 16596
 SECOP/PMCG


Raimundo Antonio S. Carvalho
 NN-16/04.517/4
 Coordenador de Obras
 SECOP/PMCG







Assinado por 2 pessoas: RAFAEL GOMES LEITE e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande1doc.com.br/verificacaopdf/B47-BDE8-F09-F78A> e informe o código FB47-BDE8-F09-F78A

Rafael Gomes Leite
Engenheiro Civil
CPF 08.893.244-92
CREA: 1614297940

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SEC0B/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
Rui-160.175.517/4
Coordenador de Obras
SEC0B/PMCG

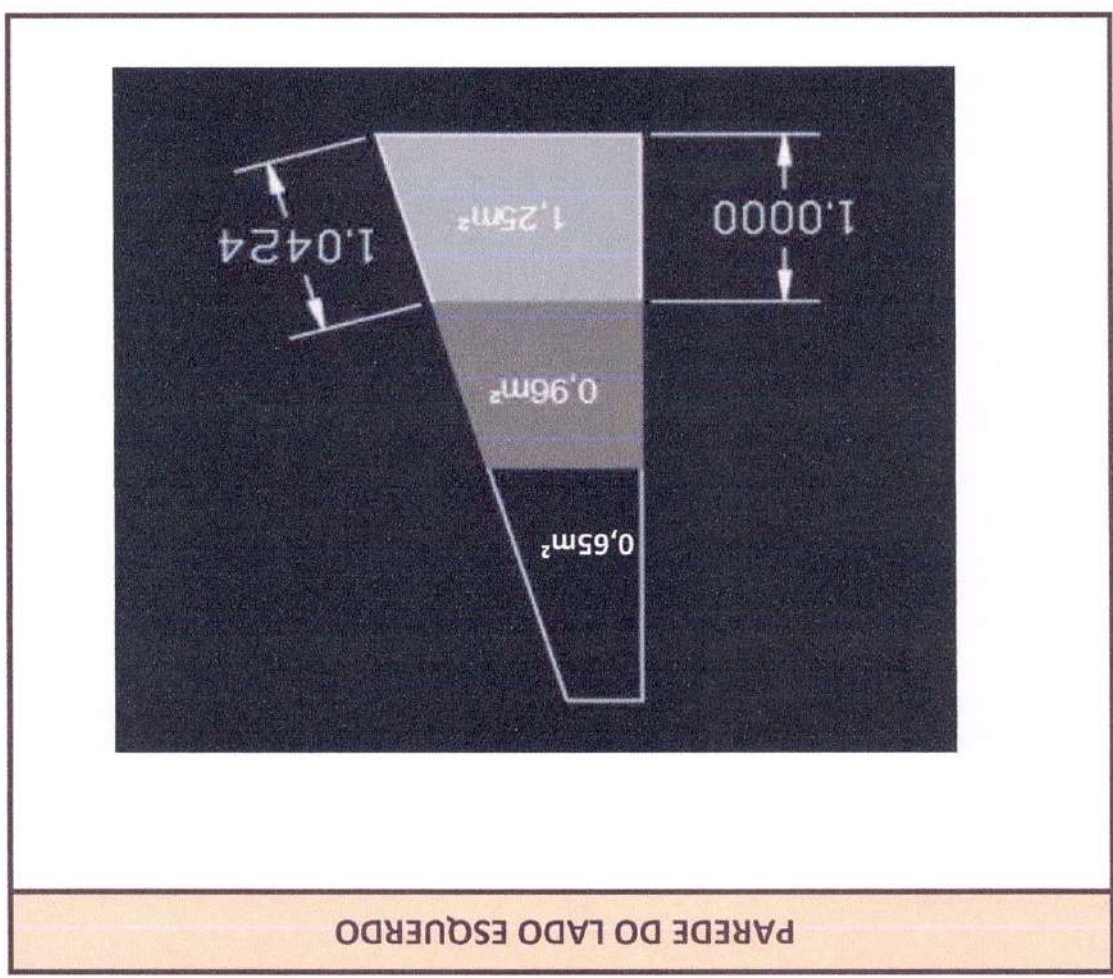




FOTO 01



FOTO 02

Rafael Gomes Leite
CPF: 012.924.492
CNPJ: 101420740

A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PASSOU O DIA EM MANUTENÇÃO E SÓ FOI LIBERADA POR VOLTA DAS 14H40, COM ISSO INICIOU AS ATIVIDADES COM A LIMPEZA DO LIXO QUE ESTAVA ATRAPALHANDO A PASSAGEM DA ÁGUA NO CANAL. A EQUIPE, INICIOU TAMBÉM A LIMPEZA NA ARMADURA DO PILAR DA PONTE, POIS DEVIDO A ENCHENTE NESSES ÚLTIMOS DIAS, O LIXO QUE FOI CARRREGADO PELA ÁGUA SE PRENDEU BASTANTE DAS FERRAGENS, COM O AUXÍLIO DA RETROESCAVADORA, CONSTRUÍMOS UMA DRENAGEM EM TODA LATERAL DO CANAL, COM O INTUITO DE EVITAR O ACÚMULO DE ÁGUA NAS PAREDES, TAMBÉM DEMOS CONTINUIDADE A PREPARAÇÃO PARA A CONCRETAGEM, COM A LOCAÇÃO DE NOVOS PAINEIS PARA AS FORMAS E A SUSTENTAÇÃO DESSE MATERIAL COM O USO DE BARROTES E ESCORAS E NA BASE DOS EQUIPAMENTOS O REFORÇO COM VERGALHÕES DE AÇO PARA QUE ASSIM NÃO SEJA POSSÍVEL O ACONTECIMENTO DE EMPÊCHOS NA OBRA, FINALIZAMOS NO PERÍODO DA TARDE A PAREDE QUE RECEBERÁ O PAINEL DE ENERGIA E AGORA ESTAMOS SÓ ESPERANDO A VISITA DA EQUIPE DA ENERGIA, PARA FINALIZARMOS O DIA, TRANSPORTAMOS OS MATERIAIS QUE ESTAVAM NO CANAL, COMO ESCORAS E GERADORES PARA O CANTIEIRO DE OBRAS.

REGISTRO DO DIA

CONDICÕES DO TEMPO		DATA: 01/12/2023						
	MANHÃ	TARDE	NOITE	S	T	Q	Q	S
RETROESCAVADORA								
MINIVAN								
ESCAVADORA HIDRÁULICA								
ROMPEDOR HIDRÁULICO								
CAÇAMBAS								
GERADOR A GASOLINA								
SERRA MÁRMORE								
FURADORA								
VIBRADOR								
MARTELETE								
COZINHEIRA								
OPERADOR DE ESCAVADORA HID.	1,00							
MOTORISTA	4,00							
OPERADOR DE RETROESCAVADORA	2,00							
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	-							
TOPOGRÁFO	40,00							
OPERADOR DE ROMPEDOR HIDRÁUL.	2,00							
FORMAS		1,00						
EXTENSÃO DE ENERGIA								
BOMBA D'ÁGUA								
CONTAINERS								
ENSECADOURAS								
MARTELETE								
VIBRADOR								
FURADORA								
SERRA MÁRMORE								
GERADOR A GASOLINA								
CAÇAMBAS								
ROMPEDOR HIDRÁULICO								
ESCAVADORA HIDRÁULICA								
MINIVAN								
RETROESCAVADORA	1,00							
ENGENHEIRO								
ARQUITETO								
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1,00							
ENCARRREGADO	-							
ARMADOR	1,00							
CARPINTEIRO	2,00							
PEDREIRO	1,00							
SERVENTE	1,00							
VIGIA	-							
COZINHEIRA	1,00							
MARTELETE								
ENSECADOURAS	150,00							
CONTAINERS	4,00							
BOMBA D'ÁGUA	2,00							
EXTENSÃO DE ENERGIA	-							
FORMAS	40,00							
TRAÇADOR	2,00							
MAQUITA	-							
ESCORAS	300,00							
MARTELETE	-							
TOTAL	506,00							
TOTAL			22,00					

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB
CONTRATADO: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE
OBJETO: CANALIZAÇÃO DO RIACHO DE BODOCONGÓ - 2ª ETAPA
ENDEREÇO: TRECHO - FLORIANO PEIXOTO/FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: WATHSNEIT DANTAS





Assinado por 2 pessoas: RAFAEL GOMES LETTE e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campaniagrande-1.doc.com.br/verificacao/FB47-8DE8-FC09-F78A> e informe o código FB47-8DE8-FC09-F78A

Raimundo Antonio S. Carvalho
 Coordenador de Obras
 RN-1810045174
 SEC08/PMCG

Rafael Gomes Lette
 Engenharia Civil
 CPF: 162.03.244-92
 CREA: 1314297940

Rui Barbosa
 FISCAL DE CONTRATOS
 Maio/1996
 SEC08/PMCG

COORDENADAS:	7°14'35,5"S 35°54'55,9"W
LOCAL:	CANAL DE BODOCONGÔ.



COORDENADAS:	7°14'35,5"S 35°54'55,9"W
LOCAL:	CANAL DE BODOCONGÔ.



COORDENADAS:	7°14'35,5"S 35°54'55,9"W
LOCAL:	CANAL DE BODOCONGÔ.




COORDENADAS:	7°14'35,5"S 35°54'55,9"W
LOCAL:	CANAL DE BODOCONGÔ.


COORDENADAS:	7°14'35,5"S 35°54'55,9"W
LOCAL:	CANAL DE BODOCONGÔ.



COORDENADAS:	7°14'35,5"S 35°54'55,9"W
LOCAL:	CANAL DE BODOCONGÔ.

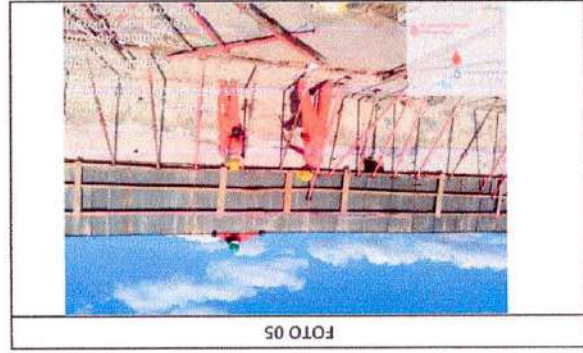

COORDENADAS:	7°14'35,5"S 35°54'55,9"W
LOCAL:	CANAL DE BODOCONGÔ.

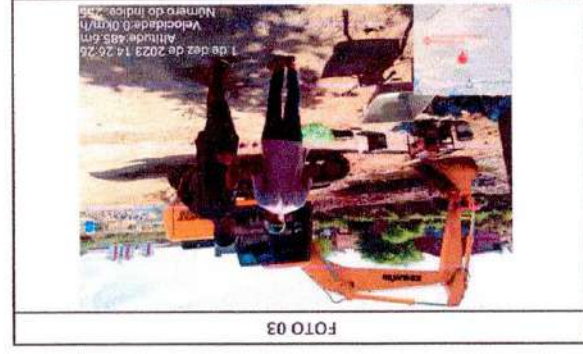

COORDENADAS:	7°14'35,5"S 35°54'55,9"W
LOCAL:	CANAL DE BODOCONGÔ.



Assinado por 2 pessoas: RAFAEL GOMES LEITE e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/FB47-BDE8-FC09-F78A> e informe o código FB47-BDE8-FC09-F78A

Rafael Gomes Leite
 Engenharia Civil
 CEF 06.140.244-92
 CREA: 1614207040

Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN-160.4.5174
 Coordenador de Obras
 SECOB/PMCG

Rui Barbosa
 FISCAL DE CONTRATOS
 Matr. 1696
 SECOB/PMCG

COORDENADAS:	7°14'35,5"S 35°54'55,9"W
LOCAL:	CANAL DE BODOCONGO.

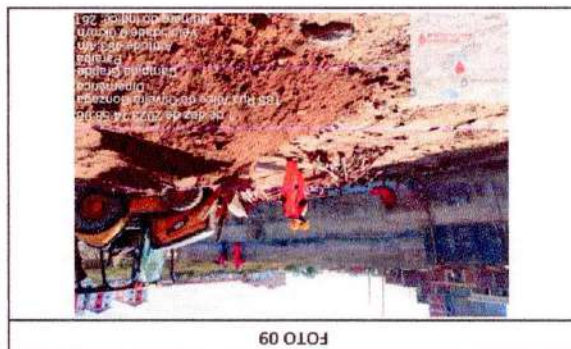



FOTO 09

Rui Barbosa
 FISCAL DE CONTABILIDADE
 Matr. 1596
 SEC08/PMCG

Raimundo Antônio, (Carvalho)
 Coordenador de Obras
 RM-160.457.4
 SEC08/PMCG

Rafael Gomes Leite
 Engenheiro Civil
 CPF 012.481.244-92
 CREA 1014297940

COORDENADAS:	7°14'35,5"S 35°54'55,9"W
LOCAL:	CANAL DE BODOCONGÔ.

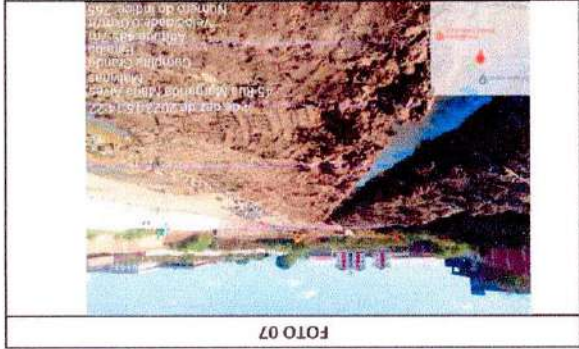

COORDENADAS:	7°14'35,5"S 35°54'55,9"W
LOCAL:	CANAL DE BODOCONGÔ.



COORDENADAS:	7°14'35,5"S 35°54'55,9"W
LOCAL:	CANAL DE BODOCONGÔ.



COORDENADAS:	7°14'35,5"S 35°54'55,9"W
LOCAL:	CANAL DE BODOCONGÔ.

COORDENADAS:	7°14'35,5"S 35°54'55,9"W
LOCAL:	CANAL DE BODOCONGÔ.



COORDENADAS:	7°14'35,5"S 35°54'55,9"W
LOCAL:	CANAL DE BODOCONGÔ.




COORDENADAS:	7°14'35,5"S 35°54'55,9"W
LOCAL:	CANAL DE BODOCONGÔ.




COORDENADAS:	7°14'35,5"S 35°54'55,9"W
LOCAL:	CANAL DE BODOCONGÔ.



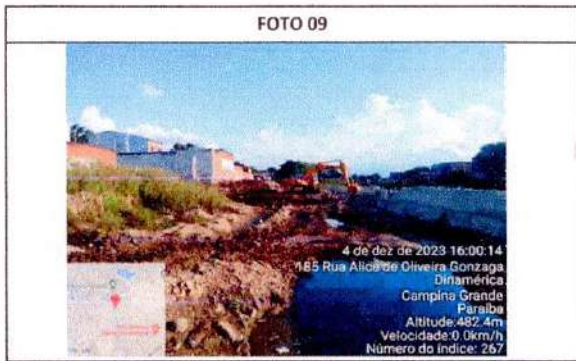

COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.

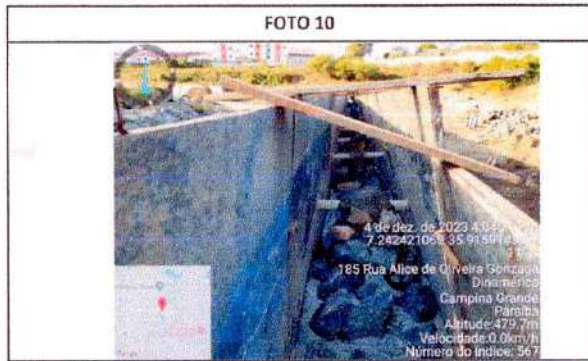

COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Rafael Gomes Leite
Engenheiro Civil
CPF: 162.483.244-92
CREA: 1614297940

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL GOMES LEITE e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/FB47-BDE8-FC09-F78A> e informe o código FB47-BDE8-FC09-F78A






COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.

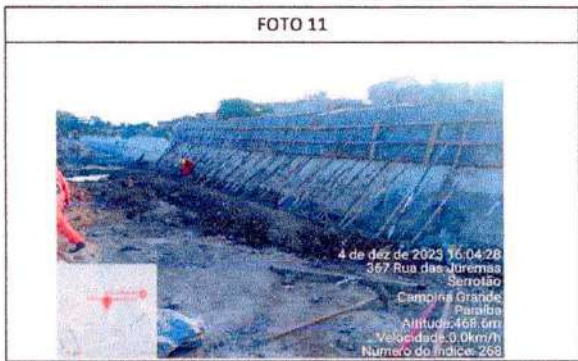

COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.


Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-10.704.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Rafael Gomes Leite
Engenheiro Civil
CPF 062.483.244-92
CREA: 1614297940

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL GOMES LEITE e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/FB47-BDE8-FC09-F78A> e informe o código FB47-BDE8-FC09-F78A



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB										
CONTRATADO: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE										
OBJETO: CANALIZAÇÃO DO RIACHO DE BODOCONGÓ - 2ª ETAPA										
ENDEREÇO: TRECHO - FLORIANO PEIXOTO/FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA										
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: WATHISNEIT DANTAS										
DATA:		05/12/2023					CONDIÇÕES DO TEMPO			
S	T	Q	Q	S	S	D	BOM	MANHÃ	TARDE	NOITE
	X						NUBLADO			
							CHUVA			
EQUIPAMENTOS						QUANT.	EFETIVO			QUANT.
RETROESCAVADEIRA						1,00	ENGENHEIRO			1,00
MINIVAM						-	ARQUITETO			-
ESCAVADEIRA HIDRAULICA						1,00	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			2,00
ROMPEDOR HIDRAULICO						1,00	ENCARREGADO			1,00
CAÇAMBAS						4,00	ARMADOR			-
GERADOR A GASOLINA						2,00	CARPINTEIRO			3,00
SERRA MÁRMORE						1,00	PEDREIRO			1,00
FURADEIRA						-	SERVENTE			7,00
VIBRADOR						-	VIGIA			2,00
MARTELETE						-	COZINHEIRA			-
ENSECADEIRAS						150,00	OPERADOR DE ESCAVADEIRA HID.			1,00
CONTAINERS						4,00	MOTORISTA			1,00
BOMBA D'ÁGUA						-	OPERADOR DE RETROESCAVADEIR			1,00
EXTENSÃO DE ENERGIA						-	AUXILIAR DE LABORATÓRIO			-
FORMAS						40,00	TOPOGRÁFO			1,00
TRAÇADOR						-	OPERADOR DE ROMPEDOR HIDRÁ			1,00
MAQUITA						-				
ESCORAS						390,00				
MARTELETE						-				
TOTAL						594,00	TOTAL			22,00

REGISTRO DO DIA

HOJE, INICIAMOS O DIA COM A DRENAGEM DA ÁGUA QUE AINDA PERMANECE NAS LATERAIS DO CANAL, PARA ISSO UTILIZAMOS O MOTOR BOMBA PARA ESSA ATIVIDADE, TAMBÉM DURANTE A MANHÃ, ESTÁVAMOS FINALIZANDO OS PREPAROS PARA MAIS UMA ETAPA DA CONCRETAGEM, ETAPA ESSA, QUE TERÁ O PRIMEIRO TRECHO DA PAREDE COM SUA ALTURA NA COTA FINAL. REALIZAMOS A COLOCAÇÃO DOS BARBACÃS NO SETOR QUE SERÁ CONCRETADO PARA AUXILIAR NA DRENAGEM DA ÁGUA QUE FICARÁ ACUMULADA. NO TURNO NA TARDE, ESTÁVAMOS A ESPERA DO FORNECIMENTO DO MATERIAL, MAS DURANTE ESSE TEMPO, REALIZAMOS A ORGANIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUE ESTAVAM NO CANAL E REALIZAMOS O TRANSPORTE DE PEDRAS RACHÃO QUE SERÃO USADAS JUNTO COM O CONCRETO CICLÓPICO NA PAREDE DO CANAL, O PRIMEIRO CAMINHÃO CHEGOU POR VOLTA DAS 15H40 E FOI ENCAMINHADO PARA O ENSAIO DO SLUMP E TEVE RESULTADO DE 10 CM E PORTANTO LIBERADO PARA USO, POIS ESTÁ DENTRO DOS PAR METROS EXIGIDO NO PROJETO, PARA AUXILIAR NO LEVANTAMENTO DAS PEDRAS RACHÃO, UTILIZAMOS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E DA RETROESCAVADEIRA, POIS ASSIM, ACELERA NO PROCESSO DE CONCRETAGEM, NO ADENSAMENTO DO MATERIAL, UTILIZAMOS O VIBRADOR MEÂNICO, PARA MINIMIZAR OS ESPAÇOS VAZIOS NO CONCRETO E MELHORAR A RESISTÊNCIA DO MATERIAL. O CARPINTEIRO, INICIOU A CONSTRUÇÃO DAS FÔRMAS DE MADEIRITE QUE SERÃO USADAS PARA A CONCRETAGEM DO PILAR DA PONTE.

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antônio S. Carvalho
RN-1602/2017-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Rafael Gomes Leite
Engenheiro Civil
CPF 012.483.244-92
CREA: 1614297840




FOTO 01



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.

FOTO 02



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.

FOTO 03



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.

FOTO 04



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.

FOTO 05



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.

FOTO 06



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.

FOTO 07



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.

FOTO 08



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.

Raimundo Antonio S. Carvalho
 IN-15010-015174
 Coordenador de Obras
 SECOP/PMCG

Rafael Gomes Leite
 Engenheiro Civil
 CPF 062.113.244-92
 CREA: 1614297940

Rui Barbosa
 FISCAL DE CONTRATOS
 Mat. 1696
 SECOP/PMCG

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL GOMES LEITE e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campingrande.1doc.com.br/verificacao/FB47-BDE8-FC09-F78A> e informe o código FB47-BDE8-FC09-F78A



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.

COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.

COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.

COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.

COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.

Raimundo Antônio de Souza Carvalho
RN-161.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1896
SECOB/PMCG

Rafael Gomes Leite
Engenheiro Civil
CPF 012.483.244-92
CREA: 1614297940

[Handwritten signature]

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL GOMES LEITE e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/FB47-BDE8-FC09-F78A> e informe o código FB47-BDE8-FC09-F78A



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB

CONTRATADO: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE

OBJETO: CANALIZAÇÃO DO RIACHO DE BODOCONGÓ - 2ª ETAPA

ENDEREÇO: TRECHO - FLORIANO PEIXOTO/FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: WATHISNEIT DANTAS



DATA:							06/12/2023							CONDIÇÕES DO TEMPO			
S	T	Q	Q	S	S	D	BOM	MANHÃ	TARDE	NOITE							
		X						X	X								
							NUBLADO										
							CHUVA										
EQUIPAMENTOS							QUANT.	EFETIVO				QUANT.					
RETROESCAVADEIRA							1,00	ENGENHEIRO				1,00					
MINIVAM							-	ARQUITETO				-					
ESCAVADEIRA HIDRAULICA							1,00	ASSISTENTE ADMININSTRATIVO				2,00					
ROMPEDOR HIDRAULICO							1,00	ENCARREGADO				1,00					
CAÇAMBAS							4,00	ARMADOR				-					
GERADOR A GASOLINA							2,00	CARPINTEIRO				3,00					
SERRA MÁRMORE							1,00	PEDREIRO				1,00					
FURADEIRA							-	SERVENTE				7,00					
VIBRADOR							-	VIGIA				2,00					
MARTELETE							-	COZINHEIRA				-					
ENSECADEIRAS							150,00	OPERADOR DE ESCAVADEIRA HID.				1,00					
CONTEINERS							4,00	MOTORISTA				1,00					
BOMBA D'ÁGUA							-	OPERADOR DE RETROESCAVADEIR				1,00					
EXTENSÃO DE ENERGIA							-	AUXILIAR DE LABORATÓRIO									
FORMAS							40,00	TOPOGRÁFO				1,00					
TRAÇADOR							-	OPERADOR DE ROMPEDOR HIDRÁ				1,00					
MAQUITA							-										
ESCORAS							390,00										
MARTELETE							-										
TOTAL							594,00	TOTAL				22,00					

REGISTRO DO DIA

HOJE, NO FINAL DO TURNO, REALIZAMOS A ENTREGA DE UM MOTOR BOMBA QUE ESTAVA SENDO USADO PARA A DRENAGEM DA ÁGUA QUE ESTAVA PRESENTE NAS LATERAIS DO CANAL. NO PERÍODO DA MANHÃ, REALIZAMOS A LOCAÇÃO DAS FÔRMAS DE MADEIRITE, AS QUAIS SERÃO USADAS PARA A CONCRETAGEM DO PRIMEIRO UM METRO DO PILAR DA PONTE, TAMBÉM REALIZAMOS A COLOCAÇÃO DOS BARBACÃS, COM O INTUITO DE AJUDAR NA DRENAGEM DA ÁGUA QUE SERÁ ACUMULADA. DURANTE O TURNO DA TARDE, REALIZAMOS A DRENAGEM DA ÁGUA QUE ESTAVA PRESENTE NO LASTRO QUE LIGARÁ AS MANILHAS DAS RUAS LATERAIS COM AS LOCADAS NO CANAL, A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTAVA REALIZANDO A LIMPEZA DO SETOR QUE TERÁ ATIVIDADES DE TERRAPLANAGEM PARA AS FUTURAS VIAS PAVIMENTADAS, NO ENTANTO, NO HORÁRIO DAS 14H30 APRESENTOU DEFEITO E FOI GUARDADA NO CANTEIRO DE OBRA. AINDA NO PERÍODO DA TARDE, O PRIMEIRO CAMINHÃO BETONEIRA CHEGOU POR VOLTA DAS 15H20 E LOGO FOI ENCAMINHADO PARA O ENSAIO DO SLUMP, O QUAL TEVE RESULTADO DE 12 CM, ESTANDO NOS CRITÉRIOS EXIGIDOS NO PROJETO, COM ISSO FOI LIBERADO PARA USO. DURANTE ESSA NOVA CONCRETAGEM, QUE TERÁ MAIS UM TRECHO DA PAREDE COM SUA COTA FINAL, TIVEMOS EMPECILHOS, POIS O USO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SERIA DE GRANDE IMPORTANCIA PARA A COLOCAÇÃO DAS PEDRAS RACHÃO JUNTO COM O CONCRETO CICLÓPICO, COM ISSO A CONCRETAGEM SE ESTENDEU NO HORÁRIO E SÓ FINALIZAMOS NO TURNO DA NOITE.

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Reimundo Antônio S. Carvalho
RN-19714517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Rafael Gomes Leite
Engenheiro Civil
CPF 002.483.244-92
CREA: 1614297940

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL GOMES LEITE e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/FB47-BDE8-FC09-F78A> e informe o código FB47-BDE8-FC09-F78A





COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.

Rafael Gomes Leite
Engenheiro Civil
CPF: 164.183.244-02
CREA: 1614297940

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
SECOP/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-161.04.517/4
Coordenador de Obras
SECOP/PMCG

[Handwritten signature]

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL GOMES LEITE e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/FB47-BDE8-FC09-F78A> e informe o código FB47-BDE8-FC09-F78A



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.

COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.

COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.

COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.

Rafael Gomes Leite
Engenheiro Civil
CPF: 32.493.244-92
CREA: 16142079-0

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
M31.1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-14517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

(Handwritten signature)

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL GOMES LEITE e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/FB47-BDE8-FC09-F78A> e informe o código FB47-BDE8-FC09-F78A



FOTO 15




6 de dez. de 2023 7:34:45 PM
7.24193459S 35.91615079W
183° S
28 Rua Margarida Maria Alves
Malvinas
Campina Grande
Paraíba
Altitude: 475.9m
Velocidade: 0.0km/h
Número do Índice: 579

COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.101.5714
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Rafael Gomes Leite
Engenheiro Civil
CPF: 162.085.244-92
CREA: 1614297940

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB										
CONTRATADO: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE										
OBJETO: CANALIZAÇÃO DO RIACHO DE BODOCONGÓ - 2ª ETAPA										
ENDEREÇO: TRECHO - FLORIANO PEIXOTO/FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA										
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: WATHISNEIT DANTAS										
DATA:		07/12/2023					CONDIÇÕES DO TEMPO			
S	T	Q	Q	S	S	D	BOM	MANHÃ	TARDE	NOITE
			X				NUBLADO			
							CHUVA			
EQUIPAMENTOS						QUANT.	EFETIVO			QUANT.
RETROESCAVADEIRA						1,00	ENGENHEIRO			1,00
MINIVAM						-	ARQUITETO			-
ESCAVADEIRA HIDRAULICA						1,00	ASSISTENTE ADMININSTRATIVO			2,00
ROMPEDOR HIDRAULICO						1,00	ENCARREGADO			1,00
CAÇAMBAS						4,00	ARMADOR			-
GERADOR A GASOLINA						2,00	CARPINTEIRO			3,00
SERRA MÁRMORE						1,00	PEDREIRO			1,00
FURADEIRA						-	SERVENTE			7,00
VIBRADOR						-	VIGIA			2,00
MARTELETE						-	COZINHEIRA			-
ENSECADEIRAS						150,00	OPERADOR DE ESCAVADEIRA HID.			1,00
CONTEINERS						4,00	MOTORISTA			1,00
BOMBA D'ÁGUA						-	OPERADOR DE RETROESCAVADEIR			1,00
EXTENSÃO DE ENERGIA						-	AUXILIAR DE LABORATÓRIO			-
FORMAS						40,00	TOPOGRÁFO			1,00
TRAÇADOR						-	OPERADOR DE ROMPEDOR HIDRÁ			1,00
MAQUITA						-				
ESCORAS						350,00				
MARTELETE						-				
TOTAL						554,00	TOTAL			22,00


REGISTRO DO DIA

FORAM ENTREGUES PELA EQUIPE, 40 ESCORAS QUE FORAM ALUGADAS DA PROMINA. HOJE, REALIZAMOS A FINALIZAÇÃO PARA A LOCAÇÃO DAS FÔRMAS PARA O CONCRETAGEM DO PRIMEIRO 1 M DO PILAR NA PONTE, PARA EVITARMOS EMPECILHOS DURANTE ESSA ATIVIDADE, COLOCAMOS EM TORNO DESSES MATERIAIS PARA AJUDAR NA SUSTENTAÇÃO, ESCORAS E BARROTES, DURANTE O PERÍODO DE ESPERA DO FORNECIMENTO DO CONCRETO, A EQUIPE REALIZOU O TRANSPORTE DE TODO MATERIAL QUE ESTAVA PRESENTE NO CANAL, POIS DEVIDO AO FERIADO QUE SE INICIAVA NO DIA POSTERIOR, NOS TROUXE PREOCUPAÇÃO COM OS EQUIPAMENTOS, APROVEITANDO ESSA ATIVIDADE, REALIZAMOS TAMBÉM A LIMPEZA DOS PAINÉIS METÁLICOS COM O USO DE DESMOLDANTE, EQUIPAMENTOS QUE ESTÃO SENDO ESSENCIAIS NA CONCRETAGEM DAS PAREDES DO CANAL. COM A CHEGADA DO CONCRETO POR VOLTA DA 16H50, REALIZAMOS O PROCEDIMENTO DE SLUMP E LIBERAMOS PARA USO, DESSA VEZ, USAMOS UM CONCRETO QUE APRESENTA CARACTERÍSTICAS DE TER FCK 30 MPA, COMO ESTÁ SENDO EXIGIDO EM PROJETO PARA PONTE, PARA MELHORAR NO ADENSAMENTO DO CONCRETO, UTILIZAMOS UM VIBRADOR MECÂNICO, PARA QUE ASSIM, SEJA POSSÍVEL A DIMINUIÇÃO DE ESPAÇOS VAZIOS NO CONCRETO E COM ISSO MELHORAR A RESISTÊNCIA DO MATERIAL. NESSA ETAPA DA CONCRETAGEM, UTILIZAMOS 5 M³ E FINALIZAMOS O TRABALHO POR VOLTA DAS 20H.

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
RIN-160.144.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Rafael Gomes Leite
Engenheiro Civil
CPF 012.483.214-92
CREA: 1614297940





COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.




COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.

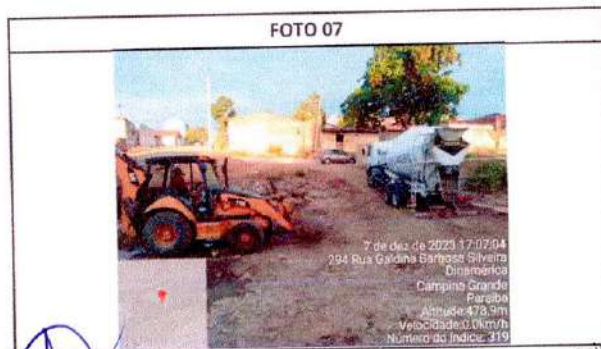

Rafael Gomes Leite
Engenheiro Civil
CPF 062.483.244-92
CREA: 1614297940

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1.896
SECOB/PMCG



Raimundo Antonio de Souza Carvalho
Rui-16.142.979-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Rafael Gomes Leite

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL GOMES LEITE e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://icampinagrande.1doc.com.br/verificacao/FB47-BDE8-FC09-F78A> e informe o código FB47-BDE8-FC09-F78A



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.

COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SEC08/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160. 4.517/4
Coordenador de Obras
SEC08/PMCG

Rafael Gomes Leite
Engenheiro Civil
CPF 012.433.244-92
CREA: 1614297940





FOTO 09




COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.


Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG


Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-16/04.517/4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG


Rafael Gomes Leite
Engenheiro Civil
CPF: 032.483.244-92
CREA: 1614297940



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB
 CONTRATADO: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE
 OBJETO: CANALIZAÇÃO DO RIACHO DE BODOCONGÓ - 2ª ETAPA
 ENDEREÇO: TRECHO - FLORIANO PEIXOTO/FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA
 ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: WATHISNEIT DANTAS



DATA:		08/12/2023					CONDIÇÕES DO TEMPO			
S	T	Q	Q	S	S	D	BOM	MANHÃ	TARDE	NOITE
				X				X	X	
							NUBLADO			
							CHUVA			
EQUIPAMENTOS						QUANT.	EFETIVO			QUANT.
RETROESCAVADEIRA						1,00	ENGENHEIRO			1,00
MINIVAM						-	ARQUITETO			-
ESCAVADEIRA HIDRAULICA						1,00	ASSISTENTE ADMININSTRATIVO			2,00
ROMPEDOR HIDRAULICO						1,00	ENCARREGADO			1,00
CAÇAMBAS						4,00	ARMADOR			-
GERADOR A GASOLINA						2,00	CARPINTEIRO			3,00
SERRA MÁRMORE						1,00	PEDREIRO			1,00
FURADEIRA						-	SERVENTE			7,00
VIBRADOR						-	VIGIA			2,00
MARTELETE						-	COZINHEIRA			-
ENSECADEIRAS						150,00	OPERADOR DE ESCAVADEIRA HID.			1,00
CONTEINERS						4,00	MOTORISTA			1,00
BOMBA DÁGUA						-	OPERADOR DE RETROESCAVADEIR			1,00
EXTENSÃO DE ENERGIA						-	AUXILIAR DE LABORATÓRIO			
FORMAS						40,00	TOPOGRÁFO			1,00
TRAÇADOR						-	OPERADOR DE ROMPEDOR HIDRÁ			1,00
MAQUITA						-				
ESCORAS						350,00				
MARTELETE						-				
TOTAL						554,00	TOTAL			22,00

REGISTRO DO DIA

HOJE, VINHEMOS A OBRA PARA REALIZAR A RETIRADA DAS FÔRMAS DE MADEIRITO, DAS ESCORAS E BARROTES QUE FORAM USADAS PARA A CONCRETAGEM DO PRIMEIRO 1 M DO PILAR NA PONTE, REALIZAMOS ESSA ATIVIDADE PARA EVITAR EMPECILHOS COM OS EQUIPAMENTOS DEVIDO AO FERIADO QUE SE INICIA HOJE, COM O USO DA RETROESCAVADEIRA, REALIZAMOS O TRANSPORTE DESSE MATERIAL E GUARDAMOS TODOS NO CANTEIRO DE OBRAS. NESSE PRIMEIRO 1 M NÃO TIVEMOS NENHUMA COMPLICAÇÃO E AGORA RETOMAREMOS O CRONOGRAMA NA PRÓXIMA SEMANA.



Raimundo Antônio S. Carvalho
 Fone: (31) 4151714
 Coordenador de Obras
 SACCOP/PMCG

COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.

COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.

Rafael Gomes Leite
 Engenheiro Civil
 CPF 012.703.244-92
 CREA: 1614297940

Rui Barbosa
 FISCAL DE CONTRATOS
 Matr. 11896
 SECOB/PMCG

[Handwritten signature]

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL GOMES LEITE e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/FB47-BDE8-FC09-F78A> e informe o código FB47-BDE8-FC09-F78A





COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.

Rui Barbosa
Rui Barbosa
 FISCAL DE CONTRATOS
 Matr. 1596
 SECOB/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN-160.004.517/4
 Coordenador de Obras
 SECOB/PMCG

Rafael Gomes Leite
Rafael Gomes Leite
 Engenheiro Civil
 CPF: 082.483.244-92
 CREA: 1614237940

[Handwritten signature]



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB
 CONTRATADO: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE
 OBJETO: CANALIZAÇÃO DO RIACHO DE BODOCONGÓ - 2ª ETAPA
 ENDEREÇO: TRECHO - FLORIANO PEIXOTO/FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA
 ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: WATHISNEIT DANTAS



DATA:		11/12/2023					CONDIÇÕES DO TEMPO			
S	T	Q	Q	S	S	D	BOM	MANHÃ	TARDE	NOITE
X							NUBLADO			
							CHUVA			
EQUIPAMENTOS						QUANT.	EFETIVO			QUANT.
RETROESCAVADEIRA						1,00	ENGENHEIRO			1,00
MINIVAM						-	ARQUITETO			-
ESCAVADEIRA HIDRAULICA						1,00	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			2,00
ROMPEDOR HIDRAULICO						-	ENCARREGADO			1,00
CAÇAMBAS						4,00	ARMADOR			-
GERADOR A GASOLINA						2,00	CARPINTEIRO			3,00
SERRA MÁRMORE						1,00	PEDREIRO			1,00
FURADEIRA						-	SERVENTE			7,00
VIBRADOR						-	VIGIA			2,00
MARTELETE						-	COZINHEIRA			-
ENSECADEIRAS						150,00	OPERADOR DE ESCAVADEIRA HID.			1,00
CONTEINERS						4,00	MOTORISTA			1,00
BOMBA D'ÁGUA						-	OPERADOR DE RETROESCAVADEIR			1,00
EXTENSÃO DE ENERGIA						-	AUXILIAR DE LABORATÓRIO			
FORMAS						40,00	TOPOGRÁFO			1,00
TRAÇADOR						-	OPERADOR DE ROMPEDOR HIDRÁ			1,00
MAQUITA						-				
ESCORAS						350,00				
MARTELETE						-				
TOTAL						553,00	TOTAL			22,00

REGISTRO DO DIA

TIVEMOS A ENTREGA DO MATERIAL QUE USAREMOS PARA A LIGAÇÃO DO PONTO DE ENERGIA PARA AS ATIVIDADES DO CANAL. RECEBEMOS HOJE : 3 UN ELETRODUTO PVC ROSCA ¾; 3 UN BUCHA DE ALUMÍNIO ¾; 1 HASTE COBREADA ½ X 1,20 M; 2 M CABO COBRE 10 MM; 3 UN ABRACADEIRA ½ X 4; 1 UN ISOLADOR DE ROLDANA 72 X 72; 1 UN GRAMPO DE TERRA; 3 UN ARRUELA DE ALUMÍNIO ¾; 1 CAIXA DE MEDIÇÃO; 1 UN DISJUNTOR SOPRANO MONOFÁSICO; 1 UN CABEÇOTE DE ALUMÍNIO ¾; 2 UN CURVA PVC ROSCA ¾; 2 UN LUVA DE PVC ¾; 10 UN CABO RÍGIDO ISOLADO; 1 UN PONTALETE DE C/6 E 1 UN DE CAIXA INSPEÇÃO PVC COM TAMPA. HOJE, INICIAMOS O DIA COM A REALIZAÇÃO DE REPAROS NAS EMENDAS QUE FICAM NA CONCRETAGEM DAS PAREDES, TAMBÉM REALIZAMOS A LOCAÇÃO DE NOVOS PAINÉIS METÁLICOS QUE SERÃO USADOS COMO FÔRMAS DAS PAREDES. DURANTE O TURNO DA TARDE, REALIZAMOS A DRENAGEM DA ÁGUA PRESENTE NO TRECHO DA PONTE COM O USO DO MOTOR BOMBA, PARA QUE ASSIM, A EQUIPE FOCASSE NA FINALIZAÇÃO DA COLOCAÇÃO DAS FÔRMAS DE MADEIRITO, POIS ESSE MATERIAL SERÁ PARA O PILAR DA PONTE QUE SERÁ CONCRETADO AINDA NO HORÁRIO DA TARDE, COM A LOCAÇÃO DAS FÔRMAS E SUSTENTAÇÃO DO MATERIAL COM O USO DE ESCORAS E BARROTES, INICIAMOS A CONCRETAGEM POR VOLTA DAS 18H00, PARA ESSA ETAPA USAMOS 6 M³ DE CONCRETO COM FCK 30 MPA, DURANTE A CONCRETAGEM, UTILIZAMOS O VIBRADOR MECÂNICO PARA MELHORAR O ADENSAMENTO DO MATERIAL E MINIMIZAR A PRESENÇA DE VAZIOS E COM ISSO, MELHORAR A RESISTÊNCIA APÓS A SECAGEM DO CONCRETO, NESSA ATIVIDADE TIVEMOS

Rui Barbosa
 FISCAL DE CONTRATOS
 Matr. 1596
 SECÓB/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN-160.214.517-4
 Coordenador de Obras
 SECC/PMCG

Rafael Gomes Leite
 Engenheiro Civil
 CPF 082.483.244-92
 CREA: 1614207940





COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.

Raimundo Antonio S. Carvalho
RW-160.1 517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Rafael Gomes Leite
Engenheiro Civil
CPF 052.033.243-00
CREA: 16142071-9

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL GOMES LEITE e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/FB47-BDE8-FC09-F78A> e informe o código FB47-BDE8-FC09-F78A





COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.




COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.




COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



Rafael Gomes Leite
 Engenheiro Civil
 CPF 002.430.244-92
 CREA: 1614297940

Rui Barbosa
 FISCAL DE CONTRATOS
 Matr. 7599
 SECOP/PMCG


Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN-106.177.774
 Coordenador de Obras
 SECOP/PMCG





CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB	
CONTRATADO: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE	
OBJETO: CANALIZAÇÃO DO RIACHO DE BODOCONGÓ - 2ª ETAPA	
ENDEREÇO: TRECHO - FLORIANO PEIXOTO/FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA	
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: WATHISNEIT DANTAS	

DATA:		12/12/2023					CONDIÇÕES DO TEMPO			
S	T	Q	Q	S	S	D		MANHÃ	TARDE	NOITE
	X						BOM	X	X	
							NUBLADO			
							CHUVA			
EQUIPAMENTOS						QUANT.	EFETIVO			QUANT.
RETROESCAVADEIRA						1,00	ENGENHEIRO			1,00
MINIVAM						-	ARQUITETO			-
ESCAVADEIRA HIDRAULICA						1,00	ASSISTENTE ADMININSTRATIVO			2,00
ROMPEDOR HIDRAULICO						-	ENCARREGADO			1,00
CAÇAMBAS						4,00	ARMADOR			-
GERADOR A GASOLINA						2,00	CARPINTEIRO			3,00
SERRA MÁRMORE						1,00	PEDREIRO			1,00
FURADEIRA						-	SERVENTE			7,00
VIBRADOR						-	VIGIA			2,00
MARTELETE						-	COZINHEIRA			-
ENSECADEIRAS						150,00	OPERADOR DE ESCAVADEIRA HID.			1,00
CONTEINERS						4,00	MOTORISTA			1,00
BOMBA DÁGUA						-	OPERADOR DE RETROESCAVADEIR			1,00
EXTENSÃO DE ENERGIA						-	AUXILIAR DE LABORATÓRIO			
FORMAS						40,00	TOPOGRÁFO			1,00
TRAÇADOR						-	OPERADOR DE ROMPEDOR HIDRÁ			1,00
MAQUITA						-				
ESCORAS						350,00				
MARTELETE						-				
TOTAL						553,00	TOTAL			22,00

REGISTRO DO DIA

HOJE, COM A CONCRETAGEM DE UMAS DAS ETAPAS DO PILAR NA PONTE PRONTA, A EQUIPE REALIZOU A RETIRADA DAS FÔRMAS E COM ISSO, POSSIBILITOU COM QUE OS ARMADORES REALIZAM MAIS UMA APLICAÇÃO DA FERRAGEM PARA QUE POSTERIORMENTE FOSSE REALIZADO MAIS UMA CONCRETAGEM DO PILAR, COM A FINALIZAÇÃO DO TRABALHO DO ARMADOR, O CARPINTEIRO JUNTO COM OS SERVENTES, INICIARAM A APLICAÇÃO DE CHAPAS DE VERGALHÃO O PILAR DA PONTE PARA SERVIR COMO APOIO PARA AS FÔRMAS DE MADEIRITO E ESSE MATERIAL FOI APOIADO COM ESCORAS E BARROTES, PARA QUE DURANTE A CONCRETAGEM NÃO SE TENHA EMPECILHOS. AINDA NO PERÍODO DA MANHÃ, O PEDREIRO DA NOSSA EQUIPE, DEU CONTINUIDADE ÀS CORREÇÕES NAS EMENDAS DA CONCRETAGEM DAS PAREDES E O RESTANTE DO GRUPO, CONTINUOU NA APLICAÇÃO DE NOVOS PAINÉIS METÁLICOS QUE TERÃO COMO FINALIDADE SER USADOS COMO FÔRMAS PARA AS PAREDES E ESSE MESMO MATERIAL É SUSTENTADO COM ESCORAS E BARROTES, PARA QUE NÃO ACONTEÇA EMPECILHOS NA CONCRETAGEM, ENTRE OS PAINÉIS LOCADOS PARA A PAREDE, REALIZAMOS A CONSTRUÇÃO DAS BASES PARA OS TUBOS DOS BARBACÃS, COM O INTUITO DE FACILITAR NA APLICAÇÃO DO EQUIPAMENTO MOMENTOS ANTES DA CONCRETAGEM. PARA FINALIZARMOS O TURNO, REALIZAMOS MAIS LIMPEZAS AO REDOR E DENTRO DO CANAL.

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECÓB/PMCG

Rafael Gomes Leite
Engenheiro Civil
CPF 052.083.244-92
CREA: 1614297940

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-16.004.517-4
Coordenador de Obras
SECÓB/PMCG

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL GOMES LEITE e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/FB47-BDE8-FC09-F78A> e informe o código FB47-BDE8-FC09-F78A





COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



Rafael Gomes Leite
Engenheiro Civil
CPF 012.103.244-92
CREA 1614297940

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 596
SECOB/PMCG



Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-16.103.517/4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

[Handwritten signature]

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL GOMES LEITE e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/FB47-BDE8-FC09-F78A> e informe o código FB47-BDE8-FC09-F78A



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.

COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.

Rui Barbosa
Rui Barbosa
 FISCAL DE CONTRATOS
 Mat. 1596
 SECOB/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
 RM-100.04.517-4
 Coordenador de Obras
 SECOB/PMCG

Rafael Gomes Leite
Rafael Gomes Leite
 Engenheiro Civil
 CPF: 02.483.244-92
 CREA: 1014297940

[Handwritten signature]



FOTO 09




COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.

Rub Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
MEX. 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
RIV-159.104/7-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Rafael Gomes Leite
Engenheiro Civil
CPF 062.483.244-92
CREA: 1614297940

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB	
CONTRATADO: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE	
OBJETO: CANALIZAÇÃO DO RIACHO DE BODOCONGÓ - 2ª ETAPA	
ENDEREÇO: TRECHO - FLORIANO PEIXOTO/FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA	
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: WATHISNEIT DANTAS	

DATA:		13/12/2023					CONDIÇÕES DO TEMPO			
S	T	Q	Q	S	S	D	BOM	MANHÃ	TARDE	NOITE
		X					X	X		
							NUBLADO			
							CHUVA			
EQUIPAMENTOS						QUANT.	EFETIVO			QUANT.
RETROESCAVADEIRA						1,00	ENGENHEIRO			1,00
MINIVAM						-	ARQUITETO			-
ESCAVADEIRA HIDRAULICA						1,00	ASSISTENTE ADMININSTRATIVO			2,00
ROMPEDOR HIDRAULICO						-	ENCARREGADO			1,00
CAÇAMBAS						1,00	ARMADOR			-
GERADOR A GASOLINA						2,00	CARPINTEIRO			3,00
SERRA MÁRMORE						1,00	PEDREIRO			1,00
FURADEIRA						-	SERVENTE			7,00
VIBRADOR						1,00	VIGIA			2,00
MARTELETE						-	COZINHEIRA			-
ENSECADEIRAS						150,00	OPERADOR DE ESCAVADEIRA HID.			1,00
CONTEINERS						4,00	MOTORISTA			1,00
BOMBA DÁGUA						1,00	OPERADOR DE RETROESCAVADEIR			1,00
EXTENSÃO DE ENERGIA						1,00	AUXILIAR DE LABORATÓRIO			-
FORMAS						40,00	TOPOGRÁFO			1,00
TRAÇADOR						-	OPERADOR DE ROMPEDOR HIDRÁ			-
MAQUITA						-				-
ESCORAS						350,00				-
MARTELETE						-				-
TOTAL						553,00	TOTAL			21,00

REGISTRO DO DIA

DEMOS CONTINUIDADE AS PREPARAÇÕES PARA A CONCRETAGEM DA PAREDE E DO PILAR DA PONTE, PARA ISSO, FINALIZAMOS A LOCAÇÃO DAS FÔRMAS DE MADEIROTA PARA O PILAR E FIZEMOS A SUSTENTAÇÃO DESSES EQUIPAMENTOS COM O USO DE ESCORAS E BARROTES, COM O INTUITO DE EVITAR EMPECILHOS DURANTE A CONCRETAGEM, JÁ PARA AS PAREDES, REALIZAMOS A COLOCAÇÃO DE MAIS PAINÉIS METÁLICOS E USAMOS TAMBÉM NESSE SETOR ESCORAS E BARROTES PARA A SUSTENTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E BASE DESSES EQUIPAMENTOS, COLOCAMOS VERGALHÕES DE 12 MM, PARA EVITARMOS COMPLICAÇÕES, ENTRE OS PAINÉIS JÁ LOCADOS, A EQUIPE COLOCOU OS TUBOS DOS BARBACÃS PARA AUXILIAR NA DRENAGEM DA ÁGUA QUE PODERÁ FICAR ACUMULADA NO CONCRETO E COM A FINALIZAÇÃO DESSA ATIVIDADE, REALIZAMOS A LIMPEZA DOS PAINÉIS E PREPARAMOS PARA POSTERIORMENTE PASSARMOS O DESMOLDANTE. NO PERÍODO DA TARDE, TIVEMOS A VISITA DO TOPOGRÁFO DA OBRA, O QUAL, DEU INÍCIO NA LOCAÇÃO DOS PONTOS, ALINHAMENTO E ANÁLISE DAS COTAS DA DRENAGEM DAS RUAS DO ENTORNO DO CANAL, TAMBÉM TIVEMOS O RECEBIMENTO DAS PEDRAS CALCÁRIAS QUE ESTAVAM NO CAMPINA RESIDENCE E REALIZAMOS COM A RETROESCAVADEIRA UM CORTE NO MATERIAL PRESENTE PRÓXIMO AOS PAINÉIS PARA FACILITAR NO MOMENTO DA COLOCAÇÃO DAS ESCORAS.

Rafael Gomes Leite
 Engenheiro Civil
 CPF 062.483.244-92
 CREA: 1614297940



Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN-10.814.517/4
 Coordenador de Obras
 SECOP/PMCG

COORDENADAS: 7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	LOCAL: CANAL DE BODOCONGÓ.
---	-------------------------------

COORDENADAS: 7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	LOCAL: CANAL DE BODOCONGÓ.
---	-------------------------------

Rui Barbosa
 FISCAL DE CONTRATOS
 SECOP/PMCG

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL GOMES LEITE e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/FB47-BDE8-FC09-F78A> e informe o código FB47-BDE8-FC09-F78A





COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-15.004.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Rafael Gomes Leite
Engenheiro Civil
CPF 082.483.244-92
CREA: 1614297940





COORDENADAS: 7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	LOCAL: CANAL DE BODOCONGÓ.
--	--------------------------------------



COORDENADAS: 7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	LOCAL: CANAL DE BODOCONGÓ.
--	--------------------------------------



COORDENADAS: 7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	LOCAL: CANAL DE BODOCONGÓ.
--	--------------------------------------



COORDENADAS: 7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	LOCAL: CANAL DE BODOCONGÓ.
--	--------------------------------------



COORDENADAS: 7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	LOCAL: CANAL DE BODOCONGÓ.
--	--------------------------------------



COORDENADAS: 7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	LOCAL: CANAL DE BODOCONGÓ.
--	--------------------------------------


Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Rafael Gomes Leite
Engenheiro Civil
CPF 052.493.244-92
CREA: 1614297940

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-15014-15174
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

[Handwritten signature]



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB	
CONTRATADO: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE	
OBJETO: CANALIZAÇÃO DO RIACHO DE BODOCONGÓ - 2ª ETAPA	
ENDEREÇO: TRECHO - FLORIANO PEIXOTO/FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA	
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: WATHISNEIT DANTAS	

DATA:		14/12/2023					CONDIÇÕES DO TEMPO			
S	T	Q	Q	S	S	D	BOM	MANHÃ	TARDE	NOITE
			X				NUBLADO	X	X	
							CHUVA			

EQUIPAMENTOS	QUANT.	EFETIVO	QUANT.
RETROESCAVADEIRA	1,00	ENGENHEIRO	1,00
MINIVAM	-	ARQUITETO	-
ESCAVADEIRA HIDRAULICA	1,00	ASSISTENTE ADMININSTRATIVO	2,00
ROMPEDOR HIDRAULICO	-	ENCARREGADO	1,00
CAÇAMBAS	1,00	ARMADOR	-
GERADOR A GASOLINA	2,00	CARPINTEIRO	3,00
SERRA MÁRMORE	1,00	PEDREIRO	1,00
FURADEIRA	-	SERVENTE	7,00
VIBRADOR	1,00	VIGIA	2,00
MARTELETE	-	COZINHEIRA	-
ENSECADEIRAS	150,00	OPERADOR DE ESCAVADEIRA HID.	1,00
CONTEINERS	4,00	MOTORISTA	1,00
BOMBA DÁGUA	1,00	OPERADOR DE RETROESCAVADEIR	1,00
EXTENSÃO DE ENERGIA	1,00	AUXILIAR DE LABORATÓRIO	
FORMAS	40,00	TOPOGRÁFO	1,00
TRAÇADOR	-	OPERADOR DE ROMPEDOR HIDRÁ	-
MAQUITA	-		
ESCORAS	350,00		
MARTELETE	-		
TOTAL	553,00	TOTAL	21,00

REGISTRO DO DIA

COM A IMPOSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DO MATERIAL DA CONCRETEIRA PARA A PONTE E PAREDE, HOJE, REALIZAMOS ALGUMAS ATIVIDADES PARA NOS AUXILIAR NO CRONOGRAMA DA OBRA, NA PAREDE DO PADRÃO DE ENERGIA, REALIZAMOS A COLOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E ENTRAMOS EM CONTATO COM A ENERGISA COM O PEDIDO DA LIGAÇÃO, TAMBÉM FOI FEITO MAIS BASES PARA OS BARBACÃS NO INTUITO DE TRAZER UMA MELHOR TRABALHABILIDADE QUANDO FOR REALIZADO A CONCRETAGEM. NO TURNO DA TARDE, INICIAMOS MAIS LIMPEZAS NA OBRA, DESSA VEZ, COMEÇAMOS A VARRER O PISO DO CANAL, POIS COM AS CHUVAS DOS ÚLTIMOS DIAS, TEVE UMA GRANDE ACUMULAÇÃO DE AREIA, TAMBÉM COMEÇAMOS AS ANÁLISES PARA CONSTRUÇÃO DA CAIXA QUE RECEBERÁ A ÁGUA DRENADA DAS RUAS LATERAIS E QUE SERÁ DISTRIBUÍDA PARA O CANAL. CONTINUAMOS A LOCAÇÃO DE NOVOS PAINÉIS, SÓ QUE DESSA VEZ, NÃO FOI POSSÍVEL COLOCAR ESCORAS EM TODOS, POIS COM O ATRASO DO FORNECIMENTO DO CONCRETO, AS NOSSAS ESCORAS JÁ ESTÃO USADAS E TAMBÉM REALIZAMOS A DRENAGEM DA ÁGUA PRESENTE NO LASTRO DA LATERAL DO CANAL.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S	CANAL DE BODOCONGÓ.
35°54'55.9"W	



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S	CANAL DE BODOCONGÓ.
35°54'55.9"W	

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-104.517/4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Rafael Gomes Leite
Engenheiro Civil
CPF: 02.493.244-92
CREA: 1614207940

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL GOMES LEITE e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/FB47-BDE8-FC09-F78A> e informe o código FB47-BDE8-FC09-F78A





COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.




COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
RM-160.4517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Rafael Gomes Leite
Engenheiro Civil
CPF 012.483.244-92
CREA: 1614297940




CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB	
CONTRATADO: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE	
OBJETO: CANALIZAÇÃO DO RIACHO DE BODOCONGÓ - 2ª ETAPA	
ENDEREÇO: TRECHO - FLORIANO PEIXOTO/FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA	
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: WATHISNEIT DANTAS	

DATA:		15/12/2023					CONDIÇÕES DO TEMPO			
S	T	Q	Q	S	S	D	BOM	MANHÃ	TARDE	NOITE
				X			X	X		
							NUBLADO			
							CHUVA			


EQUIPAMENTOS		QUANT.	EFETIVO	QUANT.
RETROESCAVADEIRA		1,00	ENGENHEIRO	1,00
MINIVAM		-	ARQUITETO	-
ESCAVADEIRA HIDRAULICA		1,00	ASSISTENTE ADMININSTRATIVO	2,00
ROMPEDOR HIDRAULICO		-	ENCARREGADO	1,00
CAÇAMBAS		1,00	ARMADOR	-
GERADOR A GASOLINA		2,00	CARPINTEIRO	3,00
SERRA MÁRMORE		1,00	PEDREIRO	1,00
FURADEIRA		-	SERVENTE	7,00
VIBRADOR		1,00	VIGIA	2,00
MARTELETE		-	COZINHEIRA	-
ENSECADEIRAS		150,00	OPERADOR DE ESCAVADEIRA HID.	1,00
CONTAINERS		4,00	MOTORISTA	1,00
BOMBA DÁGUA		1,00	OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA	1,00
EXTENSÃO DE ENERGIA		1,00	AUXILIAR DE LABORATÓRIO	-
FORMAS		40,00	TOPOGRÁFO	1,00
TRAÇADOR		-	OPERADOR DE ROMPEDOR HIDRÁULICO	-
MAQUITA		-		
ESCORAS		350,00		
MARTELETE		-		
TOTAL		553,00	TOTAL	
			21,00	

REGISTRO DO DIA

COM O NÃO FORNECIMENTO DA CONCRETEIRA HOJE NOVAMENTE, TIVEMOS UM ATRASO NO CRONOGRAMA E COM ISSO, DEMOS CONTINUIDADE A LIMPEZA NO CANAL, DESSA VEZ, INICIAMOS A RETIRADA DE MATERIAIS QUE FICARAM PRESOS DENTRO DOS BARBAÇAS, POIS A PERMANÊNCIA DELES FARÁ COM QUE A DRENAGEM DA ÁGUA SEJA DIFICULTADA OU NÃO POSSÍVEL, A EQUIPE TAMBÉM DEU CONTINUIDADE NA LIMPEZA DO MATERIAL PRESENTE DO PISO DO CANAL. DURANTE O TURNO DA TARDE, REALIZAMOS A CONSTRUÇÃO DE NOVAS BASES PARA O RECEBIMENTO DOS TUBOS PARA OS BARBACÃS, REALIZAMOS TAMBÉM O FECHAMENTO DE ESPAÇOS NAS BASES DOS PAINÉIS PARA QUE ASSIM NÃO ACONTEÇA O VAZAMENTO DE CONCRETO, TAMBÉM REALIZAMOS A LIMPEZA DESSES PAINÉIS QUE JÁ FORAM LOCADOS PARA QUE NÃO TENHA IMPERFEIÇÕES QUANDO FOREM RETIRADOS, NO FINAL DO TURNO, REALIZAMOS O TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS PARA O CANTEIRO.



 Raimundo Antonio S. Carvalho
 Engenheiro Civil
 CPF: 022.323.244-92
 CREA: 1614297340





 Raimundo Antonio S. Carvalho
 Engenheiro Civil
 CPF: 022.323.244-92
 CREA: 1614297340

COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.

COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.


Rui Barbosa
 FISCAL DE CONTRATOS
 Mat. 1596
 SECOB/PMCG



Assinado por 2 pessoas: RAFAEL GOMES LEITE e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/FB47-BDE8-FC09-F78A> e informe o código FB47-BDE8-FC09-F78A





COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.




COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.145.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Rafael Gomes Leite
Engenheiro Civil
CPF 012.483.244-92
CREA: 1614297940



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB	
CONTRATADO: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE	
OBJETO: CANALIZAÇÃO DO RIACHO DE BODOCONGÓ - 2ª ETAPA	
ENDEREÇO: TRECHO - FLORIANO PEIXOTO/FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA	
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: WATHISNEIT DANTAS	

DATA:		16/12/2023					CONDIÇÕES DO TEMPO				
S	T	Q	Q	S	S	D	BOM	MANHÃ	TARDE	NOITE	
					X			X	X		
							NUBLADO				
							CHUVA				
EQUIPAMENTOS							QUANT.	EFETIVO			QUANT.
RETROESCAVADEIRA							1,00	ENGENHEIRO			1,00
MINIVAM							-	ARQUITETO			-
ESCAVADEIRA HIDRAULICA							1,00	ASSISTENTE ADMININSTRATIVO			2,00
ROMPEDOR HIDRAULICO							-	ENCARREGADO			1,00
CAÇAMBAS							1,00	ARMADOR			-
GERADOR A GASOLINA							2,00	CARPINTEIRO			3,00
SERRA MÁRMORE							1,00	PEDREIRO			1,00
FURADEIRA							-	SERVENTE			7,00
VIBRADOR							1,00	VIGIA			2,00
MARTELETE							-	COZINHEIRA			-
ENSECADEIRAS							150,00	OPERADOR DE ESCAVADEIRA HID.			1,00
CONTAINERS							4,00	MOTORISTA			1,00
BOMBA D'ÁGUA							1,00	OPERADOR DE RETROESCAVADEIR			1,00
EXTENSÃO DE ENERGIA							1,00	AUXILIAR DE LABORATÓRIO			
FORMAS							40,00	TOPOGRÁFO			1,00
TRAÇADOR							-	OPERADOR DE ROMPEDOR HIDRÁ			-
MAQUITA							-				
ESCORAS							350,00				
MARTELETE							-				
TOTAL							553,00	TOTAL			21,00

REGISTRO DO DIA

HOJE, REALIZAMOS MAIS ETAPAS DE CONCRETAGEM DA OBRA DO CANAL, DESSA VEZ, REALIZAMOS A CONCRETAGEM DE MAIS UMA ETAPA DA PAREDE E MAIS UMA ETAPA DO PILAR PARA A PONTE, O PRIMEIRO CAMINHÃO CHEGOU POR VOLTA DAS 8H30, TINHA COMO CARACTERÍSTICA SER UM CONCRETO DE FCK 30 MPA, ESSE MATERIAL FOI UTILIZADO PARA O PILAR DA PONTE E TINHA UM VOLUME DE 5 M³, JÁ PARA A PAREDE, FORAM UTILIZADOS 20 M³ E ESSE MATERIAL VEIO COMO PERFIL DE SER UM CONCRETO DE FCK 15 MPA, NA PAREDE, INICIAMOS A CONCRETAGEM POR VOLTA DAS 9H50, FOI UTILIZADO PEDRA CALCÁRIA, RESPEITANDO O VOLUME DE CADA MATERIAL SEGUNDO O PROJETO, EM AMBOS OS TRECHOS DA CONCRETAGEM FOI USADO O VIBRADOR MECÂNICO, PARA AUXILIAR NO ADENSAMENTO DO MATERIAL E ASSIM MELHORAR A RESISTÊNCIA DELE, POIS MINIMIZARÁ A PRESENÇA DE VAZIOS.



Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN-11.14.517-4
 Coordenador de Obras
 SECOP/PMCG

COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.


COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.

Rafael Gomes Leite
 Engenheiro Civil
 CPF 012.483.244-92
 CREA: 1614297940

Rui Barbosa
 FISCAL DE CONTRATOS
 Matr. 1596
 SECOP/PMCG

(Handwritten signature)



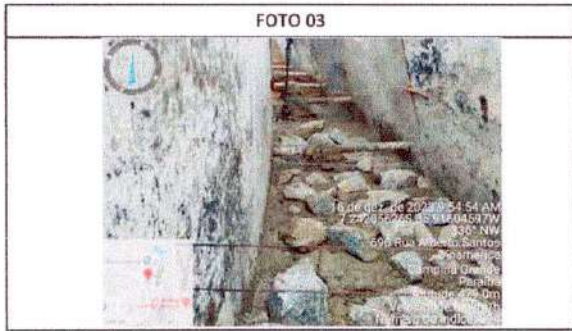

COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.




COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 5596
SECOB/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-16.174.517/4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Rafael Gomes Leite
Engenheiro Civil
CPF 012.483.244-92
CREA: 1614297940

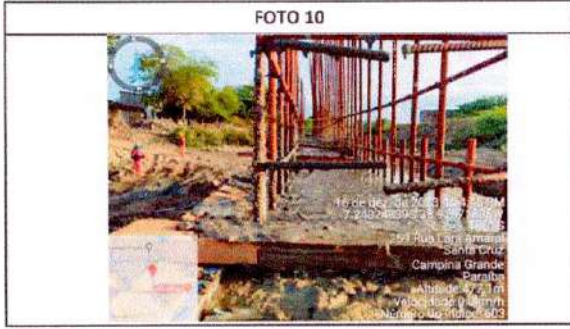

COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.

COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.

Rafael
Rafael Barbosa
 FISCAL DE CONTRATOS
 Mat. 1596
 SECOB/PMCG

Raimundo
 Raimundo Antonio Carvalho
 RN-16.104.514
 Coordenador de Obras
 SECOB/PMCG

Rafael
 Rafael Gomes Leite
 Engenheiro Civil
 CPF 062.483.244-92
 CREA: 1614297940

[Handwritten signature]



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB
 CONTRATADO: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE
 OBJETO: CANALIZAÇÃO DO RIACHO DE BODOCONGÓ - 2ª ETAPA
 ENDEREÇO: TRECHO - FLORIANO PEIXOTO/FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA
 ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: WATHISNEIT DANTAS



DATA:		18/12/2023					CONDIÇÕES DO TEMPO			
S	T	Q	Q	S	S	D	BOM	MANHÃ	TARDE	NOITE
X							NUBLADO	X	X	
							CHUVA			
EQUIPAMENTOS						QUANT.	EFETIVO			QUANT.
RETROESCAVADEIRA						1,00	ENGENHEIRO			1,00
MINIVAM						-	ARQUITETO			-
ESCAVADEIRA HIDRAULICA						1,00	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			2,00
ROMPEDOR HIDRAULICO						-	ENCARREGADO			1,00
CAÇAMBAS						1,00	ARMADOR			-
GERADOR A GASOLINA						2,00	CARPINTEIRO			3,00
SERRA MÁRMORE						1,00	PEDREIRO			1,00
FURADEIRA						-	SERVENTE			7,00
VIBRADOR						1,00	VIGIA			2,00
MARTELETE						-	COZINHEIRA			-
ENSECADEIRAS						150,00	OPERADOR DE ESCAVADEIRA HID.			1,00
CONTAINERS						4,00	MOTORISTA			1,00
BOMBA D'ÁGUA						1,00	OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA			1,00
EXTENSÃO DE ENERGIA						1,00	AUXILIAR DE LABORATÓRIO			
FORMAS						40,00	TOPOGRÁFO			1,00
TRAÇADOR						-	OPERADOR DE ROMPEDOR HIDRÁ			-
MAQUITA						-				
ESCORAS						350,00				
MARTELETE						-				
TOTAL						553,00	TOTAL			21,00

REGISTRO DO DIA

HOJE, INICIAMOS MAIS UMA ETAPA DA CONCRETAGEM DA PAREDE, MAS O MATERIAL SÓ PODERIA SER FORNECIDO NO PERÍODO DA TARDE. NO TURNO DA MANHÃ, COM O USO DA RETROESCAVADEIRA, INICIAMOS A LIMPEZA DO TRECHO PRESENTE ENTRE OS PILARES DA PONTE, ESSE TRECHO SERÁ USADO PARA A CONCRETAGEM DE MAIS UMA ETAPA DO PISO, APÓS A LIMPEZA, A RETROESCAVADEIRA INICIOU A DISTRIBUIÇÃO DA PEDRA GRANÍTICA ARRUMADA, PARA QUE APÓS ISSO, FOSSE RECEBIDO O CONCRETO CICLÓPICO. DURANTE A TARDE, COM A CHEGADA DO PRIMEIRO CAMINHÃO BETONEIRA ÀS 14H20 E LOGO FOI ENCAMINHADO PARA O ENSAIO DE SLUMP E TEVE RESULTADO DE 12 CM, ENTÃO FOI LIBERADA PARA O USO. NESTA ETAPA, FORAM USADOS 27 M³, ONDE 22 M³, FORAM USADAS PARA A CONCRETAGEM DA PAREDE E 5 M³, FORAM USADOS PARA MAIS UM TRECHO DO PISO, O QUAL, ESTÁ ENTRE OS PILARES DA PONTE, PARA MELHORAR A RESISTÊNCIA DO CONCRETO, FOI USADO O VIBRADOR MECÂNICO, PARA AUXILIAR NO ADENSAMENTO DO MATERIAL E MINIMIZAR A PRESENÇA DE ESPAÇOS. DEVIDO AO ERRO NO FORNECIMENTO DA CONCRETEIRA, A ATIVIDADE DO DIA SE ENCERROU ÀS 20H30.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.

Rafael Gomes Leite
 Engenheiro Civil
 CPF 069.489.244-92
 CREA: 1614207940

Rui Barbosa
 FISCAL DE CONTRATOS
 Mat. 71536
 SECOP/PMCG

Raimundo Antonio de Souza Carvalho
 CR-16.113.174
 Coordenador de Obras
 SECOP/PMCG

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL GOMES LEITE e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/FB47-BDE8-FC09-F78A> e informe o código FB47-BDE8-FC09-F78A





COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.

Rafael Gomes Leite
Engenheiro Civil
CPF 012.463.244-92
CREA: 1614297940

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
MAT. 1896
SECOB/PMCG

Raimundo Antonio de Souza Carvalho
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG





COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.




COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
Mat. 1596
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Rafael Gomes Leite
Engenheiro Civil
CPF 062.483.244-92
CREA: 1614297940



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB	
CONTRATADO: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE	
OBJETO: CANALIZAÇÃO DO RIACHO DE BODOCONGÓ - 2ª ETAPA	
ENDEREÇO: TRECHO - FLORIANO PEIXOTO/FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA	
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: WATHISNEIT DANTAS	

DATA:		19/12/2023					CONDIÇÕES DO TEMPO			
S	T	Q	Q	S	S	D		MANHÃ	TARDE	NOITE
	X						BOM			
							NUBLADO		X	
							CHUVA	X		
EQUIPAMENTOS						QUANT.	EFETIVO			QUANT.
RETROESCAVADEIRA						1,00	ENGENHEIRO			1,00
MINIVAM						-	ARQUITETO			-
ESCAVADEIRA HIDRAULICA						1,00	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			2,00
ROMPEDOR HIDRAULICO						-	ENCARREGADO			1,00
CAÇAMBAS						1,00	ARMADOR			-
GERADOR A GASOLINA						2,00	CARPINTEIRO			3,00
SERRA MÁRMORE						1,00	PEDREIRO			1,00
FURADEIRA						-	SERVENTE			7,00
VIBRADOR						1,00	VIGIA			2,00
MARTELETE						-	COZINHEIRA			-
ENSECADEIRAS						150,00	OPERADOR DE ESCAVADEIRA HID.			1,00
CONTEINERS						4,00	MOTORISTA			1,00
BOMBA D'ÁGUA						1,00	OPERADOR DE RETROESCAVADEIR			1,00
EXTENSÃO DE ENERGIA						1,00	AUXILIAR DE LABORATÓRIO			
FORMAS						40,00	TOPOGRÁFO			1,00
TRAÇADOR						-	OPERADOR DE ROMPEDOR HIDRÁ			-
MAQUITA						-				
ESCORAS						350,00				
MARTELETE						-				
TOTAL						553,00	TOTAL			21,00


REGISTRO DO DIA

RECEBEMOS NO CANAL, 40 LUVAS BLUE FLEX; 1 ADAPTADOR MANDRIL DE 1/2"; 1 SUPORTE DE SERRA COPO; 1 SERRA COPO DE 7/8"; 1 BROCA 12X160; 1 MANDRIL 13MM C/CHAVE E 2 CAMARA DE AR. HOJE, TIVEMOS NOVAMENTE A PRESENÇA DE CHUVAS FORTES EM NOSSA REGIÃO, E TAL ACONTECIMENTO NOS TROUXE NOVAMENTE TRANSTORNO NA OBRA, UMAS VEZ QUE A ÁGUA TROUXE MATERIAIS PARA O CANAL E ARRASTOU NOSSOS EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, POIS ELAS ESTAVAM SENDO USADAS PARA ESCORAR AS FÔRMAS QUE FORAM USADAS NA CONCRETAGEM DO DIA ANTERIOR. DIANTE DISSO, DURANTE O DIA, REALIZAMOS O RECOLHIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS PRESENTES PARA O CANTEIRO DE OBRAS E INICIAMOS O LEVANTAMENTO QUANTITATIVOS DELES, COM A UTILIZAÇÃO DE SACOS COM AREIA, REALIZAMOS NOVAMENTE A CONSTRUÇÃO DE MAIS BARREIRAS PARA AUXILIAR NO DESVIO DO PERCURSO DA ÁGUA. ESSE FENÔMENO, TRARÁ NO NOSSO CRONOGRAMA MAIS DE UMA SEMANA DE ATRASO, POIS A PRESENÇA DE CHUVAS ESTÁ CONTINUA E ISSO IMPOSSIBILITARÁ A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ESTABELECIDAS PELO CRONOGRAMA.

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1590
SECOB/PMCG

Rafael Gomes Leite
Engenheiro Civil
CPF 061.483.244-92
CREA: 1614297940

Raimundo Antonio S. Carvalho
Mat. 5114
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG



Assinado por 2 pessoas: RAFAEL GOMES LEITE e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/FB47-BDE8-FC09-F78A> e informe o código FB47-BDE8-FC09-F78A





COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



Rafael Gomes Leite
 Engenheiro Civil
 CPF 062.483.244-92
 CREA: 1614237940

Rui Barbosa
 FISCAL DE CONTRATOS
 Mat. 1596
 SECOP/PMCG



Raimundo Antonio S.
 Coordenador de Obras
 SECOP/PMCG

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL GOMES LEITE e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/FB47-BDE8-FC09-F78A>



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.

COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
M 311.596
SECOB/PMCG


Raimundo Antonio S. Carvalho
M 11.611.5174
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Rafael Gomes Leite
Engenheiro Civil
CPF 082.483.244-92
CREA: 1614227940

[Large handwritten signature]

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL GOMES LEITE e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinegrante.1doc.com.br/verificacao/FB47-BDE8-FC09-F78A> e informe o código FB47-BDE8-FC09-F78A



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB	
CONTRATADO: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE	
OBJETO: CANALIZAÇÃO DO RIACHO DE BODOCONGÓ - 2ª ETAPA	
ENDEREÇO: TRECHO - FLORIANO PEIXOTO/FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA	
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: WATHISNEIT DANTAS	

DATA:		20/12/2023					CONDIÇÕES DO TEMPO			
S	T	Q	Q	S	S	D	BOM	MANHÃ	TARDE	NOITE
		X					NUBLADO		X	
							CHUVA	X		

EQUIPAMENTOS	QUANT.	EFETIVO	QUANT.
RETROESCAVADEIRA	1,00	ENGENHEIRO	1,00
MINIVAM	-	ARQUITETO	-
ESCAVADEIRA HIDRAULICA	1,00	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2,00
ROMPEDOR HIDRAULICO	-	ENCARREGADO	1,00
CAÇAMBAS	1,00	ARMADOR	-
GERADOR A GASOLINA	2,00	CARPINTEIRO	4,00
SERRA MÁRMORE	1,00	PEDREIRO	1,00
FURADEIRA	-	SERVENTE	7,00
VIBRADOR	1,00	VIGIA	2,00
MARTELETE	-	COZINHEIRA	-
ENSECADEIRAS	150,00	OPERADOR DE ESCAVADEIRA HID.	1,00
CONTAINERS	4,00	MOTORISTA	1,00
BOMBA D'ÁGUA	1,00	OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA	1,00
EXTENSÃO DE ENERGIA	1,00	AUXILIAR DE LABORATÓRIO	-
FORMAS	40,00	TOPOGRÁFO	1,00
TRAÇADOR	-	OPERADOR DE ROMPEDOR HIDRÁ	-
MAQUITA	-		
ESCORAS	350,00		
MARTELETE	-		
TOTAL	553,00	TOTAL	22,00

REGISTRO DO DIA

HOJE, TIVEMOS O RECEBIMENTO DE 240 BLOCOS DE CONCRETO QUE SERÁ USADO NA CONSTRUÇÃO DAS PAREDES DA CAIXA QUE RECEBERÁ A ÁGUA DAS RUAS QUE ESTÃO PRESENTES NA LATERAL DO CANAL, ESSA CAIXA FOI INICIADA HOJE PELA EQUIPE, SEU PISO SERÁ CONSTITUÍDO POR PEDRA GRANÍTICA E CONCRETO, TAMBÉM INICIAMOS A CONSTRUÇÃO DE MAIS FÔRMAS DE MADEIRITO QUE SERÁ USADA PARA AS ATIVIDADES DA PONTE. DIANTE DA SITUAÇÃO QUE SE ENCONTRA O CANAL DEVIDO ÀS GRANDES CHUVAS NA REGIÃO, NOSSAS ATIVIDADES FICARAM LIMITADAS NA CONSTRUÇÃO DA CAIXA E NA CONSTRUÇÃO DAS FÔRMAS E DEMOS CONTINUIDADE AS LIMPEZAS, AS CHUVAS AINDA ESTÃO CONSTANTES NA CIDADE E ISSO ATRASARÁ NOSSO CRONOGRAMA DE FORMA INCALCULÁVEL.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.

Rafael Gomes Leite
Engenheiro Civil
CPF 012.183.244-92
CREA: 1614237940

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
Mat. 15174
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL GOMES LEITE e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/FB47-BDE8-FC09-F78A> e informe o código FB47-BDE8-FC09-F78A





COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
161.1696
SECOB/PMCG


Rafael Gomes Leite
Engenheiro Civil
CPF 002.483.244-92
CREA: 1614297940

Raimundo Antonio S. Carvalho
CPF 002.483.244-92
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

[Handwritten signature]

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL GOMES LEITE e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/FB47-BDE8-FC09-F78A> e informe o código FB47-BDE8-FC09-F78A



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB										
CONTRATADO: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE										
OBJETO: CANALIZAÇÃO DO RIACHO DE BODOCONGÓ - 2ª ETAPA										
ENDEREÇO: TRECHO - FLORIANO PEIXOTO/FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA										
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: WATHISNEIT DANTAS										
DATA:		21/12/2023					CONDIÇÕES DO TEMPO			
S	T	Q	Q	S	S	D	BOM	MANHÃ	TARDE	NOITE
			X				NUBLADO			
							CHUVA	X	X	
EQUIPAMENTOS						QUANT.	EFETIVO			QUANT.
RETROESCAVADEIRA						1,00	ENGENHEIRO			1,00
MINIVAM						-	ARQUITETO			-
ESCAVADEIRA HIDRAULICA						1,00	ASSISTENTE ADMININSTRATIVO			2,00
ROMPEDOR HIDRAULICO						-	ENCARREGADO			1,00
CAÇAMBAS						1,00	ARMADOR			-
GERADOR A GASOLINA						2,00	CARPINTEIRO			4,00
SERRA MÁRMORE						1,00	PEDREIRO			1,00
FURADEIRA						-	SERVENTE			7,00
VIBRADOR						1,00	VIGIA			2,00
MARTELETE						-	COZINHEIRA			-
ENSECADEIRAS						150,00	OPERADOR DE ESCAVADEIRA HID.			1,00
CONTEINERS						4,00	MOTORISTA			1,00
BOMBA DÁGUA						1,00	OPERADOR DE RETROESCAVADEIF			1,00
EXTENSÃO DE ENERGIA						1,00	AUXILIAR DE LABORATÓRIO			
FORMAS						40,00	TOPOGRÁFO			1,00
TRAÇADOR						-	OPERADOR DE ROMPEDOR HIDRÁ			-
MAQUITA						-				
ESCORAS						350,00				
MARTELETE						-				
TOTAL						553,00	TOTAL			22,00

REGISTRO DO DIA

COM FORTES CHUVAS PERMANECENDO NA REGIÃO, HOJE, TIVEMOS MAIS UMA ENCHENTE NO CANAL, TODA AS NOSSAS BARREIRAS QUE DESVIAVAM A ÁGUA FOI DESTRUÍDA E FICAMOS SEM POSSIBILIDADES PARA FAZERMOS ATIVIDADES. DURANTE A MANHÃ, REALIZAMOS A CONCRETAGEM DE MAIS UMA PARTE DO PISO DA CAIXA QUE RECEBERÁ A ÁGUA DAS VIAS LATERAIS DO CANAL, FINALIZAMOS A CONSTRUÇÃO DAS FÔRMAS DE MADEIRITO PARA A PONTE. NO TURNO DA TARDE, COM O ALTO NÍVEL D'ÁGUA, DECIDIMOS DISPENSAR PARTE DA EQUIPE E COM O RESTANTE DO PESSOAL REALIZAMOS A CONCRETAGEM DAS TAMPAS QUE SERÃO USADAS PARA A CAIXA E PARA A BOCA DE LOBO QUE ESTÁ PRÓXIMO AO CANAL.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ

Rafael Gomes Leite
Engenheiro Civil
CPF: 032.483.244-92
CREA: 1614237940

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
M. 1586
SEC. OB/P/MCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
CPF: 032.483.244-92
CREA: 1614237940

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL GOMES LEITE e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/FB47-BDE8-FC09-F78A> e informe o código FB47-BDE8-FC09-F78A





COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG


Raimundo Antonio S. Carvalho
Rua ... 14
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Rafael Gomes Leite
Engenheiro Civil
CPF 063.483.244-92
CREA: 1614297940

(Assinatura manuscrita)

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL GOMES LEITE e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/FB47-BDE8-FC09-F78A> e informe o código FB47-BDE8-FC09-F78A



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB	
CONTRATADO: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE	
OBJETO: CANALIZAÇÃO DO RIACHO DE BODOCONGÓ - 2ª ETAPA	
ENDEREÇO: TRECHO - FLORIANO PEIXOTO/FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA	
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: WATHISNEIT DANTAS	

DATA:		22/12/2023					CONDIÇÕES DO TEMPO			
S	T	Q	Q	S	S	D	BOM	MANHÃ	TARDE	NOITE
				X			NUBLADO		X	
							CHUVA	X		

EQUIPAMENTOS	QUANT.	EFETIVO	QUANT.
RETROESCAVADEIRA	1,00	ENGENHEIRO	1,00
MINIVAM	-	ARQUITETO	-
ESCAVADEIRA HIDRAULICA	1,00	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2,00
ROMPEDOR HIDRAULICO	-	ENCARREGADO	1,00
CAÇAMBAS	1,00	ARMADOR	-
GERADOR A GASOLINA	2,00	CARPINTEIRO	4,00
SERRA MÁRMORE	1,00	PEDREIRO	1,00
FURADEIRA	-	SERVENTE	7,00
VIBRADOR	1,00	VIGIA	2,00
MARTELETE	-	COZINHEIRA	-
ENSECADEIRAS	150,00	OPERADOR DE ESCAVADEIRA HID.	1,00
CONTAINERS	4,00	MOTORISTA	1,00
BOMBA D'ÁGUA	1,00	OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA	1,00
EXTENSÃO DE ENERGIA	1,00	AUXILIAR DE LABORATÓRIO	-
FORMAS	40,00	TOPOGRÁFO	1,00
TRAÇADOR	-	OPERADOR DE ROMPEDOR HIDRÁ	-
MAQUITA	-		
ESCORAS	350,00		
MARTELETE	-		
TOTAL	553,00	TOTAL	22,00

REGISTRO DO DIA

HOJE, DEMOS CONTINUIDADE AS PREPARAÇÕES PARA A CAIXA QUE RECEBERÁ A ÁGUA QUE ESTÁ PRESENTE NAS RUAS DA LATERAL DO CANAL, DESSA VEZ, FINALIZAMOS A CONCRETAGEM DO PISO PARA A CAIXA, PARA QUE ASSIM, SEJA POSSÍVEL INICIARMOS O LEVANTAMENTO DAS PAREDES. COM A DIMINUIÇÃO DAS CHUVAS DURANTE O DIA, A EQUIPE TEVE A DECISÃO DE COLOCARMOS NOVAMENTE OS SACOS COM AREIA, PARA QUE SEJA POSSÍVEL REALIZARMOS O DESVIO DA ÁGUA E ASSIM INICIARMOS A LIMPEZA DO MATERIAL QUE FOI ARRASTADO PARA O PISO DO CANAL.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.

COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.

Rafael Gomes Leite
Rafael Gomes Leite
 FISCAL DE CONTRATOS
 Matr. 1596
 SEC0B/PMCG

Raimundo Antonio de Souza Carvalho
Raimundo Antonio de Souza Carvalho
 Eng. Civil
 CPF: 02.483.244-92
 CREA: 1614297940

Raimundo Antonio de Souza Carvalho
Raimundo Antonio de Souza Carvalho
 Eng. Civil
 Matr. 1596
 SEC0B/PMCG

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL GOMES LEITE e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/FB47-BDE8-FC09-F78A> e informe o código FB47-BDE8-FC09-F78A





COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
M 1596
SEC. OB/PMCG

Rafael Gomes Leite
Engenheiro Civil
CPF 062.163.244-92
CREA: 1614297940

Carvalho
1.431-4
Coordenador de Obras
SEC. OB/PMCG

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL GOMES LEITE e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campingagrande.1doc.com.br/verificacao/FB47-BDE8-FC09-F78A> e informe o código FB47-BDE8-FC09-F78A



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB
 CONTRATADO: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE
 OBJETO: CANALIZAÇÃO DO RIACHO DE BODOCONGÓ - 2ª ETAPA
 ENDEREÇO: TRECHO - FLORIANO PEIXOTO/FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA
 ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: WATHISNEIT DANTAS



DATA:		26/12/2023					CONDIÇÕES DO TEMPO			
S	T	Q	Q	S	S	D	BOM	MANHÃ	TARDE	NOITE
	X						NUBLADO		X	
							CHUVA	X		

EQUIPAMENTOS		QUANT.	EFETIVO	QUANT.
RETROESCAVADEIRA		1,00	ENGENHEIRO	1,00
MINIVAM		-	ARQUITETO	-
ESCAVADEIRA HIDRAULICA		1,00	ASSISTENTE ADMININSTRATIVO	2,00
ROMPEDOR HIDRAULICO		-	ENCARREGADO	1,00
CAÇAMBAS		1,00	ARMADOR	-
GERADOR A GASOLINA		2,00	CARPINTEIRO	4,00
SERRA MÁRMORE		1,00	PEDREIRO	1,00
FURADEIRA		-	SERVENTE	7,00
VIBRADOR		1,00	VIGIA	2,00
MARTELETE		-	COZINHEIRA	-
ENSECADEIRAS		150,00	OPERADOR DE ESCAVADEIRA HID.	1,00
CONTAINERS		4,00	MOTORISTA	1,00
BOMBA D'ÁGUA		1,00	OPERADOR DE RETROESCAVADEIR	1,00
EXTENSÃO DE ENERGIA		1,00	AUXILIAR DE LABORATÓRIO	
FORMAS		40,00	TOPOGRÁFO	1,00
TRAÇADOR		-	OPERADOR DE ROMPEDOR HIDRÁ	-
MAQUITA		-		
ESCORAS		350,00		
MARTELETE		-		
TOTAL		553,00	TOTAL	22,00

REGISTRO DO DIA

HOJE, RECEBEMOS NA OBRA OS SEGUINTES MATERIAIS: 2 UN DE BASE PARA LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA; 2 UN DE BASE PARA LIMPADOR PERFUMADO FLOR DE CAMPO; 2 UN DE BASE PARA LIMPADOR PERFUMADO GARDENIA; 4 L DE BASE PARA DETERGENTE NEUTRO; 10 UN DE PAPEL HIGIÊNICO COM 30 MT; 2 UN VASSOURAS DE NYLON E 10 UN ESPONJA MULTIUSO BRILHUS. DURANTE O TURNO DA MANHÃ, APÓS A INTENSA CHUVA QUE PASSOU PELA OBRA, A NOSSA EQUIPE SE ORGANIZOU E FOCOU EM DAR CONTINUIDADE NA LIMPEZA DO MATERIAL QUE FOI ARRASTADO PELA CHUVA PARA O CANAL, UMA VEZ QUE, NO LOCAL QUE TEVE O MAIOR ACÚMULO DE ENTULHO, SERÁ IMPORTANTE PARA DARMOS CONTINUIDADE AO LEVANTAMENTO DAS PAREDES DO CANAL. NO HORÁRIO DA TARDE, COM A ESTIAGEM DA CHUVA, TIVEMOS A POSSIBILIDADE QUE INICIARMOS OUTRAS ATIVIDADES NO CANAL, REALIZAMOS A COLOCAÇÃO DE NOVOS SACOS COM AREIAS NO DESVIO DA ÁGUA, PARA QUE DIMINUISSE A POSSIBILIDADE DE EMPECILHOS COM O AUMENTO DO NÍVEL DA ÁGUA, REALIZAMOS A CONSTRUÇÃO DAS BASES PARA A LOCAÇÃO DAS MANILHAS, SEGUINDO AS REGRAS EXIGIDAS NO PROJETO, ESSES MATERIAIS, QUE SERÃO USADOS NAS BOCA DE LOBO, E PARA AUXILIAR NA COLOCAÇÃO, USAMOS A RETROESCAVADEIRA PARA O LEVANTAMENTO DO MATERIAL.

Rui Barbosa
 FISCAL DE CONTRATOS
 Mat. 1696
 SECOB/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
 Engenheiro Civil
 Coordenador de Obras
 SECOB/PMCG

Rafael Gomes Leite
 Engenheiro Civil
 CPF 052.483.214-02
 CREA: 1514297840

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL GOMES LEITE e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/FB47-BDE8-FC09-F78A e informe o código FB47-BDE8-FC09-F78A





COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
CPF: 061.406.244-92
SECOB/PMCG

Rafael Gomes Leite
Engenheiro Civil
CPF: 061.406.244-92
CREA: 1614207942

Raimundo Antonio de Souza Carvalho
Engenheiro Civil
CPF: 061.406.244-92
CREA: 1614207942

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL GOMES LEITE e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/FB47-BDE8-FC09-F78A> e informe o código FB47-BDE8-FC09-F78A





COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
M.º 1596
SECOM/PMCG

Rafael Gomes Leite
Eng.º Civil
CPF 01.2453.244-92
CREA: 1614297940

Raimundo Antonio S. Carvalho
Eng.º Civil
Código de OBRAS
CBOB/PMCG

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB
 CONTRATADO: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE
 OBJETO: CANALIZAÇÃO DO RIACHO DE BODOCONGÓ - 2ª ETAPA
 ENDEREÇO: TRECHO - FLORIANO PEIXOTO/FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA
 ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: WATHISNEIT DANTAS



DATA:		27/12/2023					CONDIÇÕES DO TEMPO			
S	T	Q	Q	S	S	D	BOM	MANHÃ	TARDE	NOITE
			X					X	X	
							NUBLADO			
							CHUVA			

EQUIPAMENTOS	QUANT.	EFETIVO	QUANT.
RETROESCAVADEIRA	1,00	ENGENHEIRO	1,00
MINIVAM	-	ARQUITETO	-
ESCAVADEIRA HIDRAULICA	1,00	ASSISTENTE ADMININSTRATIVO	2,00
ROMPEDOR HIDRAULICO	-	ENCARREGADO	1,00
ÇAÇAMBAS	1,00	ARMADOR	-
GERADOR A GASOLINA	2,00	CARPINTEIRO	4,00
SERRA MÁRMORE	1,00	PEDREIRO	1,00
FURADEIRA	-	SERVENTE	7,00
VIBRADOR	1,00	VIGIA	2,00
MARTELETE	-	COZINHEIRA	-
ENSECADEIRAS	150,00	OPERADOR DE ESCAVADEIRA HID.	1,00
CONTAINERS	4,00	MOTORISTA	1,00
BOMBA DÁGUA	1,00	OPERADOR DE RETROESCAVADEIF	1,00
EXTENSÃO DE ENERGIA	1,00	AUXILIAR DE LABORATÓRIO	
FORMAS	40,00	TOPOGRÁFO	1,00
TRAÇADOR	-	OPERADOR DE ROMPEDOR HIDRÁ	-
MAQUITA	-		
ESCORAS	350,00		
MARTELETE	-		
TOTAL	553,00	TOTAL	22,00

REGISTRO DO DIA

RECEBEMOS EM NOSSA OBRA 12,55 M³. COM A ESTIAGEM DAS CHUVAS NOS ÚLTIMOS DIAS, INICIAMOS OS TRABALHOS COM A DRENAGEM DA ÁGUA QUE ESTAVA PRESENTE NAS LATERAIS DO CANAL E ACUMULADA ENTRE OS PILARES DA PONTE, HOJE, TAMBÉM DEMOS CONTINUIDADE A MAIS PREPARAÇÕES PARA A CONCRETAGEM DAS PAREDES, PARA ISSO, REALIZAMOS A LOCAÇÃO DE MAIS PAINÉIS PARA AS FÔRMAS E PARA A SUSTENTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, USAMOS AS ESCORAS E BARROTES. DURANTE O TURNO DA TARDE, REALIZAMOS A COLOCAÇÃO DE VERGALHÕES DE FERRO NA PAREDE JÁ EXISTENTE DO CANAL, PARA QUE APÓS A NOSSA CONCRETAGEM A UNIÃO ENTRE O CONCRETO JÁ EXISTENTE COM O NOVO TENHA UMA MELHOR RESISTÊNCIA, TAMBÉM CONSTRUÍMOS AS BASES PARA O RECEBIMENTOS DOS TUBOS PARA OS BARBACÃS, E JÁ COLOCAMOS OS MESMOS EM ALGUMAS DESSAS BASES, ESSES BARBACÃS TERÁ COMO FUNÇÃO A DRENAGEM DA ÁGUA QUE ESTARÁ ACUMULADA NO CONCRETO. NÃO TIVEMOS NENHUM EMPELILHOS EM TODA A ATIVIDADE DO DIA.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.

Rafael Gomes Leite
 Engenheiro Civil
 CPF 012.413.244-92
 CREA 1614287940

Rui Barbosa
 FISCAL DE CONTRATO
 Matr. 1696
 SEC08/PMCG

Wathisneit Dantas
 Engenheiro Civil
 Coordenador de Obras
 SEC08/PMCG

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL GOMES LEITE e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinggrande.1doc.com.br/verificacao/FB47-BDE8-FC09-F78A> e informe o código FB47-BDE8-FC09-F78A





COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.




COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.

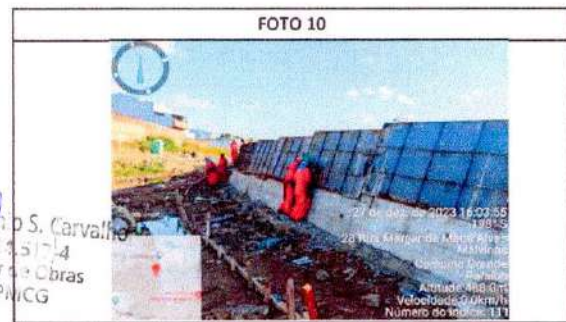

COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.

Raimundo S. Carvalho
 Eng. Civil
 Coord. de Obras
 SECOM/PMCG

Rafael Gomes Leite
 Engenheiro Civil
 CPF 062.483.244-92
 CREA: 1614297940

Rui Barbosa
 FISCAL DE CONTRATOS
 Mat. 1596
 SECOM/PMCG

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL GOMES LEITE e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinggrande.1doc.com.br/verificacao/FB47-BDE8-FC09-F78A> e informe o código FB47-BDE8-FC09-F78A





COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
 Mat. 1596
 SECOB/PMCG

Rafael Gomes Leite
Rafael Gomes Leite
 Engenheiro Civil
 CPF: 082.483.244-92
 CREA: 1614297940

Raimundo Antonio S. Carvalho
Raimundo Antonio S. Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 1614297940
 SECOB/PMCG

[Assinatura manuscrita]



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB
 CONTRATADO: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE
 OBJETO: CANALIZAÇÃO DO RIACHO DE BODOCONGÓ - 2ª ETAPA
 ENDEREÇO: TRECHO - FLORIANO PEIXOTO/FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA
 ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: WATHISNEIT DANTAS



DATA:		28/12/2023					CONDIÇÕES DO TEMPO			
S	T	Q	Q	S	S	D	BOM	MANHÃ	TARDE	NOITE
			X				NUBLADO	X	X	
							CHUVA			
EQUIPAMENTOS						QUANT.	EFETIVO			QUANT.
RETROESCAVADEIRA						1,00	ENGENHEIRO			1,00
MINIVAM						-	ARQUITETO			-
ESCAVADEIRA HIDRAULICA						1,00	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			2,00
ROMPEDOR HIDRAULICO						-	ENCARREGADO			1,00
CAÇAMBAS						1,00	ARMADOR			-
GERADOR A GASOLINA						2,00	CARPINTEIRO			4,00
SERRA MÁRMORE						1,00	PEDREIRO			1,00
FURADEIRA						-	SERVENTE			7,00
VIBRADOR						1,00	VIGIA			2,00
MARTELETE						-	COZINHEIRA			-
ENSECADEIRAS						150,00	OPERADOR DE ESCAVADEIRA HID.			1,00
CONTAINERS						4,00	MOTORISTA			1,00
BOMBA D'ÁGUA						1,00	OPERADOR DE RETROESCAVADEIR			1,00
EXTENSÃO DE ENERGIA						1,00	AUXILIAR DE LABORATÓRIO			
FORMAS						40,00	TOPOGRÁFO			1,00
TRAÇADOR						-	OPERADOR DE ROMPEDOR HIDRÁ			-
MAQUITA						-				
ESCORAS						350,00				
MARTELETE						-				
TOTAL						553,00	TOTAL			22,00

REGISTRO DO DIA

HOJE, RECEBEMOS EM NOSSA OBRA 200 L DE DESMOLDANTE DENVER. DURANTE O INÍCIO DA MANHÃ, LOCAMOS MAIS E PAINÉIS E REALIZAMOS A SUSTENTAÇÃO DESSE MATERIAL COM O USO DE ESCORAS E BARROTES, TAMBÉM COLOCAMOS OS TUBOS PARA OS BARBACÃS EM SUAS BASES E ESPERAMOS A CHEGADA O CONCRETO. POR VOLTA DAS 10H O PRIMEIRO CAMINHÃO BETONEIRA CHEGOU E LOGO FOI ENCAMINHADO PARA O ENSAIO DE SLUMP E TEVE RESULTADO DE 10 CM E PORTANTO LIBERADO, POIS O SEU RESULTADO ESTÁ NO INDICADO NO PROJETO, PARA ESSA ETAPA, FOI USADO 22 M³ E TINHA COMO CARACTERÍSTICA SER UM CONCRETO DE FCK 15 MPA, FOI UTILIZADO NOVAMENTE O VIBRADOR MECÂNICO PARA AUXILIAR NO ADENSAMENTO DO MATERIAL E COM ISSO TEM UMA MELHOR RESISTÊNCIA, POIS DIMINUIRÁ A PRESENÇA DE ESPAÇOS VAZIOS NO CONCRETO. PARA ESSA CONCRETAGEM NÃO TIVEMOS NENHUM EMPELILHO.

Raimundo Antonio S. Carvalho
 Engenheiro Civil
 Matr. 1594
 SEC08/PMCG



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.

Rafael Gomes Leite
 Engenheiro Civil
 CPF 061.443.214-9
 CREA: 1614287940
Rui Barbosa
 FISCAL DE CONTRATOS
 Matr. 1594
 SEC08/PMCG

(Handwritten signature)

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL GOMES LEITE e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/FB47-BDE8-FC09-F78A> e informe o código FB47-BDE8-FC09-F78A





COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.




COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.

Raimundo Antonio S. Carvalho
RM-16.111.5174
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG


Rafael Gomes Leite
Engenheiro Civil
CPF 040.114.482
CREA 01/107940

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG



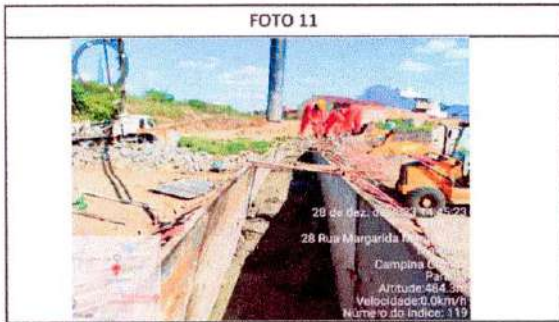

COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5\"/>	

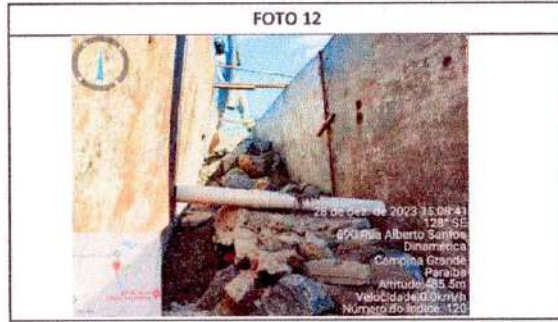

COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5\"/>	



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5\"/>	



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5\"/>	


Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1506
SECOB/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
PM-12045174
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Rafael Gomes Leite
Engenheiro Civil
CPF 082.483.244-92
CREA: 1014207040

(Assinatura manuscrita)



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB										
CONTRATADO: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE										
OBJETO: CANALIZAÇÃO DO RIACHO DE BODOCONGÓ - 2ª ETAPA										
ENDEREÇO: TRECHO - FLORIANO PEIXOTO/FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA										
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: WATHISNEIT DANTAS										
DATA:		29/12/2023					CONDIÇÕES DO TEMPO			
S	T	Q	Q	S	S	D		MANHÃ	TARDE	NOITE
				X			BOM	X	X	
							NUBLADO			
							CHUVA			
RETROESCAVADEIRA							1,00	ENGENHEIRO		1,00
MINIVAM							-	ARQUITETO		-
ESCAVADEIRA HIDRAULICA							1,00	ASSISTENTE ADMININSTRATIVO		2,00
ROMPEDOR HIDRAULICO							-	ENCARREGADO		1,00
CAÇAMBAS							1,00	ARMADOR		-
GERADOR A GASOLINA							2,00	CARPINTEIRO		4,00
SERRA MÁRMORE							1,00	PEDREIRO		1,00
FURADEIRA							-	SERVENTE		7,00
VIBRADOR							1,00	VIGIA		2,00
MARTELETE							-	COZINHEIRA		-
ENSECADEIRAS							150,00	OPERADOR DE ESCAVADEIRA HID.		1,00
CONTEINERS							4,00	MOTORISTA		1,00
BOMBA DÁGUA							1,00	OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA		1,00
EXTENSÃO DE ENERGIA							1,00	AUXILIAR DE LABORATÓRIO		
FORMAS							40,00	TOPOGRÁFO		1,00
TRAÇADOR							-	OPERADOR DE ROMPEDOR HIDRÁULI		-
MAQUITA							-			
ESCORAS							350,00			
MARTELETE							-			
TOTAL							553,00	TOTAL		22,00

REGISTRO DO DIA

INICIAMOS O DIA COM PROBLEMAS MECÂNICOS NA RETRO ESCAVADEIRA, PORÉM O MESMO FOI SOLUCIONADO DE FORMA RÁPIDA. INICIAMOS O DIA FAZENDO A REMOÇÃO DAS ESCORAS E FÔRMAS DA ÁREA CONCRETADA NO DIA ANTERIOR, LIMPAMOS TAMBÉM OS BARBACÃS QUE POR SUA VEZ DURANTE AS CONCRETAGENS ADENTRAM UM POUCO DO CONCRETO CICLÓPICO. INICIAMOS A REALOCAÇÃO DAS FORMAS E ESCORAMENTO AFIM DE PREPARAR MAIS UM TRECHO DE MURO A SER CONCRETADO. DEMOS INÍCIO MAIS UMA VEZ A LIMPEZA NA ÁREA ONDE SERÁ ERGUIDA A PONTE, AFIM DE TENTARMOS FINALIZAR O CONCRETO DE PISO QUE AINDA FALTA EXECUTAR, NÃO CONSEGUIMOS CONCLUIR POR CONTA DA CONCRETAGEM QUE HAVIA SIDO MARCADA PARA O PERÍODO DA TARDE. HOJE TIVEMOS DE MUDAR DE FORNECEDOR DE CONCRETO, POIS A CAMPINA MIX NÃO PODE NOS ATENDER ENTÃO PRA NÃO ATRASAR NOSSO PLANEJAMENTO DECIDIMOS FAZER ESSA CONCRETAGEM COM A SUPERMIX, FOI UTILIZADO UM CARRO DE CONCRETO COM 8M³, FOI LANÇADO ATRAVÉS DA BOMBA ESTACIONÁRIA. FOI FEITO O CONTATO COM OS LABORATÓRIOS TANTO DA EMPRESA COMO DO ORGÃO FISCALIZADOS A ATECEL, AMBOS NÃO PUDEAM ESTAR PRESENTES E INFORMARAM QUE PODIAMOS PROSSEGUIR COM A CONCRETAGEM. DEIXO AQUI O MEU REGISTRO DESTA OCORRÊNCIA PARA QUE EM CASO DE DIVERGÊNCIAS FIQUE COMO PROVA E REGISTRADO EM DIÁRIO DE OBRA O QUE REALMENTE OCORREU.



Rafael Gomes Leite
Engenheiro Civil
CPF 02.203.244-92
CREA 1614287840

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1566
SECOB/PMICG



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.


COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.

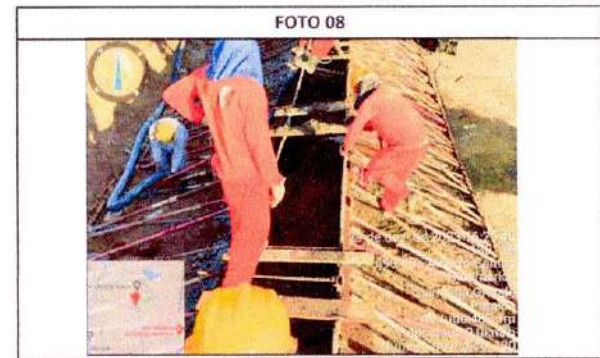

COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.


Rafael Gomes Leite
 Rafael Gomes Leite
 Engenheiro Civil
 CPF 042.483.244-92
 CREA: 1614297940

Rui Barbosa
 Rui Barbosa
 FISCAL DE CONTABILIDADE
 Matr. 12006
 SECOP/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
 Raimundo Antonio S. Carvalho
 Matr. 190431714
 Coordenador de Obras
 SEL/DB/PMCG

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL GOMES LEITE e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/FB47-BDE8-FC09-F78A> e informe o código FB47-BDE8-FC09-F78A



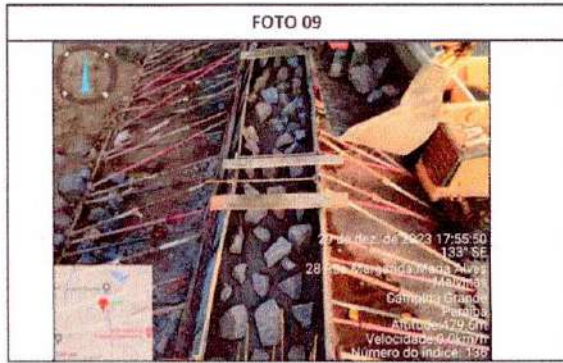

COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.



COORDENADAS:	LOCAL:
7°14'35.5"S 35°54'55.9"W	CANAL DE BODOCONGÓ.

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1.596
SECOB/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
Raimundo Antonio S. Carvalho
RM-16 14.517/4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Rafael Gomes Leite
Rafael Gomes Leite
Engenheiro Civil
CPP 052.483.244-02
CREA: 1614207940

[Handwritten signature]





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FB47-BDE8-FC09-F78A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RAFAEL GOMES LEITE (CPF 062.XXX.XXX-92) em 02/02/2024 08:41:56 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO (CPF 203.XXX.XXX-91) em 02/02/2024 08:43:42 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/FB47-BDE8-FC09-F78A>
