

CAIXA							Grau de Sigilo	
Nº do CTEF(Contrato Execução/Fornecime		BM - Número - 11			BM - Data emissão:	30/04/2025	BM - Período de referência da medição	
Início da obra		Empresa Contratada					Nº do CT	Data do CT
30/10/2023		SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA					2.08.018/2023	07/02/19
CTEF-		Objeto do CTEF(resumido)				CNPJ	Tomador/Ag.Promotor ou Tomador	
18.941.944,10		Urbanização da Av. Plínio Lemos				01.514.128/0001-36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	
		Local da obra (Bairro/Município/UF)					Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse	
							CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
							Fonte de Recursos outra (descrever)	
CTEF-		Valor atual (R\$)						
		20.637.504,26					AVENIDA PLÍNIO LEMOS, MALVINAS, CAMPINA GRANDE-PB	

FISICO FINANCEIRO												
ITEM	CÓDIGO SINAPI PARA	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL	EXECUTADO FISICO(QUANTITATIVOS)			EXECUTADO FINANCEIRO(R\$)		
							ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACMULADO INCLUINDO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACMULADO INCLUINDO PERÍODO
1		DRENAGEM PLUVIAL										
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				31.532,60				31.192,93	20,70	31.213,63
1.1	ORSE-2663	Locação rede de drenagem	M	1.817,68	2,07	3.762,60	1.653,59	10,00	1.663,59	3.422,93	20,70	3.443,63
1.2	10193 - SINAPI PB (MAR 2023)	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO RETO, H = 2,30 m, ESPAÇAMENTO 2,5 m, CRAVADOS A 0,5 m, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 05/2020	M	500,00	55,54	27.770,00	500,00		500,00	27.770,00	-	27.770,00
2		REDE COLETORA				2.087.723,83				1.854.684,25	26.158,15	1.880.842,40
2.1	92210-SINAPI	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferência - fornecimento e assentamento. af_12/2015	M	307,20	198,77	61.062,14	238,94	10,00	248,94	47.494,10	1.987,70	49.481,80
2.2	92212-SINAPI	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferência - fornecimento e assentamento. af_12/2015	M	1.204,65	300,00	361.395,00	1.204,65		1.204,65	361.395,00	-	361.395,00
2.3	037449-SINAPI	Tubo de concreto simples para águas pluviais, classe ps1 com encaixe macho e fêmea, diâmetro nominal de 200 mm	M	20,00	44,96	899,20	-		-	-	-	-
2.4	038054-SINAPI	Tubo dreno, corrugado, espiralado, flexível, perfurado, em polietileno de alta densidade (pead), dn "200" mm, (8") para drenagem - em barra (norma dnit 093/2006 - em)	M	216,00	50,66	10.942,56	216,00		216,00	10.942,56	-	10.942,56
2.5	COMPOSIÇÃO A	Poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1,0x1,0 m, externa de 1,40 x1,40 profundidade = 2,00 m, excluindo tampão. af_12/2020_pa	UNIDADE	34,00	4.000,01	136.000,34	34,00		34,00	136.000,34	-	136.000,34
2.6	97947-SINAPI	Caixa com grelha simples retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,5x1x1 m. af_12/2020 (boca de lobo)	UNIDADE	54,00	2.020,84	109.125,36	42,00		42,00	84.875,28	-	84.875,28
2.7	09141-ORSE	Tampão de ferro fundido articulado toda 600 mm, 300 kg/cm², para poço de visitas e caixas. inscrição águas pluviais.	UNIDADE	58,00	962,10	55.801,80	16,00		16,00	15.393,60	-	15.393,60
2.8	90107-SINAPI	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,00m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m3/111 hp), larg. menor que 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021	M³	857,31	8,23	7.055,66	857,31		857,31	7.055,67	-	7.055,67
2.9	102311-SINAPI	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,50 até 3,00 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (1,2 m3,larg. de 1,5 m até 2,5 m, em solo de 2a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021	M³	208,41	14,04	2.926,08	208,41		208,41	2.926,08	-	2.926,08
2.10	4503-ORSE	Escavação em valas, a fogo controlado, em material de 3ª categoria (rocha dura), com uso de compressor, perfuratriz pneumática e explosivos (aprovado pela gigogip em nt.002 - cagepa c049050-1	M³	94,73	200,00	18.946,00	94,73		94,73	18.946,00	-	18.946,00
2.10.1	Comp. 01	Escavação em vala de material de 3ª categoria (rocha), com rompedor acoplado em escavadeira hidráulica, inclusive remoção de material de vala com escavadeira hidráulica	M³	2.664,14	199,45	531.362,72	2.664,14		2.664,14	531.362,72	-	531.362,72
2.11	94329-SINAPI	Envolvimento e colchão de areia: aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com areia para aterro. af_05/2016	M³	1.595,49	104,66	166.983,98	1.503,07	2,52	1.505,59	157.311,29	263,74	157.575,03
2.12	93362-SINAPI	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade daçacamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016 (material reaproveitado)	M³	773,38	15,78	12.203,94	-		-	-	-	-

FÍSICO FINANCEIRO												
ITEM	CÓDIGO SINAPI PARA	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL	EXECUTADO FÍSICO(QUANTITATIVOS)			EXECUTADO FINANCEIRO(R\$)		
							ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO PERÍODO
2.13	93362 + 0368 - SINAPI	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade daçacamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016 (material de empréstimo) + areia para aterro	M³	1.749,15	88,25	154.362,49	1.299,96	17,10	1.317,06	114.721,47	1.509,08	116.230,55
2.14	100982-SINAPI	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 (bota fora)	M³	3.894,40	6,72	26.170,37	3.894,40		3.894,40	26.170,37	-	26.170,37
2.14.1	100982-SINAPI	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 (jazida)	M³	4.176,93	6,72	28.068,97	4.176,93		4.176,93	28.068,98	-	28.068,98
2.15	95875-SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade m³xkm). af_09/2016.(momento extraordinário transporte de jazida)	M³XKM	73.818,54	1,51	111.466,00	60.545,70	414,72	60.960,42	91.424,01	626,23	92.050,24
2.15.1	95875-SINAPI	Bota-fora com caminhão basculante via urbana pavimentada m³ x km, DMT até 30km (unidade: m³ x km).	M³XKM	70.575,56	1,51	106.569,10	70.429,50		70.429,50	106.348,56	-	106.348,56
2.16	004721-SINAPI	Pedra britada n.1 (9,5 a 19 mm) - posto pedreira/fornecedor sem frete	M³	280,80	162,99	45.767,59	276,48	4,32	280,80	45.063,48	704,12	45.767,60
2.17	006081-SINAPI	Argila ou barro para aterro ou reaterro (com transporte até 10 km	M³	21,60	64,43	1.391,69	-		-	-	-	-
2.18	102715-SINAPI	Geotêxtil não tecido 100% poliéster, resistência a tração de 26kn/m(1-26), instalado em dreno - fornecimento e instalação. af_07/2021	M²	739,60	32,67	24.162,73	734,40	5,20	739,60	23.992,85	169,88	24.162,73
2.19	ORSE-05156	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico, fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes	M	425,18	3,78	1.607,18	-		-	-	-	-
2.2	ORSE-05158	Sinalização com telas portáteis para isolamento	M	2.404,00	5,81	13.967,24	2.246,13		2.246,13	13.050,01	-	13.050,01
2.21	ORSE-03090	Bombeamento para esgotamento de valas com duração de 8 horas/dia	H	440,00	7,61	3.348,40	193,00		193,00	1.468,73	-	1.468,73
2.22	ORSE-05153	Passadiços com tábuas de madeira para pedestres	M²	163,72	105,02	17.193,87	16,00		16,00	1.680,32	-	1.680,32
2.23	101819-SINAPI	Recomposição de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa, com reaproveitamento dos paralelepípedos, para o fechamento de valas - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020	M²	588,00	72,06	42.371,28	-	290,00	290,00	-	20.897,40	20.897,40
2.24	COMPOSIÇÃO B	Retirada e reposição de rede de água	M	144,30	74,24	10.712,83	144,30		144,30	10.712,83	-	10.712,83
2.25	COMPOSIÇÃO C	Retirada e reposição de ligação domiciliar de água	UNIDADE	6,00	53,89	323,34	6,00		6,00	323,34	-	323,34
2.26	COMPOSIÇÃO D	Retirada e reposição de rede de esgotos	M	144,30	121,72	17.564,20	144,30		144,30	17.564,20	-	17.564,20
2.27	COMPOSIÇÃO E	Retirada e reposição de ligação domiciliar de esgoto	UNIDADE	6,00	65,41	392,46	6,00		6,00	392,46	-	392,46
2.28	ORSE-11675	Cadastro técnico de rede de drenagem	M	1.637,00	1,78	2.913,86	-		-	-	-	-
2.29	ORSE-02830	Limpeza e teste de estanqueidade	M	1.637,00	2,85	4.665,45	-		-	-	-	-
3.0	PONTA DE ALA					41.621,22				41.563,57	-	41.563,57
3.1	102740-SINAPI	Boca para bueiro simples tubular d = 100 cm em concreto, alas com esconsidade de 0º, incluindo formas e materiais. af_07/2021	UNIDADE	6,00	6.520,34	39.122,04	6,00		6,00	39.122,04	-	39.122,04
3.2	93358-SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade maior ou igual a 1,30 m	M³	3,62	86,11	311,72	3,60		3,60	310,00	-	310,00
3.3	ORSE-02499	Escavação manual de vala em material de 2ª categoria até 2,00m	M³	5,51	102,97	567,36	5,40		5,40	556,04	-	556,04
3.4	ORSE-04502	Escavação manual de vala ou cava em material de 3a categoria, profundidade até 2,00 m, com uso de explosivos e perfuração manual	M³	6,61	187,89	1.241,95	6,60		6,60	1.240,07	-	1.240,07
3.5	93362-SINAPI	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade daçacamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016 (material reaproveitado)	M³	6,62	15,78	104,46	6,60		6,60	104,15	-	104,15
3.6	93362 + 0368 - SINAPI	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade daçacamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016 (material de empréstimo) + areia para aterro	M³	1,63	88,25	143,85	1,56		1,56	137,67	-	137,67
3.7	100982-SINAPI	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 (bota fora)	M³	15,14	6,72	101,74	9,92		9,92	66,66	-	66,66

FÍSICO FINANCEIRO												
ITEM	CÓDIGO SINAPI PARA	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL	EXECUTADO FÍSICO(QUANTITATIVOS)			EXECUTADO FINANCEIRO(R\$)		
							ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACMULADO INCLUINDO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACMULADO INCLUINDO PERÍODO
3.8	95875-SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade m³xkm). af_09/2016.(momento extraordinário transporte de bota fora)	M³ X KM	18,61	1,51	28,10	17,84		17,84	26,94	-	26,94
SUB-TOTAL						2.160.877,65				1.927.440,75	26.178,85	1.953.619,60
II RECAPEAMENTO ASFÁLTICO												
1		SERVÇOS PRELIMINARES				228.372,00				212.503,87	-	212.503,87
1.1	99064-SINAPI	Locação de pavimentação. AF_10/2018	M	4.137,48	0,67	2.772,11	4.135,43		4.135,43	2.770,74	-	2.770,74
1.2	98524-SINAPI	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.AF_05/2018	m²	530,00	3,02	1.600,60	514,80		514,80	1.554,70	-	1.554,70
1.3	101819-SINAPI	Recomposição de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa, com aproveitamento dos paralelepípedos, incluso retirada e colocação do material	m²	2.423,80	70,95	171.968,61	2.218,00		2.218,00	157.367,11	-	157.367,11
1.4	96001-SINAPI	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte	m²	5.447,67	9,22	50.227,52	5.320,00		5.320,00	49.050,40	-	49.050,40
1.5	100982-SINAPI	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³. Carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³/111HP e decarga livre (unidade: m³) AF_07/2020	m²	272,38	6,62	1.803,16	266,00		266,00	1.760,92	-	1.760,92
2		SERVÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				3.128.330,23				3.044.851,92	-	3.044.851,92
2.1	COMPOSIÇÃO	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C. AF_11/2019	m²	53.036,27	4,05	214.796,89	53.036,27		53.036,27	214.796,89	-	214.796,89
3		CBUQ										
3.1	95995-SINAPI	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - Exclusive carga e transporte. AF_11/2019	m³	1.183,92	1.500,01	1.775.891,84	1.183,92		1.183,92	1.775.891,84	-	1.775.891,84
3.2	95996-SINAPI	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de Binder - Exclusive carga e transporte. AF_11/2019	m³	744,19	1.400,00	1.041.866,00	717,70		717,70	1.004.780,00	-	1.004.780,00
3.3	101002-SINAPI	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	1.928,11	3,54	6.825,51	1.901,62		1.901,62	6.731,73	-	6.731,73
3.4	100986-SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	16.751,41	5,31	88.949,99	8.032,29		8.032,29	42.651,46	-	42.651,46
4		OUTROS SERVIÇOS				14.435,84				13.533,60	-	13.533,60
4.1	06382-ORSE	Conserto de poço de visita - Nivelamento de tampão	unidade	32,00	451,12	14.435,84	30,00		30,00	13.533,60	-	13.533,60
SUB-TOTAL						3.371.138,07				3.270.889,39	-	3.270.889,39
III CALÇADAS E CICLOVIAS												
1		SERVÇOS INICIAIS				230.521,22				135.015,71	-	135.015,71
1.1	98525-SINAPI	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas arvores (diâmetro menor que 0,20 m), com trator de esteiras.	m²	79.245,20	0,42	33.282,98	51.463,53		51.463,53	21.614,68	-	21.614,68
1.2	020404-EMBASA	Corte de árvore com destocamento manual, c/ diâmetro entre 15 e 30cm	unid.	190,00	85,21	16.189,90	170,00		170,00	14.485,70	-	14.485,70
1.3	03240-ORSE	Demolição de piso de alta resistência	m²	870,00	22,79	19.827,30	870,00		870,00	19.827,30	-	19.827,30
1.4	00021-ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pré moldado	m	360,00	11,41	4.107,60	-		-	-	-	-
1.5	22911-SBC	Remoção e bota-fora de entulho em caminhão 12m³ - Percurso 12km.	m³	72,00	56,33	4.055,76	72,00		72,00	4.055,76	-	4.055,76
1.6	100577-SINAPI	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso.	m²	73.859,81	1,34	98.972,15	51.463,53		51.463,53	68.961,13	-	68.961,13
1.7	C3104-SEINFRA CE	Remoção de cercas	m	4.441,32	0,53	2.353,90	2.400,00		2.400,00	1.272,00	-	1.272,00
1.8	C3373-SEINFRA CE	Retirada de meio fio em pedra granítica	m	4.282,42	12,08	51.731,63	397,28		397,28	4.799,14	-	4.799,14
2		CALÇADAS				1.606.992,47				396.195,96	285.120,00	681.315,96
2.1		CALÇADAS CANTEIRO CENTRAL				1.051.173,10				63.110,56	285.120,00	348.230,56
2.1.1	94995-SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022	m²	7.467,67	72,00	537.672,24	702,55	3.960,00	4.662,55	50.583,60	285.120,00	335.703,60
2.1.2	CPOS 11.20.050	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos.	m	10.132,07	12,94	131.108,98	968,08		968,08	12.526,96	-	12.526,96
2.1.3	COMPOSIÇÃO 1	Rampa de acesso para calçada em concreto, incluso piso tátil. (rampa com abas laterais.)	unid.	63,70	1.858,51	118.387,09	-		-	-	-	-
2.1.4	COMPOSIÇÃO 2	Rampa de acesso para cicloviias em concreto, incluso piso tátil. (rampa com abas laterais.)	unid.	61,10	2.395,68	146.376,05	-		-	-	-	-
2.1.5	09418/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/ deficientes visuais, dimensões 25x25 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado.	m²	1.039,95	113,11	117.628,74	-		-	-	-	-
2.2		CALÇADAS DAS QUADRAS EXISTENTES				555.819,37				333.085,40	-	333.085,40
2.2.1	101620-SINAPI	Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, com camada de areia, lançamento manual. af_08/2020	m²	435,00	256,20	111.447,00	398,68		398,68	102.141,82	-	102.141,82



FÍSICO FINANCEIRO												
ITEM	CÓDIGO SINAPI PARA	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL	EXECUTADO FÍSICO(QUANTITATIVOS)			EXECUTADO FINANCEIRO(R\$)		
							ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACMULADO INCLUINDO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACMULADO INCLUINDO PERÍODO
2.2.2	94995-SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022	m²	2.900,00	72,00	208.800,00	2.900,00		2.900,00	208.800,00	-	208.800,00
2.2.3	CPOS 11.20.050	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos.	m	1.424,00	12,94	18.426,56	1.424,00		1.424,00	18.426,56	-	18.426,56
2.2.4	COMPOSIÇÃO 1	Rampa de acesso para calçada em concreto, incluso piso tátil. (rampa com abas laterais.)	unid.	50,00	1.858,51	92.925,50	2,00		2,00	3.717,02	-	3.717,02
2.2.5	94273-SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionado em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 CM (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário).	m	1.424,00	50,00	71.200,00	-		-	-	-	-
2.2.6	09418/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/ deficientes visuais, dimensões 25x25 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado.	m²	468,75	113,11	53.020,31	-		-	-	-	-
3		MEIO-FIO				629.642,00				563.142,00	-	563.142,00
3.1	94273-SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionado em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 CM (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário).	m	12.592,84	50,00	629.642,00	11.262,84		11.262,84	563.142,00	-	563.142,00
4		CICLOVIAS				940.491,18				-	794.430,54	794.430,54
4.1	92.396,00	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022	m²	-	65,00	-	-		-	-	-	-
4.2	09164/ORSE	Locação topográfica com nivelamento de seções transversais de serviços de terraplenagem, inclusive conferências	m²	51.463,53	5,78	297.459,20		51.463,53	51.463,53		297.459,20	297.459,20
4.3	02592/ORSE	Imprimação - execução e fornecimento de material	m²	7.938,00	13,57	107.718,66	-	6.129,00	6.129,00	-	83.170,53	83.170,53
4.4	COMPOSIÇÃO	Execução de pintura de ligação com emulsão RR-2C - AF_11/2019	m²	7.938,00	4,05	32.148,90	-	6.129,00	6.129,00	-	24.822,45	24.822,45
4.5	95995-SINAPI	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento. Exclui carga e transporte. AF_11/2019	m³	238,14	1.500,01	357.212,38		183,87	183,87		275.806,84	275.806,84
4.6	101002-SINAPI	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³ x km	238,14	3,54	843,02	-	183,87	183,87	-	650,90	650,90
4.7	100986-SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³	714,42	5,31	3.793,57	-	551,61	551,61	-	2.929,05	2.929,05
4.8	96396-SINAPI	Execução e compactação de base ou de sub-base para pavimentação de brita graduada simples - Exclui carga e transporte.AF_11/2019	m³	793,80	169,99	134.938,06	-	615,60	615,60	-	104.645,84	104.645,84
4.9	100974-SINAPI	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante de 10m³ - Carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 HP) e descarga livre.	m³	1.031,94	6,18	6.377,39	-	800,28	800,28	-	4.945,73	4.945,73
5		TERRAPLENAGEM				2.763.156,57				2.738.640,51	-	2.738.640,51
5.1	101137-SINAPI	Escavação horizontal, incluindo carga, descarga de solo de 1ª categoria com trator de esteiras (347HP/lâmina:8,70m²) e caminhão basculante de 10 m³ DMT até 200 m - AF_07/2020	m³	3.522,45	16,35	57.592,06	3.406,52		3.406,52	55.696,60	-	55.696,60
5.2	101139-SINAPI	Escavação horizontal, incluindo, escarificação, carga, descarga de solo de 2ª categoria com trator de esteiras (100HP/lâmina:2,19m²) e caminhão basculante de 10 m³ DMT até 200 m - AF_07/2020	m³	1.426,25	22,04	31.434,55	1.405,30		1.405,30	30.972,82	-	30.972,82
5.3	012519/ORSE	Escavação em material de 3ª categoria com escavadeira hidráulica e rompedor hidráulico	m³	53,20	49,27	2.621,16	53,20		53,20	2.621,16	-	2.621,16
5.4	COMPOSIÇÃO G - P	Escavação em área, a fogo controlado em material de 3ª categoria (rocha dura)com uso de compressor, perfuratriz pneumática e explosivos. Aprovado pela GIGOV para a CAGEPA através da NT.002	m³	1.538,72	115,74	178.091,45	1.538,72		1.538,72	178.091,45	-	178.091,45
5.5	95875-SINAPI	Bota-fora com caminhão basculante via urbana pavimentada m³ x km, DMT até 30km (unidade: m³ x km).	m³xkm	130.509,26	1,49	194.458,79	130.509,26		130.509,26	194.458,79	-	194.458,79
5.6	101137-SINAPI + 03	Escavação horizontal, incluindo carga, descarga de solo de 1ª categoria (Jazida)com trator de esteiras (34HP/lâmina:8,70m²) e caminhão basculante de 10 m³ DMT até 200 m - AF_07/2021. = Areia para aterro	m³	20.063,15	87,71	1.759.738,88	20.063,15		20.063,15	1.759.738,88	-	1.759.738,88
5.7	96386-SINAPI	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente arenoso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019	m³	17.110,82	9,47	162.039,47	16.719,29		16.719,29	158.331,68	-	158.331,68
5.8	95875-SINAPI	Momento extraordinário de transporte - Jazida - Transporte com caminhão basculante em via urbana pavimentada m² x km, DMT até 30 km.	m³xkm	253.141,08	1,49	377.180,21	240.757,80		240.757,80	358.729,13	-	358.729,13
SUB-TOTAL						6.170.803,44				3.832.994,18	1.079.550,54	4.912.544,72
IV		LAJES SOBRE O CANAL										
1		ESCAVAÇÃO				1.044,28				-	-	-
1.1	3658/ORSE	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria em meio alagado.	m³	100,80	4,18	421,34			-	-	-	-



FÍSICO FINANCEIRO												
ITEM	CÓDIGO SINAPI PARA	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL	EXECUTADO FÍSICO(QUANTITATIVOS)			EXECUTADO FINANCEIRO(R\$)		
							ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACMULADO INCLUINDO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACMULADO INCLUINDO PERÍODO
1.2	100974-SINAPI	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante de 10m³ - Carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 HP) e descarga livre.	m³	100,80	6,18	622,94			-	-	-	-
2		MURO DE APOIO				93.224,35				-	-	-
2.1	021180/SBC	Forma em madeira para muro de arrimo	m²	263,68	152,23	40.140,01			-	-	-	-
2.2	102487-SINAPI	Concreto ciclópico Fck= 15Mpa, 30% pedra de mão em volume real , inclusive lançamento.	m³	74,88	679,34	50.868,98			-	-	-	-
2.3	102723-SINAPI	Dreno em muro de contenção, executado no pé do muro , com tubo PVC corrugado flexível perfurado, enchimento com brita , envolvido com manta geotêxtil.	m	32,00	69,23	2.215,36			-	-	-	-
3		LAJES SOBRE MURO				96.093,94				-	-	-
3.1	92267-SINAPI	Fabricação de forma para laje, em chapa de madeira compensada resinada, E=17mm.	m²	325,88	36,77	11.982,61			-	-	-	-
3.2	101792-SINAPI	escoramento de fôrmas de laje em madeira não aparelhada, pé-direito simples, incluso travamento, 4 utilizações. af_09/2020	m³	651,76	23,31	15.192,53			-	-	-	-
3.3	92801-SINAPI	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea utilizando aço CA-50 de 6.3mm	Kg	593,90	13,71	8.142,37			-	-	-	-
3.4	92803-SINAPI	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea utilizando aço CA-50 de 10.0mm	Kg	1.009,60	12,83	12.953,17			-	-	-	-
3.5	92804-SINAPI	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea utilizando aço CA-50 de 12.5mm	Kg	920,10	11,03	10.148,70			-	-	-	-
3.6	103675-SINAPI	Concretagem de vigas e lajes, FCK=25Mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - Lançamento, adensamento e acabamento.	m³	53,43	705,12	37.674,56			-	-	-	-
		SUB-TOTAL				190.362,57				-	-	-
V									-	-	-	-
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				245.662,76				192.873,02	-	192.873,02
1.1	00051/ORSE	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, instalada - Ver. 02-01/2022	m²	56,00	448,51	25.116,56	4,50		4,50	2.018,30	-	2.018,30
1.2	09164/ORSE	Locação topográfica com nivelamento de seções transversais de serviços de terraplenagem, inclusive conferências	m²	24.277,06	5,78	140.321,41	24.277,06		24.277,06	140.321,41	-	140.321,41
1.3	C2207-SEINFRA/CE	Reirada de guia pré-fabricada de concreto	m	240,00	12,08	2.899,20	-		-	-	-	-
1.4	97636-SINAPI	Demolição de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. AF_12/2017	m²	1.200,00	20,80	24.960,00	-		-	-	-	-
1.5	03053/ORSE	Deslocamento de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12 m	unidade	3,00	601,29	1.803,87	-		-	-	-	-
1.6	07989/ORSE	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sem reaproveitamento	m²	3.401,37	13,66	46.462,71	3.399,29		3.399,29	46.434,31	-	46.434,31
1.7	100974-SINAPI	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão de 10 m³- carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,0 m³/128 HP) e descarga livre. AF_07/2020	m³	663,27	6,18	4.099,01	663,27		663,27	4.099,00	-	4.099,00
2		SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM				4.303.304,58				3.763.097,73	378.640,25	4.141.737,98
2.1	101137-SINAPI	Escavação horizontal, incluindo carga, descarga de solo de 1ª categoria com trator de esteiras (347HP/lâmina:8,70m³) e caminhão basculante de 10 m³ DMT até 200 m - AF_07/2020	m³	5.892,44	16,35	96.341,39	5.463,41		5.463,41	89.326,76	-	89.326,76
2.2	101139-SINAPI	Escavação horizontal, incluindo, escarificação, carga, descarga de solo de 2ª categoria com trator de esteiras (100HP/lâmina:2,19m³) e caminhão basculante de 10 m³ DMT até 200 m - AF_07/2020	m³	2.426,07	22,04	53.470,58	2.339,67		2.339,67	51.566,33	-	51.566,33
2.3	COMPOSIÇÃO G	Escavação em área, a fogo controlado em material de 3ª categoria (rocha dura) com uso de compressor, perfuratriz pneumática e explosivos. Aprovado pela GIGOVJP para a CAGEPA através da NT.002.	m³	6.676,17	115,74	772.699,92	6.326,69		6.326,69	732.251,10	-	732.251,10
2.4	101137-SINAPI + 03	Escavação horizontal, incluindo carga, descarga de solo de 1ª categoria (Jazida)com trator de esteiras (34HP/lâmina:8,70m³) e caminhão basculante de 10 m³ DMT até 200 m - AF_07/2021. + material para aterro	m³	5.387,87	87,71	472.570,08	4.660,09	727,78	5.387,87	408.736,49	63.833,58	472.570,07
2.5	95875-SINAPI	Momento Extraordinário de Transporte - Jazida - Transporte com caminhão basculante em via urbana pavimentada m³ x km, DMT até 30 km (unidade: m³ x km). AF_07/2020	m³xkm	64.654,44	1,49	96.335,12	55.921,08	8.733,36	64.654,44	83.322,41	13.012,71	96.335,12
2.6	95875-SINAPI	Bota-fora com caminhão basculante em via urbana pavimentada m³ x km, DMT até 30 km (unidade: m³ x km). AF_07/2020	m³xkm	262.612,56	1,49	391.292,71	233.282,28		233.282,28	347.590,60	-	347.590,60
2.7	96386-SINAPI	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente arenoso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019	m³	4.489,89	9,47	42.519,26	3.883,41	606,48	4.489,89	36.775,89	5.743,37	42.519,26
2.8	100577-SINAPI	Regularização e compactação de sub-leito de solo predominantemente arenoso. AF_11/2019	m²	24.277,06	1,34	32.531,26	16.800,00		16.800,00	22.512,00	-	22.512,00
2.9	100974-SINAPI	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão de 10 m³- carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,0 m³/128 HP) e descarga livre. AF_07/2020	m³	10.014,26	6,18	61.888,13	9.228,26		9.228,26	57.030,64	-	57.030,64

FÍSICO FINANCEIRO												
ITEM	CÓDIGO SINAPI PARA	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL	EXECUTADO FÍSICO(QUANTITATIVOS)			EXECUTADO FINANCEIRO(R\$)		
							ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACMULADO INCLUINDO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACMULADO INCLUINDO PERÍODO
2.10	96388-SINAPI + 036	Execução e compactação de sub-base para pavimentação de solo de comportamento laterítico (arenoso) - Exclusive solo, escavação, carga e transporte.AF_11/2019 + AREIA PARA ATERRO	m³	-	84,73	-	-	-	-	-	-	-
2.11	96396-SINAPI	Execução e compactação de base ou de sub-base para pavimentação de brita graduada simples - Exclusive carga e transporte.AF_11/2019	m³	8.781,77	169,99	1.492.813,08	7.047,12	1.468,65	8.515,77	1.197.939,93	249.655,81	1.447.595,74
CAMADA DRENATE												
2.12	96400 - SINAPI PB (MAR 2023)	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE EOU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	2.232,00	198,44	442.918,08	2.232,00		2.232,00	442.918,08	-	442.918,08
2.13	100974-SINAPI	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante de 10m³ - Carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 HP) e descarga livre.	m³	14.317,90	6,18	88.484,62	12.062,86	1.909,25	13.972,11	74.548,48	11.799,17	86.347,65
2.14	95875-SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade m³xkm). af_09/2016.(momento extraordinário transporte de jazida)	M³XKM	171.814,80	1,51	259.440,35	144.754,32	22.911,00	167.665,32	218.579,02	34.595,61	253.174,63
3		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				2.860.442,44				2.643.147,73	-	2.643.147,73
3.1	02592/ORSE	Imprimação - execução e fornecimento de material	m²	24.277,06	13,57	329.439,70	23.891,65	-	700,00	324.209,69	-	324.209,69
3.2	COMPOSIÇÃO	Execução de pintura de ligação com emulsão RR-2C - AF_11/2019	m²	24.277,06	4,05	98.322,09	23.891,65	-	700,00	23.191,65	96.761,19	93.926,19
3.3	95995-SINAPI	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento. Exclusive carga e transporte. AF_11/2019	m³	1.433,50	1.500,01	2.150.264,33	1.343,40	-	42,00	1.301,40	2.015.113,43	1.952.113,01
3.4	101002-SINAPI	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³ x km	1.433,50	3,54	5.074,59	1.433,50	-	42,00	1.391,50	5.074,60	4.925,92
3.5	100986-SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³	4.300,50	5,31	22.835,65	1.343,40	-	126,00	1.217,40	7.133,45	6.464,39
3.6	102498-SINAPI	Pintura de meio fio com tinta branca a base de cal (caiação). AF_05/2020	m	5.800,62	1,56	9.048,97	5.777,54		5.777,54	9.012,96	-	9.012,96
3.7	94273-SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100 x 15 x 13 x 30 (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016.	m	305,40	50,00	15.270,00	-		-	-	-	-
3.8	94274-SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100 x 15 x 13 x 30 (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016.	m	816,06	54,34	44.344,70	-		-	-	-	-
3.9	903810 - SICRO PB (JAN 2023)	INSTALAÇÃO DE USINA DE ASFALTO A QUENTE CAPACIDADE 120 t/h	UNID.	1,00	185.842,41	185.842,41	1,00		1,00	185.842,41	-	185.842,41
SUB-TOTAL						7.409.409,78				6.599.118,48	302.488,09	6.901.606,57
VI ROTATÓRIA AVENIDA FLORIANO PEIXOTO												
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				6.988,85				-	-	-
1.1	11472-ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m²	804,24	8,69	6.988,85			-	-	-	-
2		ROTATÓRIA				-				-	-	-
2.1	101090-SINAPI	Piso em pedra portuguesa assentado sobre argamassa seca de cimento e areia, traço 1:3, rejuntado com cimento comum.	m²	-	268,24	-			-	-	-	-
2.2	103946-SINAPI	Plantio de grama esmeralda ou São Carlos ou Curitiba, em placas. AF_05/2022	m²	-	25,26	-			-	-	-	-
3		MEIO-FIO				15.664,93				-	-	-
3.1	94274-SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionado em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 CM (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016	m	101,47	61,86	6.276,93			-	-	-	-
3.2	94273-SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionado em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 CM (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016	m	187,76	50,00	9.388,00			-	-	-	-
4		MONUMENTO CENTRAL				-				-	-	-
4.1	93358-SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m	M³	-	84,79	-			-	-	-	-
4.2	96539-SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, E= 17mm, 2 utilizações.	m²	-	140,95	-			-	-	-	-
4.3	91603-SINAPI	Armação do sistema de paredes de concreto, executada como reforço, vergalhão de 10,0mm de diâmetro.	Kg	-	14,43	-			-	-	-	-
4.4	103669-SINAPI	Concretagem de muretas, Fck= 25Mpa, com uso de bomba - Lançamento, adensamento e acabamento.	m³	-	997,39	-			-	-	-	-



FÍSICO FINANCEIRO												
ITEM	CÓDIGO SINAPI PARA	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL	EXECUTADO FÍSICO(QUANTITATIVOS)			EXECUTADO FINANCEIRO(R\$)		
							ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACMULADO INCLUINDO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACMULADO INCLUINDO PERÍODO
4.5	101092-SINAPI	Piso em granito aplicado em calçadas ou pisos externos.	m²	-	374,54	-			-	-	-	-
4.6	90696-SINAPI	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto maciça, DN 200mm, junta elástica - Fornecimento e assentamento.	m	-	180,29	-			-	-	-	-
4.7	103669-SINAPI	Concretagem de pilares, Fck=25Mpa, com uso de baldes em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25m²- Lançamento, adensamento e acabamento.	m³	-	997,39	-			-	-	-	-
4.8	9882-ORSE	Aterro com argila para jardim (paisagismo)	m³	-	93,59	-			-	-	-	-
									-	-	-	-
SUB-TOTAL						22.653,77			-	-	-	-
TOTAL SERVIÇOS						19.325.245,28			15.630.442,80	1.408.217,48	17.038.660,28	
VII	OUTROS SERVIÇOS											
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				919.740,78			-	755.442,45	67.020,89	822.463,34
2		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				54.120,00			-	32.472,00		32.472,00
3		CANTEIRO DE OBRAS				250.253,56			-	250.253,56		250.253,56
4		CONTROLE GEOTÉCNICO				88.144,64			-	88.144,64		88.144,64
SUB-TOTAL						1.312.258,98			1.126.312,65	67.020,89	1.193.333,54	
TOTAL						20.637.504,26			16.756.755,45	1.475.238,37	18.231.993,82	
		Campina Grande, 30 de ABRIL de 2025.										
		Local e Data										

SCAVE ENGENHARIA E LOCAÇÕES		 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB	
MEMORIAL FOTOGRÁFICO			Medição Nº: 11
			Data: 30/04/2025
Contratada: SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA		Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	
CNPJ: 01.514.128/0001-36		Objeto: Urbanização da Av. Plínio Lemos	
Prazo de Execução: 30/10/2023 30/04/2025		Número do Contrato: 2.08.018/2023	
Valor Contratado: 18.941.944,10		Agente Financeiro: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Foto 01: Base e sub-base em brita graduada simples retorno 01		Foto 02: Base e sub-base embrita graduada simples E43 a 61 lado direito (Cagepa)	
			
Foto 03: Concreto asfáltico ciclovia.		Foto 04: Concreto asfáltico ciclovia.	
			

MEMORIAL FOTOGRÁFICO

Medição Nº: 11

Data: 02/04/2025

Contratada: SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ: 01.514.128/0001-36

Prazo de Execução: 30/10/2023 30/04/2025

Valor Contratado: 18.941.944,10

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

Objeto: Urbanização da Av. Plínio Lemos

Número do Contrato: 2.08.018/2023

Agente Financeiro: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Foto 05: Recapeamento lado direito E 127 a 123



Foto 06: Recapeamento lado direito E 36 a 43



Foto 07: Pavimentação asfáltica E43 a 61 lado direito (Cagepa)



Foto 08: Pavimentação asfáltica E43 a 61 lado direito (Cagepa)



MEMORIAL FOTOGRÁFICO

Medição Nº: 11

Data: 02/04/2025

Contratada: SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ: 01.514.128/0001-36

Prazo de Execução: 30/10/2023 30/04/2025

Valor Contratado: 18.941.944,10

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

Objeto: Urbanização da Av. Plínio Lemos

Número do Contrato: 2.08.018/2023

Agente Financeiro: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Foto 09: Recapeamento rua Leonardo Costa



Foto 10: Recapeamento rua Leonardo Costa

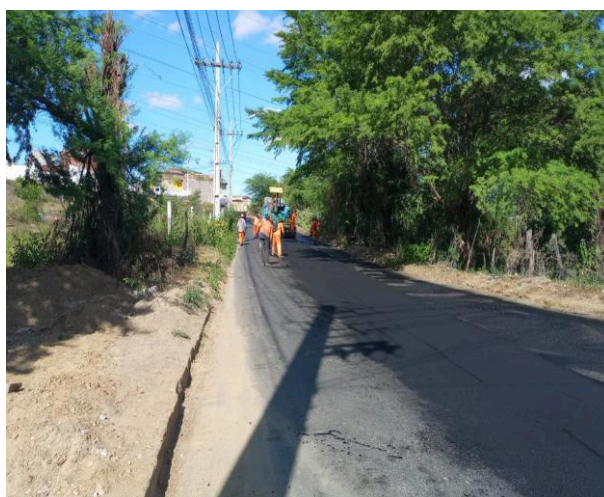


Foto 11: Recapeamento lado direito E 133 a 143.



Foto 12: Recapeamento lado esquerdo E 135 a 147.



MEMORIAL FOTOGRÁFICO

Medição Nº: 11

Data: 02/04/2025

Contratada: SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ: 01.514.128/0001-36

Prazo de Execução: 30/10/2023 30/04/2025

Valor Contratado: 18.941.944,10

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

Objeto: Urbanização da Av. Plínio Lemos

Número do Contrato: 2.08.018/2023

Agente Financeiro: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Foto 13: Recapeamento lado esquerdo E 103 a 124.



Foto 14: Recapeamento lado direito E 126 a 132.

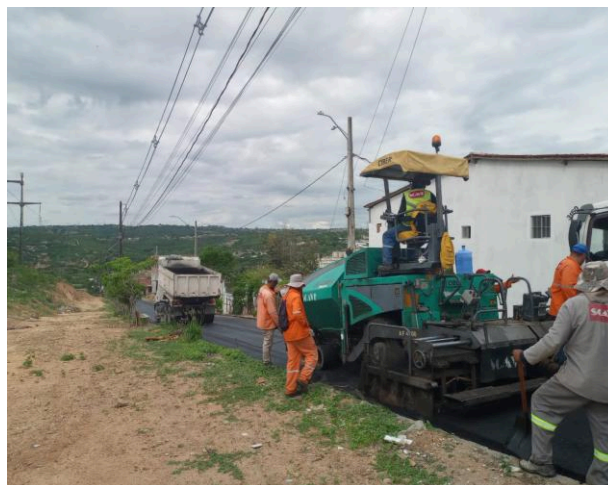


Foto 15: Recapeamento lado direito E 90 a 101



Foto 16: Recapeamento lado direito E 25 a 35





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6BF3-BD38-BA7B-572C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS (CPF 008.XXX.XXX-35) em 05/05/2025 07:48:34 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✓ RUI BARBOSA (CPF 113.XXX.XXX-87) em 05/05/2025 08:16:05 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✓ RUI BARBOSA (CPF 113.XXX.XXX-87) em 05/05/2025 08:16:26 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✓ RUI BARBOSA (CPF 113.XXX.XXX-87) em 05/05/2025 08:16:56 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✓ RUI BARBOSA (CPF 113.XXX.XXX-87) em 05/05/2025 08:17:13 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✓ RUI BARBOSA (CPF 113.XXX.XXX-87) em 05/05/2025 08:17:35 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✓ RUI BARBOSA (CPF 113.XXX.XXX-87) em 05/05/2025 08:17:57 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✓ RUI BARBOSA (CPF 113.XXX.XXX-87) em 05/05/2025 08:18:22 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



RUI BARBOSA (CPF 113.XXX.XXX-87) em 05/05/2025 08:18:40 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



RUI BARBOSA (CPF 113.XXX.XXX-87) em 05/05/2025 08:18:57 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO (CPF 203.XXX.XXX-91) em 05/05/2025 10:46:08
GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/6BF3-BD38-BA7B-572C>
