



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra: 12.345.840,80							
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinhã, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha: 7.017.667,08							
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripêdesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:		607.521,98					
Período da Medição: 25/11/2025 A 15/01/2026										Porcentagem total realizada: 43,16%							
PLANILHA DE MEDIÇÃO 13																	
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDA DE	DADOS DO CONTRATO				MEDIÇÃO 13									
				QUANTID ADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	ACUMULA DO	REVISÃO	ACUMULADO DO TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	REVISÃO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	%
2.3.6.26	103769	SINAPI	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UNID.	1,00	2.042,32	2.489,99	2.042,32	2.489,99	0,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.489,99
2.3.6.27	10069	ORSE	TRAVESSE PARA FUTEBOL DE 30X40 3XCM EM AÇO GALV.3", COM REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO JUBIAL)	UNID.	1,00	4.291,18	5.231,80	4.291,18	5.231,80	0,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	5.231,80
2.3.6.28	2419	ORSE	ESTRUTURA METÁLICA FIXA, P/ TABELA EM AÇO COM ARO E CESTA P/ BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO 114x3", INSTALADA	UNID.	1,00	11.215,87	13.674,38	11.215,87	13.674,38	0,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	13.674,38
2.3.6.29	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO	M²	44,00	41,75	50,90	1.837,00	2.239,60	0,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.239,60
2.3.7			QUADRAS DE AREIA (02 unid.)					111.487,17	135.899,81				0,00	2.476,80	2.476,80		12.136,00
2.3.7.1	102279	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3) LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M³	12,48	6,59	8,03	82,24	100,21	12,48	12,48	100,00%	100,21	0,00	100,21	100,00%	0,00
2.3.7.2	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASENTAMENTO. AF_08/2022 - QUADRAS DE AREIA	M³	12,48	476,27	580,66	5.943,84	7.246,63	12,48	12,48	100,00%	7.246,64	0,00	7.246,64	100,00%	-0,01
2.3.7.3	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M³	7,90	579,18	706,13	4.577,83	5.581,25	7,90	7,90	99,95%	5.578,43	0,00	5.578,43	99,95%	2,82
2.3.7.4	6077-INS	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	192,00	33,70	41,08	6.470,40	7.887,36	192,00	192,00	100,00%	7.887,36	0,00	7.887,36	100,00%	0,00
2.3.7.5	102974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA, COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	240,00	8,44	10,29	2.025,60	2.469,60	240,00	240,00	100,00%	2.469,60	0,00	2.469,60	100,00%	0,00
2.3.7.6	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL DE JAZIDA	M³xKM	3.360,00	2,12	2,58	7.123,20	8.668,80	2.400,00	960,00	100,00%	6.192,00	2.476,80	8.668,80	100,00%	0,00
2.3.7.7	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M²	960,00	2,85	3,47	2.736,00	3.331,20	960,00	960,00	100,00%	3.331,20	0,00	3.331,20	100,00%	0,00
2.3.7.8	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_07/2019	M²	120,00	160,50	195,68	19.260,00	23.481,60	120,00	120,00	100,00%	23.481,60	0,00	23.481,60	100,00%	0,00
2.3.7.9	102363	SINAPI	ALAMBRAÇÃO PARA QUADRA POLIESPORTRIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MATERIAL). AF_03/2024	M²	348,00	165,87	202,22	57.722,76	70.372,56	288,00	288,00	82,76%	58.239,36	0,00	58.239,36	82,76%	12.133,20
2.3.7.10	102487	SINAPI	BLOCOS DE CONCRETO CICLÓPCO (40x40x h=50) - BASE MONTANTE DO ALMBRADO	M³	3,20	539,27	657,47	1.725,66	2.103,90	3,20	3,20	100,00%	2.103,90	0,00	2.103,90	100,00%	0,00
2.3.7.11	103337	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 - MURETA BASE PALAMBRAÇO (h=40cm) SOBRE FUNDAMENTO	M²	46,40	82,32	100,36	3.819,64	4.656,70	46,40	46,40	100,00%	4.656,70	0,00	4.656,70	100,00%	0,00
2.4			PASSAGENS SOBRE O CANAL EM CONCRETO ARMADO					20.996,47	25.595,28					0,00			2.334,48
2.4.1	102475	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:6:2:9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) AREIA MÉDIA	M³	12,30	613,23	747,65	7.542,72	9.196,09	12,30	12,30	100,00%	9.196,10	0,00	9.196,10	100,00%	0,00
2.4.2	103762	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X130 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA MONTAGEM DE BARRAS DE AÇO. AF_03/2025	M³	88,15	60,15	73,33	5.302,22	6.464,03	56,31	56,31	63,88%	4.129,54	0,00	4.129,54	63,88%	2.334,49
2.4.3	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0MM. AF_06/2022	KG	466,95	8,74	10,65	4.081,14	4.973,01	466,95	466,95	100,00%	4.973,02	0,00	4.973,02	100,00%	-0,01
2.4.4	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3MM. AF_06/2022	KG	105,00	9,46	11,53	993,30	1.210,65	105,00	105,00	100,00%	1.210,65	0,00	1.210,65	100,00%	0,00
2.4.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADESAO E ACABAMENTO DE	M²	12,30	250,17	305,00	3.077,09	3.751,50	12,30	12,30	100,00%	3.751,50	0,00	3.751,50	100,00%	0,00
2.5			CALÇADAS EM CONCRETO					228.197,70	278.135,98				81.905,94	4.138,92	86.044,86		69.748,37
2.5.1	94273	SINAPI	ASENTAMENTO DE LULA (MECOPLO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X130 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA MONTAGEM DE BARRAS DE AÇO. AF_03/2025	M	292,90	47,28	57,64	13.848,31	16.882,75	292,90	292,90	100,00%	16.882,76	0,00	16.882,76	100,00%	-0,01
2.5.2	6077-INS	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	691,50	33,70	41,08	23.303,55	28.406,82	444,59	444,59	64,29%	18.263,76	0,00	18.263,76	64,29%	10.143,06
2.5.3	102974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA, COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	864,38	8,44	10,29	7.295,32	8.894,41	444,59	444,59	51,43%	4.574,83	0,00	4.574,83	51,43%	4.319,58
2.5.4	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL DE JAZIDA	M³xKM	12.101,25	2,12	2,58	25.654,65	31.221,22	7.780,35	7.780,35	64,29%	20.073,30	0,00	20.073,30	64,29%	11.147,92
2.5.5	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M²	2.766,00	2,85	3,47	7.883,10	9.598,02	1.641,04	1.641,04	59,33%	5.694,41	0,00	5.694,41	59,33%	3.903,61
2.5.6	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_07/2019	M²	69,15	160,50	195,68	11.098,57	13.531,27	4,07	4,07	5,89%	796,42	0,00	796,42	5,89%	12.734,85
2.5.7	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M²	1.383,00	93,45	113,93	129.241,35	157.565,19	1.372,83	1.372,83	99,26%	133.620,30	0,00	133.620,30	84,80%	23.944,89

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plano Edificações Ltda.						Total da obra:									12.345.840,80		
Obras: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocóngo, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.						Saldo em Planilha:									7.017.567,08		
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripêdesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocóngo.						Medido no Período:									607.521,98		
Período da Medição: 25/11/2025 A 15/01/2026						Porcentagem total realizada:									43,16%		
PLANILHA DE MEDIÇÃO 13																	
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDA DE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANTIDADES					MEDIÇÃO 13			
									ACUMULADO DO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	REVISÃO DO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
2.10.2	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PIQÜENHAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M) ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERILAS (125HP), ÂMINA-2,7MM AF_07/2020, CORTE	M²	3.600,00	0,35	4,2	1.260,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.512,00
2.10.3	101118	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRIO(ATERRO (RETIRADO NA JAZDA, SEM TRANSPORTE))	M³	900,00	0,37	4,10	3.033,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	3.690,00
2.10.4	6077-INS	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10-M, CARGA COM PLATAFORMA DE 14 M², EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: KX3KM) AF_07/2020,	M³	1.462,50	33,70	41,08	49.286,25	60.079,50	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	60.079,50
2.10.5	102974	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M², EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: KX3KM) AF_07/2020,	M³	2.559,38	8,44	10,29	21.601,12	26.335,96	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	26.335,96
2.10.6	95876	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRIO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVO SOLO ESCAVAÇÃO CARGA E ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES:	M²	2.047,50	11,02	13,43	22.563,45	27.497,92	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	27.497,92
2.10.8	94275	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAS EM PLACAS, AF_05/2018	m2	4.207,17	15,73	19,17	66.178,78	80.651,44	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	80.651,44
2.10.10			ARQUIBANCADA										0,00		0,00		
2.10.10	99058	SINAPI	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRAFICA, AF_10/2018	PT	4,00	10,50	12,80	42,00	51,20	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	51,20
2.10.11	102279	SINAPI	ESCVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONITANTE E JUSANTE)BA COMBOSSICAO BOB TREGIO	M³	26,30	6,59	8,03	173,34	211,22	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	211,22
2.10.12	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSA COM CIMENTO E AREIA 13, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS -	M³	178,00	476,27	580,66	84.775,58	103.356,89	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	103.356,89
2.10.13	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, AF_08/2017 -CAMADA SOBRE PEDRA	M²	11,40	576,35	702,68	6.570,39	8.010,55	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	8.010,55
2.10.14	89478	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESURA 14 CM) FCK=15 MPa, LITIGANDO COLHER DE ALVENARIA, DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 16X19X39 CM (ESPESURA 16 CM) ARGAMASSA DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COBERTURA PARA ARGAMASSA TRACO EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALEMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS	M²	127,00	69,67	84,94	8.848,09	10.787,38	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	10.787,38
2.10.18	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE "10 CM" AF_07/2019	M²	36,00	160,50	195,68	5.778,00	7.044,48	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	7.044,48
2.10.19	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LÉS SOBRE SOLO OU RADIER, AF_08/2017 -ARQUIBANCADA - 5cm	M²	11,40	576,35	702,68	6.570,39	8.010,55	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	8.010,55
2.10.20	98680	SINAPI	PSO CIMENTADO - TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA QUANDO CORRUPTO EM TIPOS DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA + 1,00), COM BARRAS VERTICAIS A CADA 2,0M (+1,20) BARRA	M	60,00	291,88	355,86	17.512,80	21.351,60	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	21.351,60
2.10.21	CPU.F2	PRÓPRIA	PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃS AF_04/2021	M²													



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:		12.345.840,80					
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinhã, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:		7.017.667,08					
Endereço: Ruas Isolada Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:		607.521,98					
Período da Medição: 25/11/2025 A 15/01/2026										Porcentagem total realizada:		43,16%					
PLANILHA DE MEDIÇÃO 13																	
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDA DE	DADOS DO CONTRATO				MEDIÇÃO 13									
				QUANTO ADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	ACUMULADA	RECEBIDA	ACUMULADA DO TOTAL	%	SALDO				
2.13.4.5	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M²	23,30	138,98	169,44	3.238,23	3.947,95	21,40	21,40	91,85%	3.626,02				
2.13.4.6	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOIS AF. 06/2018	M²	34,48	49,36	60,17	1.702,13	2.074,90	34,48	34,48	99,99%	2.074,66				
2.13.5			SUPERESTRUTURA				20.830,17	25.394,07				1.625,83	11.580,88				
2.13.5.1			PILARES									0,00	0,00				
2.13.5.1	103669	SINAPI	CONCRETAÇÃO DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES, LANÇAMENTO EM	M³	1,40	973,67	1.187,09	1.363,13	1.661,92	1,40	1,40	100,00%	1.661,93				
2.13.5.2	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF. 06/2022	KG	108,59	8,74	10,65	949,07	1.156,48	108,59	108,59	100,00%	1.156,48				
2.13.5.3	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF. 06/2022	KG	17,79	9,28	11,31	165,09	201,20	17,79	17,79	100,00%	201,20				
2.13.5.4	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE	M²	17,50	158,28	192,97	2.769,90	3.376,97	17,50	17,50	100,00%	3.376,98				
2.13.5.5			VIGAS									0,00	0,00				
2.13.5.5	103683	SINAPI	CONCRETAÇÃO DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM	M³	1,96	1.231,38	1.501,29	2.410,05	2.938,32	1,96	1,96	100,00%	2.938,32				
2.13.5.6	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF. 06/2022	KG	158,14	8,74	10,65	1.382,14	1.684,19	56,16	56,16	35,51%	598,10				
2.13.5.7	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF. 06/2022	KG	39,15	9,28	11,31	363,31	442,78	39,15	39,15	100,00%	442,79				
2.13.5.8	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA.	M²	27,49	102,62	125,11	2.821,43	3.437,97	27,48	27,48	99,93%	3.437,40				
2.13.5.9			LAJE									0,00	0,00				
2.13.5.9	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, REAPADO PARA DRENO, ENCHIMENTO EM	M²	53,21	161,73	197,18	8.606,05	10.492,44	53,21	53,21	100,00%	0,00				
2.13.5.10	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF. 06/2022	KG	102,46	9,46	11,53	969,26	1.181,35	0,00	102,46	100,00%	0,00				
2.13.5.11	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF. 06/2022	KG	14,42	9,44	11,50	136,10	165,80	0,00	14,42	100,00%	0,00				
2.13.5.12	92763	SINAPI	Assobio de 1000 ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5.	KG	25,52	8,96	10,92	228,65	278,67	0,00	25,52	100,00%	0,00				
2.13.6			ELEVACÃO				12.213,97	14.890,58				14.889,82	0,00				
2.13.6.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 910X191 CM (ESPESURA 9 CM) E	M²	156,71	77,94	95,02	12.213,97	14.890,58	156,70	156,70	99,99%	14.889,82				
2.13.7			REVESTIMENTO PAREDES E TETOS				20.641,78	25.163,46				5.623,03	0,00				
2.13.7.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	M²	313,43	3,80	4,63	1.191,03	1.451,18	313,40	313,40	99,99%	1.451,06				
2.13.7.2	87885	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF. 10/2022	M²	46,29	9,09	11,08	420,77	512,89	46,29	46,29	100,00%	512,89				
2.13.7.3	87549	SINAPI	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1: 2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 500 E 1000. ESPESURA DE 10MM COM MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M²	164,96	20,59	25,10	3.396,52	4.140,49	145,78	145,78	88,37%	3.659,08				
2.13.7.4	87529	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 02/2025, PE	M²	148,47	34,00	41,45	5.047,98	6.154,08	0,00	0,00	0,00%	0,00				
2.13.7.5	99198	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 02/2025, PE	M²	164,96	64,17	78,23	10.585,48	12.904,82	0,00	0,00	0,00%	0,00				
2.13.8			COBERTA				17.323,20	21.119,79				0,00	9.835,29				
2.13.8.1	94218	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF. 07/2019, PS	M²	36,50	158,01	192,64	5.767,36	7.031,36	0,00	36,50	100,00%	0,00				
2.13.8.2	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATE 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M²	36,50	63,01	76,82	2.299,86	2.803,93	0,00	36,50	100,00%	0,00				
2.13.8.3	96110	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017, PS	M²	46,29	65,34	79,66	3.024,58	3.687,46	0,00	0,00	0,00%	0,00				
2.13.8.4	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. AF. 06/2022	M²	48,89	121,43	148,04	5.937,01	7.238,04	0,00	0,00	0,00%	0,00				
2.13.8.5	CPU.M2	PRÓPRIA	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA - 05/2014	M²	1,29	228,21	278,23	294,39	358,91	0,00	0,00	0,00%	0,00				
2.13.9			ESQUADRIAS				10.739,58	13.093,64				0,00	0,00				
2.13.9.1	94807	SINAPI	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PLACAS EM MADEIRA COMPENSADA (CARTELÂ). LISA, SEM COÇA, 0,70 X 1,60 A 1,80M. INCLUSIVE INCLUSIVE REPARAÇÃO DE FERRO, COM VÍDIO, BATEANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTAMINACÃO.	UNID	4,00	670,34	817,27	2.681,36	3.269,08	0,00	0,00	0,00%	0,00				
2.13.9.2	12515	ORSE	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CARTELÂ). LISA, SEM COÇA, 0,70 X 1,60 A 1,80M. INCLUSIVE INCLUSIVE REPARAÇÃO DE FERRO, COM VÍDIO, BATEANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTAMINACÃO.	UNID	6,00	1.174,15	1.431,52	7.044,90	8.589,12	0,00	0,00	0,00%	0,00				
2.13.9.3	100674	SINAPI	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CARTELÂ). LISA, SEM COÇA, 0,70 X 1,60 A 1,80M. INCLUSIVE INCLUSIVE REPARAÇÃO DE FERRO, COM VÍDIO, BATEANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTAMINACÃO.	M²	1,44	703,70	857,95	1.013,32	1.235,44	0,00	0,00	0,00%	0,00				
2.13.10			PISO				7.333,16	8.939,40				2.919,40	2.058,98				
2.13.10.1	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF. 09/2021	M²	92,58	2,85	3,47	263,85	321,25	46,29	46,29	50,00%	160,63				
2.13.10.2	00006081	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRAMENTO/ATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M³	18,52	47,19	57,53	873,77	1.065,22	18,52	18,52	100,00%	1.065,23				
2.13.10.3	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4:5,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF. 05/2021 - 8m	M³	3,70	375,10	457,32	1.389,07	1.693,54	3,70	3,70	100,00%	1.693,55				
2.13.10.4	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEQUANDO ACABAMENTO DE REFINADO, ESPESURA 3CM	M²	46,29	36,49	44,48	1.689,12	2.058,97	0,00	46,29	100,00%	0,00				
2.13.10.5	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM, COM CADEMEIA. AF. 06/2022	M²	36,42	62,02	75,61	2.258,76	2.753,71	0,00	0,00	0,00%	0,00				
2.13.10.6	104162	SINAPI	PISO EM GRANITO, MARFORTE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM	M²	9,87	86,99	106,05	858,59	1.046,71	0,00	0,00	0,00%	0,00				
2.13.11			PINTURA				3.315,32	4.041,34				0,00	0,00				
2.13.11.1	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOIS, USANDO MANOAL. AF. 06/2023	M²	148,47	15,02	18,31	2.230,01	2.718,48	0,00	0,00	0,00%	0,00				
2.13.11.2	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF. 06/2023	M²	148,47	7,31	8,91	1.085,31	1.322,86	0,00	0,00	0,00%	0,00				
2.13.12			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				8.499,96	10.362,96				8.543,53	0,00				
2.13.12.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, 20,0 MM, INSTALADO EM CANAL DE ÁGUA.	UN	14,00	120,59	147,02	1.688,26	2.058,28	14,00	14,00	100,00%	2.058,28				
2.13.12.2	CPU.N2	PRÓPRIA	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/ MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 40MM	UN	8,00	176,75	215,49	1.414,00	1.723,92	8,00	8,00	100,00%	1.723,92				

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plano Edificações Ltda.										Total da obra:				12.345.840,80			
Obr: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:				7.017.667,08			
Endereço: Ruas Iolanda Barros Torquato, Rua FloripêdesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:				607.521,98			
Período da Medição: 25/11/2025 A 15/01/2026										Porcentagem total realizada:				43,16%			
PLANILHA DE MEDIÇÃO 13																	
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDA DE	DADOS DO CONTRATO				MEDIÇÃO 13									
				QUANTID ADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM IPI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	ACUMULA DO	ACUMULA DO TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO	
2.16.4	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASEAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CIMENTO DE 14X19X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM ALVENARIA DE VEDADO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPEREUBA 14CM) ARGAMASSA DE CIMENTO 1:2:8 EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO. PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. PARA REVERTE	M²	0,60	579,18	706,13	346,63	422,61	0,00	0,60	100,00%	422,61	0,00	422,61	100,00%	0,00
2.16.5	103318	SINAPI	ALVENARIA DE VEDADO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPEREUBA 14CM) ARGAMASSA DE CIMENTO 1:2:8 EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO. PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. PARA REVERTE	M²	17,64	94,59	115,32	1.668,56	2.034,24	17,64	17,64	100,00%	2.034,24	2.034,24	4.068,48	200,00%	-2.034,24
2.16.6	102476	SINAPI	ALVENARIA DE VEDADO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPEREUBA 14CM) ARGAMASSA DE CIMENTO 1:2:8 EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO. PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. PARA REVERTE	M²	0,37	631,74	770,21	232,16	283,05	0,37	0,37	100,00%	283,05	283,05	566,10	200,00%	-283,05
2.16.7	103670	SINAPI	ALVENARIA DE VEDADO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPEREUBA 14CM) ARGAMASSA DE CIMENTO 1:2:8 EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO. PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. PARA REVERTE	M²	0,37	250,17	305,00	91,93	112,08	0,37	0,37	100,00%	112,08	112,08	224,16	200,00%	-112,08
2.16.8	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF. 06/2022	KG	18,25	9,44	11,50	172,28	209,87	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	209,87
2.16.9	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF. 06/2022	KG	8,30	9,28	11,31	77,02	93,87	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	93,87
2.16.10	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, F. 17,7 MM. AF. 09/2021	M²	5,25	102,62	125,11	538,75	656,82	5,25	5,25	100,00%	656,82	656,82	1.313,64	200,00%	-656,82
2.16.11	101964	SINAPI	ALVENARIA DE VEDADO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPEREUBA 14CM) ARGAMASSA DE CIMENTO 1:2:8 EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO. PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. PARA REVERTE	M²	9,09	161,73	197,18	1.469,31	1.791,38	9,03	9,03	99,39%	1.780,54	0,00	1.780,54	99,39%	10,84
2.16.12	98557	SINAPI	ALVENARIA DE VEDADO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPEREUBA 14CM) ARGAMASSA DE CIMENTO 1:2:8 EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO. PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. PARA REVERTE	M²	9,09	49,36	60,17	448,43	546,64	9,03	9,03	99,39%	543,34	0,00	543,34	99,40%	3,30
2.16.13			REVESTIMENTO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE RENDIDA ARGAMASSA TRACO 1:2:8 EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO. PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. PARA REVERTE	M²	36,11	3,80	4,63	137,21	167,18	36,04	36,04	99,81%	166,87	0,00	166,87	99,81%	0,31
2.16.14	87549	SINAPI	ALVENARIA DE VEDADO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPEREUBA 14CM) ARGAMASSA DE CIMENTO 1:2:8 EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO. PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. PARA REVERTE	M²	20,25	20,59	25,10	416,94	508,27	20,14	20,14	99,46%	505,51	0,00	505,51	99,46%	2,76
2.16.15	87529	SINAPI	ALVENARIA DE VEDADO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPEREUBA 14CM) ARGAMASSA DE CIMENTO 1:2:8 EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO. PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. PARA REVERTE	M²	15,86	34,00	41,45	539,24	657,39	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	657,39
2.16.16	99198	SINAPI	ALVENARIA DE VEDADO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPEREUBA 14CM) ARGAMASSA DE CIMENTO 1:2:8 EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO. PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. PARA REVERTE	M²	20,25	64,17	78,23	1.299,44	1.584,15	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.584,15
2.16.17			PISO										0,00		0,00		
2.16.17	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECANICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLA PERCUSSÃO. AF. 09/2021	M													



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:		12.345.840,80									
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinhá, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:		7.017.667,08									
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:		607.521,98									
Período da Medição: 25/11/2025 A 15/01/2026										Porcentagem total realizada:		43,16%									
PLANILHA DE MEDIÇÃO 13																					
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	MEDIÇÃO 13												
									ACUMULADO	REMOVEDOR	ACUMULADO	%	SALDO	ACUMULADO	VALORES						
									DO TOTAL	DO TOTAL	DO TOTAL	DO TOTAL	DO TOTAL	DO TOTAL	DO TOTAL						
2.17.5.3	95876	SINAPI	TRANSPORTE "COM CAMINHÃO" BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³/KM). AF_07/2020	M³/KM	4.016,25	2,12	2,58	8.514,45	10.361,92	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00						
2.17.5.4	92770	SINAPI	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM.	KG	1.011,20	11,36	13,85	11.487,23	14.005,12	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00						
2.17.5.5	92772	SINAPI	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM.	KG	3.956,05	8,61	10,49	34.061,59	41.498,96	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00						
2.17.5.6	92774	SINAPI	CONCRETO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM.	KG	5.039,76	9,75	11,88	49.137,70	59.872,39	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00						
2.17.5.7	97096	SINAPI	CONCRETO DE LAJE SOBRE SOLO. FCK=30 MPa - LANCAMENTO ADENSAMENTO E CURA EM MOLDURA DE MADEIRA.	m³	152,25	692,59	844,40	105.446,82	128.559,90	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00						
2.17.5.8	92267	SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=12 MM. AF_06/2020	M²	603,15	29,69	36,19	17.907,52	21.827,99	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00						
2.17.5.9	101792	SINAPI	ESQUELAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO (SEM ESQUELAMENTO DE LATERAL). AF_06/2020	M²	152,25	19,14	23,33	2.914,06	3.551,99	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00						
2.17.5.10	102487	SINAPI	CONCRETO COLORIDO FCK=15 MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_06/2021	m³	250,00	539,27	657,47	134.817,50	164.367,50	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00						
2.17.6			CIRCULAÇÃO E EQUIPAMENTOS																		
2.17.6.1	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COM NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6.	M²	930,11	53,44	65,15	49.705,07	60.596,66	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00						
2.17.6.2	CPU.C2	PRÓPRIA	BANCO EM CONCRETO NO ENTORNO DO PARQUE	UNID	30,00	477,08	581,65	14.312,40	17.449,50	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00						
2.17.6.3	104658	SINAPI	PISO PODOSTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA.	M²	211,12	114,69	139,83	24.213,35	29.520,90	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00						
2.17.6.4	103310	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONADO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM 1,50 MM. AF_06/2021	UNID	18,00	1.280,74	1.561,47	23.053,32	28.106,46	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00						
2.17.7			RUAS DE ACESSO																		
2.17.7.1	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CEMENTO E AREIA).	M²	1.787,30	83,61	101,93	149.436,15	182.179,48	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00						
2.17.7.2	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	M²	1.787,30	0,48	0,58	857,90	1.036,63	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00						
3.0		PRÓPRIA	REDE COLETORA DE ESGOTO - REGIÃO III - RUA FLORIPÉDES COUTINHO				1.142.222,26	1.430.199,49			343.502,73	27.719,93	351.388,36	1.059.575,69							
3.1		SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES				4.309,50	5.323,50			0,00	0,00	0,00	5.323,50							
3.1.1	CPU.D3	SINAPI	Placa de obra em chapa de aço galvanizada	m2	12,50	344,76	425,88	4.309,50	5.323,50	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00						
3.2			LIGAÇÕES DOMICILIARES INTERNAS - SERVIÇOS				201.346,04	248.726,04			84.979,75	0,00	84.979,75	163.746,29							
3.2.1	CPU.E3	SINAPI	Ligação domiciliar de esgoto DN 100mm do imóvel até a casa, com conexões.	und	147,00	803,16	992,14	118.064,52	145.844,58	31,00	31,00	21,09%		30.756,34	0,00						
3.2.2	97974	ORSE	Caixa de inspeção em concreto premoldado DN 60 cm com tampa, altura 60 cm	und	147,00	461,46	570,04	67.834,62	83.795,88	94,00	94,00	63,95%		53.583,76	0,00						
3.2.3	100247	SINAPI	Transporte horizontal manual, de tubo de pvc série normal - esgoto predial, ou reforçado para esgoto ou águas pluviais predial, com diâmetro maior que 75 mm e menor ou igual a 100 mm (unidade: m/m).	Mxkm	1.396,50	2,83	3,50	3.952,09	4.887,75	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00						
3.2.4	CPU.J3	PRÓPRIA	Retirada e reposição de calçada cimentada	m2	176,40	20,58	25,42	3.630,31	4.484,08	25,16	25,16	14,26%		639,65	0,00						
3.2.5	CPU.K3	PRÓPRIA	Retirada e reposição de piso em lajota granítica irregular (com arremateamento)	m2	117,60	26,75	33,04	3.145,80	3.885,50	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00						
3.2.6	CPU.L3	PRÓPRIA	Retirada e reposição de contra piso em concreto simples (sem aproveitamento)	m3	176,40	26,75	33,04	4.718,70	5.828,25	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00						
3.3			LIGAÇÕES DOMICILIARES EXTERNAS - SERVIÇOS				247.738,40	306.029,51			27.618,16	0,00	27.618,16	278.411,35							
3.3.1	90106	SINAPI	Escarvação mecanizada de valas em material de 1ª categoria até 1,50 m de profundidade	m3	246,96	6,66	8,23	1.644,75	2.032,48	110,79	110,79	44,86%		911,80	0,00						
3.3.2	94329	SINAPI	Colchão de areia, lastro de vala com preparo de fundo	m3	105,84	94,92	117,25	10.046,33	12.409,74	16,26	16,26	15,37%		1.906,97	0,00						
3.3.3	90733	SINAPI	Assentamento de tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 100 mm, junta elástica (não inclui fornecimento). af_01/2021	m	882,00	2,47	3,05	2.178,54	2.690,10	222,62	222,62	25,24%		678,98	0,00						
3.3.4	93382	SINAPI	Reatero manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023	m3	141,12	21,89	27,04	3.089,11	3.815,88	107,43	107,43	76,13%		2.905,02	0,00						
3.3.5	100247	SINAPI	Transporte horizontal manual, de tubo de pvc série normal - esgoto predial, ou reforçado para esgoto ou águas pluviais predial, com diâmetro maior que 75 mm e menor ou igual a 100 mm (unidade: m/m). af_07/2019	Mxkm	882,00	2,83	3,50	2.496,06	3.087,00	222,60	222,60	25,24%		779,10	0,00						
3.3.6	101852	SINAPI	Reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com argamassa, com reaproveitamento dos paralelepípedos - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020	m2	1.146,60	70,56	87,16	80.904,09	99.937,65	82,00	82,00	7,15%		7.147,12	0,00						
3.3.7	102098	SINAPI	Recomposição de revestimento em concreto asfáltico (aquisição em usina), para o fechamento de valas - incluso demolição do pavimento. af_12/2020	m3	57,33	1.863,62	2.302,13	106.841,33	131.981,11	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00						
3.3.8	36365	SINAPI	Tubo coletor de esgoto pvc, jel, dn 100 mm (nbr 7362)	m	882,00	37,06	45,78	32.686,92	40.377,96	222,60	222,60	25,24%		10.190,63	0,00						
3.3.9	90733	SINAPI	Assentamento de tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 100 mm, junta elástica (não inclui fornecimento). af_01/2021	m	882,00	2,47	3,05	2.178,54	2.690,10	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00						
3.3.10	104076	SINAPI	Selim, pvc ocre, com trava, dn 125 x 100 mm ou 150 x 100 mm, para coletor predial de esgoto	und.	147,00	38,59	47,67	5.672,73	7.007,49	65,00	65,00	44,22%		3.098,55	0,00						
3.4			REDE COLETORA DE ESGOTOS - SERVIÇOS				688.828,33	850.885,00			230.904,82	27.719,93	238.790,45	612.094,55							
3.4.1	99063	SINAPI	Locação e nivelamento	m	754,75	4,65	5,74	3.509,58	4.332,26	432,43	432,43	57,29%		2.482,15	0,00						
3.4.2	CPU.I3	PRÓPRIA	Sinalização de vias com cone de pvc h=0,75m, porta peso e balde plástico (inclusive iluminação)	m	264,16	24,22	29,92	6.397,95	7.903,66	217,00	217,00	82,15%		6.492,64	0,00						
3.4.3	CPU.F3	PRÓPRIA	Sinalização com tela tapume pvc utilização 10 vezes	m	490,59	14,46	17,86	7.093,93	8.761,93	484,03	484,03	98,66%		8.644,78	0,00						
3.4.4	CPU.G3	PRÓPRIA	Passadiços com tábuas de madeira para pedestre	m2	240,00	79,22	97,86	19.012,80	23.486,40	22,50	22,50	9,38%		2.201,85	0,00						
3.4.5	90106	SINAPI	Escarvação mecanizada de valas em material de 1ª categoria até 1,50 m de profundidade	m3	296,40	6,66	8,23	1.974,02	2.439,37	296,40	296,40	100,00%		2.439,37	0,00						



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra: 12.345.840,80									
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinhã, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha: 7.017.667,08									
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:					607.521,98				
Período da Medição: 25/11/2025 A 15/01/2026										Porcentagem total realizada: 43,16%									
PLANILHA DE MEDIÇÃO 13																			
	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDA DE	DADOS DO CONTRATO				MEDIÇÃO 13										
					QUANTID ADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR	RECEBIM ENTO ANTERIOR	ACUMULADO DO TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	RECEBIM ENTO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
3.4.6	90108	SINAPI	Escavação mecanizada de valas em material de 1ª categoria até 2,00 m de profundidade	m3	241,60	5,98	7,39	1.444,76	1.785,42	106,40		106,40	44,04%		786,30	0,00	786,30	44,04%	999,12
3.4.7	102325	SINAPI	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m³), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 2a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021	m3	322,80	13,56	16,75	4.377,16	5.406,90	148,80		148,80	46,10%		2.492,40	0,00	2.492,40	46,10%	2.914,50
3.4.8	CPU.H3	PRÓPRIA	Escavação manual em valas com material de 3ª categoria sem uso de explosivo e fogo controlado com utilização de compressor e rompedor - profundidade até 2,00m	m3	215,20	349,18	431,34	75.143,53	92.824,36	18,76		18,76	8,72%		8.091,94	0,00	8.091,94	8,72%	84.732,42
3.4.9	93378	SINAPI	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão. af_08/2023	m3	381,89	20,40	25,20	7.790,55	9.623,62	381,89		381,89	100,00%		9.623,63	0,00	9.623,63	100,00%	-0,01
3.4.10	101622	SINAPI	Colchão de areia, lastro de vala com preparo de fundo	m3	286,42	210,22	259,68	60.211,21	74.377,54	58,87		58,87	20,56%		15.288,47	0,00	15.288,47	20,56%	59.089,07
3.4.11	93382+0368	SINAPI	Aterro mecanizado com empréstimo de material	m3	350,06	79,39	98,07	27.791,26	34.330,38	83,62		83,62	23,89%		8.200,93	0,00	8.200,93	23,89%	26.129,45
3.4.12	95875	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dnt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	694,11	2,47	3,05	1.714,45	2.117,03	648,49		648,49	93,43%		1.977,91	0,00	1.977,91	93,43%	139,12
3.4.13	95875	SINAPI	Transporte com caminhão basculante até 15,00Km (momento extraordinário)	m3xkm	13.535,15	2,47	3,05	33.431,82	41.282,20	751,20		751,20	5,55%		2.291,16	0,00	2.291,16	5,55%	38.991,04
3.4.14	101582	SINAPI	Escoramento de vala, tipo contínuo, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura menor que 1,5 m. af_08/2020	m2	636,48	55,56	68,63	35.362,82	43.681,62	572,10		572,10	89,88%		39.263,22	0,00	39.263,22	89,88%	4.418,40
3.4.15	101577	SINAPI	Escoramento de vala, tipo descontínuo, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. af_08/2020	m2	636,48	43,28	53,46	27.546,85	34.026,22	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	34.026,22
3.4.16	104482	SINAPI	Esgotamento de vala com bomba submersível	h	220,00	24,37	30,10	5.361,40	6.622,00	184,00		184,00	83,64%		5.538,40	0,00	5.538,40	83,64%	1.083,60
3.4.17	CPU.B3	PRÓPRIA	Retrada e reposição de rede de abastecimento de água DN = 50mm	m	882,00	50,70	62,63	44.717,40	55.239,66	109,00		109,00	12,36%		6.826,67	0,00	6.826,67	12,36%	48.412,99
3.4.18	CPU.C3	PRÓPRIA	Retrada e reposição de ligação domiciliar de água	und	147,00	51,11	63,14	7.513,17	9.281,58	68,00		68,00	46,26%		4.293,52	0,00	4.293,52	46,26%	4.988,06
3.4.19	90734+41936	SINAPI	Fornecimento e assentamento de tubo PVC DN 150mm	m	795,60	75,61	93,40	60.155,31	74.309,04	432,43		432,43	54,35%		40.388,96	0,00	40.388,96	54,35%	33.920,08
3.4.20	100248	SINAPI	Transporte horizontal manual, de tubo de pvc série normal - esgoto predial, ou reforçado para esgoto ou águas pluviais predial, com diâmetro maior que 100 mm e menor ou igual a 150 mm (unidade: mxkm). af_07/2019	m	795,60	11,16	13,79	8.878,89	10.971,32	432,43		432,43	54,35%		5.963,21	0,00	5.963,21	54,35%	5.008,11
3.4.21	97988	SINAPI	Base para poço de visita circular para esgoto, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, diâmetro interno = 1,20 m, profundidade = 1,40 m, excluindo tampão. af_12/2020_pa	und	0,00	2.773,65	3.426,29	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3.4.22	97987	SINAPI	Acréscimo para poço de visita circular para esgoto, em concreto pré- moldado, diâmetro interno = 1,2 m. af_12/2020	und	4,00	673,54	832,02	2.694,16	3.328,08	1,00	3,00	4,00	0,00%		832,02	2.496,06	3.328,08	0,00%	0,00
3.4.23	102141	SINAPI	Base para poço de visita circular para esgoto, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,50 m, profundidade = 1,35 m, excluindo tampão. af_12/2020_pa	und	0,00	2.484,44	3.069,03	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00%		3.069,03	-3.069,03	0,00	0,00%	0,00
3.4.24	97991	SINAPI	Acréscimo para poço de visita circular para esgoto, em concreto pré- moldado, diâmetro interno = 1,5 m. af_12/2020	und	4,00	924,01	1.141,43	3.696,04	4.565,72	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	4.565,72
3.4.25	98114	SINAPI	Tampão em ferro fundido 600mm padrão CAGEPA	und	11,00	684,74	845,86	7.532,14	9.304,46	0,00	10,00	10,00	90,91%		0,00	8.458,60	8.458,60	90,91%	845,86
3.4.26	101852	SINAPI	Reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com argamassa, com reaproveitamento dos paralelepípedos - incluso retrada e colocação do material. af_12/2020	m2	1.591,20	70,56	87,16	112.275,07	138.688,99	616,30		616,30	38,73%		53.716,27	0,00	53.716,27	38,73%	84.972,72
3.4.27	102098	SINAPI	Recomposição de revestimento em concreto asfáltico (aquisição em usina), para o fechamento de valas - incluso demolição do pavimento. af_12/2020	m3	63,65	1.863,62	2.302,13	118.619,41	146.530,57	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	146.530,57
3.4.28	CPU.A3	PRÓPRIA	Limpeza e teste de estanqueidade	m	795,60	5,76	7,12	4.582,65	5.664,67	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	5.664,67
3.4.29	102098	SINAPI	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	UND	12,00	1.605,63	1.983,43	19.267,56	23.801,16	0,00	10,00	10,00	83,33%		1,00	19.834,30	19.835,30	83,34%	3.965,86
4.0			CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE PADRÃO (2 UND.)		2,00	80.997,85	98.752,21	169.506,25	206.218,21						61.105,37	70.716,07	131.822,24		74.396,97
4.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					3.394,56	4.138,24						2.069,12	2.069,12	4.138,24		0,00
4.1.1	99059	SINAPI	LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALEITADAS - A CADA 2,00M - 2 PONTALEITADAS E 2 TÁBUAS	M	64,00	53,04	64,66	3.394,56	4.138,24	32,00	32,00	64,00	100,00%		2.069,12	2.069,12	4.138,24	100,00%	0,00
4.2			INFRAESTRUTURA					39.677,52	48.369,88						15.994,16	27.859,14	43.853,30		4.516,58
4.2.1			FUNDAÇÃO					20.289,84	24.735,64						5.812,59	16.060,43	21.873,02		2.862,62



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra: 12.345.840,80									
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha: 7.017.667,08									
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripêdesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:					607.521,98				
Período da Medição: 25/11/2025 A 15/01/2026										Porcentagem total realizada: 43,16%									
PLANILHA DE MEDIÇÃO 13															MEDIÇÃO 13				
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDA DE	QUANTO ADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANTIDADES					VALORES					
									ACUMULADO	RECORRIDO NO PERÍODO	ACUMULADO DO TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	RECORRIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO	
4.2.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	43,46	72,19	88,01	3.137,37	3.824,91	20,25	13,50	33,75	77,66%		1.782,20	1.188,14	2.970,34	77,66%	854,57
4.2.1.2	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	43,46	8,83	10,76	383,75	467,62	0,00	13,50	13,50	31,06%		0,00	145,26	145,26	31,06%	322,36
4.2.1.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	749,03	2,47	3,01	1.850,10	2.254,58	0,00	189,00	189,00	25,23%		0,00	568,89	568,89	25,23%	1.685,69
4.2.1.4	103800	SINAPI	PELURA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E REDESA DE ALCO COM ESPECULAS	m³	26,70	476,27	580,66	12.717,74	15.505,24	4,63	22,07	26,70	100,00%		2.688,75	12.816,50	15.505,25	100,00%	-0,01
4.2.1.5	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	3,80	579,18	706,13	2.200,88	2.683,29	1,90	1,90	3,80	100,00%		1.341,64	1.341,64	2.683,28	100,00%	0,01
4.2.2			SAPATAS				4.019,23	4.899,58							2.431,25	2.431,37	4.862,62		36,96
4.2.2.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COARADOAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	6,45	29,90	36,45	192,85	235,10	3,23	3,23	6,45	100,00%		117,55	117,55	235,10	100,00%	0,00
4.2.2.2	102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:2:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_05/2021	m³	1,62	631,74	770,21	1.023,41	1.247,74	0,81	0,81	1,62	100,00%		623,87	623,87	1.247,74	100,00%	0,00
4.2.2.3	103670	SINAPI	ACABAMENTO COM USO DE BALDES, ADESAAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m²	1,62	250,17	305,00	405,27	494,10	0,81	0,81	1,62	100,00%		247,05	247,05	494,10	100,00%	0,00
4.2.2.4	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	102,60	8,74	10,65	896,72	1.092,69	49,56	49,57	99,13	96,62%		527,81	527,92	1.055,73	96,62%	36,96
4.2.2.5	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	10,80	138,98	169,44	1.500,98	1.829,95	5,40	5,40	10,80	100,00%		914,97	914,98	1.829,95	100,00%	0,00
4.2.3			CINTAMENTO				15.368,45	18.734,66							7.750,32	9.367,34	17.117,67		1.616,99
4.2.3.1	102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:2:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_05/2021	m³	3,54	631,74	770,21	2.236,35	2.726,54	1,77	1,77	3,54	100,00%		1.363,27	1.363,27	2.726,54	100,00%	0,00
4.2.3.2	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADESAAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m²	3,54	250,17	305,00	885,60	1.079,70	1,77	1,77	3,54	100,00%		539,85	539,85	1.079,70	100,00%	0,00
4.2.3.3	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	52,40	9,44	11,50	494,65	602,60	26,20	26,20	52,40	100,00%		301,30	301,30	602,60	100,00%	0,00
4.2.3.4	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	142,00	8,74	10,65	1.241,08	1.512,30	71,00	71,00	142,00	100,00%		360,90	756,15	1.117,05	73,86%	395,25
4.2.3.5	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	120,30	9,28	11,31	1.116,38	1.360,59	60,15	60,15	120,30	100,00%		324,68	680,30	1.004,98	73,86%	355,61
4.2.3.6	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	49,88	138,98	169,44	6.932,32	8.451,66	24,94	24,94	49,88	100,00%		4.225,83	4.225,83	8.451,66	100,00%	0,00
4.2.3.7	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMAS AF_06/2018	m²	49,88	49,36	60,17	2.462,07	3.001,27	24,94	24,94	49,88	100,00%		634,49	1.500,64	2.135,13	71,14%	866,14
4.3			SUPERESTRUTURA				25.416,40	30.984,46							12.770,60	15.230,69	28.001,29		2.983,17
4.3.1			PILARES				13.646,73	16.638,67							5.623,64	8.083,81	13.707,45		2.931,22
4.3.1.1	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADESAAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	2,58	973,67	1.187,09	2.512,06	3.062,69	1,29	1,29	2,58	100,00%		1,29	1.531,35	1.532,64	50,04%	1.530,05
4.3.1.2	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	222,60	8,74	10,65	1.945,52	2.370,69	111,30	111,30	222,60	100,00%		1.185,34	1.185,35	2.370,69	100,00%	0,01
4.3.1.3	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	69,40	9,28	11,31	644,03	784,91	26,84	26,84	53,69	77,36%		303,59	303,59	607,18	77,36%	177,73
4.3.1.4	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	54,00	158,28	192,97	8.547,12	10.420,38	21,42	26,24	47,66	88,26%		4.133,42	5.063,53	9.196,95	88,26%	1.223,43
4.3.2			VIGAS				7.352,45	8.962,78							4.455,47	4.455,37	8.910,84		51,94
4.3.2.1	103683	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE, COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MÚLTIPLOS ANDARES	m³	2,14	1.231,38	1.501,29	2.635,15	3.212,76	1,07	1,07	2,14	100,00%		1.606,38	1.606,38	3.212,76	100,00%	0,00
4.3.2.2	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	8,60	9,46	11,53	81,35	99,15	2,05	2,05	4,11	47,73%		23,67	23,67	47,33	47,74%	51,82
4.3.2.3	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	81,00	9,44	11,50	764,64	931,50	40,50	40,49	80,99	99,99%		465,75	465,64	931,39	99,99%	0,12
4.3.2.4	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	36,20	8,74	10,65	316,38	385,53	18,10	18,10	36,20	100,00%		192,76	192,77	385,53	100,00%	0,00
4.3.2.5	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	45,80	9,28	11,31	425,02	517,99	22,90	22,90	45,80	100,00%		258,99	259,00	517,99	100,00%	0,00
4.3.2.6	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	30,50	102,62	125,11	3.129,91	3.815,85	15,25	15,25	30,50	100,00%		1.907,92	1.907,93	3.815,85	100,00%	0,00
4.3.3			LAJE				4.415,22	5.383,01							2.691,50	2.691,51	5.383,01		0,00
4.3.3.1	101964	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORNO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, MANTA CONVENCIONAL, ALTOBA	m²	27,30	161,73	197,18	4.415,22	5.383,01	13,65	13,65	27,30	100,00%		2.691,50	2.691,51	5.383,01	100,00%	0,00
4.4			ELEVADO				9.655,20	11.771,07							5.885,53	5.856,08	11.741,61		29,46
4.4.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA: 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m³	123,88	77,94	95,02	9.655,20	11.771,07	61,94	61,63	123,57	99,75%		5.885,53	5.856,08	11.741,61	99,75%	29,46
4.5			REVESTIMENTO PAREDES E TETOS				24.504,87	29.873,82							3.053,52	3.049,50	6.103,02		23.770,80
4.5.1	87879	SINAPI	CRAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM CRAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA	m²	247,76	3,80	4,63	941,48	1.147,12	123,88	123,01	246,89	99,65%		573,56	569,54	1.143,10	99,65%	4,02
4.5.2	87885	SINAPI	ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA	m²	32,50	9,09	11,08	295,42	360,10	16,25	16,25	32,50	100,00%		180,05	180,05	360,10	100,00%	0,00
4.5.3	87549	SINAPI	REVESTIMENTO DE CERÂMICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1: 2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE BASES PARA VIGAS, COM REVESTIMENTO	m²	247,76	20,59	25,10	5.101,37	6.218,77	91,63	91,63	183,26	73,97%		2.299,91	2.299,91	4.599,83	73,97%	1.618,94
4.5.4	90409	SINAPI	PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, REVESTIMENTO LÂMINAS PARA LAJES COM	m²	32,50	33,72	41,11	1.095,90	1.336,07	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.336,07
4.5.5	87257	SINAPI	PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES	m²	92,70	98,59	120,20	9.139,29	11.142,54	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	11.142,54
4.5.6	99198	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA, BLENDO BORDA DE DIMENSÃO 20X30 CM	m²	123,60	64,17	78,23	7.931,41	9.669,22	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	9.669,22
4.6			COBERTA				10.502,67	12.804,04							0,00	11.993,68	11.993,68		810,36
4.6.1	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPACANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	75,92	38,08	46,42	2.891,03	3.524,20	0,00	75,92	75,92	100,00%		0,00	3.524,21	3.524,21	100,00%	-0,01
4.6.2	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	75,92	63,01	76,82	4.783,71	5.832,17	0,00	75,92	75,92	100,00%		0,00	5.832,17	5.832,17	100,00%	0,00
4.6.3	291	ORSE	RUFO EM PLACA DE CONCRETO L=34cm	m	29,50	73,33	89,40	2.163,23	2.637,30	0,00	29,50	29,50	100,00%		0,00	2.637,30	2.637,30	10	

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:										12.345.840,80		
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinhã, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:										7.017.667,08		
Endereço: Ruas Isolada Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:										607.521,98		
Período da Medição: 25/11/2025 A 15/01/2026										Porcentagem total realizada:										43,16%		
PLANILHA DE MEDIÇÃO 13																						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDA DE	QUANTO ADE	DADOS DO CONTRATO				QUANTIDADES										MEDIÇÃO 13			
					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	ACUMULADA DO	REVISÃO DO	ACUMULADA DO TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	REVISÃO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO				
4.6.4	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, 6,3MM	m²	5,47	121,43	148,04	664,70	810,37	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	810,37	
4.7			ESQUADRIAS					14.333,27	17.474,83						0,00	0,00	0,00			17.474,83		
4.7.1	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES, AF-12/2019	m²	11,34	602,15	734,14	6.828,38	8.325,14	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%		8.325,14		
4.7.2	12710	ORSE	PORTA DE ENROLAR, EM PERFIL MEIA CANA FECHADO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	9,06	354,25	431,90	3.209,50	3.913,01	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%		3.913,01		
4.7.3	12710	ORSE	PORTA DE ENROLAR, EM PERFIL MEIA CANA FECHADO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	2,84	354,25	431,90	1.006,07	1.226,59	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%		1.226,59		
4.7.4	12710	ORSE	PORTA DE ENROLAR, EM PERFIL MEIA CANA FECHADO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	4,72	354,25	431,90	1.672,06	2.038,56	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%		2.038,56		
4.7.5	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO	m²	0,36	658,82	803,23	237,17	289,16	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%		289,16		
4.7.6	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA, PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF-03/2016	M	26,36	32,61	39,75	859,59	1.047,81	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%		1.047,81		
4.7.7	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA, PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF-03/2016	M	6,00	43,82	53,42	262,92	320,52	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%		320,52		
4.7.8	93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF-03/2016	M	6,00	42,93	52,34	257,58	314,04	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%		314,04		
4.8			PISO					8.775,53	10.697,86						656,67	1.232,83	1.889,50			8.806,36		
4.8.1	97083	SINAPI	CUMPRIMENTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO LIGADO SOBRE SOLO, COM CONTRAFORTES	m²	58,80	2,85	3,47	167,58	204,03	14,70	14,70	29,40	50,00%		51,01	51,01	102,02	50,00%		102,01		
4.8.2	0006081	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRIO/ATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	m³	20,58	47,19	57,53	971,17	1.183,96	4,69	14,70	19,39	94,19%		269,53	845,69	1.115,22	94,19%		68,74		
4.8.3	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MEDIANTE BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF-05/2021	m³	2,94	375,10	457,32	1.102,79	1.344,52	0,74	0,74	1,47	50,00%		336,13	336,13	672,26	50,00%		672,26		
4.8.4	87630	SINAPI	CONTRAFORTES EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO LIGADO SOBRE LAJE, EXTRA DE 10 CM	m²	58,80	36,49	44,48	2.145,61	2.615,42	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%		2.615,42		
4.8.5	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, EXTRA DE DIMENSÕES 15X15 CM, CADA UM	m²	29,10	62,02	75,61	1.804,78	2.200,25	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%		2.200,25		
4.8.6	104162	SINAPI	GRANITINA EM AMBIENTES INTERIORES, COM ESPESURA DE 2 CM, INCLUSIVE MONTAGEM	m²	29,70	86,99	106,05	2.583,60	3.149,68	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%		3.149,68		
4.9			PINTURA					2.316,28	2.823,53						0,00	0,00	0,00			2.823,53		
4.9.1	100757	SINAPI	PINTURA COM LANTIN - ALGODÃO DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACRIADO) EM LUBRIFICADA SOBRE	M²	55,68	41,60	50,71	2.316,28	2.823,53	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%		2.823,53		
4.10			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					7.420,84	9.047,04						3.425,83	3.425,83	6.851,66			2.195,38		
4.10.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, PREVISÃO DE CONSUMO DE 10 LPM	UN	14,00	120,59	147,02	1.688,26	2.058,28	7,00	7,00	14,00	100,00%		1.029,14	1.029,14	2.058,28	100,00%		0,00		
4.10.2	CPU.D4	PRÓPRIA	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MÔDULOS, BALNE, BANHEIROS, ETC.)	pt	8,00	71,19	86,79	569,52	694,32	4,00	4,00	8,00	100,00%		347,16	347,16	694,32	100,00%		0,00		
4.10.3	CPU.E4	PRÓPRIA	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, LAVABOS, LAVAS, ETC.)	pt	2,00	121,17	147,73	242,34	295,46	1,00	1,00	2,00	100,00%		147,73	147,73	295,46	100,00%		0,00		
4.10.4	CPU.F4	PRÓPRIA	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 75 MM	pt	2,00	157,36	191,85	314,72	383,70	1,00	1,00	2,00	100,00%		191,85	191,85	383,70	100,00%		0,00		
4.10.5	CPU.G4	PRÓPRIA	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	pt	2,00	105,08	128,11	210,16	256,22	1,00	1,00	2,00	100,00%		128,11	128,11	256,22	100,00%		0,00		
4.10.6	98104	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBO DE PVC Ø 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL	UN	2,00	326,09	397,56	652,18	795,12	1,00	1,00	2,00	100,00%		397,56	397,56	795,12	100,00%		0,00		
4.10.7	104329	SINAPI	CAIXA SIFONADA COM GREIDE, REDONDA, PVC ØN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF-01/2020	UN	4,00	68,47	83,47	273,88	333,88	2,00	2,00	4,00	100,00%		166,94	166,94	333,88	100,00%		0,00		
4.10.8	97900	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS Ø 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL	UN	4,00	164,66	200,75	658,64	803,00	2,00	2,00	4,00	100,00%		401,50	401,50	803,00	100,00%		0,00		
4.10.9	97902	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS Ø 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL	UN	2,00	505,12	615,84	1.010,24	1.231,68	1,00	1,00	2,00	100,00%		615,84	615,84	1.231,68	100,00%		0,00		
4.10.10	97741	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS Ø 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL	UN	2,00	161,72	197,16	323,44	394,32	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%		394,32		
4.10.11	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (½"), 5,0 MPH FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF-10/2016	UN	2,00	146,65	178,79	293,30	357,58	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%		357,58		
4.10.12	102622	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉTILENO, 500 LITROS (INCLUI TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOMBA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	2,00	591,98	721,74	1.183,96	1.443,48	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%		1.443,48		
4.11			LOUÇAS E METAIS					6.894,64	11.819,52						0,00	0,00	0,00			11.819,52		
4.11.1	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF-01/2020	UN	2,00	501,35	611,24	1.002,70	1.222,48	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%		1.222,48		
4.11.2	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF-01/2020	UN	2,00	44,34	54,05	88,68	108,10	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%		108,10		
4.11.3	2033	ORSE	PAPELEIRA DE LOUÇA, DECA A480, 15 X 15 CM OU SIMILAR	un	2,00	60,37	73,60	120,74	147,20	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%		147,20		
4.11.4	100869	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF-01/2020	UN	6,00	365,45	445,55	2.192,70	2.673,30	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%		2.673,30		
4.11.5	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSÓ, 29,3 X 39,0 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF-01/2020	UN	2,00	150,13	183,03	300,26	366,06	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%		366,06		
4.11.6	93442	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC Ø 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL	UN	2,00	1.218,54	1.485,64	2.437,08	2.971,28	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%		2.971,28		
4.11.7	00011692	SINAPI	BANDEJA DE COZINHA EM AÇO INOX, EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO BRILHANTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF-01/2020	m²	6,00	505,19	615,92	3.031,14	3.695,52	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%		3.695,52		
4.11.8	89986	SINAPI	REGISTRO DE "GAVETA" BRUTO, LITRO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CAMBRIA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF-01/2020	UN	6,00	86,89	105,93	521,34	635,58	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%		635,58		
4.12			CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS					2.633,82	3.210,81						0,00	0,00	0,00			3.210,81		
4.12.1	94228	SINAPI	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 90 CM, LARGURA DE 60 CM, COM TUBO DE PVC Ø 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL	M	6,48	85,71	104,49	555,40	677,09	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	</			

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra: 12.345.840,80								
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinhã, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha: 7.017.667,08								
Endereço: Ruas Isolada Barros Torquato, Rua Floripêdscoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período: 607.521,98								
Período da Medição: 25/11/2025 A 15/01/2026										Porcentagem total realizada: 43,16%								
PLANILHA DE MEDIÇÃO 13																		
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDA DE	QUANTID ADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	DADOS DO CONTRATO		QUANTIDADES			MEDIÇÃO 13							
						PREÇO UNITÁRIO (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	ACUMULA DO	REMOVIM ENTO	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	REMOVIM ENTO	ACUMULADO TOTAL	SALDO			
4.13.7	9193	ORSE	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA COM PONTELETO DE AÇO GALVANIZADO D=1 1/2", FIXADO NO TELHADO	un	2,00	252,92	308,36	505,84	616,72	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	616,72		
4.14			DIVERSOS				2.409,69	2.937,85				0,00	0,00	0,00		2.937,85		
4.14.1	10759	ORSE	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	m²	4,32	557,80	680,06	2.409,69	2.937,85	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.937,85		
5.0			CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE				2.004.909,66	2.859.642,11				827.843,69	300.093,21	914.488,67		1.945.153,44		
5.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				62.276,39	75.914,90				65.839,64	-1.660,18	64.179,46		11.735,44		
5.1.1	CPU.G5	PRÓPRIA	Pisca da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal	m²	10,00	344,76	420,33	3.447,60	4.203,30	10,00	10,00	100,00%	4.203,30	0,00	4.203,30	100,00%	0,00	
5.1.2	98459	SINAPI	Tapume com telha metálica. af_05/2018	m²	99,00	96,06	117,11	9.509,94	11.593,89	99,00	99,00	100,00%	11.593,89	0,00	11.593,89	100,00%	0,00	
5.1.3	C2850	SEINFRA	Ligação provisória de energia elétrica aérea provisória 50kV com haste de madeira isolada	un	1,00	1.676,69	2.044,22	1.676,69	2.044,22	1,00	1,00	100,00%	2.044,22	0,00	2.044,22	100,00%	0,00	
5.1.4	C1622	SEINFRA	Instalação provisória de água e sanitário	un	1,00	3.600,03	4.389,15	3.600,03	4.389,15	1,00	1,00	100,00%	4.389,15	0,00	4.389,15	100,00%	0,00	
5.1.5	10779	SINAPI	Locação de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, p/ sanitário c/ 5 banis - 1 lavatório e 4 mictórios (maior)	mês	8,00	1.112,50	1.356,36	8.900,00	10.850,88	3,87	-0,68	3,19	39,92%	5.253,50	-922,32	4.331,17	39,92%	6.519,71
5.1.6	10775	SINAPI	Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem	mês	8,00	890,00	1.085,08	7.120,00	8.680,64	3,87	-0,68	3,19	39,92%	4.202,77	-737,85	3.464,91	39,92%	5.215,73
5.1.7	93584	SINAPI	Barraço provisório para depósito (6,00 X 4,00)	m²	24,00	777,76	948,24	18.666,24	22.757,76	24,00	24,00	100,00%	22.757,76	0,00	22.757,76	100,00%	0,00	
5.1.8	90509	SINAPI	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tubos, com deslocamento de cerca 2,00m - 2	m	166,00	53,04	64,66	8.804,64	10.733,56	166,00	166,00	100,00%	10.733,56	0,00	10.733,56	100,00%	0,00	
5.1.9	98525	SINAPI	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m²	1.575,00	0,35	0,42	551,25	661,50	1.575,00	100,00%	661,50	0,00	661,50	100,00%	0,00		
5.2			MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÕES				40.847,58	112.736,82				49.003,26	62.940,35	49.003,26		792,22		
5.2.1			EDIFICAÇÃO				40.459,11	112.262,45				49.003,26	62.940,35	49.003,26		318,85		
5.2.1.1	94319	SINAPI	Assento manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecânica af_05/2018	m³	356,40	68,69	83,74	24.481,11	29.844,93	356,40	100,00%	29.844,94	0,00	29.844,94	100,00%	-0,01		
5.2.1.2	96525	SINAPI	Assento manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecânica af_05/2018	m³	250,58	44,22	53,91	11.080,64	13.508,77	250,58	100,00%	13.508,77	0,00	13.508,77	100,00%	-0,01		
5.2.1.3	101617	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	107,09	2,63	3,20	281,84	342,68	107,09	100,00%	342,69	0,00	342,69	100,00%	-0,01		
5.2.1.4	93382	SINAPI	Reatero manual de valas com compactação mecânica af_04/2018	m³	219,86	21,89	26,68	4.615,72	5.625,74	198,91	94,33%	5.306,87	0,00	5.306,87	94,33%	318,87		
5.2.1.5	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBAISAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA DE 14X19X20CM	M³	42,31	579,18	706,13	24.505,10	29.876,36	0,00	42,31	42,31	100,00%	5.307,87	29.876,36	35.184,23	117,77%	-5.307,87
5.2.1.6	6077-INS	SINAPI	ARGILA DO BARRO PARA ATERRO/REATERO (BARRO NA LAVIA, SEM TRANSPORTE)	M³	428,29	33,70	41,08	14.433,37	17.594,15	0,00	428,29	428,29	100,00%	5.308,87	17.594,15	22.903,03	130,17%	-5.308,88
5.2.1.7	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO, PNT	M³XKM	5.996,06	2,12	2,58	12.711,64	15.469,83	0,00	5.996,06	5.996,06	100,00%	5.308,87	15.469,83	20.779,71	134,32%	-5.309,88
5.2.2			MURETA E ABRO GAS				388,47	473,37				0,00	0,00	0,00		473,37		
5.2.2.1	102279	SINAPI	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (medida montante e a jusante) uma composição nor	m³	15,68	6,59	8,03	103,33	125,91	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	125,91	
5.2.2.2	101617	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	13,37	2,63	3,20	35,16	42,78	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	42,78	
5.2.2.3	93382	SINAPI	Reatero manual de valas com compactação mecânica	m³	11,42	21,89	26,68	249,98	304,68	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	304,68	
5.3			FUNDAÇÕES				190.694,44	234.125,45				212.175,48	6.454,68	216.976,21		15.495,30		
5.3.1			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS				56.970,76	69.452,11				67.600,42	0,00	67.600,42		1.851,69		
5.3.1.1	93358	SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,50 m af_02/2021	m³	163,67	72,19	88,01	11.815,33	14.404,59	160,52	98,08%	14.127,37	0,00	14.127,37	98,08%	277,22		
5.3.1.2	96619	SINAPI	Leito de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala	m²	47,73	29,90	36,45	1.427,12	1.739,75	47,72	99,98%	1.739,39	0,00	1.739,39	99,98%	0,36		
5.3.1.3	96535	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reencastamento	m²	131,71	138,98	169,44	16.305,05	22.316,94	131,71	100,00%	22.316,94	0,00	22.316,94	100,00%	0,00		
5.3.1.4	96544	SINAPI	Armação de bloco, viga bidrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem	kg	317,20	14,85	18,10	4.710,42	5.741,32	288,36	90,91%	5.219,32	0,00	5.219,32	90,91%	522,00		
5.3.1.5	96545	SINAPI	Armação de bloco, viga bidrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem	kg	41,25	13,68	16,67	564,30	687,83	37,50	90,91%	625,12	0,00	625,12	90,91%	62,51		
5.3.1.6	96546	SINAPI	Armação de bloco, viga bidrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem	kg	366,94	12,15	14,81	4.458,32	5.434,38	333,58	90,91%	4.940,32	0,00	4.940,32	90,91%	494,06		
5.3.1.7	96547	SINAPI	Armação de bloco, viga bidrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem	kg	225,00	10,25	12,49	2.306,25	2.810,25	204,55	90,91%	2.554,83	0,00	2.554,83	90,91%	255,42		
5.3.1.8	96543	SINAPI	Armação de bloco, viga bidrame e sapata utilizando aço CA-50 de 5 mm - montagem	kg	134,38	16,12	19,65	2.166,20	2.640,56	122,16	90,91%	2.400,44	0,00	2.400,44	90,91%	240,12		
5.3.1.9	103685	SINAPI	Concretagem de muretas, fck=25 mpa, com uso de bomba, lançamento, adensamento e acabamento	m³	15,55	721,40	879,53	11.217,77	13.676,69	15,55	100,00%	13.676,69	0,00	13.676,69	100,00%	0,00		
5.3.2			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAME				95.511,36	116.436,26				108.973,35	4.900,73	113.774,08		2.662,18		
5.3.2.1	96619	SINAPI	Leito de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala	m²	60,44	29,90	36,45	1.807,15	2.203,03	60,44	100,00%	2.203,04	0,00	2.203,04	100,00%	-0,01		
5.3.2.2	94968	SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento) areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l af_05/2021	m³	55,45	373,95	455,91	20.735,52	25.280,20	39,08	10,53	49,61	89,47%	17.817,24	4.800,73	22.617,98	89,47%	2.662,22
5.3.2.3	96536	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reencastamento	m²	349,55	70,58	86,05	24.671,23	30.078,77	349,55	100,00%	30.078,78	0,00	30.078,78	100,00%	-0,01		
5.3.2.4	96545	SINAPI	Armação de bloco, viga bidrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem	kg	600,09	13,68	16,67	8.209,23	10.003,50	600,09	100,00%	10.003,50	0,00	10.003,50	100,00%	0,00		
5.3.2.5	96546	SINAPI	Armação de bloco, viga bidrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem	kg	103,27	12,15	14,81	1.254,73	1.529,42	103,27	100,00%	1.529,43	0,00	1.529,43	100,00%	-0,01		
5.3.2.6	96547	SINAPI	Armação de bloco, viga bidrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem	kg	24,01	10,25	12,49	246,10	299,88	24,01	100,00%	299,88	0,00	299,88	100,00%	0,00		
5.3.2.7	96543	SINAPI	Armação de bloco, viga bidrame e sapata utilizando aço CA-50 de 5 mm - montagem	kg	324,46	16,12	19,65	5.230,29	6.375,63	324,46	100,00%	6.375,64	0,00	6.375,64	100,00%	-0,01		
5.3.2.8	103685	SINAPI	Concretagem de muretas, fck=25 mpa, com uso de bomba, lançamento, adensamento e acabamento	m³	24,18	721,40	879,53	11.217,77	13.676,69	24,18	100,00%	13.676,69	0,00	13.676,69	100,00%	-0,01		
5.3.2.9	96557	SINAPI	Leito de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala	m²	322,40	49,36	60,17	15.913,68	19.398,81	322,40	100,00%	19.398,81	0,00	19.398,81	100,00%	-0,01		
5.3.3			CONCRETO ARMADO - 15.000 EM CONCRETO ARMADO				29.363,55	37.448,92				35.601,71	1.653,95	35.601,71		193,27		
5.3.3.1	90509	SINAPI	Locação da obra	m²	19,10	53,04	64,66	1.013,06	1.235,00	19,10	100,00%	1.235,01	0,00	1.235,01	100,00%	-0,01		
5.3.3.2	102279	SINAPI	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (medida montante e a jusante) uma composição nor	m³	8,97	6,59	8,03	59,11	72,02	8,64	96,32%	69,38	0,00	69,38	96,32%	2,64		
5.3.3.3	94971	SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento) areia média (brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l af_05/2021	m³	12,20	465,76	567,85	5.682,27	6.927,77	12,13	99,46%	6.890,18	0,00	6.890,18	99,46%	37,59		
5.3.3.4	96541	SINAPI	Fabricação															



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:		12.345.840,80						
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinhã, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:		7.017.667,08						
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripêdesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:		607.521,98						
Período da Medição: 25/11/2025 A 15/01/2026										Porcentagem total realizada:		43,16%						
PLANILHA DE MEDIÇÃO 13																		
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDA DE	QUANTID ADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANTIDADES				MEDIÇÃO 13					
									ACUMULA DO	REMOVEDO	ACUMULA DO TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	REMOVEDO ANTERIOR	VALORES	ACUMULADO TOTAL	%
5.4		SUPERESTRUTURA					107.871,49	279.402,71						122.858,70	147.908,33	122.858,70	8.635,71	
5.4.1		CONCRETO ARMADO - PILARES					45.525,07	55.493,58						53.548,33	0,00	53.548,33	1.945,25	
5.4.1.1	92443	SINAPI Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com	m²	333,34	42,40	51,69	14.133,61	17.230,34	333,34	100,00%				17.230,34	0,00	17.230,34	0,00	
5.4.1.2	92762	SINAPI Armagem de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem, af. 06/2022	kg	839,33	10,58	12,89	8.880,11	10.818,96	763,03	90,91%				9.835,46	0,00	9.835,46	90,91%	983,50
5.4.1.3	92763	SINAPI Armagem de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem, af. 06/2022	kg	312,88	8,96	10,92	2.803,40	3.416,64	284,44	90,91%				3.106,08	0,00	3.106,08	90,91%	310,56
5.4.1.4	92759	SINAPI Armagem de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem, af. 06/2022	kg	450,22	13,05	15,91	5.875,37	7.163,00	409,29	90,91%				6.511,80	0,00	6.511,80	90,91%	651,20
5.4.1.5	96558	SINAPI Concreto Bombado tck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	18,25	757,95	924,09	13.832,58	16.864,64	18,25	100,00%				16.864,64	0,00	16.864,64	100,00%	0,00
5.4.2		CONCRETO ARMADO - VIGAS					53.578,68	213.221,85						64.957,74	147.908,33	64.957,74	355,61	
5.4.2.1	92479	SINAPI Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com	m²	344,10	64,36	78,46	22.146,27	26.998,09	344,10	100,00%				26.998,09	0,00	26.998,09	100,00%	-0,01
5.4.2.2	92761	SINAPI Armagem de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm	kg	675,91	11,77	14,34	7.955,46	9.692,54	675,91	100,00%				9.692,55	0,00	9.692,55	100,00%	-0,01
5.4.2.3	92762	SINAPI Armagem de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm	kg	9,64	10,58	12,89	101,99	124,25	9,64	100,00%				124,26	0,00	124,26	100,01%	-0,01
5.4.2.4	92759	SINAPI Armagem de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm	kg	365,31	13,05	15,91	4.767,29	5.812,08	342,96	93,88%				5.456,44	0,00	5.456,44	93,88%	355,64
5.4.2.5	96558	SINAPI Concreto Bombado tck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	24,55	757,95	924,09	18.607,87	22.686,40	24,55	100,00%				22.686,41	0,00	22.686,41	100,00%	-0,01
5.4.2.6	CPU Q3	SINAPI LAJE - PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, RAUPHIANA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTIA.	M²	593,51	191,40	233,35	113.597,81	138.495,55	0,00	593,51	593,51	100,00%	0,00	138.495,56	138.495,56	100,00%	-0,01	
5.4.2.7	92800	SINAPI CORTI E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF. 06/2022	KG	70,81	9,28	11,31	657,11	800,86	0,00	70,81	70,81	100,00%	0,00	800,86	800,86	100,00%	0,00	
5.4.2.8	92802	SINAPI CORTI E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF. 06/2022	KG	71,69	9,44	11,50	676,75	824,43	0,00	71,69	71,69	100,00%	0,00	824,44	824,44	100,00%	0,00	
5.4.2.9	92803	SINAPI CORTI E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF. 06/2022	KG	141,85	8,74	10,65	1.239,76	1.510,70	0,00	141,85	141,85	100,00%	0,00	1.510,70	1.510,70	100,00%	0,00	
5.4.2.10	92265	SINAPI FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA REFINADA, 12MM.	M²	50,17	102,62	125,11	5.148,44	6.276,77	0,00	50,17	50,17	100,00%	0,00	6.276,77	6.276,77	100,00%	-0,01	
5.4.3		CONCRETO ARMADO PARA VERGAS					4.047,55	4.933,77						4.352,63	0,00	4.352,63	581,15	
5.4.3.1	93184	SINAPI Verga e contraverga pré-moldada tck= 20MPa, seção 10x10cm.	m	124,12	32,61	39,75	4.047,55	4.933,77	109,50	88,22%				4.352,63	0,00	4.352,63	88,22%	581,15
5.4.4		CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES					2.034,43	2.479,86						0,00	0,00	0,00	2.479,86	
5.4.4.1	92443	SINAPI Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com	m²	18,00	42,40	51,69	763,20	930,42	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	930,42	
5.4.4.2	92759	SINAPI Armagem de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 5,0 mm	kg	13,66	13,05	15,91	178,26	217,33	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	217,33	
5.4.4.3	92761	SINAPI Armagem de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm	kg	43,92	11,77	14,34	516,93	629,81	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	629,81	
5.4.4.4	96558	SINAPI Concreto Bombado tck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	0,76	757,95	924,09	576,04	702,30	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	702,30	
5.4.5		CONCRETO ARMADO - CASA DE GAS - PILARES, VIGAS E LAJE					2.685,76	3.273,85						0,00	0,00	0,00	3.273,85	
5.4.5.1	92443	SINAPI Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com	m²	19,24	42,40	51,69	815,77	994,51	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	994,51	
5.4.5.2	92760	SINAPI Armagem de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm	kg	15,26	12,44	15,16	189,83	231,34	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	231,34	
5.4.5.3	92761	SINAPI Armagem de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm	kg	19,45	11,77	14,34	228,92	278,91	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	278,91	
5.4.5.4	92762	SINAPI Armagem de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm	kg	28,01	10,58	12,89	296,34	361,04	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	361,04	
5.4.5.5	92759	SINAPI Armagem de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm	kg	17,06	13,05	15,91	222,63	271,42	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	271,42	
5.4.5.6	96558	SINAPI Concreto Bombado tck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	1,23	757,95	924,09	932,27	1.136,63	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.136,63	
5.5		SISTEMA DE VEDAÇÃO					150.443,81	183.413,09						158.372,15	14.880,90	173.253,05	10.160,75	
5.5.1		ELEMENTOS VAZADOS					1.351,45	1.647,67						0,00	0,00	0,00	1.647,67	
5.5.1.1	101161	SINAPI Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4	m²	6,10	221,55	270,11	1.351,45	1.647,67	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.647,67	
5.5.2		ALVENARIA DE VEDAÇÃO					141.138,00	172.068,69						149.131,25	14.880,90	164.012,15	8.056,54	
5.5.2.1	103332	SINAPI Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x19 cm (espessura 9 cm) e assentamento com argamassa, af. 12/2021	m²	572,77	102,19	124,59	58.531,36	71.361,41	572,77	100,00%				71.361,41	0,00	71.361,41	100,00%	0,00
5.5.2.2	103334	SINAPI Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x19 cm (espessura 14 cm, bloco detalhado) e argamassa de assentamento com preparo manual, af. 12/2021	m²	10,38	124,11	151,31	1.288,26	1.570,59	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.570,59	
5.5.2.3	103335	SINAPI Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x19 cm e argamassa de assentamento com preparo manual, af. 12/2021	m²	564,11	126,36	154,05	71.280,93	86.901,14	487,30	76,81	564,11	100,00%	75.068,57	11.832,58	86.901,15	100,00%	-0,01	
5.5.2.4	101154	SINAPI Alvenaria em tijolos maciços 5x10x20 cm (espessura 10cm), assentamento com argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	9,72	122,80	149,71	1.193,61	1.455,18	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.455,18	
5.5.2.5	93203	SINAPI Fixação (enchimento) de alvenaria de vedação com espuma de poliuretano expansiva	m	311,80	15,13	18,44	4.717,53	5.749,59	146,49	165,31	311,80	100,00%	2.701,28	3.048,32	5.749,59	100,00%	0,00	
5.5.2.6	C4070	SEINFRA Divisão de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm, polido, assentado com argamassa	m²	8,06	487,55	594,42	3.929,65	4.791,02	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	4.791,02	
5.5.2.7	96370	SINAPI Fechamento de shafts com placas de gesso acartonado	m²	3,60	54,63	66,60	196,66	239,76	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	239,76	
5.5.3		ALVENARIA DA MURETA					7.954,36	9.697,44						9.240,90	0,00	9.240,90	456,54	
5.5.3.1	103335	SINAPI Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x19 cm (espessura 14 cm.	m²	62,95	126,36	154,05	7.954,36	9.697,44	59,99	95,29%				9.240,90	0,00	9.240,90	95,29%	456,54
5.6		ESQUADRIAS					263.117,33	320.790,75						0,00	0,00	0,00	320.790,75	
5.6.1		PORTAS DE MADEIRA					23.758,81	28.966,66						0,00	0,00	0,00	28.966,66	
5.6.1.1	90842	SINAPI Porta de Madeira - PM1 - 70x210cm, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de	un	6,00	910,60	1.110,20	5.463,60	6.661,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	6.661,20	
5.6.1.2	CPU A5	PRÓPRIA Porta de Madeira - PM2 - 80x210cm, com ferragens, incluso ferragens e fechadura, conforme	un	3,00	981,81	1.197,02	2.945,43	3.591,06	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	3.591,06	
5.6.1.3	CPU B5	PRÓPRIA Porta de Madeira - PM3 - 80x210cm, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de	un	6,00	954,93	1.164,25	5.729,58	6.985,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	6.985,50	
5.6.1.4	90843	PRÓPRIA Porta de Madeira - PM4 - 82x210cm, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de	un	3,00	954,93	1.164,25	2.864,79	3.492,75	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	3.492,75	
5.6.1.5	CPU C5	PRÓPRIA Porta de Madeira - PM5 - 82x210cm, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de	un	5,00	1.036,25	1.263,39	5.181,25	6.316,95										

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra: 12.345.840,80								
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinhã, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha: 7.017.667,08								
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período: 607.521,98								
Período da Medição: 25/11/2025 A 15/01/2026										Porcentagem total realizada: 43,16%								
PLANILHA DE MEDIÇÃO 13																		
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDA DE	QUANTID ADE	DADOS DO CONTRATO				QUANTIDADES					MEDIÇÃO 13				
					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	ACUMULA DO	REVENHO em %	ACUMULA DO TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	REVENHO em %	VALORES	%	SALDO
5.6.5.7	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Máximas - incluído	m²	12,60	658,82	803,23	8.301,13	10.120,69	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	10.120,69
5.6.5.8	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Máximas - incluído	m²	8,40	658,82	803,23	5.534,08	6.747,13	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	6.747,13
5.6.5.9	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Máximas - incluído	m²	6,30	658,82	803,23	4.150,56	5.060,34	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	5.060,34
5.6.5.10	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-10, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Máximas - incluído	m²	1,05	658,82	803,23	691,76	843,39	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	843,39
5.6.5.11	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Máximas - incluído	m²	5,25	658,82	803,23	3.458,80	4.216,95	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	4.216,95
5.6.5.12	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Máximas - incluído	m²	4,20	658,82	803,23	2.767,04	3.373,56	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	3.373,56
5.6.5.13	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Máximas - incluído	m²	16,80	658,82	803,23	11.068,17	13.494,26	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	13.494,26
5.6.5.14	100674	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-14, 1600x85, completa conforme projeto de esquadrias - Máximas - incluído	m²	2,72	703,70	857,95	1.914,06	2.333,62	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.333,62
5.6.5.15	1897	ORSE	Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria	m²	10,28	57,11	69,62	587,09	715,69	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	715,69
5.6.6			VIDROS				11.257,73	13.725,33		0,00		0,00		0,00	0,00		13.725,33	
5.6.6.1	102156	SINAPI	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para janelas	m²	13,33	274,64	334,84	3.660,95	4.463,41	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	4.463,41
5.6.6.2	102235	SINAPI	Box em vidro temperado incolor, 10mm, com altura de 1,80m	m²	7,20	501,88	611,89	3.613,53	4.405,60	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	4.405,60
5.6.6.3	C4835	SEINFRA	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira	m²	7,50	531,10	647,51	3.983,25	4.856,32	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	4.856,32
5.6.7			ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO				134.768,75	164.309,66		0,00		0,00		0,00	0,00		164.309,66	
5.6.7.1	11236	ORSE	Gradil com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/4" e tela redequadrada malha 2" - medida 1x15,00m	m²	71,89	587,42	716,18	42.229,62	51.486,18	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	51.486,18
5.6.7.2	13135	ORSE	Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura (PEI 1 e PEI 2)	m²	5,27	675,92	824,08	3.562,09	4.342,90	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	4.342,90
5.6.7.3	13135	ORSE	Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive pintura	m²	16,76	675,92	824,08	78.920,41	96.219,58	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	96.219,58
5.6.7.4	11236	ORSE	Gradil com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/4" e tela redequadrada malha 2" - medida 1x15,00m	m²	17,12	587,42	716,18	10.056,63	12.261,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	12.261,00
5.7			SISTEMA DE COBERTURA				181.885,63	423.838,31		0,00		0,00		0,00	0,00		221.747,02	
5.7.1	12509	ORSE	Estrutura Metálica Pl. Cobertura c/Vigão-Trelca Pratt e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 10,01 e 20,0m, pintada 1 d oxiado ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto for. Telhas - Executada	m²	881,21	179,96	219,40	158.582,55	193.337,47	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	193.337,47
5.7.2	12733	ORSE	Talha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR	m²	0,00	393,68	479,97	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5.7.3	94228	SINAPI	Calha em chapa metálica Nº 22 desenvolvimento de 63 cm	m	69,15	85,71	104,49	5.926,84	7.225,48	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	7.225,48
5.7.4	94231	SINAPI	Ruífo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 73 cm	m	93,60	53,48	65,20	5.005,72	6.102,72	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	6.102,72
5.7.5	94231	SINAPI	Ruífo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 38 cm	m	45,70	53,48	65,20	2.444,03	2.979,64	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.979,64
5.7.6	94231	SINAPI	Ruífo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 32 cm	m	126,60	53,48	65,20	6.770,56	8.254,32	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	8.254,32
5.7.7	C3084	SEINFRA	Grandeira ou chapim em concreto aparente desmoldado	m	233,60	13,51	16,47	3.155,93	3.847,39	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	3.847,39
5.7.8	12733	SINAPI	TERMINAÇÃO COM TELHA METÁLICA TERMINAÇÃO COM TELHA METÁLICA Nº 22	m²	850,66	194,86	237,57	165.759,60	202.091,29	0,00		0,00	0,00%	1,00	0,00	1,00	0,00%	202.090,29
5.8			IMPERMEABILIZAÇÃO				24.974,07	30.444,12		5.191,46		5.191,46		5.191,46		5.191,46		25.252,66
5.8.1	98557	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m²	394,02	49,36	60,17	19.448,82	23.708,18	50,09		50,09	12,71%	3.013,79	0,00	3.013,79	12,71%	20.694,39
5.8.2	98562	SINAPI	Impermeabilização com argamassa e aditivo impermeabilizante e=2cm em áreas molhadas	m²	125,46	44,04	53,69	5.525,25	6.735,94	40,56		40,56	32,33%	2.177,67	0,00	2.177,67	32,33%	4.558,27
5.9			REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO				226.306,76	275.867,82		73.641,51	47.551,24	121.192,74		73.641,51	47.551,24	121.192,74		154.674,88
5.9.1			EDIFICAÇÃO				222.452,42	271.170,05		73.641,51	47.551,24	121.192,74		73.641,51	47.551,24	121.192,74		149.977,31
5.9.1.1	87878	SINAPI	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, áreas, rebatidas e calhas	m²	2.569,60	4,28	5,21	10.997,88	13.367,61	1.423,18	811,14	2.234,32	86,95%	7.414,75	4.226,04	11.640,79	86,95%	1.746,82
5.9.1.2	87535	SINAPI	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm	m²	1.589,78	29,53	36,00	46.946,20	57.232,08	603,61	425,34	1.028,95	64,72%	21.730,03	15.312,24	37.042,27	64,72%	20.189,81
5.9.1.3	87792	SINAPI	Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm	m²	979,82	35,03	42,70	34.323,09	41.838,31	818,98	360,84	979,82	100,00%	26.430,62	15.407,70	41.838,31	100,00%	0,00
5.9.1.4	87543	SINAPI	Reboco para paredes internas, externas, pórticos, áreas, traço 1:4:5 - espessura 0,5 cm	m²	1.024,77	24,55	29,93	25.158,10	30.671,36	603,61	421,16	1.024,77	100,00%	18.066,11	12.605,26	30.671,37	100,00%	-0,01
5.9.1.5	87273	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme	m²	456,39	68,32	83,29	31.180,56	38.012,72	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	38.012,72
5.9.1.6	87265	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme	m²	4,60	62,19	75,82	286,07	348,77	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	348,77
5.9.1.7	87265	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme	m²	4,92	62,19	75,82	305,97	373,03	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	373,03
5.9.1.8	87265	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme	m²	9,71	62,19	75,82	603,86	736,21	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	736,21
5.9.1.9	87265	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme	m²	94,00	62,19	75,82	5.845,86	7.127,08	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	7.127,08
5.9.1.10	101738	SINAPI	Roda meio em madeira (largura=10cm)	m	127,20	31,34	38,20	3.986,44	4.859,04	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	4.859,04
5.9.1.11	C4294	SEINFRA	Forno de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação	m²	438,37	71,84	87,70	31.536,33	38.445,04	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	38.445,04
5.9.1.12	C4479	SEINFRA	Forno em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "I" invertido 24mm	m²	259,43	120,58	147,01	31.282,06	38.138,80	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	38.138,80
5.9.2			MURETA				3.854,34	4.697,57		0,00		0,00		0,00	0,00		4.697,57	
5.9.2.1	87878	SINAPI	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, áreas, rebatidas e calhas	m	98,05	4,28	5,21	419,65	510,84	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	510,84
5.9.2.2	87792	SINAPI	Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm	m	98,05	35,03	42,70	3.434,69	4.186,73	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	4.186,73
5.10			SISTEMA DE PISOS				200.283,43	244.172,81		48.678,06	5.507,71	53.240,17		48.678,06	5.507,71	53.240,17		194.932,64
5.10.1			PAVIMENTAÇÃO INTERNA				165.250,56	201.464,85		17.775,99	4.562,11	22.338,10		17.775,99	4.562,11	22.338,10		183.126,75
5.10.1.1	87630	SINAPI	Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3 cm e acabamento mecânico	m²	408,38	36,49	44,48	14.901,78	18.164,74	399,64		399,64	97,86%	17.775,99	0,00	17.775,99	97,86%	388,

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.									Total da obra: 12.345.840,80								
Obra: Construção do Parque Linear Ramadilha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.									Saldo em Planilha: 7.017.667,08								
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.									Medido no Período:				607.521,98				
Período da Medição: 25/11/2025 A 15/01/2026									Porcentagem total realizada:				43,16%				
PLANILHA DE MEDIÇÃO 13																	
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDA DE	QUANTID ADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANTIDADES				VALORES				
									ACUMULA DO	REMOVED OR	ACUMULADO DO TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	REMOVED OR ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	%
5.11.1.2	88489	SINAPI Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos.	m²	1.902,96	9,79	11,93	18.629,97	22.702,31	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	22.702,31
5.11.1.3	C1208	SEINFRA Emassamento de forro com massa corrida PVA	m²	442,55	14,04	17,11	6.213,40	7.572,03	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	7.572,03
5.11.1.4	104640	SINAPI Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos	m²	442,55	10,17	12,39	4.500,73	5.483,19	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5.483,19
5.11.1.5	102219	SINAPI Pintura em esmalte sintético em esquadrias de madeira, 2 demãos	m²	123,61	14,11	17,20	1.744,13	2.126,09	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.126,09
5.11.1.6	102219	SINAPI Pintura em esmalte sintético em rodameio de madeira, 2 demãos	m²	12,72	14,11	17,20	179,47	218,78	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	218,78
5.11.1.7	100758	SINAPI Pintura em esmalte sintético em esquadria de ferro, 2 demãos	m²	421,23	41,75	50,90	17.586,35	21.440,60	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	21.440,60
5.11.1.8	102494	SINAPI Pintura epóxi à base de água para área molhadas, 2 demãos.	m²	101,63	52,87	64,45	5.373,17	6.550,05	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	6.550,05
5.11.1.9	100743	SINAPI Pintura de esmalte sintético para estrutura metálica, 2 demãos.	m²	344,26	8,90	10,85	3.063,91	3.735,22	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3.735,22
5.11.2		MURETA					2.730,68	3.327,81					0,00	0,00	0,00		3.327,81
5.11.2.1	96132	SINAPI Emassamento de paredes internas em externas com massa acrílica, 2 demãos	m²	98,05	18,06	22,01	1.770,78	2.158,08	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.158,08
5.11.2.2	88489	SINAPI Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos	m²	98,05	9,79	11,93	959,90	1.169,73	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.169,73
5.12		INSTALAÇÃO HIDRAULICA					32.948,29	40.165,67					0,00	6.705,81	6.705,81		33.459,86
5.12.1		TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO					26.563,39	32.381,40					0,00	6.705,81	6.705,81		25.675,59
5.12.1.1	89401	SINAPI Tubo PVC soldável Ø 20 mm	m	27,60	10,02	12,21	276,55	336,99	0,00	27,60	27,60	100,00%	0,00	337,00	337,00	100,00%	-0,01
5.12.1.2	89446	SINAPI Tubo PVC soldável Ø 25 mm	m	166,90	5,72	6,97	954,66	1.163,29	0,00	166,90	166,90	100,00%	0,00	1.163,29	1.163,29	100,00%	0,00
5.12.1.3	89449	SINAPI Tubo PVC soldável Ø 50 mm	m	81,05	19,73	24,05	1.599,11	1.949,25	0,00	81,05	81,05	100,00%	0,00	1.949,25	1.949,25	100,00%	0,00
5.12.1.4	89450	SINAPI Tubo PVC soldável Ø 60 mm	m	11,00	31,79	38,75	349,69	426,25	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	426,25
5.12.1.5	89451	SINAPI Tubo PVC soldável Ø 75mm	m	134,60	52,01	63,41	7.000,54	8.534,98	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	8.534,98
5.12.1.6	89452	SINAPI Tubo PVC soldável Ø 85mm	m	54,55	71,80	87,53	3.916,69	4.774,76	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4.774,76
5.12.1.7	94783	SINAPI Adaptador soldável com flange livre para caixa d'água - 20mm - 1/2"	un	3,00	19,82	24,16	59,46	72,48	0,00	3,00	3,00	100,00%	0,00	72,48	72,48	100,00%	0,00
5.12.1.8	94789	SINAPI Adaptador soldável com flange livre para caixa d'água - 75mm - 2 1/2"	un	6,00	248,95	303,51	1.493,70	1.821,06	0,00	4,00	4,00	66,67%	0,00	1.214,04	1.214,04	66,67%	607,02
5.12.1.9	94790	SINAPI Adaptador soldável com flange livre para caixa d'água - 85mm - 3"	un	2,00	344,84	420,42	689,68	840,84	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	840,84
5.12.1.10	104049	SINAPI Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2"	un	4,00	4,22	5,14	16,88	20,56	0,00	4,00	4,00	100,00%	0,00	20,56	20,56	100,00%	0,00
5.12.1.11	94656	SINAPI Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4"	un	72,00	5,54	6,75	398,88	486,00	0,00	36,00	36,00	50,00%	0,00	243,00	243,00	50,00%	243,00
5.12.1.12	94662	SINAPI Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2"	un	40,00	11,99	14,61	479,60	584,40	0,00	20,00	20,00	50,00%	0,00	292,20	292,20	50,00%	292,20
5.12.1.13	94666	SINAPI Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2"	un	6,00	34,60	42,18	207,60	253,08	0,00	3,00	3,00	50,00%	0,00	126,54	126,54	50,00%	126,54
5.12.1.14	94668	SINAPI Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3"	un	2,00	52,99	64,60	105,98	129,20	0,00	2,00	2,00	100,00%	0,00	129,20	129,20	100,00%	0,00
5.12.1.15	89605	SINAPI Luva de redução, pvc, soldável, dh 60mm x 50mm	un	6,00	20,14	24,55	120,84	147,30	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	147,30
5.12.1.16	C0500	SEINFRA Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm	un	2,00	44,19	53,87	88,38	107,74	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	107,74
5.12.1.17	C0505	SEINFRA Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm	un	4,00	48,38	58,98	193,52	235,92	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	235,92
5.12.1.18	89579	SINAPI Luva de redução, pvc, soldável, dh 50mm x 25mm	un	30,00	11,24	13,70	337,20	411,00	0,00	15,00	15,00	50,00%	0,00	205,50	205,50	50,00%	205,50
5.12.1.19	C0503	SEINFRA Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm	un	1,00	23,16	28,23	23,16	28,23	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	28,23
5.12.1.20	C0498	SEINFRA Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm	un	5,00	37,22	45,37	186,10	226,85	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	226,85
5.12.1.21	89485	SINAPI Joelho 45 soldável - 25mm	un	3,00	5,44	6,63	16,32	19,89	0,00	2,00	2,00	66,67%	0,00	13,26	13,26	66,67%	6,63
5.12.1.22	89502	SINAPI Joelho 45 soldável - 50mm	un	2,00	15,84	19,31	31,68	38,62	0,00	1,00	1,00	50,00%	0,00	19,31	19,31	50,00%	19,31
5.12.1.23	89515	SINAPI Joelho 45 soldável - 75mm	un	8,00	85,71	104,49	685,68	835,92	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	835,92
5.12.1.24	89523	SINAPI Joelho 45 soldável - 85mm	un	2,00	104,99	128,00	209,98	256,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	256,00
5.12.1.25	89358	SINAPI Joelho 90 soldável - 20mm	un	4,00	6,88	8,14	26,72	32,56	0,00	2,00	2,00	50,00%	0,00	16,28	16,28	50,00%	16,28
5.12.1.26	89362	SINAPI Joelho 90 soldável - 25mm	un	88,00	7,93	9,66	697,84	850,08	0,00	64,00	64,00	72,73%	0,00	618,24	618,24	72,73%	231,84
5.12.1.27	89501	SINAPI Joelho 90 soldável - 50mm	un	28,00	13,02	15,87	364,56	444,36	0,00	18,00	18,00	64,29%	0,00	285,66	285,66	64,29%	158,70
5.12.1.28	89505	SINAPI Joelho 90 soldável - 60mm	un	4,00	41,83	50,99	167,32	203,96	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	203,96
5.12.1.29	89519	SINAPI Joelho 90 soldável - 75mm	un	26,00	46,93	57,21	1.220,18	1.487,46	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.487,46
5.12.1.30	89521	SINAPI Joelho 90 soldável - 85mm	un	6,00	129,41	157,77	776,46	946,62	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	946,62
5.12.1.31	90373	SINAPI Joelho 90° soldável com bucha de latão - 25mm - 1/2"	un	47,00	12,20	14,87	573,40	698,89	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	698,89
5.12.1.32	90373	SINAPI Joelho 90° soldável com bucha de latão - 25mm - 3/4"	un	12,00	12,20	14,87	146,40	178,44	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	178,44
5.12.1.33	89395	SINAPI Tê 90 soldável - 25mm	un	17,00	11,01	13,42	187,17	228,14	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	228,14
5.12.1.34	89625	SINAPI Tê 90 soldável - 50mm	un	14,00	21,13	25,76	295,82	360,64	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	360,64
5.12.1.35	89629	SINAPI Tê 90 soldável - 75mm	un	7,00	81,56	99,43	570,92	696,01	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	696,01
5.12.1.36	89631	SINAPI Tê 90 soldável - 85mm	un	4,00	107,81	131,44	431,24	525,76	0,00	0,00	0,00%	0,00					



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.									Total da obra:				12.345.840,80						
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.									Saldo em Planilha:				7.017.667,08						
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripêdesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.									Medido no Período:				607.521,98						
Período da Medição: 25/11/2025 A 15/01/2026									Porcentagem total realizada:				43,16%						
PLANILHA DE MEDIÇÃO 13																			
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDA DE	DADOS DO CONTRATO				MEDIÇÃO 13											
				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	ACUMULADO	REMOVEDO	ACUMULADO DO TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	REMOVEDO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO	
5.21.1.4	C2910	SEINFRA	Prateleiras e escaninhos em mdf	m²	30,15	179,68	219,06	5.417,35	6.604,65	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	6.604,65	
5.21.1.5	C0361	SEINFRA	Bancos de concreto	m²	9,32	202,07	246,36	1.883,29	2.296,07	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	2.296,07	
5.21.1.6	C1869	SEINFRA	Pelotão em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e canoadeira	m	79,65	97,14	118,43	7.737,20	9.432,94	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	9.432,94	
5.21.1.7	100861	SINAPI	Mão francesa metálica para apoio das prateleiras e bancadas	un	148,00	32,47	39,58	4.805,56	5.857,84	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	5.857,84	
5.21.1.8	C4622	SEINFRA	Fita adesiva antiderrapante 50mm para degraus dos banheiros	un	1,00	56,19	68,50	56,19	68,50	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	68,50	
5.21.1.9	C4646	SEINFRA	Corrimão dupla altura em aço inox 1 1/2"	m	4,12	387,75	472,74	1.597,53	1.947,68	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.947,68	
5.21.2			MURO DE CONTORNO (35,00 X 45,00)					73.695,88	89.846,27					51.113,34	0,00	51.113,34		38.732,93	
5.21.2.1	99058	SINAPI	Locação de ponto para referência topográfica. af. 10/2018.	PT	12,00	10,50	12,80	126,00	153,60	12,00	12,00	100,00%		153,60	0,00	153,60	100,00%	0,00	
5.21.2.2	96525	SINAPI	Escavação mecanizada para viga baldrame com mini-escavadeira (incluindo escavação para colocação de formas). af. 06/2017	m³	32,00	44,22	53,91	1.415,04	1.725,12	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.725,12	
5.21.2.3	103800	SINAPI	pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - 40% de argamassa em volume - areia e pedra de mão comerciais - fornecimento e assentamento. af. 08/2023.	M²	32,00	476,27	580,66	15.240,64	18.581,12	32,00	32,00	100,00%		18.581,12	0,00	18.581,12	100,00%	0,00	
5.21.2.4	103340	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto aparente de 19x19x39 cm (espessura 19 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af. 12/2021	M²	128,00	129,54	157,93	16.581,12	20.215,04	91,25	91,25	71,29%		14.411,11	0,00	14.411,11	71,29%	5.803,93	
5.21.2.5	103336	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto aparente de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af. 12/2021	M²	320,00	81,25	99,06	26.000,00	31.699,20	181,38	181,38	56,68%		17.967,50	0,00	17.967,50	56,68%	13.731,70	
5.21.2.6	87878	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual. af. 10/2022	m²	180,00	4,28	5,21	770,40	937,80	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	937,80	
5.21.2.7	87794	SINAPI	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. af. 09/2022	m²	90,00	38,64	47,10	3.477,60	4.239,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	4.239,00	
5.21.2.8	87244	SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo.	m²	36,00	212,76	259,39	7.659,36	9.338,04	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	9.338,04	
5.21.2.9	88423	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. af. 06/2014	m²	54,00	14,88	18,14	803,52	979,56	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	979,56	
5.21.2.10	13135	ORSE	Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura (PF1 e PF2)	m²	2,40	675,92	824,08	1.622,20	1.977,79	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.977,79	
5.22			SERVIÇOS FINAIS					1.578,27	1.917,11					0,00	0,00	0,00		1.917,11	
5.22.1	99803	SINAPI	Limpeza de obra	m²	891,68	1,77	2,15	1.578,27	1.917,11	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.917,11	
VALOR TOTAL DO CONTRATO									12.345.840,80	MEDIDO NO PERÍODO:				607.521,98	SALDO:				7.017.667,08
TOTAL DO BDI =																			

VALOR DESTA MEDIÇÃO	R\$	607.521,98
---------------------	-----	------------

1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS
1.1	Administração Local de Obras (ALLO - Local de OOB)

13	
14	1.1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

[illegible][illegible][illegible]

42	1.1.5	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES								
43	LOCAL	UNID	COMP	LABOR	ALT	DEDET	QUANT	% EXECUTADA	TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES

49	1.1.6	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES									
50		LOCAL	LIND	COMP.	LARG.	ALT.	RFPET.	QUANT.	% EXECUTADA	TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES

56	1.1.7	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES									
57		LOCAL	UND	COMP.	LARG.	ALT.	REPET.	QUANT.	% EXECUTADA	TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES

64	LOCAL	UND	COMP.	LARG.	ALT.	REPET.	QUANT.	% EXECUTADA	TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES
----	-------	-----	-------	-------	------	--------	--------	-------------	---------------	-------------

71	LOCAL	UND	COMP.	LARG.	ALT.	REPET.	QUANT.	% EXECUTADA	TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES
72	OBRA	PROPORCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,000	0,68	

78	LOCAL	UNID.	COMPR.	PREÇO	ALÍQ.	REFEET.	QUANT.	% EXCETO IVA	TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES
79	OBRA	PROPORCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,050	286,50	

93		
94	1.2.5	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2.30 X 4.30 M. ALT. 2.50 M. P/ SANITÁRIO. C/ 5 BACIAS, 1 LAVATÓRIO E 4 MICTÓRIOS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)

101	1.2.6	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
-----	-------	---

108	
2.0	BARQUE

318	2.3.1	PLAYGROUND - 01
-----	-------	-----------------

321	LOCAL	UND	QUANTIDADE					TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES
-----	-------	-----	------------	--	--	--	--	---------------	-------------

140	2.3.2	PLAYGROUND - 02
-----	-------	-----------------

2.3.2.9	BANCOS EM CONCRETO									
	LOCAL	UNID	QUANTIDADE						TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES

[illegible]

351	LOCAL	UND	QUANT	FATOR EMPOL	VOLUME	DISTANCIA			TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES
-----	-------	-----	-------	-------------	--------	-----------	--	--	---------------	-------------

[illegible]

350	2.3.4.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM): AF_07/2020 - MATERIAL DE JAZIDA
-----	---------	---

364			653,38
		MEDICÕES ANTERIORES	03 71

[illegible]

7172	V4	KG	7,00	2,00	0,395		5,53		5,53
7173	V5	KG	1,00	2,00	0,395		0,79		0,79
7174	V6	KG	6,00	2,00	0,395		4,74		4,74
7181									
7182							TOTAL		40,49
7183							MEDIÇÕES ANTERIORES		
7184							MEDICÃO 13		40,49

A.3.2.5		CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 5.0 MM. AF_06/2022							
	LOCAL	UND	COMP.	QTD	KG/M	KG	DESC.	TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES
2104	V1	KG	0,83	30,00	0,154	3,82		3,82	
2104	V2	KG	0,83	30,00	0,154	3,82		3,82	
2104	V3	KG	0,83	30,00	0,154	3,82		3,82	
2104	V4	KG	0,83	30,00	0,154	3,82		3,82	
2104	V5	KG	0,83	30,00	0,154	3,82		3,82	
2104	V6	KG	0,83	30,00	0,154	3,82		3,82	
2104							TOTAL	22,90	
2104							MEDIÇÕES ANTERIORES		
2104							MEDIÇÃO 13	22,90	

4.3.3.1 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORDO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+9), AF. 11/2020									
LOCAL	UNID	COMP.	LARGURA	ALTURA	AREA	QUANTIDADE	TOTAL	TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES
QUIOSQUE 02	M2	3,41	4,00		13,65			13,65	
						TOTAL		13,65	
						MEDIÇÕES ANTERIORES			
						MEDIÇÃO 13		13,65	

4.5.1		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLUER DE FEDEIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L Af. 10/2022								
LOCAL		UNID	COMP.	ALTURA	AREA	DESCONTO	REP.	DESC.	TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES
COZINHA		M2	9,00	2,75	24,75		2,00		31,33	
BANHEIRO		M2	6,00	4,00	24,00	1,68			44,64	
DESPENSA		M2	6,30	4,00	25,20	1,68	2,00		47,04	
							TOTAL		123,01	
							MEDIÇÕES ANTERIORES			
							MEDIÇÃO 13		123,01	

4.5.3		EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1: 2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSAS. AF_06/2014								
21.63	LOCAL	UND	COMP	ALTURA	AREA	DESCONTO	REPETIÇÕES	DESC.	TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES
21.63	COZINHA	M2	8,50	2,50	21,25	2,00			24,33	
21.63	BANHEIRO	M2	5,30	3,70	19,61	1,68	2,00		35,86	
21.63	DEPENSA	M2	5,80	3,00	17,40	1,68	2,00		31,44	
									TOTAL	91,63
									MEDIÇÕES ANTERIORES	
									MEDICAO 13	91,63

4.6.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019									
	LOCAL	UND	COMP	LARGURA				DESC.	TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES
	QUIOSQUE 01	M2	6,3	6,00					37,96	
	QUIOSQUE 02	M2	6,3	6,00					37,96	
								TOTAL	75,92	
								MEDIÇÕES ANTERIORES		
								MEDICÃO 13	75,92	

4.8.1		COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS À PERCUSSÃO. AF_09/2021							
LOCAL		UNID	ÁREA				DESC.	TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES
QUIOSQUE 02		M2	14,7					14,70	
							TOTAL	14,70	
							MEDIÇÕES ANTERIORES		
							MEDIÇÃO 13	14,70	

4.8.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRÁÇOA 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021									
4.8.3	LOCAL	UND	AREA	ALTURA	VOLUME			DESC.	TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES

[illegible]

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
							ESTADO DA PARAIBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS				
	MEMORIA DE CALCULO MEDIÇÃO 13										
1312	ADMINISTRAÇÃO	M2	5,80	1,50	8,70				1	8,70	
1313	ADMINISTRAÇÃO	M2	3,00	1,50	4,50				1	4,50	
1314	SANITARIO PCD MASC	M2	2,50	1,50	3,75				1	3,75	
1315	SANITARIO PCD MASC	M2	1,40	1,50	2,10				1	2,10	
1316	SANITARIO PCD MASC	M2	1,40	1,50	2,10				1	2,10	
1317	SANITARIO PCD MASC	M2	2,50	1,50	3,75				1	3,75	
1318	CIRCULAÇÃO	M2	2,10	1,50	3,15				1	3,15	
1319	SANITARIO PCD FEM	M2	2,50	1,50	3,75				1	3,75	
1320	SANITARIO PCD FEM	M2	1,40	1,50	2,10				1	2,10	
1321	SANITARIO PCD FEM	M2	1,40	1,50	2,10				1	2,10	
1322	SANITARIO PCD FEM	M2	2,50	1,50	3,75				1	3,75	
1323	COZINHA	M2	4,80	1,50	7,20				1	7,20	
1324	COZINHA	M2	0,60	1,50	0,90				1	0,90	
1325	COZINHA	M2	2,10	1,50	3,15				1	3,15	
1326	COZINHA	M2	2,95	1,50	4,43				1	4,43	
1327	DESPENSA	M2	2,95	1,50	4,43				1	4,43	
1328	DESPENSA	M2	1,80	1,50	2,70				1	2,70	
1329	COZINHA	M2	1,00	1,50	1,50				1	1,50	
1330	COZINHA	M2	6,00	1,50	9,00				1	9,00	
1331	CIRCULAÇÃO	M2	1,20	1,50	1,80				1	1,80	
1332	CIRCULAÇÃO	M2	1,55	1,50	2,33				1	2,33	
1333	CIRCULAÇÃO	M2	2,70	1,50	4,05				1	4,05	
1334	CIRCULAÇÃO	M2	2,90	1,50	4,35				1	4,35	
1335	LAVANDERIA	M2	2,90	1,50	4,35				1	4,35	
1336	LAVANDERIA	M2	2,50	1,50	3,75				1	3,75	
1337	LAVANDERIA	M2	1,95	1,50	2,93				1	2,93	
1338	LAVANDERIA	M2	2,90	1,50	4,35				1	4,35	
1339	ROUPARIA	M2	1,75	1,50	2,63				1	2,63	
1340	ROUPARIA	M2	2,10	1,50	3,15				1	3,15	
1341	ROUPARIA	M2	1,95	1,50	2,93				1	2,93	
1342	VESTIARIO FUNCIONARIOS	M2	1,80	1,50	2,70				1	2,70	
1343	VESTIARIO FUNCIONARIOS	M2	1,95	1,50	2,93				1	2,93	
1344	VESTIARIO FUNCIONARIOS	M2	1,65	1,50	2,48				1	2,48	
1345	COPA	M2	3,85	1,50	5,78				1	5,78	
1346	COPA - CIRCULAÇÃO	M2	6,00	1,50	9,00				1	9,00	
1347	CRECHE 1	M2	6,05	1,50	9,08				1	9,08	
1348	CRECHE 1	M2	6,25	1,50	9,38				1	9,38	
1349	CRECHE 1	M2	5,95	1,50	8,93				1	8,93	
1350	CRECHE 1	M2	6,45	1,50	9,68				1	9,68	
1351	PCD INFANTIL	M2	2,10	1,50	3,15				1	3,15	
1352	PCD INFANTIL	M2	3,35	1,50	5,03				1	5,03	
1353	PCD INFANTIL	M2	2,50	1,50	3,75				1	3,75	
1354	SANITARIO INFANTIL 1	M2	3,60	1,50	5,40				1	5,40	
1355	SANITARIO INFANTIL 1	M2	6,50	1,50	9,75				1	9,75	
1356	SANITARIO INFANTIL 1	M2	3,60	1,50	5,40				1	5,40	
1357	CRECHE 3	M2	6,00	1,50	9,00				1	9,00	
1358	CRECHE 3	M2	6,00	1,50	9,00				1	9,00	
1359	CRECHE 3	M2	6,00	1,50	9,00				1	9,00	
1360	SALA MULTIUSO	M2	5,60	1,50	8,40				1	8,40	
1361	SALA MULTIUSO	M2	6,00	1,50	9,00				1	9,00	
1362	SALA MULTIUSO	M2	6,40	1,50	9,60				1	9,60	
1363	SANITARIO INFANTIL 2	M2	3,60	1,50	5,40				1	5,40	
1364	SANITARIO INFANTIL 2	M2	8,55	1,50	12,83				1	12,83	
1365	SANITARIO INFANTIL 2	M2	2,60	1,50	3,90				1	3,90	
1366	PRE ESCOLA 2	M2	6,00	1,50	9,00				1	9,00	
1367	PRE ESCOLA 2	M2	6,60	1,50	9,90				1	9,90	
1368	PRE ESCOLA 2	M2	5,50	1,50	8,25				1	8,25	
1369	PRE ESCOLA 1	M2	7,00	1,50	10,50				1	10,50	
1370	PRE ESCOLA 1	M2	5,90	1,50	8,85				1	8,85	
1371	PRE ESCOLA 1	M2	6,20	1,50	9,30				1	9,30	
1372									TOTAL	421,19	
1373									MEDIÇÕES ANTERIORES		
1374									MEDIÇÃO 13	421,19	
1375	5.10 SISTEMA DE PISOS										
1376	5.10.1.2	Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm - áreas molhadas									
1377	LOCAL	UND	AREA						TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES	
1378	SANITARIO INFANTIL 1	M²	16,50						16,50		
1379	SANITARIO INFANTIL 2	M²	16,50						16,50		
1380	FRALDÁRIO	M²	12,35						12,35		
1381	COPA	M²	15,75						15,75		
1382	AMAMENTAÇÃO	M²	7,50						7,50		
1383	BANHEIRO PCD MASC	M²	2,88						2,88		
1384	BANHEIRO PCD FEM	M²	2,88						2,88		
1385	COZINHA	M²	35,20						35,20		
1386	LAVANDERIA	M²	11,80						11,80		
1387	VESTIARIO MASCULINO	M²	4,50						4,50		
1388	VESTIARIO FEMININO	M²	4,50						4,50		
1389		M²							0,00		
1390		M²							0,00		
1391									TOTAL	130,36	
1392									MEDIÇÕES ANTERIORES		
1393									MEDIÇÃO 13	130,36	
1394									EM PLANILHA HÁ APENAS 130,16M²		
1395	5.10.2.9 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³/KM). AF_07/2020										
1396	LOCAL	UND	VOLUME	DISTANCIA	M³/KM				TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES	
1397	TRANSPORTE DE AREIA	M2	1,84	14,00	25,76				25,76		
1398									TOTAL	25,76	
1399									MEDIÇÕES ANTERIORES		
1400									MEDIÇÃO 13	25,76	
1401	5.10.2.10 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022										
1402	LOCAL	UND	AREA						TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES	
1403	Piso em concreto	M²	254,80						254,80		
1404	Rampa de acesso	M²	17,38						17,38		
1405									TOTAL	272,18	
1406									MEDIÇÕES ANTERIORES		
1407									MEDIÇÃO 13	272,18	
1408	5.12.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO										
1409	5.12.1.1	Tubo PVC soldável Ø 20 mm									
1410	LOCAL	UND	COMPRIMENTO						TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES	
1411	SANITARIO INFANTIL 1	M	12,50						12,50		
1412	SANITARIO INFANTIL 2	M	8,00						8,00		
1413	COPA	M	7,10						7,10		
1414									TOTAL	27,60	
1415									MEDIÇÕES ANTERIORES		
1416									MEDIÇÃO 13	27,60	
1417	5.12.1.2 Tubo PVC soldável Ø 25 mm										
1418	LOCAL	UND	COMPRIMENTO						TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES	
1419	SANITARIO INFANTIL 1	M	31,00						31,00		
1420	SANITARIO INFANTIL 2	M	32,50						32,50		
1421	LAVANDERIA	M	41,00						41,00		
1422	COPA	M	29,00						29,00		
1423	WC MASC/FEMININO	M	33,40						33,40		
1424									TOTAL	166,90	
1425									MEDIÇÕES ANTERIORES		
1426									MEDIÇÃO 13	166,90	
1427	5.12.1.3 Tubo PVC soldável Ø 50 mm										
1428	LOCAL	UND	COMPRIMENTO						TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES	
1429	SANITARIO INFANTIL 1	M	28,50						28,50		
1430	SANITARIO INFANTIL 2	M	13,50						13,50		

</

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
   ESTADO DA PARAIBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS										
MEMÓRIA DE CÁLCULO MEDIÇÃO 13										
									MEDIÇÃO 13	18,00
5.13.1.1	Tubo de PVC Ø100mm									
	LOCAL	UND	QUANT						TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES
	INTERLIGAÇÃO CAIXAS DE DRENAGEM FUNDO CRECHE	QTD	48,00						48,00	
	TIE:								TOTAL	48,00
									MEDIÇÕES ANTERIORES	
									MEDIÇÃO 13	48,00
5.14.27	Ralo seco PVC 100mm									
	LOCAL	UND	QUANT						TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES
	SANITARIOS INF MASC/FEM	QTD	4,00						4,00	
	FRAIDARIO	QTD	1,00						1,00	
	WC FUNCIONARIOS MASC E FEM	QTD	2,00						2,00	
	COPA	QTD	3,00						3,00	
									TOTAL	10,00
									MEDIÇÕES ANTERIORES	
									MEDIÇÃO 13	10,00
5.17.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS									
5.17.3.8	Caixa de Passagem PVC 4x2"									
	LOCAL	UND	QUANT	LARGURA	ÁREA				TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES
	BLOCO B CRECHE	QTD	70,00						70,00	
									TOTAL	70,00
									MEDIÇÕES ANTERIORES	
									MEDIÇÃO 13	70,00
5.17.5.1	Eletrocalha lisa tipo U 150x75 x 3000mm com tampa, inclusive conexões									
	LOCAL	UND	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA				TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES
	CORREDORES BLOCOS A E B	M	25,00						25,00	
									0,00	
									0,00	
									TOTAL	25,00
									MEDIÇÕES ANTERIORES	
									MEDIÇÃO 13	25,00
5.19.5.1	Eletroduto PVC flexível 1", inclusive conexões									
	LOCAL	UND	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA				TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES
	INTERLIGAÇÃO POSTES MASTROS	M	15,20						15,20	EM PLANILHA: BM
									TOTAL	15,20
									MEDIÇÕES ANTERIORES	
									MEDIÇÃO 13	15,20
5.19.5.2	Eletroduto PVC flexível 3/4", inclusive conexões									
	LOCAL	UND	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA				TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES
	ENTRADA BLOCO B	M	25,00						25,00	
									TOTAL	25,00
									MEDIÇÕES ANTERIORES	
									MEDIÇÃO 13	25,00

MEMÓRIA DE CALCULO MEDIÇÃO 13



ADMINISTRAÇÃO



ADMINISTRAÇÃO



ADMINISTRAÇÃO



ADMINISTRAÇÃO



ADMINISTRAÇÃO



ADMINISTRAÇÃO



ADMINISTRAÇÃO



CRECHE



CRECHE



CRECHE



CRECHE



CRECHE



CRECHE



CRECHE



CRECHE



CRECHE





CRECHE



CRECHE



CRECHE



CRECHE



CRECHE




CRECHE



CRECHE



CRECHE

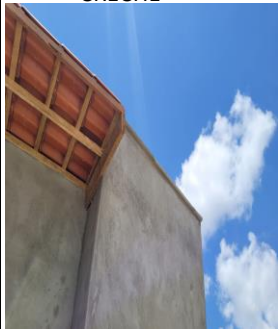

PARQUE



PARQUE



PARQUE



PARQUE



PARQUE




PARQUE



PARQUE



PARQUE

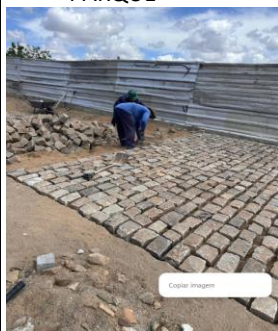

PARQUE




ESGOTAMENTO



ESGOTAMENTO



ESGOTAMENTO

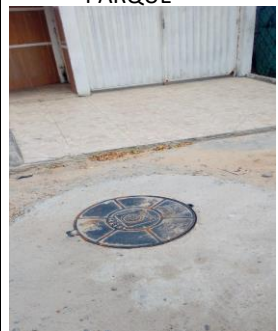

ESGOTAMENTO



QUIOSQUE
