



							VALORES (R\$)			PORC. (%)	
BOLETIM DE MEDIÇÃO							CONTRATO INICIAL (A):		R\$	3.861.513,98	-
							ADITIVO DE ACRÉSCIMO (B):				0,00%
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE TRECHOS DA AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PARAIBA	Nº DO CONTRATO: 2.08.009/2024		PERÍODO: 28-10 a 02-11-2024		BM Nº:	2	ADITIVO DE SUPRESSÃO (C):				0,00%
LOCALIZAÇÃO: CAMPINA GRANDE/PB	O.S. Nº: 9.08.03/2024		PERÍODO: -		MEDIÇÃO:		CONTRATOS + ADITIVOS (B+C):		R\$ <td>3.861.513,98</td> <td>0,00%</td>	3.861.513,98	0,00%
	PERÍODO DA 2ª MEDIÇÃO:		PRAZO CONTRATO:		INICIAL	X	MEDIÇÃO ACUMULADA:		R\$	-	0,00%
CONTRATADA: CLPT CONSTRUTORA EIRELI-EPP	28-10-2024 a 02-11-2024		PRAZO EXECUÇÃO:		INTERMEDIÁRIA		SALDO A MEDIR:		R\$	872.792,38	22,60%
CNPJ: 25.165.699/0001-70			ADITIVO DE PRAZO:	-	FINAL		VALOR DA MEDIÇÃO:		R\$	-	0,00%

ITEM	CÓDIGO						MEDIDO NO MÊS			ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO TOTAL			SALDO		
			UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL (R\$)	QUANT	VALOR TOTAL	(%)	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	(%)	QUANT	VALOR TOTAL	(%)
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA				102.382,41		-	0,00%		74.056,61		-	74.056,61	72,33%	28.325,80	27,67%
1.1	CP.108	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	3,00	R\$ 34.127,47	R\$ 102.382,41		R\$ -	0,00%	2,17	R\$ 74.056,61	2,17	R\$ 74.056,61	72,33%	0,83	R\$ 28.325,80	28%
2		SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS				28.087,76		-	0,00%		27.090,70		-	27.090,70	96,45%	997,06	3,55%
2.1	PLANIHA AUX.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	-	1,00	R\$ 16.118,66	R\$ 16.118,66		R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 16.118,66	1,00	R\$ 16.118,66	100,00%	-	R\$ -	0%
2.2	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_09/2022_PS	m²	25,00	R\$ 326,97	R\$ 8.174,25		R\$ -	0,00%	25,00	R\$ 8.174,25	25,00	R\$ 8.174,25	100,00%	-	R\$ -	0%
2.3	00010777	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	3,00	R\$ 997,06	R\$ 2.991,18		R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 1.994,12	2,00	R\$ 1.994,12	66,67%	1,00	R\$ 997,06	33%
2.4	CP.120	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER (BASE SETOP ED-50137)	Und	1,00	R\$ 803,67	R\$ 803,67		R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 803,67	1,00	R\$ 803,67	100,00%	-	R\$ -	0%
3		SERVIÇOS INICIAIS				1.295,80		310,00	23,92%		985,80		-	1.295,80	100,00%	-	0,00%
3.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	2090,00	R\$ 0,62	R\$ 1.295,80	500,00	R\$ 310,00	23,92%	1.590,00	R\$ 985,80	2.090,00	R\$ 1.295,80	100,00%	-	R\$ -	0%
4		SINALIZAÇÃO				5.961,90		-	0,00%		-		-	0,00%		5.961,90	100,00%
4.1	5212560	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos -fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	450,00	R\$ 4,08	R\$ 1.836,00	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	-	R\$ -	0,00%	450,00	R\$ 1.836,00	100%
4.2	5158	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos	m	500,00	R\$ 4,87	R\$ 2.435,00	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	-	R\$ -	0,00%	500,00	R\$ 2.435,00	100%
4.3	5156	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes	m	500,00	R\$ 3,24	R\$ 1.620,00	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	-	R\$ -	0,00%	500,00	R\$ 1.620,00	100%
4.4	5152	Sinalização com Cavelete Plástico Desmontável	un	5,00	R\$ 14,18	R\$ 70,90	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	-	R\$ -	0,00%	5,00	R\$ 70,90	100%
5		FRESAGEM				206.138,01		50.279,24	24,39%		155.858,77		-	206.138,01	100,00%	-	0,00%
5.1	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	m²	22549,25	R\$ 6,96	R\$ 156.942,78	5.500,00	R\$ 38.280,00	24,39%	17.049,25	R\$ 118.662,78	22.549,25	R\$ 156.942,78	100,00%	-	R\$ -	0%
5.2	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXM). AF_07/2020	M3XXM	17859,00	R\$ 2,54	R\$ 45.361,86	4.356,00	R\$ 11.064,24	24,39%	13.503,00	R\$ 34.297,62	17.859,00	R\$ 45.361,86	100,00%	-	R\$ -	0%
5.3	CP.104	VARRIÇÃO MECANIZADA	M²	22549,25	R\$ 0,17	R\$ 3.833,37	5.500,00	R\$ 935,00	24,39%	17.049,25	R\$ 2.898,37	22.549,25	R\$ 3.833,37	100,00%	-	R\$ -	0%



							VALORES (R\$)			PORC. (%)	
BOLETIM DE MEDIÇÃO							CONTRATO INICIAL (A):		RS	3.861.513,98	-
							ADITIVO DE ACRÉSCIMO (B):				0,00%
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE TRECHOS DA AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PARAIBA	Nº DO CONTRATO: 2.08.009/2024		PERÍODO: 28-10 a 02-11-2024		BM Nº:	2	ADITIVO DE SUPRESSÃO (C):			0,00%	
LOCALIZAÇÃO: CAMPINA GRANDE/PB	O.S. Nº: 9.08.03/2024		PERÍODO: -		MEDIÇÃO:		CONTRATOS + ADITIVOS (B+C):		RS	3.861.513,98	0,00%
	PERÍODO DA 2ª MEDIÇÃO:		PRAZO CONTRATO:		INICIAL	X	MEDIÇÃO ACUMULADA:		RS	-	0,00%
CONTRATADA: CLPT CONSTRUTORA EIRELI-EPP	28-10-2024 a 02-11-2024		PRAZO EXECUÇÃO:		INTERMEDIÁRIA		SALDO A MEDIR:		RS	872.792,38	22,60%
CNPJ: 25.165.699/0001-70			ADITIVO DE PRAZO:	-	FINAL		VALOR DA MEDIÇÃO:		RS	-	0,00%

ITEM	CÓDIGO						MEDIDO NO MÊS			ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO TOTAL			SALDO		
			UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL (R\$)	QUANT	VALOR TOTAL	(%)	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	(%)	QUANT	VALOR TOTAL	(%)
6		DRENAGEM				380.808,17		-	0,00%		-		-	0,00%	380.808,17	100,00%	
6.1		ESCOVAÇÃO/ESCORAMENTO/REATERRO POS INST. TUBOS				113.992,56		-	0,00%		-		-	0,00%	113.992,56	100,00%	
6.1.1	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	463,00	R\$ 5,31	R\$ 2.458,53	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	-	R\$ -	0,00%	463,00	R\$ 2.458,53	100%
6.1.2	90100	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	739,89	R\$ 13,20	R\$ 9.766,54	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	-	R\$ -	0,00%	739,89	R\$ 9.766,54	100%
6.1.3	102323	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	317,09	R\$ 16,51	R\$ 5.235,15	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	-	R\$ -	0,00%	317,09	R\$ 5.235,15	100%
6.1.4	101578	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	m²	1552,00	R\$ 31,30	R\$ 48.577,60	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	-	R\$ -	0,00%	1.552,00	R\$ 48.577,60	100%
6.1.5	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	723,40	R\$ 3,22	R\$ 2.329,34	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	-	R\$ -	0,00%	723,40	R\$ 2.329,34	100%
6.1.6	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	m²	53,82	R\$ 225,78	R\$ 12.151,47	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	-	R\$ -	0,00%	53,82	R\$ 12.151,47	100%
6.1.7	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	843,50	R\$ 26,30	R\$ 22.184,05	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	-	R\$ -	0,00%	843,50	R\$ 22.184,05	100%
6.1.8	100974	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	266,85	R\$ 8,78	R\$ 2.342,94	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	-	R\$ -	0,00%	266,85	R\$ 2.342,94	100%
6.1.9	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3522,42	R\$ 2,54	R\$ 8.946,94	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	-	R\$ -	0,00%	3.522,42	R\$ 8.946,94	100%
6.2		APARELHOS DE DRENAGEM				264.772,19		-	0,00%		-		-	0,00%	264.772,19	100,00%	
6.2.1	92221	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	87,00	R\$ 327,43	R\$ 28.486,41	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	-	R\$ -	0,00%	87,00	R\$ 28.486,41	100%
6.2.2	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	376,00	R\$ 515,28	R\$ 193.745,28	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	-	R\$ -	0,00%	376,00	R\$ 193.745,28	100%
6.2.3	CP-106	BOCA DE LOBO SIMPLES - 1,5M - PADRÃO DNIT - REF BLS02	UN	6,00	R\$ 1.304,47	R\$ 7.826,82	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	-	R\$ -	0,00%	6,00	R\$ 7.826,82	100%
6.2.4	98008	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	UN	5,00	R\$ 4.097,71	R\$ 20.488,55	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	-	R\$ -	0,00%	5,00	R\$ 20.488,55	100%
6.2.5	99241	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020	M	5,00	R\$ 1.772,57	R\$ 8.862,85	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	-	R\$ -	0,00%	5,00	R\$ 8.862,85	100%



							VALORES (R\$)			PORC. (%)	
BOLETIM DE MEDIÇÃO							CONTRATO INICIAL (A):		R\$	3.861.513,98	-
							ADITIVO DE ACRÉSCIMO (B):				0,00%
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE TRECHOS DA AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PARAIBA	Nº DO CONTRATO: 2.08.009/2024		PERÍODO: 28-10 a 02-11-2024		BM Nº:	2	ADITIVO DE SUPRESSÃO (C):				0,00%
LOCALIZAÇÃO: CAMPINA GRANDE/PB	O.S. Nº: 9.08.03/2024		PERÍODO: -		MEDIÇÃO:		CONTRATOS + ADITIVOS (B+C):		R\$	3.861.513,98	0,00%
	PERÍODO DA 2ª MEDIÇÃO:		PRAZO CONTRATO:		INICIAL	X	MEDIÇÃO ACUMULADA:		R\$	-	0,00%
CONTRATADA: CLPT CONSTRUTORA EIRELI-EPP	28-10-2024 a 02-11-2024		PRAZO EXECUÇÃO:		INTERMEDIÁRIA		SALDO A MEDIR:		R\$	872.792,38	22,60%
CNPJ: 25.165.699/0001-70			ADITIVO DE PRAZO:	-	FINAL		VALOR DA MEDIÇÃO:		R\$	-	0,00%

ITEM	CÓDIGO						MEDIDO NO MÊS			ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO TOTAL			SALDO		
		UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL (R\$)	QUANT	VALOR TOTAL	(%)	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	(%)	QUANT	VALOR TOTAL	(%)	
6.2.6	00014112	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 600 MM (COM INSCRIÇÃO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	UN	5,00	R\$ 327,47	R\$ 1.637,35	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	-	R\$ -	0,00%	5,00	R\$ 1.637,35	100%
6.2.7	102739	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	1,00	R\$ 3.724,93	R\$ 3.724,93	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	-	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 3.724,93	100%
6.3		RESTAURAÇÃO DE APARELHOS DE DRENAGEM EXISTENTES				2.043,42		-	0,00%		-	-	-	0,00%		2.043,42	100,00%
6.3.1	103003	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R\$ 422,56	R\$ 1.267,68	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	-	R\$ -	0,00%	3,00	R\$ 1.267,68	100%
6.3.2	CP.107	RECONSTRUÇÃO DE TAMPA PARA BOCA DE LOBO 1MX1M EM CONCRETO ARMADO - BASE SINAPI 94995 E 103913	UN	6,00	R\$ 129,29	R\$ 775,74	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	-	R\$ -	0,00%	6,00	R\$ 775,74	100%
7		RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO - ÁREA QUE HAVERÁ NOVA DRENAGEM				128.412,96		-	0,00%		-	-	-	0,00%		128.412,96	100,00%
7.1	7989	Demolição de pavimentação em paralelepipedo sem reaproveitamento	m³	1300,00	R\$ 13,96	R\$ 18.148,00	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	-	R\$ -	0,00%	1.300,00	R\$ 18.148,00	100%
7.2	101124	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	m³	260,00	R\$ 15,19	R\$ 3.949,40	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	-	R\$ -	0,00%	260,00	R\$ 3.949,40	100%
7.3	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	260,00	R\$ 166,88	R\$ 43.388,80	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	-	R\$ -	0,00%	260,00	R\$ 43.388,80	100%
7.4	100573	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	260,00	R\$ 95,26	R\$ 24.767,60	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	-	R\$ -	0,00%	260,00	R\$ 24.767,60	100%
7.5	00006077	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/BEATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	130,00	R\$ 37,17	R\$ 4.832,10	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	-	R\$ -	0,00%	130,00	R\$ 4.832,10	100%
7.6	00004729	PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M³	130,00	R\$ 96,95	R\$ 12.603,50	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	-	R\$ -	0,00%	130,00	R\$ 12.603,50	100%
7.7	101124	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	m³	260,00	R\$ 15,19	R\$ 3.949,40	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	-	R\$ -	0,00%	260,00	R\$ 3.949,40	100%
7.8	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6604,00	R\$ 2,54	R\$ 16.774,16	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	-	R\$ -	0,00%	6.604,00	R\$ 16.774,16	100%
8		RECAPEAMENTO				2.694.960,05		656.635,13	24,37%		2.023.505,36	-	2.680.140,50	99,45%		14.819,57	0,55%
8.1	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	676,48	R\$ 1.259,40	R\$ 851.958,91	165,00	R\$ 207.801,00	24,39%	511,48	R\$ 644.157,91	676,48	R\$ 851.958,91	100,00%	-	R\$ -	0%
8.2	CP.108 - 01	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, EXCLUSIVE TRANSPORTE - BASE-ORSE2592	m³	1300,00	R\$ 11,34	R\$ 14.742,00		R\$ -	0,00%		R\$ -	-	R\$ -	0,00%	1.300,00	R\$ 14.742,00	100%



						VALORES (R\$)			PORC. (%)		
BOLETIM DE MEDIÇÃO						CONTRATO INICIAL (A):		R\$	3.861.513,98	-	
						ADITIVO DE ACRÉSCIMO (B):				0,00%	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE TRECHOS DA AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PARAIBA	Nº DO CONTRATO: 2.08.009/2024		PERÍODO: 28-10 a 02-11-2024		BM Nº:	2		ADITIVO DE SUPRESSÃO (C):		0,00%	
LOCALIZAÇÃO: CAMPINA GRANDE/PB	O.S. Nº: 9.08.03/2024		PERÍODO: -		MEDIÇÃO:		CONTRATOS + ADITIVOS (B+C):		R\$ <td>3.861.513,98</td> <td>0,00%</td>	3.861.513,98	0,00%
	PERÍODO DA 2ª MEDIÇÃO:		PRAZO CONTRATO:		INICIAL	X		MEDIÇÃO ACUMULADA:	R\$	-	0,00%
CONTRATADA: CLPT CONSTRUTORA EIRELI-EPP	28-10-2024 a 02-11-2024		PRAZO EXECUÇÃO:		INTERMEDIÁRIA			SALDO A MEDIR:	R\$	872.792,38	22,60%
CNPJ: 25.165.699/0001-70			ADITIVO DE PRAZO:	-	FINAL			VALOR DA MEDIÇÃO:	R\$	-	0,00%

ITEM	CÓDIGO						MEDIDO NO MÊS			ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO TOTAL			SALDO		
			UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL (R\$)	QUANT	VALOR TOTAL	(%)	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	(%)	QUANT	VALOR TOTAL	(%)
8.3	CP.109	EXECUÇÃO DE PINTURA ASFÁLTICA DE LIGAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE LIGANTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE - BASE-ORSE2593	m²	22549,25	R\$ 1,85	R\$ 41.716,11	5.500,00	R\$ 10.175,00	24,39%	17.049,25	R\$ 31.541,11	22.549,25	R\$ 41.716,11	100,00%	-	R\$ -	0%
8.4	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	309,65	R\$ 1,88	R\$ 582,14	65,46	R\$ 123,06	21,14%	202,93	R\$ 381,51	268,39	R\$ 504,57	86,68%	41,26	R\$ 77,57	13%
8.5	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	1127,46	R\$ 1.458,21	R\$ 1.644.073,45	275,00	R\$ 401.007,75	24,39%	852,46	R\$ 1.243.065,70	1.127,46	R\$ 1.644.073,45	100,00%	-	R\$ -	0%



						VALORES (R\$)			PORC. (%)	
BOLETIM DE MEDIÇÃO						CONTRATO INICIAL (A):		RS	3.861.513,98	-
						ADITIVO DE ACRÉSCIMO (B):				0,00%
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE TRECHOS DA AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PARAIBA	Nº DO CONTRATO: 2.08.009/2024		PERÍODO: 28-10 a 02-11-2024		BM Nº:	2	ADITIVO DE SUPRESSÃO (C):			0,00%
LOCALIZAÇÃO: CAMPINA GRANDE/PB	O.S. Nº: 9.08.03/2024		PERÍODO: -		MEDIÇÃO:		CONTRATOS + ADITIVOS (B+C):	RS	3.861.513,98	0,00%
	PERÍODO DA 2ª MEDIÇÃO:		PRAZO CONTRATO:		INICIAL	X	MEDIÇÃO ACUMULADA:	RS	-	0,00%
CONTRATADA: CLPT CONSTRUTORA EIRELI-EPP	28-10-2024 a 02-11-2024		PRAZO EXECUÇÃO:		INTERMEDIÁRIA		SALDO A MEDIR:	RS	872.792,38	22,60%
CNPJ: 25.165.699/0001-70			ADITIVO DE PRAZO:	-	FINAL		VALOR DA MEDIÇÃO:	RS	-	0,00%



						VALORES (R\$)			PORC. (%)	
BOLETIM DE MEDIÇÃO						CONTRATO INICIAL (A):		R\$	3.861.513,98	-
						ADITIVO DE ACRÉSCIMO (B):				0,00%
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE TRECHOS DA AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PARAIBA	Nº DO CONTRATO: 2.08.009/2024		PERÍODO: 28-10 a 02-11-2024		BM Nº:	2	ADITIVO DE SUPRESSÃO (C):			0,00%
LOCALIZAÇÃO: CAMPINA GRANDE/PB	O.S. Nº: 9.08.03/2024		PERÍODO: -		MEDIÇÃO:		CONTRATOS + ADITIVOS (B+C):	R\$ <td>3.861.513,98</td> <td>0,00%</td>	3.861.513,98	0,00%
	PERÍODO DA 2ª MEDIÇÃO:		PRAZO CONTRATO:		INICIAL	X	MEDIÇÃO ACUMULADA:	R\$	-	0,00%
CONTRATADA: CLPT CONSTRUTORA EIRELI-EPP	28-10-2024 a 02-11-2024		PRAZO EXECUÇÃO:		INTERMEDIÁRIA		SALDO A MEDIR:	R\$	872.792,38	22,60%
CNPJ: 25.165.699/0001-70			ADITIVO DE PRAZO:	-	FINAL		VALOR DA MEDIÇÃO:	R\$	-	0,00%

ITEM	CÓDIGO						MEDIDO NO MÊS			ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO TOTAL			SALDO		
			UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL (R\$)	QUANT	VALOR TOTAL	(%)	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	(%)	QUANT	VALOR TOTAL	(%)
9.2.9	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	371,41	R\$ 9,17	R\$ 3.405,82	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	-	R\$ -	0,00%	371,41	R\$ 3.405,82	100%
TOTAL						R\$ 3.861.513,98		R\$ 707.224,37	18,31%		R\$ 2.281.497,24		R\$ 2.988.721,62	77,40%		R\$ 872.792,38	22,60%

 CLPT CONSTRUTORA LTDA ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORÓ/RN CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011 ORÇAMENTO CONSOLIDADO CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE OBRAS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE TRECHOS DA AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PARAÍBA LOCAL: CAMPINA GRANDE/PB TIPO: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 9.8.003/2024 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA											
Item	BANCO: SINAPI 12/2023 - Paraíba SICRO 10/2023 - Paraíba	Fonte	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	MEMÓRIA DE CÁLCULO					OBSERVAÇÃO
						EST. INICIAL	EST. FINAL	LARGURA(m)	EXPESSURA(m)	DMT (km)	
3			SERVIÇOS INICIAIS								
3.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	500,00	84	59				
5			FRESAGEM								
5.1	96001	SINAPI	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	m²	5500,00	84	59	11			
5.2	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4356,00	84	59	11	0,05	13,2	= Empolamento de 20%
5.3	CP.104	Próprio	VARRIÇÃO MECANIZADA	M²	5500,00	84	59	11			
8			RECAPEAMENTO								
8.1	95996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	165,00	84	59	11	0,03		
8.3	CP.109	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA ASFÁLTICA DE LIGAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE LIGANTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE - BASE ORSE2593	m²	5500,00	84	59	11			
8.4	102332	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	65,46	84	59	11		26,45	= Pintura de ligação - Taxa 0,00045 T/m²
8.5	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	275,00	84	59	11	0,05		
8.6	100986	SINAPI	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	440,00						= 165 (Volume de camada de Binder) + 275 (Volume de concreto Asfáltico) = 440
8.7	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11638,00					26,45	= 440 (Volume de asfalto) x 26,45 (DMT) = 11638
8.8	2060400	CAERN	NIVELAMENTO DE TAMPÃO EM POÇO DE VISITA INCLUSIVE TRANSPORTE ECHUMBAMENTO EM CONCRETO. INC_05/2017	UN	20,00						= Quantidade Aferida In Loco

CLPT CONSTRUTORA

Mário Lino

Sócio

CPE: 048.784.764-43

Assinado de forma digital
por CLPT CONSTRUTORA
LTDA:25165699000170
Dados: 2025.08.25 10:21:45
-03'00'

SammyaRafaela dos S. M. Mendonça

Engenheira Civil

CREA: 211397088-0

CPF: 012.055.404-66

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO

Representante Legal

CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça


Responsável Técnico

CREA 211397088-0

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	28-10 a 02-11-2024	 CLPT
CONTRATADA:		CLPT CONSTRUTORA EIRELI- EPP	PRAZO:	180 DIAS	
PERÍODO MEDIÇÃO:		28-10-2024 a 02-11-2024	PERÍODO DE CONTRATO:		
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE TRECHOS DA AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PARAÍBA				
	Nº DO CONTRATO: 2.08.009/2024				



2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS


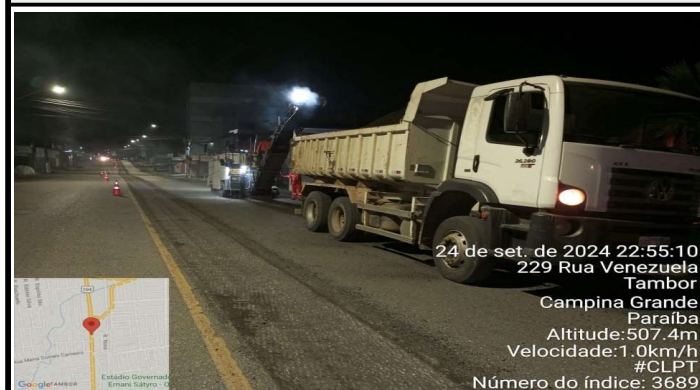


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	28-10 a 02-11-2024	 CLPT
CONTRATADA:		CLPT CONSTRUTORA EIRELI- EPP	PRAZO:	180 DIAS	
PERÍODO MEDIÇÃO:		28-10-2024 a 02-11-2024	PERÍODO DE CONTRATO:		
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE TRECHOS DA AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PARAÍBA				
	Nº DO CONTRATO: 2.08.009/2024				

2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

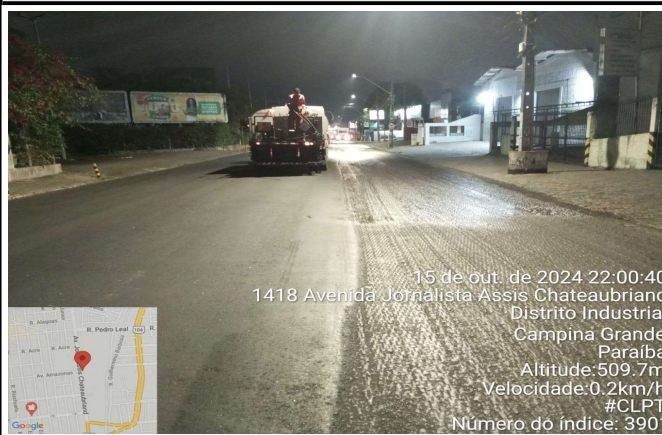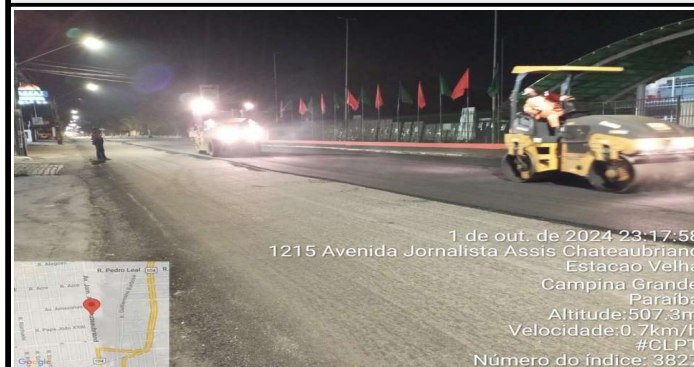

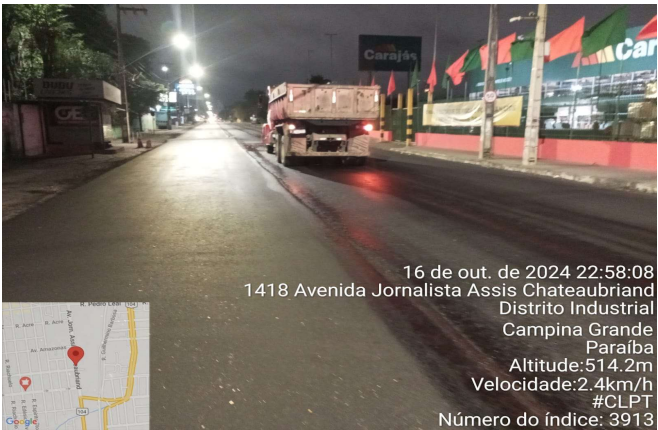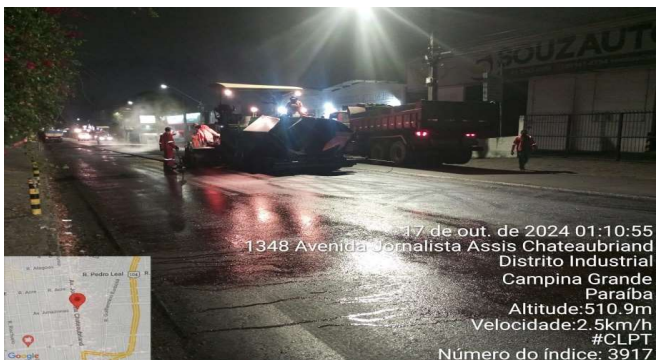RELATÓRIO FOTOGRÁFICO			
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	28-10 a 02-11-2024
CONTRATADA:	CLPT CONSTRUTORA EIRELI- EPP	PRAZO:	180 DIAS
PERÍODO MEDIÇÃO:	28-10-2024 a 02-11-2024	PERÍODO DE CONTRATO:	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE TRECHOS DA AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PARAÍBA		
	Nº DO CONTRATO: 2.08.009/2024		
2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS			
			
16 de out. de 2024 21:36:49 Rua Pedro Otávio de Farias Leite Tambor Campina Grande Paraíba Altitude:502.7m Velocidade:2.4km/h #CLPT Número do índice: 3912		16 de out. de 2024 22:58:08 1418 Avenida Jornalista Assis Chateaubriand Distrito Industrial Campina Grande Paraíba Altitude:514.2m Velocidade:2.4km/h #CLPT Número do índice: 3913	
			
17 de out. de 2024 01:10:43 1348 Avenida Jornalista Assis Chateaubriand Distrito Industrial Campina Grande Paraíba Altitude:505.4m Velocidade:1.0km/h #CLPT Número do índice: 3916		17 de out. de 2024 01:10:55 1348 Avenida Jornalista Assis Chateaubriand Distrito Industrial Campina Grande Paraíba Altitude:510.9m Velocidade:2.5km/h #CLPT Número do índice: 3917	
			
17 de out. de 2024 01:53:41 1334 Avenida Jornalista Assis Chateaubriand Estação Velha Campina Grande Paraíba Altitude:497.6m Velocidade:1.4km/h #CLPT Número do índice: 3919		17 de out. de 2024 01:53:19 1334 Avenida Jornalista Assis Chateaubriand Estação Velha Campina Grande Paraíba Altitude:502.2m Velocidade:1.8km/h #CLPT Número do índice: 3918	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	CLPT CONSTRUTORA LTDA:25165699000170 Assinado de forma digital por CLPT CONSTRUTORA LTDA:25165699000170 Dados: 2025.08.22 16:28:57 -03'00'		FISCALIZAÇÃO:
