



BOLETIM DE MEDIÇÃO						VALORES (R\$)			PERÍODO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE TRECHOS DA AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PARAIBA						CONTRATO INICIAL (A):			R\$ 3.861.513,98
						ADITIVO DE ACRÉSCIMO (B):			0,00%
Nº DO CONTRATO: 2.08.009/2024						PERÍODO: 01/12/2025 a 30/01/2026			BM Nº: 3
LOCALIZAÇÃO: CAMPINA GRANDE/PB						O.S. Nº: 9.08.03/2024			PERÍODO: -
CONTRATADA: CLPT CONSTRUTORA EIRELI-EPP						CNPJ: 25.165.699/0001-70			3
O.S. Nº: 9.08.03/2024						PERÍODO: -			MEDIÇÃO: -
PERÍODO DA 3ª MEDIÇÃO:						PRAZO CONTRATO:			INICIAL
01/12/2025 a 30/01/2026						PRAZO EXECUÇÃO:			INTERMEDIÁRIA
						ADITIVO DE PRAZO:			FINAL
						CONTRATOS + ADITIVOS (B+C):			R\$ 3.861.513,98
						MEDIÇÃO ACUMULADA:			R\$ -
						SALDO A MEDIR:			R\$ 919.619,19
						VALOR DA MEDIÇÃO:			R\$ -

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIDO NO MÊS			ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO TOTAL			SALDO		
							QUANT	VALOR TOTAL	(%)	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	(%)	QUANT	VALOR TOTAL	
<b>1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA</b>																	
1.1	CP.108	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	3,00	R\$ 34.127,47	R\$ 102.382,41		R\$ -	0,00%	2,02	R\$ 68.937,49	2,02	R\$ 68.937,49	67,33%	0,98	R\$ 33.444,92	32,67%
<b>2 SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS</b>																	
2.1	PLANILHA AUX.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	-	1,00	R\$ 16.118,66	R\$ 16.118,66		R\$ -	0,00%	0,50	R\$ 8.059,33	0,50	R\$ 8.059,33	50,00%	0,50	R\$ 8.059,33	50%
2.2	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	25,00	R\$ 326,97	R\$ 8.174,25		R\$ -	0,00%	12,50	R\$ 4.087,13	12,50	R\$ 4.087,13	50,00%	12,50	R\$ 4.087,13	50%
2.3	00010777	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	3,00	R\$ 997,06	R\$ 2.991,18		R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 1.994,12	2,00	R\$ 1.994,12	66,67%	1,00	R\$ 997,06	33%
2.4	CP.120	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER (BASE SETOP ED-50137)	Und	1,00	R\$ 803,67	R\$ 803,67		R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 803,67	1,00	R\$ 803,67	100,00%	-	R\$ -	0%
<b>3 SERVIÇOS INICIAIS</b>																	
3.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	2090,00	R\$ 0,62	R\$ 1.295,80		R\$ -	0,00%	1.980,00	R\$ 1.227,60	1.980,00	R\$ 1.227,60	94,74%	110,00	R\$ 68,20	26%
<b>4 SINALIZAÇÃO</b>																	
4.1	5212560	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos -fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	450,00	R\$ 4,08	R\$ 1.836,00		R\$ -	0,00%		R\$ -		R\$ -	0,00%	450,00	R\$ 1.836,00	100%
4.2	5158	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos	m	500,00	R\$ 4,87	R\$ 2.435,00		R\$ -	0,00%		R\$ -		R\$ -	0,00%	500,00	R\$ 2.435,00	100%
4.3	5156	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes	m	500,00	R\$ 3,24	R\$ 1.620,00		R\$ -	0,00%		R\$ -		R\$ -	0,00%	500,00	R\$ 1.620,00	100%
4.4	5152	Sinalização com Cavalete Plástico Desmontável	un	5,00	R\$ 14,18	R\$ 70,90		R\$ -	0,00%		R\$ -		R\$ -	0,00%	5,00	R\$ 70,90	100%
<b>5 FRESAGEM</b>																	
5.1	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	m²	22549,25	R\$ 6,96	R\$ 156.942,78		R\$ -	0,00%	21.339,25	R\$ 148.521,18	21.339,25	R\$ 148.521,18	94,63%	1.210,00	R\$ 8.421,60	8%
5.2	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	17859,00	R\$ 2,54	R\$ 45.361,86		R\$ -	0,00%	16.900,68	R\$ 42.927,73	16.900,68	R\$ 42.927,73	94,63%	958,32	R\$ 2.434,13	5%
5.3	CP.104	VARRIÇÃO MECANIZADA	M²	22549,25	R\$ 0,17	R\$ 3.833,37		R\$ -	0,00%	21.339,25	R\$ 3.627,67	21.339,25	R\$ 3.627,67	94,63%	1.210,00	R\$ 205,70	



Assinado digitalmente por Sammya Rafaela Dos Santos Martins Mendonça  
 ND: CN=Sammya Rafaela Dos Santos Martins Mendonça, OU=Engenharia Civil, E=clccacaa@clptconstrutora.com.br, C=BR  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2025.02.25 15:05:55 -0300  
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Assinado por 4 pessoas: LUIS HENRIQUE SOARES PINTO, GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS RUI BARBOSA & RAMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/F021-F-95A-C298-10AA e informe o código F021-F95A-C298-10AA





BOLETIM DE MEDIÇÃO						VALORES (R\$)			PORCENTAGEM		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE TRECHOS DA AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PARAIBA						CONTRATO INICIAL (A):			R\$ 3.861.513,98	0,00%	
						ADITIVO DE ACRÉSCIMO (B):				0,00%	
Nº DO CONTRATO: 2.08.009/2024						PERÍODO: 01/12/2025 a 30/01/2026			BM Nº:	3	
LOCALIZAÇÃO: CAMPINA GRANDE/PB						O.S. Nº: 9.08.03/2024			PERÍODO: -		
CONTRATADA: CLPT CONSTRUTORA EIRELI-EPP						CNPJ: 25.165.699/0001-70			MEDIÇÃO:		
PERÍODO DA 3ª MEDIÇÃO:						PRAZO CONTRATO:			INICIAL		
01/12/2025 a 30/01/2026						PRAZO EXECUÇÃO:			INTERMEDIÁRIA		
						ADITIVO DE PRAZO:			FINAL		
						CONTRATOS + ADITIVOS (B+C):			R\$ 3.861.513,98		
						MEDIÇÃO ACUMULADA:			R\$ -		
						SALDO A MEDIR:			R\$ 919.619,19		
						VALOR DA MEDIÇÃO:			R\$ -		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIDO NO MÊS			ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO TOTAL			SALDO	
							QUANT.	VALOR TOTAL	(%)	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	(%)	QUANT.	VALOR TOTAL
6		DRENAGEM				380.808,17	-	0,00%	-	-	-	0,00%	380.808,17	100,00%		
6.1		ESCAVAÇÃO/ESCORAMENTO/REATERRO POS INST. TUBOS				113.992,56	-	0,00%	-	-	-	0,00%	113.992,56	100,00%		
6.1.1	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	463,00	R\$ 5,31	R\$ 2.458,53	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	463,00	R\$ 2.458,53	100,00%
6.1.2	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3). LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	739,89	R\$ 13,20	R\$ 9.766,54	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	739,89	R\$ 9.766,54	100,00%
6.1.3	102323	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3). LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	317,09	R\$ 16,51	R\$ 5.235,15	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	317,09	R\$ 5.235,15	100,00%
6.1.4	101578	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	m²	1552,00	R\$ 31,30	R\$ 48.577,60	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	1.552,00	R\$ 48.577,60	100,00%
6.1.5	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	723,40	R\$ 3,22	R\$ 2.329,34	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	723,40	R\$ 2.329,34	100,00%
6.1.6	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	m²	53,82	R\$ 225,78	R\$ 12.151,47	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	53,82	R\$ 12.151,47	100,00%
6.1.7	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	843,50	R\$ 26,30	R\$ 22.184,05	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	843,50	R\$ 22.184,05	100,00%
6.1.8	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M² / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	266,85	R\$ 8,78	R\$ 2.342,94	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	266,85	R\$ 2.342,94	100,00%
6.1.9	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3522,42	R\$ 2,54	R\$ 8.946,94	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	3.522,42	R\$ 8.946,94	100,00%
6.2		APARELHOS DE DRENAGEM				264.772,19	-	0,00%	-	-	-	0,00%	264.772,19	100,00%		
6.2.1	92221	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	87,00	R\$ 327,43	R\$ 28.486,41	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	87,00	R\$ 28.486,41	100,00%
6.2.2	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	376,00	R\$ 515,28	R\$ 193.745,28	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	376,00	R\$ 193.745,28	100,00%
6.2.3	CP.106	BOCA DE LOBO SIMPLES - 1,5M - PADRÃO DNIT - REF BLS02	UN	6,00	R\$ 1.304,47	R\$ 7.826,82	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	6,00	R\$ 7.826,82	100,00%
6.2.4	98008	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	UN	5,00	R\$ 4.097,71	R\$ 20.488,55	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	5,00	R\$ 20.488,55	100,00%
6.2.5	99241	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020	M	5,00	R\$ 1.772,57	R\$ 8.862,85	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	5,00	R\$ 8.862,85	100,00%



Assinado digitalmente por Sammya Rafaela Dos Santos Martins Mendonça  
 ND: CN=Sammya Rafaela Dos Santos Martins Mendonça, OU=Engenharia Civil, E=clccacac@clptconstrutora.com.br, C=BR  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2025.02.25 15:05:55 -0300  
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Assinado por 4 pessoas: LUIS HENRIQUE SOARES PINTO, GUSTAVO LUISSES DALUZ BARROS RUI BARBOSA & RAMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/F021-F-95A-C298-10AA e informe o código F021-F95A-C298-10AA





BOLETIM DE MEDIÇÃO										VALORES (R\$)			PORT.				
										CONTRATO INICIAL (A):	R\$	3.861.513,98	0,00%				
										ADITIVO DE ACRÉSCIMO (B):			0,00%				
										ADITIVO DE SUPRESSÃO (C):			0,00%				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE TRECHOS DA AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PARAIBA										Nº DO CONTRATO: 2.08.009/2024	PERÍODO: 01/12/2025 a 30/01/2026	BM Nº:	3				
LOCALIZAÇÃO: CAMPINA GRANDE/PB										O.S. Nº: 9.08.03/2024	PERÍODO: -	MEDIÇÃO:	CONTRATOS + ADITIVOS (B+C):	R\$	3.861.513,98	0,00%	
CONTRATADA: CLPT CONSTRUTORA EIRELI-EPP										PERÍODO DA 3ª MEDIÇÃO:	PRAZO CONTRATO:	INICIAL	X	MEDIÇÃO ACUMULADA:	R\$	-	0,00%
CNPJ: 25.165.699/0001-70										01/12/2025 a 30/01/2026	PRAZO EXECUÇÃO:	INTERMEDIÁRIA	SALDO A MEDIR:	R\$	919.619,19	23,81%	
										ADITIVO DE PRAZO:	FINAL	VALOR DA MEDIÇÃO:	R\$	-	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIDO NO MÊS			ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO TOTAL			SALDO		PORT.
							QUANT.	VALOR TOTAL	(%)	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	(%)	QUANT.	VALOR TOTAL	
6.2.6	00014112	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T., 400 X 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	UN	5,00	R\$ 327,47	R\$ 1.637,35	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00%	5,00	R\$ 1.637,35	100%
6.2.7	102739	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSDADE DE 0°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	1,00	R\$ 3.724,93	R\$ 3.724,93	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00%	1,00	R\$ 3.724,93	100%
<b>6.3 RESTAURAÇÃO DE APARELHOS DE DRENAGEM EXISTENTES</b>						<b>2.043,42</b>	-	<b>0,00%</b>	-	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>2.043,42</b>	<b>100%</b>		
6.3.1	103003	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R\$ 422,56	R\$ 1.267,68	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00%	3,00	R\$ 1.267,68	100%
6.3.2	CP.107	RECONSTRUÇÃO DE TAMPA PARA BOCA DE LOBO 1MX1M EM CONCRETO ARMADO - BASE SINAPI 94995 E 103913	UN	6,00	R\$ 129,29	R\$ 775,74	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00%	6,00	R\$ 775,74	100%
<b>7 RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO - ÁREA QUE HAVERÁ NOVA DRENAGEM</b>						<b>128.412,96</b>	-	<b>0,00%</b>	-	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>128.412,96</b>	<b>100%</b>		
7.1	7989	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m²	1300,00	R\$ 13,96	R\$ 18.148,00	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00%	1.300,00	R\$ 18.148,00	100%
7.2	101124	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	m³	260,00	R\$ 15,19	R\$ 3.949,40	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00%	260,00	R\$ 3.949,40	100%
7.3	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	260,00	R\$ 166,88	R\$ 43.388,80	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00%	260,00	R\$ 43.388,80	100%
7.4	100573	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	260,00	R\$ 95,26	R\$ 24.767,60	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00%	260,00	R\$ 24.767,60	100%
7.5	00006077	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	130,00	R\$ 37,17	R\$ 4.832,10	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00%	130,00	R\$ 4.832,10	100%
7.6	00004729	PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M³	130,00	R\$ 96,95	R\$ 12.603,50	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00%	130,00	R\$ 12.603,50	100%
7.7	101124	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	m³	260,00	R\$ 15,19	R\$ 3.949,40	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00%	260,00	R\$ 3.949,40	100%
7.8	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6604,00	R\$ 2,54	R\$ 16.774,16	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00%	6.604,00	R\$ 16.774,16	100%
<b>8 RECAPEAMENTO</b>						<b>2.694.960,05</b>	-	<b>0,00%</b>	-	<b>2.535.565,07</b>	-	<b>2.535.565,07</b>	<b>94,09%</b>	<b>169.395,00</b>	<b>99,11%</b>		
8.1	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m²	676,48	R\$ 1.259,40	R\$ 851.958,91	-	R\$ 640,18	0,00%	R\$ 806.242,69	-	R\$ 640,18	R\$ 806.242,69	94,63%	36,30	R\$ 45.716,22	95%
8.2	CP.108 - 01	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, EXCLUSIVE TRANSPORTE - BASE-ORSE2592	m²	1300,00	R\$ 11,34	R\$ 14.742,00	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00%	1.300,00	R\$ 14.742,00	100%



Assinado digitalmente por Sammya Rafaela Dos Santos Martins Mendonça  
 ND: CN=Sammya Rafaela Dos Santos Martins Mendonça, OU=Engenharia Civil, E=licenciacao@clptconstrutora.com.br, C=BR  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2025.02.25 15:05:55 -0300  
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Assinado por 4 pessoas: LUIS HENRIQUE SOARES PINTO, GUSTAVO LUIS DA SILVA BARROS, RUI BARBOSA & RAMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/F021-F95A-C298-10AA e informe o código F021-F95A-C298-10AA





BOLETIM DE MEDIÇÃO						VALORES (R\$)			PORT.		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE TRECHOS DA AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PARAIBA  LOCALIZAÇÃO: CAMPINA GRANDE/PB  CONTRATADA: CLPT CONSTRUTORA EIRELI-EPP  CNPJ: 25.165.699/0001-70						CONTRATO INICIAL (A):			R\$	3.861.513,98	0,00%
						ADITIVO DE ACRÉSCIMO (B):					0,00%
						ADITIVO DE SUPRESSÃO (C):					0,00%
O.S. Nº: 9.08.03/2024		PERÍODO: 01/12/2025 a 30/01/2026		BM Nº:	3	CONTRATOS + ADITIVOS (B+C):			R\$	3.861.513,98	0,00%
PERÍODO DA 3ª MEDIÇÃO:		PRAZO CONTRATO:	INICIAL		X	MEDIÇÃO ACUMULADA:			R\$	-	0,00%
01/12/2025 a 30/01/2026		PRAZO EXECUÇÃO:	INTERMEDIÁRIA			SALDO A MEDIR:			R\$	919.619,19	23,81%
		ADITIVO DE PRAZO:	FINAL			VALOR DA MEDIÇÃO:			R\$	-	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIDO NO MÊS			ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO TOTAL			SALDO		%
							QUANT	VALOR TOTAL	(%)	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	(%)	QUANT	VALOR TOTAL	
8.3	CP.109	EXECUÇÃO DE PINTURA ASFÁLTICA DE LIGAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE LIGANTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE - BASE-ORSE2593	m³	22549,25	R\$ 1,85	R\$ 41.716,11		R\$ -	0,00%	21.339,25	R\$ 39.477,61	21.339,25	R\$ 39.477,61	94,63%	1.210,00	R\$ 2.238,50	5%
8.4	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	309,65	R\$ 1,88	R\$ 582,14		R\$ -	0,00%	253,99	R\$ 477,50	253,99	R\$ 477,50	82,02%	55,66	R\$ 104,64	18%
8.5	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	1127,46	R\$ 1.458,21	R\$ 1.644.073,45		R\$ -	0,00%	1.066,96	R\$ 1.555.851,74	1.066,96	R\$ 1.555.851,74	94,63%	60,50	R\$ 88.221,71	5%



Assinado digitalmente por Sammya Rafaela Dos Santos Martins Mendonça  
 ND: CN=Sammya Rafaela Dos Santos Martins Mendonça, OU=Engenharia Civil, E=clpt@clpt.com.br, C=BR  
 Racião: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2025.02.25 15:05:55 -0300  
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Assinado por 4 pessoas: LUIS HENRIQUE SOARES PINTO, GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, RUI BARBOSA GRAMMINDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/F021-F95A-C298-10AA> e informe o código F021-F95A-C298-10AA





BOLETIM DE MEDIÇÃO										VALORES (R\$)			PORCENTAGEM							
										CONTRATO INICIAL (A):		R\$	3.861.513,98	0,00%						
										ADITIVO DE ACRÉSCIMO (B):				0,00%						
										ADITIVO DE SUPRESSÃO (C):				0,00%						
<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE TRECHOS DA AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PARAIBA</b>										Nº DO CONTRATO: 2.08.009/2024		PERÍODO: 01/12/2025 a 30/01/2026		BM Nº:	3					
LOCALIZAÇÃO: CAMPINA GRANDE/PB										O.S. Nº: 9.08.03/2024		PERÍODO: -		MEDIÇÃO:		CONTRATOS + ADITIVOS (B+C):		R\$	3.861.513,98	0,00%
PERÍODO DA 3ª MEDIÇÃO:										PRAZO CONTRATO:		INICIAL		X	MEDIÇÃO ACUMULADA:		R\$	-	0,00%	
CONTRATADA: CLPT CONSTRUTORA EIRELI-EPP										PRAZO EXECUÇÃO:		INTERMEDIÁRIA			SALDO A MEDIR:		R\$	919.619,19	23,81%	
CNPJ: 25.165.699/0001-70										ADITIVO DE PRAZO:		FINAL			VALOR DA MEDIÇÃO:		R\$	-	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIDO NO MÊS			ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO TOTAL			SALDO		PORCENTAGEM
							QUANT	VALOR TOTAL	(%)	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	(%)	QUANT	VALOR TOTAL	
8.6	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	1803,94	R\$ 9,33	R\$ 16.830,76		R\$ -	0,00%	1.707,14	R\$ 15.927,62	1.707,14	R\$ 15.927,62	94,63%	96,80	R\$ 903,14	5%
8.7	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	47714,21	R\$ 2,54	R\$ 121.194,09		R\$ -	0,00%	45.153,92	R\$ 114.690,96	45.153,92	R\$ 114.690,96	94,63%	2.560,29	R\$ 6.503,14	6%
8.8	2060400	NIVELAMENTO DE TAMPÃO EM POÇO DE VISITA INCLUSIVE TRANSPORTE ECHUMBAMENTO EM CONCRETO. INC_05/2017	UN	20,00	R\$ 193,13	R\$ 3.862,60		R\$ -	0,00%	15,00	R\$ 2.896,95	15,00	R\$ 2.896,95	75,00%	5,00	R\$ 965,65	25%
<b>9 CALÇADAS E MEIOS-FIOS</b>						<b>313.466,92</b>		<b>126.143,83</b>	<b>40,24%</b>	-	-	<b>126.143,83</b>	<b>40,24%</b>	<b>187.323,09</b>	<b>59,76%</b>		
<b>9.1 MEIOS-FIOS</b>						<b>150.416,51</b>		<b>45.835,35</b>	<b>30,47%</b>	-	-	<b>45.835,35</b>	<b>30,47%</b>	<b>104.581,16</b>	<b>53%</b>		
9.1.1	21	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	1084,00	R\$ 11,64	R\$ 12.617,76	50,30	R\$ 585,49	4,64%		R\$ -	50,30	R\$ 585,49	4,64%	1.033,70	R\$ 12.032,27	95%
9.1.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	2212,00	R\$ 51,66	R\$ 114.271,92	420,50	R\$ 21.723,03	19,01%		R\$ -	420,50	R\$ 21.723,03	19,01%	1.791,50	R\$ 92.548,89	81%
9.1.3	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	442,40	R\$ 53,18	R\$ 23.526,83	442,40	R\$ 23.526,83	100,00%		R\$ -	442,40	R\$ 23.526,83	100,00%	-	R\$ -	0%
<b>9.2 CALÇADAS</b>						<b>163.050,41</b>		<b>80.308,48</b>	<b>49,25%</b>	-	-	<b>80.308,48</b>	<b>49,25%</b>	<b>82.741,93</b>	<b>50,75%</b>		
9.2.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	952,33	R\$ 3,29	R\$ 3.133,16	468,50	R\$ 1.541,36	49,20%		R\$ -	468,50	R\$ 1.541,36	49,20%	483,83	R\$ 1.591,80	51%
9.2.2	2497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	285,70	R\$ 62,30	R\$ 17.799,11	140,56	R\$ 8.756,89	49,20%		R\$ -	140,56	R\$ 8.756,89	49,20%	145,14	R\$ 9.042,22	51%
9.2.3	2523	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m³	190,47	R\$ 145,00	R\$ 27.618,15	96,64	R\$ 14.012,80	50,74%		R\$ -	96,64	R\$ 14.012,80	50,74%	93,83	R\$ 13.605,35	49%
9.2.4	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2432,25	R\$ 2,54	R\$ 6.177,91	1.227,26	R\$ 3.117,24	50,46%		R\$ -	1.227,26	R\$ 3.117,24	50,46%	1.204,99	R\$ 3.060,67	50%
9.2.5	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	952,33	R\$ 3,06	R\$ 2.914,12	468,50	R\$ 1.433,61	49,20%		R\$ -	468,50	R\$ 1.433,61	49,20%	483,83	R\$ 1.480,51	51%
9.2.6	3637	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m²), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m²	952,33	R\$ 25,40	R\$ 24.189,18	468,50	R\$ 11.899,90	49,20%		R\$ -	468,50	R\$ 11.899,90	49,20%	483,83	R\$ 12.289,28	51%
9.2.7	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	95,23	R\$ 796,84	R\$ 75.883,07	46,61	R\$ 37.140,71	48,94%		R\$ -	46,61	R\$ 37.140,71	48,94%	48,62	R\$ 38.742,36	51%
9.2.8	11620	Junta de dilatação com brita 2, argamassada, esp=3 x 3cm	m	559,39	R\$ 3,45	R\$ 1.929,89	112,50	R\$ 388,12	20,11%		R\$ -	112,50	R\$ 388,12	20,11%	446,89	R\$ 1.541,77	80%



Assinado digitalmente por Sammya Rataella Dos Santos Martins Mendonça  
 ND: CN=Sammya Rataella Dos Santos Martins Mendonça, OU=Engenharia Civil, E=licitacao@clptconstrutora.com.br, C=BR  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2025.02.25 15:05:55 -0300  
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Assinado por 4 pessoas: LUIS HENRIQUE SOARES PINHO, GUSTAVO ULSES DA SILVA BARROS, RUI BARBOSA GRAMINHO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/F021-F95A-C298-10AA> e informe o código F021-F95A-C298-10AA





BOLETIM DE MEDIÇÃO							VALORES (R\$)			PORT.							
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE TRECHOS DA AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PARAIBA  LOCALIZAÇÃO: CAMPINA GRANDE/PB  CONTRATADA: CLPT CONSTRUTORA EIRELI-EPP  CNPJ: 25.165.699/0001-70							Nº DO CONTRATO: 2.08.009/2024		PERÍODO: 01/12/2025 a 30/01/2026		BM Nº:	3	CONTRATO INICIAL (A):	R\$	3.861.513,98	0,00%	
							O.S. Nº: 9.08.03/2024		PERÍODO: -		MEDIÇÃO:		CONTRATOS + ADITIVOS (B+C):		R\$	3.861.513,98	0,00%
							PERÍODO DA 3ª MEDIÇÃO:		PRAZO CONTRATO:	INICIAL	X		MEDIÇÃO ACUMULADA:		R\$	-	0,00%
01/12/2025 a 30/01/2026		PRAZO EXECUÇÃO:	INTERMEDIÁRIA				SALDO A MEDIR:		R\$	919.619,19	23,81%						
		ADITIVO DE PRAZO:	FINAL				VALOR DA MEDIÇÃO:		R\$	-	0,00%						

ITEM	CÓDIGO	DESCR. UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIDO NO MÊS			ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO TOTAL			SALDO			
						QUANT	VALOR TOTAL	(%)	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	(%)	QUANT	VALOR TOTAL	(%)	
9.2.9	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	m³	371,41	R\$ 9,17	R\$ 3.405,82	220,05	R\$ 2.017,85	59,25%	R\$ -	R\$ -	220,05	R\$ 2.017,85	59,25%	151,36	R\$ 1.387,97	41%
<b>TOTAL</b>							R\$ 126.143,83	3,27%	R\$ 2.815.750,99	R\$ -	R\$ 2.941.694,81	76,19%	R\$ 919.619,19	23,81%			



Assinado digitalmente por Sammya Rafaela Dos Santos Martins Mendonça  
 ND: CN=Sammya Rafaela Dos Santos Martins Mendonça, OU=Engenharia Civil, E=clpt@clptconstrutora.com.br, C=BR  
 Racião: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2025.02.25 15:05:55 -0300  
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



Assinado por 4 pessoas: LUIS HENRIQUE SOARES PINTO, GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, RUI BARBOSA & RAMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/F021-F95A-C298-10AA> e informe o código F021-F95A-C298-10AA

Item	Fonte	DESCRIÇÃO: SERVIÇO EXECUTADO ENTRE A ESTACA 76 A 147 .	Unidade	Quantidade				TOTAL	OBSERVAÇÃO
					COMPRIMENTO	LARGURA(m)	EXCESSURA(m)		
9.1		MEIO FIO							
9.1.1	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO	M	50,30	50,30			50,30	
9.1.2	SINAPI	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO	M	420,50	420,50			420,50	O MEIO FIO FOI EXECUTADO POR FORA E DENTRO, estacas 145,147, 91,92,76 .
9.1.3	SINAPI	PISO CIMENTADO	M²	467,42	2	1,96		3,92	ESSE TRECHO ESTACA 92 , TEM UM ÂNGULO QUE ENCONTRA A PONTE EXISTENTE, POR ISSO ESSA LARGURA .
					185,4	2,50		463,50	QTDE INSUFICIENTE, MEDIDO 100% NA PLANILHA
9.2		CALÇADA							TRECHO ESTACA , 91 , 92 , 76 , 84,85,86.
9.2.1	SINAPI	LIMPEZA MANUEAL DE VEGETAÇÃO	m²	468,50	185,4	2,50		468,5	
9.2.2	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA	M³	140,54	168,70	0,3	0,2	50,61	
					299,75	0,3	0,2	89,925	
9.2.3	Próprio	ATERRO	M3	96,64	66,7	2,5	0,22	36,685	
					119,9	2,5	0,2	59,95	
9.2.4	SINAPI	TRANSPORTE DE CAMINHÃO BASCULHANTE DE 10M³	m³	1227,26				0	DMT = 12,7Km
9.2.5	Próprio	APLICAÇÃO DE LONA	m²	468,50	187,4	2,50		468,5	

CLPT CONSTRUTORA  
Mário Lino  
Sócio  
CPF: 048.784.764-43

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
Representante Legal  
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos S. M. Mendonça  
Engenheira Civil  
CREA: 211397088-0  
CPF: 012.055.404-66

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
Responsável Técnico  
CREA 211397088-0

Item	Fonte	DESCRIÇÃO: SERVIÇO EXECUTADO ENTRE A ESTACA 76 A 147 .	Unidade	Quantidade					
9.2.6	SINAPI	FORNECIMENTO DE E INSTALAÇÃO DE TELA	m <sup>2</sup>	468,50	187,4	2,50		468,5	
9.2.7	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALCADA ) OU PISO DE CONCRETO NÃO ARMADO.	m <sup>3</sup>	46,61	186,6	2,5	0,1	46,65	
9.2.8	SINAPI	JUNTA DE DILATAÇÃO	m	112,50	112,5			112,5	TRECHO DE ESTACA ENTRE A 145 E 147 .
9.2.9	SINAPI	CARGA E MANOBRA	M3	220,05	66,7	2,5	0,6	100,05	
					120	2,5	0,4	120	

CLPT CONSTRUTORA  
Mário Lino  
Sócio  
CPF: 048.784.764-43

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
Representante Legal  
CPF 048.784.764-43

 Sammya Rafaella dos S. M. Mendonça  
Engenheira Civil  
CREA: 211397088-0  
CPF: 012.055.404-66

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça  
Responsável Técnico  
CREA 211397088-0

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

<b>CONTRATANTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB	<b>PERÍODO DE EXECUÇÃO:</b>	01-12 a 30-01-2026
<b>CONTRATADA:</b>	CLPT CONSTRUTORA EIRELI- EPP	<b>PRAZO:</b>	180 DIAS
<b>PERÍODO MEDIÇÃO:</b>	01-12-2025 a 30-01-2026	<b>PERÍODO DE CONTRATO:</b>	



# CLPT

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE TRECHOS DA AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PARAÍBA**

Nº DO CONTRATO: 2.08.009/2024

### 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS



Assinado por 4 pessoas: LUIS FENRQUE SOARES PINTO, GUSTAVO ULISES DA LUZ BARROS, RUI BARBOSA e RAYMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/F021-F95A-C298-10AA> e informe o código F021-F95A-C298-10AA



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

<b>CONTRATANTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB	<b>PERÍODO DE EXECUÇÃO:</b>	01-12 a 30-01-2026
<b>CONTRATADA:</b>	CLPT CONSTRUTORA EIRELI- EPP	<b>PRAZO:</b>	180 DIAS
<b>PERÍODO MEDIÇÃO:</b>	01-12-2025 a 30-01-2026	<b>PERÍODO DE CONTRATO:</b>	




# CLPT

**OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE TRECHOS DA AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PARAÍBA**

Nº DO CONTRATO: 2.08.009/2024

### 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

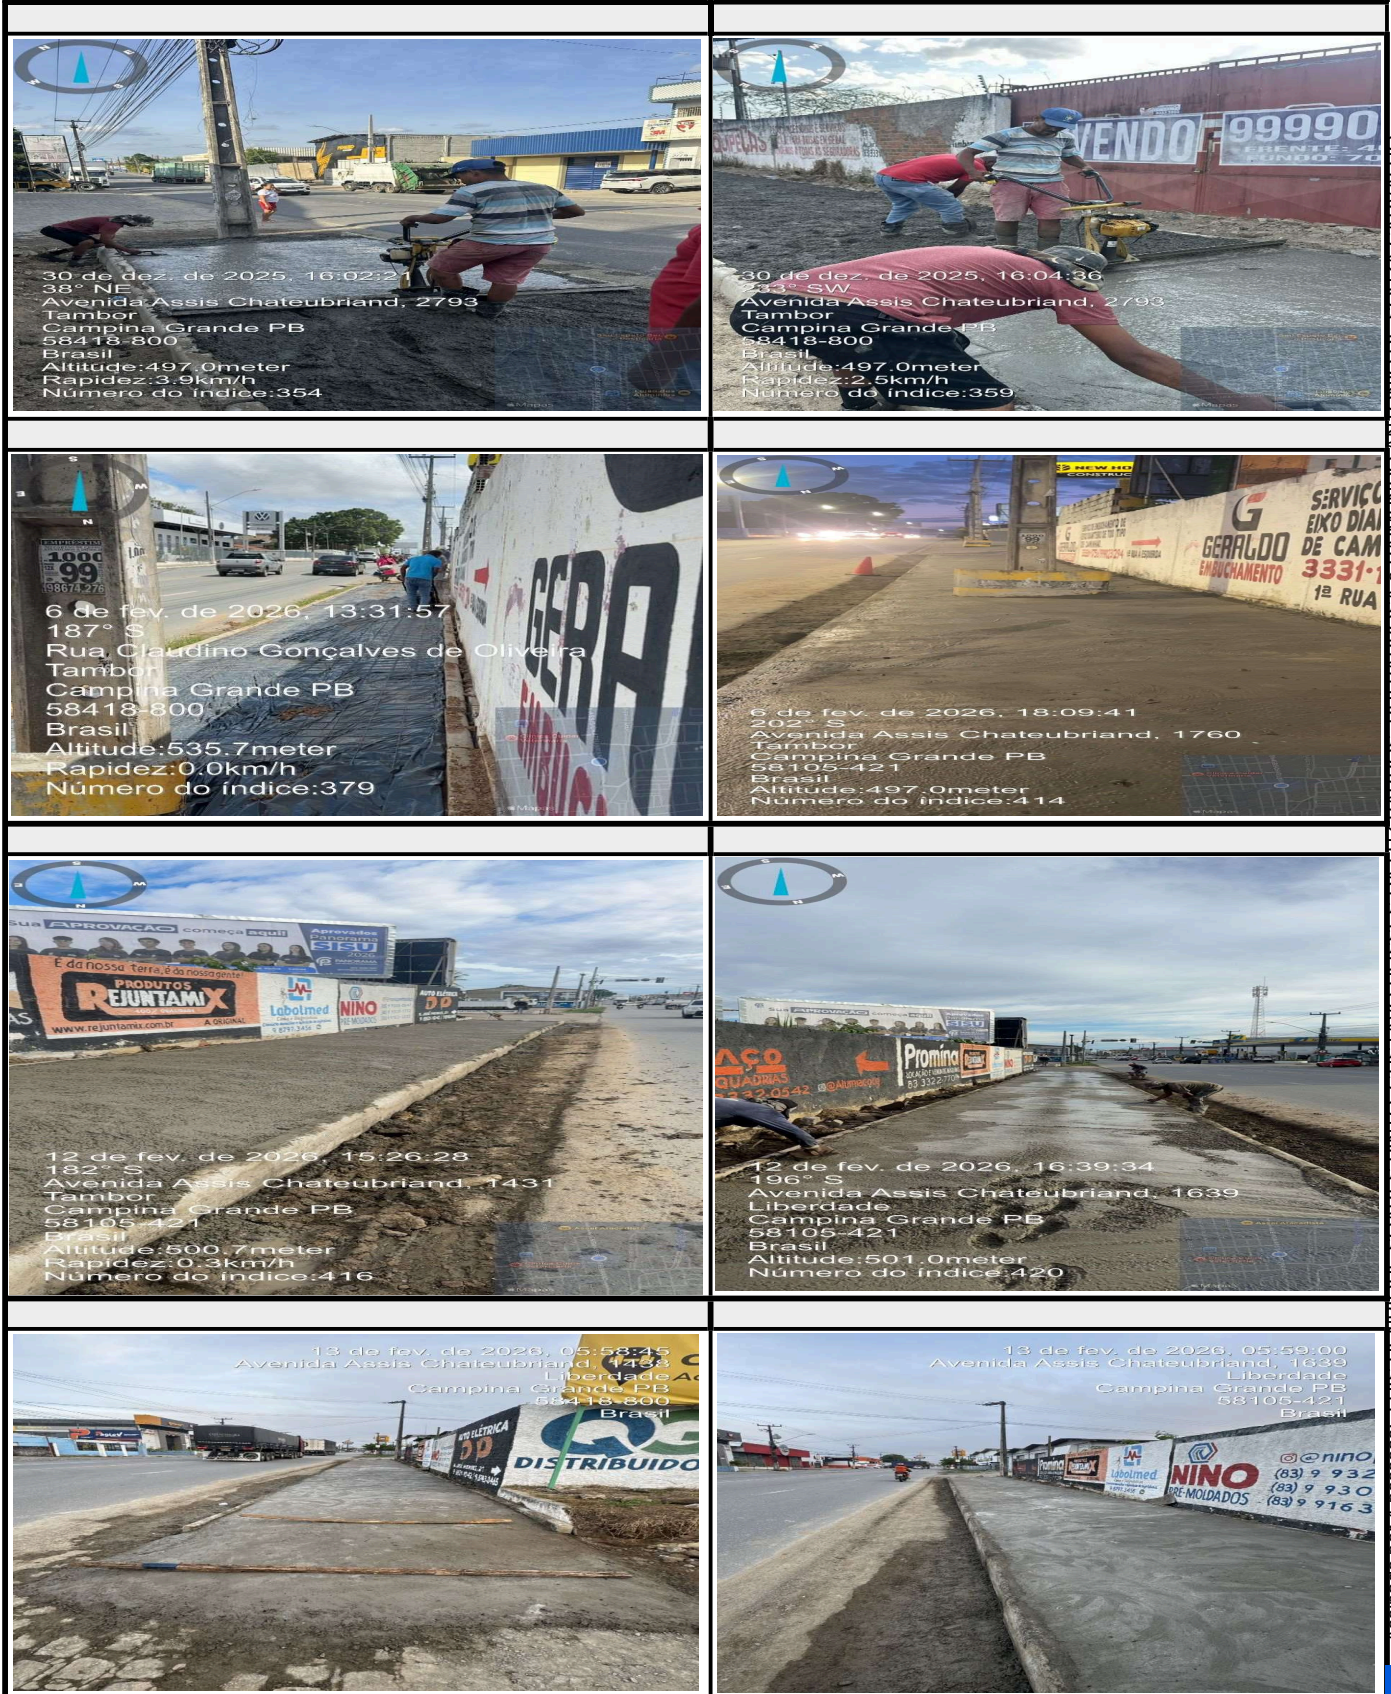

Assinado por 4 pessoas: LUIS HENRIQUE SOARES PINTO, GUSTAVO ULISES DA LUZ BARROS, RUI BARBOSA e RAYMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campina.grande.1.doc.com.br/verificacao/F021-F95A-C298-10AA> e informe o código F021-F95A-C298-10AA



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


<b>CONTRATANTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB	<b>PERÍODO DE EXECUÇÃO:</b>	01-12 a 30-01-2026
<b>CONTRATADA:</b>	CLPT CONSTRUTORA EIRELI- EPP	<b>PRAZO:</b>	180 DIAS
<b>PERÍODO MEDIÇÃO:</b>	01-12-2025 a 30-01-2026	<b>PERÍODO DE CONTRATO:</b>	



# CLPT

<b>OBRA:</b>	<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE TRECHOS DA AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PARAÍBA</b>
	<b>Nº DO CONTRATO: 2.08.009/2024</b>

### 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

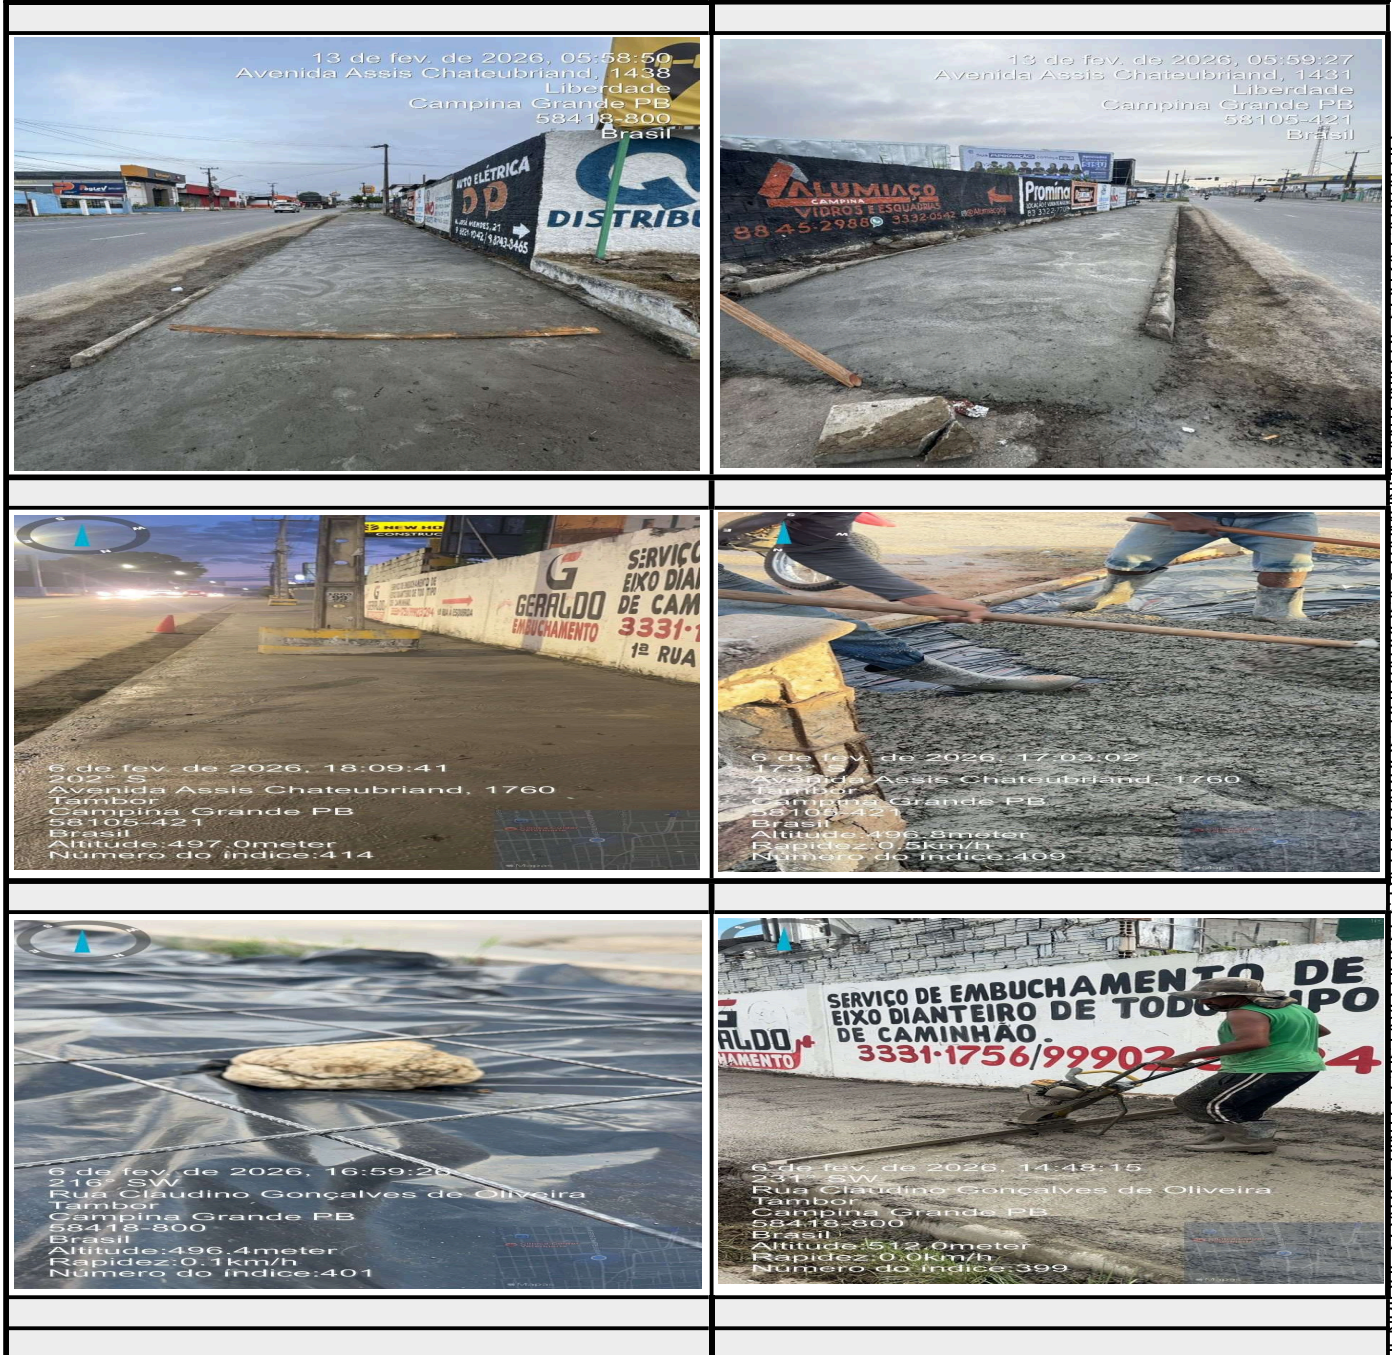

<b>RESPONSÁVEL TÉCNICO:</b>	Sammya Rafaella Dos Santos Martins Mendonça <small>Assinado de forma digital por Sammya Rafaella Dos Santos Martins Mendonça Dados: 2026.02.25 15:05:03 -03'00'</small>	<b>FISCALIZAÇÃO:</b>	
-----------------------------	--	----------------------	--

Assinado por 4 pessoas: LUIS FENRQUE SOARES PINTO, GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, RUI BARBOSA e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campina.grande.1.doc.com.br/verificacao/F021-F95A-C298-10AA> e informe o código F021-F95A-C298-10AA





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS




Código para verificação: F021-F95A-C298-10AA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIS HENRIQUE SOARES PINTO (CPF 122.XXX.XXX-08) em 25/02/2026 15:15:20 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS (CPF 008.XXX.XXX-35) em 25/02/2026 15:28:24 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ RUI BARBOSA (CPF 113.XXX.XXX-87) em 25/02/2026 16:15:54 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO (CPF 203.XXX.XXX-91) em 26/02/2026 11:53:21  
GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)


Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/F021-F95A-C298-10AA>


 <div style="text-align: center;"> <b>CLPT CONSTRUTORA LTDA</b>                      ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAOI - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN                      CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7                      TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011  <b>ORÇAMENTO CONSOLIDADO</b> </div>									
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE -PB <b>OBRA:</b> CALÇADA <b>LOCAL:</b> CAMPINA GRANDE <b>MEDICÃO:</b> 1 <b>TIPO:</b> CALÇADA									
Item	Fonte	DESCRIÇÃO: SERVIÇO EXECUTADO ENTRE A ESTACA 76 A 147 .	Unidade	Quantidade				TOTAL	OBSERVAÇÃO
					COMPRIMENTO	LARGURA(m)	EXPESSURA(m)		
<b>9.1</b>		<b>MEIO FIO</b>							
9.1.1	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO	M	50,30	50,30			50,30	
9.1.2	SINAPI	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO	M	420,50	420,50			420,50	O MEIO FIO FOI EXECUTADO POR FORA E DENTRO, estacas 145,147, 91,92,76 .
9.1.3	SINAPI	PISO CIMENTADO	M²	467,42	2	1,96		3,92	ESSE TRECHO ESTACA 92 , TEM UM ÂNGULO QUE ENCONTRA A PONTE EXISTENTE, POR ISSO ESSA LARGURA .
					185,4	2,50		463,50	
<b>9.2</b>		<b>CALÇADA</b>							TRECHO ESTACA , 91 , 92 , 76 , 84,85,86.
9.2.1	SINAPI	LIMPEZA MANUEAL DE VEGETAÇÃO	m²	468,50	185,4	2,50		468,5	
9.2.2	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA	M³	140,54	168,70	0,3	0,2	50,61	
					299,75	0,3	0,2	89,925	
9.2.3	Próprio	ATERRO	M3	96,64	66,7	2,5		36,685	
					119,9	2,5	0,22	59,95	
9.2.4	SINAPI	TRANSPORTE DE CAMINHÃO BASCULHANTE DE 10M³	m³	1227,26				0	DMT = 12,7Km
9.2.5	Próprio	APLICAÇÃO DE LONA	m²	468,50	187,4	2,50		468,5	

CLPT CONSTRUTORA  
 Mário Lino  
 Sócio  
 CPF: 048.784.764-43

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43


 Sammya Rafaela dos S. M. Mendonça  
 Engenheira Civil  
 CREA: 211397088-0  
 CPF: 012.055.404-66

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 211397088-0

		<b>CLPT CONSTRUTORA LTDA</b> ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011 <b>ORÇAMENTO CONSOLIDADO</b>							
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE -PB <b>OBRA:</b> CALÇADA <b>LOCAL:</b> CAMPINA GRANDE <b>MEDIÇÃO:</b> 1 <b>TIPO:</b> CALÇADA									
Item	Fonte	DESCRIÇÃO: SERVIÇO EXECUTADO ENTRE A ESTACA 76 A 147 .	Unidade	Quantidade					
9.2.6	SINAPI	FORNECIMENTO DE E INSTALAÇÃO DE TELA	m <sup>2</sup>	468,50	187,4	2,50		468,5	
9.2.7	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALCADA ) OU PISO DE CONCRETO NÃO ARMADO.	m <sup>3</sup>	46,61	186,6	2,5	0,1	46,65	
9.2.8	SINAPI	JUNTA DE DILATAÇÃO	m	112,50	112,5			112,5	TRECHO DE ESTACA ENTRE A 145 E 147 .
9.2.9	SINAPI	CARGA E MANOBRA	M3	220,05	66,7	2,5	0,6	100,05	
					120	2,5	0,4	120	

CLPT CONSTRUTORA  
 Mário Lino  
 Sócio  
 CPF: 048.784.764-43

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43

 Sammya Rafaella dos S. M. Mendonça  
 Engenheira Civil  
 CREA: 211397088-0  
 CPF: 012.055.404-66

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 211397088-0

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

<b>CONTRATANTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB	<b>PERÍODO DE EXECUÇÃO:</b>	01-12 a 30-01-2026
<b>CONTRATADA:</b>	CLPT CONSTRUTORA EIRELI- EPP	<b>PRAZO:</b>	180 DIAS
<b>PERÍODO MEDIÇÃO:</b>	01-12-2025 a 30-01-2026	<b>PERÍODO DE CONTRATO:</b>	



# CLPT

**OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE TRECHOS DA AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PARAÍBA**

Nº DO CONTRATO: 2.08.009/2024

### 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

<b>CONTRATANTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB	<b>PERÍODO DE EXECUÇÃO:</b>	01-12 a 30-01-2026
<b>CONTRATADA:</b>	CLPT CONSTRUTORA EIRELI- EPP	<b>PRAZO:</b>	180 DIAS
<b>PERÍODO MEDIÇÃO:</b>	01-12-2025 a 30-01-2026	<b>PERÍODO DE CONTRATO:</b>	



# CLPT

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE TRECHOS DA AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PARAÍBA**

Nº DO CONTRATO: 2.08.009/2024

### 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

<p>30 de dez. de 2025, 16:02:21 38° NE Avenida Assis Chateaubriand, 2793 Tambor Campina Grande PB 58418-800 Brasil Altitude: 497.0meter Rapidez: 3.9km/h Número do índice: 354</p>	<p>30 de dez. de 2025, 16:04:36 33° SW Avenida Assis Chateaubriand, 2793 Tambor Campina Grande PB 58418-800 Brasil Altitude: 497.0meter Rapidez: 2.5km/h Número do índice: 359</p>
<p>6 de fev. de 2026, 13:31:57 187° S Rua Claudino Gonçalves de Oliveira Tambor Campina Grande PB 58418-800 Brasil Altitude: 535.7meter Rapidez: 0.0km/h Número do índice: 379</p>	<p>6 de fev. de 2026, 18:09:41 202° S Avenida Assis Chateaubriand, 1760 Tambor Campina Grande PB 58105-421 Brasil Altitude: 497.0meter Número do índice: 414</p>
<p>12 de fev. de 2026, 15:26:28 182° S Avenida Assis Chateaubriand, 1431 Tambor Campina Grande PB 58105-421 Brasil Altitude: 500.7meter Rapidez: 0.3km/h Número do índice: 416</p>	<p>12 de fev. de 2026, 16:39:34 196° S Avenida Assis Chateaubriand, 1639 Liberdade Campina Grande PB 58105-421 Brasil Altitude: 501.0meter Número do índice: 420</p>
<p>13 de fev. de 2026, 05:58:45 Avenida Assis Chateaubriand, 1433 Liberdade Campina Grande PB 58418-800 Brasil</p>	<p>13 de fev. de 2026, 05:59:00 Avenida Assis Chateaubriand, 1639 Liberdade Campina Grande PB 58105-421 Brasil</p>

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


<b>CONTRATANTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB	<b>PERÍODO DE EXECUÇÃO:</b>	01-12 a 30-01-2026
<b>CONTRATADA:</b>	CLPT CONSTRUTORA EIRELI- EPP	<b>PRAZO:</b>	180 DIAS
<b>PERÍODO MEDIÇÃO:</b>	01-12-2025 a 30-01-2026	<b>PERÍODO DE CONTRATO:</b>	



# CLPT

<b>OBRA:</b>	<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE TRECHOS DA AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PARAÍBA</b>
	Nº DO CONTRATO: 2.08.009/2024

### 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

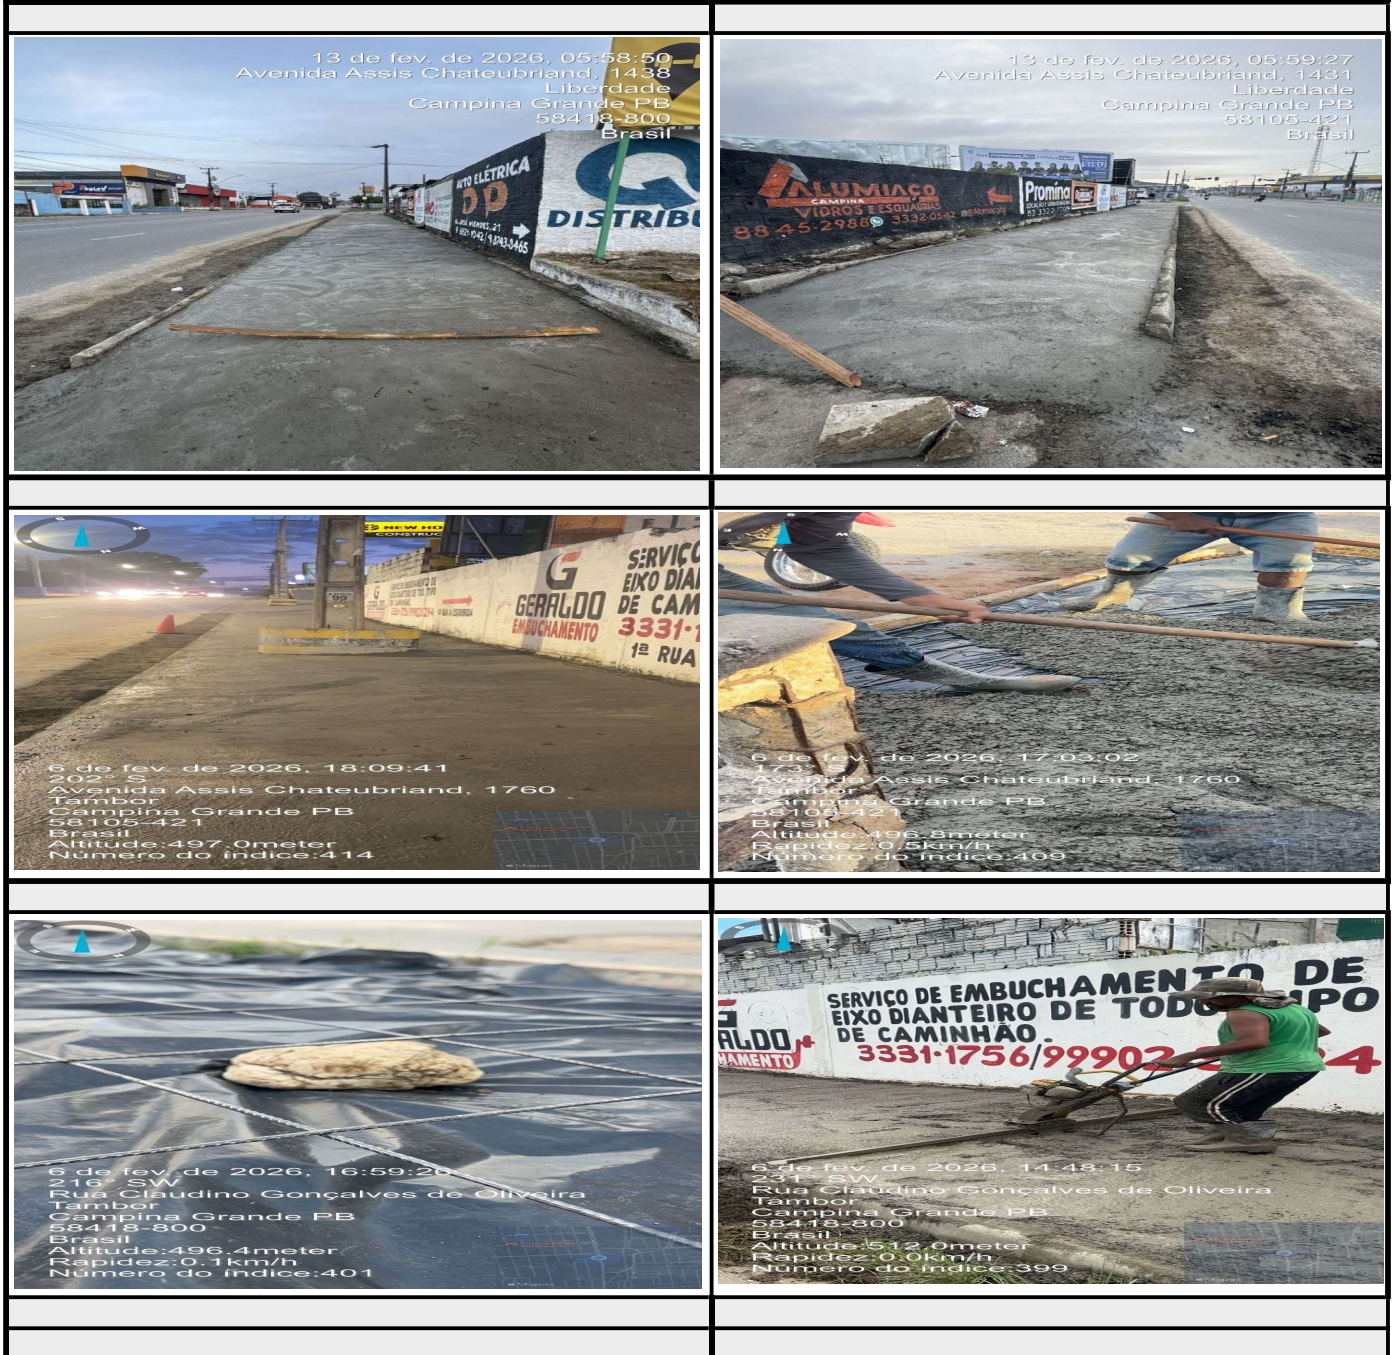

<b>RESPONSÁVEL TÉCNICO:</b>	Sammya Rafaella Dos Santos Martins Mendonça Assinado de forma digital por Sammya Rafaella Dos Santos Martins Mendonça Dados: 2026.02.25 15:05:03 -03'00'	<b>FISCALIZAÇÃO:</b>	
-----------------------------	--	----------------------	--
