

Protocolo Secretaria de Obras 41.059/2025

De: INVIAS ENGENHARIA LTDA

Para: SECOB - MC

Data: 26/05/2025 às 10:11:29

Setores (CC):

SECOB - PROTOCOLO, SECOB - MC

Setores envolvidos:

SECOB - COOBRAS, SECOB - EMP, SECOB - PROTOCOLO, SECOB - MC

Medição de Contratos com Convênio

Nome da Empresa*:

CONSÓRCIO INVIAS CONSTRUPAV

CNPJ*:

30566555000166

Número do Contrato*:

2.08.010/2024

Período da Medição*:

24/04/2025 a 26/05/2025

Programa*:

962806

Operação*:

1094228-20

Número da Medição*:

7

Valor da Medição*:

362.657,40

Estimado,

Segue anexo os documentos que compõe a medição nº7 do período 24/04/2025 a 26/05/2025, referente a Recapeamento da Avenida João Walig.

att,

Anexos:

BOLETIM_MEDICAO_N_7_ADITIVO.pdf

BOLETIM_MEDICAO_N_7_ADITIVO.xlsx

MEMORIA_DE_CALCULO_MEDICAO_N_7_ADITIVO.pdf

RELATORIO_FOTOGRAFICO_MEDICAO_N_7_ADITIVO.pdf

CONCORRÊNCIA Nº 9.08.11/2024						MEDIÇÃO Nº		7		CAMPINA GRANDE CIDADE QUE TRANSFORMA INVIAS ENGENHARIA CONSTRUPAV				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO DA AVENIDA JOÃO WALLIG E DRENAGEM DO CANAL DO DSM, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA						DATA DA EMISSÃO:		26/05/2025						
						CONTRATO:		2.08.010/2024						
DATA DE INICIO:					01/04/2025 <th colspan="2" rowspan="2">VALOR DO CONTRATO =</th> <th colspan="2" rowspan="2">MEDIÇÃO ANTERIOR =</th> <th colspan="2" rowspan="2">MEDIÇÃO ATUAL=</th> <th colspan="2" rowspan="2">MEDIÇÃO ACUMULADA =</th>		VALOR DO CONTRATO =		MEDIÇÃO ANTERIOR =		MEDIÇÃO ATUAL=		MEDIÇÃO ACUMULADA =	
MEDIÇÃO:					7									
PERÍODO SIMPLES: 24/04/2025 a 26/05/2025					PERÍODO ACUMULADO: 01/04/2025 a 26/05/2025		R\$ 962.580,90		R\$ 599.923,51		R\$ 362.657,40		R\$ 962.580,90	
BOLETIM DE MEDIÇÃO - RECUPERAÇÃO DE TRECHO DA AV. JOÃO WALLIG.														
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	PREVISTO			ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO		
			PREÇO UNIT COM BDI R\$	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	
1.0	ADIMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 122.298,55		R\$ 81.645,90		R\$ 40.652,65		R\$ 122.298,55		R\$ -	
1.1	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO (5,00 x 2,50 M)	m²	R\$ 509,89	12,50	R\$ 6.373,63	12,50	R\$ 6.373,63		R\$ -	12,50	R\$ 6.373,63	0,00	R\$ -	
1.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	mês	R\$ 50.012,68	2,00	R\$ 100.025,36	1,35	R\$ 67.322,49	0,65	R\$ 32.702,87	2,00	R\$ 100.025,36	0,00	R\$ -	
1.3	MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE EQUIP. E MO	und	R\$ 15.899,56	1,00	R\$ 15.899,56	0,50	R\$ 7.949,78	0,50	R\$ 7.949,78	1,00	R\$ 15.899,56	0,00	R\$ -	
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 74.048,12		R\$ 64.980,62		R\$ 9.067,50		R\$ 74.048,12		R\$ -	
2.1	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	R\$ 21,42	2.110,00	R\$ 45.196,20	2.110,00	R\$ 45.196,20		R\$ -	2.110,00	R\$ 45.196,20	0,00	R\$ -	
2.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	R\$ 9,24	105,50	R\$ 974,82	105,50	R\$ 974,82		R\$ -	105,50	R\$ 974,82	0,00	R\$ -	
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³xK m	R\$ 2,30	1.055,00	R\$ 2.426,50	1.055,00	R\$ 2.426,50		R\$ -	1.055,00	R\$ 2.426,50	0,00	R\$ -	
2.4	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	m	R\$ 0,63	680,00	R\$ 428,40	680,00	R\$ 428,40		R\$ -	680,00	R\$ 428,40	0,00	R\$ -	
2.5	Sinalização de vias com placas indicativas refletiva(0,30 x 0,40)m, porta peso, suporte tubo 1"qº 2", reuso 25 vezes	und	R\$ 9,20	8,00	R\$ 73,60	8,00	R\$ 73,60		R\$ -	8,00	R\$ 73,60	0,00	R\$ -	
2.6	Interdição de obra com fita de sinalização	m	R\$ 10,02	680,00	R\$ 6.813,60	680,00	R\$ 6.813,60		R\$ -	680,00	R\$ 6.813,60	0,00	R\$ -	
2.7	REMOÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m	R\$ 15,64	180,00	R\$ 2.815,20	90,00	R\$ 1.407,60	90,00	R\$ 1.407,60	180,00	R\$ 2.815,20	0,00	R\$ -	
2.8	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA. 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45	m	R\$ 85,11	180,00	R\$ 15.319,80	90,00	R\$ 7.659,90	90,00	R\$ 7.659,90	180,00	R\$ 15.319,80	0,00	R\$ -	
3.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM				R\$ 140.359,73		R\$ 140.359,73		R\$ -		R\$ 140.359,73		R\$ -	
3.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	m³	R\$ 3,98	422,00	R\$ 1.679,56	422,00	R\$ 1.679,56		R\$ -	422,00	R\$ 1.679,56	0,00	R\$ -	
3.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	R\$ 9,24	527,50	R\$ 4.874,10	527,50	R\$ 4.874,10		R\$ -	527,50	R\$ 4.874,10	0,00	R\$ -	
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³xK m	R\$ 2,30	10.550,00	R\$ 24.265,00	10.550,00	R\$ 24.265,00		R\$ -	10.550,00	R\$ 24.265,00	0,00	R\$ -	
3.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	R\$ 196,05	422,00	R\$ 82.733,10	422,00	R\$ 82.733,10		R\$ -	422,00	R\$ 82.733,10	0,00	R\$ -	
3.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	R\$ 9,24	485,30	R\$ 4.484,17	485,30	R\$ 4.484,17		R\$ -	485,30	R\$ 4.484,17	0,00	R\$ -	
3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³xK m	R\$ 2,30	9.706,00	R\$ 22.323,80	9.706,00	R\$ 22.323,80		R\$ -	9.706,00	R\$ 22.323,80	0,00	R\$ -	
4.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				R\$ 625.874,50		R\$ 312.937,26		R\$ 312.937,25		R\$ 625.874,50		R\$ -	
4.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	R\$ 1.330,67	63,30	R\$ 84.231,41	31,65	R\$ 42.115,71	31,65	R\$ 42.115,71	63,30	R\$ 84.231,41	0,00	R\$ -	
4.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E	m³	R\$ 9,24	63,30	R\$ 584,89	31,65	R\$ 292,45	31,65	R\$ 292,45	63,30	R\$ 584,89	0,00	R\$ -	
4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³xK m	R\$ 2,30	1.266,00	R\$ 2.911,80	633,00	R\$ 1.455,90	633,00	R\$ 1.455,90	1.266,00	R\$ 2.911,80	0,00	R\$ -	
4.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	R\$ 1.360,99	340,00	R\$ 462.736,60	170,00	R\$ 231.368,30	170,00	R\$ 231.368,30	340,00	R\$ 462.736,60	0,00	R\$ -	
4.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E	m³	R\$ 9,24	340,00	R\$ 3.141,60	170,00	R\$ 1.570,80	170,00	R\$ 1.570,80	340,00	R\$ 3.141,60	0,00	R\$ -	
4.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³xK m	R\$ 2,30	6.800,00	R\$ 15.640,00	3.400,00	R\$ 7.820,00	3.400,00	R\$ 7.820,00	6.800,00	R\$ 15.640,00	0,00	R\$ -	
4.7	Imprimação com CM-30	m²	R\$ 11,82	2.110,00	R\$ 24.940,20	1.055,00	R\$ 12.470,10	1.055,00	R\$ 12.470,10	2.110,00	R\$ 24.940,20	0,00	R\$ -	
4.8	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive	m²	R\$ 4,14	6.800,00	R\$ 28.152,00	3.400,00	R\$ 14.076,00	3.400,00	R\$ 14.076,00	6.800,00	R\$ 28.152,00	0,00	R\$ -	
4.9	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	R\$ 0,52	6.800,00	R\$ 3.536,00	3.400,00	R\$ 1.768,00	3.400,00	R\$ 1.768,00	6.800,00	R\$ 3.536,00	0,00	R\$ -	
VALOR TOTAL:					R\$ 962.580,90	R\$ 599.923,51		R\$ 362.657,40		R\$ 962.580,90		R\$ 0,00		

	RECAPEAMENTO DA AVENIDA JOÃO WALLIG - CAMPINA GRANDE-PB																				
	MEMÓRIA DE CÁLCULO																		LOGRADOUROS: AV. JOÃO WALLIG		
ITEM	SERVIÇOS	ESTACA						UNIDADE COMPOSIÇÃO	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	ALTURA (m)	VOLUME (m³)	EMPOLAMENTO	DENSIDADE	PESO	DMT (KM)	MÊS	H	QUANTIDADES	
		INICIAL			FINAL															Parciais / Unidades	Totais
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL																				
1.1	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO (5,00 x 2,50 M) COMPRIMENTO - COMPRIMENTO X LARGURA							m²												-	-
																				-	-
1.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							mês										0,65		0,65	0,65
1.3	MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE EQUIP. E MO MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS PARA PAVIMENTAÇÃO							und										0,50		0,50	0,50
2.0	€ -																				
2.1	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023							m²													-
	Trecho 1	0,00	+	0,00	19,00	+	0,00													-	-
	Trecho 2																			-	-
	Trecho 3																			-	-
	Trecho 4																			-	-
	Trecho 5																			-	-
	Trecho 6																			-	-
2.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020							m³													-
	Trecho 1	0,00	+	0,00	19,00	+	0,00													-	-
	Trecho 2																			-	-
	Trecho 3																			-	-
	Trecho 4																			-	-
	Trecho 5																			-	-
	Trecho 6																			-	-
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020							m³xKm													-
	Trecho 1	0,00	+	0,00	19,00	+	0,00													-	-
	Trecho 2																			-	-
	Trecho 3																			-	-
	Trecho 4																			-	-
	Trecho 5																			-	-
	Trecho 6																			-	-
2.4	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018							m													-
	Aveida João Wallig	0,00		0,00	34,00		0,00													-	-
2.5	Sinalização de vias com placas indicativas refletiva(0,30 x 0,40)m, porta peso, suporte tubo fºgº 2", reuso 25 vezes							und													-
	Aveida João Wallig																				-
2.6	Interdição de obra com fita de sinalização							m													-
																				-	-
2.7	REMOÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023							m													90,00
	Aveida João Wallig								90,00											90,00	90,00
2.8	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016							m													90,00
	Aveida João Wallig								90,00											90,00	90,00
3.0	€ -																				
3.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020							m³													-
	Trecho 1	0,00	+	0,00	19,00	+	0,00						-							-	-
	Trecho 2												-							-	-
	Trecho 3												-							-	-
	Trecho 4												-							-	-
	Trecho 5												-							-	-
	Trecho 6												-							-	-
3.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020							m³													-
	Trecho 1	0,00	+	0,00	19,00	+	0,00						-	25%						-	-
	Trecho 2												-	25%						-	-
	Trecho 3												-	25%						-	-
	Trecho 4												-	25%						-	-
	Trecho 5												-	25%						-	-
	Trecho 6												-	25%						-	-
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020							m³xKm													-
	Trecho 1	0,00	+	0,00	19,00	+	0,00						-	25%			20,00			-	-
	Trecho 2												-	25%			20,00			-	-
	Trecho 3												-	25%			20,00			-	-
	Trecho 4												-	25%			20,00			-	-
	Trecho 5												-	25%			20,00			-	-
	Trecho 6												-	25%			20,00			-	-
3.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019							m³													-
	Trecho 1	0,00	+	0,00	19,00	+	0,00						-							-	-

RECAPEAMENTO DA AVENIDA JOÃO WALLIG - CAMPINA GRANDE-PB																							
		MEMÓRIA DE CÁLCULO																					
		LOGRADOUROS: AV. JOÃO WALLIG																					
ITEM	SERVIÇOS	ESTACA						UNIDADE COMPOSIÇÃO	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	ALTURA (m)	VOLUME (m³)	EMPOLAMENTO	DENSIDADE	PESO	DMT (KM)	MÊS	H	QUANTIDADES			
		INICIAL			FINAL															Parciais / Unidades	Totais		
	Trecho 2												-							-	-		
	Trecho 3												-							-	-		
	Trecho 4												-							-	-		
	Trecho 5												-							-	-		
	Trecho 6												-							-	-		
3.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020							m³															
	Trecho 1	0,00	+	0,00	19,00	+	0,00						-	15%						-	-		
	Trecho 2												-	15%						-	-		
	Trecho 3												-	15%						-	-		
	Trecho 4												-	15%						-	-		
	Trecho 5												-	15%						-	-		
	Trecho 6												-	15%						-	-		
3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020							m³xKm													-		
	Trecho 1	0,00	+	0,00	19,00	+	0,00						-	15%			20,00			-	-		
	Trecho 2												-	15%			20,00			-	-		
	Trecho 3												-	15%			20,00			-	-		
	Trecho 4												-	15%			20,00			-	-		
	Trecho 5												-	15%			20,00			-	-		
	Trecho 6												-	15%			20,00			-	-		
4.0	€																						
4.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019							m³													31,65		
	Trecho 1	0,00	+	0,00	19,00	+	0,00		16,00	10,00	160,00	0,03	4,80							2,40	2,40		
	Trecho 2								70,00	10,00	700,00	0,03	21,00							10,50	10,50		
	Trecho 3								110,00	5,00	550,00	0,03	16,50							8,25	8,25		
	Trecho 4								30,00	5,00	150,00	0,03	4,50							2,25	2,25		
	Trecho 5								40,00	5,00	200,00	0,03	6,00							3,00	3,00		
	Trecho 6								70,00	5,00	350,00	0,03	10,50							5,25	5,25		
4.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020							m³													31,65		
	Trecho 1	0,00	+	0,00	19,00	+	0,00		16,00	10,00	160,00	0,03	4,80							2,40	2,40		
	Trecho 2								70,00	10,00	700,00	0,03	21,00							10,50	10,50		
	Trecho 3								110,00	5,00	550,00	0,03	16,50							8,25	8,25		
	Trecho 4								30,00	5,00	150,00	0,03	4,50							2,25	2,25		
	Trecho 5								40,00	5,00	200,00	0,03	6,00							3,00	3,00		
	Trecho 6								70,00	5,00	350,00	0,03	10,50							5,25	5,25		
4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020							m³xKm													633,00		
	Trecho 1	0,00	+	0,00	19,00	+	0,00		16,00	10,00	160,00	0,03	4,80				20,00			48,00	48,00		
	Trecho 2								70,00	10,00	700,00	0,03	21,00				20,00			210,00	210,00		
	Trecho 3								110,00	5,00	550,00	0,03	16,50				20,00			165,00	165,00		
	Trecho 4								30,00	5,00	150,00	0,03	4,50				20,00			45,00	45,00		
	Trecho 5								40,00	5,00	200,00	0,03	6,00				20,00			60,00	60,00		
	Trecho 6								70,00	5,00	350,00	0,03	10,50				20,00			105,00	105,00		
4.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019							m³													170,00		
	Avenida João Wallig	0,00		0,00	18,00		0,00		680,00	10,00	6.800,00	0,05	340,00							170,00	170,00		
4.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020							m³													170,00		
	Avenida João Wallig	0,00		0,00	18,00		0,00		680,00	10,00	6.800,00	0,05	340,00							170,00	170,00		
4.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020							m³xKm													3.400,00		
	Avenida João Wallig	0,00		0,00	18,00		0,00		680,00	10,00	6.800,00	0,05	340,00				20,00			3.400,00	3.400,00		
4.7	Imprimação com CM-30							m²													1.055,00		
	Trecho 1	0,00	+	0,00	19,00	+	0,00		16,00	10,00	160,00		-							80,00	80,00		
	Trecho 2								70,00	10,00	700,00		-							350,00	350,00		
	Trecho 3								110,00	5,00	550,00		-							275,00	275,00		
	Trecho 4								30,00	5,00	150,00		-							75,00	75,00		
	Trecho 5								40,00	5,00	200,00		-							100,00	100,00		
	Trecho 6								70,00	5,00	350,00		-							175,00	175,00		
4.8	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive							m²													3.400,00		
	Avenida João Wallig	0,00		0,00	18,00		0,00		680,00	10,00	6.800,00		-							3.400,00	3.400,00		
4.9	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)							m²													3.400,00		
	Avenida João Wallig	0,00		0,00	18,00		0,00		680,00	10,00	6.800,00		-							3.400,00	3.400,00		

EMPRESA: **CONSÓRCIO INVIAS CONSTRUPAV**
CONTRATO: **2.08.010/2024**
PERÍODO LÍQUIDO: **24/04/2025 a 26/05/2025**


MEDIÇÃO: **7ª**

FOTO 01



TRECHO AV. JOÃO WALLIG

FOTO 02

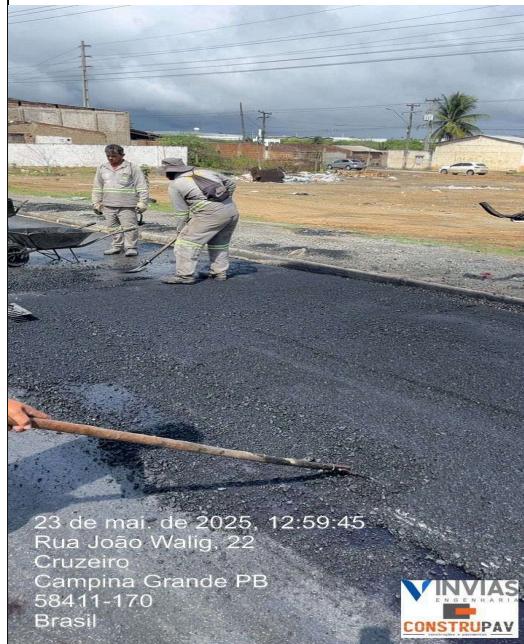

TRECHO AV. JOÃO WALLIG

FOTO 03



TRECHO AV. JOÃO WALLIG

FOTO 04



TRECHO AV. JOÃO WALLIG

EMPRESA: **CONSÓRCIO INVIAS CONSTRUPAV**
CONTRATO: **2.08.010/2024**
PERÍODO LÍQUIDO: **24/04/2025 a 26/05/2025**

MEDIÇÃO: **7ª**

FOTO 05



TRECHO

AV. JOÃO WALLIG

FOTO 06



TRECHO

AV. JOÃO WALLIG



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F6E1-92E1-1FDA-D944

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS JUNIOR (CPF 083.XXX.XXX-58) em 04/06/2025 10:35:59 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS (CPF 008.XXX.XXX-35) em 04/06/2025 10:52:05 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RUI BARBOSA (CPF 113.XXX.XXX-87) em 04/06/2025 10:52:25 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO (CPF 203.XXX.XXX-91) em 04/06/2025 10:56:49 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/F6E1-92E1-1FDA-D944>
