

ITEM	CÓDIGO	BASE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	VALORES (R\$)					PREVISTO CONTRATADO				ACUMULADO ANTERIOR				REALIZADO NO PERÍODO DE 13.06.2024				ACUMULADO ATUAL				SALDO CONTRATUAL			
					UNID.	CONTRATADO	ANTERIO R	ANTERIO R	ANTERIO R	ANTERIO R (PREVISTO)	NOVO ANTERIO R	VALOR (R\$)	%	QUANT	VALOR (R\$)	%	QUANT	VALOR (R\$)	%	QUANT	VALOR (R\$)	%	QUANT	VALOR (R\$)	%	QUANT	VALOR (R\$)	%	
6.3	100323	SNAPY	CANALIZ. ORENTEANTE COM AREA MEDIA (PARDE DO CANAL)	M²	R\$ 185,20	R\$ 30.114,24	R\$ 30.114,24	R\$ 42.818,24	R\$ 42.818,24	231,20	R\$ 185,20	R\$ 42.818,24	100%	231,20	R\$ 41.806,80	97,64%	-	R\$ 0,00	0,00%	231,20	R\$ 41.806,80	97,64%	5,45	R\$ 1.000,34	2,36%				
6.4	96024	SNAPY	CANALIZ. VERTICAL DRENANTE COM PEDRA BRITADA (PARDE DO CANAL)	M²	R\$ 175,00	R\$ 37.156,41	R\$ 37.156,41	R\$ 40.875,01	R\$ 40.875,01	231,20	R\$ 175,00	R\$ 40.875,01	100%	231,20	R\$ 39.716,20	97,64%	-	R\$ 0,00	0,00%	231,20	R\$ 39.716,20	97,64%	5,45	R\$ 950,62	2,36%				
6.5	100341	SNAPY	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DEMONTAGEM DE FÓRMA PARA CORTINA DE CONCRETO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPLETA PLASTIFICADA, 1" X 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES	M²	R\$ 36,71	R\$ 154.123,28	R\$ 154.123,28	R\$ 171.269,55	R\$ 171.269,55	4.665,47	R\$ 36,71	R\$ 171.269,55	100%	4.665,47	R\$ 171.269,55	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4.665,47	R\$ 171.269,55	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%				
7.			REINTEGRAÇÃO			R\$ 409.842,24	R\$ 409.842,24	R\$ 409.842,24	R\$ 396.007,00			R\$ 396.007,00																	
7.1	96882	SNAPY	REINTEGRAÇÃO COMBASTO DO EMPALMADO, ARMAZENADA COMBASTO/ÁREA GROSSA, COM ESP. MÉDIA DE 3,00MM	M²	R\$ 49,89	R\$ 409.842,24	R\$ 409.842,24	R\$ 409.842,24	R\$ 396.007,00	6.179,22	R\$ 49,89	R\$ 396.007,00	100%	6.179,22	R\$ 391.916,69	98,41%	-	R\$ 0,00	0,00%	6.179,22	R\$ 391.916,69	98,41%	100,00	R\$ 4.886,30	1,10%				
8.			REPARAÇÃO			R\$ 76.769,52	R\$ 90.794,43	R\$ 90.794,43	R\$ 90.794,43			R\$ 90.794,43																	
8.1	102725	SNAPY	ORNO REPARAÇÃO, CM 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE, AF. 2/20/201	UNID	R\$ 30,00	R\$ 76.769,52	R\$ 76.769,52	R\$ 76.769,52	R\$ 76.769,52	2.560,00	R\$ 30,00	R\$ 76.769,52	100%	2.560,00	R\$ 76.769,52	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2.560,00	R\$ 76.769,52	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%				
8.2	102715	SNAPY	GRUPO, 180 TONELADAS 100% POLIESTER, RESISTENTE A TRACÇÃO DE 28 MM (18" - 28"), INSTALADO EM DRENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	R\$ 28,27	R\$ 2.442,32	R\$ 6.683,01	R\$ 13.866,41	R\$ 13.866,41	480,28	R\$ 28,27	R\$ 13.866,41	100%	480,28	R\$ 13.866,41	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	480,28	R\$ 13.866,41	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%				
9.			REINTEGRAÇÃO			R\$ 114.403,32	R\$ 114.403,32	R\$ 114.403,32	R\$ 114.403,32			R\$ 114.403,32																	
9.01	CPU-13	PROFISIA	REINTEGRAÇÃO COM SACOS DE AREIA	M²	R\$ 558,61	R\$ 114.403,32	R\$ 114.403,32	R\$ 114.403,32	R\$ 114.403,32	271,80	R\$ 558,61	R\$ 114.403,32	100%	271,80	R\$ 113.800,30	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	271,80	R\$ 113.800,30	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%				
10.			VAL DO CANAL E BUNDO DO ANTERIO R			R\$ 5.797.983,76	R\$ 5.798.084,76	R\$ 5.833.519,77	R\$ 5.833.519,77			R\$ 5.833.519,76																	
1.			SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM (VAL DO CANAL)			R\$ 167.892,32	R\$ 167.892,32	R\$ 167.892,32	R\$ 167.892,32			R\$ 167.892,32																	
1.1	CPU-04	PROFISIA	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFIA E NIVELADOR	M	R\$ 5,83	R\$ 2.451,20	R\$ 2.451,20	R\$ 2.451,20	R\$ 2.451,20	640,00	R\$ 5,83	R\$ 2.451,20	100%	640,00	R\$ 2.451,20	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	640,00	R\$ 2.451,20	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%				
1.2	101127	SNAPY	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA, COM TRATOR DE ESTERNA (JATPA/JANNA, 8,70MM, AF. 2/20/20)	R\$	R\$ 13,78	R\$ 55.753,88	R\$ 165.481,12	R\$ 165.481,12	R\$ 234.705,02	17.032,30	R\$ 13,78	R\$ 234.705,02	100%	17.032,30	R\$ 234.705,03	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	17.032,30	R\$ 234.705,03	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%				
2.			NOTA PARA O MATERIAL			R\$ 224.188,00	R\$ 591.173,82	R\$ 585.428,30	R\$ 670.004,82			R\$ 670.004,82																	
2.1	100978	SNAPY	CARGA, MANOBR. E DESCARGA DE AREIA, BRTA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CEMENTO 30 MP	M²	R\$ 6,95	R\$ 28.118,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 6,95	R\$ 0,00	100%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%				
2.2	95589	SNAPY	TRANSPORTE LOCAL, COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MM, RODOVIA PLASTIFICADA, REVESTIMENTO PRIMÁRIO (CANAL)	M³/KM	R\$ 2,80	R\$ 88.364,64	R\$ 585.428,30	R\$ 585.428,30	R\$ 684.250,30	215.484,43	R\$ 2,80	R\$ 684.250,30	100%	215.484,43	R\$ 684.250,31	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	215.484,43	R\$ 684.250,31	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%				
2.3	95588	SNAPY	TRANSPORTE LOCAL, COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MM, RODOVIA LITO	M³/KM	R\$ 2,80	R\$ 105.959,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 2,80	R\$ 0,00	100%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%				
2.4	100574	SNAPY	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTERNA DE 180 HP	M²	R\$ 1,42	R\$ 5.745,32	R\$ 5.745,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4.046,00	R\$ 1,42	R\$ 5.745,32	100%	4.046,00	R\$ 5.745,32	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4.046,00	R\$ 5.745,32	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%				
3.			ATERRO			R\$ 5.955.151,33	R\$ 5.955.151,33	R\$ 6.018.961,33	R\$ 6.018.961,33			R\$ 6.018.961,33																	
3.1	100323	SNAPY	ATERRO COM AREIA COM ADESIAMENTO HORIZONTAL	M²	R\$ 185,20	R\$ 592.640,00	R\$ 592.640,00	R\$ 592.640,00	R\$ 1.779.431,23	8.608,18	R\$ 185,20	R\$ 1.779.431,23	100%	8.608,18	R\$ 1.779.431,23	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	8.608,18	R\$ 1.779.431,23	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%				
3.2	905477	SNAPY	MATERIAL PARA ATERRO RETENÇÃO EM AREIA	R\$	R\$ 39,92	R\$ 1.158.383,29	R\$ 1.158.383,29	R\$ 1.296.034,29	R\$ 1.296.034,29	38.945,00	R\$ 39,92	R\$ 1.296.034,29	100%	38.945,00	R\$ 1.296.034,29	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	38.945,00	R\$ 1.296.034,29	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%				
3.3	98525	SNAPY	LIMPEZA MECANIZADA DE TERREIRO COM REMOÇÃO DE CANADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTON-VEICULO	M²	R\$ 0,39	R\$ 11.700,00	R\$ 11.700,00	R\$ 11.700,00	R\$ 11.700,00	30.000,00	R\$ 0,39	R\$ 11.700,00	100%	30.000,00	R\$ 11.700,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	30.000,00	R\$ 11.700,00	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%				
3.4	101126	SNAPY	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA EM AREIA	M²	R\$ 12,00	R\$ 348.135,48	R\$ 348.135,48	R\$ 348.135,48	R\$ 599.932,60	49.994,38	R\$ 12,00	R\$ 599.932,60	100%	49.994,38	R\$ 599.932,61	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	49.994,38	R\$ 599.932,61	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%				
3.5	95589	SNAPY	TRANSPORTE LOCAL, COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MM, RODOVIA PLASTIFICADA, REVESTIMENTO PRIMÁRIO (CANAL)	M³/KM	R\$ 2,80	R\$ 633.715,78	R\$ 633.715,78	R\$ 633.715,78	R\$ 1.177.932,08	412.920,38	R\$ 2,80	R\$ 1.177.932,08	100%	412.920,38	R\$ 1.177.932,09	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	412.920,38	R\$ 1.177.932,09	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%				
3.6	95588	SNAPY	TRANSPORTE LOCAL, COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MM, RODOVIA LITO	M³/KM	R\$ 2,80	R\$ 732.210,52	R\$ 732.210,52	R\$ 732.210,52	R\$ 1.208.761,34	412.920,38	R\$ 2,80	R\$ 1.208.761,34	100%	412.920,38	R\$ 1.208.761,34	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	412.920,38	R\$ 1.208.761,34	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%				
3.7	96586	SNAPY	ATERRO MECANIZADO COMPACTADO A 95% DO PROCTOR NORMAL, ATERRO EM AREIA	R\$	R\$ 8,91	R\$ 238.535,14	R\$ 238.535,14	R\$ 397.786,14	R\$ 277.599,96	31.116,00	R\$ 8,91	R\$ 277.599,96	100%	31.116,00	R\$ 277.599,96	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	31.116,00	R\$ 277.599,96	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%				
3.8	100576	SNAPY	REGULAGEM DE SOLO LITO	M²	R\$ 2,60	R\$ 28.288,00	R\$ 28.288,00	R\$ 35.464,00	R\$ 0,00	10.824,00	R\$ 2,60	R\$ 28.142,40	100%	10.824,00	R\$ 28.142,40	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	10.824,00	R\$ 28.142,40	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%				
3.9	905127	SICRO	PARA BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO	M²	R\$ 11,89	R\$ 25.872,64	R\$ 25.872,64	R\$ 28.080,40	R\$ 17.264,28	1.432,00	R\$ 11,89	R\$ 17.264,28	100%	1.432,00	R\$ 17.264,28	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1.432,00	R\$ 17.264,28	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%				
3.10	100585	SNAPY	BASE DE SOLO BRTA DESDE MISTURA EM LAMA, COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	M²	R\$ 89,96																								

ITEM	CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	VALORES (R\$)					PREVISTO CONTRATADO				ACUMULADO ANTERIOR				REALIZADO NO PERÍODO DE 13.04.2024			ACUMULADO ATUAL				SALDO CONTRATUAL		
					UNID.	CONTRATADO	ANEXO 02	ANEXO 03	ANEXO 04	ANEXO 05 (PREÇO)	VALOR UNITÁRIO	VALOR (R\$)	%	QUANT.	VALOR (R\$)	%	QUANT.	VALOR (R\$)	%	QUANT.	VALOR (R\$)	%	QUANT.	VALOR (R\$)	%		
6.9	302725	SNAPY	DRENAGEM, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE, AF_07/2021	UNID	R\$ 30,05	R\$ 384,64	R\$ 384,64	R\$ 384,64	R\$ 300,50	10,00	R\$ 30,05	R\$ 300,50	100%	10,00	R\$ 300,50	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 300,50	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%		
6.10	CPU-12	PROFISPA	GUARDA-CORPO EM TUBO DE FIBRO SARAIVANDIA 1"'	M	R\$ 231,68	R\$ 17.515,00	R\$ 17.448,43	R\$ 17.515,00	75,71	R\$ 231,68	R\$ 17.077,13	75,71	R\$ 17.077,13	75,71	R\$ 17.077,13	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	75,71	R\$ 17.077,13	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%		
6.11	CPU-23	PROFISPA	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	R\$ 9,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 148.840,31	R\$ 148.840,31	15.360,20	R\$ 9,89	R\$ 148.840,31	100%	15.360,20	R\$ 148.840,31	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	15.360,20	R\$ 148.840,31	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%		
6.12			ARMAÇÃO DAS PONTES (EST 18 E EST 38)			R\$ 90.478,92	R\$ 90.478,92	R\$ 493.146,38	R\$ 384.396,44			R\$ 384.396,44															
6.12.1	100807	SNAPY	ESTACA DE CONCRETO ARMADO (REFORÇO DE FUNDAÇÃO PARA PONTE DA EST-18)	M	R\$ 125,99	R\$ 38.804,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 125,99	R\$ 0,00	100%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%			
6.12.2	102467	SNAPY	ALCANTARAL COMBOMENTO EM CONCRETO CILÍNDRICO (0,80 x 1,50 - 1kg x 3,90kg)	M²	R\$ 408,24	R\$ 49.297,85	R\$ 49.297,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 408,24	R\$ 0,00	100%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		
6.12.3	90101	SNAPY	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VILA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONITENTE E ADJUNTURA COMPOSIÇÃO POR TRECHOS, RETROSCAV. 0,8 M LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_07/2021	M³	R\$ 13,03	R\$ 2.376,15	R\$ 2.376,15	R\$ 27.932,02	R\$ 18.739,42	1.438,18	R\$ 13,03	R\$ 18.739,42	100%	1.438,18	R\$ 18.739,42	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1.438,18	R\$ 18.739,42	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%		
6.12.4	102467	SNAPY	CONCRETO CILÍNDRICO FCK-ESMPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M²	R\$ 608,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 181.133,87	R\$ 0,00	-	R\$ 608,24	R\$ 0,00	100%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%		
6.12.5	93589	SNAPY	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 ML, RODOVIA PAVIMENTADA REVESTIMENTO PRIMÁRIO (CANAL)	M³/M	R\$ 2,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84.004,05	R\$ 70.111,03	26.960,79	R\$ 2,80	R\$ 70.111,03	100%	26.960,79	R\$ 70.111,03	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	26.960,79	R\$ 70.111,03	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%		
6.12.6	11912	ORSE	CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, COM MÁQUINA E DISCO DOMINANTE, 00/25	M	R\$ 14,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.190,00	150,00	R\$ 14,60	R\$ 2.190,00	100%	150,00	R\$ 2.190,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	150,00	R\$ 2.190,00	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%			
6.12.7	100978	SNAPY	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AREIA, BRTA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHO 10 M²	M³	R\$ 6,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.569,39	R\$ 0,00	-	R\$ 6,35	R\$ 0,00	100%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%		
6.12.8	954077	SNAPY	MATERIAL PARA ATERRIO RETENÇÃO EM LAJADA	M³	R\$ 39,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.407,41	R\$ 57.008,43	927,07	R\$ 39,92	R\$ 57.008,43	100%	927,07	R\$ 57.008,43	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	927,07	R\$ 57.008,43	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%		
6.12.9	93182	SNAPY	REATORIO MANUAL DE VILAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M²	R\$ 26,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.711,43	R\$ 24.632,11	927,07	R\$ 26,57	R\$ 24.632,11	100%	927,07	R\$ 24.632,11	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	927,07	R\$ 24.632,11	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%		
6.12.10	100341	SNAPY	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTROLE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENHADA PLASTIFICADA, E=18 MM, 50 UTILIZAÇÕES, AF_07/2023	M²	R\$ 50,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.732,20	288,72	R\$ 50,70	R\$ 14.638,10	100%	288,72	R\$ 14.638,10	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	288,72	R\$ 14.638,10	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%			
6.12.11	96620	SNAPY	LAJATO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISÓIS, LAJES SOBRE SOLO OU MADERA, AF_08/2017 - REQUALIFICAÇÃO DA VILA	M²	R\$ 796,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.037,31	R\$ 0,00	-	R\$ 796,75	R\$ 0,00	100%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%		
6.12.12	102319	SNAPY	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VILA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONITENTE E ADJUNTURA COMPOSIÇÃO POR TRECHOS, RETROSCAV. 0,8 M LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_07/2021	M³	R\$ 6,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.607,68	R\$ 0,00	-	R\$ 6,80	R\$ 0,00	100%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%		
6.12.13	100974	SNAPY	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHO BASCULANTE 10 M² - CARGA COM PL. CARGUEIRA (LARGURA DE 1,7 A 3,8 M) / 128 MP (DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	M³	R\$ 8,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.032,00	R\$ 17.270,55	2.038,39	R\$ 8,35	R\$ 17.270,55	100%	2.038,39	R\$ 17.270,55	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2.038,39	R\$ 17.270,55	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%		
7.			PAROIS EM CONCRETO CILÍNDRICO - PAROIS DE APOIO DAS PONTES 01 E 02			R\$ 353.265,79	R\$ 353.265,79	R\$ 359.546,47	R\$ 139.945,46			R\$ 139.945,46															
7.1	102467	SNAPY	CONCRETO CILÍNDRICO FCK-ESMPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO PAROIS	M²	R\$ 608,24	R\$ 353.265,79	R\$ 353.265,79	R\$ 353.265,79	R\$ 48.659,20	80,00	R\$ 608,24	R\$ 48.659,20	100%	76,50	R\$ 46.130,36	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	76,50	R\$ 46.130,36	0,00%	3,50	R\$ 2.126,84	0,00%		
7.2			ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VILA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONITENTE E ADJUNTURA COMPOSIÇÃO POR TRECHOS, RETROSCAV. 0,8 M LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_07/2021	M³	R\$ 13,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.541,08	493,21	R\$ 13,03	R\$ 6.436,52	100%	493,21	R\$ 6.436,52	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	493,21	R\$ 6.436,52	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%			
7.3			CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHO BASCULANTE 10 M² - CARGA COM PL. CARGUEIRA (LARGURA DE 1,7 A 3,8 M) / 128 MP (DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	M³	R\$ 8,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.365,51	636,51	R\$ 8,35	R\$ 5.271,18	100%	636,51	R\$ 5.271,18	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	636,51	R\$ 5.271,18	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%			
7.4			TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 ML, RODOVIA PAVIMENTADA REVESTIMENTO PRIMÁRIO (CANAL)	M³/M	R\$ 2,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.472,50	9.247,69	R\$ 2,80	R\$ 24.043,99	100%	9.247,69	R\$ 24.043,99	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	9.247,69	R\$ 24.043,99	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%			
7.5	100341	SNAPY	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTROLE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENHADA PLASTIFICADA, E=18 MM, 50 UTILIZAÇÕES, AF_07/2023	M²	R\$ 50,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.544,58	977,21	R\$ 50,70	R\$ 40.544,58	100%	977,21	R\$ 40.544,58	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	977,21	R\$ 40.544,58	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%			
8.0			CONCRETO ARMADO - PONTES ROTATIVAS			R\$ 802.268,30	R\$ 802.268,30	R\$ 758.455,37	R\$ 630.714,09			R\$ 630.714,09															
8.1	96508	SNAPY	CONCRETO USADO BOMBADO FCK-ESMPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ARMAÇAMENTO	M²	R\$ 802,42	R\$ 320.087,14	R\$ 320.087,14	R\$ 320.087,14	R\$ 0,00	-	R\$ 802,42	R\$ 0,00	100%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%		
8.2	92368	SNAPY	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJEL, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENHADA PLASTIFICADA, E=18 MM, AF_06/2020	M²	R\$ 50,70	R\$ 36.165,32	R\$ 36.165,32	R\$ 41.970,47	827,80	R\$ 50,70	R\$ 41.970,47	100%	808,02	R\$ 40.966,61	97,81%	-	R\$ 0,00	0,00%	808,02	R\$ 40.966,61	97,81%	19,68	R\$ 1.003,86	2,19%			
8.3	CPU-11	PROFISPA	ESCOMBAMENTO TUBULAR DESMONTAVEL PARA PONTE DO VAZIO, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	M	R\$ 74,43	R\$ 158.866,36	R\$ 161.374,66	R\$ 161.374,66	2.168,14	R\$ 74,43	R\$ 161.374,66	100%	2.168,14	R\$ 161.374,66	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2.168,14	R\$ 161.374,66	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%			
8.4	92768	SNAPY	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	R\$ 13,52	R\$ 189,28	R\$ 189,28	R\$ 202,80	R\$ 197,39	14,60	R\$ 13,52	R\$ 197,39	100%	14,60	R\$ 197,39	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	14,60	R\$ 197,39	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%		
8.5	92770	SNAPY	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	R\$ 11,87	R\$ 2.497,38	R\$ 2.497,38	R\$ 3.879,50	R\$ 3.882,61	332,70	R\$ 11,87	R\$ 3.882,61	100%	332,70	R\$ 3.882,61	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	332,70	R\$ 3.882,61	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%		
8.6	92771	SNAPY	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	R\$ 30,39	R\$ 69.997,05	R\$ 69.997,05	R\$ 63,00	612,73	59,20	R\$ 30,39	R\$ 612,73	100%	59,20	R\$ 612,73	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	59,20	R\$ 612,73	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%		
8.7	92772	SNAPY	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	R\$ 6,63	R\$ 39.887,86	R\$ 39.887,86	R\$ 50.062,63	R\$ 65.422,30	7.580,80	R\$ 6,63	R\$ 65.422,30	100%	7.580,80	R\$ 65.422,30	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	7.580,80	R\$ 65.422,30	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%		
8.8	92774	SNAPY	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	R\$ 9,76	R\$ 79.428,88	R\$ 79.428,88	R\$ 38.415,38	R\$ 54.011,84	5.534,00	R\$ 9,76	R\$ 54.011,84	100%	5.534,00	R\$ 54.011,84	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	5.534,00	R\$ 54.011,84	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%		
8.9	CPU-23	PROFISPA	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	R\$ 9,89	R\$ 76.269,99	R\$ 76.269,99	R\$ 87.320,71	R\$ 87.366,59	9.036,80	R\$ 9,89	R\$ 87.366,59	100%	9.036,80	R\$ 87.366,59	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	9.036,80	R\$ 87.366,59	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%		
8.10	102725	SNAPY	DRENAGEM, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE, AF_07/2021	UNID	R\$ 30,05	R\$ 384,64	R\$ 384,64	R\$ 384,64	12,80	R\$ 30,05	R\$ 384,64	100%	12,80	R\$ 384,64	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	12,80	R\$ 384,64	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%			
8.11	CPU-12	PROFISPA	GUARDA-CORPO EM TUBO DE FIBRO SARAIVANDIA 1"'	M	R\$ 231,68	R\$ 17.515,00	R\$ 17.515,00	R\$ 19.000,17	R\$ 15.290,88	66,00	R\$ 231,68	R\$ 15.290,88	100%	66,00	R\$ 15.290,88	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	66,00	R\$ 15.290,88	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%		
IV			ORÇAMENTO DAS 13 LATERAIS E RUAS DO ENTORNO			R\$ 9.156.180,89	R\$ 587.879,46	R\$ 556.401,92	R\$ 519.447,93			R\$ 519.447,93															
1.			LOCAÇÃO E REBENTAMENTO			R\$ 40.444,32	R\$ 39.479,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 0,00															
1.1	101852	SNAPY	REBENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO, REBENTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REFORÇAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, INCLUSIVE RETENÇÃO E COLOCAÇÃO DO MATERIAL, AF_12/2020	M²	R\$ 82,72	R\$ 37.058,56	R\$ 37.058,56	R\$ 37.058,56	R\$ 0,00	-	R\$ 82,72	R\$ 0,00	100%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%		
1.2	CPU-04	PROFISPA	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFIA E IMPLANTAÇÃO	M	R\$ 1,83	R\$ 3.365,72	R\$ 2.420,56	R\$ 2.420,56	R\$ 0,00	-	R\$ 1,83	R\$ 0,00	100%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00				

ITEM	CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	VALORES (R\$)					PREVISTO CONTRATADO				ACUMULADO ANTERIOR				REALIZADO NO PERÍODO DE 13.08.2024				ACUMULADO ATUAL				SALDO CONTRATUAL			
					UNID.	CONTRATADO	ANTERIO R\$	ANTERIO R\$	ANTERIO R\$	UNID.	PREVISTO (QUANTIDADE)	PREVISTO (VALOR R\$)	%	QUANT.	VALOR (R\$)	%	QUANT.	VALOR (R\$)	%	QUANT.	VALOR (R\$)	%	QUANT.	VALOR (R\$)	%				
3.4	100374	SNAPY	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEREO DE 100 HP	M²	R\$ 1,42	R\$ 9.800,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 1,42	R\$ 0,00	100%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
4			ATERRIO DE ABREIA				R\$ 23.409,28	R\$ 23.409,28	R\$ 23.409,28																				
4.1	100373	SNAPY	COLOCAÇÃO DE ABREIA	M²	R\$ 189,20	R\$ 48.142,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 189,20	R\$ 23.409,28	100%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	139,40	R\$ 23.409,28	100,00%	
5			ACRESCIMO E ADEAMENTO DE TUBOS				R\$ 126.772,88	R\$ 126.772,88	R\$ 126.772,88																				
5.1	92210	SNAPY	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLUTORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCA COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ADEAMENTO	M	R\$ 200,59	R\$ 126.772,88	R\$ 126.772,88	R\$ 126.772,88	R\$ 67.799,42	-	338,00	R\$ 200,59	100%	317,00	R\$ 63.187,03	93,79%	21,00	R\$ 4.712,39	6,21%	338,00	R\$ 67.799,42	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
5.2	92216	SNAPY	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLUTORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCA COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ADEAMENTO	M	R\$ 721,18	R\$ 173.085,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 721,18	R\$ 0,00	100%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
5.3	93018	SNAPY	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLUTORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCA COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ADEAMENTO	M	R\$ 1.932,09	R\$ 656.031,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.056,39	-	13,00	R\$ 1.932,09	100%	13,00	R\$ 17.056,39	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
6			CAIXAS COLUTORAS				R\$ 36.816,76	R\$ 36.816,76	R\$ 36.816,76																				
6.1	97066	SNAPY	CAIXA PARA BOTA DE LIXO DUPLEX RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 1,5X1,5 M, AF_12/2020	UNID	R\$ 1.533,09	R\$ 64.427,58	R\$ 36.816,76	R\$ 42.951,72	R\$ 42.951,72	-	28,00	R\$ 1.533,09	100%	28,00	R\$ 42.951,72	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
6.2	99290	SNAPY	BASE PARA POÇO DE VISTA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 1,5 X 1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAO AF_12/2020, PA	UNID	R\$ 4.176,09	R\$ 36.704,36	R\$ 0,00	R\$ 4.176,09	R\$ 4.176,09	-	1,00	R\$ 4.176,09	100%	1,00	R\$ 4.176,09	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
6.3	99126	SNAPY	BASE PARA POÇO DE VISTA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAO AF_12/2020, PA	UNID	R\$ 6.559,39	R\$ 42.766,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-	R\$ 6.559,39	100%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
6.4	99241	SNAPY	ACRESCIMO PARA POÇO DE VISTA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 1,5X1,5 M, 15 BLOCOS ADICIONAIS	M	R\$ 1.833,52	R\$ 2.965,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-	R\$ 1.833,52	100%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
6.5	99282	SNAPY	ACRESCIMO PARA POÇO DE VISTA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 1,5X1,5 M, 15 BLOCOS ADICIONAIS	M	R\$ 2.930,31	R\$ 9.345,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-	R\$ 2.930,31	100%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
6.6	CPU-16	PROPIRIA	POÇO DE VISTA EM CONCRETO ARMADO COM ALTURA DE ATÉ 3,50 M	UNID	R\$ 14.332,14	R\$ 14.332,14	R\$ 0,00	R\$ 14.332,14	R\$ 14.332,14	-	1,00	R\$ 14.332,14	100%	1,00	R\$ 14.332,14	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
6.7	CPU-14	PROPIRIA	POÇO DE VISTA EM CONCRETO ARMADO COM ALTURA DE ATÉ 3,50 ATÉ 5,00 M	UNID	R\$ 20.432,35	R\$ 40.865,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-	R\$ 20.432,35	100%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
6.8	CPU-15	PROPIRIA	POÇO DE VISTA EM CONCRETO ARMADO COM ALTURA DE ATÉ 5,00 ATÉ 6,00 M	UNID	R\$ 24.769,18	R\$ 24.769,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-	R\$ 24.769,18	100%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
6.9	98114	SNAPY	TAMPA CIRCULAR PARA SIFOTOS E DRENAGEM, EM FERRUGEM, DIÂMETRO INTERIO = 6,0 M	UN	R\$ 722,88	R\$ 9.397,44	R\$ 722,88	R\$ 722,88	R\$ 722,88	-	1,00	R\$ 722,88	100%	1,00	R\$ 722,88	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
7			ESCOAMENTO				R\$ 122.364,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00																				
7.1	101576	SNAPY	ESCOAMENTO DE VAZIAS TIPO DESCONTINÚO COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,50 M, LARGURA MENOR DE 1,50	M²	R\$ 38,80	R\$ 13.968,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 38,80	R\$ 0,00	100%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
7.2	101577	SNAPY	ESCOAMENTO DE VAZIAS TIPO DESCONTINÚO COM PROFUNDIDADE DE 1,50 A 3,00 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,50 E MENOR DO QUE 3,00M	M²	R\$ 50,30	R\$ 23.138,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 50,30	R\$ 0,00	100%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
7.3	101579	SNAPY	ESCOAMENTO DE VAZIAS TIPO DESCONTINÚO COM PROFUNDIDADE DE 3,00 A 1,50 M, LARGURA MAIOR DO QUE 3,00 E MENOR DO QUE 3,00M	M²	R\$ 40,08	R\$ 89.258,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 40,08	R\$ 0,00	100%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
8			REVESTIMENTO DE PAVIS				R\$ 100.392,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00																				
8.1	100323	SNAPY	ATERRIO COM AREIA COM ADEAMENTO HIDRÁULICO	M²	R\$ 189,20	R\$ 79.324,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 189,20	R\$ 0,00	100%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
8.2	93382	SNAPY	REVESTIMENTO MANUAL DE PAVIS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M²	R\$ 26,57	R\$ 100.392,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 26,57	R\$ 0,00	100%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
8.3	9054077	SNAPY	MATERIAL PARA ATERRIO RETENÇÃO EM LAJOTA	M²	R\$ 99,93	R\$ 130.833,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 99,93	R\$ 0,00	100%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
8.4	100078	SNAPY	CARGA, MANDEBIA E DESCARGA DE ABREIA, BRTA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMBIO 10 M²	M²	R\$ 6,95	R\$ 32.834,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 6,95	R\$ 0,00	100%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
8.5	93589	SNAPY	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 ML, RODOVIA PAVIMENTADA REVESTIMENTO PRIMÁRIO (CANAL)	M³/M	R\$ 2,80	R\$ 85.958,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 2,80	R\$ 0,00	100%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
8.6	93588	SNAPY	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 ML, RODOVIA LITO NATURAL (CANAL)	M³/M	R\$ 3,00	R\$ 99.180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 3,00	R\$ 0,00	100%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
9			BOTA FORA DO MATERIAL ESCAVADO				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																				
9.1	100078	SNAPY	CARGA, MANDEBIA E DESCARGA DE ABREIA, BRTA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMBIO 10 M²	M²	R\$ 6,95	R\$ 47.988,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 6,95	R\$ 0,00	100%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
9.2	93589	SNAPY	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 ML, RODOVIA PAVIMENTADA REVESTIMENTO PRIMÁRIO (CANAL)	M³/M	R\$ 2,80	R\$ 12.654,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 2,80	R\$ 0,00	100%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
9.3	93588	SNAPY	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 ML, RODOVIA LITO NATURAL (CANAL)	M³/M	R\$ 3,00	R\$ 144.935,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 3,00	R\$ 0,00	100%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
10			CANAL AL																										

ITEM	CÓDIGO	BASE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	VALORES (R\$)					PREVISTO CONTRATADO				ACUMULADO ANTERIOR			REALIZADO NO PERÍODO DE 15 DIAS ANTERIORES			ACUMULADO ATUAL			SALDO CONTRATUAL		
					UNID.	CONTRATADO	ADOTADO R\$	ADOTADO R\$	VIGENTE - ADOTADO R\$	ADOTADO R\$ (EMPRESA)	VALOR ANTERIOR	VALOR (R\$)	%	QUANT.	VALOR (R\$)	%	QUANT.	VALOR (R\$)	%	QUANT.	VALOR (R\$)	%	QUANT.	VALOR (R\$)	%
OBSERVAÇÕES:														723.206,51			DADOS DA CONTRATADA								
										(-) Retenção Contratual:				0,00			DADOS BANCÁRIOS:								
										(-) Adiantamento Contratual:				0,00			TITULAR : VIPETRO CONST E MONT Ltda								
										(-) Desconto de Alimentação:				0,00			BANCO: BANCO DAYCOVAL S/A								
										(-) Desconto de Combustível:				0,00			AGÊNCIA: 0001-9			OPERAÇÃO: N/A					
										(-) Desconto de Materiais:				0,00			CONTA: 717.005-1								
										TOTAL DOS DESCONTOS (B)				0,00			PIX: N/A								
										BASE DE CALCULO DO REIDI (A) - (B):				723.206,51			DADOS CADASTRAIS:								
										(-) Benefício do REIDI :				0,00			EMPRESA: VIPETRO CONST. E MONT. IND Ltda								
										(-) Impostos Retidos (INSS e ISS):				0,00			CNPJ: 09.080.623/0001-96								
										(-) Outros Descontos:				0,00			INSCR. ESTADUAL: 20.022.753-0								
										VALOR DA NOTA FISCAL:				723.206,51			INSCR. MUNICIPAL: 000.606-8								
										VALOR POR EXTENSO:							ENDEREÇO: Rua Vicente Fernandes n 179 Mossoro RN								
										Setecentos e vinte e três mil, duzentos e seis reais e cinquenta e um centavos.							CONTATOS: Ivan 84.9.9988.1600								



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO CANAL BODOCONGO CAMPINA GRANDE / PB



CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA	MOTIVO	MODIFICAÇÕES	RESPONSÁVEL	APROVAÇÃO
0	30/04/2026	Emissão Inicial	-	Daniel Cobe	Edenilson Bezerra

PLACAS DA OBRA



LOCAÇÃO DE CONTAINERS




4 de mai. de 2026 15:25:34
-7.243825 -35.913955
267



4 de mai. de 2026 15:25:45
-7.243846666666667 -35.913968333333333
267

PAVIMENTAÇÃO VIAS DO CANAL

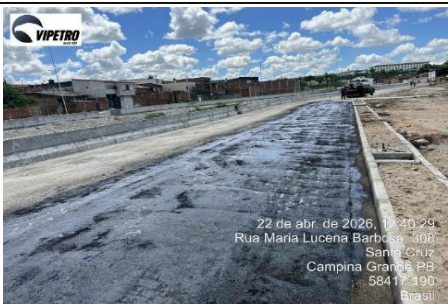

PAVIMENTAÇÃO VIAS DO CANAL




PAVIMENTAÇÃO RUAS DO ENTORNO



ILUMINAÇÃO PÚBLICA



AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBOS

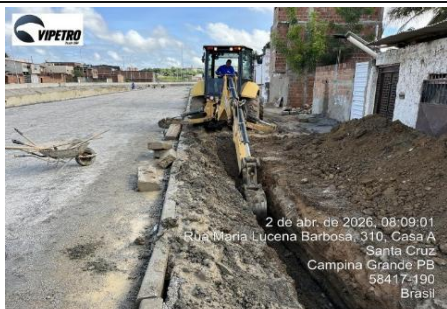



Data	Vipetro Constr. e Ind. Industriais Ltda Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5305-D-RN	Data	Fiscalização Gustavo Ulisses L. Barro Engenheiro Civil CREA 160006741-7
------	---	------	--



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ


CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	01/04/2026	476
240	475	-235				

Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RNGustavo Bissos L. Barros
Engenheiro Civil
CREA 160006741-7



Data	Contratada	Data	Fiscalização
	Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda Edenilson Pinto Bezerra		Gustavo Ulisses L. Barros Engenheiro Civil CREA 160006741-7

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	02/04/2026	477
240	476	-236				

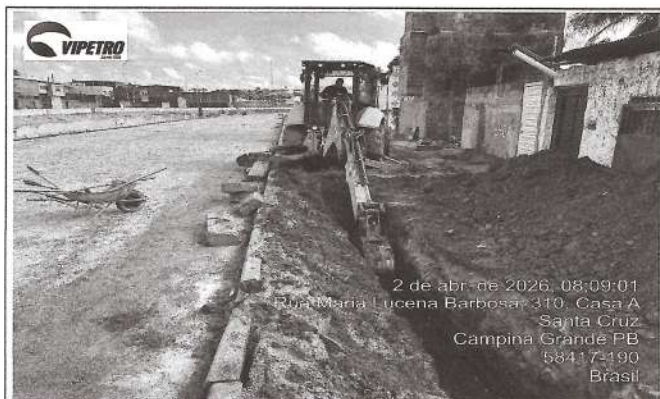

Gustavo Ulisses L. Barro.
Engenheiro Civil
CREA 160006741-7

Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN



Data	Contratada	Data	Fiscalização
	Vipetro Constr. e Mq. Industriais Ltda Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato		Gustavo B. L. - 170a



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	Nº 2.08.030/2024

RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	05/04/2026	480
240	479	-239				

QUADRO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS																						
Chuvvas/Horas	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30
Improdutivo																						
Impraticável																						

ATIVIDADES EXECUTADAS																					
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ATIVIDADES PRINCIPAIS EM EXECUTADAS:

SEM ATIVIDADES - DESCANSO SEMANAL

CONTINUAMOS NO AGUARDO DE PROVIDÊNCIAS COM RELAÇÃO AS INTERFERÊNCIAS QUE ESTÃO IMPEDINDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS CALÇADAS, CONFORME CROCI JÁ ENVIANDO NO DIA 28/04/2025.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS					
MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
Gerente de contrato	1	Encarregado de Obra Civil	2	Veículo Leve	4
Coordenador de sala técnica		Lider de Equipe	1	Retroescavadeira	1
Supervisor de Obra		Topografo (operador de GEORADAR)	1	Escavadeira Hidráulica	0
Engenheiro Civil		Apontador	1	Caminhão Munk	0
Topografo		Armador	1	Caminhão Cabinado	1
Técnico de planejamento	1	Pedreiro	6	Caminhão Caçamba	0
Técnico de Segurança	1	Carpinteiro	1	Caminhão Melosa	0
Profissional de Licenciamento		Servente	10	Caminhão Pipa	
Encarregado Administrativo	1	Operador de Betoneira	1	Carreta Munk	
Aux. Engenharia	1	Operador de Escavadeira hidráulica	1		
Aux. SMS		Operador de Retroescavadeira	0		
ASG	1	Motorista de Caçamba	0		
Eletricista	1	Motorista de Cabinada	1		
Aux. Eletricista		Motorista de Caminhão Munk			
Almoxarife		Motorista de Caminhão Comboio	1		
Aux. Almoxarife	1	Vigia Moturno	2		
Seguranca Patrimonial	2				
TOTAL (Indireto)	10	TOTAL (Direto)	29	TOTAL (Equipamentos)	6

Data	Contratada	Data	Fiscalização
	Vipetro Constr. e Montagens Industriais Ltda Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5305 D RN		Gustavo Uliasson de Azevedo Engenheiro Civil CREA 160006741-7



Data	Vipetro Constr. e M&E Industriais Ltda	Data	Fiscalização
	Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CPF: 5305 D RN		Gustavo Ulisses L. Barros Engenheiro Civil



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ





CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	06/04/2026	481
240	480	-240				



Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN

Gustavo Ulisses L. ...
Engenheiro Civil
CREA 160006741-7

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL 240	DECORRIDO 481	FALTANTE -241	12/12/2024	09/08/2025	07/04/2026	482

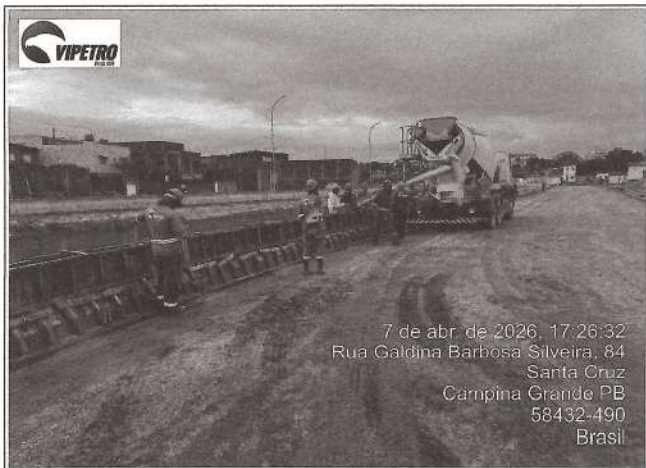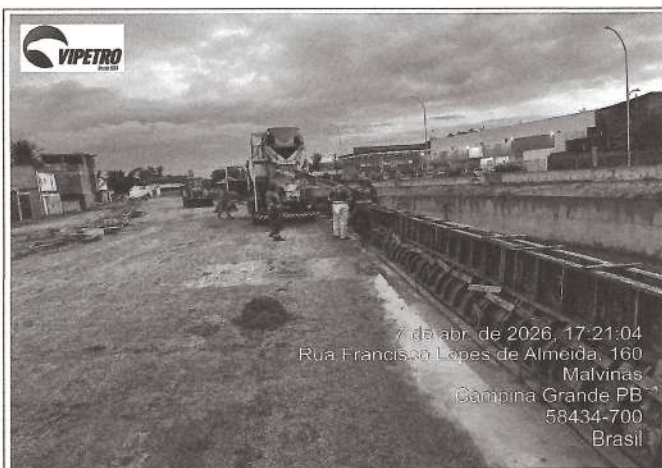

Gustavo Ulisses L. Barros
Engenheiro Civil
CREA 160006741-7

Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN



Gustavo Ulisses L. Barros
Engenheiro Civil
CREA 160006741-7



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ



CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	08/04/2026	483
240	482	-242				



Gustavo Ulisses L. Barros
Engenheiro Civil
CREA 160006741-7

Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN





RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ



CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INÍCIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	09/04/2026	484
240	483	-243				


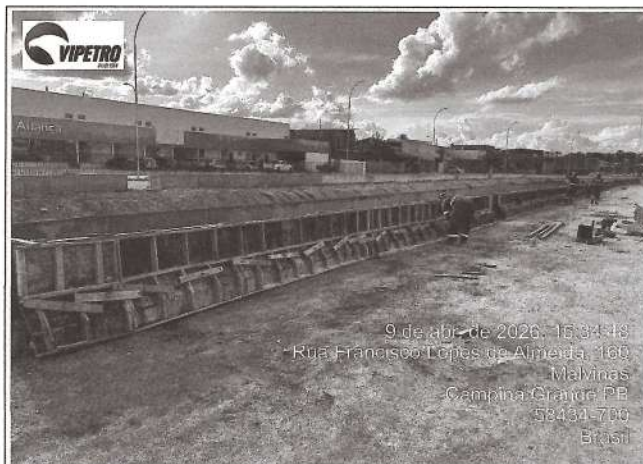
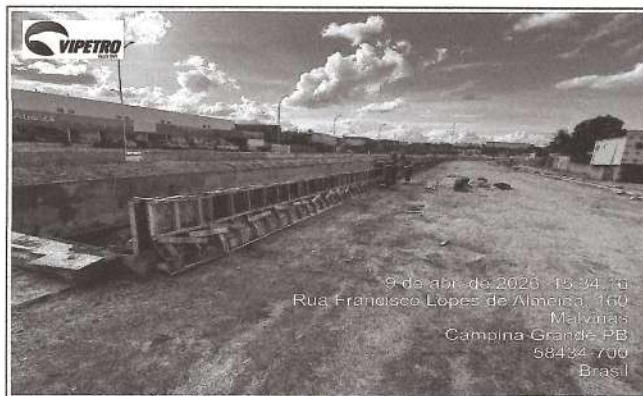


Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN

Gustavo Ulisses L. Barros
Engenheiro Civil
CREA 160006741-7



CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INÍCIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	10/04/2026	485
240	484	-244				

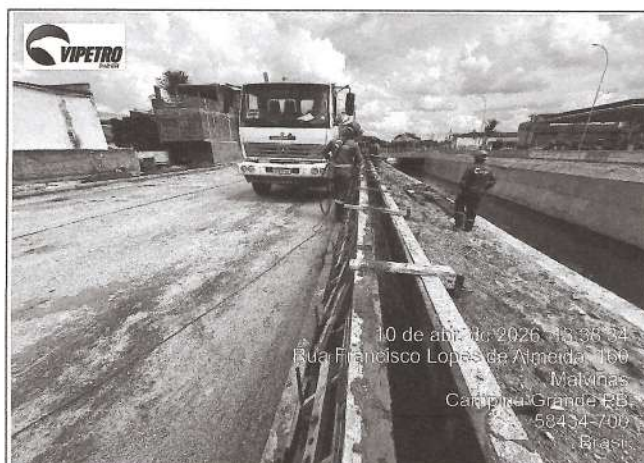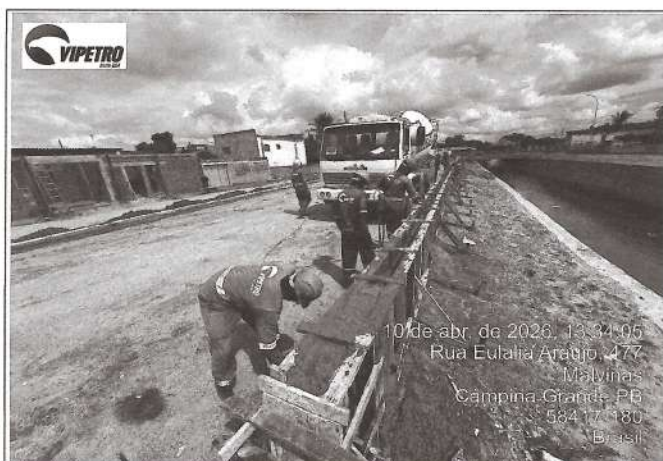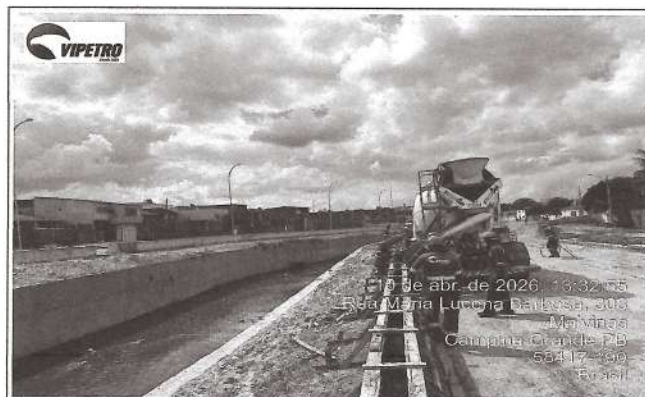

Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN

Gustavo Ulisses L. Barros
Engenheiro Civil
CREA 160006741-7



Data	Contratada	Data	Fiscalização
	Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato		Gustavo Ulisses L. Barros Engenheiro Civil CREA 180006741-7



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ



CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INÍCIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	11/04/2026	486
240	485	-245				



Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN

Gustavo Ulisses L. Barro
Engenheiro Civil
CREA 160006741-7



Data	Vipetro Constr. e Ind. Industriais Ltda	Data	Fiscalização
	 Edenílson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5305-D/RN		 Gustavo Ulisses L. Barro Engenheiro Civil



Data	Vipetro Constr. e Montagem Industriais Ltda	Data	Fiscalização
	Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5305 D RN		Gustavo Ulisses L. Barros Engenheiro Civil CREA 168006741-7



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	13/04/2026	488
240	487	-247				



Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda

Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RNGustavo Ulisses L. Barros
Engenheiro Civil
CREA 160006741-7



Data	Contratada	Data	Fiscalização
	Vipetro Constr. e Mante. Industriais Ltda Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CEP: RN		Gustavo Usses L. Barros Engenheiro Civil CREA 160606741-7



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ



CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	14/04/2026	489
240	488	-248				



Gustavo Ulisses L. Barros
Engenheiro Civil
CREA 160006741-7

Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INÍCIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	15/04/2026	490
240	489	-249				



Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN

Gustavo Ulisses L. Barros
Engenheiro Civil
CREA 160006741-7



Data	Contratada	Data	Fiscalização
	Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5305 D RN		Gustavo Ulisses L. Barros Engenheiro Civil CREA 160006741-7



Data	Contratada	Data	Fiscalização
	Vipetro Constr. e Mnt. Industriais Ltda Edenilson Pinto Bezerra		Gustavo Ulisses L. Barro Engenheiro Civil CREA 160006741-7



Data	Contratada	Data	Fiscalização
	Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda Edenilson Pinto Bezerra Contrato		Gustavo Ulisses L. Barro. Engenheiro Civil 11996741-7



Data	Contratada	Data	Fiscalização
	Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato		Gustavo Ulisses L. Barro. Engenheiro Civil CREA 456006741-7



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:		VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA																		CONTRATO		
OBRA:		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.																		Nº 2.08.030/2024		
RESUMOS DE DIAS						INÍCIO REAL - AC 1				TÉRMINO CONTRATUAL				DATA ATUAL				RDO Nº				
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE		12/12/2024				09/08/2025				20/04/2026				495						
240	494	-254																				
QUADRO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS																						
Chuvvas/Horas	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30
Improdutivo																						
Impraticável																						
ATIVIDADES EXECUTADAS																						
ATIVIDADES PRINCIPAIS EM EXECUTADAS:																						
RUAS DO ENTORNO																						
CONTINUAÇÃO DE APLICAÇÃO DE MEIO FIO CAIXA DE PASSAGENS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA																						
CONTINUAÇÃO DE EXECUÇÃO DO CALÇAMENTO DAS ENTRADAS DE RUAS DO ENTORNO: RUA SUENIA PEREIRA NEVES, RUA EULAIA ARAUJO, RUA MARIA LUCENA BARBOSA E RUA VALDOMIRO FERREIRA DA SILVA.																						
VIAS DO CANAL PRINCIPAL																						
INÍCIO DE LIMPEZA DE BASE PARA POSTERIOR APLICAÇÃO DO ASFALTO (CBUQ)																						
REGISTRO DE CHUVA, 3,2 MM. SITE OFICIAL : https://www.aesa.pb.gov.br/chuvvas/																						
CONTINUAMOS NO AGUARDO DE PROVIDÊNCIAS COM RELAÇÃO AS INTERFERÊNCIAS QUE ESTÃO IMPEDINDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS CALÇADAS, CONFORME CROCI JÁ ENVIANDO NO DIA 28/04/2025.																						
COMENTÁRIOS CONTRATADA																						
FISCALIZAÇÃO																						
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS																						
MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS																		
Gerente de contrato	1	Encarregado de Obra Civil	2	Veículo Leve	3																	
Coordenador de sala técnica		Líder de Equipe		Retroescavadeira	1																	
Supervisor de Obra		Topógrafo (operador de GEORADAR)	1	Escavadeira Hidráulica	0																	
Engenheiro Civil		Apontador	1	Caminhão Munk	0																	
Topógrafo		Armador	1	Caminhão Cabinado	1																	
Técnico de planejamento	1	Pedreiro	5	Caminhão Caçamba	0																	
Técnico de Segurança		Carpinteiro	1	Caminhão Melosa	0																	
Profissional de Licenciamento		Servente	7	Caminhão Pipa																		
Encarregado Administrativo	1	Operador de Betoneira	1	Carreta Munk																		
Aux. Engenharia	1	Operador de Escavadeira hidráulica																				
Aux. SMS		Operador de Retroescavadeira																				
ASG	1	Motorista de Caçamba																				
Eletricista	1	Motorista de Cabinada	1																			
Aux. Eletricista		Motorista de Caminhão Munk																				
Aux. Almoxarife	1	Vigia Moturno	2																			
Segurança Patrimonial	2																					
TOTAL (Indireto)	9	TOTAL (Direto)	22	TOTAL (Equipamentos)	5																	
MÃO DE OBRA INDIRETA ANCAR		MÃO DE OBRA DIRETA ANCAR		EQUIPAMENTOS ANCAR																		
Técnico de Edificações	1	Motorista	2	Vibro Acabadora	1																	
		Operador de Vibro Acabadora	1	Rolo de Pneu	1																	
		Operador de Rolo	1	Rolo Tanden	1																	
		Operador de Rolo Tanden	1	Espargidor	1																	
		Operador de Espargidor	1	Caminhão Basculante	8																	
		Motorista de Caminhão Basculante	8																			
		Mesista	1																			
		Rastalheiro	4																			
		Servente	8																			
TOTAL (Indireto)	1	TOTAL (Direto)	27	TOTAL (Equipamentos)	12																	
Data	Contratada			Data	Fiscalização																	
	Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda				Gustavo Ulisses L. Barros																	
	Edenilson Pinto Bezerra				Engenheiro Civil																	
	Gerente de Contrato				CREA 160006741-7																	
	CREA 5305 D RN																					



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:		VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA																		CONTRATO		
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.																			Nº 2.08.030/2024		
RESUMOS DE DIAS						INICIO REAL - AC 1				TÉRMINO CONTRATUAL				DATA ATUAL				RDO Nº				
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024				09/08/2025				21/04/2026				496							
240	495	-255																				
QUADRO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS																						
Chuvvas/Horas	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30
Improdutivo																						
Impraticável																						
ATIVIDADES EXECUTADAS																						
ATIVIDADES PRINCIPAIS EM EXECUTADAS:																						
RUAS DO ENTORNO																						
CONTINUAÇÃO DE APLICAÇÃO DE MEIO FIO CAIXA DE PASSAGENS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA																						
CONTINUAÇÃO DE EXECUÇÃO DO CALÇAMENTO DAS ENTRADAS DE RUAS DO ENTORNO: RUA SUENIA PEREIRA NEVES, RUA EULAIA ARAUJO, RUA MARIA LUCENA BARBOSA E RUA VALDOMIRO FERREIRA DA SILVA.																						
VIAS DO CANAL PRINCIPAL																						
CONTINUAÇÃO DE LIMPEZA DE BASE PARA POSTERIOR APLICAÇÃO DO ASFALTO (CBUQ)																						
REGISTRO DE CHUVA, 11,2 MM. SITE OFICIAL : https://www.aesa.pb.gov.br/chuvvas/																						
CONTINUAMOS NO AGUARDO DE PROVIDÊNCIAS COM RELAÇÃO AS INTERFERÊNCIAS QUE ESTÃO IMPEDINDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS CALÇADAS, CONFORME CROCI JÁ ENVIANDO NO DIA 28/04/2025.																						
COMENTÁRIOS CONTRATADA																						
FISCALIZAÇÃO																						
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS																						
MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS																		
Gerente de contrato	1	Encarregado de Obra Civil	2	Veiculo Leve	3																	
Coordenador de sala técnica		Lider de Equipe		Retroescavadeira	1																	
Supervisor de Obra		Topografo (operador de GEORADAR)	1	Escavadeira Hidráulica	0																	
Engenheiro Civil		Apontador	1	Caminhão Munk	0																	
Topografo		Armador	1	Caminhão Cabinado	1																	
Técnico de planejamento	1	Pedreiro	5	Caminhão Caçamba	0																	
Técnico de Segurança		Carpinteiro	1	Caminhão Melosa	0																	
Profissional de Licenciamento		Servente	7	Caminhão Pipa																		
Encarregado Administrativo	1	Operador de Betoneira	1	Carreta Munk																		
Aux. Engenharia	1	Operador de Escavadeira hidráulica																				
Aux. SMS		Operador de Retroescavadeira																				
ASG	1	Motorista de Caçamba																				
Eletricista	1	Motorista de Cabinada	1																			
Aux. Eletricista		Motorista de Caminhão Munk																				
Aux. Almoxarife	1	Vigia Moturno	2																			
Segurança Patrimonial	2																					
TOTAL (Indireto)	9	TOTAL (Direto)	22	TOTAL (Equipamentos)	5																	
MÃO DE OBRA INDIRETA ANCAR		MÃO DE OBRA DIRETA ANCAR		EQUIPAMENTOS ANCAR																		
Tecnico de Edificações	1	Motorista	2	Vibro Acabadora	1																	
		Operador de Vibro Acabadora	1	Rolo de Pneu	1																	
		Operador de Rolo	1	Rolo Tanden	1																	
		Operador de Rolo Tanden	1	Espargidor	1																	
		Operador de Espargidor	1	Caminhão Basculante	8																	
		Motorista de Caminhão Basculante	8																			
		Mesista	1																			
		Rastalheiro	4																			
		Servente	8																			
TOTAL (Indireto)	1	TOTAL (Direto)	27	TOTAL (Equipamentos)	12																	
Data	Contratada			Data	Fiscalização																	
	Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda				Gustavo Ulisses L. Sánc.																	
	Edenilson Pinto Bezerra				Engenheiro Civil																	
	Gerente de Contrato				CREA 160006741-7																	
	CREA 5305 D RN																					




RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ



CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	21/04/2026	496
240	495	-255				

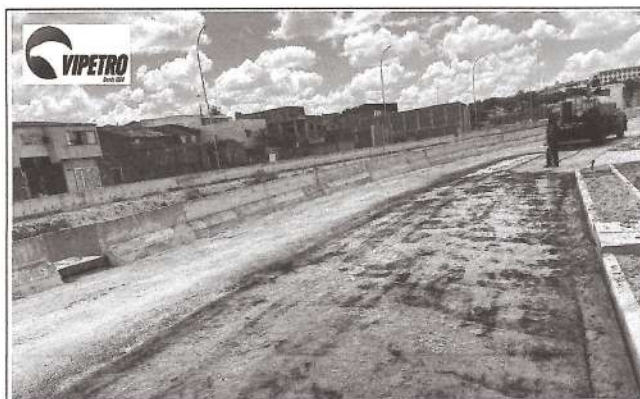

Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN

Gustavo Ulisses L. Sánc
Engenheiro Civil
CREA 160006741-7







RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:		VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA																		CONTRATO		
OBRA:		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.																		Nº 2.08.030/2024		
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1			TÉRMINO CONTRATUAL			DATA ATUAL			RDO Nº										
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024			09/08/2025			22/04/2026			497										
240	496	-256																				
QUADRO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS																						
Chuvvas/Horas	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30
Improdutivo																						
Impraticável																						
ATIVIDADES EXECUTADAS																						
ATIVIDADES PRINCIPAIS EM EXECUTADAS:																						
RUAS DO ENTORNO																						
CONTINUAÇÃO DE EXECUÇÃO DO CALÇAMENTO DAS ENTRADAS DE RUAS DO ENTORNO: RUA SUENIA PEREIRA NEVES, RUA EULAIA ARAUJO, RUA MARIA LUCENA BARBOSA E RUA VALDOMIRO FERREIRA DA SILVA.																						
VIAS DO CANAL PRINCIPAL																						
CONTINUAÇÃO DE LIMPEZA DE BASE PARA POSTERIOR APLICAÇÃO DO ASFALTO (CBUQ)																						
INICIO DE APLICAÇÃO DE CBUQ DAS VIAS DO CANAL																						
REGISTRO DE CHUVA, 1,7 MM. SITE OFICIAL : https://www.aesa.pb.gov.br/chuvas/																						
CONTINUAMOS NO AGUARDO DE PROVIDÊNCIAS COM RELAÇÃO AS INTERFERÊNCIAS QUE ESTÃO IMPEDINDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS CALÇADAS, CONFORME CROCRÍ JÁ ENVIANDO NO DIA 28/04/2025.																						
COMENTÁRIOS CONTRATADA																						
FISCALIZAÇÃO																						
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS																						
MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS																		
Gerente de contrato	1	Encarregado de Obra Civil	2	Veiculo Leve	3																	
Coordenador de sala técnica		Lider de Equipe		Retroescavadeira	1																	
Supervisor de Obra		Topografo (operador de GEORADAR)	1	Escavadeira Hidráulica	0																	
Engenheiro Civil		Apontador	1	Caminhão Munck	0																	
Topografo		Armador	1	Caminhão Cabinado	1																	
Técnico de planejamento	1	Pedreiro	5	Caminhão Caçamba	0																	
Técnico de Segurança		Carpinteiro	1	Caminhão Melosa	0																	
Profissional de Licenciamento		Servente	7	Caminhão Pipa																		
Encarregado Administrativo	1	Operador de Betoneira	1	Carreta Munck																		
Aux. Engenharia	1	Operador de Escavadeira hidráulica																				
Aux. SMS		Operador de Retroescavadeira																				
ASG	1	Motorista de Caçamba																				
Eletricista	1	Motorista de Cabinada	1																			
Aux. Eletricista		Motorista de Caminhão Munck																				
Aux. Almoxarife	1	Vigia Moturno	2																			
Segurança Patrimonial	2																					
TOTAL (Indireto)	9	TOTAL (Direto)	22	TOTAL (Equipamentos)	5																	
MÃO DE OBRA INDIRETA ANCAR		MÃO DE OBRA DIRETA ANCAR		EQUIPAMENTOS ANCAR																		
Tecnico de Edificações	1	Motorista	2	Vibro Acabadora	1																	
		Operador de Vibro Acabadora	1	Rolo de Pneu	1																	
		Operador de Rolo	1	Rolo Tanden	1																	
		Operador de Rolo Tanden	1	Espargidor	1																	
		Operador de Espargidor	1	Caminhão Basculante	8																	
		Motorista de Caminhão Basculante	8																			
		Mesista	1																			
		Rastalheiro	4																			
		Servente	8																			
TOTAL (Indireto)	1	TOTAL (Direto)	27	TOTAL (Equipamentos)	12																	
Data		Data		Data		Fiscalização																
Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda				Gustavo Ulisses L. Sarro																		
Edenilson Pinto Bezerra				Engenheiro Civil																		
Gerente de Contrato				CREA 160006741-7																		
CREA 5305 D RN																						

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	22/04/2026	497
240	496	-256				

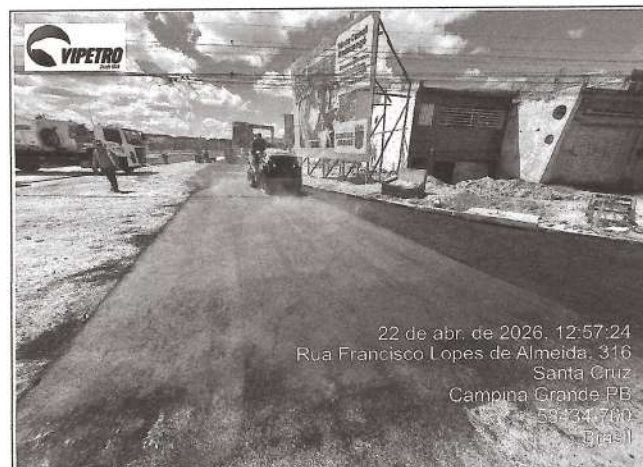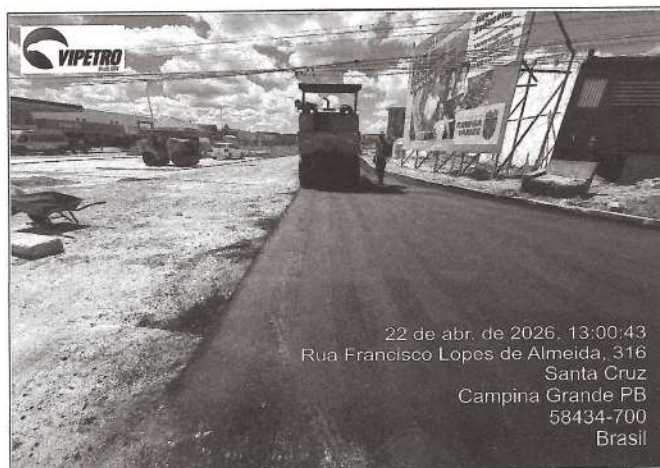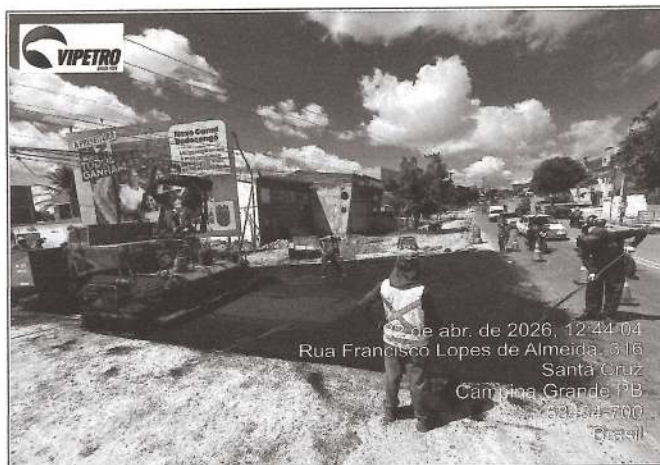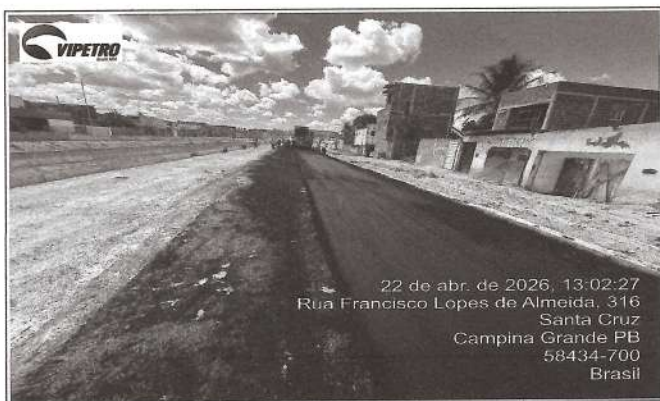

Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN

Gustavo Ulisses L. Sarro
Engenheiro Civil
CREA 160006741-7



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:		VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA																CONTRATO						
OBRA:		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.																Nº 2.08.030/2024						
RESUMOS DE DIAS			INÍCIO REAL - AC 1				TÉRMINO CONTRATUAL				DATA ATUAL				RDO Nº									
CONTRATUAL			DECORRIDO			FALTANTE			12/12/2024				09/08/2025				23/04/2026				498			
240			497			-257																		
QUADRO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS																								
Chuvadas/Horas	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30		
Improdutivo																								
Impraticável																								
ATIVIDADES EXECUTADAS																								
ATIVIDADES PRINCIPAIS EM EXECUTADAS:																								
RUAS DO ENTORNO																								
CONTINUAÇÃO DE EXECUÇÃO DO CALÇAMENTO DAS ENTRADAS DE RUAS DO ENTORNO: RUA SUENIA PEREIRA NEVES, RUA EULÁIA ARAÚJO, RUA MARIA LUCENA BARBOSA E RUA VALDOMIRO FERREIRA DA SILVA.																								
VIAS DO CANAL PRINCIPAL																								
CONTINUAÇÃO DE LIMPEZA DE BASE PARA POSTERIOR APLICAÇÃO DO ASFALTO (CBUQ)																								
CONTINUAÇÃO DE APLICAÇÃO DE CBUQ DAS VIAS DO CANAL																								
REGISTRO DE CHUVA, 1,7 MM. SITE OFICIAL : https://www.aesa.pb.gov.br/chuvas/																								
CONTINUAMOS NO AGUARDO DE PROVIDÊNCIAS COM RELAÇÃO AS INTERFERÊNCIAS QUE ESTÃO IMPEDINDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS CALÇADAS, CONFORME CROCI JÁ ENVIANDO NO DIA 28/04/2025.																								
COMENTÁRIOS CONTRATADA																								
FISCALIZAÇÃO																								
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS																								
MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS																				
Gerente de contrato	1	Encarregado de Obra Civil	2	Veículo Leve	3																			
Coordenador de sala técnica		Líder de Equipe		Retroescavadeira	1																			
Supervisor de Obra		Topógrafo (operador de GEORADAR)	1	Escavadeira Hidráulica	0																			
Engenheiro Civil		Apontador	1	Caminhão Munck	0																			
Topógrafo		Armador	1	Caminhão Cabinado	1																			
Técnico de planejamento	1	Pedreiro	5	Caminhão Caçamba	0																			
Técnico de Segurança		Carpinteiro	1	Caminhão Melosa	0																			
Profissional de Licenciamento		Servente	7	Caminhão Pipa																				
Encarregado Administrativo	1	Operador de Betoneira	1	Carreta Munck																				
Aux. Engenharia	1	Operador de Escavadeira hidráulica																						
Aux. SMS		Operador de Retroescavadeira																						
ASG		Motorista de Caçamba																						
Eletricista	1	Motorista de Cabinada	1																					
Aux. Eletricista		Motorista de Caminhão Munck																						
Aux. Almoxarife	1	Vigia Moturno	2																					
Segurança Patrimonial	2																							
TOTAL (Indireto)	9	TOTAL (Direto)	22	TOTAL (Equipamentos)	5																			
MÃO DE OBRA INDIRETA ANCAR		MÃO DE OBRA DIRETA ANCAR		EQUIPAMENTOS ANCAR																				
Técnico de Edificações	1	Motorista	2	Vibro Acabadora	1																			
		Operador de Vibro Acabadora	1	Rolo de Pneu	1																			
		Operador de Rolo	1	Rolo Tanden	1																			
		Operador de Rolo Tanden	1	Espargidor	1																			
		Operador de Espargidor	1	Caminhão Basculante	8																			
		Motorista de Caminhão Basculante	8																					
		Mesista	1																					
		Rastalheiro	4																					
		Servente	8																					
TOTAL (Indireto)	1	TOTAL (Direto)	27	TOTAL (Equipamentos)	12																			
Data		Contratada		Data		Fiscalização																		
		Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda				Gustavo Ulisses L. Bano																		
		Edenilson Pinto Bezerra				Engenheiro Civil																		
		Gerente de Contrato				CREA 160006741-7																		
		CREA 5305 D RN																						



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ



CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	23/04/2026	498
240	497	-257				



Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN

Gustavo Mises L. Barros
Engenheiro Civil
CREA 160006741-7



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:		VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA																		CONTRATO		
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.																		Nº 2.08.030/2024			
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1			TÉRMINO CONTRATUAL			DATA ATUAL			RDO Nº										
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024			09/08/2025			24/04/2026			499										
240	498	-258																				
QUADRO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS																						
Chuvvas/Horas	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30
Improdutivo																						
Impraticável																						
ATIVIDADES EXECUTADAS																						
ATIVIDADES PRINCIPAIS EM EXECUTADAS:																						
RUAS DO ENTORNO																						
CONTINUAÇÃO DE EXECUÇÃO DO CALÇAMENTO DAS ENTRADAS DE RUAS DO ENTORNO: RUA SUENIA PEREIRA NEVES, RUA EULAIA ARAUJO, RUA MARIA LUCENA BARBOSA E RUA VALDOMIRO FERREIRA DA SILVA.																						
VIAS DO CANAL PRINCIPAL																						
CONTINUAÇÃO DE LIMPEZA DE BASE PARA POSTERIOR APLICAÇÃO DO ASFALTO (CBUQ)																						
CONTINUAÇÃO DE APLICAÇÃO DE CBUQ DAS VIAS DO CANAL																						
REGISTRO DE CHUVA, 37,4 MM. SITE OFICIAL : https://www.aesa.pb.gov.br/chuvvas/																						
CONTINUAMOS NO AGUARDO DE PROVIDÊNCIAS COM RELAÇÃO AS INTERFERÊNCIAS QUE ESTÃO IMPEDINDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS CALÇADAS, CONFORME CROCRÍ JÁ ENVIANDO NO DIA 28/04/2025.																						
COMENTÁRIOS CONTRATADA																						
FISCALIZAÇÃO																						
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS																						
MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS																		
Gerente de contrato	1	Encarregado de Obra Civil	2	Veiculo Leve	3																	
Coordenador de sala técnica		Lider de Equipe		Retroescavadeira	1																	
Supervisor de Obra		Topografo (operador de GEORADAR)	1	Escavadeira Hidráulica	0																	
Engenheiro Civil		Apontador	1	Caminhão Munck	0																	
Topografo		Armador	1	Caminhão Cabinado	1																	
Técnico de planejamento	1	Pedreiro	5	Caminhão Caçamba	0																	
Técnico de Segurança		Carpinteiro	1	Caminhão Melosa	0																	
Profissional de Licenciamento		Servente	7	Caminhão Pipa																		
Encarregado Administrativo	1	Operador de Betoneira	1	Carreta Munck																		
Aux. Engenharia	1	Operador de Escavadeira hidráulica																				
Aux. SMS		Operador de Retroescavadeira																				
ASG	1	Motorista de Caçamba																				
Eletricista	1	Motorista de Cabinada	1																			
Aux. Eletricista		Motorista de Caminhão Munck																				
Aux. Almoxarife	1	Vigia Moturno	2																			
Segurança Patrimonial	2																					
TOTAL (Indireto)	9	TOTAL (Direto)	22	TOTAL (Equipamentos)	5																	
MÃO DE OBRA INDIRETA ANCAR		MÃO DE OBRA DIRETA ANCAR		EQUIPAMENTOS ANCAR																		
Tecnico de Edificações	1	Motorista	2	Vibro Acabadora	1																	
		Operador de Vibro Acabadora	1	Rolo de Pneu	1																	
		Operador de Rolo	1	Rolo Tanden	1																	
		Operador de Rolo Tanden	1	Espargidor	1																	
		Operador de Espargidor	1	Caminhão Basculante	8																	
		Motorista de Caminhão Basculante	8																			
		Mesista	1																			
		Rastalheiro	4																			
		Servente	8																			
TOTAL (Indireto)	1	TOTAL (Direto)	27	TOTAL (Equipamentos)	12																	
Data	Contratada			Data	Fiscalização																	
	Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda				Gustavo Ulisses L. Sarte																	
	Edenilson Pinto Bezerra				Engenheiro Civil																	
	Gerente de Contrato				CREA 260006741-7																	
	CREA 5305 D RN																					



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:		VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA																CONTRATO				
OBRA:		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.																Nº 2.08.030/2024				
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1				TÉRMINO CONTRATUAL				DATA ATUAL				RDO Nº							
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024				09/08/2025				25/04/2026				500							
240	499	-259																				
QUADRO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS																						
Chuvvas/Horas	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30
Improdutivo																						
Impraticável																						
ATIVIDADES EXECUTADAS																						
ATIVIDADES PRINCIPAIS EM EXECUTADAS:																						
RUAS DO ENTORNO																						
CONTINUAÇÃO DE EXECUÇÃO DO CALÇAMENTO DAS ENTRADAS DE RUAS DO ENTORNO: RUA SUENIA PEREIRA NEVES, RUA EULAIA ARAUJO, RUA MARIA LUCENA BARBOSA E RUA VALDOMIRO FERREIRA DA SILVA.																						
VIAS DO CANAL PRINCIPAL																						
CONTINUAÇÃO DE LIMPEZA DE BASE PARA POSTERIOR APLICAÇÃO DO ASFALTO (CBUQ)																						
CONTINUAÇÃO DE APLICAÇÃO DE CBUQ DAS VIAS DO CANAL																						
REGISTRO DE CHUVA, 3,6 MM. SITE OFICIAL : https://www.aesa.pb.gov.br/chuvas/																						
CONTINUAMOS NO AGUARDO DE PROVIDÊNCIAS COM RELAÇÃO AS INTERFERÊNCIAS QUE ESTÃO IMPEDINDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS CALÇADAS, CONFORME CROCRÍ JÁ ENVIANDO NO DIA 28/04/2025.																						
COMENTÁRIOS CONTRATADA																						
FISCALIZAÇÃO																						
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS																						
MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS																		
Gerente de contrato	1	Encarregado de Obra Civil	2	Veículo Leve	3																	
Coordenador de sala técnica		Líder de Equipe		Retroescavadeira	1																	
Supervisor de Obra		Topógrafo (operador de GEORADAR)	1	Escavadeira Hidráulica	0																	
Engenheiro Civil		Apontador	1	Caminhão Munck	0																	
Topógrafo		Armador	1	Caminhão Cabina	1																	
Técnico de planejamento	1	Pedreiro	5	Caminhão Caçamba	0																	
Técnico de Segurança		Carpinteiro	1	Caminhão Melosa	0																	
Profissional de Licenciamento		Servente	7	Caminhão Pipa																		
Encarregado Administrativo	1	Operador de Betoneira	1	Carreta Munck																		
Aux. Engenharia	1	Operador de Escavadeira hidráulica																				
Aux. SMS		Operador de Retroescavadeira																				
ASG	1	Motorista de Caçamba																				
Eletricista	1	Motorista de Cabina	1																			
Aux. Eletricista		Motorista de Caminhão Munck																				
Aux. Almoxarife	1	Vigia Moturno	2																			
Segurança Patrimonial	2																					
TOTAL (Indireto)	9	TOTAL (Direto)	22	TOTAL (Equipamentos)	5																	
MÃO DE OBRA INDIRETA ANCAR		MÃO DE OBRA DIRETA ANCAR		EQUIPAMENTOS ANCAR																		
Técnico de Edificações	1	Motorista	2	Vibro Acabadora	1																	
		Operador de Vibro Acabadora	1	Rolo de Pneu	1																	
		Operador de Rolo	1	Rolo Tandem	1																	
		Operador de Rolo Tandem	1	Espargidor	1																	
		Operador de Espargidor	1	Caminhão Basculante	8																	
		Motorista de Caminhão Basculante	8																			
		Mesista	1																			
		Rastilheiro	4																			
		Servente	8																			
TOTAL (Indireto)	1	TOTAL (Direto)	27	TOTAL (Equipamentos)	12																	
Data	Contratada			Data	Fiscalização																	
	Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda				Gustavo Ulisses L. Barro																	
	Edenilson Pinto Bezerra				Engenheiro Civil																	
	Gerente de Contrato				CREA 160006741-7																	
	CREA 5305 D RN																					



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:		VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA																CONTRATO				
OBRA:		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.																Nº 2.08.030/2024				
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1			TÉRMINO CONTRATUAL			DATA ATUAL			RDO Nº										
CONTRATUAL			DECORRIDO			FALTANTE			12/12/2024			09/08/2025			26/04/2026			501				
240			500			-260																
QUADRO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS																						
Chuvvas/Horas	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30
Improdutivo																						
Impraticável																						
ATIVIDADES EXECUTADAS																						
ATIVIDADES PRINCIPAIS EM EXECUTADAS:																						
DESCANSO SEMANAL - SEM ATIVIDADES																						
REGISTRO DE CHUVA, 8,2 MM. SITE OFICIAL : https://www.aesa.pb.gov.br/chuvas/																						
CONTINUAMOS NO AGUARDO DE PROVIDÊNCIAS COM RELAÇÃO AS INTERFERÊNCIAS QUE ESTÃO IMPEDINDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS CALÇADAS, CONFORME CROCRÍ JÁ ENVIANDO NO DIA 28/04/2025.																						
COMENTÁRIOS CONTRATADA																						
FISCALIZAÇÃO																						
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS																						
MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS																		
Gerente de contrato	1	Encarregado de Obra Civil	2	Veiculo Leve	3																	
Coordenador de sala técnica		Lider de Equipe		Retroescavadeira	1																	
Supervisor de Obra		Topografo (operador de GEORADAR)	1	Escavadeira Hidráulica	0																	
Engenheiro Civil		Apontador	1	Caminhão Munck	0																	
Topografo		Armador	1	Caminhão Cabinado	1																	
Técnico de planejamento	1	Pedreiro	5	Caminhão Caçamba	0																	
Técnico de Segurança		Carpinteiro	1	Caminhão Melosa	0																	
Profissional de Licenciamento		Servente	7	Caminhão Pipa																		
Encarregado Administrativo	1	Operador de Betoneira	1	Carreta Munck																		
Aux. Engenharia	1	Operador de Escavadeira hidráulica																				
Aux. SMS		Operador de Retroescavadeira																				
ASG	1	Motorista de Caçamba																				
Eletricista	1	Motorista de Cabinada	1																			
Aux. Eletricista		Motorista de Caminhão Munck																				
Aux. Almoxarife	1	Vigia Moturno	2																			
Segurança Patrimonial	2																					
TOTAL (Indireto)	9	TOTAL (Direto)	22	TOTAL (Equipamentos)	5																	
MÃO DE OBRA INDIRETA ANCAR		MÃO DE OBRA DIRETA ANCAR		EQUIPAMENTOS ANCAR																		
Tecnico de Edificações	1	Motorista	2	Vibro Acabadora	1																	
		Operador de Vibro Acabadora	1	Rolo de Pneu	1																	
		Operador de Rolo	1	Rolo Tanden	1																	
		Operador de Rolo Tanden	1	Espargidor	1																	
		Operador de Espargidor	1	Caminhão Basculante	8																	
		Motorista de Caminhão Basculante	8																			
		Mesista	1																			
		Rastalheiro	4																			
		Servente	8																			
TOTAL (Indireto)	1	TOTAL (Direto)	27	TOTAL (Equipamentos)	12																	
Data	Contratada			Data	Fiscalização																	
	Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda				Gustavo Ulisses L. Barro																	
	Edenilson Pinto Bezerra				Engenheiro Civil																	
	Gerente de Contrato				CREA 150006741-7																	
	CREA 5305 D RN																					



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:		VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA																CONTRATO				
OBRA:		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.																Nº 2.08.030/2024				
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1			TÉRMINO CONTRATUAL			DATA ATUAL			RDO Nº										
CONTRATUAL		DECORRIDO		FALTANTE		12/12/2024			09/08/2025			27/04/2026			502							
240		501		-261																		
QUADRO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS																						
Chuvvas/Horas	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30
Improdutivo																						
Impraticável																						
ATIVIDADES EXECUTADAS																						
ATIVIDADES PRINCIPAIS EM EXECUTADAS:																						
RUAS DO ENTORNO																						
CONTINUAÇÃO DE EXECUÇÃO DO CALÇAMENTO DAS ENTRADAS DE RUAS DO ENTORNO: RUA SUENIA PEREIRA NEVES, RUA EULAIA ARAUJO, RUA MARIA LUCENA BARBOSA E RUA VALDOMIRO FERREIRA DA SILVA.																						
VIAS DO CANAL PRINCIPAL																						
CONTINUAÇÃO DE LIMPEZA DE BASE PARA POSTERIOR APLICAÇÃO DO ASFALTO (CBUQ)																						
CONTINUAÇÃO DE APLICAÇÃO DE CBUQ DAS VIAS DO CANAL																						
INSTALAÇÃO DE POSTES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA LADO ESQUERDO																						
CONTINUAMOS NO AGUARDO DE PROVIDÊNCIAS COM RELAÇÃO AS INTERFERÊNCIAS QUE ESTÃO IMPEDINDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS CALÇADAS, CONFORME CROCRÍ JÁ ENVIANDO NO DIA 28/04/2025.																						
COMENTÁRIOS CONTRATADA																						
FISCALIZAÇÃO																						
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS																						
MÃO DE OBRA INDIRETA			MÃO DE OBRA DIRETA			EQUIPAMENTOS																
Gerente de contrato	1		Encarregado de Obra Civil	2		Veiculo Leve	3															
Coordenador de sala técnica			Lider de Equipe			Retroescavadeira	1															
Supervisor de Obra			Topografo (operador de GEORADAR)	1		Escavadeira Hidráulica	0															
Engenheiro Civil			Apontador	1		Caminhão Munck	0															
Topografo			Armador	1		Caminhão Cabinado	1															
Técnico de planejamento	1		Pedreiro	5		Caminhão Caçamba	0															
Técnico de Segurança			Carpinteiro	1		Caminhão Melosa	0															
Profissional de Licenciamento			Servente	7		Caminhão Pipa																
Encarregado Administrativo	1		Operador de Betoneira	1		Carreta Munck																
Aux. Engenharia	1		Operador de Escavadeira hidráulica																			
Aux. SMS			Operador de Retroescavadeira																			
ASG	1		Motorista de Caçamba																			
Eletricista	1		Motorista de Cabinada	1																		
Aux. Eletricista			Motorista de Caminhão Munck																			
Aux. Almoxarife	1		Vigia Moturno	2																		
Segurança Patrimonial	2																					
TOTAL (Indireto)		9	TOTAL (Direto)		22	TOTAL (Equipamentos)		5														
MÃO DE OBRA INDIRETA ANCAR			MÃO DE OBRA DIRETA ANCAR			EQUIPAMENTOS ANCAR																
Tecnico de Edificações	1		Motorista	2		Vibro Acabadora	1															
			Operador de Vibro Acabadora	1		Rolo de Pneu	1															
			Operador de Rolo	1		Rolo Tanden	1															
			Operador de Rolo Tanden	1		Espargidor	1															
			Operador de Espargidor	1		Caminhão Basculante	8															
			Motorista de Caminhão Basculante	8																		
			Mesista	1																		
			Rastalheiro	4																		
			Servente	8																		
TOTAL (Indireto)		1	TOTAL (Direto)		27	TOTAL (Equipamentos)		12														
Data		Contratada				Data		Fiscalização														
		Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda						Gustavo Ulisses L. Barros														
		Edenilson Pinto Bezerra						Engenheiro Civil														
		Gerente de Contrato						CREA 160006741-7														
		CREA 5305 D RN																				



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ



CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA				CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.				Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	27/04/2026
240	501	-261			502



Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN

Gustavo Ulisses L. Barros
Engenheiro Civil
CREA 160006741-7



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA																		CONTRATO			
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.																		Nº 2.08.030/2024			
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1			TÉRMINO CONTRATUAL			DATA ATUAL			RDO Nº										
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024			09/08/2025			28/04/2026			503										
240	502	-262																				
QUADRO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS																						
Chuvvas/Horas	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30
Improdutivo																						
Impraticável																						
ATIVIDADES EXECUTADAS																						
ATIVIDADES PRINCIPAIS EM EXECUTADAS:																						
RUAS DO ENTORNO																						
CONTINUAÇÃO DE EXECUÇÃO DO CALÇAMENTO DAS ENTRADAS DE RUAS DO ENTORNO: RUA SUENIA PEREIRA NEVES, RUA EULAIA ARAUJO, RUA MARIA LUCENA BARBOSA E RUA VALDOMIRO FERREIRA DA SILVA.																						
VIAS DO CANAL PRINCIPAL																						
CONTINUAÇÃO DE LIMPEZA DE BASE PARA POSTERIOR APLICAÇÃO DO ASFALTO (CBUQ)																						
CONTINUAÇÃO DE APLICAÇÃO DE CBUQ DAS VIAS DO CANAL																						
INICIO DE APLICAÇÃO DE CABOS DE COBRE DA ILUMINAÇÃO PUBLICA LADO ESQUERDO																						
REGISTRO DE CHUVA, 29,2 MM. SITE OFICIAL : https://www.aesa.pb.gov.br/chuvas/																						
CONTINUAMOS NO AGUARDO DE PROVIDÊNCIAS COM RELAÇÃO AS INTERFERÊNCIAS QUE ESTÃO IMPEDINDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS CALÇADAS, CONFORME CROCRÍ JÁ ENVIANDO NO DIA 28/04/2025.																						
COMENTÁRIOS CONTRATADA																						
FISCALIZAÇÃO																						
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS																						
MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS																		
Gerente de contrato	1	Encarregado de Obra Civil	2	Veiculo Leve	3																	
Coordenador de sala técnica		Lider de Equipe		Retroescavadeira	1																	
Supervisor de Obra		Topografo (operador de GEORADAR)	1	Escavadeira Hidráulica	0																	
Engenheiro Civil		Apontador	1	Caminhão Munck	0																	
Topografo		Armador	1	Caminhão Cabinado	1																	
Técnico de planejamento	1	Pedreiro	5	Caminhão Caçamba	0																	
Técnico de Segurança		Carpinteiro	1	Caminhão Melosa	0																	
Profissional de Licenciamento		Servente	7	Caminhão Pipa																		
Encarregado Administrativo	1	Operador de Betoneira	1	Carreta Munck																		
Aux. Engenharia	1	Operador de Escavadeira hidráulica																				
Aux. SMS		Operador de Retroescavadeira																				
ASG	1	Motorista de Caçamba																				
Eletricista	1	Motorista de Cabinada	1																			
Aux. Eletricista		Motorista de Caminhão Munck																				
Aux. Almoxarife	1	Vigia Moturno	2																			
Segurança Patrimonial	2																					
TOTAL (Indireto)	9	TOTAL (Direto)	22	TOTAL (Equipamentos)	5																	
MÃO DE OBRA INDIRETA ANCAR		MÃO DE OBRA DIRETA ANCAR		EQUIPAMENTOS ANCAR																		
Tecnico de Edificações	1	Motorista	2	Vibro Acabadora	1																	
		Operador de Vibro Acabadora	1	Rolo de Pneu	1																	
		Operador de Rolo	1	Rolo Tanden	1																	
		Operador de Rolo Tanden	1	Espargidor	1																	
		Operador de Espargidor	1	Caminhão Basculante	8																	
		Motorista de Caminhão Basculante	8																			
		Mesista	1																			
		Rastalheiro	4																			
		Servente	8																			
TOTAL (Indireto)	1	TOTAL (Direto)	27	TOTAL (Equipamentos)	12																	
Data		Contratada		Data		Fiscalização																
		Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda				Gustavo Ulisses L. Baril																
		Edenilson Pinto Bezerra				Engenheiro Civil																
		Gerente de Contrato				CREA 160066741-7																
		CREA 5305 D RN																				



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA																			CONTRATO		
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES,PASSARELAS,CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.																			Nº 2.08.030/2024		
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1			TÉRMINO CONTRATUAL			DATA ATUAL			RDO Nº										
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024			09/08/2025			29/04/2026			504										
240	503	-263																				
QUADRO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS																						
Chuvvas/Horas	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30
Improdutivo																						
Impraticável																						
ATIVIDADES EXECUTADAS																						
ATIVIDADES PRINCIPAIS EM EXECUTADAS:																						
RUAS DO ENTORNO																						
CONTINUAÇÃO DE EXECUÇÃO DO CALÇAMENTO DAS ENTRADAS DE RUAS DO ENTORNO: RUA SUENIA PEREIRA NEVES, RUA EULAIA ARAUJO, RUA MARIA LUCENA BARBOSA E RUA VALDOMIRO FERREIRA DA SILVA.																						
VIAS DO CANAL PRINCIPAL																						
CONTINUAÇÃO DE LIMPEZA DE BASE PARA POSTERIOR APLICAÇÃO DO ASFALTO (CBUQ)																						
CONTINUAÇÃO DE APLICAÇÃO DE CBUQ DAS VIAS DO CANAL																						
REGISTRO DE CHUVA, 19,5 MM. SITE OFICIAL : https://www.aesa.pb.gov.br/chuvvas/																						
CONTINUAMOS NO AGUARDO DE PROVIDÊNCIAS COM RELAÇÃO AS INTERFERÊNCIAS QUE ESTÃO IMPEDINDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS CALÇADAS, CONFORME CROCI JÁ ENVIANDO NO DIA 28/04/2025.																						
COMENTÁRIOS CONTRATADA																						
FISCALIZAÇÃO																						
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS																						
MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS																		
Gerente de contrato	1	Encarregado de Obra Civil	2	Veiculo Leve	3																	
Coordenador de sala técnica		Lider de Equipe		Retroescavadeira	1																	
Supervisor de Obra		Topografo (operador de GEORADAR)	1	Escavadeira Hidráulica	0																	
Engenheiro Civil		Apontador	1	Caminhão Munck	0																	
Topografo		Armador	1	Caminhão Cabinado	1																	
Técnico de planejamento	1	Pedreiro	5	Caminhão Caçamba	0																	
Técnico de Segurança		Carpinteiro	1	Caminhão Melosa	0																	
Profissional de Licenciamento		Servente	7	Caminhão Pipa																		
Encarregado Administrativo	1	Operador de Betoneira	1	Carreta Munck																		
Aux. Engenharia	1	Operador de Escavadeira hidráulica																				
Aux. SMS		Operador de Retroescavadeira																				
ASG	1	Motorista de Caçamba																				
Eletricista	1	Motorista de Cabinada	1																			
Aux. Eletricista		Motorista de Caminhão Munck																				
Aux. Almoxarife	1	Vigia Moturno	2																			
Segurança Patrimonial	2																					
TOTAL (Indireto)	9	TOTAL (Direto)	22	TOTAL (Equipamentos)	5																	
MÃO DE OBRA INDIRETA ANCAR		MÃO DE OBRA DIRETA ANCAR		EQUIPAMENTOS ANCAR																		
Tecnico de Edificações	1	Motorista	2	Vibro Acabadora	1																	
		Operador de Vibro Acabadora	1	Rolo de Pneu	1																	
		Operador de Rolo	1	Rolo Tanden	1																	
		Operador de Rolo Tanden	1	Espargidor	1																	
		Operador de Espargidor	1	Caminhão Basculante	8																	
		Motorista de Caminhão Basculante	8																			
		Mesista	1																			
		Rastalheiro	4																			
		Servente	8																			
TOTAL (Indireto)	1	TOTAL (Direto)	27	TOTAL (Equipamentos)	12																	
Data		Contratada		Data		Fiscalização																
		Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda				Gustavo Ulisses L. Barros																
		Edenilson Pinto Bezerra				Engenheiro Civil																
		Gerente de Contrato				CREA 160006741-7																
		CREA 5305 D RN																				



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA		CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		Nº 2.08.030/2024

RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	30/04/2026	505
240	504	-264				

QUADRO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS																				
Chuvvas/Horas	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30
Improdutivo																				
Impraticável																				

ATIVIDADES EXECUTADAS

ATIVIDADES PRINCIPAIS EM EXECUTADAS:

RUAS DO ENTORNO

CONTINUAÇÃO DE EXECUÇÃO DO CALÇAMENTO DAS ENTRADAS DE RUAS DO ENTORNO: RUA SUENIA PEREIRA NEVES, RUA EULAIA ARAUJO, RUA MARIA LUCENA BARBOSA E RUA VALDOMIRO FERREIRA DA SILVA.

VIAS DO CANAL PRINCIPAL

CONTINUAÇÃO DE LIMPEZA DE BASE PARA POSTERIOR APLICAÇÃO DO ASFALTO (CBUQ)

CONTINUAÇÃO DE APLICAÇÃO DE CBUQ DAS VIAS DO CANAL

CONTINUAMOS NO AGUARDO DE PROVIDÊNCIAS COM RELAÇÃO AS INTERFERÊNCIAS QUE ESTÃO IMPEDINDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS CALÇADAS, CONFORME CROCRÍ JÁ ENVIANDO NO DIA 28/04/2025.

COMENTÁRIOS CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
Gerente de contrato	1	Encarregado de Obra Civil	2	Veículo Leve	3
Coordenador de sala técnica		Líder de Equipe		Retroescavadeira	1
Supervisor de Obra		Topógrafo (operador de GEORADAR)	1	Escavadeira Hidráulica	0
Engenheiro Civil		Apontador	1	Caminhão Munk	0
Topógrafo		Armador	1	Caminhão Cabinado	1
Técnico de planejamento	1	Pedreiro	5	Caminhão Caçamba	0
Técnico de Segurança		Carpinteiro	1	Caminhão Melosa	0
Profissional de Licenciamento		Servente	7	Caminhão Pipa	
Encarregado Administrativo	1	Operador de Betoneira	1	Carreta Munk	
Aux. Engenharia	1	Operador de Escavadeira hidráulica			
Aux. SMS		Operador de Retroescavadeira			
ASG	1	Motorista de Caçamba			
Eletricista	1	Motorista de Cabinado	1		
Aux. Eletricista		Motorista de Caminhão Munk			
Aux. Almoxarife	1	Vigia Moturno	2		
Segurança Patrimonial	2				
TOTAL (Indireto)	9	TOTAL (Direto)	22	TOTAL (Equipamentos)	5
MÃO DE OBRA INDIRETA ANCAR		MÃO DE OBRA DIRETA ANCAR		EQUIPAMENTOS ANCAR	
Tecnico de Edificações	1	Motorista	2	Vibro Acabadora	1
		Operador de Vibro Acabadora	1	Rolo de Pneu	1
		Operador de Rolo	1	Rolo Tanden	1
		Operador de Rolo Tanden	1	Espargidor	1
		Operador de Espargidor	1	Caminhão Basculante	8
		Motorista de Caminhão Basculante	8		
		Mesista	1		
		Rastalheiro	4		
		Servente	8		
TOTAL (Indireto)	1	TOTAL (Direto)	27	TOTAL (Equipamentos)	12

Data	Contratada	Data	Fiscalização
	Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda		Gustavo Ulisses L. Barros
	Ederaldo Bezerra		Engenheiro Civil
	CREA 355 D RN		CREA 160006741-7
