



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	Nº 2.08.030/2024

RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	01/09/2025	264
240	263	-23				

QUADRO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS																		
Chuvas/Horas	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
Improdutivo																		
Impraticável																		

ATIVIDADES EXECUTADAS

ATIVIDADES PRINCIPAIS EM EXECUTADAS:

CANAL PRINCIPAL E VIAS DO CANAL

DESFORMA E REAPLICAÇÃO DE FORMA PARA CONCRETAGEM DA PAREDE CANAL

APLICAÇÃO DE REBOCO DE REVESTIMENTO DA PAREDE DO CANAL

CALÇADA/CICLOVIA

CORTE DAS CALÇADAS

PONTE ROTATORIA

DESFORMA E REAPLICAÇÃO DE FORMA BLOCO DA FUNDAÇÃO LADO ESQUERDO.

PONTE DA ROTATORIA : RECEBIDO O PROJETO PARCIAL NO DIA DE HOJE.

DEVIDO CHUVAS NO FINAL DE SEMANA, TIVEMOS AS ATIVIDADES PRINCIPAIS DE RECOBO COM RITMO LENTO, OCASIONANDO NOVAMENTE PERDA DE PRODUTIVIDADE.

PONTE ESTACA 45+15: APÓS ESTUDO DA ATECEL VERIFICOU-SE QUE NÃO TEMOS NESTE LOCAL SOLO COM CAPACIDADE DE SUPORTE PARA RECEBER O BLOCO ESTRUTURAL DA FUNDAÇÃO, VERIFICOU-SE TAMBÉM QUE A PRESENÇA DE ÁGUA AFLORANDO. SOLICITAMOS A FISCALIZAÇÃO ORIENTAÇÃO SOBRE COMO PROCEDER. NOSSA FRENTE DE SERVIÇO SE ENCONTRA PARALISADA DESDE DO DIA 23/07/2025.

CONTINUAMOS NO AGUARDANDO DE PROVIDÊNCIAS COM RELAÇÃO AS INTERFERÊNCIAS QUE ESTÃO IMPEDINDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS CALÇADAS, CONFORME CROCI JÁ ENVIANDO NO DIA 28/04.

REITEIRAMOS QUE, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, OS REPAROS NO EMISSÁRIO DA CAGEPA NÃO FORAM REALIZADOS, RESULTANDO NA MANUTENÇÃO DE UM VOLUME CONSIDERÁVEL DE ESGOTO CORRENDO A CÉU ABERTO, JUSTAMENTE AO LADO DA PAREDE DO CANAL QUE SE ENCONTRA EM FASE DE EXECUÇÃO. ESSA SITUAÇÃO TEM CAUSADO SÉRIOS TRANSTORNOS À CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS, ALÉM DE GERAR IMPACTOS NEGATIVOS À POPULAÇÃO DO ENTORNO, QUE CONVIVE COM OS EFEITOS DIRETOS DA EXPOSIÇÃO AO ESGOTO NÃO CONTIDO.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
Gerente de contrato	1	Encarregado de Obra Civil	4	Veículo Leve	5
Coordenador de sala técnica	1	Líder de Equipe	2	Retroescavadeira	2
Supervisor de Obra	1	Topógrafo (operador de GEORADAR)	1	Escavadeira Hidráulica	1
Engenheiro Civil	1	Apontador	2	Caminhão Munck	0
Topógrafo		Armador	3	Caminhão Cabinado	2
Técnico de planejamento	1	Pedreiro	15	Caminhão caçamba	1
Técnico de Segurança	1	Carpinteiro	7	Caminhão Melosa	1
Profissional de Licenciamento		Servente	24	Caminhão Pipa	1
Encarregado Administrativo	1	Operador de Escavadeira hidráulica	2	Carreta Munck	
Aux. Engenharia	1	Operador de Retroescavadeira	1		
Aux. SMS	1	Motorista de Caçamba	1		
ASG	2	Motorista de Cabinado	2		
Eletricista	1	Motorista de Caminhão Munck	0		
Aux. Eletricista		Motorista de Caminhão Comboio	1		
Almoxarife		Vigia Moturno	2		
Aux. Almoxarife	1				
Segurança Patrimonial	2				
TOTAL (Indireto)	15	TOTAL (Direto)	67	TOTAL (Equipamentos)	13

COMENTÁRIOS CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

Data	Contratada	Data	Fiscalização
	Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5305 D RN		Matheus Nascimento Tomaz Engenheiro Civil CREA-PB 1422307640 Matrícula 30994 SEC 08/PACG




RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÔ

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÔ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INÍCIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	01/09/2025	264
240	263	-23				

ANEXOS:

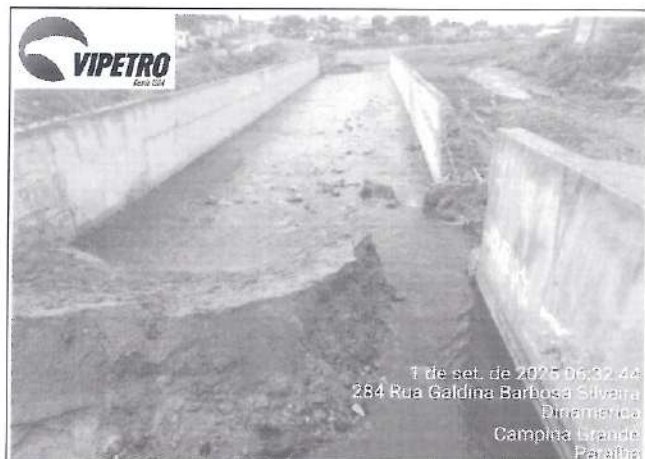

Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN

Matheus Nascimento Tomaz
Engenheiro Civil
CREA-PB 162207648
Matrícula: 30894
SECOB/PMCG



Matheus Nascimento Tomaz
Engenheiro Civil
CREA-AB 1022307640
Matrícula 30994
SECOR/PMCG

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INÍCIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	02/09/2025	265
240	264	-24				

ANEXOS:



Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN

Matheus Nascimento Tomaz
Engenheiro Civil
CREA-PB 1622307640
Matrícula 30992
SECOB/PMCG



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENACÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORES DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	Nº 2.08.030/2024

RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	03/09/2025	265
240	265	-25				

QUADRO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS																				
Chuvvas/Horas	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30
Improdutivo																				
Impraticável																				

ATIVIDADES EXECUTADAS

ATIVIDADES PRINCIPAIS EM EXECUTADAS:

CANAL PRINCIPAL E VIAS DO CANAL

DESFORMA E REAPLICAÇÃO DE FORMA PARA CONCRETAGEM DA PAREDE CANAL

APLICAÇÃO DE REBOCO DE REVESTIMENTO DA PAREDE DO CANAL

CALÇADAS/CICLOVIAS

ACABAMENTO, LIMPEZA.

PONTE ROTATORIA

APLICAÇÃO DE FORMA BLOCO DA FUNDAÇÃO LADO ESQUERDO PARA CONCRETAGEM.

DEVIDO A CHUVA, PARTE DAS ATIVIDADES TIVERAM SEU RITMO LENTO. REGISTRO DE 4,4 MM DE ACORDO COM O SITE DO INMETRO - <https://tempo.inmet.gov.br/TabelaEstacoes/A001>

PONTE DA ROTATORIA : 100% DOS PROJETOS ENTREGUES.

PONTE ESTACA 45+15: APÓS ESTUDO DA ATECEL VERIFICOU-SE QUE NÃO TEMOS NESTE LOCAL SOLO COM CAPACIDADE DE SUPORTE PARA RECEBER O BLOCO ESTRUTURAL DA FUNDAÇÃO, VERIFICOU-SE TAMBÉM QUE A PRESENÇA DE ÁGUA AFLORANDO. SOLICITAMOS A FISCALIZAÇÃO ORIENTAÇÃO SOBRE COMO PROCEDER. NOSSA FRENTE DE SERVIÇO SE ENCONTRA PARALISADA DESDE DO DIA 23/07/2025.

CONTINUAMOS NO AGUARDANDO DE PROVIDÊNCIAS COM RELAÇÃO AS INTERFERÊNCIAS QUE ESTÃO IMPEDINDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS CALÇADAS, CONFORME CROCI JÁ ENVIANDO NO DIA 28/04.

REITEIRAMOS QUE, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, OS REPAROS NO EMISSÁRIO DA CAGEPA NÃO FORAM REALIZADOS, RESULTANDO NA MANUTENÇÃO DE UM VOLUME CONSIDERÁVEL DE ESGOTO CORRENDO A CÉU ABERTO, JUSTAMENTE AO LADO DA PAREDE DO CANAL QUE SE ENCONTRA EM FASE DE EXECUÇÃO. ESSA SITUAÇÃO TEM CAUSADO SÉRIOS TRANSTORNOS À CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS, ALÉM DE GERAR IMPACTOS NEGATIVOS À POPULAÇÃO DO ENTORNO, QUE CONVIVE COM OS EFEITOS DIRETOS DA EXPOSIÇÃO AO ESGOTO NÃO CONTIDO.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
Gerente de contrato	1	Encarregado de Obra Civil	4	Veículo Leve	5
Coordenador de sala técnica	1	Lider de Equipe	2	Retroescavadeira	2
Supervisor de Obra	1	Topógrafo (operador de GEORADAR)	1	Escavadeira Hidráulica	1
Engenheiro Civil	1	Apontador	2	Caminhão Munck	0
Topógrafo		Armador	3	Caminhão Cabinado	2
Técnico de planejamento	1	Pedreiro	15	Caminhão caçamba	1
Técnico de Segurança	1	Carpinteiro	7	Caminhão Melosa	1
Profissional de Licenciamento		Servente	24	Caminhão Pipa	1
Encarregado Administrativo	1	Operador de Escavadeira hidráulica	2	Carreta Munck	
Aux. Engenharia	1	Operador de Retroescavadeira	1		
Aux. SMS	1	Motorista de Caçamba	1		
ASG	2	Motorista de Cabinado	2		
Eletricista	1	Motorista de Caminhão Munck	0		
Aux. Eletricista		Motorista de Caminhão Comboio	1		
Almoxarife		Vigia Moturno	2		
Aux. Almoxarife	1				
Segurança Patrimonial	2				
TOTAL (Indireto)	15	TOTAL (Direto)	67	TOTAL (Equipamentos)	13

COMENTARIOS CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

Data	Contratada	Data	Fiscalização
	Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda		Matheus Nascimento, Iomaz

Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RNEngenheiro Civil
CREA-PB 1022307640
Matrícula 50994
SECOB/PMCG




RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INÍCIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	03/09/2025	266
240	265	-25				

ANEXOS:

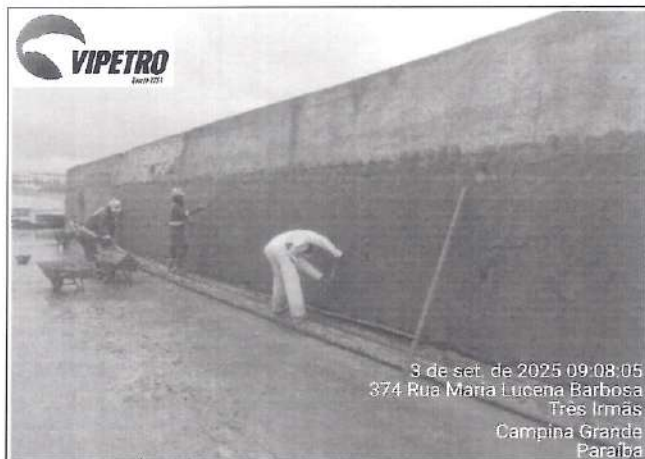

Matheus Nascimento Tomaz
Engenheiro Civil
CREA-RB 1622307640
Matrícula 30994
SECOB/PMCG

Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORES DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	Nº 2.08.030/2024

RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	04/09/2025	267
240	266	-26				

QUADRO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS																				
Chuvvas/Horas	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30
Improdutivo																				
Impraticável																				

ATIVIDADES EXECUTADAS

ATIVIDADES PRINCIPAIS EM EXECUTADAS:

CANAL PRINCIPAL E VIAS DO CANAL

APLICAÇÃO DE REBOCO DE REVESTIMENTO DA PAREDE DO CANAL

TIVEMOS NOSSAS ATIVIDADES REDUZIDAS DEVIDO AS CHUVAS ACUMULADAS DA SEMANA. NO FINAL DO DIA, TIVEMOS PELA SEGUNDA VEZ NA SEMANA, O ROMPIMENTO DAS BARREIRAS DE CONTENÇÃO DO CANAL QUE INVADIRAM O LOCAL DAS NOSSAS ATIVIDADES PRINCIPAIS. CHUVAS REGISTRADAS DE 12MM DE ACORDO COM SITE DO INMETRO- <https://tempo.inmet.gov.br/TabelaEstacoes/A001>.

PONTE ESTACA 45+15: APÓS ESTUDO DA ATECEL VERIFICOU-SE QUE NÃO TEMOS NESTE LOCAL SOLO COM CAPACIDADE DE SUPORTE PARA RECEBER O BLOCO ESTRUTURAL DA FUNDAÇÃO, VERIFICOU-SE TAMBÉM QUE A PRESENÇA DE ÁGUA AFLORANDO. SOLICITAMOS A FISCALIZAÇÃO ORIENTAÇÃO SOBRE COMO PROCEDER. NOSSA FRENTE DE SERVIÇO SE ENCONTRA PARALISADA DESDE DO DIA 23/07/2025.

CONTINUAMOS NO AGUARDANDO DE PROVIDÊNCIAS COM RELAÇÃO AS INTERFERÊNCIAS QUE ESTÃO IMPEDINDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS CALÇADAS, CONFORME CROCI JÁ ENVIANDO NO DIA 28/04.

REITEIRAMOS QUE, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, OS REPAROS NO EMISSÁRIO DA CAGEPA NÃO FORAM REALIZADOS, RESULTANDO NA MANUTENÇÃO DE UM VOLUME CONSIDERÁVEL DE ESGOTO CORRENDO A CÉU ABERTO, JUSTAMENTE AO LADO DA PAREDE DO CANAL QUE SE ENCONTRA EM FASE DE EXECUÇÃO. ESSA SITUAÇÃO TEM CAUSADO SÉRIOS TRANSTORNOS À CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS, ALÉM DE GERAR IMPACTOS NEGATIVOS À POPULAÇÃO DO ENTORNO, QUE CONVIVE COM OS EFEITOS DIRETOS DA EXPOSIÇÃO AO ESGOTO NÃO CONTIDO.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
Gerente de contrato	1	Encarregado de Obra Civil	4	Veículo Leve	5
Coordenador de sala técnica	1	Lider de Equipe	2	Retroescavadeira	2
Supervisor de Obra	1	Topógrafo (operador de GEORADAR)	1	Escavadeira Hidráulica	1
Engenheiro Civil	1	Apontador	2	Caminhão Munc	0
Topógrafo		Armador	3	Caminhão Cabinado	2
Técnico de planejamento	1	Pedreiro	15	Caminhão caçamba	1
Técnico de Segurança	1	Carpinteiro	7	Caminhão Miolo	1
Profissional de Licenciamento		Servente	24	Caminhão Pipa	1
Encarregado Administrativo	1	Operador de Escavadeira hidráulica	2	Carreta Munc	
Aux. Engenharia	1	Operador de Retroescavadeira	1		
Aux. SMS	1	Motorista de Caçamba	1		
ASG	2	Motorista de Cabinado	2		
Eletricista	1	Motorista de Caminhão Munc	0		
Aux. Eletricista		Motorista de Caminhão Comboio	1		
Almoxarife		Vigia Moturno	2		
Aux. Almoxarife	1				
Segurança Patrimonial	2				
TOTAL (Indireto)	15	TOTAL (Direto)	67	TOTAL (Equipamentos)	13


COMENTÁRIOS CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

Data		Data	Fiscalização
	 Ednilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5305-D RN		 Matheus Nascimento Tomaz Engenheiro Civil CREA-PE 1622307640 Matrícula: 30994 SECOB/PMCG

CONTRATADA:		VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA				CONTRATO	
OBRA:		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES,PASSARELAS,CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.				Nº 2.08.030/2024	
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº	
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	04/09/2025	267	
240	266	-26					

ANEXOS:

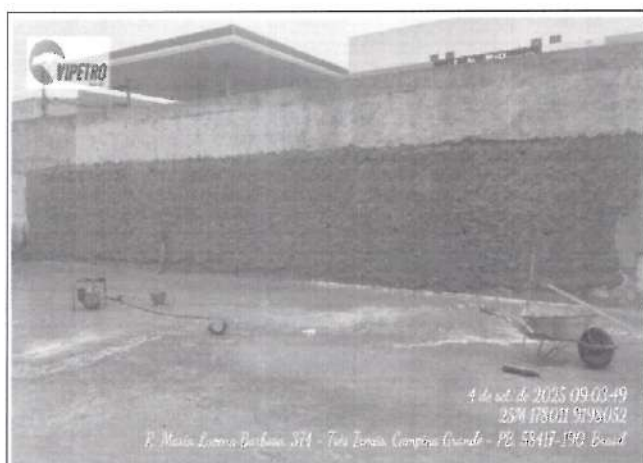

Matheus Nascimento Tomaz
Engenheiro Civil
CREA-PB 622307640
Matrícula: 30994
SECOB/PMCG

Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:		VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA																CONTRATO				
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.																Nº 2.08.030/2024					
RESUMOS DE DIAS			INÍCIO REAL - AC 1				TÉRMINO CONTRATUAL				DATA ATUAL				RDO Nº							
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024				09/08/2025				07/09/2025				270							
240	269	-29																				
QUADRO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS																						
Chuvvas/Horas	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30
Improdutivo																						
Impraticável																						
ATIVIDADES EXECUTADAS																						
ATIVIDADES PRINCIPAIS EM EXECUTADAS:																						
SEM ATIVIDADES - DESCANSO SEMANAL																						
PONTE ESTACA 45+15: APÓS ESTUDO DA ATECEL VERIFICOU-SE QUE NÃO TEMOS NESTE LOCAL SOLO COM CAPACIDADE DE SUPORTE PARA RECEBER O BLOCO ESTRUTURAL DA FUNDAÇÃO, VERIFICOU-SE TAMBÉM QUE A PRESENÇA DE ÁGUA AFLORANDO. SOLICITAMOS A FISCALIZAÇÃO ORIENTAÇÃO SOBRE COMO PROCEDER. NOSSA FRENTE DE SERVIÇO SE ENCONTRA PARALISADA DESDE DO DIA 23/07/2025.																						
CONTINUAMOS NO AGUARDO DE PROVIDÊNCIAS COM RELAÇÃO AS INTERFERÊNCIAS QUE ESTÃO IMPEDINDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS CALÇADAS, CONFORME CROCI JÁ ENVIANDO NO DIA 28/04.																						
REITEIRAMOS QUE, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, OS REPAROS NO EMISSÁRIO DA CAGEPA NÃO FORAM REALIZADOS, RESULTANDO NA MANUTENÇÃO DE UM VOLUME CONSIDERÁVEL DE ESGOTO CORRENDO A CÉU ABERTO, JUSTAMENTE AO LADO DA PAREDE DO CANAL QUE SE ENCONTRA EM FASE DE EXECUÇÃO. ESSA SITUAÇÃO TEM CAUSADO SÉRIOS TRANSTORNOS À CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS, ALÉM DE GERAR IMPACTOS NEGATIVOS À POPULAÇÃO DO ENTORNO, QUE CONVIVE COM OS EFEITOS DIRETOS DA EXPOSIÇÃO AO ESGOTO NÃO CONTIDO.																						
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS																						
MÃO DE OBRA INDIRETA			MÃO DE OBRA DIRETA			EQUIPAMENTOS																
Gerente de contrato	1		Encarregado de Obra Civil	4		Veículo Leve	5															
Coordenador de sala técnica	1		Líder de Equipe	2		Retroescavadeira	2															
Supervisor de Obra	1		Topógrafo (operador de GEORADAR)	1		Escavadeira Hidráulica	1															
Engenheiro Civil	1		Apontador	2		Caminhão Munck	0															
Topógrafo	1		Armador	3		Caminhão Cabinado	2															
Técnico de planejamento	1		Pedreiro	15		Caminhão caçamba	1															
Técnico de Segurança	1		Carpinteiro	7		Caminhão Melosa	1															
Profissional de Licenciamento	1		Servente	24		Caminhão Pipa	1															
Encarregado Administrativo	1		Operador de Escavadeira hidráulica	2		Carreta Munck																
Aux. Engenharia	1		Operador de Retroescavadeira	1																		
Aux. SMS	1		Motorista de Caçamba	1																		
ASG	2		Motorista de Cabinado	2																		
Eletricista	1		Motorista de Caminhão Munck	0																		
Aux. Eletricista			Motorista de Caminhão Comboio	1																		
Almoxarife			Vigia Moturno	2																		
Aux. Almoxarife	1																					
Segurança Patrimonial	2																					
TOTAL (Indireto)		15	TOTAL (Direto)		67	TOTAL (Equipamentos)		13														
COMENTÁRIOS CONTRATADA																						
FISCALIZAÇÃO																						
Data	Vipetro Constr. e Montagens Industriais Ltda										Data	Fiscalização										
	Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5305 D RN											Matheus Nascimento Tomaz Engenheiro Civil CREA-PB 1622307640 Matrícula: 30994 SECOP/PMCG										





Fiscalização
 Mathheus Nascimento Tomaz
 Engenheiro Civil
 CREA-PR 1622307640
 Matrícula: 30994
 SECOP/PMCG



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	Nº 2.08.030/2024

RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	08/09/2025	271
240	270	-30				

QUADRO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS																				
Chuvvas/Horas	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30
Improdutivo																				
Impraticável																				

ATIVIDADES EXECUTADAS

ATIVIDADES PRINCIPAIS EM EXECUTADAS:

CANAL PRINCIPAL E VIAS DO CANAL

APLICAÇÃO DE REBOCO DE REVESTIMENTO DA PAREDE DO CANAL

CICLOVIA/CALÇADA

REGULARIZAÇÃO DE CALÇADAS E CICLOVIA

CONCRETAGEM CALÇADA/CICLOVIA

PONTE ROTATORIA

ESGOTAMENTO E LIMPEZA DA FUNDAÇÃO DA PONTE LADO ESQUERDO.

PONTE ESTACA 45+15: APÓS ESTUDO DA ATECEL VERIFICOU-SE QUE NÃO TEMOS NESTE LOCAL SOLO COM CAPACIDADE DE SUPORTE PARA RECEBER O BLOCO ESTRUTURAL DA FUNDAÇÃO, VERIFICOU-SE TAMBÉM QUE A PRESENÇA DE ÁGUA AFLORANDO. SOLICITAMOS A FISCALIZAÇÃO ORIENTAÇÃO SOBRE COMO PROCEDER. NOSSA FRENTE DE SERVIÇO SE ENCONTRA PARALISADA DESDE DO DIA 23/07/2025.

CONTINUAMOS NO AGUARDAR DE PROVIDÊNCIAS COM RELAÇÃO AS INTERFERÊNCIAS QUE ESTÃO IMPEDINDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS CALÇADAS, CONFORME CROCRI JÁ ENVIANDO NO DIA 28/04.

REITEIRAMOS QUE, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, OS REPAROS NO EMISSÁRIO DA CAGEPA NÃO FORAM REALIZADOS, RESULTANDO NA MANUTENÇÃO DE UM VOLUME CONSIDERÁVEL DE ESGOTO CORRENDO A CÉU ABERTO, JUSTAMENTE AO LADO DA PAREDE DO CANAL QUE SE ENCONTRA EM FASE DE EXECUÇÃO. ESSA SITUAÇÃO TEM CAUSADO SÉRIOS TRANSTORNOS À CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS, ALÉM DE GERAR IMPACTOS NEGATIVOS À POPULAÇÃO DO ENTORNO, QUE CONVIVE COM OS EFEITOS DIRETOS DA EXPOSIÇÃO AO ESGOTO NÃO CONTIDO.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
Gerente de contrato	1	Encarregado de Obra Civil	4	Veículo Leve	5
Coordenador de sala técnica	1	Líder de Equipe	2	Retroescavadeira	2
Supervisor de Obra	1	Topógrafo (operador de GEORADAR)	1	Escavadeira Hidráulica	1
Engenheiro Civil	1	Apontador	2	Caminhão Munck	0
Topógrafo		Armador	3	Caminhão Cabinado	2
Técnico de planejamento	1	Pedreiro	15	Caminhão caçamba	1
Técnico de Segurança	1	Carpinteiro	7	Caminhão Melosa	1
Profissional de Licenciamento		Servente	24	Caminhão Pipa	1
Encarregado Administrativo	1	Operador de Escavadeira hidráulica	2	Carreta Munck	
Aux. Engenharia	1	Operador de Retroescavadeira	1		
Aux. SMS	1	Motorista de Caçamba	1		
ASG	2	Motorista de Cabinado	2		
Eletricista	1	Motorista de Caminhão Munck	0		
Aux. Eletricista		Motorista de Caminhão Comboio	1		
Almoxarife		Vigia Moturno	2		
Aux. Almoxarife	1				
Segurança Patrimonial	2				
TOTAL (Indireto)	15	TOTAL (Direto)	67	TOTAL (Equipamentos)	13


COMENTÁRIOS CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

Data	Assinatura	Data	Fiscalização
	Vipetro Constr. e Montagens Industriais Ltda Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5305 D RN		Matheus Nascimento Tomaz Engenheiro Civil CREA-PB 1622307640 Matrícula: 30994 SECOB/PMCG

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÔ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	08/09/2025	271
240	270	-30				

ANEXOS:

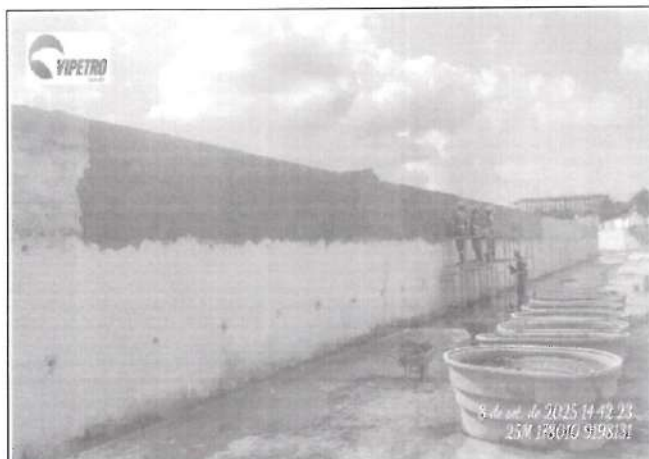

Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN


Mathheus Nascimento Tomaz
Engenheiro Civil
CREA PB 1522307640
Matrícula: 30994
SECOB/PMCG



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA				CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.				Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	08/09/2025
240	270	-30			271

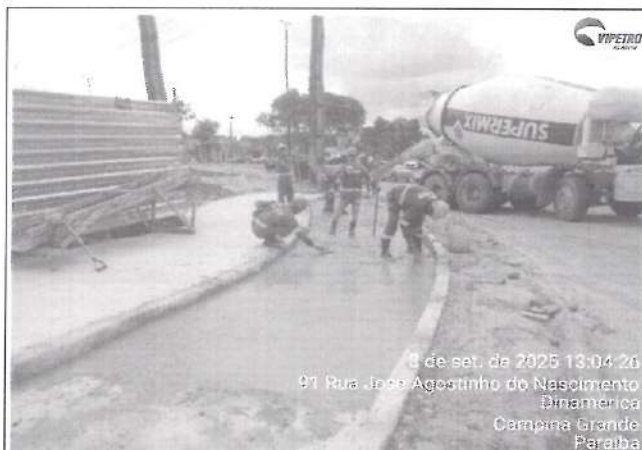

Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN

Matheus Nascimento Tomaz
Engenheiro Civil
CREA-PB 1622307640
Matrícula: 30994
SECOB/PMCG



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALSINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	Nº 2.08.030/2024

RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	09/09/2025	272
240	271	-31				

QUADRO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

Chuvvas/Horas	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30
Improdutivo																						
Impraticável																						

ATIVIDADES EXECUTADAS

ATIVIDADES PRINCIPAIS EM EXECUTADAS:

CANAL PRINCIPAL E VIAS DO CANAL
APLICAÇÃO DE REBOCO DE REVESTIMENTO DA PAREDE DO CANAL
CICLOVIA/CALÇADA
REGULARIZAÇÃO DE CALÇADAS E CICLOVIA
PLANTIO DE GRAMA CANTEIRO
PONTE ROTATORIA
CONCRETAGEM BLOCO DA FUNDAÇÃO LADO ESQUERDO

A VIPETRO INFORMA A NECESSIDADE DE EXECUTAR UM MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO CICLÓPICO ENTRE AS ESTACAS 10+2,67 À ESTACA 13+2,32. ESSA SOLUÇÃO TEM COMO OBJETIVO GARANTIR A ESTABILIDADE DO ATERRO, POSSIBILITANDO A EXECUÇÃO SEGURA DA CALÇADA E ASSEGURANDO A PRESERVAÇÃO DA RESIDÊNCIA EXISTENTE NAS PROXIMIDADES.

PONTE ESTACA 45+15: APÓS ESTUDO DA ATECEL VERIFICOU-SE QUE NÃO TEMOS NESTE LOCAL SOLO COM CAPACIDADE DE SUPORTE PARA RECEBER O BLOCO ESTRUTURAL DA FUNDAÇÃO, VERIFICOU-SE TAMBÉM QUE A PRESENÇA DE ÁGUA AFLORANDO. SOLICITAMOS A FISCALIZAÇÃO ORIENTAÇÃO SOBRE COMO PROCEDER. NOSSA FRENTE DE SERVIÇO SE ENCONTRA PARALISADA DESDE DO DIA 23/07/2025.

CONTINUAMOS NO AGUARDO DE PROVIDÊNCIAS COM RELAÇÃO AS INTERFERÊNCIAS QUE ESTÃO IMPEDINDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS CALÇADAS, CONFORME CROCRÍ JÁ ENVIANDO NO DIA 28/04.

REITEIRAMOS QUE, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, OS REPAROS NO EMISSÁRIO DA CAGEPA NÃO FORAM REALIZADOS, RESULTANDO NA MANUTENÇÃO DE UM VOLUME CONSIDERÁVEL DE ESGOTO CORRENDO A CÉU ABERTO, JUSTAMENTE AO LADO DA PAREDE DO CANAL QUE SE ENCONTRA EM FASE DE EXECUÇÃO. ESSA SITUAÇÃO TEM CAUSADO SÉRIOS TRANSTORNOS À CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS, ALÉM DE GERAR IMPACTOS NEGATIVOS À POPULAÇÃO DO ENTORNO, QUE CONVIVE COM OS EFEITOS DIRETOS DA EXPOSIÇÃO AO ESGOTO NÃO CONTIDO.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
Gerente de contrato	1	Encarregado de Obra Civil	4	Veículo Leve	5
Coordenador de sala técnica	1	Líder de Equipe	2	Retroescavadeira	2
Supervisor de Obra	1	Topógrafo (operador de GEORADAR)	1	Escavadeira Hidráulica	1
Engenheiro Civil	1	Apontador	2	Caminhão Munck	0
Topógrafo		Armador	3	Caminhão Cabinado	2
Técnico de planejamento	1	Pedreiro	15	Caminhão caçamba	1
Técnico de Segurança	1	Carpinteiro	7	Caminhão Melosa	1
Profissional de Licenciamento		Servente	24	Caminhão Pipa	1
Encarregado Administrativo	1	Operador de Escavadeira hidráulica	2	Carreta Munck	
Aux. Engenharia	1	Operador de Retroescavadeira	1		
Aux. SMS	1	Motorista de Caçamba	1		
ASG	2	Motorista de Cabinado	2		
Eletricista	1	Motorista de Caminhão Munck	0		
Aux. Eletricista		Motorista de Caminhão Comboio	1		
Almoxarife		Vigia Moturno	2		
Aux. Almoxarife	1				
Segurança Patrimonial	2				
TOTAL (Indireto)	15	TOTAL (Direto)	67	TOTAL (Equipamentos)	13

COMENTÁRIOS CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO



EM VISTORIA REALIZADA IN LOCO, FOI CONSTATADO QUE, PARA GARANTIR A ESTABILIDADE DO ATERRO NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS ESTACAS 10+2,67 E 13+2,32, SERÁ EXECUTADO NO TERRENO UM TALUDE COM INCLINAÇÃO APROXIMADA DE 45°, SOLUÇÃO ESTA QUE PROPORCIONARÁ A DEVIDA SUSTENTAÇÃO AO ATERRO, POSSIBILITANDO A EXECUÇÃO SEGURA DA CALÇADA E PRESERVANDO A RESIDÊNCIA EXISTENTE NAS PROXIMIDADES.

Data	Contratada	Data	Fiscalização
	 Edenisson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5305 D RN Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda		 Matheus Nascimento Tomaz Engenheiro Civil CREA-PB 162.307640 Matrícula: 30992 SECOB/PMCG

Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda
Edenisson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN

CONTRATADA:		VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA				CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES,PASSARELAS,CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	09/09/2025	272
240	271	-31				



ANEXOS:

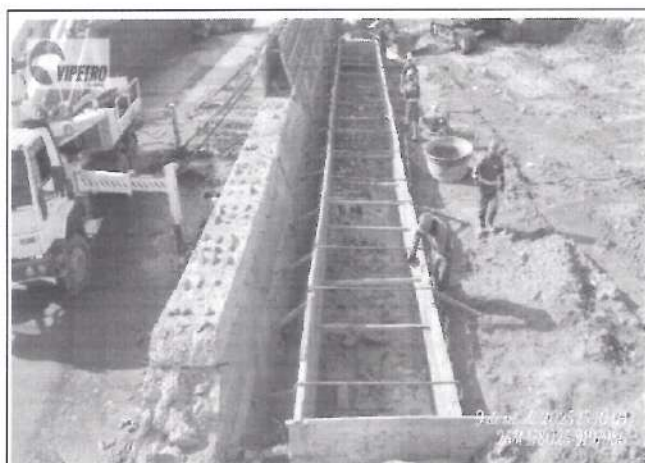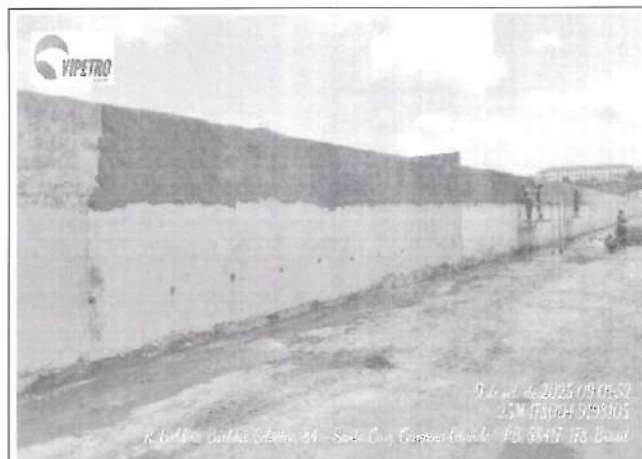

Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN

Matheus Nascimento Tomaz
Engenheiro Civil
CREA-PB 1622307640
Matrícula: 30994
SECOB/PMCG

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA				CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.				Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	09/09/2025
240	271	-31			
					RDO Nº 272

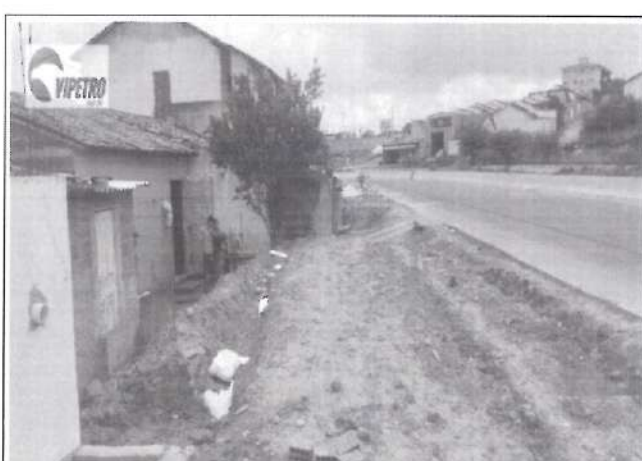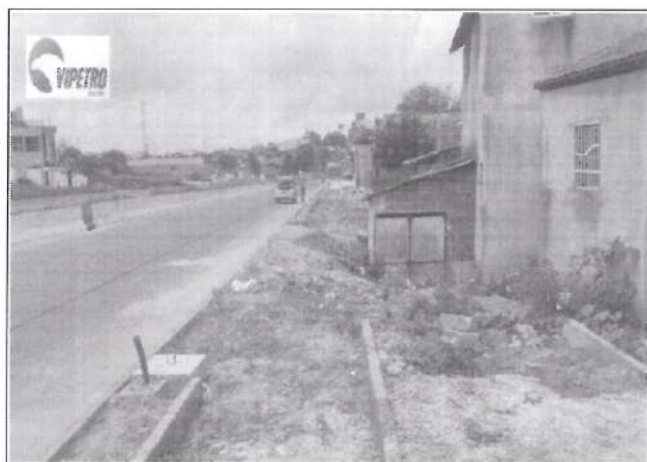

Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN

Matheus Nascimento Tomaz
Engenheiro Civil
CREA-RB 1622307640
Matricula: 30994
SECOB/PMCG



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	Nº 2.08.030/2024

RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	10/09/2025	273
240	272	-32				

QUADRO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS																				
Chuvvas/Horas	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30
Improdutivo																				
Impraticável																				

ATIVIDADES EXECUTADAS

ATIVIDADES PRINCIPAIS EM EXECUTADAS:

CANAL PRINCIPAL E VIAS DO CANAL

DESFORMA E REAPLICAÇÃO DE FORMA DA PAREDE DO CANAL

APLICAÇÃO DE REBOCO DE REVESTIMENTO DA PAREDE DO CANAL

CONCRETAGEM DE PAREDE DO CANAL

CICLOVIA/CALÇADA

REGULARIZAÇÃO DE CALÇADAS E CICLOVIA

PLANTIO DE GRAMA CANTEIRO

IRRIGAÇÃO DA GRAMA PLATANDA

PONTE ROTATORIA

CONCRETAGEM DE FUNDAÇÃO DO BLOCO LADO ESQUERDO

RETIRADA E REAPLICAÇÃO DE FORMA DO BLOCO DA FUNDAÇÃO LADO ESQUERDO

PONTE ESTACA 45+15: APÓS ESTUDO DA ATECEL VERIFICOU-SE QUE NÃO TEMOS NESTE LOCAL SOLO COM CAPACIDADE DE SUPORTE PARA RECEBER O BLOCO ESTRUTURAL DA FUNDAÇÃO, VERIFICOU-SE TAMBÉM QUE A PRESENÇA DE ÁGUA AFLORANDO. SOLICITAMOS A FISCALIZAÇÃO ORIENTAÇÃO SOBRE COMO PROCEDER. NOSSA FRENTE DE SERVIÇO SE ENCONTRA PARALISADA DESDE DO DIA 23/07/2025.

CONTINUAMOS NO AGUARDAR DE PROVIDÊNCIAS COM RELAÇÃO AS INTERFERÊNCIAS QUE ESTÃO IMPEDINDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS CALÇADAS, CONFORME CROCI JÁ ENVIANDO NO DIA 28/04.

REITEIRAMOS QUE, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, OS REPAROS NO EMISSÁRIO DA CAGEPA NÃO FORAM REALIZADOS, RESULTANDO NA MANUTENÇÃO DE UM VOLUME CONSIDERÁVEL DE ESGOTO CORRENDO A CÉU ABERTO, JUSTAMENTE AO LADO DA PAREDE DO CANAL QUE SE ENCONTRA EM FASE DE EXECUÇÃO. ESSA SITUAÇÃO TEM CAUSADO SÉRIOS TRANSTORNOS À CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS, ALÉM DE GERAR IMPACTOS NEGATIVOS À POPULAÇÃO DO ENTORNO, QUE CONVIVE COM OS EFEITOS DIRETOS DA EXPOSIÇÃO AO ESGOTO NÃO CONTIDO.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS		
Gerente de contrato	1	Encarregado de Obra Civil	4	Veículo Leve	5	
Coordenador de sala técnica	1	Líder de Equipe	2	Retroescavadeira	2	
Supervisor de Obra	1	Topógrafo (operador de GEORADAR)	1	Escavadeira Hidráulica	1	
Engenheiro Civil	1	Apontador	2	Caminhão Munck	0	
Topógrafo		Armador	3	Caminhão Cabinado	2	
Técnico de planejamento	1	Pedreiro	15	Caminhão caçamba	1	
Técnico de Segurança	1	Carpinteiro	7	Caminhão Melosa	1	
Profissional de Licenciamento		Servente	24	Caminhão Pipa	1	
Encarregado Administrativo	1	Operador de Escavadeira hidráulica	2	Carreta Munck		
Aux. Engenharia	1	Operador de Retroescavadeira	1			
Aux. SMS	1	Motorista de Caçamba	1			
ASG	2	Motorista de Cabinado	2			
Eletricista	1	Motorista de Caminhão Munck	0			
Aux. Eletricista		Motorista de Caminhão Comboio	1			
Almoxarife		Vigia Motorno	2			
Aux. Almoxarife	1					
Segurança Patrimonial	2					
TOTAL (Indireto)		15	TOTAL (Direto)	67	TOTAL (Equipamentos)	13



COMENTÁRIOS CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

Data	Contratada	Data	Fiscalização
	Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5305 D RN		Matheus Nascimento Tomaz Engenheiro Civil CREA-PB 1622307640 Matrícula: 30994 SECOB/PMCG

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INÍCIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	10/09/2025	273
240	272	-32				

ANEXOS:

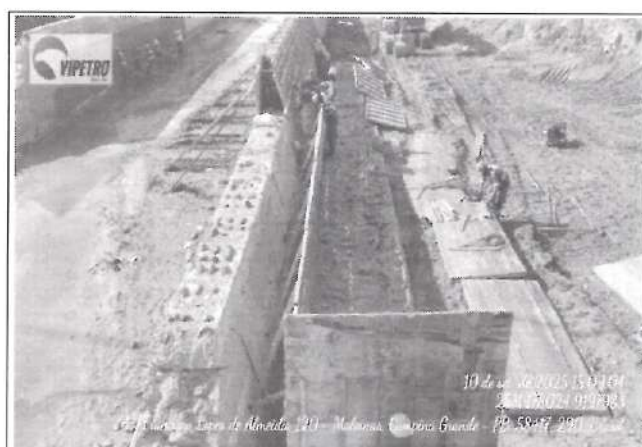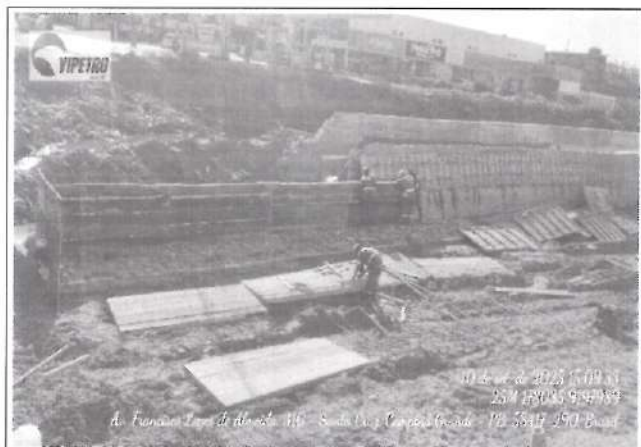

Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN

Matheus Nascimento Tomaz
Engenheiro Civil
CREA PB 1622307640
Matrícula: 30994
SECOB/PMCG

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INÍCIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	10/09/2025	273
240	272	-32				



Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN

Matheus Nascimento Tomaz
Engenheiro Civil
CREA-PB 1622307640
Matrícula: 30994
SECOB/PMCG



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	Nº 2.08.030/2024

RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	11/09/2025	274
240	273	-33				

QUADRO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS																						
Chuvvas/Horas	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30
Improdutivo																						
Impraticável																						

ATIVIDADES EXECUTADAS

ATIVIDADES PRINCIPAIS EM EXECUTADAS:

CANAL PRINCIPAL E VIAS DO CANAL

APLICAÇÃO DE REBOCO DE REVESTIMENTO DA PAREDE DO CANAL

CICLOVIA/CALÇADA

REGULARIZAÇÃO DE CALÇADAS E CICLOVIA

PLANTIO DE GRAMA CANTEIRO

PONTE ROTATORIA

CONCRETAGEM BLOCO DA FUNDAÇÃO LADO ESQUERDO

PONTE ESTACA 45+15: APÓS ESTUDO DA ATECEL VERIFICOU-SE QUE NÃO TEMOS NESTE LOCAL SOLO COM CAPACIDADE DE SUPORTE PARA RECEBER O BLOCO ESTRUTURAL DA FUNDAÇÃO, VERIFICOU-SE TAMBÉM QUE A PRESENÇA DE ÁGUA AFLORANDO. SOLICITAMOS A FISCALIZAÇÃO ORIENTAÇÃO SOBRE COMO PROCEDER. NOSSA FRENTE DE SERVIÇO SE ENCONTRA PARALISADA DESDE DO DIA 23/07/2025.

CONTINUAMOS NO AGUARDAR DE PROVIDÊNCIAS COM RELAÇÃO AS INTERFERÊNCIAS QUE ESTÃO IMPEDINDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS CALÇADAS, CONFORME CROCI JÁ ENVIANDO NO DIA 28/04.

REITEIRAMOS QUE, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, OS REPAROS NO EMISSÁRIO DA CAGEPA NÃO FORAM REALIZADOS, RESULTANDO NA MANUTENÇÃO DE UM VOLUME CONSIDERÁVEL DE ESGOTO CORRENDO A CÉU ABERTO, JUSTAMENTE AO LADO DA PAREDE DO CANAL QUE SE ENCONTRA EM FASE DE EXECUÇÃO. ESSA SITUAÇÃO TEM CAUSADO SÉRIOS TRANSTORNOS À CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS, ALÉM DE GERAR IMPACTOS NEGATIVOS À POPULAÇÃO DO ENTORNO, QUE CONVIVE COM OS EFEITOS DIRETOS DA EXPOSIÇÃO AO ESGOTO NÃO CONTIDO.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
Gerente de contrato	1	Encarregado de Obra Civil	4	Veículo Leve	5
Coordenador de sala técnica	1	Lider de Equipe	2	Retroescavadeira	2
Supervisor de Obra	1	Topógrafo (operador de GEORADAR)	1	Escavadeira Hidráulica	1
Engenheiro Civil	1	Apontador	2	Caminhão Munck	0
Topógrafo		Armador	3	Caminhão Cabineado	2
Técnico de planejamento	1	Pedreiro	15	Caminhão caçamba	1
Técnico de Segurança	1	Carpinteiro	7	Caminhão Melosa	1
Profissional de Licenciamento		Servente	24	Caminhão Pipa	1
Encarregado Administrativo	1	Operador de Escavadeira hidráulica	2	Carreta Munck	
Aux. Engenharia	1	Operador de Retroescavadeira	1		
Aux. SMS	1	Motorista de Caçamba	1		
ASG	2	Motorista de Cabineado	2		
Eletricista	1	Motorista de Caminhão Munck	0		
Aux. Eletricista		Motorista de Caminhão Comboio	1		
Almoxarife		Vigia Moturno	2		
Aux. Almoxarife	1				
Segurança Patrimonial	2				
TOTAL (Indireto)	15	TOTAL (Direto)	67	TOTAL (Equipamentos)	13

COMENTÁRIOS CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

Data	Contratada	Data	Fiscalização
	Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5305 D RN		Matheus Nascimento Tomaz Engenheiro Civil CREA-PB 16223076-4 Metrícula 3099-1 SECOB/PMCG

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORES DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INÍCIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	11/09/2025	274
240	273	-33				

ANEXOS:



Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN


Matheus Nascimento Tomaz
Engenheiro Civil
CREA-PB 1622307640
Matrícula: 50994
SEGOB/AMCG



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INÍCIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	11/09/2025	274
240	273	-33				

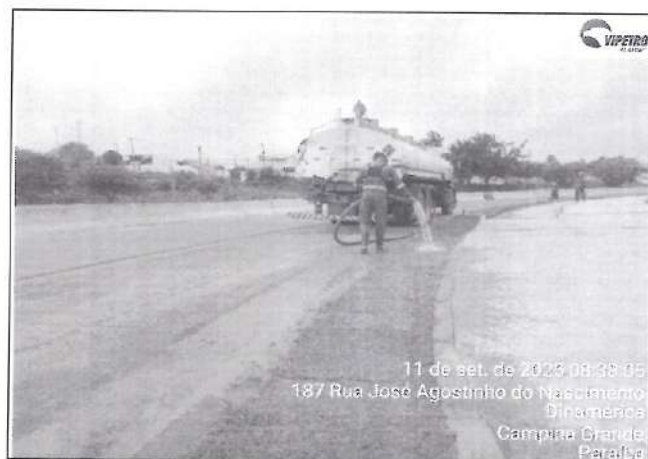

Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda

Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RNMatheus Nascimento Tomaz
Engenheiro Civil
CREA-PB 1622307640
Matrícula: 30994
SECOB/PMCG



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	Nº 2.08.030/2024

RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	12/09/2025	275
240	274	-34				

QUADRO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS																				
Chuvvas/Horas	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30
Improdutivo																				
Impraticável																				

ATIVIDADES EXECUTADAS

ATIVIDADES PRINCIPAIS EM EXECUTADAS:

CANAL PRINCIPAL E VIAS DO CANAL
DESFORMA E REAPLICAÇÃO DE FORMA DA PAREDE DO CANAL
APLICAÇÃO DE REBOCO DE REVESTIMENTO DA PAREDE DO CANAL
CONCRETAGEM DE PAREDE DO CANAL
CICLOVIA/CALÇADA
REGULARIZAÇÃO DE CALÇADAS E CICLOVIA
PLANTIO DE GRAMA CANTEIRO
IRRIGAÇÃO DA GRAMA PLANTADA
CONCRETAGEM DE CICLOVIA/CALÇADA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
APLICAÇÃO DE POSTES
PONTE ROTATORIA
DESFORMA E REAPLICAÇÃO DE FORMA DO BLOCO DA FUNDAÇÃO LADO ESQUERDO
CONCRETAGEM BLOCO DA FUNDAÇÃO LADO ESQUERDO

PONTE ESTACA 45+15: APÓS ESTUDO DA ATECEL VERIFICOU-SE QUE NÃO TEMOS NESTE LOCAL SOLO COM CAPACIDADE DE SUPORTE PARA RECEBER O BLOCO ESTRUTURAL DA FUNDAÇÃO, VERIFICOU-SE TAMBÉM QUE A PRESENÇA DE ÁGUA AFLORANDO. SOLICITAMOS A FISCALIZAÇÃO ORIENTAÇÃO SOBRE COMO PROCEDER. NOSSA FRENTE DE SERVIÇO SE ENCONTRA PARALISADA DESDE DO DIA 23/07/2025.

CONTINUAMOS NO AGUARDAR DE PROVIDÊNCIAS COM RELAÇÃO AS INTERFERÊNCIAS QUE ESTÃO IMPEDINDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS CALÇADAS, CONFORME CROCI JÁ ENVIANDO NO DIA 28/04.

REITEIRAMOS QUE, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, OS REPAROS NO EMISSÁRIO DA CAGEPA NÃO FORAM REALIZADOS, RESULTANDO NA MANUTENÇÃO DE UM VOLUME CONSIDERÁVEL DE ESGOTO CORRENDO A CÉU ABERTO, JUSTAMENTE AO LADO DA PAREDE DO CANAL QUE SE ENCONTRA EM FASE DE EXECUÇÃO. ESSA SITUAÇÃO TEM CAUSADO SÉRIOS TRANSTORNOS À CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS, ALÉM DE GERAR IMPACTOS NEGATIVOS À POPULAÇÃO DO ENTORNO, QUE CONVIVE COM OS EFEITOS DIRETOS DA EXPOSIÇÃO AO ESGOTO NÃO CONTIDO.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
Gerente de contrato	1	Encarregado de Obra Civil	4	Veículo Leve	5
Coordenador de sala técnica	1	Lider de Equipe	2	Retroescavadeira	2
Supervisor de Obra	1	Topografo (operador de GEORADAR)	1	Escavadeira Hidráulica	1
Engenheiro Civil	1	Apontador	2	Caminhão Munck	0
Topografo		Armador	3	Caminhão Cabinado	2
Técnico de planejamento	1	Pedreiro	15	Caminhão caçamba	1
Técnico de Segurança	1	Carpinteiro	7	Caminhão Melosa	1
Profissional de Licenciamento		Servente	24	Caminhão Pipa	1
Encarregado Administrativo	1	Operador de Escavadeira hidráulica	2	Carreta Munck	
Aux. Engenharia	1	Operador de Retroescavadeira	1		
Aux. SMS	1	Motorista de Caçamba	1		
ASG	2	Motorista de Cabinado	2		
Eletricista	1	Motorista de Caminhão Munck	0		
Aux. Eletricista		Motorista de Caminhão Comboio	1		
Almoxarife		Vigia Moturno	2		
Aux. Almoxarife	1				
Segurança Patrimonial	2				
TOTAL (Indireto)	15	TOTAL (Direto)	67	TOTAL (Equipamentos)	13


COMENTARIOS CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

Data		Data	Fiscalização
	Vipetro Constr. e Montagens Industriais Ltda Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5305 D RN		Matheus Nascimento Tomaz Engenheiro Civil CREA PB 1622307640 Matrícula: 30994 SECOB/PMCG

CONTRATADA:			VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA			CONTRATO
OBRA:			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.			Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	12/09/2025	275
240	274	-34				

ANEXOS:

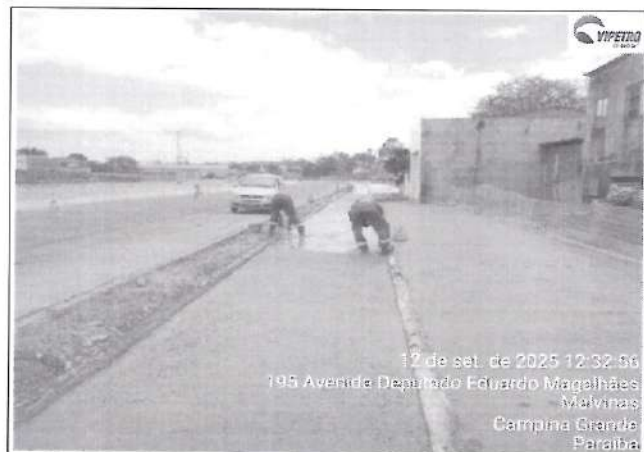

Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN


Matheus Nascimento Tomaz
Engenheiro Civil
CREA-PB 1622307640
Matrícula: 30994
SECOP/PMCG



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORES DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	12/09/2025	275
240	274	-34				

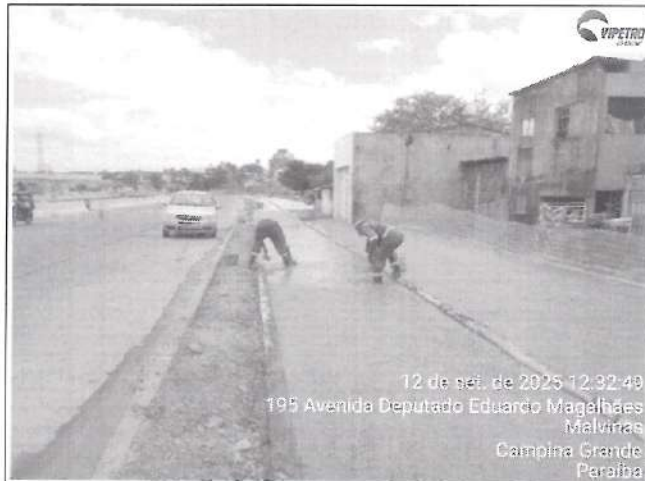

Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN

Matheus Nascimento Tomaz
Engenheiro Civil
CREA-PB 1622307640
Matrícula: 30994
SECOOP/PMCG



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	Nº 2.08.030/2024

RESUMOS DE DIAS			INÍCIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	13/09/2025	276
240	275	-35				

QUADRO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS																						
Chuvvas/Horas	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30
Improdutivo																						
Impraticável																						

ATIVIDADES EXECUTADAS

ATIVIDADES PRINCIPAIS EM EXECUTADAS:

CANAL PRINCIPAL E VIAS DO CANAL
APLICAÇÃO DE REBOCO DE REVESTIMENTO DA PAREDE DO CANAL
CONCRETAGEM DE PAREDE DO CANAL
CICLOVIA/CALÇADA
IRRIGAÇÃO DA GRAMA PLANTADA
PONTE ROTATORIA
CONCRETAGEM BLOCO DA FUNDAÇÃO LADO ESQUERDO

PONTE ESTACA 45+15: APÓS ESTUDO DA ATECEL VERIFICOU-SE QUE NÃO TEMOS NESTE LOCAL SOLO COM CAPACIDADE DE SUPORTE PARA RECEBER O BLOCO ESTRUTURAL DA FUNDAÇÃO, VERIFICOU-SE

CONTINUAMOS NO AGUARDAR DE PROVIDÊNCIAS COM RELAÇÃO AS INTERFERÊNCIAS QUE ESTÃO IMPEDINDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS CALÇADAS, CONFORME CROCRI JÁ ENVIANDO NO DIA 28/04.

REITEIRAMOS QUE, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, OS REPAROS NO EMISSÁRIO DA CAGEPA NÃO FORAM REALIZADOS, RESULTANDO NA MANUTENÇÃO DE UM VOLUME CONSIDERÁVEL DE ESGOTO CORRENDO A CÉU ABERTO, JUSTAMENTE AO LADO DA PAREDE DO CANAL QUE SE ENCONTRA EM FASE DE EXECUÇÃO. ESSA SITUAÇÃO TEM CAUSADO SÉRIOS TRANSTORNOS À CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS, ALÉM DE

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS		
Gerente de contrato	1	Encarregado de Obra Civil	4	Veículo Leve	5	
Coordenador de sala técnica	1	Líder de Equipe	2	Retroescavadeira	2	
Supervisor de Obra	1	Topógrafo (operador de GEORADAR)	1	Escavadeira Hidráulica	1	
Engenheiro Civil	1	Apontador	2	Caminhão Munck	0	
Topógrafo		Armador	3	Caminhão Cabinado	2	
Técnico de planejamento	1	Pedreiro	15	Caminhão caçamba	1	
Técnico de Segurança	1	Carpinteiro	7	Caminhão Melosa	1	
Profissional de Licenciamento		Servente	24	Caminhão Pipa	1	
Encarregado Administrativo	1	Operador de Escavadeira hidráulica	2	Carreta Munck		
Aux. Engenharia	1	Operador de Retroescavadeira	1			
Aux. SMS	1	Motorista de Caçamba	1			
ASG	2	Motorista de Cabinada	2			
Eletricista	1	Motorista de Caminhão Munck	0			
Aux. Eletricista		Motorista de Caminhão Comboio	1			
Almoxarife		Vigia Moturno	2			
Aux. Almoxarife	1					
Segurança Patrimonial	2					
TOTAL (Indireto)		15	TOTAL (Direto)	67	TOTAL (Equipamentos)	13

COMENTÁRIOS CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

Data	Contratada	Data	Fiscalização
	Vipetro Constr. e Montagens Industriais Ltda Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5305 D RN		Matheus Nascimento Tomaz Engenheiro Civil CREA-RN 1622307640 Matrícula: 30994 SECOP/PMCG



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORES DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	13/09/2025	276
240	275	-35				

ANEXOS:



Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda

Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RNMatheus Nascimento Tomaz
Engenheiro Civil
CREA-PB 1622307640
Matrícula: 30994
SECOB/PMCG



Matheus Nascimento Tomaz
Engenheiro Civil
CREA-OB 1622307640
Matrícula: 30994
SECOB/PMCG



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA														CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORES DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.														Nº 2.08.030/2024

RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	15/09/2025	278
240	277	-37				

QUADRO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS																				
Chuvas/Horas	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30
Improdutivo																				
Impraticável																				

ATIVIDADES EXECUTADAS

ATIVIDADES PRINCIPAIS EM EXECUTADAS:

CANAL PRINCIPAL E VIAS DO CANAL
APLICAÇÃO DE REBOCO DE REVESTIMENTO DA PAREDE DO CANAL
APLICAÇÃO DE REBOCO DE REVESTIMENTO DA PISO DO CANAL
CICLOVIA/CALÇADA
IRRIGAÇÃO DA GRAMA PLANTADA
APLICAÇÃO DE MEIO FIO
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
APLICAÇÃO DE POSTES
PONTE ROTATORIA
CONCRETAGEM BLOCO DA FUNDAÇÃO LADO ESQUERDO
DESFORMA E REAPLICAÇÃO DE FORMA BLOCO DA FUNDAÇÃO LADO ESQUERDO

PONTE ESTACA 45+15: APÓS ESTUDO DA ATECEL VERIFICOU-SE QUE NÃO TEMOS NESTE LOCAL SOLO COM CAPACIDADE DE SUPORTE PARA RECEBER O BLOCO ESTRUTURAL DA FUNDAÇÃO, VERIFICOU-SE TAMBÉM QUE A PRESENÇA DE ÁGUA AFLORANDO. SOLICITAMOS A FISCALIZAÇÃO ORIENTAÇÃO SOBRE COMO PROCEDER. NOSSA FRENTE DE SERVIÇO SE ENCONTRA PARALISADA DESDE DO DIA 23/07/2025.

CONTINUAMOS NO AGUARDO DE PROVIDÊNCIAS COM RELAÇÃO AS INTERFERÊNCIAS QUE ESTÃO IMPEDINDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS CALÇADAS, CONFORME CROCI JÁ ENVIANDO NO DIA 28/04.

REITEIRAMOS QUE, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, OS REPAROS NO EMISSÁRIO DA CAGEPA NÃO FORAM REALIZADOS, RESULTANDO NA MANUTENÇÃO DE UM VOLUME CONSIDERÁVEL DE ESGOTO CORRENDO A CÉU ABERTO, JUSTAMENTE AO LADO DA PAREDE DO CANAL QUE SE ENCONTRA EM FASE DE EXECUÇÃO. ESSA SITUAÇÃO TEM CAUSADO SÉRIOS TRANSTORNOS À CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS, ALÉM DE GERAR IMPACTOS NEGATIVOS À POPULAÇÃO DO ENTORNO, QUE CONVIVE COM OS EFEITOS DIRETOS DA EXPOSIÇÃO AO ESGOTO NÃO CONTIDO.


QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS									
MÃO DE OBRA INDIRETA			MÃO DE OBRA DIRETA			EQUIPAMENTOS			
Gerente de contrato	1		Encarregado de Obra Civil	4		Veículo Leve	5		
Coordenador de sala técnica	1		Líder de Equipe	2		Retroescavadeira	2		
Supervisor de Obra	1		Topógrafo (operador de GEORADAR)	1		Escavadeira Hidráulica	1		
Engenheiro Civil	1		Apontador	2		Caminhão Munck	0		
Topógrafo			Armador	3		Caminhão Cabinado	2		
Técnico de planejamento	1		Pedreiro	14		Caminhão caçamba	1		
Técnico de Segurança	1		Carpinteiro	7		Caminhão Melosa	1		
Profissional de Licenciamento			Servente	24		Caminhão Pipa	1		
Encarregado Administrativo	1		Operador de Escavadeira hidráulica	2		Carreta Munck			
Aux. Engenharia	1		Operador de Retroescavadeira	1					
Aux. SMS	1		Motorista de Caçamba	1					
ASG	2		Motorista de Cabinado	2					
Eletricista	1		Motorista de Caminhão Munck	0					
Aux. Eletricista			Motorista de Caminhão Comboio	1					
Almoxarife			Vigia Motorno	2					
Aux. Almoxarife	1								
Segurança Patrimonial	2								
TOTAL (Indireto)	15		TOTAL (Direto)	66		TOTAL (Equipamentos)	13		

COMENTÁRIOS CONTRATADA

Data	Contratada	Data	Fiscalização
	Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5305 D RN		Mathheus Nascimento Tomaz Engenheiro Civil CREA-PE 1622307640 Matrícula 30994 SECOB/PMCG

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INÍCIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	15/09/2025	278
240	277	-37				

ANEXOS:

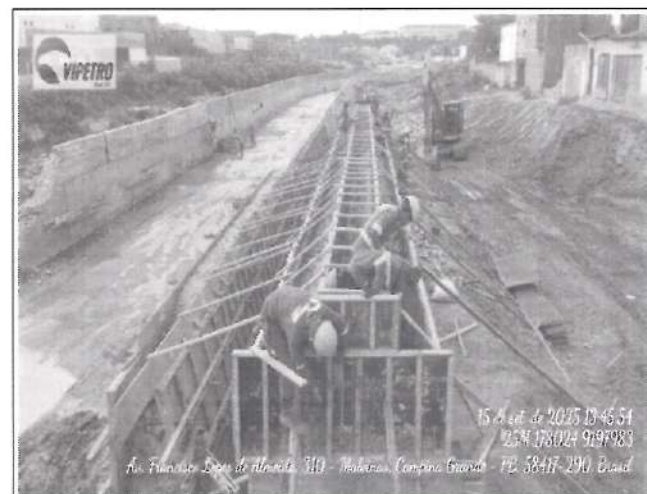

Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN

Matheus Nascimento Tomaz
Engenheiro Civil
CREA-PB 162280/640
Matrícula: 30994
SECOB/PMCG



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	15/09/2025	278
240	277	-37				



Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda

Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RNMatheus Nascimento Tomaz
Engenheiro Civil
CREA-PB 1622307640
Matrícula: 90994
SECOP/PMCG



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	Nº 2.08.030/2024

RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	16/09/2025	279
240	278	-38				

QUADRO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS																					
Chuvvas/Horas	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00
Improdutivo																					
Impraticável																					

ATIVIDADES EXECUTADAS

ATIVIDADES PRINCIPAIS EM EXECUTADAS:

CANAL PRINCIPAL E VIAS DO CANAL

DESFORMA E REAPLICAÇÃO DE FORMA PARA CONCRETAGEM DA PAREDE CANAL

APLICAÇÃO DE REBOCO DE REVESTIMENTO DA PAREDE DO CANAL

APLICAÇÃO DE REBOCO DE REVESTIMENTO DA PISO DO CANAL

CICLOVIA/CALÇADA

IRRIGAÇÃO DA GRAMA PLANTADA

APLICAÇÃO DE MEIO FIO

REGULARIZAÇÃO DE CALÇADAS E CICLOVIAS

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

APLICAÇÃO DE POSTES

PONTE ROTATORIA

CONCRETAGEM BLOCO DA FUNDAÇÃO LADO ESQUERDO

DESFORMA E REAPLICAÇÃO DE FORMA BLOCO DA FUNDAÇÃO LADO ESQUERDO

PONTE ESTACA 45+15: APÓS ESTUDO DA ATECEL VERIFICOU-SE QUE NÃO TEMOS NESTE LOCAL SOLO COM CAPACIDADE DE SUPORTE PARA RECEBER O BLOCO ESTRUTURAL DA FUNDAÇÃO, VERIFICOU-SE TAMBÉM QUE A PRESENÇA DE ÁGUA AFLORANDO. SOLICITAMOS A FISCALIZAÇÃO ORIENTAÇÃO SOBRE COMO PROCEDER. NOSSA FRENTE DE SERVIÇO SE ENCONTRA PARALISADA DESDE DO DIA 23/07/2025.

CONTINUAMOS NO AGUARDANDO DE PROVIDÊNCIAS COM RELAÇÃO AS INTERFERÊNCIAS QUE ESTÃO IMPEDINDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS CALÇADAS, CONFORME CROCI JÁ ENVIANDO NO DIA 28/04.

REITEIRAMOS QUE, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, OS REPAROS NO EMISSÁRIO DA CAGEPA NÃO FORAM REALIZADOS, RESULTANDO NA MANUTENÇÃO DE UM VOLUME CONSIDERÁVEL DE ESGOTO CORRENDO A CÉU ABERTO, JUSTAMENTE AO LADO DA PAREDE DO CANAL QUE SE ENCONTRA EM FASE DE EXECUÇÃO. ESSA SITUAÇÃO TEM CAUSADO SÉRIOS TRANSTORNOS À CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS, ALÉM DE GERAR IMPACTOS NEGATIVOS À POPULAÇÃO DO ENTORNO, QUE CONVIVE COM OS EFEITOS DIRETOS DA EXPOSIÇÃO AO ESGOTO NÃO CONTIDO.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
Gerente de contrato	1	Encarregado de Obra Civil	4	Veículo Leve	5
Coordenador de sala técnica	1	Líder de Equipe	2	Retroescavadeira	2
Supervisor de Obra	1	Topógrafo (operador de GEORADAR)	1	Escavadeira Hidráulica	1
Engenheiro Civil	1	Apontador	2	Caminhão Munck	0
Topógrafo		Armador	3	Caminhão Cabineado	2
Técnico de planejamento	1	Pedreiro	14	Caminhão caçamba	1
Técnico de Segurança	1	Carpinteiro	7	Caminhão Melosa	1
Profissional de Licenciamento		Servente	24	Caminhão Pipa	1
Encarregado Administrativo	1	Operador de Escavadeira hidráulica	2	Carreta Munck	
Aux. Engenharia	1	Operador de Retroescavadeira	1		
Aux. SMS	1	Motorista de Caçamba	1		
ASG	2	Motorista de Cabinado	2		
Eletricista	1	Motorista de Caminhão Munck	0		
Aux. Eletricista		Motorista de Caminhão Comboio	1		
Almoxarife		Vigia Motorno	2		
Aux. Almoxarife	1				
Segurança Patrimonial	2				
TOTAL (Indireto)	15	TOTAL (Direto)	66	TOTAL (Equipamentos)	13

COMENTÁRIOS CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

Data	Contratada	Data	Fiscalização
	Vipetro Const. e Mont. Industriais LTDA Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5305 D RN		Matheus Nascimento Tomaz Engenheiro Civil CREA PB 1622307640 Matr. nº 30994 SECOP/PMCG




RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ



CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORES DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INÍCIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	16/09/2025	279
240	278	-38				

ANEXOS:

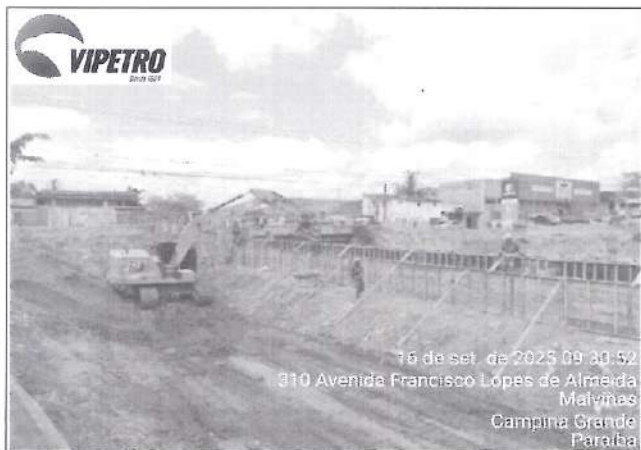

Vipetro Const. e Mont. Industriais LTDA
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN

Matheus Nascimento Tomaz
Engenheiro Civil
CREA-PB 1622307640
Matrícula: 30994
SECOB/PMCG



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA: VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA				CONTRATO		
OBRA:		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.				Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INÍCIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	16/09/2025	279
240	278	-38				



Vipetro Construções e Montagens Industriais LTDA
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN

Matheus Nascimento Tomaz
Engenheiro Civil
CREA-PB 1622307640
Matrícula: 30994
SECOB/HMCG



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	Nº 2.08.030/2024

RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	17/09/2025	280
240	279	-39				

QUADRO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS																				
Chuvvas/Horas	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30
Improdutivo																				
Impraticável																				

ATIVIDADES EXECUTADAS

ATIVIDADES PRINCIPAIS EM EXECUTADAS:

CANAL PRINCIPAL E VIAS DO CANAL

DESFORMA E REAPLICAÇÃO DE FORMA PARA CONCRETAGEM DA PAREDE CANAL

APLICAÇÃO DE REBOCO DE REVESTIMENTO DA PISO DO CANAL

CICLOVIA/CALÇADA

IRRIGAÇÃO DA GRAMA PLANTADA

CONCRETAGEM DE CALÇADAS/CICLOVIA

REGULARIZAÇÃO DE CALÇADAS E CICLOVIAS

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

APLICAÇÃO DE POSTES

CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM

ESCAVAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL

APLICAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL

CONCRETAGEM DE ELETRODUTO FLEXÍVEL

PONTE ROTATORIA

CONCRETAGEM CAMADA DE REGULARIZAÇÃO PARA APOIO DA LAJE

DESFORMA E REAPLICAÇÃO DE FORMA BLOCO DA FUNDAÇÃO LADO ESQUERDO

PONTE ESTACA 45+15: APÓS ESTUDO DA ATECEL VERIFICOU-SE QUE NÃO TEMOS NESTE LOCAL SOLO COM CAPACIDADE DE SUPORTE PARA RECEBER O BLOCO ESTRUTURAL DA FUNDAÇÃO, VERIFICOU-SE TAMBÉM QUE A PRESENÇA DE ÁGUA AFLORANDO. SOLICITAMOS A FISCALIZAÇÃO ORIENTAÇÃO SOBRE COMO PROCEDER. NOSSA FRENTE DE SERVIÇO SE ENCONTRA PARALISADA DESDE DO DIA 23/07/2025.

CONTINUAMOS NO AGUARDAR DE PROVIDÊNCIAS COM RELAÇÃO AS INTERFERÊNCIAS QUE ESTÃO IMPEDINDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS CALÇADAS, CONFORME CROCI JÁ ENVIANDO NO DIA 28/04.

REITEIRAMOS QUE, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, OS REPAROS NO EMISSÁRIO DA CAGEPA NÃO FORAM REALIZADOS, RESULTANDO NA MANUTENÇÃO DE UM VOLUME CONSIDERÁVEL DE ESGOTO CORRENDO A CÉU ABERTO, JUSTAMENTE AO LADO DA PAREDE DO CANAL QUE SE ENCONTRA EM FASE DE EXECUÇÃO. ESSA SITUAÇÃO TEM CAUSADO SÉRIOS TRANSTORNOS À CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS, ALÉM DE GERAR IMPACTOS NEGATIVOS À POPULAÇÃO DO ENTORNO, QUE CONVIVE COM OS EFEITOS DIRETOS DA EXPOSIÇÃO AO ESGOTO NÃO CONTIDO.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
Gerente de contrato	1	Encarregado de Obra Civil	4	Veículo Leve	5
Coordenador de sala técnica	1	Líder de Equipe	2	Retroescavadeira	2
Supervisor de Obra	1	Topógrafo (operador de GEORADAR)	1	Escavadeira Hidráulica	1
Engenheiro Civil	1	Apontador	2	Caminhão Munck	0
Topógrafo		Armador	3	Caminhão Cabinado	2
Técnico de planejamento	1	Pedreiro	14	Caminhão caçamba	1
Técnico de Segurança	1	Carpinteiro	7	Caminhão Melosa	1
Profissional de Licenciamento		Servente	24	Caminhão Pipa	1
Encarregado Administrativo	1	Operador de Escavadeira hidráulica	2	Carreta Munck	
Aux. Engenharia	1	Operador de Retroescavadeira	1		
Aux. SMS	1	Motorista de Caçamba	1		
ASG	2	Motorista de Cabinado	2		
Eletricista	1	Motorista de Caminhão Munck	0		
Aux. Eletricista		Motorista de Caminhão Comboio	1		
Almoxarife		Vigia Moturno	2		
Aux. Almoxarife	1				
Segurança Patrimonial	2				
TOTAL (Indireto)		TOTAL (Direto)		TOTAL (Equipamentos)	
15		66		13	

COMENTÁRIOS CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

Data	Contratada	Data	Fiscalização
	Vipetro Const. e Mont. Industriais LTDA Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5305 D/RN		Matheus Nat. Almeida Romaz Engenheiro Civil CREA-PE 1672307640 Matrícula: 30994 SECOB/PMCG

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	17/09/2025	280
240	279	-39				

ANEXOS:



Vipetro Const. e Mont. Industriais LTDA
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN

Matheus Nascimento Tomaz
Engenheiro Civil
CREA-PB 622307640
Matrícula 30994
SECOP/PMCG



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ



CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	17/09/2025	280
240	279	-39				



Vipetro Const. e Montagens Industriais LTDA

Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN

Matheus Nascimento Tomaz
Engenheiro Civil
CREA-PB 622307640
MTR 11/11/2024 30994
SFCB/PMCG



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCÓNGO

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCÓNGO, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	Nº 2.08.030/2024

RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	18/09/2025	281
240	280	-40				

QUADRO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS																				
Chuvvas/Horas	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30
Improdutivo																				
Impraticável																				

ATIVIDADES EXECUTADAS

ATIVIDADES PRINCIPAIS EM EXECUTADAS:

CANAL PRINCIPAL E VIAS DO CANAL

CONCRETAGEM DE PAREDE DO CANAL

APLICAÇÃO DE REBOCO DE REVESTIMENTO DA PISO DO CANAL

CICLOVIA/CALÇADA

PLANTIO DE GRAMA

CONCRETAGEM DE CALÇADAS/CICLOVIA

APLICAÇÃO DE MEIO FIO

PONTE ROTATORIA

DESFORMA E REAPLICAÇÃO DE FORMA BLOCO DA FUNDAÇÃO LADO ESQUERDO

PONTE ESTACA 45+15: APÓS ESTUDO DA ATECEL VERIFICOU-SE QUE NÃO TEMOS NESTE LOCAL SOLO COM CAPACIDADE DE SUPORTE PARA RECEBER O BLOCO ESTRUTURAL DA FUNDAÇÃO, VERIFICOU-SE TAMBÉM QUE A PRESENÇA DE ÁGUA AFLORANDO. SOLICITAMOS A FISCALIZAÇÃO ORIENTAÇÃO SOBRE COMO PROCEDER. NOSSA FRENTE DE SERVIÇO SE ENCONTRA PARALISADA DESDE DO DIA 23/07/2025.

CONTINUAMOS NO AGUARDO DE PROVIDÊNCIAS COM RELAÇÃO AS INTERFERÊNCIAS QUE ESTÃO IMPEDINDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS CALÇADAS, CONFORME CROCI JÁ ENVIANDO NO DIA 28/04.

REITEIRAMOS QUE, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, OS REPAROS NO EMISSÁRIO DA CAGEPA NÃO FORAM REALIZADOS, RESULTANDO NA MANUTENÇÃO DE UM VOLUME CONSIDERÁVEL DE ESGOTO CORRENDO A CÉU ABERTO, JUSTAMENTE AO LADO DA PAREDE DO CANAL QUE SE ENCONTRA EM FASE DE EXECUÇÃO. ESSA SITUAÇÃO TEM CAUSADO SÉRIOS TRANSTORNOS À CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS, ALÉM DE GERAR IMPACTOS NEGATIVOS À POPULAÇÃO DO ENTORNO, QUE CONVIVE COM OS EFEITOS DIRETOS DA EXPOSIÇÃO AO ESGOTO NÃO CONTIDO.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
Gerente de contrato	1	Encarregado de Obra Civil	4	Veículo Leve	5
Coordenador de sala técnica	1	Líder de Equipe	2	Retroescavadeira	2
Supervisor de Obra	1	Topógrafo (operador de GEORADAR)	1	Escavadeira Hidráulica	1
Engenheiro Civil	1	Apontador	2	Caminhão Munck	0
Topógrafo		Armador	3	Caminhão Cabinado	2
Técnico de planejamento	1	Pedreiro	14	Caminhão caçamba	1
Técnico de Segurança	1	Carpinteiro	7	Caminhão Melosa	1
Profissional de Licenciamento		Servente	24	Caminhão Pipa	1
Encarregado Administrativo	1	Operador de Escavadeira hidráulica	2	Carreta Munck	
Aux. Engenharia	1	Operador de Retroescavadeira	1		
Aux. SMS	1	Motorista de Caçamba	1		
ASG	2	Motorista de Cabinado	2		
Eletricista	1	Motorista de Caminhão Munck	0		
Aux. Eletricista		Motorista de Caminhão Comboio	1		
Almoxarife		Vigia Moturno	2		
Aux. Almoxarife	1				
Segurança Patrimonial	2				
TOTAL (Indireto)		15	TOTAL (Direto)		66
			TOTAL (Equipamentos)		13



COMENTÁRIOS CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

Data	Contratada	Data	Fiscalização
	Vipetro Const. e Mont. Industriais LTDA Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5305 D RN		Matheus Nascimento Tomaz Engenheiro Civil CREA-PE 1522307640 Matrícula: 80994 SECOP/PMCG

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCÓNGO, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORES DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INÍCIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	18/09/2025	281
240	280	-40				


ANEXOS:

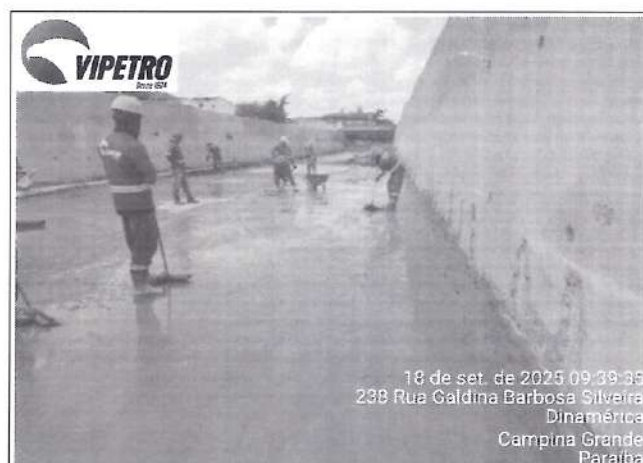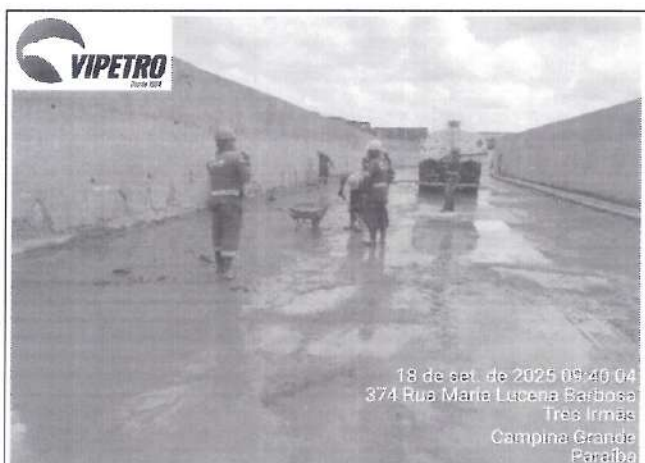

Vipetro Const. e Mont. Industriais LTDA
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN

Matheus Nascimento Tomaz
Engenheiro Civil
CREA-PB 1682807640
Matrícula 30994
SECOB/PMCG

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	18/09/2025	281
240	280	-40				

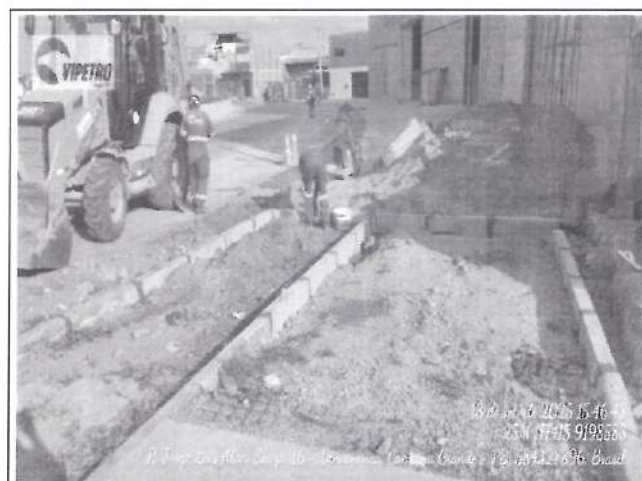


Vipetro Const. e Mont. Industriais LTDA
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN

Matheus Nascimento Tomaz
Engenheiro Civil
CREA-PB 1522307640
Matrícula: 30994
SECOP/PMCG

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS		INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº	
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE				
240	281	-41	12/12/2024	09/08/2025	19/09/2025	282

ANEXOS:

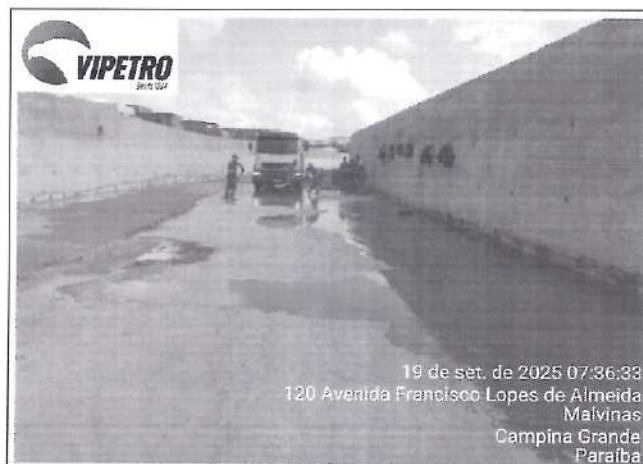

Vipetro Const. e Mont. Industriais LTDA
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN

Matheus Nascimento Tomaz
Engenheiro Civil
CREA-PB 1602307640
Matrícula 30984
SECOB/PMCG



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÔ

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÔ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	Nº 2.08.030/2024

RESUMOS DE DIAS			INÍCIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	20/09/2025	283
240	282	-42				

QUADRO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS																				
Chuvvas/Horas	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30
Improdutivo																				
Impraticável																				

ATIVIDADES EXECUTADAS

ATIVIDADES PRINCIPAIS EM EXECUTADAS:

CANAL PRINCIPAL E VIAS DO CANAL

APLICAÇÃO DE REBOCO DE REVESTIMENTO DA PISO DO CANAL

REALIZAMOS A LIBERAÇÃO DA ÁGUA DO CANAL PARA CORRER POR DENTRO DO CANAL, PARA QUE ASSIM POSSAMOS INICIAR AS ATIVIDADES NA FUNDAÇÃO DA PONTE ROTATORIA DO LADO DIREITO E NO FECHAMENTO DA PAREDE DAS CABECEIRAS DO CANAL NO LADO DIREITO.

PONTE ESTACA 45+15: APÓS ESTUDO DA ATECEL VERIFICOU-SE QUE NÃO TEMOS NESTE LOCAL SOLO COM CAPACIDADE DE SUPORTE PARA RECEBER O BLOCO ESTRUTURAL DA FUNDAÇÃO, VERIFICOU-SE TAMBÉM QUE A PRESENÇA DE ÁGUA AFLORANDO. SOLICITAMOS A FISCALIZAÇÃO ORIENTAÇÃO SOBRE COMO PROCEDER. NOSSA FRENTE DE SERVIÇO SE ENCONTRA PARALISADA DESDE DO DIA 23/07/2025.

CONTINUAMOS NO AGUARDO DE PROVIDÊNCIAS COM RELAÇÃO AS INTERFERÊNCIAS QUE ESTÃO IMPEDINDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS CALÇADAS, CONFORME CROCI JÁ ENVIANDO NO DIA 28/04.

REITEIRAMOS QUE, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, OS REPAROS NO EMISSÁRIO DA CAGEPA NÃO FORAM REALIZADOS, RESULTANDO NA MANUTENÇÃO DE UM VOLUME CONSIDERÁVEL DE ESGOTO CORRENDO A CÉU ABERTO, JUSTAMENTE AO LADO DA PAREDE DO CANAL QUE SE ENCONTRA EM FASE DE EXECUÇÃO. ESSA SITUAÇÃO TEM CAUSADO SÉRIOS TRANSTORNOS À CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS, ALÉM DE GERAR IMPACTOS NEGATIVOS À POPULAÇÃO DO ENTORNO, QUE CONVIVE COM OS EFEITOS DIRETOS DA EXPOSIÇÃO AO ESGOTO NÃO CONTIDO.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
Gerente de contrato	1	Encarregado de Obra Civil	4	Veículo Leve	5
Coordenador de sala técnica	1	Líder de Equipe	2	Retroescavadeira	2
Supervisor de Obra	1	Topógrafo (operador de GEORADAR)	1	Escavadeira Hidráulica	1
Engenheiro Civil	1	Apontador	2	Caminhão Munk	0
Topógrafo		Armador	3	Caminhão Cabineado	2
Técnico de planejamento	1	Pedreiro	14	Caminhão caçamba	1
Técnico de Segurança	1	Caranteiro	7	Caminhão Melosa	1
Profissional de Licenciamento		Servente	24	Caminhão Pipa	1
Encarregado Administrativo	1	Operador de Escavadeira hidráulica	2	Carreta Munk	
Aux. Engenharia	1	Operador de Retroescavadeira	1		
Aux. SMS	1	Motorista de Caçamba	1		
ASG	2	Motorista de Cabineado	2		
Eletricista	1	Motorista de Caminhão Munk	0		
Aux. Eletricista		Motorista de Caminhão Comboio	1		
Almoxarife		Vigia Moturno	2		
Aux. Almoxarife	1				
Segurança Patrimonial	2				
TOTAL (Indireto)		TOTAL (Direto)		TOTAL (Equipamentos)	
		66		13	

COMENTÁRIOS CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

Data	Contratada	Data	Fiscalização
	Vipetro Const. e Montagens Industriais LTDA Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5505 D-RR		Matheus Nascimento Tomaz Engenheiro Civil CREA/PE 1622307640 Matrícula: 30994 SECOB/PMCG




RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ



CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INÍCIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	20/09/2025	283
240	282	-42				

ANEXOS:

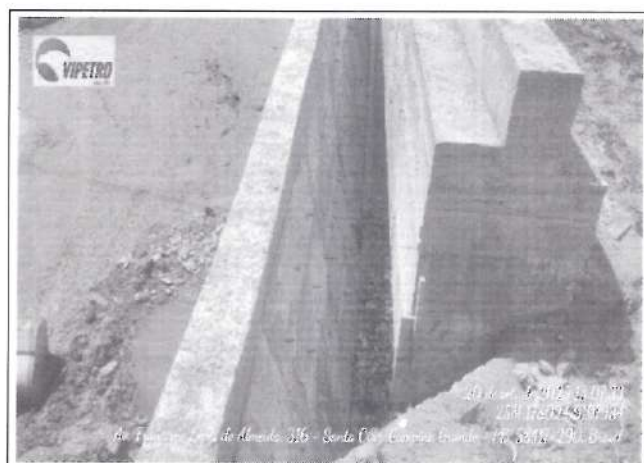

Vipetro Const. e Mont. Industriais LTDA

Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN

Matheus Nascimento Tomaz
Engenheiro Civil
CREA-PB 1022307640
Matrícula: 30984
SECOP/PMCG



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORES DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	Nº 2.08.030/2024

RESUMOS DE DIAS			INÍCIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	21/09/2025	284
240	283	-43				

QUADRO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS																				
Chuvvas/Horas	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30
Improdutivo																				
Impraticável																				

ATIVIDADES EXECUTADAS

ATIVIDADES PRINCIPAIS EM EXECUÇÃO:

SEM ATIVIDADES - DESCANSO SEMANAL

PONTE ESTACA 45+15: APÓS ESTUDO DA ATECEL VERIFICOU-SE QUE NÃO TEMOS NESTE LOCAL SOLO COM CAPACIDADE DE SUPORTE PARA RECEBER O BLOCO ESTRUTURAL DA FUNDAÇÃO, VERIFICOU-SE TAMBÉM QUE A PRESENÇA DE ÁGUA AFLORANDO. SOLICITAMOS A FISCALIZAÇÃO ORIENTAÇÃO SOBRE COMO PROCEDER. NOSSA FRENTE DE SERVIÇO SE ENCONTRA PARALISADA DESDE DO DIA 23/07/2025.

CONTINUAMOS NO AGUARDAR DE PROVIDÊNCIAS COM RELAÇÃO AS INTERFERÊNCIAS QUE ESTÃO IMPEDINDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS CALÇADAS, CONFORME CROCI JÁ ENVIANDO NO DIA 28/04.

REITEIRAMOS QUE, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, OS REPAROS NO EMISSÁRIO DA CAGEPA NÃO FORAM REALIZADOS, RESULTANDO NA MANUTENÇÃO DE UM VOLUME CONSIDERÁVEL DE ESGOTO CORRENDO A CÉU ABERTO, JUSTAMENTE AO LADO DA PAREDE DO CANAL QUE SE ENCONTRA EM FASE DE EXECUÇÃO. ESSA SITUAÇÃO TEM CAUSADO SÉRIOS TRANSTORNOS À CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS, ALÉM DE GERAR IMPACTOS NEGATIVOS À POPULAÇÃO DO ENTORNO, QUE CONVIVE COM OS EFEITOS DIRETOS DA EXPOSIÇÃO AO ESGOTO NÃO CONTIDO.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
Gerente de contrato	1	Encarregado de Obra Civil	4	Veículo Leve	5
Coordenador de sala técnica	1	Líder de Equipe	2	Retroescavadeira	2
Supervisor de Obra	1	Topógrafo (operador de GEORADAR)	1	Escavadeira Hidráulica	1
Engenheiro Civil	1	Apontador	2	Caminhão Munck	0
Topógrafo		Armador	3	Caminhão Cabineado	2
Técnico de planejamento	1	Pedreiro	14	Caminhão caçamba	1
Técnico de Segurança	1	Carpinteiro	7	Caminhão Melosa	1
Profissional de Licenciamento		Servente	24	Caminhão Pipa	1
Encarregado Administrativo	1	Operador de Escavadeira hidráulica	2	Carreta Munck	
Aux. Engenharia	1	Operador de Retroescavadeira	1		
Aux. SMS	1	Motorista de Caçamba	1		
ASG	2	Motorista de Cabinada	2		
Eletricista	1	Motorista de Caminhão Munck	0		
Aux. Eletricista		Motorista de Caminhão Comboio	1		
Almoxarife		Vigia Moturno	2		
Aux. Almoxarife	1				
Segurança Patrimonial	2				
TOTAL (Indireto)	15	TOTAL (Direto)	66	TOTAL (Equipamentos)	13

COMENTÁRIOS CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

Data	Fiscalização
Vipetro Const. e Montagens Industriais LTDA Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5305 D-BA	Matheus Nascimento Tomaz Engenheiro Civil CREA-PA 2307640 Matheus Nascimento Tomaz SECOP/PMCG



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	Nº 2.08.030/2024

RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	22/09/2025	285
240	284	-44				

QUADRO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS																				
Chuvvas/Horas	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30
Improdutivo																				
Impraticável																				

ATIVIDADES EXECUTADAS

ATIVIDADES PRINCIPAIS EM EXECUTADAS:

CANAL PRINCIPAL E VIAS DO CANAL

APLICAÇÃO DE REBOCO DE REVESTIMENTO DA PAREDE DO CANAL

APLICAÇÃO DE FORMA PARA CONCRETAGEM DE PAREDE DO CANAL LADO DIREITO, FECHAMENTO DO CANAL.

CONCRETAGEM DE PISO DO CANAL, LOCAL DO ANTIGO DESVIO.

CALÇADAS/CICLOVIAS

PLANTIO DE GRAMA

IRRIGAÇÃO DA GRAMA

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CONSTRUÇÃO BASE DE CONCRETO PARA POSTE

PONTE ESTACA 45+15: APÓS ESTUDO DA ATECEL VERIFICOU-SE QUE NÃO TEMOS NESTE LOCAL SOLO COM CAPACIDADE DE SUPORTE PARA RECEBER O BLOCO ESTRUTURAL DA FUNDAÇÃO, VERIFICOU-SE TAMBÉM QUE A PRESENÇA DE ÁGUA AFLORANDO. SOLICITAMOS A FISCALIZAÇÃO ORIENTAÇÃO SOBRE COMO PROCEDER. NOSSA FRENTE DE SERVIÇO SE ENCONTRA PARALISADA DESDE DO DIA 23/07/2025.

CONTINUAMOS NO AGUARDAR DE PROVIDÊNCIAS COM RELAÇÃO AS INTERFERÊNCIAS QUE ESTÃO IMPEDINDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS CALÇADAS, CONFORME CROCI JÁ ENVIANDO NO DIA 28/04.

REITEIRAMOS QUE, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, OS REPAROS NO EMISSÁRIO DA CAGEPA NÃO FORAM REALIZADOS, RESULTANDO NA MANUTENÇÃO DE UM VOLUME CONSIDERÁVEL DE ESGOTO CORRENDO A CÉU ABERTO, JUSTAMENTE AO LADO DA PAREDE DO CANAL QUE SE ENCONTRA EM FASE DE EXECUÇÃO. ESSA SITUAÇÃO TEM CAUSADO SÉRIOS TRANSTORNOS À CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS, ALÉM DE GERAR IMPACTOS NEGATIVOS À POPULAÇÃO DO ENTORNO, QUE CONVIVE COM OS EFEITOS DIRETOS DA EXPOSIÇÃO AO ESGOTO NÃO CONTIDO.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
Gerente de contrato	1	Encarregado de Obra Civil	4	Veículo Leve	5
Coordenador de sala técnica	1	Lider de Equipe	2	Retroescavadeira	2
Supervisor de Obra	1	Topógrafo (operador de GEORADAR)	1	Escavadeira Hidráulica	1
Engenheiro Civil	1	Apontador	2	Caminhão Munck	0
Topógrafo		Armador	3	Caminhão Cabinado	2
Técnico de planejamento	1	Pedreiro	14	Caminhão caçamba	1
Técnico de Segurança	1	Carpinteiro	7	Caminhão Melosa	1
Profissional de Licenciamento		Servente	24	Caminhão Pipa	1
Encarregado Administrativo	1	Operador de Escavadeira hidráulica	2	Carreta Munck	
Aux. Engenharia	1	Operador de Retroescavadeira	1		
Aux. SMS	1	Motorista de Caçamba	1		
ASG	2	Motorista de Cabinado	2		
Eletricista	1	Motorista de Caminhão Munck	0		
Aux. Eletricista		Motorista de Caminhão Comboio	1		
Almoxarife		Vigia Moturno	2		
Aux. Almoxarife	1				
Segurança Patrimonial	2				
TOTAL (Indireto)	15	TOTAL (Direto)	66	TOTAL (Equipamentos)	13

COMENTÁRIOS CONTRATADA

A VIPETRO IDENTIFICOU A EXISTÊNCIA DE UMA TUBULAÇÃO DE DRENAGEM PROVENIENTE DE UM POSTO DE COMBUSTÍVEL LOCALIZADO NA ÁREA DA OBRA. PARA ATENDER À FUNCIONALIDADE DO SISTEMA, SERÁ NECESSÁRIO PROLONGAR ESSA TUBULAÇÃO EM APROXIMADAMENTE 10 METROS, DE MODO A DIRECIONAR SEU DESÁGUE PARA DENTRO DO CANAL DO BODOCONGÓ. ENTRETANTO, PARA A EXECUÇÃO DESSE PROLONGAMENTO, A TUBULAÇÃO DEVERÁ ATRAVESSAR O BLOCO DE FUNDAÇÃO DA PONTE SITUADA NA ROTATÓRIA. DIANTE DISSO, SOLICITAMOS A ORIENTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO QUANTO AO PROCEDIMENTO A SER ADOTADO, AVALIANDO A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MESMA SOLUÇÃO EXECUTADA NA PONTE DA ESTACA 45+15, ONDE FOI CONSTATADA SITUAÇÃO SEMELHANTE

FISCALIZAÇÃO

Data	Fiscalização
 Ednilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5395-D RN	 Matheus Nascimento Tomaz Engenheiro Civil CREA: 18.1682307640 Matrícula: 30994 SECOB/PMCG



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÔ

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÔ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	22/09/2025	285
240	284	-44				

ANEXOS:


Vipetro Const. e Mont. Industriais LTDA
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RNMatheus Nascimento Tomaz
Engenheiro Civil
CREA PB 1622307640
Matrícula: 10994
SECOP/PMCG



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INÍCIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	22/09/2025	285
240	284	-44				

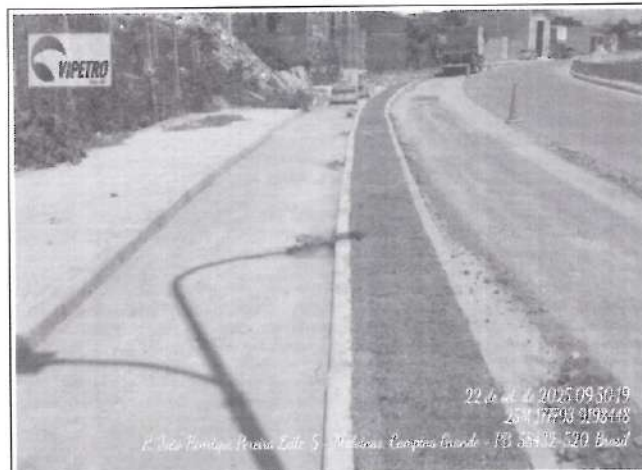Vipetro Const. e Mont. Industriais LTDA
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RNMatheus Nascimento Tomaz
Engenheiro Civil
CREA-PB 1622307640
Matrícula: 30994
SECOB/PMCG



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALHAMA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENADORIA DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORES DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	Nº 2.08.030/2024

RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	23/09/2025	286
240	285	-45				

QUADRO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS																				
Chuvvas/Hqras	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30
Improdutivo																				
Impraticável																				

ATIVIDADES EXECUTADAS

ATIVIDADES PRINCIPAIS EM EXECUTADAS:

CANAL PRINCIPAL E VIAS DO CANAL
APLICAÇÃO DE REBOCO DE REVESTIMENTO DA PAREDE DO CANAL
APLICAÇÃO DE FORMA PARA CONCRETAGEM DE PAREDE DO CANAL LADO DIREITO, FECHAMENTO DO CANAL.
CONCRETAGEM PAREDE DO CANAL
CALÇADAS/CICLOVIAS
PLANTIO DE GRAMA
IRRIGAÇÃO DA GRAMA
PONTE ROTATORIA
ESCAVAÇÃO FUNDAÇÃO LADO DIREITO
LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DO LEITO DA FUNDAÇÃO LADO DIREITO

NO DIA DE HOJE FORAM REALIZADAS ALGUMAS SONDAGENS SPT POR PARTE DA ACETEL PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DO LEITO FILTRANTE DA TERRAPLENAGEM DAS VIAS.

PONTE ESTACA 45+15: APÓS ESTUDO DA ATECEL VERIFICOU-SE QUE NÃO TEMOS NESTE LOCAL SOLO COM CAPACIDADE DE SUPORTE PARA RECEBER O BLOCO ESTRUTURAL DA FUNDAÇÃO, VERIFICOU-SE TAMBÉM QUE A PRESENÇA DE ÁGUA AFLORANDO. SOLICITAMOS A FISCALIZAÇÃO ORIENTAÇÃO SOBRE COMO PROCEDER. NOSSA FRENTE DE SERVIÇO SE ENCONTRA PARALISADA DESDE DO DIA 23/07/2025.

CONTINUAMOS NO AGUARDAR DE PROVIDÊNCIAS COM RELAÇÃO AS INTERFERÊNCIAS QUE ESTÃO IMPEDINDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS CALÇADAS, CONFORME CROCI JÁ ENVIANDO NO DIA 28/04.

REITEIRAMOS QUE, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, OS REPAROS NO EMISSÁRIO DA CAGEPA NÃO FORAM REALIZADOS, RESULTANDO NA MANUTENÇÃO DE UM VOLUME CONSIDERÁVEL DE ESGOTO CORRENDO A CÉU ABERTO, JUSTAMENTE AO LADO DA PAREDE DO CANAL QUE SE ENCONTRA EM FASE DE EXECUÇÃO. ESSA SITUAÇÃO TEM CAUSADO SÉRIOS TRANSTORNOS À CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS, ALÉM DE GERAR IMPACTOS NEGATIVOS À POPULAÇÃO DO ENTORNO, QUE CONVIVE COM OS EFEITOS DIRETOS DA EXPOSIÇÃO AO ESGOTO NÃO CONTIDO.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
Gerente de contrato	1	Encarregado de Obra Civil	4	Veículo Leve	5
Coordenador de sala técnica	1	Lider de Equipe	2	Retroescavadeira	2
Supervisor de Obra	1	Topógrafo (operador de GEORADAR)	1	Escavadeira Hidráulica	1
Engenheiro Civil	1	Apontador	2	Caminhão Munk	0
Topógrafo		Armador	3	Caminhão Cabinado	2
Técnico de planejamento	1	Pedreiro	14	Caminhão caçamba	1
Técnico de Segurança	1	Carpinteiro	7	Caminhão Melosa	1
Profissional de Licenciamento		Servente	24	Caminhão Pipa	1
Encarregado Administrativo	1	Operador de Escavadeira hidráulica	2	Carreta Munk	
Aux. Engenharia	1	Operador de Retroescavadeira	1		
Aux. SMS	1	Motorista de Caçamba	1		
ASG	2	Motorista de Cabinado	2		
Eletricista	1	Motorista de Caminhão Munk	0		
Aux. Eletricista		Motorista de Caminhão Comboio	1		
Almoxarife		Vigia Motorno	2		
Aux. Almoxarife	1				
Segurança Patrimonial	2				
TOTAL (Indireto)	15	TOTAL (Direto)	66	TOTAL (Equipamentos)	13

COMENTÁRIOS CONTRATADA



A VIPETRO IDENTIFICOU A EXISTÊNCIA DE UMA TUBULAÇÃO DE DRENAGEM PROVENIENTE DE UM POSTO DE COMBUSTÍVEL LOCALIZADO NA ÁREA DA OBRA. PARA ATENDER À FUNCIONALIDADE DO SISTEMA, SERÁ NECESSÁRIO PROLONGAR ESSA TUBULAÇÃO EM APROXIMADAMENTE 10 METROS, DE MODO A DIRECIONAR SEU DESÁGUE PARA DENTRO DO CANAL DO BODOCONGÓ. ENTRETANTO, PARA A EXECUÇÃO DESSE PROLONGAMENTO, A TUBULAÇÃO DEVERÁ ATRAVESSAR O BLOCO DE FUNDAÇÃO DA PONTE SITUADA NA ROTATÓRIA. DIANTE DISSO, SOLICITAMOS A ORIENTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO QUANTO AO PROCEDIMENTO A SER ADOTADO, AVALIANDO A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MESMA SOLUÇÃO EXECUTADA NA PONTE DA ESTACA 45+15, ONDE FOI CONSTATADA SITUAÇÃO SEMELHANTE

FISCALIZAÇÃO

Data	Contratada	Data	Fiscalização
	Vipetro Const. e Mont. Industriais LTDA Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5305 D RN		Matheus Nascimento Tomaz Engenheiro Civil CREA/PB 1622307640 Matrícula: 30994 SECOP/PMCG

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORES DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	23/09/2025	286
240	285	-45				

ANEXOS:

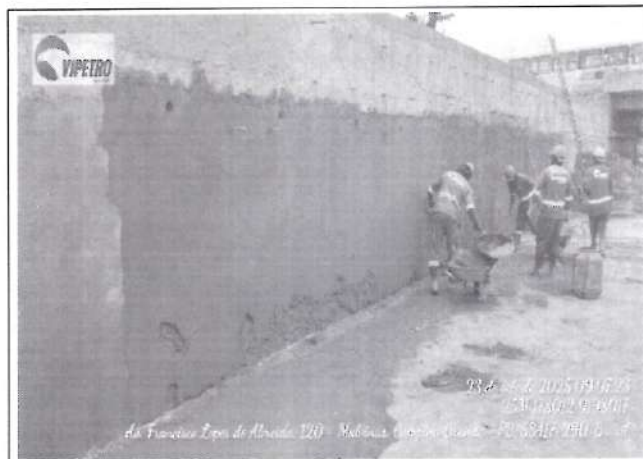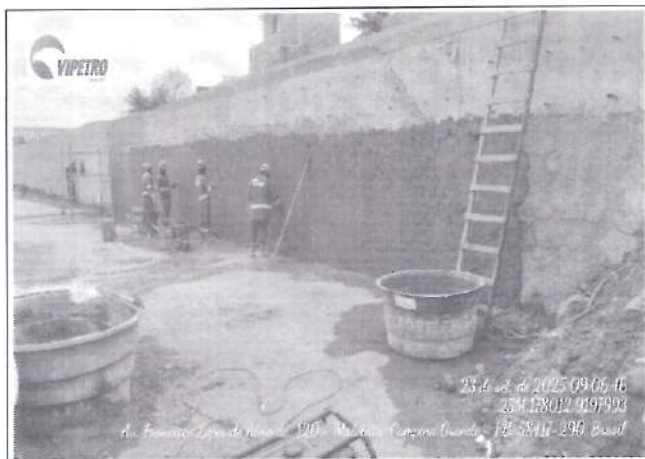

Vipetro Const. e Mont. Industriais LTDA

Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN

Matheus Nascimento Tomaz
Engenheiro Civil
CREA-PB 1622307640
Matrícula: 50994
SECOP/PMCG



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ



CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INÍCIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	23/09/2025	286
240	285	-45				



Vipetro Const. e Mont. Industriais LTDA
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN

Matheus Nascimento Tomaz
Engenheiro Civil
CREA-PB 1622307640
Matrícula: 30994
SECOB/PMCG



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	Nº 2.08.030/2024

RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	24/09/2025	287
240	285	-46				

QUADRO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS																					
Chuvvas/Horas	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00
Improdutivo																					
Impraticável																					

ATIVIDADES EXECUTADAS

ATIVIDADES PRINCIPAIS EM EXECUTADAS:

CANAL PRINCIPAL E VIAS DO CANAL

CONCRETAGEM PAREDE DO CANAL

CALÇADAS/CICLOVIAS

APLICAÇÃO DE MEIO FIO

IRRIGAÇÃO DA GRAMA

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

ESCAVAÇÃO, APLICAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL E CONCRETAGEM

PONTE ROTATORIA

LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DO LEITO DA FUNDAÇÃO LADO DIREITO

APLICAÇÃO DE FORMA PARA CONCRETAGEM FUNDAÇÃO LADO DIREITO

PONTE ESTACA 45+15: APÓS ESTUDO DA ATECEL VERIFICOU-SE QUE NÃO TEMOS NESTE LOCAL SOLO COM CAPACIDADE DE SUPORTE PARA RECEBER O BLOCO ESTRUTURAL DA FUNDAÇÃO, VERIFICOU-SE TAMBÉM QUE A PRESENÇA DE ÁGUA AFLORANDO. SOLICITAMOS A FISCALIZAÇÃO ORIENTAÇÃO SOBRE COMO PROCEDER. NOSSA FRENTE DE SERVIÇO SE ENCONTRA PARALISADA DESDE DO DIA 23/07/2025.

CONTINUAMOS NO AGUARDO DE PROVIDÊNCIAS COM RELAÇÃO AS INTERFERÊNCIAS QUE ESTÃO IMPEDINDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS CALÇADAS, CONFORME CROCRI JÁ ENVIANDO NO DIA 28/04.

REITEIRAMOS QUE, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, OS REPAROS NO EMISSÁRIO DA CAGEPA NÃO FORAM REALIZADOS, RESULTANDO NA MANUTENÇÃO DE UM VOLUME CONSIDERÁVEL DE ESGOTO CORRENDO A CÉU ABERTO, JUSTAMENTE AO LADO DA PAREDE DO CANAL QUE SE ENCONTRA EM FASE DE EXECUÇÃO. ESSA SITUAÇÃO TEM CAUSADO SÉRIOS TRANSTORNOS À CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS, ALÉM DE GERAR IMPACTOS NEGATIVOS À POPULAÇÃO DO ENTORNO, QUE CONVIVE COM OS EFEITOS DIRETOS DA EXPOSIÇÃO AO ESGOTO NÃO CONTIDO.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
Gerente de contrato	1	Encarregado de Obra Civil	4	Veículo Leve	5
Coordenador de sala técnica	1	Lider de Equipe	2	Retroescavadeira	2
Supervisor de Obra	1	Topógrafo (operador de GEORADAR)	1	Escavadeira Hidráulica	1
Engenheiro Civil	1	Apontador	2	Caminhão Munck	0
Topógrafo		Armador	3	Caminhão Cabineado	2
Técnico de planejamento	1	Pedreiro	14	Caminhão caçamba	1
Técnico de Segurança	1	Carpinteiro	7	Caminhão Melosa	1
Profissional de Licenciamento		Servente	24	Caminhão Pipa	1
Encarregado Administrativo	1	Operador de Escavadeira hidráulica	2	Carreta Munck	
Aux. Engenharia	1	Operador de Retroescavadeira	1		
Aux. SMS	1	Motorista de Caçamba	1		
ASG	2	Motorista de Cabineado	2		
Eletricista	1	Motorista de Caminhão Munck	0		
Aux. Eletricista		Motorista de Caminhão Comboio	1		
Almoxarife		Vigia Moturno	2		
Aux. Almoxarife	1				
Segurança Patrimonial	2				
TOTAL (Indireto)	15	TOTAL (Direto)	66	TOTAL (Equipamentos)	13

COMENTÁRIOS CONTRATADA


A VIPETRO IDENTIFICOU A EXISTÊNCIA DE UMA TUBULAÇÃO DE DRENAGEM PROVENIENTE DE UM POSTO DE COMBUSTÍVEL LOCALIZADO NA ÁREA DA OBRA. PARA ATENDER À FUNCIONALIDADE DO SISTEMA, SERÁ NECESSÁRIO PROLONGAR ESSA TUBULAÇÃO EM APROXIMADAMENTE 10 METROS, DE MODO A DIRECIONAR SEU DESÁGUE PARA DENTRO DO CANAL DO BODOCONGÓ. ENTRETANTO, PARA A EXECUÇÃO DESSE PROLONGAMENTO, A TUBULAÇÃO DEVERÁ ATRAVESSAR O BLOCO DE FUNDAÇÃO DA PONTE SITUADA NA ROTATÓRIA. DIANTE DISSO, SOLICITAMOS A ORIENTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO QUANTO AO PROCEDIMENTO A SER ADOTADO, AVALIANDO A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MESMA SOLUÇÃO EXECUTADA NA PONTE DA ESTACA 45+15, ONDE FOI CONSTATADA SITUAÇÃO SEMELHANTE

FISCALIZAÇÃO

Data	Contratada	Data	Fiscalização
	Vipetro Const. e Montagens Industriais Ltda Edenilson Pinto Bezerra Gerente de contrato CREA 5305 D RN		Matheus Nascimento Tomaz Engenheiro Civil CREA 1662307640 Matrícula: 30994 SECOP/PMCG

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORES DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	24/09/2025	287
240	286	-46				



ANEXOS:

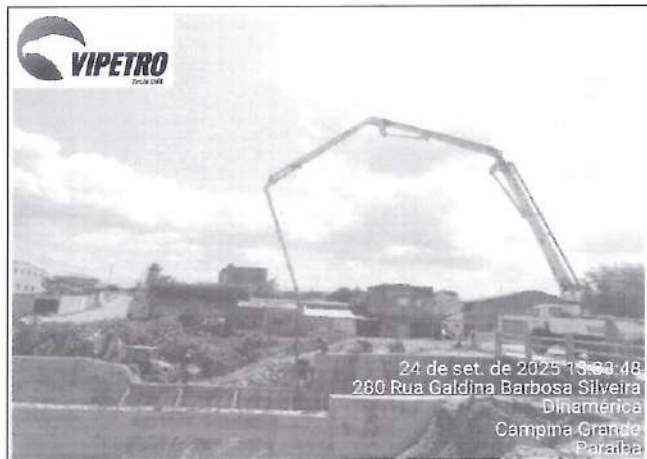

Vipetro Const. e Mont. Industriais LTDA
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CPF: 0305 D RN

Matheus Nascimento Tomaz
Engenheiro Civil
CREA/PB 1622307640
Matrícula: 30994
SECOB/PMCG

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÔ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORES DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	24/09/2025	287
240	286	-46				

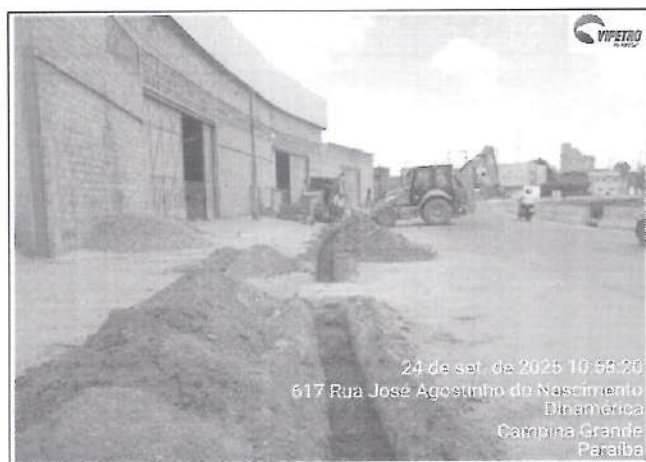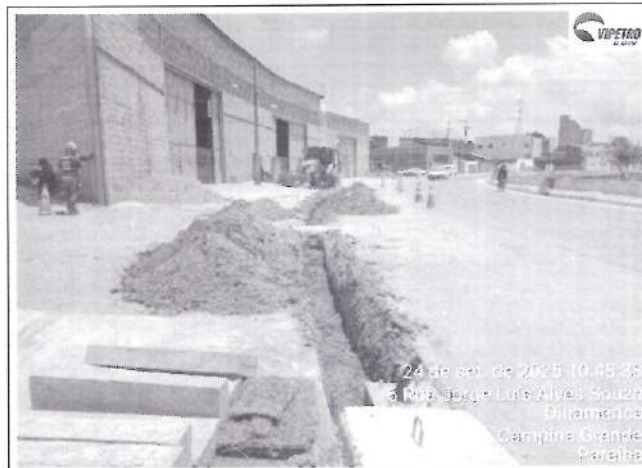

Mathys Nascimento Tomaz
Engenheiro Civil
CREA/PB 1622307640
Matrícula: 30994
RECOP/PMCG

Vipetro Const. e Mont. Industriais LTDA
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINHA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	Nº 2.08.030/2024

RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	25/09/2025	288
240	287	-47				

QUADRO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS																				
Chuvvas/Horas	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30
Improdutivo																				
Impraticável																				

ATIVIDADES EXECUTADAS

ATIVIDADES PRINCIPAIS EM EXECUTADAS:

CANAL PRINCIPAL E VIAS DO CANAL

APLICAÇÃO DE REBOCO DE REVESTIMENTO DA PAREDE DO CANAL

APLICAÇÃO DE REBOCO DE REVESTIMENTO DA PISO DO CANAL

CALÇADAS/CICLOVIAS

CONCRETAGEM DE CALÇADA/CICLOVIA

IRRIGAÇÃO DA GRAMA

PONTE ROTATORIA

LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DO LEITO DA FUNDAÇÃO LADO DIREITO

APLICAÇÃO DE FORMA PARA CONCRETAGEM FUNDAÇÃO LADO DIREITO

PONTE ESTACA 45+15: APÓS ESTUDO DA ATECEL VERIFICOU-SE QUE NÃO TEMOS NESTE LOCAL SOLO COM CAPACIDADE DE SUPORTE PARA RECEBER O BLOCO ESTRUTURAL DA FUNDAÇÃO, VERIFICOU-SE TAMBÉM QUE A PRESENÇA DE ÁGUA AFLORANDO. SOLICITAMOS A FISCALIZAÇÃO ORIENTAÇÃO SOBRE COMO PROCEDER. NOSSA FRENTE DE SERVIÇO SE ENCONTRA PARALISADA DESDE DO DIA 23/07/2025.

CONTINUAMOS NO AGUARDAR DE PROVIDÊNCIAS COM RELAÇÃO AS INTERFERÊNCIAS QUE ESTÃO IMPEDINDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS CALÇADAS, CONFORME CROCI JÁ ENVIANDO NO DIA 28/04.

REITEIRAMOS QUE, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, OS REPAROS NO EMISSÁRIO DA CAGEPA NÃO FORAM REALIZADOS, RESULTANDO NA MANUTENÇÃO DE UM VOLUME CONSIDERÁVEL DE ESGOTO CORRENDO A CÉU ABERTO, JUSTAMENTE AO LADO DA PAREDE DO CANAL QUE SE ENCONTRA EM FASE DE EXECUÇÃO. ESSA SITUAÇÃO TEM CAUSADO SÉRIOS TRANSTORNOS À CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS, ALÉM DE GERAR IMPACTOS NEGATIVOS À POPULAÇÃO DO ENTORNO, QUE CONVIVE COM OS EFEITOS DIRETOS DA EXPOSIÇÃO AO ESGOTO NÃO CONTIDO.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
Gerente de contrato	1	Encarregado de Obra Civil	4	Veículo Leve	5
Coordenador de sala técnica	1	Lider de Equipe	2	Retroescavadeira	2
Supervisor de Obra	1	Topógrafo (operador de GEORADAR)	1	Escavadeira Hidráulica	1
Engenheiro Civil	1	Apontador	2	Caminhão Munck	0
Topógrafo		Armador	3	Caminhão Cabinado	2
Técnico de planejamento	1	Pedreiro	14	Caminhão caçamba	1
Técnico de Segurança	1	Carpinteiro	7	Caminhão Melosa	1
Profissional de Licenciamento		Servente	24	Caminhão Pipa	1
Encarregado Administrativo	1	Operador de Escavadeira hidráulica	2	Carreta Munck	
Aux. Engenharia	1	Operador de Retroescavadeira	1		
Aux. SMS	1	Motorista de Caçamba	1		
ASG	2	Motorista de Cabinado	2		
Eletricista	1	Motorista de Caminhão Munck	0		
Aux. Eletricista		Motorista de Caminhão Comboio	1		
Almoxarife		Vigia Moturno	2		
Aux. Almoxarife	1				
Segurança Patrimonial	2				
TOTAL (Indireto)	15	TOTAL (Direto)	66	TOTAL (Equipamentos)	13

COMENTÁRIOS CONTRATADA

A VIPETRO IDENTIFICOU A EXISTÊNCIA DE UMA TUBULAÇÃO DE DRENAGEM PROVENIENTE DE UM POSTO DE COMBUSTÍVEL LOCALIZADO NA ÁREA DA OBRA. PARA ATENDER À FUNCIONALIDADE DO SISTEMA, SERÁ NECESSÁRIO PROLONGAR ESSA TUBULAÇÃO EM APROXIMADAMENTE 10 METROS, DE MODO A DIRECIONAR SEU DESÁGUE PARA DENTRO DO CANAL DO BODOCONGÓ. ENTRETANTO, PARA A EXECUÇÃO DESSE PROLONGAMENTO, A TUBULAÇÃO DEVERÁ ATRAVESSAR O BLOCO DE FUNDAÇÃO DA PONTE SITUADA NA ROTATÓRIA. DIANTE DISSO, SOLICITAMOS A ORIENTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO QUANTO AO PROCEDIMENTO A SER ADOTADO, AVALIANDO A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MESMA SOLUÇÃO EXECUTADA NA PONTE DA ESTACA 45+15, ONDE FOI CONSTATADA SITUAÇÃO SEMELHANTE.

VIPETRO INFORMA QUE SEGUNDO ORIENTAÇÃO DO COORDENADOR DE OBRAS RAIMUNDO, A CITAÇÃO A CIMA SERÁ EXECUTADA PASSANDO A TUBULAÇÃO POR DENTRO DA FUNDAÇÃO E PAREDE DO CANAL.


VIPETRO INFORMA QUE PARA RESOLVER A INTERFERÊNCIA ENTRE A CORTINA DE CONTENÇÃO DO ATERRO EXISTENTE, DA PONTE DO CRUZEIRO E A FUNDAÇÃO DA PONTE DA ROTATORIA 01 LADO DIREITO, O COORDENADOR DE OBRAS RAIMUNDO AUTORIZOU A REDUÇÃO DO COMPRIMENTO DO BLOCO ESTRUTURAL DA FUNDAÇÃO LADO DIREITO DE 24,10 M PARA 23,10 M.

FISCALIZAÇÃO

Data	Contratada	Data	Fiscalização
	Vipetro Const. e Mont. Industriais LTDA Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5305 D RN		Matheus Nascimento Tomaz Engenheiro Civil CREA-PA 1622307640 Matrícula: 30994 SECOB/PMCG

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES,PASSARELAS,CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORES DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	25/09/2025	288
240	287	-47				

ANEXOS:

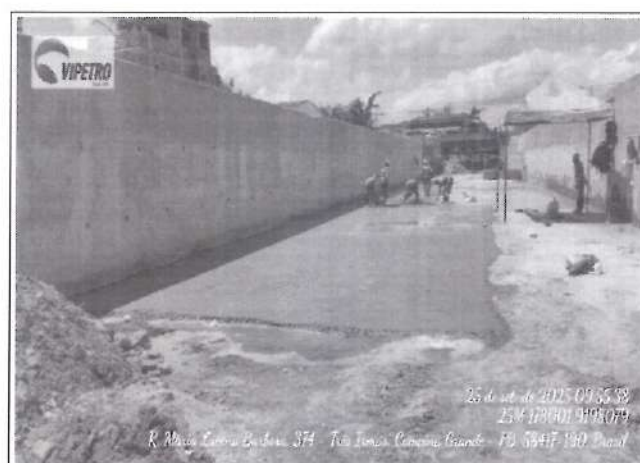

Vipetro Const. e Mont. Industriais LTDA
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN

Matheus Nascimento Tomaz
Engenheiro Civil
CREA-PB 1622307640
Matrícula: 30994
SECOB/PMCG






RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ



CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA				CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.				Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	25/09/2025
240	287	-47			288

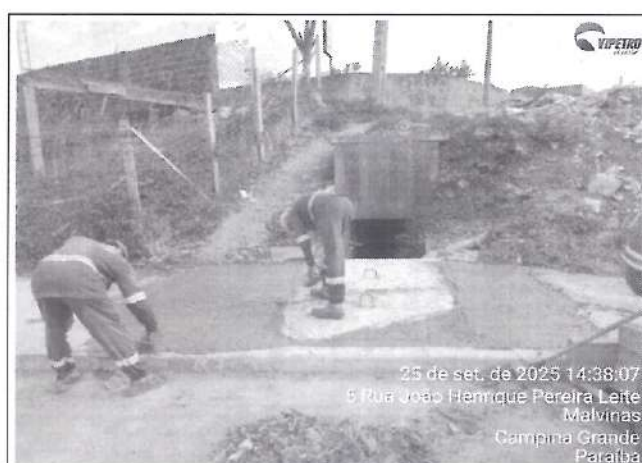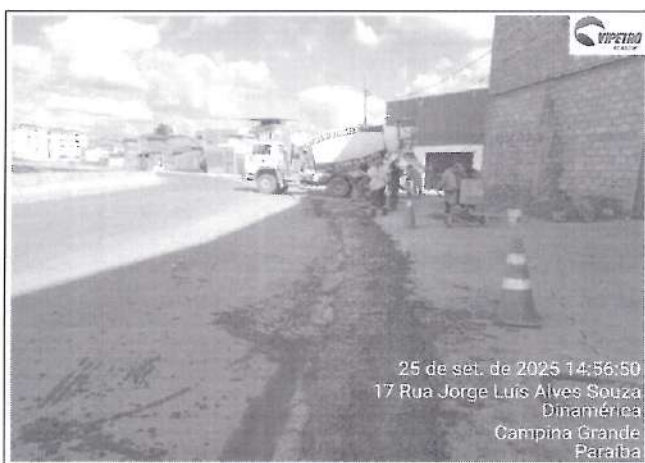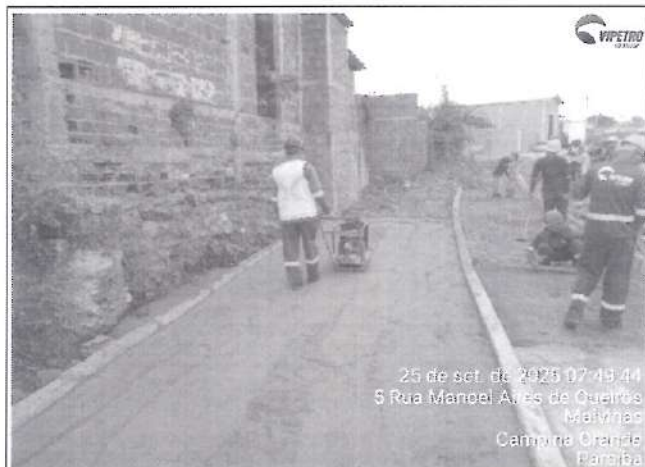

Vipetro Const. e Mont. Industriais LTDA

Ednilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN

Matheus Nascimento Tomaz
Engenheiro Civil
CREA-PB 1622387640
Matrícula 30994
SECOP/PMCG



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	Nº 2.08.030/2024

RESUMOS DE DIAS			INÍCIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	26/09/2025	289
240	288	-48				

QUADRO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS																				
Chuvvas/Horas	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30
Improdutivo																				
Impraticável																				

ATIVIDADES EXECUTADAS

ATIVIDADES PRINCIPAIS EM EXECUTADAS:

CANAL PRINCIPAL E VIAS DO CANAL

APLICAÇÃO DE REBOCO DE REVESTIMENTO DA PAREDE DO CANAL

APLICAÇÃO DE REBOCO DE REVESTIMENTO DA PISO DO CANAL

CALÇADAS/CICLOVIAS

CORTE DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO

ACABAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE CANTEIRO

PONTE ROTATORIA

CONCRETAGEM DO BLOCO DE FUNDAÇÃO LADO DIREITO

PONTE ESTACA 45+15: APÓS ESTUDO DA ATECEL VERIFICOU-SE QUE NÃO TEMOS NESTE LOCAL SOLO COM CAPACIDADE DE SUPORTE PARA RECEBER O BLOCO ESTRUTURAL DA FUNDAÇÃO, VERIFICOU-SE TAMBÉM QUE A PRESENÇA DE ÁGUA AFLORANDO. SOLICITAMOS A FISCALIZAÇÃO ORIENTAÇÃO SOBRE COMO PROCEDER. NOSSA FRENTE DE SERVIÇO SE ENCONTRA PARALISADA DESDE DO DIA 23/07/2025.

PONTE ESTACA 45+15: A SECOB INFORMA QUE A PONTE DA ESTACA 45+15 ESTA CANCELADA

CONTINUAMOS NO AGUARDO DE PROVIDÊNCIAS COM RELAÇÃO AS INTERFERÊNCIAS QUE ESTÃO IMPEDINDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS CALÇADAS, CONFORME CROCI JÁ ENVIANDO NO DIA 28/04.

REITEIRAMOS QUE, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, OS REPAROS NO EMISSÁRIO DA CAGEPA NÃO FORAM REALIZADOS, RESULTANDO NA MANUTENÇÃO DE UM VOLUME CONSIDERÁVEL DE ESGOTO CORRENDO A CÉU ABERTO, JUSTAMENTE AO LADO DA PAREDE DO CANAL QUE SE ENCONTRA EM FASE DE EXECUÇÃO. ESSA SITUAÇÃO TEM CAUSADO SÉRIOS TRANSTORNOS À CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS, ALÉM DE GERAR IMPACTOS NEGATIVOS À POPULAÇÃO DO ENTORNO, QUE CONVIVE COM OS EFEITOS DIRETOS DA EXPOSIÇÃO AO ESGOTO NÃO CONTIDO.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
Gerente de contrato	1	Encarregado de Obra Civil	4	Veículo Leve	5
Coordenador de sala técnica	1	Lider de Equipe	2	Retroescavadeira	2
Supervisor de Obra	1	Topógrafo (operador de GEORADAR)	1	Escavadeira Hidráulica	1
Engenheiro Civil	1	Apontador	2	Caminhão Munck	0
Topógrafo		Armador	3	Caminhão Cabinado	2
Técnico de planejamento	1	Pedreiro	14	Caminhão caçamba	1
Técnico de Segurança	1	Carpinteiro	7	Caminhão Melosa	1
Profissional de Licenciamento		Servente	24	Caminhão Pipa	1
Encarregado Administrativo	1	Operador de Escavadeira hidráulica	2	Carreta Munck	
Aux. Engenharia	1	Operador de Retroescavadeira	1		
Aux. SMS	1	Motorista de Caçamba	1		
ASG	2	Motorista de Cabinado	2		
Eletricista	1	Motorista de Caminhão Munck	0		
Aux. Eletricista		Motorista de Caminhão Comboio	1		
Almoxarife		Vigia Moturno	2		
Aux. Almoxarife	1				
Segurança Patrimonial	2				
TOTAL (Indireto)	15	TOTAL (Direto)	66	TOTAL (Equipamentos)	13

COMENTÁRIOS CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

Data	Assinatura	Data	Assinatura
	 Ednilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5385 URN		 Matheus Nascimento Tomaz Engenheiro Civil CREA-RN 1622307640 Matheus 30894 SECOB/PMCG



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INÍCIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	26/09/2025	289
240	288	-48				

ANEXOS:



Vipetro Const. e Mont. Industriais LTDA
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN

Matheus Nascimento Tomaz
Engenheiro Civil
CREA-PB 1622307640
Matrícula: 30994
SECOP/PMCG



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	Nº 2.08.030/2024

RESUMOS DE DIAS			INÍCIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	27/09/2025	290
240	289	-49				

QUADRO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS																				
Chuvvas/Horas	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30
Improdutivo																				
Impraticável																				

ATIVIDADES EXECUTADAS

ATIVIDADES PRINCIPAIS EM EXECUTADAS:

CANAL PRINCIPAL E VIAS DO CANAL

APLICAÇÃO DE REBOCO DE REVESTIMENTO DA PAREDE DO CANAL

APLICAÇÃO DE REBOCO DE REVESTIMENTO DA PISO DO CANAL

DESFORMA E REAPLICAÇÃO DE FORMA PARA CONCRETAGEM DA PAREDE CANAL

PONTE ROTATORIA

DESFORMA E REAPLICAÇÃO DE FORMA PARA CONCRETAGEM FUNDAÇÃO LADO DIREITO

CONTINUAMOS NO AGUARDAR DE PROVIDÊNCIAS COM RELAÇÃO AS INTERFERÊNCIAS QUE ESTÃO IMPEDINDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS CALÇADAS, CONFORME CROCI JÁ ENVIANDO NO DIA 28/04.

REITERAMOS QUE, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, OS REPAROS NO EMISSÁRIO DA CAGEPA NÃO FORAM REALIZADOS, RESULTANDO NA MANUTENÇÃO DE UM VOLUME CONSIDERÁVEL DE ESGOTO CORRENDO A CÉU ABERTO, JUSTAMENTE AO LADO DA PAREDE DO CANAL QUE SE ENCONTRA EM FASE DE EXECUÇÃO. ESSA SITUAÇÃO TEM CAUSADO SÉRIOS TRANSTORNOS À CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS, ALÉM DE GERAR IMPACTOS NEGATIVOS À POPULAÇÃO DO ENTORNO, QUE CONVIVE COM OS EFEITOS DIRETOS DA EXPOSIÇÃO AO ESGOTO NÃO CONTIDO.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
Gerente de contrato	1	Encarregado de Obra Civil	4	Veículo Leve	5
Coordenador de sala técnica	1	Líder de Equipe	2	Retroescavadeira	2
Supervisor de Obra	1	Topógrafo (operador de GEORADAR)	1	Escavadeira Hidráulica	1
Engenheiro Civil	1	Apostador	2	Caminhão Munck	0
Topógrafo		Armador	3	Caminhão Cabinado	2
Técnico de planejamento	1	Pedreiro	14	Caminhão cacamba	1
Técnico de Segurança	1	Carpinteiro	7	Caminhão Melosa	1
Profissional de Licenciamento		Servente	24	Caminhão Pipa	1
Encarregado Administrativo	1	Operador de Escavadeira hidráulica	2	Carreta Munck	
Aux. Engenharia	1	Operador de Retroescavadeira	1		
Aux. SMS	1	Motorista de Cacamba	1		
ASG	2	Motorista de Cabinado	2		
Eletricista	1	Motorista de Caminhão Munck	0		
Aux. Eletricista		Motorista de Caminhão Comboio	1		
Almoxarife		Vigia Moturno	2		
Aux. Almoxarife	1				
Segurança Patrimonial	2				
TOTAL (Indireto)	15	TOTAL (Direto)	66	TOTAL (Equipamentos)	13


COMENTÁRIOS CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

Data	Contratada	Data	Fiscalização
	Vipetro Const. e Mont. Industriais LTDA Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5305 D RN		Matheus Nascimento Tomaz Engenheiro Civil CREA- PB 1822307640 Matrícula: 30994 SECOB/PMCG

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INÍCIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	27/09/2025	290
240	289	-49				

ANEXOS:

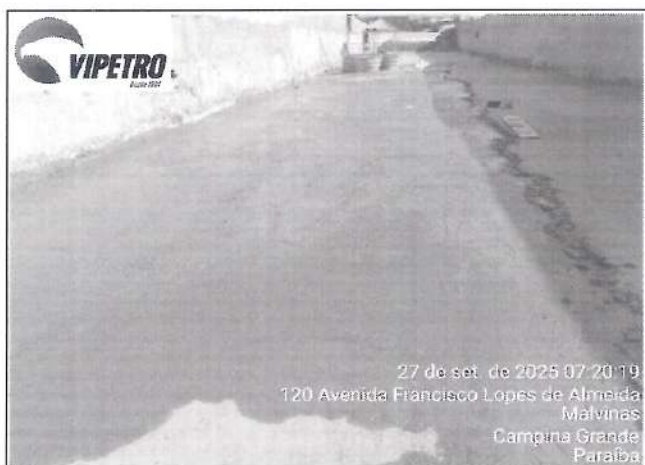

Vipetro Const. e Mont. Industriais LTDA
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN

Matheus Nascimento Tomaz
Engenheiro Civil
CREA-PB 1622307640
Matrícula: 30994
SECOB/PMCG



Matheus Nascimento Tomaz
Engenheiro Civil
CREA-PB/1622307640
Matrícula: 30994
SECOB/PMCG



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	Nº 2.08.030/2024

RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	29/09/2025	292
240	291	-51				

QUADRO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS																						
Chuvvas/Horas	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30
Improdutivo																						
Impraticável																						

ATIVIDADES EXECUTADAS

ATIVIDADES PRINCIPAIS EM EXECUTADAS:

CANAL PRINCIPAL E VIAS DO CANAL

CONCRETAGEM PAREDE DO CANAL

PONTE ROTATORIA

APLICAÇÃO DE FORMA PARA CONCRETAGEM FUNDAÇÃO LADO DIREITO

CONCRETAGEM DO BLOCO DE FUNDAÇÃO LADO DIREITO

CONTINUAMOS NO AGUARDANDO DE PROVIDÊNCIAS COM RELAÇÃO AS INTERFERÊNCIAS QUE ESTÃO IMPEDINDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS CALÇADAS, CONFORME CROCI JÁ ENVIANDO NO DIA 28/04.

REITEIRAMOS QUE, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, OS REPAROS NO EMISSÁRIO DA CAGEPA NÃO FORAM REALIZADOS, RESULTANDO NA MANUTENÇÃO DE UM VOLUME CONSIDERÁVEL DE ESGOTO CORRENDO A CÉU ABERTO, JUSTAMENTE AO LADO DA PAREDE DO CANAL QUE SE ENCONTRA EM FASE DE EXECUÇÃO. ESSA SITUAÇÃO TEM CAUSADO SÉRIOS TRANSTORNOS À CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS, ALÉM DE GERAR IMPACTOS NEGATIVOS À POPULAÇÃO DO ENTORNO, QUE CONVIVE COM OS EFEITOS DIRETOS DA EXPOSIÇÃO AO ESGOTO NÃO CONTIDO.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
Gerente de contrato	1	Encarregado de Obra Civil	4	Veículo Leve	5
Coordenador de sala técnica	1	Líder de Equipe	2	Retroescavadeira	2
Supervisor de Obra	1	Topógrafo (operador de GEORADAR)	1	Escavadeira Hidráulica	1
Engenheiro Civil	1	Apontador	2	Caminhão Munck	0
Topógrafo		Armador	4	Caminhão Cabineado	1
Técnico de planejamento	1	Pedreiro	14	Caminhão caçamba	1
Técnico de Segurança	1	Carpinteiro	6	Caminhão Melosa	1
Profissional de Licenciamento		Servente	23	Caminhão Pipa	1
Encarregado Administrativo	1	Operador de Escavadeira hidráulica	2	Carreta Munck	
Aux. Engenharia	1	Operador de Retroescavadeira	1		
Aux. SMS	1	Motorista de Caçamba	1		
ASG	2	Motorista de Cabineado	1		
Eletricista	1	Motorista de Caminhão Munck	0		
Aux. Eletricista		Motorista de Caminhão Comboio	1		
Almoxarife		Vigia Motorno	2		
Aux. Almoxarife	1				
Segurança Patrimonial	2				
TOTAL (Indireto)	15	TOTAL (Direto)	64	TOTAL (Equipamentos)	12

COMENTÁRIOS CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

Data	Contratada	Data	Fiscalização
	Vipetro Const. e Mont. Industriais LTDA Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5385 D RN		Matheus Nascimento Tomaz Engenheiro Civil CREA-PE 1622307640 Matriculad 30994 SECOB/PMCG




RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÔ

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÔ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INÍCIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	29/09/2025	292
240	291	-51				

ANEXOS:

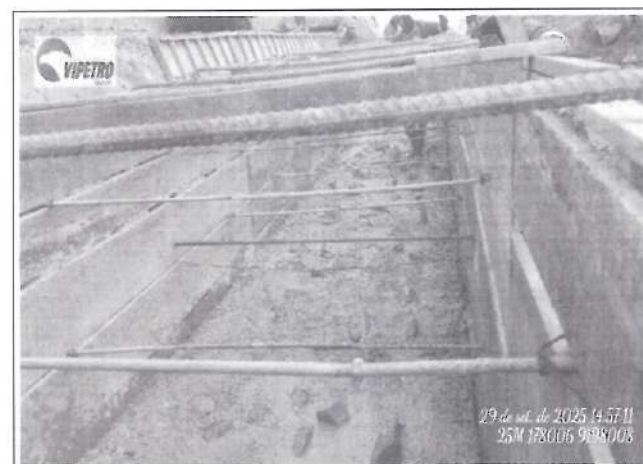

Vipetro Const. e Mont. Industriais LTDA
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN

Matheus Nascimento Tomaz
Engenheiro Civil
CREA-PB 1622307640
Matrícula: 30994
SECOP/PMCG



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:		VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA															CONTRATO						
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.															Nº 2.08.030/2024							
RESUMOS DE DIAS			INÍCIO REAL - AC 1			TÉRMINO CONTRATUAL			DATA ATUAL			RDO Nº											
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024			09/08/2025			30/09/2025			293											
240	292	-52																					
QUADRO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS																							
Chuvvas/Horas	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30	
Improdutivo																							
Impraticável																							
ATIVIDADES EXECUTADAS																							
ATIVIDADES PRINCIPAIS EM EXECUTADAS:																							
CANAL PRINCIPAL E VIAS DO CANAL																							
DESFORMA E REAPLICAÇÃO DE FORMA PARA CONCRETAGEM DA PAREDE CANAL																							
PONTE ROTATORIA																							
DESFORMA E REAPLICAÇÃO DE FORMA DO BLOCO DE FUNDAÇÃO LADO DIREITO																							
PONTE ESTACA 19																							
LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE LEITO PARA EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM PARA FUTURA LIBERAÇÃO DA VIA.																							
CONTINUAMOS NO AGUARDANDO DE PROVIDÊNCIAS COM RELAÇÃO AS INTERFERÊNCIAS QUE ESTÃO IMPEDINDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS CALÇADAS, CONFORME CROCI JÁ ENVIANDO NO DIA 28/04.																							
REITEIRAMOS QUE, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, OS REPAROS NO EMISSÁRIO DA CAGEPA NÃO FORAM REALIZADOS, RESULTANDO NA MANUTENÇÃO DE UM VOLUME CONSIDERÁVEL DE ESGOTO CORRENDO A CÉU ABERTO, JUSTAMENTE AO LADO DA PAREDE DO CANAL QUE SE ENCONTRA EM FASE DE EXECUÇÃO. ESSA SITUAÇÃO TEM CAUSADO SÉRIOS TRANSTORNOS À CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS, ALÉM DE GERAR IMPACTOS NEGATIVOS À POPULAÇÃO DO ENTORNO, QUE CONVIVE COM OS EFEITOS DIRETOS DA EXPOSIÇÃO AO ESGOTO NÃO CONTIDO.																							
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS																							
MÃO DE OBRA INDIRETA			MÃO DE OBRA DIRETA			EQUIPAMENTOS																	
Gerente de contrato	1		Encarregado de Obra Civil	4		Veículo Leve	5																
Coordenador de sala técnica	1		Lider de Equipe	2		Retroescavadeira	2																
Supervisor de Obra	1		Topógrafo (operador de GEORADAR)	1		Escavadeira Hidráulica	1																
Engenheiro Civil	1		Apontador	2		Caminhão Munck	0																
Topógrafo	1		Armador	4		Caminhão Cabinado	1																
Técnico de planejamento	1		Padreiro	14		Caminhão caçamba	1																
Técnico de Segurança	1		Carpinteiro	6		Caminhão Melosa	1																
Profissional de Licenciamento	1		Servente	23		Caminhão Pipa	1																
Encarregado Administrativo	1		Operador de Escavadeira hidráulica	2		Carreta Munck																	
Aux. Engenharia	1		Operador de Retroescavadeira	1																			
Aux. SMS	1		Motorista de Caçamba	1																			
ASG	2		Motorista de Cabinada	1																			
Eletricista	1		Motorista de Caminhão Munck	0																			
Aux. Eletricista			Motorista de Caminhão Comboio	1																			
Almoxarife			Vigia Moturno	2																			
Aux. Almoxarife	1																						
Segurança Patrimonial	2																						
TOTAL (Indireto)		15	TOTAL (Direto)		64	TOTAL (Equipamentos)		12															
COMENTÁRIOS CONTRATADA																							
FISCALIZAÇÃO																							
Data	Contratada															Data	Fiscalização						
	VIPETRO CONST. E MONT. INDUSTRIAIS LTDA																Matheus Nascimento Tomaz						
	Edenilson Pinto Bezerra																Engenheiro Civil						
	Gerente de Contrato																CREA-PB 1622307640						
	CREA 5305 D RN																Matrícula: 30994						
																	SECOB/PMCG						

Matheus Nascimento Tomaz
Engenheiro Civil
CREA-PB 1622307640
Matrícula: 30994
SECOB/PMCG

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORES DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INÍCIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	30/09/2025	293
240	292	-52				

ANEXOS:



Vipetro Const. e Mont. Industriais LTDA

Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN

Matheus Nascimento Tomaz
Engenheiro Civil
CREA-PB 1522307640
Matrícula: 30994
SECOB/PMCG
