



MÃO DE OBRA INDIRETA CTP		MÃO DE OBRA DIRETA CTP		EQUIPAMENTOS CTP			
Engenheiro Civil	1	Encarregado de Terraplenagem	1	Escavadeira Hidraulica	2		
		Encarregado de Transporte	1	Motoniveladora	2		
		Apontador	1	Retroescavadeira	1		
		Serventes	4	Caminhão Pipa	4		
		Motorista de Caminhão Pipa	4	Caminhão Basculante	10		
		Motorista de Caminhão Basculante	10	Rolo Compactador	2		
		Operador de Motoniveladora	2	Trator de Pneu	2		
		Operador de Escavadeira	2				
		Operador de Retroescavadeira	1				
		Operador de Trator de Pneu	1				
		Operador de Rolo Compactador	2				
		Laboratorista	1				
TOTAL (Indireto)	1	TOTAL (Direto)	30	TOTAL (Equipamentos)	23		

Data	Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda construção	Data	Fiscalização Júlio C. do Amaral Neto Engenheiro Civil CREA: 11676162022 PB
	Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5305 D RN		



RELATÓRIO DE SERVIÇOS


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGO

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA																CONTRATO					
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.																Nº 2.08.030/2024					
RESUMOS DE DIAS						INICIO REAL - AC 1				TÉRMINO CONTRATUAL				DATA ATUAL				RDO Nº				
CONTRATUAL		DECORRIDO		FALTANTE		12/12/2024				09/08/2025				02/02/2026				418				
240		417		-177																		
QUADRO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS																						
Chuvvas/Horas	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30
Improdutivo																						
Impraticável																						
ATIVIDADES EXECUTADAS																						
ATIVIDADES PRINCIPAIS EM EXECUTADAS:																						
TERRAPLENAGEM																						
INICIO DE EXECUÇÃO DE CAMADA DE ATERRO VIA LATERAL ESQUERDA																						
INICIO DE EXECUÇÃO DA CAMADA DE SUB BASE DA VIA LATERAL DIREITA																						
EXECUÇÃO DE CAMADA DE ATERRO VIA LATERAL DIREITA																						
CALÇADAS E CICLOVIAS																						
APLICAÇÃO DE MEIO FIO																						
REGULARIZAÇÃO DE CICLOVIA, CAMADA DE AREIA PARA CONCRETAGEM DE CICLOVIA																						
A VIPETRO INFORMA QUE ATENDERÁ À SOLICITAÇÃO DA SECOB PARA EXECUÇÃO DO ACESSO AO POSTO BORBOREMA. CONTUDO, REGISTRA-SE QUE, NO TRECHO EM QUESTÃO, EXISTE UMA CICLOVIA IMPLANTADA, PODENDO HAVER RISCO DE INCIDENTES OU ACIDENTES DECORRENTES DA INTERFERÊNCIA ENTRE O TRÁFEGO DE CICLISTAS E OS VEÍCULOS QUE ACESSARÃO O POSTO. RESSALTA-SE, AINDA, QUE A CALÇADA EXISTENTE FOI EXECUTADA EM CONCRETO COM RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA DE 15 MPA E ESPESSURA DE 8,0 CM, NÃO TENDO SIDO DIMENSIONADA PARA SUPORTAR TRÁFEGO VEICULAR. DESSA FORMA, É PROVÁVEL QUE O PAVIMENTO APRESENTE PATOLOGIAS PREMATURAS EM FUNÇÃO DAS CARGAS APLICADAS. DIANTE DO EXPOSTO, A VIPETRO ESCLARECE QUE NÃO PODERÁ GARANTIR A DURABILIDADE DO CONCRETO NESSE TRECHO ESPECÍFICO, UMA VEZ QUE SUA CONCEPÇÃO NÃO CONTEMPLA O USO PARA CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS. CASO SEJAM NECESSÁRIAS INTERVENÇÕES CORRETIVAS, MANUTENÇÕES OU RECOMPOSIÇÃO FUTURA, ESTAS DEVERÃO SER EXECUTADAS SOB RESPONSABILIDADE DA SECOB.																						
A VIPETRO RECEBEU NO DIA 08/12/2025 O ENSAIO DE LABORATÓRIO DO MATERIAL QUE SERÁ USADO NA EXECUÇÃO DA CAMADA DE SUB BASE. APÓS ANÁLISE DO RELATÓRIO DE CONTROLE TECNOLÓGICO Nº 519/2025, A VIPETRO CONCLUI QUE O MATERIAL DE JAZIDA ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DO DNIT PARA UTILIZAÇÃO COMO SUB-BASE, APRESENTANDO CBR ELEVADO, BAIXA EXPANSIVIDADE E POSSIBILIDADE DE COMPACTAÇÃO $\geq 100\%$ DO PROCTOR, CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DOS CONTROLES TECNOLÓGICOS DE CAMPO."																						
CONTINUAMOS NO AGUARDANDO DE PROVIDÊNCIAS COM RELAÇÃO AS INTERFERÊNCIAS QUE ESTÃO IMPEDINDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS CALÇADAS, CONFORME CROCI JÁ ENVIANDO NO DIA 28/04/2025.																						
COMENTÁRIOS CONTRATADA																						
FISCALIZAÇÃO																						
A SECOB SOLICITA À VIPETRO A EXECUÇÃO DE UM ACESSO PARA ENTRADA DE VEÍCULOS NO POSTO BORBOREMA, LOCALIZADO NA ESTACA DA ESTACA 77+3 A ESTACA 79+6, SITUADO NA VIA MARGINAL DO CANAL DE BODOCONGÓ, ATUALMENTE EM FASE DE EXECUÇÃO. RESSALTA-SE QUE O REFERIDO ACESSO NÃO CONSTA NO PROJETO ORIGINAL.																						
Data	Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda										Data	Fiscalização										
	Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5305 D RN											Julio C. do Amaral Neto Engenheiro Civil CREA: 11676162022 PB										



Data	Contratada	Data	Fiscalização
	Vipetro Constr. e Ind. Industriais Ltda Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5305 D RN		Julio C. do Amaral Neto Engenheiro Civil CREA: 11676162022 PB


CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	02/02/2026	418
240	417	-177				

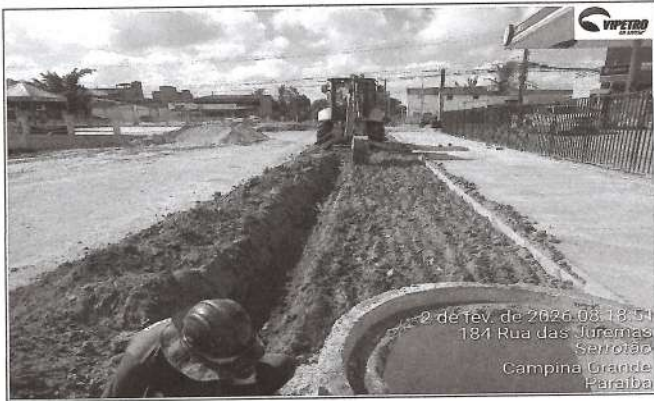

Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN

Julio C. do Amaral Neto
Engenheiro Civil
CREA: 1167616/2022 PB

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA				CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.				Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	02/02/2026
240	417	-177			418

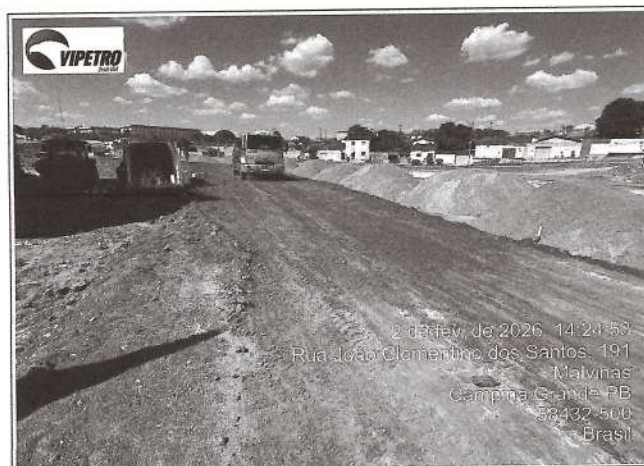

Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN

Julio C. do Amaral Neto
Engenheiro Civil
CREA: 1167616/2022 PB



RELATÓRIO DE SERVIÇOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA																CONTRATO					
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.																Nº 2.08.030/2024					
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1			TÉRMINO CONTRATUAL			DATA ATUAL			RDO Nº										
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024			09/08/2025			03/02/2026			419										
240	418	-178																				
QUADRO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS																						
Chuvvas/Horas	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30
Improdutivo																						
Impraticável																						
ATIVIDADES EXECUTADAS																						
ATIVIDADES PRINCIPAIS EM EXECUTADAS:																						
TERRAPLENAGEM																						
CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DE CAMADA DE ATERRO VIA LATERAL ESQUERDO																						
CONTINUAÇÃO DE EXECUÇÃO DA CAMADA DE SUB BASE DA VIA LATERAL DIREITA																						
EXECUÇÃO DE DRENAGEM MARGINAL DA VIA LATERAL ESQUERDA																						
CALÇADAS E CICLOVIAS																						
APLICAÇÃO DE MEIO FIO																						
REGULARIZAÇÃO DE CICLOVIA, CAMADA DE AREIA PARA CONCRETAGEM DE CICLOVIA																						
A VIPETRO INFORMA QUE ATENDERÁ À SOLICITAÇÃO DA SECOB PARA EXECUÇÃO DO ACESSO AO POSTO BORBOREMA. CONTUDO, REGISTRA-SE QUE, NO TRECHO EM QUESTÃO, EXISTE UMA CICLOVIA IMPLANTADA, PODENDO HAVER RISCO DE INCIDENTES OU ACIDENTES DECORRENTES DA INTERFERÊNCIA ENTRE O TRÁFEGO DE CICLISTAS E OS VEÍCULOS QUE ACESSARÃO O POSTO. RESSALTA-SE, AINDA, QUE A CALÇADA EXISTENTE FOI EXECUTADA EM CONCRETO COM RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA DE 15 MPa E ESPESURA DE 8,0 CM, NÃO TENDO SIDO DIMENSIONADA PARA SUPORTAR TRÁFEGO VEICULAR. DESSA FORMA, É PROVÁVEL QUE O PAVIMENTO APRESENTE PATOLOGIAS PREMATURAS EM FUNÇÃO DAS CARGAS APLICADAS. DIANTE DO EXPOSTO, A VIPETRO ESCLARECE QUE NÃO PODERÁ GARANTIR A DURABILIDADE DO CONCRETO NESSE TRECHO ESPECÍFICO, UMA VEZ QUE SUA CONCEPÇÃO NÃO CONTEMPLA O USO PARA CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS. CASO SEJAM NECESSÁRIAS INTERVENÇÕES CORRETIVAS, MANUTENÇÕES OU RECOMPOSIÇÃO FUTURA, ESTAS DEVERÃO SER EXECUTADAS SOB RESPONSABILIDADE DA SECOB.																						
A VIPETRO RECEBEU NO DIA 08/12/2025 O ENSAIO DE LABORATÓRIO DO MATERIAL QUE SERÁ USADO NA EXECUÇÃO DA CAMADA DE SUB BASE. APÓS ANÁLISE DO RELATÓRIO DE CONTROLE TECNOLÓGICO Nº 519/2025, A VIPETRO CONCLUI QUE O MATERIAL DE JAZIDA ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DO DNIT PARA UTILIZAÇÃO COMO SUB-BASE, APRESENTANDO CBR ELEVADO, BAIXA EXPANSIVIDADE E POSSIBILIDADE DE COMPACTAÇÃO $\geq 100\%$ DO PROCTOR, CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DOS CONTROLES TECNOLÓGICOS DE CAMPO."																						
CONTINUAMOS NO AGUARDANDO DE PROVIDÊNCIAS COM RELAÇÃO AS INTERFERÊNCIAS QUE ESTÃO IMPEDINDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS CALÇADAS, CONFORME CROCRI JÁ ENVIANDO NO DIA 28/04/2025.																						
COMENTÁRIOS CONTRATADA																						
FISCALIZAÇÃO																						
A SECOB SOLICITA À VIPETRO A EXECUÇÃO DE UM ACESSO PARA ENTRADA DE VEÍCULOS NO POSTO BORBOREMA, LOCALIZADO NA ESTACA DA ESTACA 77+3 A ESTACA 79+6, SITUADO NA VIA MARGINAL DO CANAL DE BODOCONGÓ, ATUALMENTE EM FASE DE EXECUÇÃO. RESSALTA-SE QUE O REFERIDO ACESSO NÃO CONSTA NO PROJETO ORIGINAL.																						
Data	Contratada										Data	Fiscalização										
	Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5305 D RN											Julio C. do Amaral Neto Engenheiro Civil CREA: 11676162022 PR										



Data	Contrato	Data	Fiscalização
	Vipetro Constr. e Ind. Industriais Ltda Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5305-D RN		Julio C. do Amaral Engenheiro Civil CREA: 116761620-PR




CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA				CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCÓNGO, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.				Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	03/02/2026
240	418	-178			419

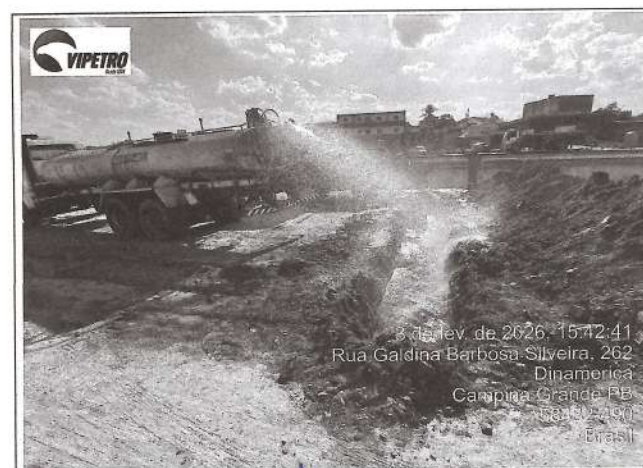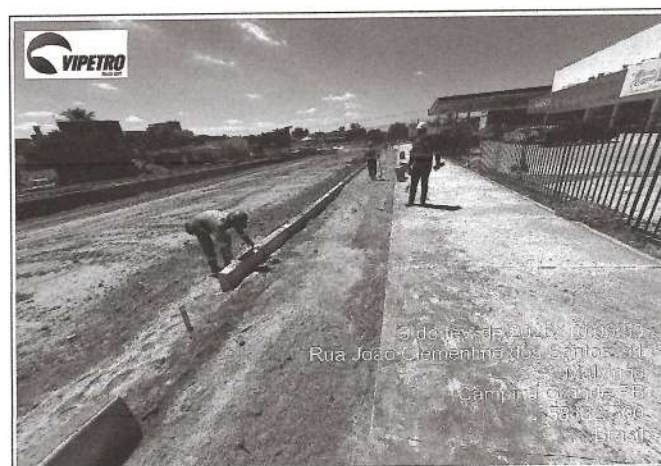

Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN

Julio C. do Amaral Neto
Engenheiro Civil
CREA: 11676162-22

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA				CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÔ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.				Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	03/02/2026
240	418	-178			419

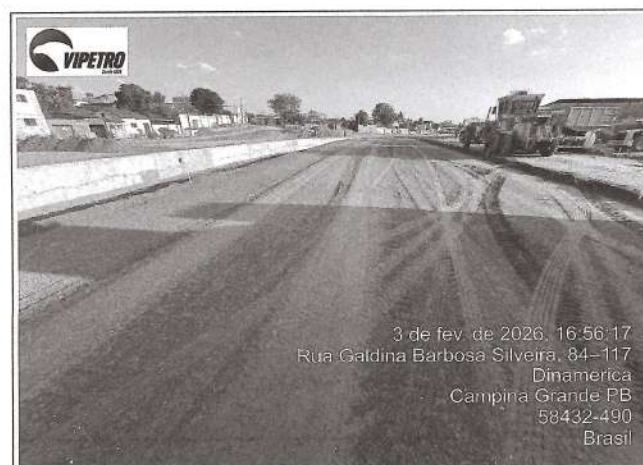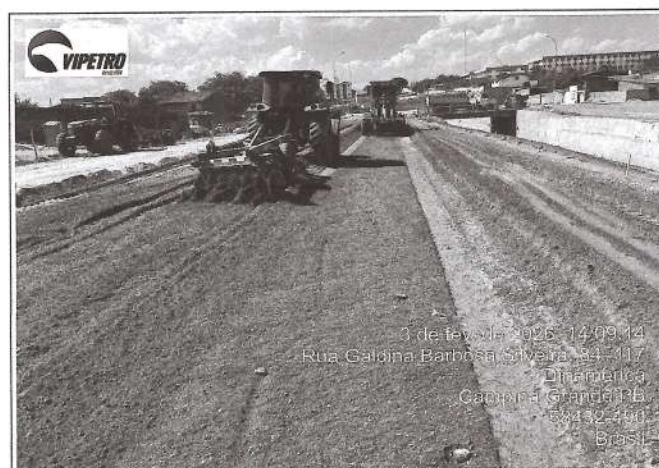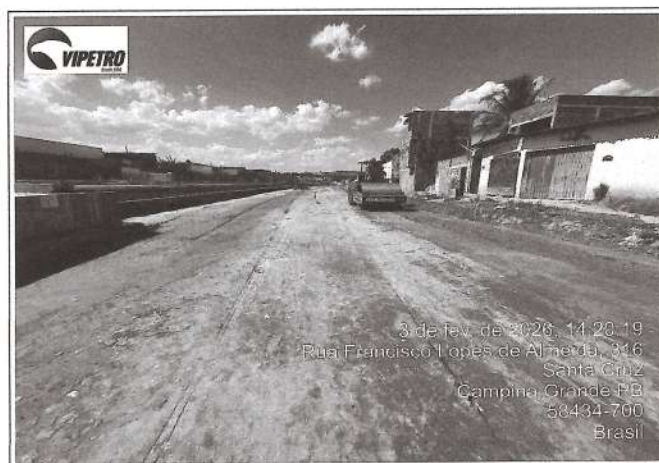

Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN

Julio C. do Amaral Neto
Engenheiro Civil
CREA: 11676162022 PB

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	04/02/2026	420
240	419	-179				



Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN


Julio C. do Amaral Neto
Engenheiro Civil
CREA: 11676162022 PB



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	04/02/2026	420
240	419	-179				

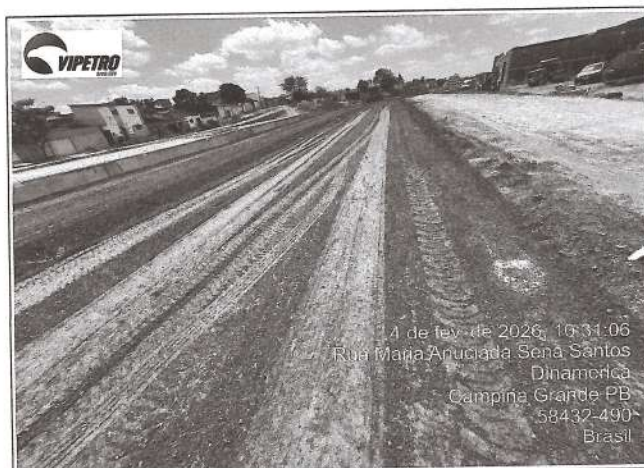



Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN

Julio C. do Amara
Engenheiro
CREA: 1167616/92



Data	Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda	Data	Fiscalização
	Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5305 D RN		Julio C. do Amaral Neto Engenheiro Civil CREA: 11676162022 PB

CONTRATADA:			VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA			CONTRATO	
OBRA:			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.			Nº 2.08.030/2024	
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº	
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	05/02/2026	421	
240	420	-180					

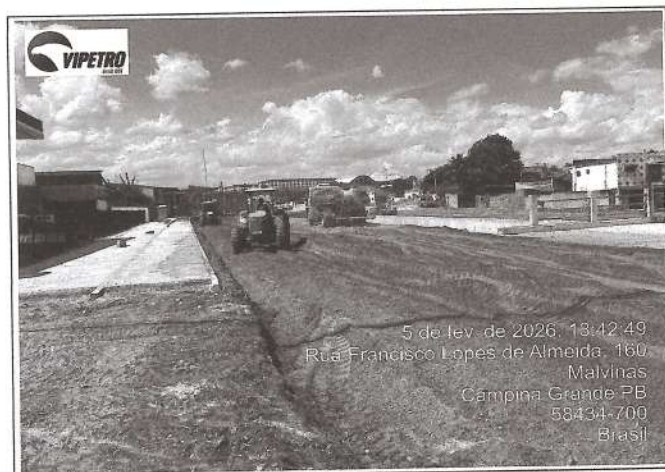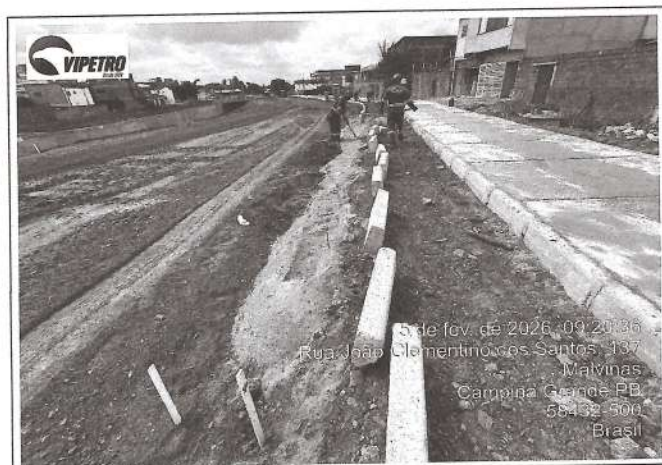

Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN



Julio C. do Amaral Neto
Engenheiro Civil
CREA: 11676162022 PB



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INÍCIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	05/02/2026	421
240	420	-180				

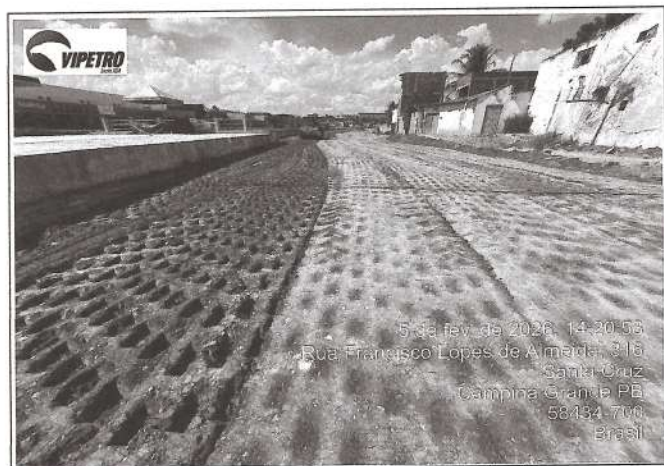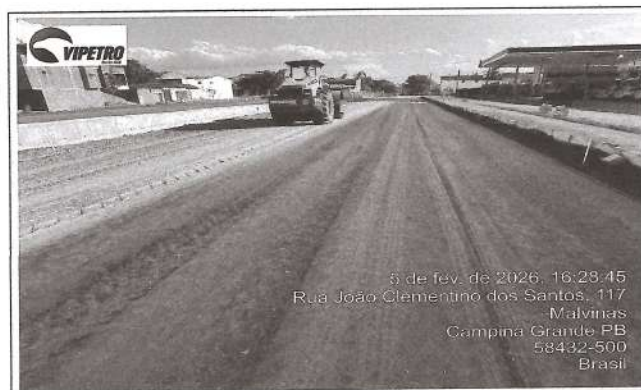

Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN

Julio C. do Amaral Neto
Engenheiro Civil
CREA: 11676162022 PB



RELATÓRIO DE SERVIÇOS


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGO

CONTRATADA:		VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA														CONTRATO						
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.														Nº 2.08.030/2024							
RESUMOS DE DIAS				INICIO REAL - AC 1				TÉRMINO CONTRATUAL				DATA ATUAL				RDO Nº						
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024				09/08/2025				06/02/2026				422							
240	421	-181																				
QUADRO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS																						
Chuvvas/Horas	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30
Improdutivo																						
Impraticável																						
ATIVIDADES EXECUTADAS																						
ATIVIDADES PRINCIPAIS EM EXECUTADAS:																						
TERRAPLENAGEM																						
AS ATIVIDADES DE TERRAPLENAGEM FORAM PARALISADAS DEVIDO A FORTES CHUVAS.																						
CALÇADAS E CICLOVIAS																						
APLICAÇÃO DE MEIO FIO																						
REGULARIZAÇÃO DE CICLOVIA, CAMADA DE AREIA PARA CONCRETAGEM DE CICLOVIA																						
REGISTRO DE CHUVA, 21,6 MM. CONFORME SITE DO INMET: https://tempo.inmet.gov.br/TabelaEstacoes/A001																						
A VIPETRO INFORMA QUE ATENDERÁ À SOLICITAÇÃO DA SECOP PARA EXECUÇÃO DO ACESSO AO POSTO BORBOREMA. CONTUDO, REGISTRA-SE QUE, NO TRECHO EM QUESTÃO, EXISTE UMA CICLOVIA IMPLANTADA, PODENDO HAVER RISCO DE INCIDENTES OU ACIDENTES DECORRENTES DA INTERFERÊNCIA ENTRE O TRÁFEGO DE CICLISTAS E OS VEÍCULOS QUE ACESSARÃO O POSTO. RESSALTA-SE, AINDA, QUE A CALÇADA EXISTENTE FOI EXECUTADA EM CONCRETO COM RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA DE 15 MPA E ESPESSURA DE 8,0 CM, NÃO TENDO SIDO DIMENSIONADA PARA SUPORTAR TRÁFEGO VEICULAR. DESSA FORMA, É PROVÁVEL QUE O PAVIMENTO APRESENTE PATOLOGIAS PREMATURAS EM FUNÇÃO DAS CARGAS APLICADAS. DIANTE DO EXPOSTO, A VIPETRO ESCLARECE QUE NÃO PODERÁ GARANTIR A DURABILIDADE DO CONCRETO NESSE TRECHO ESPECÍFICO, UMA VEZ QUE SUA CONCEPÇÃO NÃO CONTEMPLA O USO PARA CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS. CASO SEJAM NECESSÁRIAS INTERVENÇÕES CORRETIVAS, MANUTENÇÕES OU RECOMPOSIÇÃO FUTURA, ESTAS DEVERÃO SER EXECUTADAS SOB RESPONSABILIDADE DA SECOP.																						
A VIPETRO RECEBEU NO DIA 08/12/2025 O ENSAIO DE LABORATÓRIO DO MATERIAL QUE SERÁ USADO NA EXECUÇÃO DA CAMADA DE SUB BASE. APÓS ANÁLISE DO RELATÓRIO DE CONTROLE TECNOLÓGICO Nº 519/2025, A VIPETRO CONCLUI QUE O MATERIAL DE JAZIDA ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DO DNIT PARA UTILIZAÇÃO COMO SUB-BASE, APRESENTANDO CBR ELEVADO, BAIXA EXPANSIVIDADE E POSSIBILIDADE DE COMPACTAÇÃO $\geq 100\%$ DO PROCTOR, CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DOS CONTROLES TECNOLÓGICOS DE CAMPO."																						
CONTINUAMOS NO AGUARDANDO DE PROVIDÊNCIAS COM RELAÇÃO AS INTERFERÊNCIAS QUE ESTÃO IMPEDINDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS CALÇADAS, CONFORME CROCRI JÁ ENVIANDO NO DIA 28/04/2025.																						
COMENTÁRIOS CONTRATADA																						
FISCALIZAÇÃO																						
A SECOP SOLICITA À VIPETRO A EXECUÇÃO DE UM ACESSO PARA ENTRADA DE VEÍCULOS NO POSTO BORBOREMA, LOCALIZADO NA ESTACA DA ESTACA 77+3 A ESTACA 79+6, SITUADO NA VIA MARGINAL DO CANAL DE BODOCONGÓ, ATUALMENTE EM FASE DE EXECUÇÃO. RESSALTA-SE QUE O REFERIDO ACESSO NÃO CONSTA NO PROJETO ORIGINAL.																						
Data	Contratada										Data	Fiscalização										
	Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5305 D RN											Julio C. do Amaral Neto Engenheiro Civil CREA: 11676162022 PB										



Data	Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda	Data	Fiscalização
	Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5305 D RN		Julio C. do Amaral Neto Engenheiro Civil CREA: 11676162022 PB

CONTRATADA:			VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA			CONTRATO
OBRA:			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.			Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	06/02/2026	422
240	421	-181				

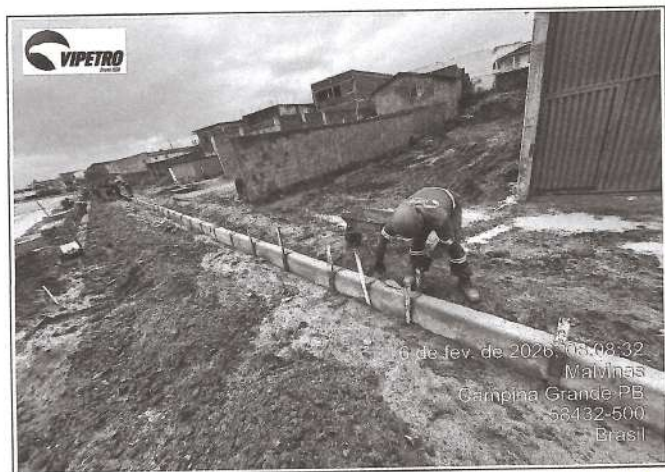

Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN

Julio C. do Amaral Neto
Engenheiro Civil
CREA: 11676162022 PB



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	06/02/2026	422
240	421	-181				



Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda

Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RNJulio C. do Amaral Neto
Engenheiro Civil
CREA: 11676162022 PB



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:		VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA														CONTRATO							
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORES DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.														Nº 2.08.030/2024								
RESUMOS DE DIAS			INÍCIO REAL - AC 1				TÉRMINO CONTRATUAL				DATA ATUAL				RDO Nº								
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024				09/08/2025				07/02/2026				423								
240	422	-182																					
QUADRO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS																							
Chuvvas/Horas	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30	
Improdutivo																							
Impraticável																							
ATIVIDADES EXECUTADAS																							
ATIVIDADES PRINCIPAIS EM EXECUTADAS:																							
TERRAPLENAGEM																							
AS ATIVIDADES DE TERRAPLENAGEM FORAM PARALISADAS DEVIDO A FORTES CHUVAS.																							
CALÇADAS E CICLOVIAS																							
CONCRETAGEM DE CICLOVIA																							
REGISTRO DE CHUVA 8,2MM NO PERÍODO DE 09H AS 12H, IMPOSSIBILITANDO AS ATIVIDADES. https://www.aesa.pb.gov.br/chuvvas/																							
A VIPETRO INFORMA QUE ATENDERÁ À SOLICITAÇÃO DA SECOP PARA EXECUÇÃO DO ACESSO AO POSTO BORBOREMA. CONTUDO, REGISTRA-SE QUE, NO TRECHO EM QUESTÃO, EXISTE UMA CICLOVIA IMPLANTADA, PODENDO HAVER RISCO DE INCIDENTES OU ACIDENTES DECORRENTES DA INTERFERÊNCIA ENTRE O TRÁFEGO DE CICLISTAS E OS VEÍCULOS QUE ACESSARÃO O POSTO. RESSALTA-SE, AINDA, QUE A CALÇADA EXISTENTE FOI EXECUTADA EM CONCRETO COM RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA DE 15 MPa E ESPESSURA DE 8,0 CM, NÃO TENDO SIDO DIMENSIONADA PARA SUPORTAR TRÁFEGO VEICULAR. DESSA FORMA, É PROVÁVEL QUE O PAVIMENTO APRESENTE PATOLOGIAS PREMATURAS EM FUNÇÃO DAS CARGAS APLICADAS. DIANTE DO EXPOSTO, A VIPETRO ESCLARECE QUE NÃO PODERÁ GARANTIR A DURABILIDADE DO CONCRETO NESSE TRECHO ESPECÍFICO, UMA VEZ QUE SUA CONCEPÇÃO NÃO CONTEMPLA O USO PARA CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS. CASO SEJAM NECESSÁRIAS INTERVENÇÕES CORRETIVAS, MANUTENÇÕES OU RECOMPOSIÇÃO FUTURA, ESTAS DEVERÃO SER EXECUTADAS SOB RESPONSABILIDADE DA SECOP.																							
A VIPETRO RECEBEU NO DIA 08/12/2025 O ENSAIO DE LABORATÓRIO DO MATERIAL QUE SERÁ USADO NA EXECUÇÃO DA CAMADA DE SUB BASE. APÓS ANÁLISE DO RELATÓRIO DE CONTROLE TECNOLÓGICO Nº 519/2025, A VIPETRO CONCLUI QUE O MATERIAL DE JAZIDA ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DO DNIT PARA UTILIZAÇÃO COMO SUB-BASE, APRESENTANDO CBR ELEVADO, BAIXA EXPANSIVIDADE E POSSIBILIDADE DE COMPACTAÇÃO ≥ 100% DO PROCTOR, CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DOS CONTROLES TECNOLÓGICOS DE CAMPO."																							
CONTINUAMOS NO AGUARDAR DE PROVIDÊNCIAS COM RELAÇÃO AS INTERFERÊNCIAS QUE ESTÃO IMPEDINDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS CALÇADAS, CONFORME CROCI JÁ ENVIANDO NO DIA 28/04/2025.																							
COMENTÁRIOS CONTRATADA																							
FISCALIZAÇÃO																							
A SECOP SOLICITA À VIPETRO A EXECUÇÃO DE UM ACESSO PARA ENTRADA DE VEÍCULOS NO POSTO BORBOREMA, LOCALIZADO NA ESTACA DA ESTACA 77+3 A ESTACA 79+6, SITUADO NA VIA MARGINAL DO CANAL DE BODOCONGÓ, ATUALMENTE EM FASE DE EXECUÇÃO. RESSALTA-SE QUE O REFERIDO ACESSO NÃO CONSTA NO PROJETO ORIGINAL.																							
Data	Contratada										Data	Fiscalização											
	Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5305 D RN											Julio C. do Amaral Neto Engenheiro Civil CREA: 11676162022 PB											



Data	Contratada	Data	Fiscalização
	Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5305 D RN		Julio C. do Amaral Neto Engenheiro Civil CREA: 11676162022 PB

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	07/02/2026	423
240	422	-182				



Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN

Julio C. do Amaral Neto
Engenheiro Civil
CREA: 11676162022 PB



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:		VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA														CONTRATO								
OBRA:		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.														Nº 2.08.030/2024								
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1				TÉRMINO CONTRATUAL				DATA ATUAL				RDO Nº									
CONTRATUAL			DECORRIDO				FALTANTE				12/12/2024				09/08/2025				08/02/2026				424	
240			423				-183																	
QUADRO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS																								
Chuvvas/Horas	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30		
Improdutivo																								
Impraticável																								
ATIVIDADES EXECUTADAS																								
ATIVIDADES PRINCIPAIS EM EXECUTADAS:																								
SEM ATIVIDADES - DESCANSO SEMANAL																								
REGISTRO DE FORTES CHUVAS 22,7 MM . https://www.aesa.pb.gov.br/chuvas/																								
A VIPETRO INFORMA QUE ATENDERÁ À SOLICITAÇÃO DA SECOB PARA EXECUÇÃO DO ACESSO AO POSTO BORBOREMA. CONTUDO, REGISTRA-SE QUE, NO TRECHO EM QUESTÃO, EXISTE UMA CICLOVIA IMPLANTADA, PODENDO HAVER RISCO DE INCIDENTES OU ACIDENTES DECORRENTES DA INTERFERÊNCIA ENTRE O TRÁFEGO DE CICLISTAS E OS VEÍCULOS QUE ACESSARÃO O POSTO. RESSALTA-SE, AINDA, QUE A CALÇADA EXISTENTE FOI EXECUTADA EM CONCRETO COM RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA DE 15 MPA E ESPESSURA DE 8,0 CM, NÃO TENDO SIDO DIMENSIONADA PARA SUPORTAR TRÁFEGO VEICULAR. DESSA FORMA, É PROVÁVEL QUE O PAVIMENTO APRESENTE PATOLOGIAS PREMATURAS EM FUNÇÃO DAS CARGAS APLICADAS. DIANTE DO EXPOSTO, A VIPETRO ESCLARECE QUE NÃO PODERÁ GARANTIR A DURABILIDADE DO CONCRETO NESSE TRECHO ESPECÍFICO, UMA VEZ QUE SUA CONCEPÇÃO NÃO CONTEMPLA O USO PARA CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS. CASO SEJAM NECESSÁRIAS INTERVENÇÕES CORRETIVAS, MANUTENÇÕES OU RECOMPOSIÇÃO FUTURA, ESTAS DEVERÃO SER EXECUTADAS SOB RESPONSABILIDADE DA SECOB.																								
A VIPETRO RECEBEU NO DIA 08/12/2025 O ENSAIO DE LABORATÓRIO DO MATERIAL QUE SERÁ USADO NA EXECUÇÃO DA CAMADA DE SUB BASE. APÓS ANÁLISE DO RELATÓRIO DE CONTROLE TECNOLÓGICO Nº 519/2025, A VIPETRO CONCLUI QUE O MATERIAL DE JAZIDA ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DO DNIT PARA UTILIZAÇÃO COMO SUB-BASE, APRESENTANDO CBR ELEVADO, BAIXA EXPANSIVIDADE E POSSIBILIDADE DE COMPACTAÇÃO $\geq 100\%$ DO PROCTOR, CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DOS CONTROLES TECNOLÓGICOS DE CAMPO."																								
CONTINUAMOS NO AGUARDANDO DE PROVIDÊNCIAS COM RELAÇÃO AS INTERFERÊNCIAS QUE ESTÃO IMPEDINDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS CALÇADAS, CONFORME CROCI JÁ ENVIANDO NO DIA 28/04/2025.																								
COMENTÁRIOS CONTRATADA																								
FISCALIZAÇÃO																								
A SECOB SOLICITA À VIPETRO A EXECUÇÃO DE UM ACESSO PARA ENTRADA DE VEÍCULOS NO POSTO BORBOREMA, LOCALIZADO NA ESTACA DA ESTACA 77+3 A ESTACA 79+6, SITUADO NA VIA MARGINAL DO CANAL DE BODOCONGÓ, ATUALMENTE EM FASE DE EXECUÇÃO. RESSALTA-SE QUE O REFERIDO ACESSO NÃO CONSTA NO PROJETO ORIGINAL.																								
Data	Contratada										Data	Fiscalização												
	Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5305 D RN											Julio C. do Amaral Neto Engenheiro Civil CREA: 11676162022 PB												



Data	Contratada	Data	Fiscalização
	Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5305 D RN		Julio C. do Amaral Neto Engenheiro Civil CREA: 11676162022 PB



RELATÓRIO DE SERVIÇOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:		VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA														CONTRATO						
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.														Nº 2.08.030/2024							
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1			TÉRMINO CONTRATUAL			DATA ATUAL			RDO Nº										
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024			09/08/2025			09/02/2026			425										
240	424	-184																				
QUADRO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS																						
Chuvvas/Horas	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30
Improdutivo																						
Impraticável																						
ATIVIDADES EXECUTADAS																						
ATIVIDADES PRINCIPAIS EM EXECUTADAS:																						
TERRAPLENAGEM																						
ATIVIDADES PARALISADAS DEVIDO AS CHUVAS FORTES CHUVAS DO FINAL DE SEMANA.																						
CALÇADAS E CICLOVIAS																						
APLICAÇÃO DE MEIO FIO																						
CONCRETAGEM DE CALÇADAS/CICLOVIAS LADO DIREITO																						
REGISTRO DE CHUVA 40,7 MM . https://www.aesa.pb.gov.br/chuvvas/																						
A VIPETRO INFORMA QUE ATENDERÁ À SOLICITAÇÃO DA SECOP PARA EXECUÇÃO DO ACESSO AO POSTO BORBOREMA. CONTUDO, REGISTRA-SE QUE, NO TRECHO EM QUESTÃO, EXISTE UMA CICLOVIA IMPLANTADA, PODENDO HAVER RISCO DE INCIDENTES OU ACIDENTES DECORRENTES DA INTERFERÊNCIA ENTRE O TRÁFEGO DE CICLISTAS E OS VEÍCULOS QUE ACESSARÃO O POSTO. RESSALTA-SE, AINDA, QUE A CALÇADA EXISTENTE FOI EXECUTADA EM CONCRETO COM RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA DE 15 MPA E ESPESSURA DE 8,0 CM, NÃO TENDO SIDO DIMENSIONADA PARA SUPORTAR TRÁFEGO VEICULAR. DESSA FORMA, É PROVÁVEL QUE O PAVIMENTO APRESENTE PATOLOGIAS PREMATURAS EM FUNÇÃO DAS CARGAS APLICADAS. DIANTE DO EXPOSTO, A VIPETRO ESCLARECE QUE NÃO PODERÁ GARANTIR A DURABILIDADE DO CONCRETO NESSE TRECHO ESPECÍFICO, UMA VEZ QUE SUA CONCEPÇÃO NÃO CONTEMPLA O USO PARA CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS. CASO SEJAM NECESSÁRIAS INTERVENÇÕES CORRETIVAS, MANUTENÇÕES OU RECOMPOSIÇÃO FUTURA, ESTAS DEVERÃO SER EXECUTADAS SOB RESPONSABILIDADE DA SECOP.																						
A VIPETRO RECEBEU NO DIA 08/12/2025 O ENSAIO DE LABORATÓRIO DO MATERIAL QUE SERÁ USADO NA EXECUÇÃO DA CAMADA DE SUB BASE. APÓS ANÁLISE DO RELATÓRIO DE CONTROLE TECNOLÓGICO Nº 519/2025, A VIPETRO CONCLUI QUE O MATERIAL DE JAZIDA ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DO DNIT PARA UTILIZAÇÃO COMO SUB-BASE, APRESENTANDO CBR ELEVADO, BAIXA EXPANSIVIDADE E POSSIBILIDADE DE COMPACTAÇÃO $\geq 100\%$ DO PROCTOR, CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DOS CONTROLES TECNOLÓGICOS DE CAMPO."																						
CONTINUAMOS NO AGUARDO DE PROVIDÊNCIAS COM RELAÇÃO AS INTERFERÊNCIAS QUE ESTÃO IMPEDINDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS CALÇADAS, CONFORME CROCI JÁ ENVIANDO NO DIA 28/04/2025.																						
COMENTÁRIOS CONTRATADA																						
FISCALIZAÇÃO																						
A SECOP SOLICITA À VIPETRO A EXECUÇÃO DE UM ACESSO PARA ENTRADA DE VEÍCULOS NO POSTO BORBOREMA, LOCALIZADO NA ESTACA DA ESTACA 77+3 A ESTACA 79+6, SITUADO NA VIA MARGINAL DO CANAL DE BODOCONGÓ, ATUALMENTE EM FASE DE EXECUÇÃO. RESSALTA-SE QUE O REFERIDO ACESSO NÃO CONSTA NO PROJETO ORIGINAL.																						
Data	Contratada										Data	Fiscalização										
	Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5305 D RN											Julio C. do Amaral Neto Engenheiro Civil CREA: 11676162022 PB										



Data	Constituída Vipetro Constr. e Ind. Industriais Ltda	Data	Fiscalização Julio C. do Amaral Neto Engenheiro Civil CREA: 11676162022 PB
	Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CBEA 5305 D RN		

40 ANOS						
CONTRATADA:		VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA				CONTRATO
OBRA:		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES,PASSARELAS,CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.				Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	09/02/2026	425
240	424	-184				

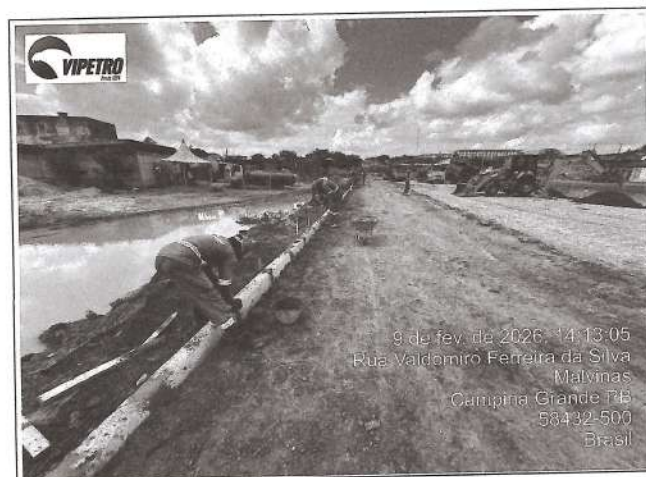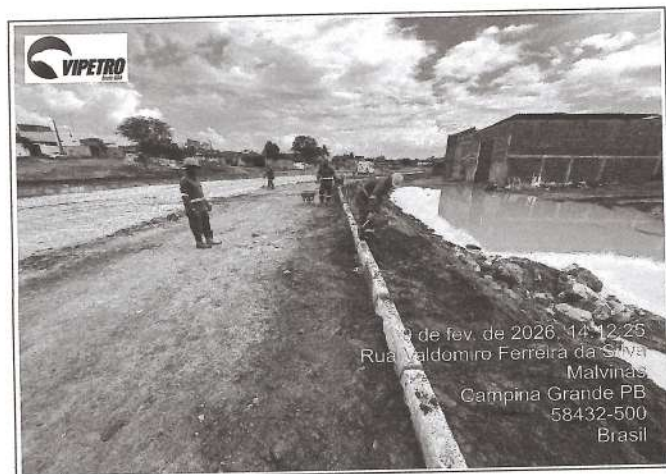

Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN


Julio C. do Amaral Neto
Engenheiro Civil
CREA: 11676162022 PB



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA				CONTRATO	
CONTRATADA:					
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.				Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	09/02/2026
240	424	-184			
					RDO Nº 425

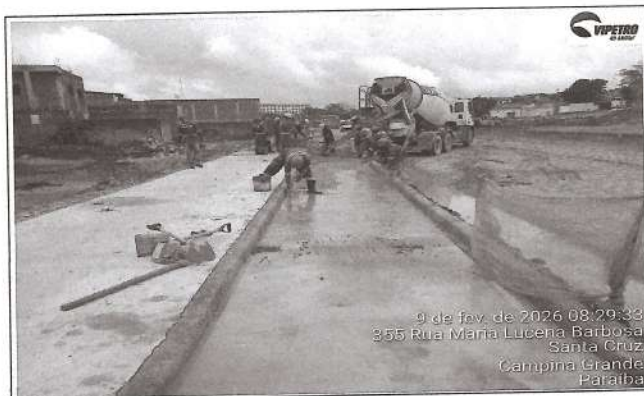


Julio C. do Amaral Neto
Engenheiro Civil
CREA: 11676162022 PB

Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda


Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN



RELATÓRIO DE SERVIÇOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:		VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA																CONTRATO					
OBRA:		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORES DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.																Nº 2.08.030/2024					
RESUMOS DE DIAS			INÍCIO REAL - AC 1				TÉRMINO CONTRATUAL				DATA ATUAL				RDO Nº								
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024				09/08/2025				10/02/2026				426								
240	425	-185																					
QUADRO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS																							
Chuvvas/Horas	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30	
Improdutivo																							
Impraticável																							
ATIVIDADES EXECUTADAS																							
ATIVIDADES PRINCIPAIS EM EXECUTADAS:																							
TERRAPLENAGEM																							
LANÇAMENTO DE CAMADA DE BASE VIA LATERAL DIREITA																							
EXECUÇÃO DE CAMADA DE BASE VIA LATERAL DIREITA																							
CALÇADAS E CICLOVIAS																							
APLICAÇÃO DE MEIO FIO																							
A VIPETRO INFORMA QUE ATENDERÁ À SOLICITAÇÃO DA SECOP PARA EXECUÇÃO DO ACESSO AO POSTO BORBOREMA. CONTUDO, REGISTRA-SE QUE, NO TRECHO EM QUESTÃO, EXISTE UMA CICLOVIA IMPLANTADA, PODENDO HAVER RISCO DE INCIDENTES OU ACIDENTES DECORRENTES DA INTERFERÊNCIA ENTRE O TRÁFEGO DE CICLISTAS E OS VEÍCULOS QUE ACESSARÃO O POSTO. RESSALTA-SE, AINDA, QUE A CALÇADA EXISTENTE FOI EXECUTADA EM CONCRETO COM RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA DE 15 MPA E ESPESSURA DE 8,0 CM, NÃO TENDO SIDO DIMENSIONADA PARA SUPORTAR TRÁFEGO VEICULAR. DESSA FORMA, É PROVÁVEL QUE O PAVIMENTO APRESENTE PATOLOGIAS PREMATURAS EM FUNÇÃO DAS CARGAS APLICADAS. DIANTE DO EXPOSTO, A VIPETRO ESCLARECE QUE NÃO PODERÁ GARANTIR A DURABILIDADE DO CONCRETO NESSE TRECHO ESPECÍFICO, UMA VEZ QUE SUA CONCEPÇÃO NÃO CONTEMPLA O USO PARA CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS. CASO SEJAM NECESSÁRIAS INTERVENÇÕES CORRETIVAS, MANUTENÇÕES OU RECOMPOSIÇÃO FUTURA, ESTAS DEVERÃO SER EXECUTADAS SOB RESPONSABILIDADE DA SECOP.																							
A VIPETRO RECEBEU NO DIA 08/12/2025 O ENSAIO DE LABORATÓRIO DO MATERIAL QUE SERÁ USADO NA EXECUÇÃO DA CAMADA DE SUB BASE. APÓS ANÁLISE DO RELATÓRIO DE CONTROLE TECNOLÓGICO Nº 519/2025, A VIPETRO CONCLUI QUE O MATERIAL DE JAZIDA ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DO DNIT PARA UTILIZAÇÃO COMO SUB-BASE, APRESENTANDO CBR ELEVADO, BAIXA EXPANSIVIDADE E POSSIBILIDADE DE COMPACTAÇÃO $\geq 100\%$ DO PROCTOR, CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DOS CONTROLES TECNOLÓGICOS DE CAMPO."																							
CONTINUAMOS NO AGUARDO DE PROVIDÊNCIAS COM RELAÇÃO AS INTERFERÊNCIAS QUE ESTÃO IMPEDINDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS CALÇADAS, CONFORME CROCRI JÁ ENVIANDO NO DIA 28/04/2025.																							
COMENTÁRIOS CONTRATADA																							
FISCALIZAÇÃO																							
A SECOP SOLICITA À VIPETRO A EXECUÇÃO DE UM ACESSO PARA ENTRADA DE VEÍCULOS NO POSTO BORBOREMA, LOCALIZADO NA ESTACA DA ESTACA 77+3 A ESTACA 79+6, SITUADO NA VIA MARGINAL DO CANAL DE BODOCONGÓ, ATUALMENTE EM FASE DE EXECUÇÃO. RESSALTA-SE QUE O REFERIDO ACESSO NÃO CONSTA NO PROJETO ORIGINAL.																							
Data	Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5305 D RN																Data	Fiscalização Julio C. do Amaral Neto Engenheiro Civil CREA: 11676162022 PB					



Data	Contratada	Data	Fiscalização
	Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5305 D RN		Julio C. do Amaral Neto Engenheiro Civil CREA: 11676162022 PB

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	10/02/2026	426
240	425	-185				

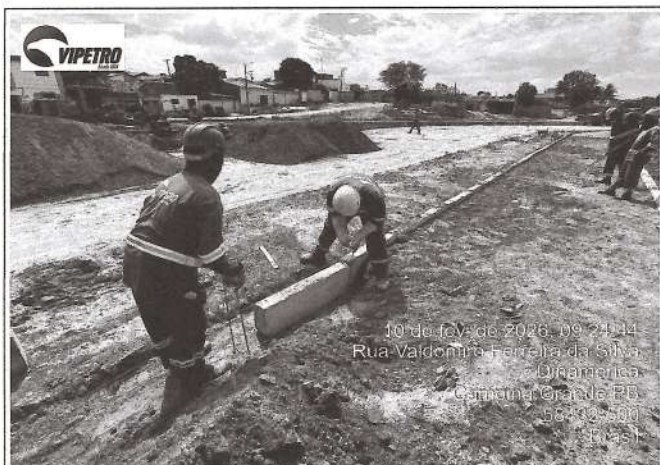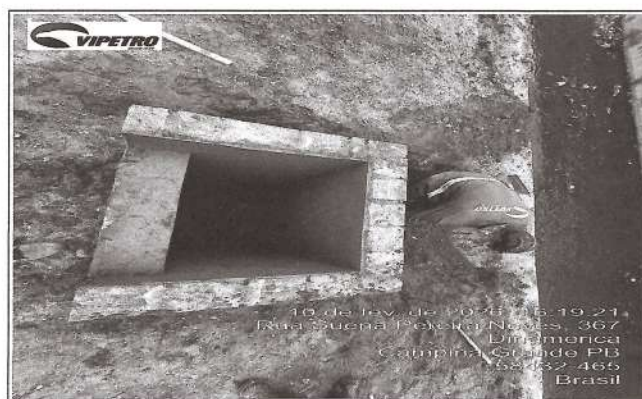

Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN

Julio C. do Amaral Neto
Engenheiro Civil
CREA: 11676162022 PB




RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ



CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INÍCIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	10/02/2026	426
240	425	-185				

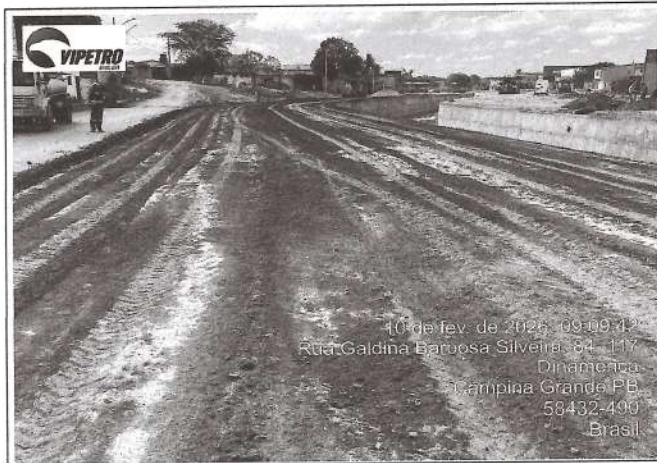

Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda
Edemilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN

Julio C. do Amaral Neto
Engenheiro Civil
CREA: 11676162022 PB



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA																CONTRATO						
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.																Nº 2.08.030/2024						
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1				TÉRMINO CONTRATUAL				DATA ATUAL				RDO Nº								
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024				09/08/2025				11/02/2026				427								
240	426	-186																					
QUADRO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS																							
Chuvvas/Horas	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30	
Improdutivo																							
Impraticável																							
ATIVIDADES EXECUTADAS																							
ATIVIDADES PRINCIPAIS EM EXECUTADAS:																							
TERRAPLENAGEM																							
CONTINUAÇÃO DE EXECUÇÃO DE CAMADA DE BASE VIA LATERAL DIREITA																							
EXECUÇÃO CAMDA DE ATERRO VIA LADO ESQUERDO																							
CONSTRUÇÃO DE CAIXAS TIPO BOCA DE LOBO DA DRENAGEM MARGINAL DAS VIAS LADO DIREITO																							
CALÇADAS E CICLOVIAS																							
APLICAÇÃO DE MEIO FIO																							
CONCRETAGEM DE CALÇADAS/CICLOVIAS																							
A VIPETRO INFORMA QUE ATENDERÁ À SOLICITAÇÃO DA SECOP PARA EXECUÇÃO DO ACESSO AO POSTO BORBOREMA. CONTUDO, REGISTRA-SE QUE, NO TRECHO EM QUESTÃO, EXISTE UMA CICLOVIA IMPLANTADA, PODENDO HAVER RISCO DE INCIDENTES OU ACIDENTES DECORRENTES DA INTERFERÊNCIA ENTRE O TRÁFEGO DE CICLISTAS E OS VEÍCULOS QUE ACESSARÃO O POSTO. RESSALTA-SE, AINDA, QUE A CALÇADA EXISTENTE FOI EXECUTADA EM CONCRETO COM RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA DE 15 MPA E ESPESSURA DE 8,0 CM, NÃO TENDO SIDO DIMENSIONADA PARA SUPORTAR TRÁFEGO VEICULAR. DESSA FORMA, É PROVÁVEL QUE O PAVIMENTO APRESENTE PATOLOGIAS PREMATURAS EM FUNÇÃO DAS CARGAS APLICADAS. DIANTE DO EXPOSTO, A VIPETRO ESCLARECE QUE NÃO PODERÁ GARANTIR A DURABILIDADE DO CONCRETO NESSE TRECHO ESPECÍFICO, UMA VEZ QUE SUA CONCEPÇÃO NÃO CONTEMPLA O USO PARA CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS. CASO SEJAM NECESSÁRIAS INTERVENÇÕES CORRETIVAS, MANUTENÇÕES OU RECOMPOSIÇÃO FUTURA, ESTAS DEVERÃO SER EXECUTADAS SOB RESPONSABILIDADE DA SECOP.																							
A VIPETRO RECEBEU NO DIA 08/12/2025 O ENSAIO DE LABORATÓRIO DO MATERIAL QUE SERÁ USADO NA EXECUÇÃO DA CAMADA DE SUB BASE. APÓS ANÁLISE DO RELATÓRIO DE CONTROLE TECNOLÓGICO Nº 519/2025, A VIPETRO CONCLUI QUE O MATERIAL DE JAZIDA ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DO DNIT PARA UTILIZAÇÃO COMO SUB-BASE, APRESENTANDO CBR ELEVADO, BAIXA EXPANSIVIDADE E POSSIBILIDADE DE COMPACTAÇÃO $\geq 100\%$ DO PROCTOR, CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DOS CONTROLES TECNOLÓGICOS DE CAMPO."																							
CONTINUAMOS NO AGUARDANDO DE PROVIDÊNCIAS COM RELAÇÃO AS INTERFERÊNCIAS QUE ESTÃO IMPEDINDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS CALÇADAS, CONFORME CROCI JÁ ENVIANDO NO DIA 28/04/2025.																							
COMENTÁRIOS CONTRATADA																							
FISCALIZAÇÃO																							
A SECOP SOLICITA À VIPETRO A EXECUÇÃO DE UM ACESSO PARA ENTRADA DE VEÍCULOS NO POSTO BORBOREMA, LOCALIZADO NA ESTACA DA ESTACA 77+3 A ESTACA 79+6, SITUADO NA VIA MARGINAL DO CANAL DE BODOCONGÓ, ATUALMENTE EM FASE DE EXECUÇÃO. RESSALTA-SE QUE O REFERIDO ACESSO NÃO CONSTA NO PROJETO ORIGINAL.																							
Data	Contratada										Data	Fiscalização											
	Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda											Julio C. do Amaral											
	Edenilson Pinto Bezerra											Engenheiro Civil											
	Gerente de Contrato											CREA: 11676162022											
	CREA 5305 D RN																						



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	11/02/2026	427
240	426	-186				

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
Gerente de contrato	1	Encarregado de Obra Civil	2	Veiculo Leve	4
Coordenador de sala técnica	1	Lider de Equipe	2	Retroescavadeira	1
Supervisor de Obra		Topografo (operador de GEORADAR)	1	Escavadeira Hidráulica	0
Engenheiro Civil	1	Apontador	1	Caminhão Munck	0
Topografo		Armador	2	Caminhão Cabinado	1
Técnico de planejamento	1	Pedreiro	8	Caminhão Caçamba	0
Técnico de Segurança	1	Carpinteiro	3	Caminhão Melosa	1
Profissional de Licenciamento		Servente	10	Caminhão Pipa	
Encarregado Administrativo	1	Operador de Betoneira	1	Carreta Munck	
Aux. Engenharia	1	Operador de Escavadeira hidráulica	1		
Aux. SMS		Operador de Retroescavadeira	0		
ASG	1	Motorista de Caçamba	0		
Eletricista	1	Motorista de Cabinada	1		
Aux. Eletricista		Motorista de Caminhão Munck			
Almoxarife		Motorista de Caminhão Comboio	1		
Aux. Almoxarife	1	Vigia Moturno	2		
Segurança Patrimonial	2				
TOTAL (Indireto)	12	TOTAL (Direto)	35	TOTAL (Equipamentos)	7

MÃO DE OBRA INDIRETA CTP		MÃO DE OBRA DIRETA CTP		EQUIPAMENTOS CTP	
Engenheiro Civil	1	Encarregado de Terraplenagem	1	Escavadeira Hidraulica	2
		Encarregado de Transporte	1	Motoniveladora	2
		Apontador	1	Retroescavadeira	1
		Serventes	4	Caminhão Pipa	4
		Motorista de Caminhão Pipa	4	Caminhão Basculante	10
		Motorista de Caminhão Basculante	10	Rolo Compactador	2
		Operador de Motoniveladora	2	Trator de Pneu	2
		Operador de Escavadeira	2		
		Operador de Retroescavadeira	1		
		Operador de Trator de Pneu	1		
		Operador de Rolo Compactador	2		
		Laboratorista	1		
TOTAL (Indireto)	1	TOTAL (Direto)	30	TOTAL (Equipamentos)	23

Data	Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda	Data	Fiscalização
	Edenilson Paulo Bezerra Gerente de Contrato CREA 5305 D RN		Julio C. do Amaral Neto Engenheiro Civil CREA: 11676162022




CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	11/02/2026	427
240	426	-186				



Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN

Julio C. do Amaral Neto
Engenheiro Civil
CREA: 11676162022 PB

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÔ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INÍCIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	11/02/2026	427
240	426	-186				

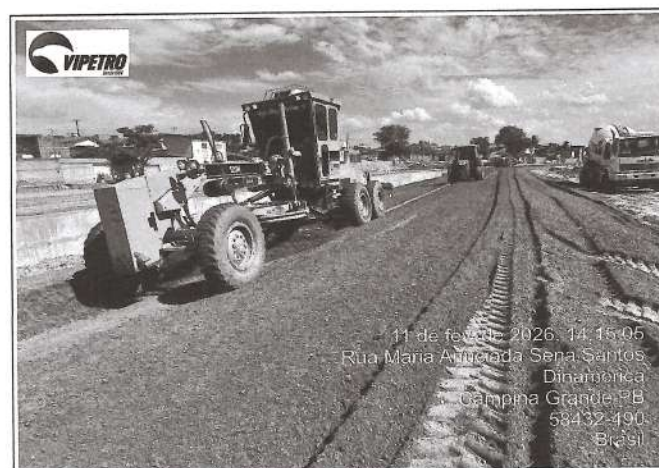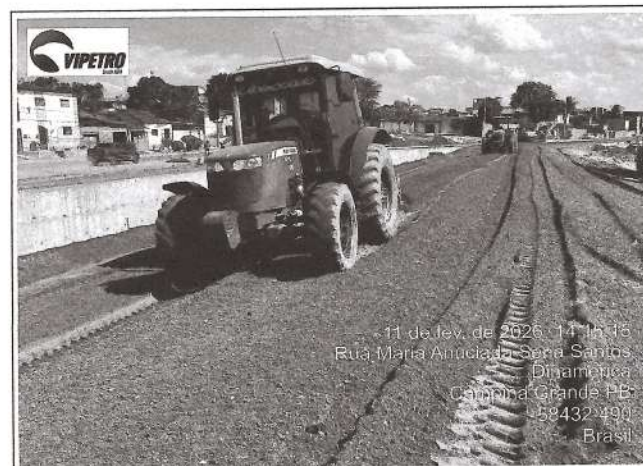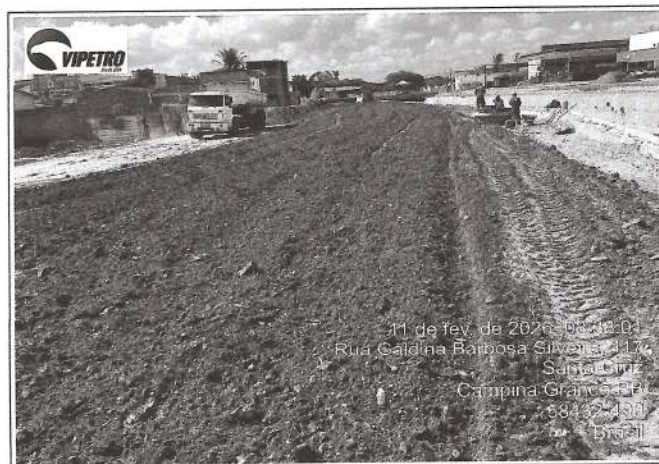

Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda

Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN

Julio C. do Amaral Neto
Engenheiro Civil
CREA: 11676162022 PB



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA															CONTRATO						
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.															Nº 2.08.030/2024						
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1			TÉRMINO CONTRATUAL			DATA ATUAL			RDO Nº										
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024			09/08/2025			12/02/2026			428										
240	427	-187																				
QUADRO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS																						
Chuvvas/Horas	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30
Improdutivo																						
Impraticável																						
ATIVIDADES EXECUTADAS																						
ATIVIDADES PRINCIPAIS EM EXECUTADAS:																						
TERRAPLENAGEM																						
CONTINUAÇÃO DE EXECUÇÃO DE CAMADA DE BASE VIA LATERAL DIREITA																						
EXECUÇÃO DE CAMADA DE ATERRO VIA LADO ESQUERDO																						
CONSTRUÇÃO DE CAIXAS TIPO BOCA DE LOBO DA DRENAGEM MARGINAL DAS VIAS LADO DIREITO																						
DESMONTE DE ROCHA COM ROMPEDOR PARA PASSAGEM DA CALÇADA.																						
CALÇADAS E CICLOVIAS																						
APLICAÇÃO DE MEIO FIO																						
CONCRETAGEM DE CICLOVIA																						
A VIPETRO INFORMA QUE ATENDERÁ À SOLICITAÇÃO DA SECOB PARA EXECUÇÃO DO ACESSO AO POSTO BORBOREMA. CONTUDO, REGISTRA-SE QUE, NO TRECHO EM QUESTÃO, EXISTE UMA CICLOVIA IMPLANTADA, PODENDO HAVER RISCO DE INCIDENTES OU ACIDENTES DECORRENTES DA INTERFERÊNCIA ENTRE O TRÁFEGO DE CICLISTAS E OS VEÍCULOS QUE ACESSARÃO O POSTO. RESSALTA-SE, AINDA, QUE A CALÇADA EXISTENTE FOI EXECUTADA EM CONCRETO COM RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA DE 15 MPA E ESPESSURA DE 8,0 CM, NÃO TENDO SIDO DIMENSIONADA PARA SUPORTAR TRÁFEGO VEICULAR. DESSA FORMA, É PROVÁVEL QUE O PAVIMENTO APRESENTE PATOLOGIAS PREMATURAS EM FUNÇÃO DAS CARGAS APLICADAS. DIANTE DO EXPOSTO, A VIPETRO ESCLARECE QUE NÃO PODERÁ GARANTIR A DURABILIDADE DO CONCRETO NESSE TRECHO ESPECÍFICO, UMA VEZ QUE SUA CONCEPÇÃO NÃO CONTEMPLA O USO PARA CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS. CASO SEJAM NECESSÁRIAS INTERVENÇÕES CORRETIVAS, MANUTENÇÕES OU RECOMPOSIÇÃO FUTURA, ESTAS DEVERÃO SER EXECUTADAS SOB RESPONSABILIDADE DA SECOB.																						
A VIPETRO RECEBEU NO DIA 08/12/2025 O ENSAIO DE LABORATÓRIO DO MATERIAL QUE SERÁ USADO NA EXECUÇÃO DA CAMADA DE SUB BASE. APÓS ANÁLISE DO RELATÓRIO DE CONTROLE TECNOLÓGICO Nº 519/2025, A VIPETRO CONCLUI QUE O MATERIAL DE JAZIDA ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DO DNIT PARA UTILIZAÇÃO COMO SUB-BASE, APRESENTANDO CBR ELEVADO, BAIXA EXPANSIVIDADE E POSSIBILIDADE DE COMPACTAÇÃO $\geq 100\%$ DO PROCTOR, CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DOS CONTROLES TECNOLÓGICOS DE CAMPO."																						
CONTINUAMOS NO AGUARDANDO DE PROVIDÊNCIAS COM RELAÇÃO AS INTERFERÊNCIAS QUE ESTÃO IMPEDINDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS CALÇADAS, CONFORME CROCI JÁ ENVIANDO NO DIA 28/04/2025.																						
COMENTÁRIOS CONTRATADA																						
FISCALIZAÇÃO																						
A SECOB SOLICITA À VIPETRO A EXECUÇÃO DE UM ACESSO PARA ENTRADA DE VEÍCULOS NO POSTO BORBOREMA, LOCALIZADO NA ESTACA DA ESTACA 77+3 A ESTACA 79+6, SITUADO NA VIA MARGINAL DO CANAL DE BODOCONGÓ, ATUALMENTE EM FASE DE EXECUÇÃO. RESSALTA-SE QUE O REFERIDO ACESSO NÃO CONSTA NO PROJETO ORIGINAL.																						
Data	Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5305-D RN										Data	Julio C. do Amaral Neto Engenheiro Civil CREA: 11676162022 RJ										



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA				CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.				Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	12/02/2026
240	427	-187			RDO Nº 428

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS					
MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
Gerente de contrato	1	Encarregado de Obra Civil	2	Veículo Leve	4
Coordenador de sala técnica	1	Líder de Equipe	2	Retroescavadeira	1
Supervisor de Obra		Topógrafo (operador de GEORADAR)	1	Escavadeira Hidráulica	0
Engenheiro Civil	1	Apontador	1	Caminhão Munk	0
Topógrafo		Armador	2	Caminhão Cabinado	1
Técnico de planejamento	1	Pedreiro	8	Caminhão Caçamba	0
Técnico de Segurança	1	Carpinteiro	3	Caminhão Melosa	1
Profissional de Licenciamento		Servente	12	Caminhão Pipa	
Encarregado Administrativo	1	Operador de Betoneira	1	Carreta Munk	
Aux. Engenharia	1	Operador de Escavadeira hidráulica	1		
Aux. SMS		Operador de Retroescavadeira	0		
ASG	1	Motorista de Caçamba	0		
Eletricista	1	Motorista de Cabinada	1		
Aux. Eletricista		Motorista de Caminhão Munk			
Almoxarife		Motorista de Caminhão Comboio	1		
Aux. Almoxarife	1	Vigia Moturno	2		
Segurança Patrimonial	2				
TOTAL (Indireto)	12	TOTAL (Direto)	37	TOTAL (Equipamentos)	7

MÃO DE OBRA INDIRETA CTP		MÃO DE OBRA DIRETA CTP		EQUIPAMENTOS CTP	
Engenheiro Civil	1	Encarregado de Terraplenagem	1	Escavadeira Hidráulica	2
		Encarregado de Transporte	1	Motoniveladora	2
		Apontador	1	Retroescavadeira	1
		Serventes	4	Caminhão Pipa	4
		Motorista de Caminhão Pipa	4	Caminhão Basculante	10
		Motorista de Caminhão Basculante	10	Rolo Compactador	2
		Operador de Motoniveladora	2	Trator de Pneu	2
		Operador de Escavadeira	2		
		Operador de Retroescavadeira	1		
		Operador de Trator de Pneu	1		
		Operador de Rolo Compactador	2		
		Laboratorista	1		
TOTAL (Indireto)	1	TOTAL (Direto)	30	TOTAL (Equipamentos)	23

Data	Contratada	Data	Fiscalização
	Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda		Julio C. do Amaral Neto
	Edenilson Pinto Bezerra		Engenheiro Civil
	Gerente de Contrato		CREA: 11676162022 -t.
	CREA 5305-D-RN		



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGO

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA																CONTRATO					
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.																Nº 2.08.030/2024					
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1			TÉRMINO CONTRATUAL			DATA ATUAL			RDO Nº										
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024			09/08/2025			14/02/2026			430										
240	429	-189																				
QUADRO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS																						
Chuvvas/Horas	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30
Improdutivo																						
Impraticável																						
ATIVIDADES EXECUTADAS																						
ATIVIDADES PRINCIPAIS EM EXECUTADAS:																						
SEM ATIVIDADES - DESCANSO SEMANAL																						
A VIPETRO INFORMA QUE ATENDERÁ À SOLICITAÇÃO DA SECOB PARA EXECUÇÃO DO ACESSO AO POSTO BORBOREMA. CONTUDO, REGISTRA-SE QUE, NO TRECHO EM QUESTÃO, EXISTE UMA CICLOVIA IMPLANTADA, PODENDO HAVER RISCO DE INCIDENTES OU ACIDENTES DECORRENTES DA INTERFERÊNCIA ENTRE O TRÁFEGO DE CICLISTAS E OS VEÍCULOS QUE ACESSARÃO O POSTO. RESSALTA-SE, AINDA, QUE A CALÇADA EXISTENTE FOI EXECUTADA EM CONCRETO COM RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA DE 15 MPA E ESPESSURA DE 8,0 CM, NÃO TENDO SIDO DIMENSIONADA PARA SUPORTAR TRÁFEGO VEICULAR. DESSA FORMA, É PROVÁVEL QUE O PAVIMENTO APRESENTE PATOLOGIAS PREMATURAS EM FUNÇÃO DAS CARGAS APLICADAS. DIANTE DO EXPOSTO, A VIPETRO ESCLARECE QUE NÃO PODERÁ GARANTIR A DURABILIDADE DO CONCRETO NESSE TRECHO ESPECÍFICO, UMA VEZ QUE SUA CONCEPÇÃO NÃO CONTEMPLA O USO PARA CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS. CASO SEJAM NECESSÁRIAS INTERVENÇÕES CORRETIVAS, MANUTENÇÕES OU RECOMPOSIÇÃO FUTURA, ESTAS DEVERÃO SER EXECUTADAS SOB RESPONSABILIDADE DA SECOB.																						
A VIPETRO RECEBEU NO DIA 08/12/2025 O ENSAIO DE LABORATÓRIO DO MATERIAL QUE SERÁ USADO NA EXECUÇÃO DA CAMADA DE SUB BASE. APÓS ANÁLISE DO RELATÓRIO DE CONTROLE TECNOLÓGICO Nº 519/2025, A VIPETRO CONCLUI QUE O MATERIAL DE JAZIDA ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DO DNIT PARA UTILIZAÇÃO COMO SUB-BASE, APRESENTANDO CBR ELEVADO, BAIXA EXPANSIVIDADE E POSSIBILIDADE DE COMPACTAÇÃO $\geq 100\%$ DO PROCTOR, CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DOS CONTROLES TECNOLÓGICOS DE CAMPO."																						
CONTINUAMOS NO AGUARDO DE PROVIDÊNCIAS COM RELAÇÃO AS INTERFERÊNCIAS QUE ESTÃO IMPEDINDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS CALÇADAS, CONFORME CROCRI JÁ ENVIANDO NO DIA 28/04/2025.																						
COMENTÁRIOS CONTRATADA																						
FISCALIZAÇÃO																						
A SECOB SOLICITA À VIPETRO A EXECUÇÃO DE UM ACESSO PARA ENTRADA DE VEÍCULOS NO POSTO BORBOREMA, LOCALIZADO NA ESTACA DA ESTACA 77+3 A ESTACA 79+6, SITUADO NA VIA MARGINAL DO CANAL DE BODOCONGÓ, ATUALMENTE EM FASE DE EXECUÇÃO. RESSALTA-SE QUE O REFERIDO ACESSO NÃO CONSTA NO PROJETO ORIGINAL.																						
Data	Contratada										Data	Fiscalização										
	Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda Edenilson Rinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5305 D RN											Júlio C. do Amaral Neto Engenheiro Civil CREA: 11676162022 PB										



Data	Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda	Data	Fiscalização
	Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5305 D RN		Julio C. do Amaral Neto Engenheiro Civil CREA: 11676162022 PB

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INÍCIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	12/02/2026	428
240	427	-187				



Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN

Julio C. do Amaral Neto
Engenheiro Civil
CREA: 11676162022 PB



RELATÓRIO DE SERVIÇOS


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:		VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA														CONTRATO						
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORES DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.														Nº 2.08.030/2024							
RESUMOS DE DIAS			INÍCIO REAL - AC 1				TÉRMINO CONTRATUAL				DATA ATUAL				RDO Nº							
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024				09/08/2025				13/02/2026				429							
240	428	-188																				
QUADRO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS																						
Chuvvas/Horas	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30
Improdutivo																						
Impraticável																						
ATIVIDADES EXECUTADAS																						
ATIVIDADES PRINCIPAIS EM EXECUTADAS:																						
TERRAPLENAGEM																						
CONTINUAÇÃO DE EXECUÇÃO DE CAMADA DE BASE VIA LATERAL DIREITA																						
EXECUÇÃO DE CAMADA DE ATERRO VIA LADO ESQUERDO																						
CONSTRUÇÃO DE CAIXAS TIPO BOCA DE LOBO DA DRENAGEM MARGINAL DAS VIAS LADO DIREITO																						
CALÇADAS E CICLOVIAS																						
APLICAÇÃO DE MEIO FIO																						
A VIPETRO INFORMA QUE ATENDERÁ À SOLICITAÇÃO DA SECOP PARA EXECUÇÃO DO ACESSO AO POSTO BORBOREMA. CONTUDO, REGISTRA-SE QUE, NO TRECHO EM QUESTÃO, EXISTE UMA CICLOVIA IMPLANTADA, PODENDO HAVER RISCO DE INCIDENTES OU ACIDENTES DECORRENTES DA INTERFERÊNCIA ENTRE O TRÁFEGO DE CICLISTAS E OS VEÍCULOS QUE ACESSARÃO O POSTO. RESSALTA-SE, AINDA, QUE A CALÇADA EXISTENTE FOI EXECUTADA EM CONCRETO COM RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA DE 15 MPA E ESPESSURA DE 8,0 CM, NÃO TENDO SIDO DIMENSIONADA PARA SUPOORTAR TRÁFEGO VEICULAR. DESSA FORMA, É PROVÁVEL QUE O PAVIMENTO APRESENTE PATOLOGIAS PREMATURAS EM FUNÇÃO DAS CARGAS APLICADAS. DIANTE DO EXPOSTO, A VIPETRO ESCLARECE QUE NÃO PODERÁ GARANTIR A DURABILIDADE DO CONCRETO NESSE TRECHO ESPECÍFICO, UMA VEZ QUE SUA CONCEPÇÃO NÃO CONTEMPLA O USO PARA CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS. CASO SEJAM NECESSÁRIAS INTERVENÇÕES CORRETIVAS, MANUTENÇÕES OU RECOMPOSIÇÃO FUTURA, ESTAS DEVERÃO SER EXECUTADAS SOB RESPONSABILIDADE DA SECOP.																						
A VIPETRO RECEBEU NO DIA 08/12/2025 O ENSAIO DE LABORATÓRIO DO MATERIAL QUE SERÁ USADO NA EXECUÇÃO DA CAMADA DE SUB BASE. APÓS ANÁLISE DO RELATÓRIO DE CONTROLE TECNOLÓGICO Nº 519/2025, A VIPETRO CONCLUI QUE O MATERIAL DE JAZIDA ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DO DNIT PARA UTILIZAÇÃO COMO SUB-BASE, APRESENTANDO CBR ELEVADO, BAIXA EXPANSIVIDADE E POSSIBILIDADE DE COMPACTAÇÃO $\geq 100\%$ DO PROCTOR, CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DOS CONTROLES TECNOLÓGICOS DE CAMPO."																						
CONTINUAMOS NO AGUARDO DE PROVIDÊNCIAS COM RELAÇÃO AS INTERFERÊNCIAS QUE ESTÃO IMPEDINDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS CALÇADAS, CONFORME CROCI JÁ ENVIANDO NO DIA 28/04/2025.																						
COMENTÁRIOS CONTRATADA																						
FISCALIZAÇÃO																						
A SECOP SOLICITA À VIPETRO A EXECUÇÃO DE UM ACESSO PARA ENTRADA DE VEÍCULOS NO POSTO BORBOREMA, LOCALIZADO NA ESTACA DA ESTACA 77+3 A ESTACA 79+6, SITUADO NA VIA MARGINAL DO CANAL DE BODOCONGÓ, ATUALMENTE EM FASE DE EXECUÇÃO. RESSALTA-SE QUE O REFERIDO ACESSO NÃO CONSTA NO PROJETO ORIGINAL.																						
Data	Contratada										Data	Fiscalização										
	Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5305 D RN											Julio C. do Amaral Neto Engenheiro Civil CREA: 11676162022 PB										



Data	Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda	Data	Fiscalização
	Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5305 D RN		Julio C. do Amaral Engenheiro Civil CREA: 11676162022

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA				CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.				Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INÍCIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	13/02/2026
240	428	-188			429

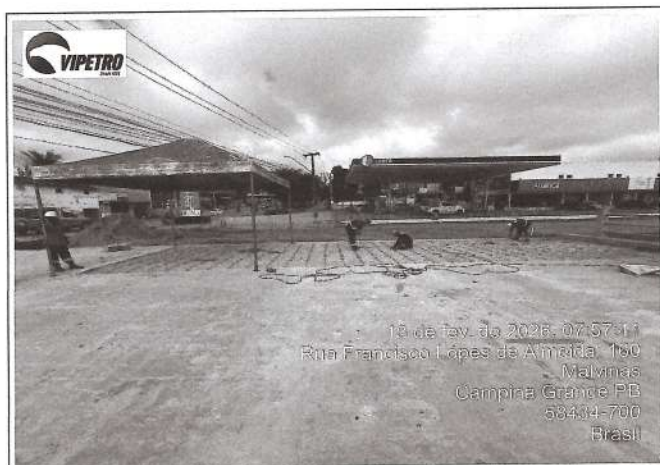

Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN

Julio C. do Amaral Neto
Engenheiro Civil
CREA: 11676162022 PB



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ



CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	13/02/2026	429
240	428	-188				



João C. de Amaral Neto
Engenheiro Civil
CREA: 11676162022

Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda

Ednilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	Nº 2.08.030/2024

RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	15/02/2026	431
240	430	-190				

QUADRO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS																				
Chuvvas/Horas	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30
Improdutivo																				
Impraticável																				

ATIVIDADES EXECUTADAS																				
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ATIVIDADES PRINCIPAIS EM EXECUTADAS:

SEM ATIVIDADES - DESCANSO SEMANAL

A VIPETRO INFORMA QUE ATENDERÁ À SOLICITAÇÃO DA SECOP PARA EXECUÇÃO DO ACESSO AO POSTO BORBOREMA. CONTUDO, REGISTRA-SE QUE, NO TRECHO EM QUESTÃO, EXISTE UMA CICLOVIA IMPLANTADA, PODENDO HAVER RISCO DE INCIDENTES OU ACIDENTES DECORRENTES DA INTERFERÊNCIA ENTRE O TRÁFEGO DE CICLISTAS E OS VEÍCULOS QUE ACESSARÃO O POSTO. RESSALTA-SE, AINDA, QUE A CALÇADA EXISTENTE FOI EXECUTADA EM CONCRETO COM RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA DE 15 MPA E ESPESSURA DE 8,0 CM, NÃO TENDO SIDO DIMENSIONADA PARA SUPOSTAR TRÁFEGO VEICULAR. DESSA FORMA, É PROVÁVEL QUE O PAVIMENTO APRESENTE PATOLOGIAS PREMATURAS EM FUNÇÃO DAS CARGAS APLICADAS. DIANTE DO EXPOSTO, A VIPETRO ESCLARECE QUE NÃO PODERÁ GARANTIR A DURABILIDADE DO CONCRETO NESSE TRECHO ESPECÍFICO, UMA VEZ QUE SUA CONCEPÇÃO NÃO CONTEMPLA O USO PARA CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS. CASO SEJAM NECESSÁRIAS INTERVENÇÕES CORRETIVAS, MANUTENÇÕES OU RECOMPOSIÇÃO FUTURA, ESTAS DEVERÃO SER EXECUTADAS SOB RESPONSABILIDADE DA SECOP.

A VIPETRO RECEBEU NO DIA 08/12/2025 O ENSAIO DE LABORATÓRIO DO MATERIAL QUE SERÁ USADO NA EXECUÇÃO DA CAMADA DE SUB BASE. APÓS ANÁLISE DO RELATÓRIO DE CONTROLE TECNOLÓGICO Nº 519/2025, A VIPETRO CONCLUI QUE O MATERIAL DE JAZIDA ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DO DNIT PARA UTILIZAÇÃO COMO SUB-BASE, APRESENTANDO CBR ELEVADO, BAIXA EXPANSIVIDADE E POSSIBILIDADE DE COMPACTAÇÃO $\geq 100\%$ DO PROCTOR, CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DOS CONTROLES TECNOLÓGICOS DE CAMPO."

CONTINUAMOS NO AGUARDO DE PROVIDÊNCIAS COM RELAÇÃO AS INTERFERÊNCIAS QUE ESTÃO IMPEDINDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS CALÇADAS, CONFORME CROCRI JÁ ENVIANDO NO DIA 28/04/2025.

COMENTÁRIOS CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

A SECOP SOLICITA À VIPETRO A EXECUÇÃO DE UM ACESSO PARA ENTRADA DE VEÍCULOS NO POSTO BORBOREMA, LOCALIZADO NA ESTACA DA ESTACA 77+3 A ESTACA 79+6, SITUADO NA VIA MARGINAL DO CANAL DE BODOCONGÓ, ATUALMENTE EM FASE DE EXECUÇÃO. RESSALTA-SE QUE O REFERIDO ACESSO NÃO CONSTA NO PROJETO ORIGINAL.

Data		Data	
	 Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda Ednilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5305 D RN		 Fiscalização Julio C. do Amaral Neto Engenheiro Civil CREA: 11676162022 PB



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA				CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.				Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	15/02/2026
240	430	-190			431

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS					
MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
Gerente de contrato	1	Encarregado de Obra Civil	2	Veiculo Leve	4
Coordenador de sala técnica	1	Lider de Equipe	2	Retroescavadeira	1
Supervisor de Obra		Topografo (operador de GEORADAR)	1	Escavadeira Hidráulica	0
Engenheiro Civil	1	Apontador	1	Caminhão Munk	0
Topografo		Armador	2	Caminhão Cabinado	1
Técnico de planejamento	1	Pedreiro	8	Caminhão Caçamba	0
Técnico de Segurança	1	Carpinteiro	3	Caminhão Melosa	1
Profissional de Licenciamento		Servente	12	Caminhão Pipa	
Encarregado Administrativo	1	Operador de Betoneira	1	Carreta Munk	
Aux. Engenharia	1	Operador de Escavadeira hidráulica	1		
Aux. SMS		Operador de Retroescavadeira	0		
ASG	1	Motorista de Caçamba	0		
Eletricista	1	Motorista de Cabinada	1		
Aux. Eletricista		Motorista de Caminhão Munk			
Almoxarife		Motorista de Caminhão Comboio	1		
Aux. Almoxarife	1	Vigia Moturno	2		
Segurança Patrimonial	2				
TOTAL (Indireto)	12	TOTAL (Direto)	37	TOTAL (Equipamentos)	7

MÃO DE OBRA INDIRETA CTP		MÃO DE OBRA DIRETA CTP		EQUIPAMENTOS CTP	
Engenheiro Civil	1	Encarregado de Terraplenagem	1	Escavadeira Hidraulica	2
		Encarregado de Transporte	1	Motoniveladora	2
		Apontador	1	Retroescavadeira	1
		Serventes	4	Caminhão Pipa	4
		Motorista de Caminhão Pipa	4	Caminhão Basculante	10
		Motorista de Caminhão Basculante	10	Rolo Compactador	2
		Operador de Motoniveladora	2	Trator de Pneu	2
		Operador de Escavadeira	2		
		Operador de Retroescavadeira	1		
		Operador de Trator de Pneu	1		
		Operador de Rolo Compactador	2		
		Laboratorista	1		
TOTAL (Indireto)	1	TOTAL (Direto)	30	TOTAL (Equipamentos)	23

Data	Vipetro Constr. e Montagens Industriais Ltda	Data	Fiscalização
	Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5305 D RN		Julio C. do Amaral Neto Engenheiro Civil CREA: 11676162022



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024

RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	16/02/2026	432
240	431	-191				

QUADRO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS																				
Chuvas/Horas	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30
Improdutivo																				
Impraticável																				

ATIVIDADES EXECUTADAS

ATIVIDADES PRINCIPAIS EM EXECUTADAS:

SEM ATIVIDADES - DIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL

A VIPETRO INFORMA QUE ATENDERÁ À SOLICITAÇÃO DA SECOB PARA EXECUÇÃO DO ACESSO AO POSTO BORBOREMA. CONTUDO, REGISTRA-SE QUE, NO TRECHO EM QUESTÃO, EXISTE UMA CICLOVIA IMPLANTADA, PODENDO HAVER RISCO DE INCIDENTES OU ACIDENTES DECORRENTES DA INTERFERÊNCIA ENTRE O TRÁFEGO DE CICLISTAS E OS VEÍCULOS QUE ACESSARÃO O POSTO. RESSALTA-SE, AINDA, QUE A CALÇADA EXISTENTE FOI EXECUTADA EM CONCRETO COM RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA DE 15 MPA E ESPESSURA DE 8,0 CM, NÃO TENDO SIDO DIMENSIONADA PARA SUPORTAR TRÁFEGO VEICULAR. DESSA FORMA, É PROVÁVEL QUE O PAVIMENTO APRESENTE PATOLOGIAS PREMATURAS EM FUNÇÃO DAS CARGAS APLICADAS. DIANTE DO EXPOSTO, A VIPETRO ESCLARECE QUE NÃO PODERÁ GARANTIR A DURABILIDADE DO CONCRETO NESSE TRECHO ESPECÍFICO, UMA VEZ QUE SUA CONCEPÇÃO NÃO CONTEMPLA O USO PARA CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS. CASO SEJAM NECESSÁRIAS INTERVENÇÕES CORRETIVAS, MANUTENÇÕES OU RECOMPOSIÇÃO FUTURA, ESTAS DEVERÃO SER EXECUTADAS SOB RESPONSABILIDADE DA SECOB.

A VIPETRO RECEBEU NO DIA 08/12/2025 O ENSAIO DE LABORATÓRIO DO MATERIAL QUE SERÁ USADO NA EXECUÇÃO DA CAMADA DE SUB BASE. APÓS ANÁLISE DO RELATÓRIO DE CONTROLE TECNOLÓGICO Nº 519/2025, A VIPETRO CONCLUI QUE O MATERIAL DE JAZIDA ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DO DNIT PARA UTILIZAÇÃO COMO SUB-BASE, APRESENTANDO CBR ELEVADO, BAIXA EXPANSIVIDADE E POSSIBILIDADE DE COMPACTAÇÃO $\geq 100\%$ DO PROCTOR, CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DOS CONTROLES TECNOLÓGICOS DE CAMPO."

CONTINUAMOS NO AGUARDANDO DE PROVIDÊNCIAS COM RELAÇÃO AS INTERFERÊNCIAS QUE ESTÃO IMPEDINDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS CALÇADAS, CONFORME CROCRI JÁ ENVIANDO NO DIA 28/04/2025.

COMENTÁRIOS CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

A SECOB SOLICITA À VIPETRO A EXECUÇÃO DE UM ACESSO PARA ENTRADA DE VEÍCULOS NO POSTO BORBOREMA, LOCALIZADO NA ESTACA DA ESTACA 77+3 A ESTACA 79+6, SITUADO NA VIA MARGINAL DO CANAL DE BODOCONGÓ, ATUALMENTE EM FASE DE EXECUÇÃO. RESSALTA-SE QUE O REFERIDO ACESSO NÃO CONSTA NO PROJETO ORIGINAL.

Data	Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda	Data	Fiscalização
	Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5305 D RN		Julio C. do Amaral Neto Engenheiro Civil CREA: 11676162022 rr

CONTRATADA:			VIPIETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA			CONTRATO	
OBRA:			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES,PASSARELAS,CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.			Nº 2.08.030/2024	
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº	
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	16/02/2026	432	
240	431	-191					

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS							
MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS			
Gerente de contrato	1	Encarregado de Obra Civil	2	Veiculo Leve	4		
Coordenador de sala técnica	1	Lider de Equipe	2	Retroescavadeira	1		
Supervisor de Obra		Topografo (operador de GEORADAR)	1	Escavadeira Hidráulica	0		
Engenheiro Civil	1	Apontador	1	Caminhão Munck	0		
Topografo		Armador	2	Caminhão Cabinado	1		
Técnico de planejamento	1	Pedreiro	8	Caminhão Caçamba	0		
Técnico de Segurança	1	Carpinteiro	3	Caminhão Melosa	1		
Profissional de Licenciamento		Servente	12	Caminhão Pipa			
Encarregado Administrativo	1	Operador de Betoneira	1	Carreta Munck			
Aux. Engenharia	1	Operador de Escavadeira hidráulica	1				
Aux. SMS		Operador de Retroescavadeira	0				
ASG	1	Motorista de Caçamba	0				
Eletricista	1	Motorista de Cabinada	1				
Aux. Eletricista		Motorista de Caminhão Munck					
Almoxarife		Motorista de Caminhão Comboio	1				
Aux. Almoxarife	1	Vigia Moturno	2				
Segurança Patrimonial	2						
TOTAL (Indireto)	12	TOTAL (Direto)	37	TOTAL (Equipamentos)	7		

MÃO DE OBRA INDIRETA CTP		MÃO DE OBRA DIRETA CTP		EQUIPAMENTOS CTP			
Engenheiro Civil	1	Encarregado de Terraplenagem	1	Escavadeira Hidraulica	2		
		Encarregado de Transporte	1	Motoniveladora	2		
		Apontador	1	Retroescavadeira	1		
		Serventes	4	Caminhão Pipa	4		
		Motorista de Caminhão Pipa	4	Caminhão Basculante	10		
		Motorista de Caminhão Basculante	10	Rolo Compactador	2		
		Operador de Motoniveladora	2	Trator de Pneu	2		
		Operador de Escavadeira	2				
		Operador de Retroescavadeira	1				
		Operador de Trator de Pneu	1				
		Operador de Rolo Compactador	2				
		Laboratorista	1				
TOTAL (Indireto)	1	TOTAL (Direto)	30	TOTAL (Equipamentos)	23		

Data	Contratada	Data	Fiscalização
	Viperro Constr. e Mont. Industriais Ltda Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5305 D RN		Julio C. do Amaral Engenheiro C CREA: 1167616202



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA				CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.				Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	17/02/2026
240	432	-192			433

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS					
MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
Gerente de contrato	1	Encarregado de Obra Civil	2	Veiculo Leve	4
Coordenador de sala técnica	1	Lider de Equipe	2	Retroescavadeira	1
Supervisor de Obra		Topografo (operador de GEORADAR)	1	Escavadeira Hidráulica	0
Engenheiro Civil	1	Apontador	1	Caminhão Munc	0
Topografo		Armador	2	Caminhão Cabinado	1
Técnico de planejamento	1	Pedreiro	8	Caminhão Caçamba	0
Técnico de Segurança	1	Carpinteiro	3	Caminhão Melosa	1
Profissional de Licenciamento		Servente	12	Caminhão Pipa	
Encarregado Administrativo	1	Operador de Betoneira	1	Carreta Munc	
Aux. Engenharia	1	Operador de Escavadeira hidráulica	1		
Aux. SMS		Operador de Retroescavadeira	0		
ASG	1	Motorista de Caçamba	0		
Eletricista	1	Motorista de Cabinada	1		
Aux. Eletricista		Motorista de Caminhão Munc			
Almoxarife		Motorista de Caminhão Comboio	1		
Aux. Almoxarife	1	Vigia Moturno	2		
Segurança Patrimonial	2				
TOTAL (Indireto)	12	TOTAL (Direto)	37	TOTAL (Equipamentos)	7

MÃO DE OBRA INDIRETA CTP		MÃO DE OBRA DIRETA CTP		EQUIPAMENTOS CTP	
Engenheiro Civil	1	Encarregado de Terraplenagem	1	Escavadeira Hidraulica	2
		Encarregado de Transporte	1	Motoniveladora	2
		Apontador	1	Retroescavadeira	1
		Serventes	4	Caminhão Pipa	4
		Motorista de Caminhão Pipa	4	Caminhão Basculante	10
		Motorista de Caminhão Basculante	10	Rolo Compactador	2
		Operador de Motoniveladora	2	Trator de Pneu	2
		Operador de Escavadeira	2		
		Operador de Retroescavadeira	1		
		Operador de Trator de Pneu	1		
		Operador de Rolo Compactador	2		
		Laboratorista	1		
TOTAL (Indireto)	1	TOTAL (Direto)	30	TOTAL (Equipamentos)	23

Data	Contratada	Data	Fiscalização
	Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda		Julio C. do Amaral
	Edenilson Pinto Bezerra		Engenheiro Civil
	Gerente de Contrato		CREA: 11676162022
	CREA: 5305-D/RN		

CONTRATADA:		VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA				CONTRATO
OBRA:		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.				Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	18/02/2026	434
240	433	-193				

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS							
MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS			
Gerente de contrato	1	Encarregado de Obra Civil	2	Veículo Leve	4		
Coordenador de sala técnica	1	Líder de Equipe	2	Retroescavadeira	1		
Supervisor de Obra		Topógrafo (operador de GEORADAR)	1	Escavadeira Hidráulica	0		
Engenheiro Civil	1	Apontador	1	Caminhão Munc	0		
Topógrafo		Armador	2	Caminhão Cabinado	1		
Técnico de planejamento	1	Pedreiro	8	Caminhão Caçamba	0		
Técnico de Segurança	1	Carpinteiro	3	Caminhão Melosa	1		
Profissional de Licenciamento		Servente	12	Caminhão Pipa			
Encarregado Administrativo	1	Operador de Betoneira	1	Carreta Munc			
Aux. Engenharia	1	Operador de Escavadeira hidráulica	1				
Aux. SMS		Operador de Retroescavadeira	0				
ASG	1	Motorista de Caçamba	0				
Eletricista	1	Motorista de Cabinada	1				
Aux. Eletricista		Motorista de Caminhão Munc					
Almoxarife		Motorista de Caminhão Comboio	1				
Aux. Almoxarife	1	Vigia Moturno	2				
Segurança Patrimonial	2						
TOTAL (Indireto)	12	TOTAL (Direto)	37	TOTAL (Equipamentos)	7		

MÃO DE OBRA INDIRETA CTP		MÃO DE OBRA DIRETA CTP		EQUIPAMENTOS CTP			
Engenheiro Civil	1	Encarregado de Terraplenagem	1	Escavadeira Hidraulica	2		
		Encarregado de Transporte	1	Motoniveladora	2		
		Apontador	1	Retroescavadeira	1		
		Serventes	4	Caminhão Pipa	4		
		Motorista de Caminhão Pipa	4	Caminhão Basculante	10		
		Motorista de Caminhão Basculante	10	Rolo Compactador	2		
		Operador de Motoniveladora	2	Trator de Pneu	2		
		Operador de Escavadeira	2				
		Operador de Retroescavadeira	1				
		Operador de Trator de Pneu	1				
		Operador de Rolo Compactador	2				
		Laboratorista	1				
TOTAL (Indireto)	1	TOTAL (Direto)	30	TOTAL (Equipamentos)	23		

Data	Contratada	Data	Fiscalização
	Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda Edenilson Pinto Bozerra Gerente de Contrato CREA 5305 D RN		Julio C. do Amaral Neto Engenheiro Civil CREA: 11676162022 PB




CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES,PASSARELAS,CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	19/02/2026	435
240	434	-194				

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS							
MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS			
Gerente de contrato	1	Encarregado de Obra Civil	2	Veículo Leve	4		
Coordenador de sala técnica	1	Líder de Equipe	2	Retroescavadeira	1		
Supervisor de Obra		Topógrafo (operador de GEORADAR)	1	Escavadeira Hidráulica	0		
Engenheiro Civil	1	Apontador	1	Caminhão Munck	0		
Topógrafo		Armador	2	Caminhão Cabinado	1		
Técnico de planejamento	1	Pedreiro	8	Caminhão Caçamba	0		
Técnico de Segurança	1	Carpinteiro	3	Caminhão Melosa	1		
Profissional de Licenciamento		Servente	12	Caminhão Pipa			
Encarregado Administrativo	1	Operador de Betoneira	1	Carreta Munck			
Aux. Engenharia	1	Operador de Escavadeira hidráulica	1				
Aux. SMS		Operador de Retroescavadeira	0				
ASG	1	Motorista de Caçamba	0				
Eletricista	1	Motorista de Cabinado	1				
Aux. Eletricista		Motorista de Caminhão Munck					
Almoxarife		Motorista de Caminhão Comboio	1				
Aux. Almoxarife	1	Vigia Moturno	2				
Segurança Patrimonial	2						
TOTAL (Indireto)	12	TOTAL (Direto)	37	TOTAL (Equipamentos)	7		

MÃO DE OBRA INDIRETA CTP		MÃO DE OBRA DIRETA CTP		EQUIPAMENTOS CTP		
Engenheiro Civil	1	Encarregado de Terraplenagem	1	Escavadeira Hidraulica	2	
		Encarregado de Transporte	1	Motoniveladora	2	
		Apontador	1	Retroescavadeira	1	
		Serventes	4	Caminhão Pipa	4	
		Motorista de Caminhão Pipa	4	Caminhão Basculante	10	
		Motorista de Caminhão Basculante	10	Rolo Compactador	2	
		Operador de Motoniveladora	2	Trator de Pneu	2	
		Operador de Escavadeira	2			
		Operador de Retroescavadeira	1			
		Operador de Trator de Pneu	1			
		Operador de Rolo Compactador	2			
		Laboratorista	1			
TOTAL (Indireto)	1	TOTAL (Direto)	30	TOTAL (Equipamentos)	23	

Data	Contratada	Data	Fiscalização
	Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5305 D RN		Julio C. do Amaral Neto Engenheiro Civil CREA: 11676162022 PB

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA				CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.				Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	19/02/2026
240	434	-194			435

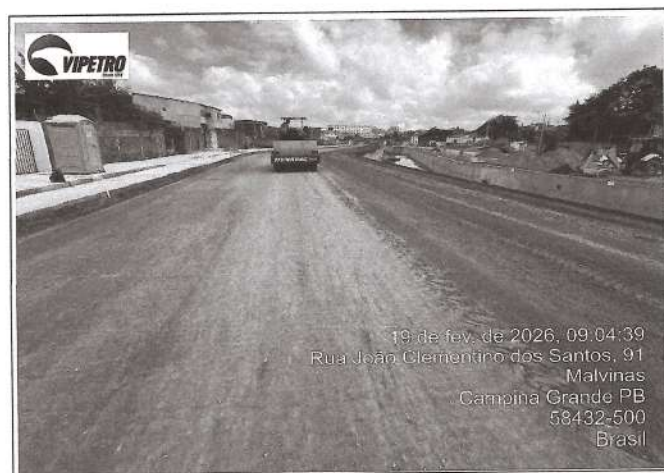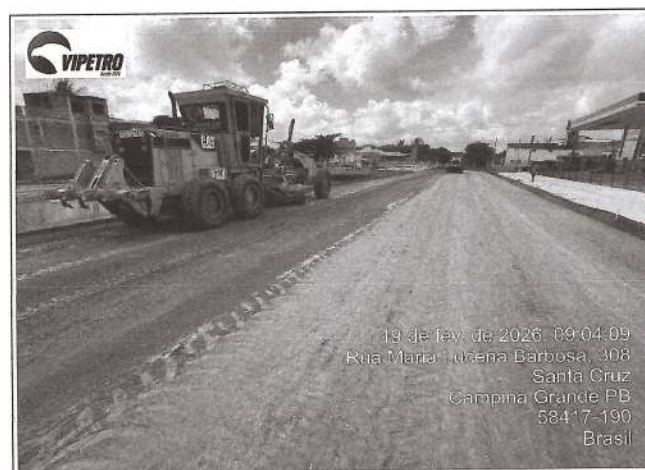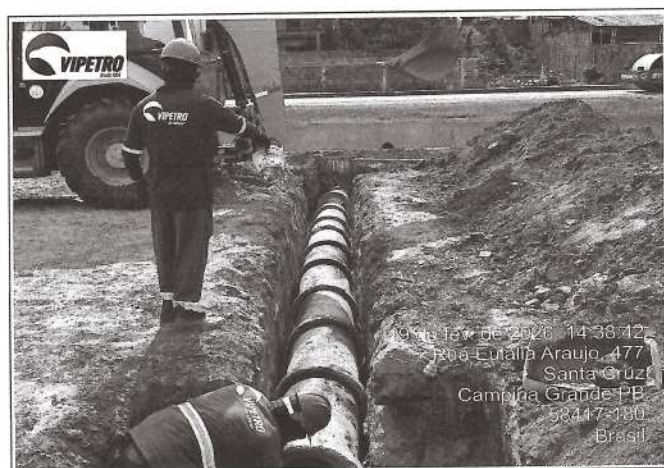

Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN

Julio C. do Amaral Neto
Engenheiro Civil
CREA: 11676162022 PB



RELATÓRIO DE SERVIÇOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA																	CONTRATO								
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.																	Nº 2.08.030/2024								
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1				TÉRMINO CONTRATUAL				DATA ATUAL				RDO Nº											
CONTRATUAL			DECORRIDO				FALTANTE				12/12/2024				09/08/2025				20/02/2026				436			
240			435				-195																			
QUADRO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS																										
Chuvas/Horas	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30				
Improdutivo																										
Impraticável																										
ATIVIDADES EXECUTADAS																										
ATIVIDADES PRINCIPAIS EM EXECUTADAS:																										
TERRAPLENAGEM																										
CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DE CAMADA DE BASE VIA LATERAL DIREITA																										
CONSTRUÇÃO DE CAIXAS TIPO BOCA DE LOBO DAS DRENAGENS MARGINAIS DA VIA LADO ESQUERDO																										
CALÇADAS E CICLOVIAS																										
CONCRETAGEM DE CALÇADAS/CICLOVIA																										
A VIPETRO INFORMA QUE ATENDERÁ À SOLICITAÇÃO DA SECOP PARA EXECUÇÃO DO ACESSO AO POSTO BORBOREMA. CONTUDO, REGISTRA-SE QUE, NO TRECHO EM QUESTÃO, EXISTE UMA CICLOVIA IMPLANTADA, PODENDO HAVER RISCO DE INCIDENTES OU ACIDENTES DECORRENTES DA INTERFERÊNCIA ENTRE O TRÁFEGO DE CICLISTAS E OS VEÍCULOS QUE ACESSARÃO O POSTO. RESSALTA-SE, AINDA, QUE A CALÇADA EXISTENTE FOI EXECUTADA EM CONCRETO COM RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA DE 15 MPA E ESPESSURA DE 8,0 CM, NÃO TENDO SIDO DIMENSIONADA PARA SUPORTAR TRÁFEGO VEICULAR. DESSA FORMA, É PROVÁVEL QUE O PAVIMENTO APRESENTE PATOLOGIAS PREMATURAS EM FUNÇÃO DAS CARGAS APLICADAS. DIANTE DO EXPOSTO, A VIPETRO ESCLARECE QUE NÃO PODERÁ GARANTIR A DURABILIDADE DO CONCRETO NESSE TRECHO ESPECÍFICO, UMA VEZ QUE SUA CONCEPÇÃO NÃO CONTEMPLA O USO PARA CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS. CASO SEJAM NECESSÁRIAS INTERVENÇÕES CORRETIVAS, MANUTENÇÕES OU RECOMPOSIÇÃO FUTURA, ESTAS DEVERÃO SER EXECUTADAS SOB RESPONSABILIDADE DA SECOP.																										
A VIPETRO RECEBEU NO DIA 08/12/2025 O ENSAIO DE LABORATÓRIO DO MATERIAL QUE SERÁ USADO NA EXECUÇÃO DA CAMADA DE SUB BASE. APÓS ANÁLISE DO RELATÓRIO DE CONTROLE TECNOLÓGICO Nº 519/2025, A VIPETRO CONCLUI QUE O MATERIAL DE JAZIDA ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DO DNIT PARA UTILIZAÇÃO COMO SUB-BASE, APRESENTANDO CBR ELEVADO, BAIXA EXPANSIVIDADE E POSSIBILIDADE DE COMPACTAÇÃO $\geq 100\%$ DO PROCTOR, CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DOS CONTROLES TECNOLÓGICOS DE CAMPO."																										
CONTINUAMOS NO AGUARDANDO DE PROVIDÊNCIAS COM RELAÇÃO AS INTERFERÊNCIAS QUE ESTÃO IMPEDINDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS CALÇADAS, CONFORME CROCRÍ JÁ ENVIANDO NO DIA 28/04/2025.																										
COMENTÁRIOS CONTRATADA																										
FISCALIZAÇÃO																										
A SECOP SOLICITA À VIPETRO A EXECUÇÃO DE UM ACESSO PARA ENTRADA DE VEÍCULOS NO POSTO BORBOREMA, LOCALIZADO NA ESTACA DA ESTACA 77+3 A ESTACA 79+6, SITUADO NA VIA MARGINAL DO CANAL DE BODOCONGÓ, ATUALMENTE EM FASE DE EXECUÇÃO. RESSALTA-SE QUE O REFERIDO ACESSO NÃO CONSTA NO PROJETO ORIGINAL.																										
Data	Contratada										Data	Fiscalização														
	Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5305 D RN											Julio C. do Amaral Neto Engenheiro Civil CREA: 11676162022 PB														



Data	Contratada	Data	Fiscalização
	Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5305 D RN		Julio C. do Amaral Neto Engenheiro Civil CREA: 11676162022 PB



CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	20/02/2026	436
240	435	-195				

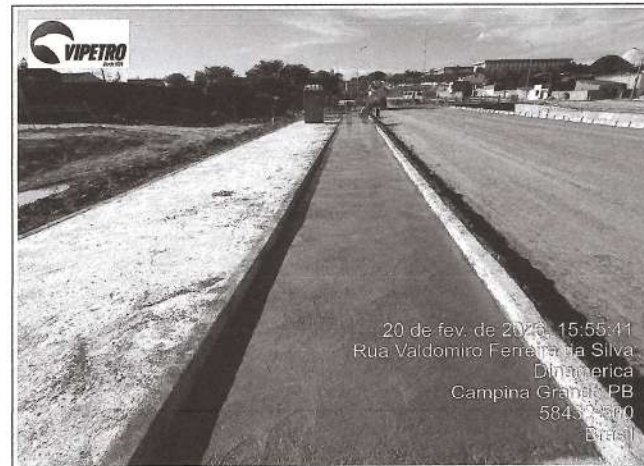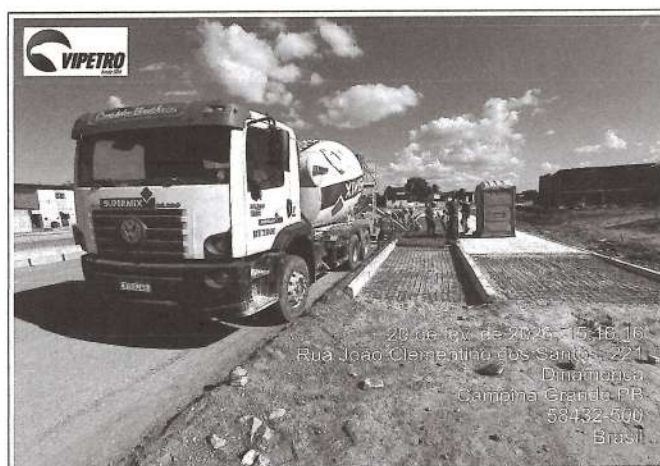

Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN

Julio C. do Amaral Neto
Engenheiro Civil
CREA: 11676162022 PB

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	20/02/2026	436
240	435	-195				

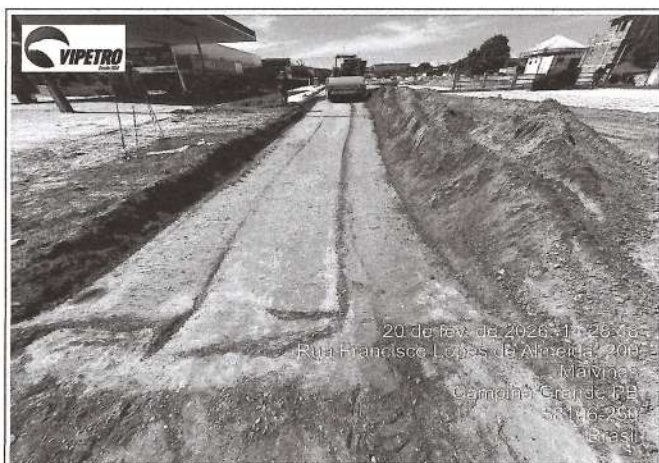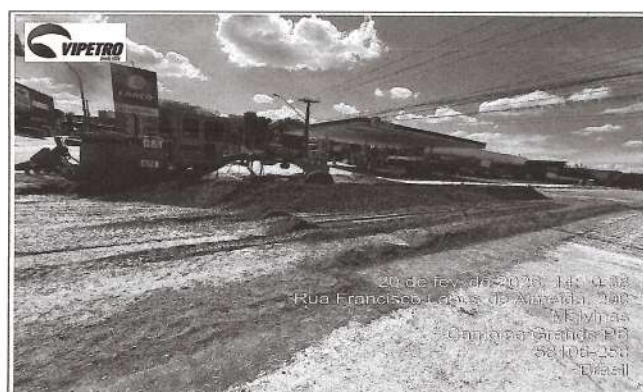

Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN

Julio C. do Amaral Neto
Engenheiro Civil
CREA: 11676162022 PB



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA																CONTRATO					
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.																Nº 2.08.030/2024					
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1			TÉRMINO CONTRATUAL			DATA ATUAL			RDO Nº										
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024			09/08/2025			21/02/2026			437										
240	436	-196																				
QUADRO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS																						
Chuvvas/Horas	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30
Improdutivo																						
Impraticável																						
ATIVIDADES EXECUTADAS																						
ATIVIDADES PRINCIPAIS EM EXECUTADAS:																						
TERRAPLENAGEM																						
CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DE CAMADA DE BASE VIA LATERAL DIREITA																						
CONSTRUÇÃO DE CAIXAS TIPO BOCA DE LOBO DAS DRENAGENS MARGINAIS DA VIA LADO ESQUERDO																						
CALÇADAS E CICLOVIAS																						
CONCRETAGEM DE CALÇADAS/CICLOVIA																						
A VIPETRO INFORMA QUE ATENDERÁ À SOLICITAÇÃO DA SECOP PARA EXECUÇÃO DO ACESSO AO POSTO BORBOREMA. CONTUDO, REGISTRA-SE QUE, NO TRECHO EM QUESTÃO, EXISTE UMA CICLOVIA IMPLANTADA, PODENDO HAVER RISCO DE INCIDENTES OU ACIDENTES DECORRENTES DA INTERFERÊNCIA ENTRE O TRÁFEGO DE CICLISTAS E OS VEÍCULOS QUE ACESSARÃO O POSTO. RESSALTA-SE, AINDA, QUE A CALÇADA EXISTENTE FOI EXECUTADA EM CONCRETO COM RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA DE 15 MPA E ESPESSURA DE 8,0 CM, NÃO TENDO SIDO DIMENSIONADA PARA SUPORTAR TRÁFEGO VEICULAR. DESSA FORMA, É PROVÁVEL QUE O PAVIMENTO APRESENTE PATOLOGIAS PREMATURAS EM FUNÇÃO DAS CARGAS APLICADAS. DIANTE DO EXPOSTO, A VIPETRO ESCLARECE QUE NÃO PODERÁ GARANTIR A DURABILIDADE DO CONCRETO NESSE TRECHO ESPECÍFICO, UMA VEZ QUE SUA CONCEPÇÃO NÃO CONTEMPLA O USO PARA CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS. CASO SEJAM NECESSÁRIAS INTERVENÇÕES CORRETIVAS, MANUTENÇÕES OU RECOMPOSIÇÃO FUTURA, ESTAS DEVERÃO SER EXECUTADAS SOB RESPONSABILIDADE DA SECOP.																						
A VIPETRO RECEBEU NO DIA 08/12/2025 O ENSAIO DE LABORATÓRIO DO MATERIAL QUE SERÁ USADO NA EXECUÇÃO DA CAMADA DE SUB BASE. APÓS ANÁLISE DO RELATÓRIO DE CONTROLE TECNOLÓGICO Nº 519/2025, A VIPETRO CONCLUI QUE O MATERIAL DE JAZIDA ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DO DNIT PARA UTILIZAÇÃO COMO SUB-BASE, APRESENTANDO CBR ELEVADO, BAIXA EXPANSIVIDADE E POSSIBILIDADE DE COMPACTAÇÃO $\geq 100\%$ DO PROCTOR, CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DOS CONTROLES TECNOLÓGICOS DE CAMPO."																						
CONTINUAMOS NO AGUARDO DE PROVIDÊNCIAS COM RELAÇÃO AS INTERFERÊNCIAS QUE ESTÃO IMPEDINDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS CALÇADAS, CONFORME CROCI JÁ ENVIANDO NO DIA 28/04/2025.																						
COMENTÁRIOS CONTRATADA																						
FISCALIZAÇÃO																						
A SECOP SOLICITA À VIPETRO A EXECUÇÃO DE UM ACESSO PARA ENTRADA DE VEÍCULOS NO POSTO BORBOREMA, LOCALIZADO NA ESTACA DA ESTACA 77+3 A ESTACA 79+6, SITUADO NA VIA MARGINAL DO CANAL DE BODOCONGÓ, ATUALMENTE EM FASE DE EXECUÇÃO. RESSALTA-SE QUE O REFERIDO ACESSO NÃO CONSTA NO PROJETO ORIGINAL.																						
Data	Vipetro Constr. e Montagens Industriais Ltda										Data	Fiscalização										
	Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5305 D RN											Julio C. do Amaral Neto Engenheiro Civil CREA: 11676162022 PB										



Data	Contratante	Data	Fiscalização
	Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5305 D RN		Julio C. do Amaral Neto Engenheiro Civil CREA: 11676162022 PB





RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ



CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	21/02/2026	437
240	436	-196				

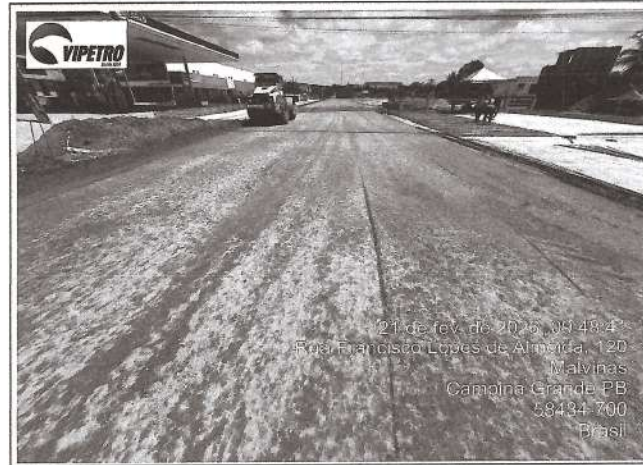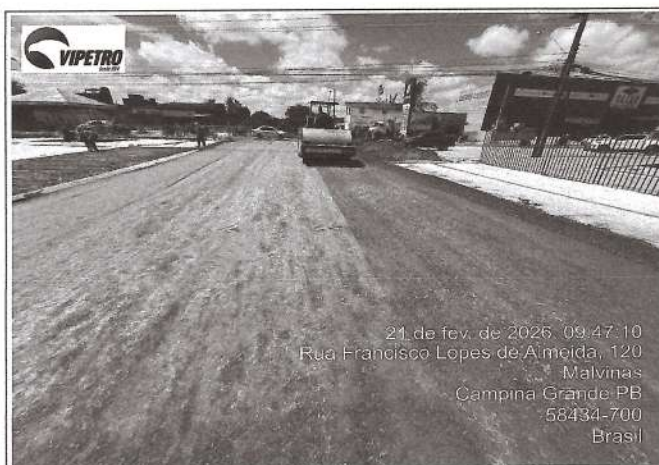

Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN

Julio C. do Amaral Neto
Engenheiro Civil
CREA: 11676162022 PB



MÃO DE OBRA INDIRETA CTP		MÃO DE OBRA DIRETA CTP		EQUIPAMENTOS CTP			
Engenheiro Civil	1	Encarregado de Terraplenagem	1	Escavadeira Hidraulica	2		
		Encarregado de Transporte	1	Motoniveladora	2		
		Apontador	1	Retroescavadeira	1		
		Serventes	4	Caminhão Pipa	4		
		Motorista de Caminhão Pipa	4	Caminhão Basculante	10		
		Motorista de Caminhão Basculante	10	Rolo Compactador	2		
		Operador de Motoniveladora	2	Trator de Pneu	2		
		Operador de Escavadeira	2				
		Operador de Retroescavadeira	1				
		Operador de Trator de Pneu	1				
		Operador de Rolo Compactador	2				
		Laboratorista	1				
TOTAL (Indireto)	1	TOTAL (Direto)	30	TOTAL (Equipamentos)	23		

Data	Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda	Data	Racionalização
	Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5305 D RN		Julio C. do Amaral Neto Engenheiro Civil CREA: 11676162022 PE



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORES DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	Nº 2.08.030/2024

RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	23/02/2026	439
240	438	-198				

QUADRO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS																				
Chuvvas/Horas	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30
Improdutivo																				
Impraticável																				

ATIVIDADES EXECUTADAS

ATIVIDADES PRINCIPAIS EM EXECUTADAS:

TERRAPLENAGEM

CONTINUAÇÃO DE EXECUÇÃO DA CAMADA DE SUB BASE DA VIA LATERAL ESQUERDA

CONSTRUÇÃO DE CAIXAS TIPO BOCA DE LOBO DAS DRENAGENS MARGINAIS DA VIA LADO ESQUERDO

CALÇADAS E CICLOVIAS

APLICAÇÃO DE MEIO FIO

A VIPETRO INFORMA QUE ATENDERÁ À SOLICITAÇÃO DA SECOB PARA EXECUÇÃO DO ACESSO AO POSTO BORBOREMA. CONTUDO, REGISTRA-SE QUE, NO TRECHO EM QUESTÃO, EXISTE UMA CICLOVIA IMPLANTADA, PODENDO HAVER RISCO DE INCIDENTES OU ACIDENTES DECORRENTES DA INTERFERÊNCIA ENTRE O TRÁFEGO DE CICLISTAS E OS VEÍCULOS QUE ACESSARÃO O POSTO. RESSALTA-SE, AINDA, QUE A CALÇADA EXISTENTE FOI EXECUTADA EM CONCRETO COM RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA DE 15 MPA E ESPESSURA DE 8,0 CM, NÃO TENDO SIDO DIMENSIONADA PARA SUPOORTAR TRÁFEGO VEICULAR. DESSA FORMA, É PROVÁVEL QUE O PAVIMENTO APRESENTE PATOLOGIAS PREMATURAS EM FUNÇÃO DAS CARGAS APLICADAS. DIANTE DO EXPOSTO, A VIPETRO ESCLARECE QUE NÃO PODERÁ GARANTIR A DURABILIDADE DO CONCRETO NESSE TRECHO ESPECÍFICO, UMA VEZ QUE SUA CONCEPÇÃO NÃO CONTEMPLA O USO PARA CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS. CASO SEJAM NECESSÁRIAS INTERVENÇÕES CORRETIVAS, MANUTENÇÕES OU RECOMPOSIÇÃO FUTURA, ESTAS DEVERÃO SER EXECUTADAS SOB RESPONSABILIDADE DA SECOB.

A VIPETRO RECEBEU NO DIA 08/12/2025 O ENSAIO DE LABORATÓRIO DO MATERIAL QUE SERÁ USADO NA EXECUÇÃO DA CAMADA DE SUB BASE. APÓS ANÁLISE DO RELATÓRIO DE CONTROLE TECNOLÓGICO Nº 519/2025, A VIPETRO CONCLUI QUE O MATERIAL DE JAZIDA ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DO DNIT PARA UTILIZAÇÃO COMO SUB-BASE, APRESENTANDO CBR ELEVADO, BAIXA EXPANSIVIDADE E POSSIBILIDADE DE COMPACTAÇÃO $\geq 100\%$ DO PROCTOR, CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DOS CONTROLES TECNOLÓGICOS DE CAMPO."

CONTINUAMOS NO AGUARDANDO DE PROVIDÊNCIAS COM RELAÇÃO AS INTERFERÊNCIAS QUE ESTÃO IMPEDINDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS CALÇADAS, CONFORME CROCRI JÁ ENVIANDO NO DIA 28/04/2025.

COMENTÁRIOS CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO



A SECOB SOLICITA À VIPETRO A EXECUÇÃO DE UM ACESSO PARA ENTRADA DE VEÍCULOS NO POSTO BORBOREMA, LOCALIZADO NA ESTACA DA ESTACA 77+3 A ESTACA 79+6, SITUADO NA VIA MARGINAL DO CANAL DE BODOCONGÓ, ATUALMENTE EM FASE DE EXECUÇÃO. RESSALTA-SE QUE O REFERIDO ACESSO NÃO CONSTA NO PROJETO ORIGINAL.

Data	Contratada	Data	Fiscalização
	Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5305 D RN		Julio C. do Amaral Neto Engenheiro Civil CREA: 11676162022 PB



Data	Contratada	Data	Fiscalização
	Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5305 D RN		Julio C. do Amaral Neto Engenheiro Civil CREA: 11676162022 PB



CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	23/02/2026	439
240	438	-198				

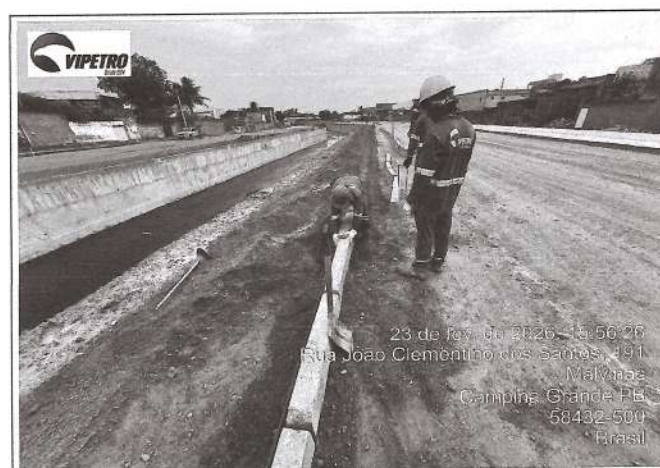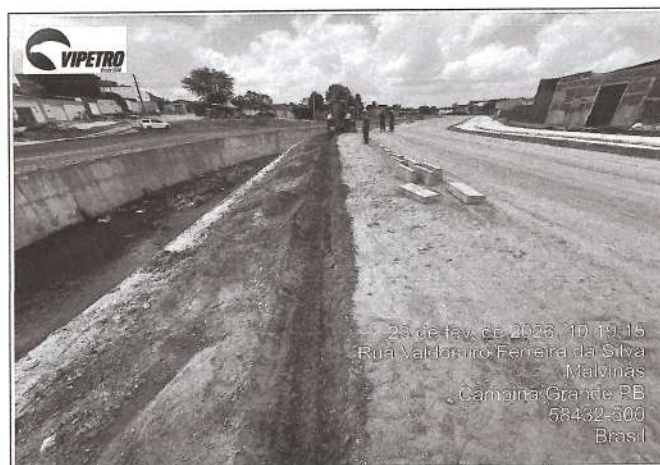

Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN

Julio C. do Amaral Neto
Engenheiro Civil
CREA: 11676162022 PB

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	23/02/2026	439
240	438	-198				

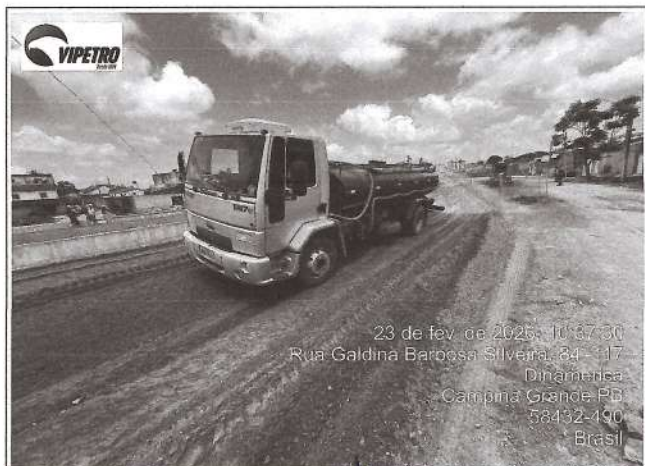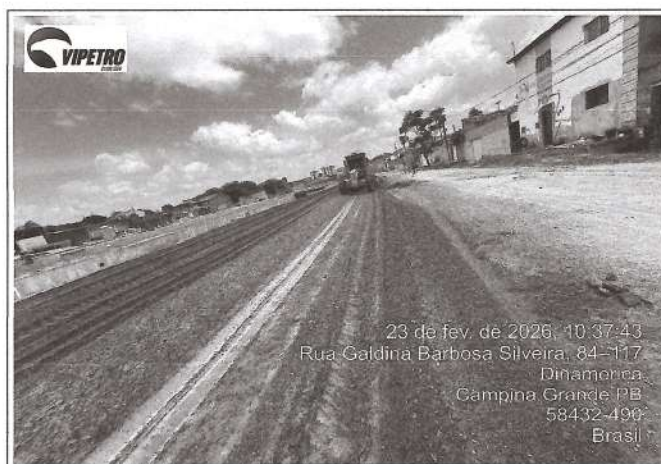

Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN

Julio C. do Amaral Neto
Engenheiro Civil
CREA: 11676162022 PB



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA																CONTRATO					
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.																Nº 2.08.030/2024					
RESUMOS DE DIAS						INICIO REAL - AC 1				TÉRMINO CONTRATUAL				DATA ATUAL				RDO Nº				
CONTRATUAL		DECORRIDO		FALTANTE		12/12/2024				09/08/2025				24/02/2026				440				
240		439		-199																		
QUADRO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS																						
Chuv./Horas	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30
Improdutivo																						
Impraticável																						
ATIVIDADES EXECUTADAS																						
ATIVIDADES PRINCIPAIS EM EXECUTADAS:																						
TERRAPLENAGEM																						
CONTINUAÇÃO DE EXECUÇÃO DA CAMADA DE SUB BASE DA VIA LATERAL ESQUERDA																						
CONSTRUÇÃO DE CAIXAS TIPO BOCA DE LOBO DAS DRENAGENS MARGINAIS DA VIA LADO ESQUERDO																						
CALÇADAS E CICLOVIAS																						
APLICAÇÃO DE MEIO FIO																						
BARREIRAS NEW JERSEY																						
INICIO DE FORMA PARA CONCRETAGEM																						
PONTE ESTACA 19+00																						
EXECUÇÃO DE CAMADA DE BASE																						
A VIPETRO INFORMA QUE ATENDERÁ À SOLICITAÇÃO DA SECOP PARA EXECUÇÃO DO ACESSO AO POSTO BORBOREMA. CONTUDO, REGISTRA-SE QUE, NO TRECHO EM QUESTÃO, EXISTE UMA CICLOVIA IMPLANTADA, PODENDO HAVER RISCO DE INCIDENTES OU ACIDENTES DECORRENTES DA INTERFERÊNCIA ENTRE O TRÁFEGO DE CICLISTAS E OS VEÍCULOS QUE ACESSARÃO O POSTO. RESSALTA-SE, AINDA, QUE A CALÇADA EXISTENTE FOI EXECUTADA EM CONCRETO COM RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA DE 15 MPA E ESPESSURA DE 8,0 CM, NÃO TENDO SIDO DIMENSIONADA PARA SUPORTAR TRÁFEGO VEICULAR. DESSA FORMA, É PROVÁVEL QUE O PAVIMENTO APRESENTE PATOLOGIAS PREMATURAS EM FUNÇÃO DAS CARGAS APLICADAS. DIANTE DO EXPOSTO, A VIPETRO ESCLARECE QUE NÃO PODERÁ GARANTIR A DURABILIDADE DO CONCRETO NESSE TRECHO ESPECÍFICO, UMA VEZ QUE SUA CONCEPÇÃO NÃO CONTEMPLA O USO PARA CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS. CASO SEJAM NECESSÁRIAS INTERVENÇÕES CORRETIVAS, MANUTENÇÕES OU RECOMPOSIÇÃO FUTURA, ESTAS DEVERÃO SER EXECUTADAS SOB RESPONSABILIDADE DA SECOP.																						
A VIPETRO RECEBEU NO DIA 08/12/2025 O ENSAIO DE LABORATÓRIO DO MATERIAL QUE SERÁ USADO NA EXECUÇÃO DA CAMADA DE SUB BASE. APÓS ANÁLISE DO RELATÓRIO DE CONTROLE TECNOLÓGICO Nº 519/2025, A VIPETRO CONCLUI QUE O MATERIAL DE JAZIDA ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DO DNIT PARA UTILIZAÇÃO COMO SUB-BASE, APRESENTANDO CBR ELEVADO, BAIXA EXPANSIVIDADE E POSSIBILIDADE DE COMPACTAÇÃO $\geq 100\%$ DO PROCTOR, CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DOS CONTROLES TECNOLÓGICOS DE CAMPO."																						
CONTINUAMOS NO AGUARDO DE PROVIDÊNCIAS COM RELAÇÃO AS INTERFERÊNCIAS QUE ESTÃO IMPEDINDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS CALÇADAS, CONFORME CROCI JÁ ENVIANDO NO DIA 28/04/2025.																						
COMENTÁRIOS CONTRATADA																						
FISCALIZAÇÃO																						
A SECOP SOLICITA À VIPETRO A EXECUÇÃO DE UM ACESSO PARA ENTRADA DE VEÍCULOS NO POSTO BORBOREMA, LOCALIZADO NA ESTACA DA ESTACA 77+3 A ESTACA 79+6, SITUADO NA VIA MARGINAL DO CANAL DE BODOCONGÓ, ATUALMENTE EM FASE DE EXECUÇÃO. RESSALTA-SE QUE O REFERIDO ACESSO NÃO CONSTA NO PROJETO ORIGINAL.																						
Data	Contratada										Data	Fiscalização										
	Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5305 D RN											Julio C. do Amaral Neto Engenheiro Civil CREA: 11676162022 PB										



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ





CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA				CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.				Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INÍCIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	24/02/2026
240	439	-199			RDO Nº 440

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS					
MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
Gerente de contrato	1	Encarregado de Obra Civil	2	Veículo Leve	4
Coordenador de sala técnica	1	Líder de Equipe	2	Retroescavadeira	1
Supervisor de Obra		Topógrafo (operador de GEORADAR)	1	Escavadeira Hidráulica	0
Engenheiro Civil	1	Apontador	1	Caminhão Munck	0
Topógrafo		Armador	1	Caminhão Cabinado	1
Técnico de planejamento	1	Pedreiro	8	Caminhão Caçamba	0
Técnico de Segurança	1	Carpinteiro	3	Caminhão Melosa	1
Profissional de Licenciamento		Servente	10	Caminhão Pipa	
Encarregado Administrativo	1	Operador de Betoneira	1	Carreta Munck	
Aux. Engenharia	1	Operador de Escavadeira hidráulica	1		
Aux. SMS		Operador de Retroescavadeira	0		
ASG	1	Motorista de Caçamba	0		
Eletricista	1	Motorista de Cabinada	1		
Aux. Eletricista		Motorista de Caminhão Munck			
Almoxarife		Motorista de Caminhão Comboio	1		
Aux. Almoxarife	1	Vigia Moturno	2		
Segurança Patrimonial	2				
TOTAL (Indireto)	12	TOTAL (Direto)	34	TOTAL (Equipamentos)	7

MÃO DE OBRA INDIRETA CTP		MÃO DE OBRA DIRETA CTP		EQUIPAMENTOS CTP	
Engenheiro Civil	1	Encarregado de Terraplenagem	1	Escavadeira Hidráulica	1
		Encarregado de Transporte	1	Motoniveladora	1
		Apontador	1	Retroescavadeira	1
		Serventes	4	Caminhão Pipa	1
		Motorista de Caminhão Pipa	1	Caminhão Basculante	4
		Motorista de Caminhão Basculante	4	Rolo Compactador	2
		Operador de Motoniveladora	1	Trator de Pneu	1
		Operador de Escavadeira	1		
		Operador de Retroescavadeira	1		
		Operador de Trator de Pneu	1		
		Operador de Rolo Compactador	2		
		Laboratorista	1		
TOTAL (Indireto)	1	TOTAL (Direto)	19	TOTAL (Equipamentos)	11

Data	Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda	Data	Fiscalização
	Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5305-D/RN		Julio C. do Amaral Neto Engenheiro Civil CREA: 11676162022 PB




CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INÍCIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	24/02/2026	440
240	439	-199				

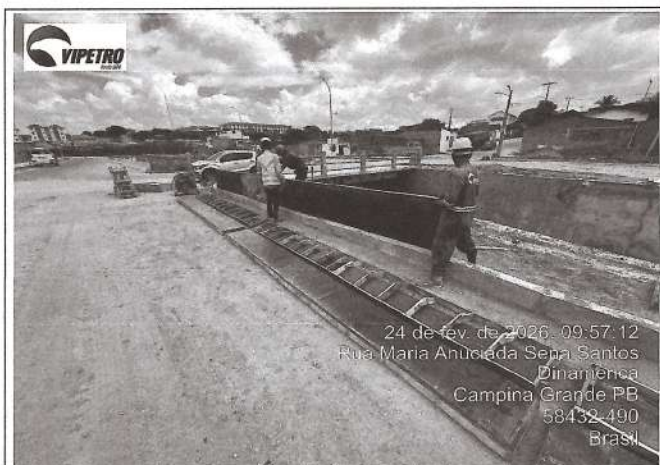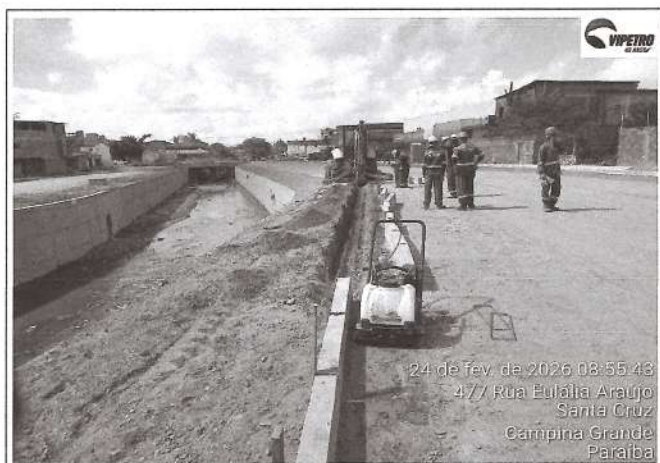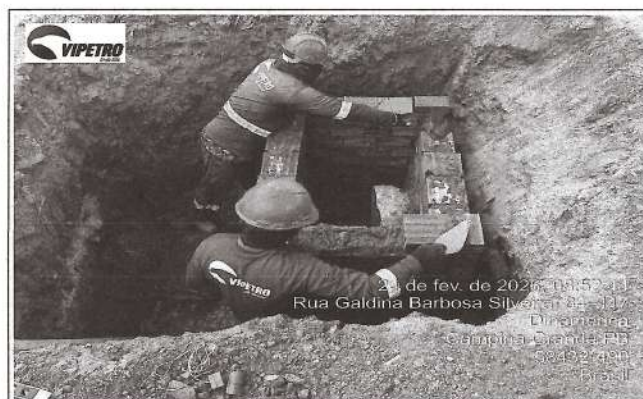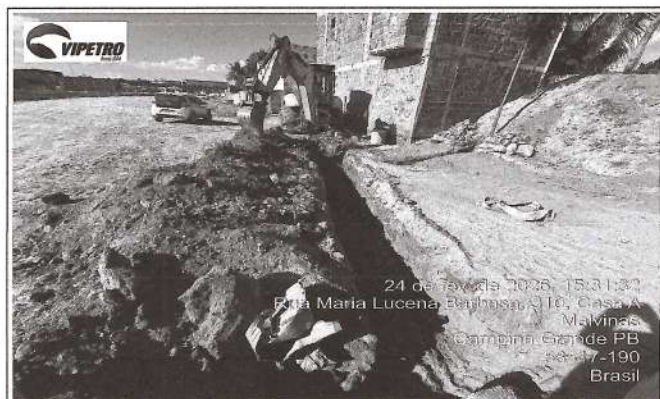

Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN

Julio C. do Amaral Neto
Engenheiro Civil
CREA: 11676162027

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	24/02/2026	440
240	439	-199				

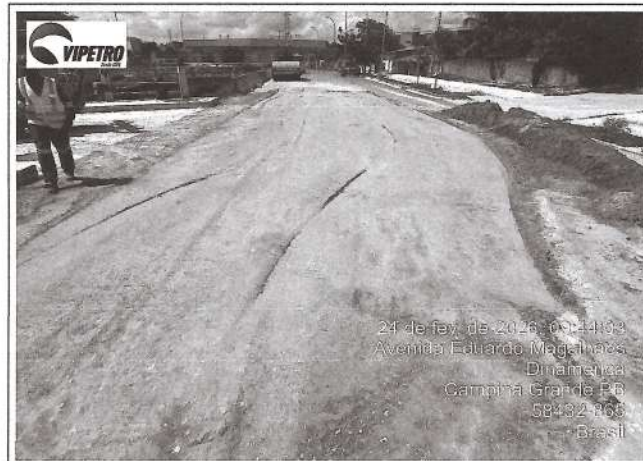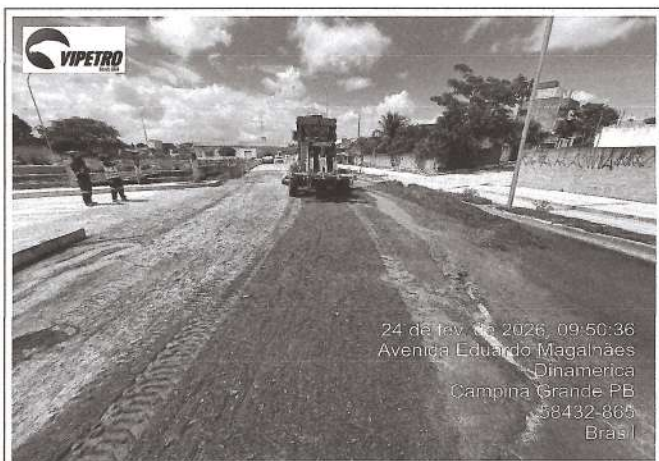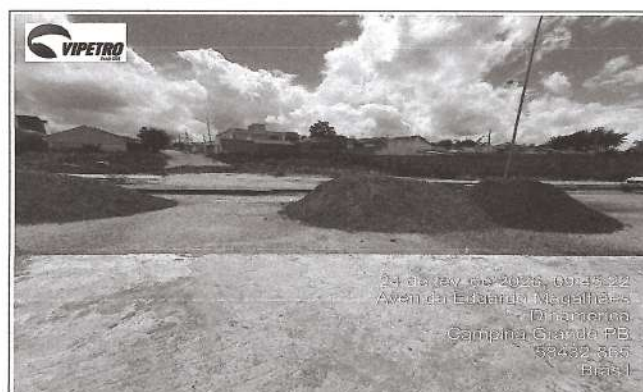

Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN

Julio C. do Amaral Neto
Engenheiro Civil
CREA: 11676162022 PB



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA																CONTRATO									
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.																Nº 2.08.030/2024									
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1				TÉRMINO CONTRATUAL				DATA ATUAL				RDO Nº											
CONTRATUAL			DECORRIDO				FALTANTE				12/12/2024				09/08/2025				25/02/2026				441			
240			440				-200																			
QUADRO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS																										
Chuvas/Horas	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30				
Improdutivo																										
Impraticável																										
ATIVIDADES EXECUTADAS																										
ATIVIDADES PRINCIPAIS EM EXECUTADAS:																										
TERRAPLENAGEM																										
CONTINUAÇÃO DE EXECUÇÃO DA CAMADA DE SUB BASE DA VIA LATERAL ESQUERDA																										
CONSTRUÇÃO DE CAIXAS TIPO BOCA DE LOBO DAS DRENAGENS MARGINAIS DA VIA LADO ESQUERDO																										
CALÇADAS E CICLOVIAS																										
APLICAÇÃO DE MEIO FIO																										
BARREIRAS NEW JERSEY																										
CONTINUAÇÃO DE FORMA PARA CONCRETAGEM																										
PONTE ESTACA 45+15																										
EXECUÇÃO DE CAMADA DE BASE																										
A VIPETRO INFORMA QUE ATENDERÁ À SOLICITAÇÃO DA SECOB PARA EXECUÇÃO DO ACESSO AO POSTO BORBOREMA. CONTUDO, REGISTRA-SE QUE, NO TRECHO EM QUESTÃO, EXISTE UMA CICLOVIA IMPLANTADA, PODENDO HAVER RISCO DE INCIDENTES OU ACIDENTES DECORRENTES DA INTERFERÊNCIA ENTRE O TRÁFEGO DE CICLISTAS E OS VEÍCULOS QUE ACESSARÃO O POSTO. RESSALTA-SE, AINDA, QUE A CALÇADA EXISTENTE FOI EXECUTADA EM CONCRETO COM RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA DE 15 MPA E ESPESSURA DE 8,0 CM, NÃO TENDO SIDO DIMENSIONADA PARA SUPOSTAR TRÁFEGO VEICULAR. DESSA FORMA, É PROVÁVEL QUE O PAVIMENTO APRESENTE PATOLOGIAS PREMATURAS EM FUNÇÃO DAS CARGAS APLICADAS. DIANTE DO EXPOSTO, A VIPETRO ESCLARECE QUE NÃO PODERÁ GARANTIR A DURABILIDADE DO CONCRETO NESSE TRECHO ESPECÍFICO, UMA VEZ QUE SUA CONCEPÇÃO NÃO CONTEMPLA O USO PARA CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS. CASO SEJAM NECESSÁRIAS INTERVENÇÕES CORRETIVAS, MANUTENÇÕES OU RECOMPOSIÇÃO FUTURA, ESTAS DEVERÃO SER EXECUTADAS SOB RESPONSABILIDADE DA SECOB.																										
A VIPETRO RECEBEU NO DIA 08/12/2025 O ENSAIO DE LABORATÓRIO DO MATERIAL QUE SERÁ USADO NA EXECUÇÃO DA CAMADA DE SUB BASE. APÓS ANÁLISE DO RELATÓRIO DE CONTROLE TECNOLÓGICO Nº 519/2025, A VIPETRO CONCLUI QUE O MATERIAL DE JAZIDA ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DO DNIT PARA UTILIZAÇÃO COMO SUB-BASE, APRESENTANDO CBR ELEVADO, BAIXA EXPANSIVIDADE E POSSIBILIDADE DE COMPACTAÇÃO $\geq 100\%$ DO PROCTOR, CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DOS CONTROLES TECNOLÓGICOS DE CAMPO."																										
CONTINUAMOS NO AGUARDO DE PROVIDÊNCIAS COM RELAÇÃO AS INTERFERÊNCIAS QUE ESTÃO IMPEDINDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS CALÇADAS, CONFORME CROCRI JÁ ENVIANDO NO DIA 28/04/2025.																										
COMENTÁRIOS CONTRATADA																										
FISCALIZAÇÃO																										
A SECOB SOLICITA À VIPETRO A EXECUÇÃO DE UM ACESSO PARA ENTRADA DE VEÍCULOS NO POSTO BORBOREMA, LOCALIZADO NA ESTACA DA ESTACA 77+3 A ESTACA 79+6, SITUADO NA VIA MARGINAL DO CANAL DE BODOCONGÓ, ATUALMENTE EM FASE DE EXECUÇÃO. RESSALTA-SE QUE O REFERIDO ACESSO NÃO CONSTA NO PROJETO ORIGINAL.																										
Data	Contratada										Data	Fiscalização														
	Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5305 D RN											Julio C. do Amaral Neto Engenheiro Civil CREA: 11676162022 PB														



MÃO DE OBRA INDIRETA CTP		MÃO DE OBRA DIRETA CTP		EQUIPAMENTOS CTP			
Engenheiro Civil	1	Encarregado de Terraplenagem	1	Escavadeira Hidraulica	1		
		Encarregado de Transporte	1	Motoniveladora	1		
		Apontador	1	Retroescavadeira	1		
		Serventes	4	Caminhão Pipa	1		
		Motorista de Caminhão Pipa	1	Caminhão Basculante	4		
		Motorista de Caminhão Basculante	4	Rolo Compactador	2		
		Operador de Motoniveladora	1	Trator de Pneu	1		
		Operador de Escavadeira	1				
		Operador de Retroescavadeira	1				
		Operador de Trator de Pneu	1				
		Operador de Rolo Compactador	2				
		Laboratorista	1				
TOTAL (Indireto)	1	TOTAL (Direto)	19	TOTAL (Equipamentos)	11		

Data	Contratada	Data	Fiscalização
	Viperro Constr. e Mont. Industriais Ltda Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5.305 D RN		Julio C. do Amaral Neto Engenheiro Civil CREA: 11676162022 PB



CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INÍCIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	25/02/2026	441
240	440	-200				



Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN

Julio C. do Amaral Neto
Engenheiro Civil
CREA: 11676162022 PB

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	25/02/2026	441
240	440	-200				

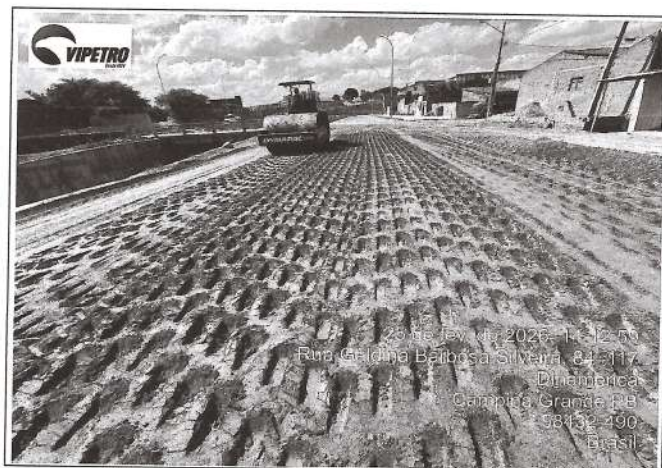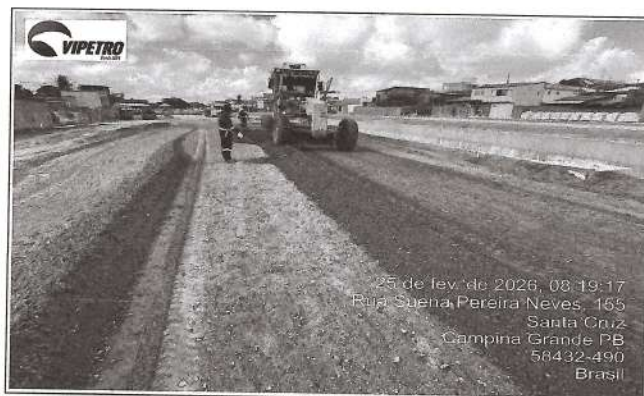

Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN

Julio C. do Amaral Neto
Engenheiro Civil
CREA: 11676162022 PB



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA															CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORES DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.															Nº 2.08.030/2024

RESUMOS DE DIAS			INÍCIO REAL - AC 1		TÉRMINO CONTRATUAL		DATA ATUAL		RDO Nº	
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE								
240	441	-201	12/12/2024		09/08/2025		26/02/2026		442	

QUADRO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS																					
Chuvvas/Horas	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00
Improdutivo																					
Impraticável																					

ATIVIDADES EXECUTADAS

ATIVIDADES PRINCIPAIS EM EXECUTADAS:

TERRAPLENAGEM

CONTINUAÇÃO DE EXECUÇÃO DA CAMADA DE SUB BASE DA VIA LATERAL ESQUERDA

CONSTRUÇÃO DE CAIXAS TIPO BOCA DE LOBO DAS DRENAGENS MARGINAIS DA VIA LADO ESQUERDO

CALÇADAS E CICLOVIAS

APLICAÇÃO DE MEIO FIO

BARREIRAS NEW JERSEY

CONTINUAÇÃO DAS FORMAS PARA CONCRETAGEM

PONTE ESTACA 45+15

EXECUÇÃO DE CAMADA DE BASE

A VIPETRO INFORMA QUE ATENDERÁ À SOLICITAÇÃO DA SECOP PARA EXECUÇÃO DO ACESSO AO POSTO BORBOREMA. CONTUDO, REGISTRA-SE QUE, NO TRECHO EM QUESTÃO, EXISTE UMA CICLOVIA IMPLANTADA, PODENDO HAVER RISCO DE INCIDENTES OU ACIDENTES DECORRENTES DA INTERFERÊNCIA ENTRE O TRÁFEGO DE CICLISTAS E OS VEÍCULOS QUE ACESSARÃO O POSTO. RESSALTA-SE, AINDA, QUE A CALÇADA EXISTENTE FOI EXECUTADA EM CONCRETO COM RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA DE 15 MPa E ESPESSURA DE 8,0 CM, NÃO TENDO SIDO DIMENSIONADA PARA SUPOORTAR TRÁFEGO VEICULAR. DESSA FORMA, É PROVÁVEL QUE O PAVIMENTO APRESENTE PATOLOGIAS PREMATURAS EM FUNÇÃO DAS CARGAS APLICADAS. DIANTE DO EXPOSTO, A VIPETRO ESCLARECE QUE NÃO PODERÁ GARANTIR A DURABILIDADE DO CONCRETO NESSE TRECHO ESPECÍFICO, UMA VEZ QUE SUA CONCEPÇÃO NÃO CONTEMPLA O USO PARA CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS. CASO SEJAM NECESSÁRIAS INTERVENÇÕES CORRETIVAS, MANUTENÇÕES OU RECOMPOSIÇÃO FUTURA, ESTAS DEVERÃO SER EXECUTADAS SOB RESPONSABILIDADE DA SECOP.

A VIPETRO RECEBEU NO DIA 08/12/2025 O ENSAIO DE LABORATÓRIO DO MATERIAL QUE SERÁ USADO NA EXECUÇÃO DA CAMADA DE SUB BASE. APÓS ANÁLISE DO RELATÓRIO DE CONTROLE TECNOLÓGICO Nº 519/2025, A VIPETRO CONCLUI QUE O MATERIAL DE JAZIDA ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DO DNIT PARA UTILIZAÇÃO COMO SUB-BASE, APRESENTANDO CBR ELEVADO, BAIXA EXPANSIVIDADE E POSSIBILIDADE DE COMPACTAÇÃO $\geq 100\%$ DO PROCTOR, CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DOS CONTROLES TECNOLÓGICOS DE CAMPO."

CONTINUAMOS NO AGUARDANDO DE PROVIDÊNCIAS COM RELAÇÃO AS INTERFERÊNCIAS QUE ESTÃO IMPEDINDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS CALÇADAS, CONFORME CROCRI JÁ ENVIANDO NO DIA 28/04/2025.

COMENTÁRIOS CONTRATADA

FISCALIZAÇÃO

A SECOP SOLICITA À VIPETRO A EXECUÇÃO DE UM ACESSO PARA ENTRADA DE VEÍCULOS NO POSTO BORBOREMA, LOCALIZADO NA ESTACA DA ESTACA 77+3 A ESTACA 79+6, SITUADO NA VIA MARGINAL DO CANAL DE BODOCONGÓ, ATUALMENTE EM FASE DE EXECUÇÃO. RESSALTA-SE QUE O REFERIDO ACESSO NÃO CONSTA NO PROJETO ORIGINAL.

Data	Contratada	Data	Fiscalização
	Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5305 D RN		Julio C. do Amaral Neto Engenheiro Civil CREA: 11676162022 PB



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGO

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGO, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORES DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024

RESUMOS DE DIAS			INICIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE				
240	442	-202	12/12/2024	09/08/2025	27/02/2026	443

QUADRO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS																				
Chuvvas/Horas	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30
Improdutivo																				
Impraticável																				

ATIVIDADES EXECUTADAS

ATIVIDADES PRINCIPAIS EM EXECUTADAS:

VIAS DO CANAL

CONSTRUÇÃO DE CAIXAS TIPO BOCA DE LOBO DAS DRENAGENS MARGINAIS DA VIA LADO ESQUERDO

CALÇADAS E CICLOVIAS

APLICAÇÃO DE MEIO FIO

BARREIRAS NEW JERSEY

CONTINUAÇÃO DE FORMA PARA CONCRETAGEM

CONTINUAMOS NO AGUARDANDO DE PROVIDÊNCIAS COM RELAÇÃO AS INTERFERÊNCIAS QUE ESTÃO IMPEDINDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS CALÇADAS, CONFORME CROCI JÁ ENVIANDO NO DIA 28/04/2025.

COMENTÁRIOS CONTRATADA



FISCALIZAÇÃO

Data	Contratada	Data	Fiscalização
	Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5305 D RN		Julio C. do Amaral Neto Engenheiro Civil CREA: 11676162022 PB



Data	Vipetro Constr. e Montagem Industriais Ltda	Data	Fiscalização
	Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5305 D RN		Julio C. do Amaral Neto Engenheiro Civil CREA: 11676162022 PB

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA					CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INÍCIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	27/02/2026	443
240	442	-202				

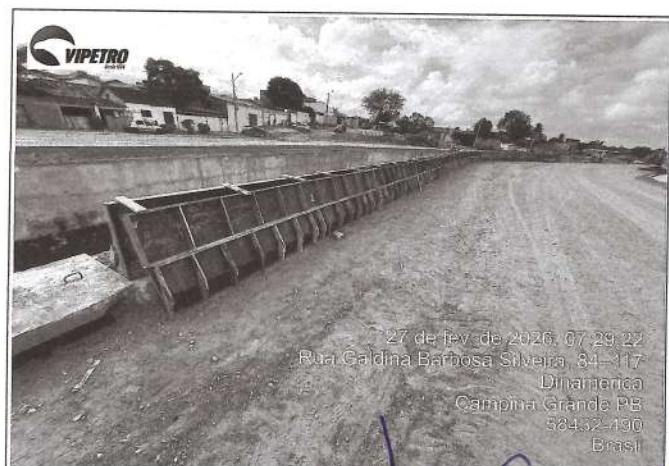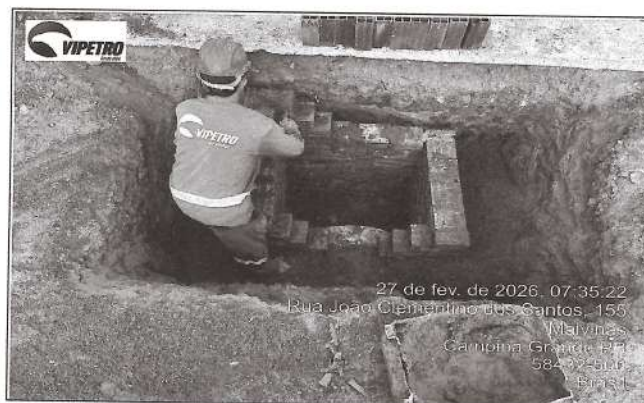

Julio C. do Amaral Neto
Julio C. do Amaral Neto
Engenheiro Civil
CREA: 11676162022 PB

Edenilson Pinto Bezerra
Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN



RELATÓRIO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA
OBRA: CANAL DE BODOCONGÓ

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	Nº 2.08.030/2024

RESUMOS DE DIAS			INÍCIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL	RDO Nº
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	28/02/2026	444
240	443	-203				

QUADRO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

Chuvvas/Horas	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30
Improdutivo																						
Impraticável																						

ATIVIDADES EXECUTADAS

ATIVIDADES PRINCIPAIS EM EXECUTADAS:

VIAS DO CANAL

CONSTRUÇÃO DE CAIXAS TIPO BOCA DE LOBO DAS DRENAGENS MARGINAIS DA VIA LADO ESQUERDO

CALÇADAS E CICLOVIAS

APLICAÇÃO DE MEIO FIO

BARREIRAS NEW JERSEY

CONTINUAÇÃO DE FORMA PARA CONCRETAGEM

CONTINUAMOS NO AGUARDANDO DE PROVIDÊNCIAS COM RELAÇÃO AS INTERFERÊNCIAS QUE ESTÃO IMPEDINDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS CALÇADAS, CONFORME CROCRI JÁ ENVIANDO NO DIA 28/04/2025.

COMENTÁRIOS CONTRATADA


FISCALIZAÇÃO

Data	Contratada	Data	Fiscalização
	Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5305 D RN		Julio C. do Amaral Neto Engenheiro Civil CREA: 11676162022 PB



Data	Vipetro Constr. e Mont. Industrial Ltda	Data	Fiscalização
	Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5305-D/RN		Julio C. do Amaral Neto Engenheiro Civil CREA: 11676162022-1

CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA				CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.				Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS			INÍCIO REAL - AC 1	TÉRMINO CONTRATUAL	DATA ATUAL
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE	12/12/2024	09/08/2025	28/02/2026
240	443	-203			444

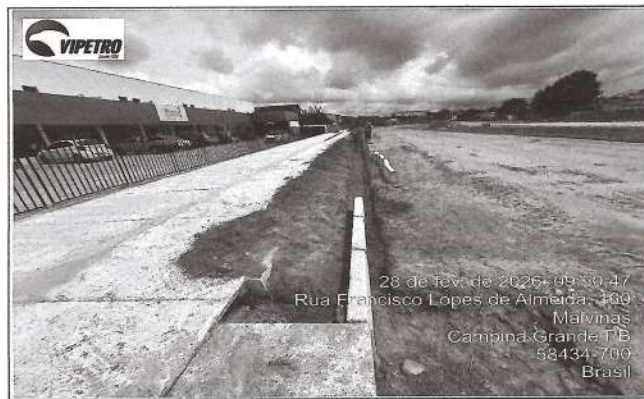

Vipetro Constr. e Mont. Industriais Ltda
Edenilson Pinto Bezerra
Gerente de Contrato
CREA 5305 D RN

Julio C. do Amaral Neto
Engenheiro Civil
CREA: 11676162022 PB
