


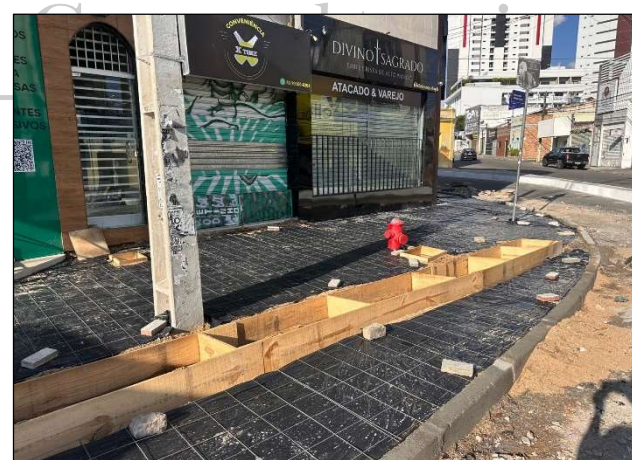
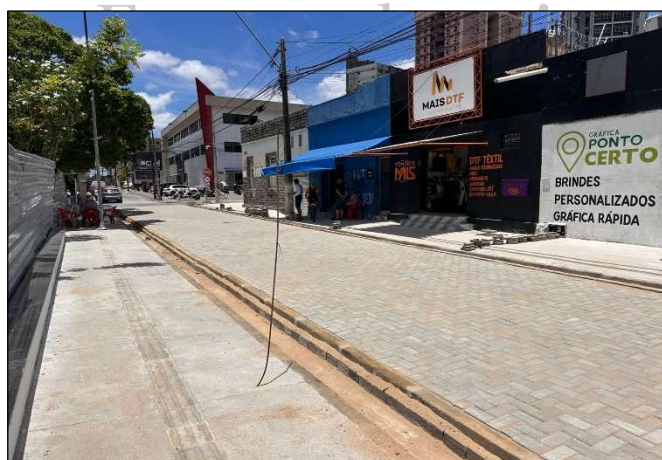
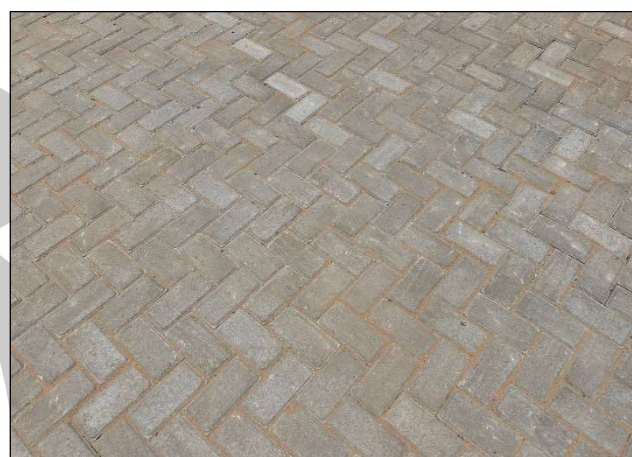
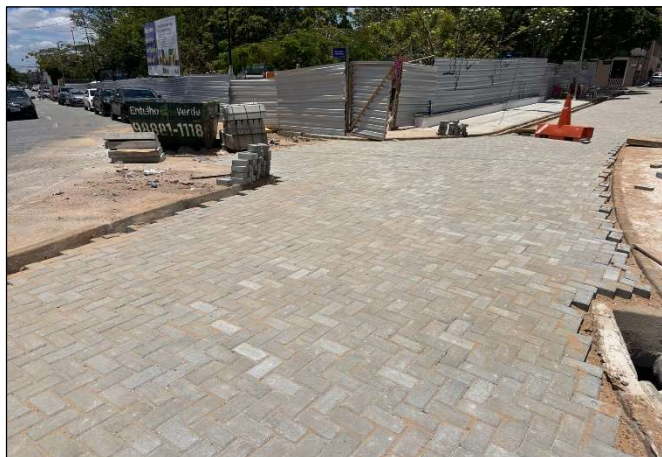



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Engenharia e Consultoria

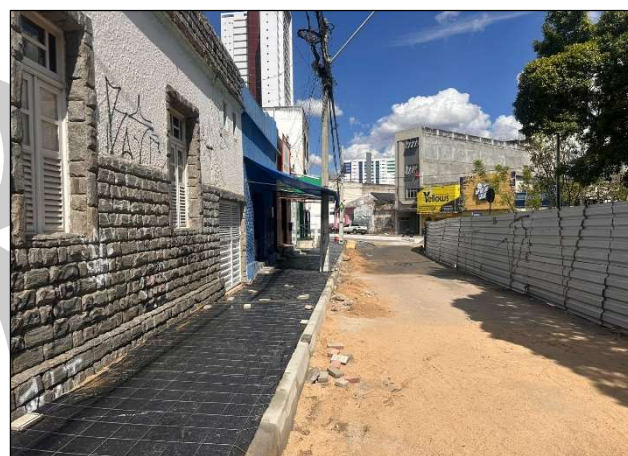

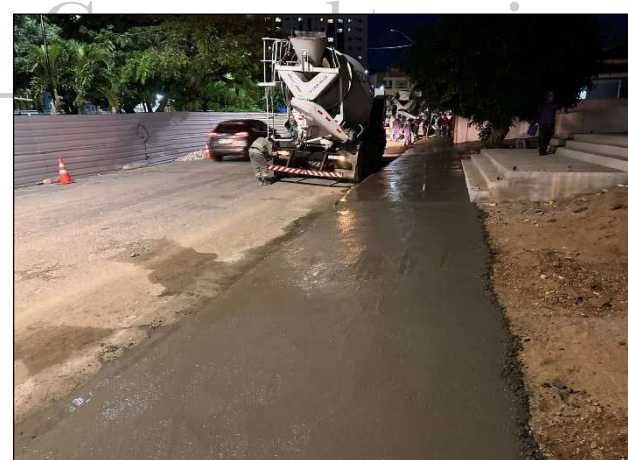

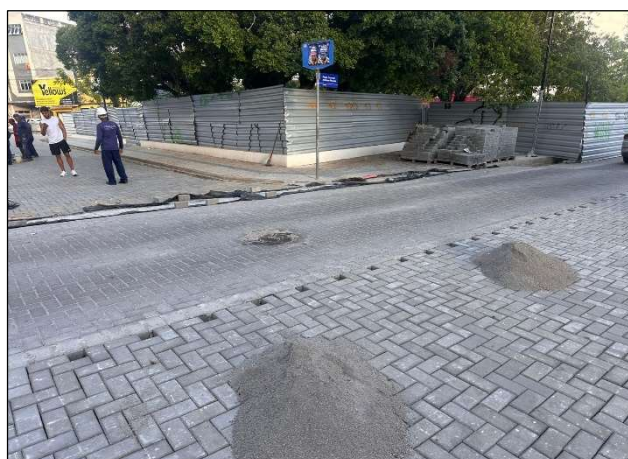

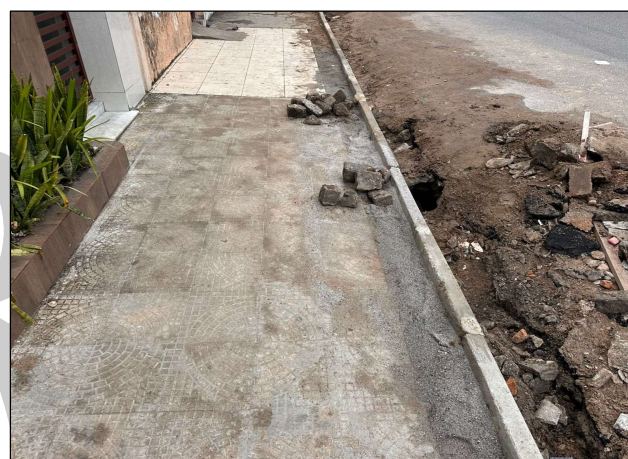



BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DAS VIAS E PASSEIOS NO ENTORNO DA PRAÇA CORONEL ANTÔNIO PESSOA, BEM COMO MELHORIAS NA ÁREA INTERNA DA PRAÇA, PRESERVANDO SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS, DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE – PB.

LOCALIDADE: PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA, 111 - CENTRO CAMPINA GRANDE - PB, 58400-263	Fonte de Recursos	Contrato:	Concorrência Eletrônica	Valor Contratado	BDI: 22,00	Nº do Boletim	Período de execução	Valor do BM	Valor Acumulado	Percentual Total Executado
	MDR - 1081110-73/2021	2.08.001/2025	9.08.17/2024	R\$ 778.679,49		03	19/12/2025 a 11/05/2026	R\$ 333.063,90	R\$ 719.338,89	92,38%

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL CAMPINA GRANDE - PB

ART de Execução: PB20250727074

ART de Fiscalização: PB20250769528

CONTRATADA: R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 30.836.850/0001-95

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PLANILHA CONTRATADA			EVOLUÇÃO FÍSICA			EVOLUÇÃO FINANCEIRA			PERCENTUAL EXECUTADO
				PREÇO UNIT. SEM/BDI	PREÇO UNIT. C/BDI	VALOR TOTAL (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLU. O PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLU. O PERÍODO	
1	ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA					R\$ 52.382,64				R\$ 14.720,59	R\$ 20.915,10	R\$ 46.969,76	89,67%
1.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	mês	3,00	R\$ 771,00	888,81	R\$ 2.666,43	1,49	1,20	2,69	R\$ 1.022,13	R\$ 1.066,57	R\$ 2.390,90	89,67%
1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO,	mês	3,00	R\$ 670,06	772,45	R\$ 2.317,35	1,49	1,20	2,69	R\$ 888,31	R\$ 926,94	R\$ 2.077,88	89,67%
1.3	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	240,00	R\$ 100,32	R\$ 122,39	R\$ 29.373,60	119,51	95,69	215,20	R\$ 5.900,47	R\$ 11.711,50	R\$ 26.338,33	89,67%
1.4	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	3,00	R\$ 4.924,94	R\$ 6.008,42	R\$ 18.025,26	1,49	1,20	2,69	R\$ 6.909,68	R\$ 7.210,10	R\$ 16.162,65	89,67%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 56.742,51				R\$ 56.742,51	R\$ -	R\$ 56.742,51	100,00%
2.1	FECHAMENTO DE OBRA					R\$ 52.544,71				R\$ 52.544,71	R\$ -	R\$ 52.544,71	100,00%
2.1.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	487,74	R\$ 78,78	R\$ 96,11	R\$ 46.876,69	487,74	-	487,74	R\$ 46.876,69	R\$ -	R\$ 46.876,69	100,00%
2.1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	18,00	R\$ 258,11	R\$ 314,89	R\$ 5.668,02	18,00	-	18,00	R\$ 5.668,02	R\$ -	R\$ 5.668,02	100,00%
2.2	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS					R\$ 2.119,35				R\$ 2.119,35	R\$ -	R\$ 2.119,35	100,00%
2.2.1	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM - REV 03_10/2022	und	1,00	R\$ 443,26	R\$ 540,77	R\$ 540,77	1,00	-	1,00	R\$ 540,77	R\$ -	R\$ 540,77	100,00%
2.2.2	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFÁSICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR	und	1,00	R\$ 1.293,92	R\$ 1.578,58	R\$ 1.578,58	1,00	-	1,00	R\$ 1.578,58	R\$ -	R\$ 1.578,58	100,00%
2.3	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS					R\$ 2.078,45				R\$ 2.078,45	R\$ -	R\$ 2.078,45	100,00%
2.3.1	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	703,00	R\$ 1,18	R\$ 1,43	R\$ 1.005,29	703,00	-	703,00	R\$ 1.005,29	R\$ -	R\$ 1.005,29	100,00%
2.3.2	LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA	m²	1.850,29	R\$ 0,48	R\$ 0,58	R\$ 1.073,16	1.850,29	-	1.850,29	R\$ 1.073,16	R\$ -	R\$ 1.073,16	100,00%
3	DEMOLIÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHO					R\$ 85.539,26				R\$ 43.247,07	R\$ 42.292,19	R\$ 85.539,26	100,00%
3.1	DEMOLIÇÃO PARA EXECUTAR CALÇADAS					R\$ 30.926,33				R\$ -	R\$ 30.926,33	R\$ 30.926,33	100,00%
3.1.1	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	283,87	R\$ 12,91	R\$ 15,75	R\$ 4.470,95		283,87	283,87	R\$ -	R\$ 4.470,95	R\$ 4.470,95	100,00%
3.1.2	RETIRADA PISO PEDRAS IRREGULARES SEM REAPROVEITAMENTO	m²	425,85	R\$ 3,94	R\$ 4,80	R\$ 2.044,08		425,85	425,85	R\$ -	R\$ 2.044,08	R\$ 2.044,08	100,00%
3.1.3	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	m²	425,85	R\$ 20,76	R\$ 25,32	R\$ 10.782,52		425,85	425,85	R\$ -	R\$ 10.782,52	R\$ 10.782,52	100,00%
3.1.4	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	m²	283,87	R\$ 11,14	R\$ 13,59	R\$ 3.857,79		283,87	283,87	R\$ -	R\$ 3.857,79	R\$ 3.857,79	100,00%
3.1.5	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	482,28	R\$ 16,61	R\$ 20,26	R\$ 9.770,99		482,28	482,28	R\$ -	R\$ 9.770,99	R\$ 9.770,99	100,00%
3.2	DEMOLIÇÃO PARA EXECUTAR PAVIMENTO ELEVADO					R\$ 14.242,78				R\$ 2.876,92	R\$ 11.365,86	R\$ 14.242,78	100,00%
3.2.1	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	703,00	R\$ 16,61	R\$ 20,26	R\$ 14.242,78	142,00	561,00	703,00	R\$ 2.876,92	R\$ 11.365,86	R\$ 14.242,78	100,00%
3.3	DEMOLIÇÃO DE PISO DA PRAÇA E MEIO FIO					R\$ 28.337,87				R\$ 28.337,87	R\$ -	R\$ 28.337,87	100,00%
3.3.1	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1.280,79	R\$ 12,91	R\$ 15,75	R\$ 20.172,44	1.280,79	-	1.280,79	R\$ 20.172,44	R\$ -	R\$ 20.172,44	100,00%
3.3.2	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	m	797,76	R\$ 7,93	R\$ 9,67	R\$ 7.714,33	797,76	-	797,76	R\$ 7.714,33	R\$ -	R\$ 7.714,33	100,00%
3.3.3	REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO SIMPLES (6,00 A 10,00 M) SEM REAPROVEITAMENTO	un	13,00	R\$ 28,45	R\$ 34,70	R\$ 451,10	13,00	-	13,00	R\$ 451,10	R\$ -	R\$ 451,10	100,00%
3.4	CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO					R\$ 12.032,28				R\$ 12.032,28	R\$ -	R\$ 12.032,28	100,00%
3.4.1	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	373,21	R\$ 7,00	R\$ 8,54	R\$ 3.187,21	373,21	-	373,21	R\$ 3.187,21	R\$ -	R\$ 3.187,21	100,00%
3.4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³xkm	3732,10	R\$ 1,95	R\$ 2,37	R\$ 8.845,07	3.732,10	-	3.732,10	R\$ 8.845,07	R\$ -	R\$ 8.845,07	100,00%
4	CONSTRUÇÃO					R\$ 500.928,38				R\$ 210.476,20	R\$ 269.856,60	R\$ 480.332,80	95,89%
4.1	PISO DAS CALÇADAS					R\$ 184.144,62				R\$ -	R\$ 184.144,62	R\$ 184.144,62	100,00%
4.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	m³	37,74	R\$ 548,48	R\$ 669,15	R\$ 25.253,72		37,74	37,74	R\$ -	R\$ 25.253,72	R\$ 25.253,72	100,00%
4.1.2	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	1.790,32	R\$ 2,41	R\$ 2,94	R\$ 5.263,54		1.790,32	1.790,32	R\$ -	R\$ 5.263,54	R\$ 5.263,54	100,00%
4.1.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	1.790,32	R\$ 70,34	R\$ 85,81	R\$ 153.627,36		1.790,32	1.790,32	R\$ -	R\$ 153.627,36	R\$ 153.627,36	100,00%
4.2	PISO DA PRAÇA					R\$ 148.323,18				R\$ 148.323,18	R\$ -	R\$ 148.323,18	100,00%
4.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	m³	38,42	R\$ 548,48	R\$ 669,15	R\$ 25.708,74	38,42	-	38,42	R\$ 25.708,74	R\$ -	R\$ 25.708,74	100,00%
4.2.2	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	1.280,79	R\$ 2,41	R\$ 2,94	R\$ 3.765,52	1.280,79	-	1.280,79	R\$ 3.765,52	R\$ -	R\$ 3.765,52	100,00%
4.2.3	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	m³	51,23	R\$ 342,61	R\$ 417,98	R\$ 21.413,12	51,23	-	51,23	R\$ 21.413,12	R\$ -	R\$ 21.413,12	100,00%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DAS VIAS E PASSEIOS NO ENTORNO DA PRAÇA CORONEL ANTÔNIO PESSOA, BEM COMO MELHORIAS NA ÁREA INTERNA DA PRAÇA, PRESERVANDO SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS, DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE – PB.

LOCALIDADE: PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA, 111 - CENTRO CAMPINA GRANDE - PB, 58400-263		Fonte de Recursos	Contrato:	Concorrência Eletrônica	Valor Contratado	BDI: 22,00	Nº do Boletim	Período de execução	Valor do BM	Valor Acumulado	Percentual Total Executado		
		MDR - 1081110-73/2021	2.08.001/2025	9.08.17/2024	R\$ 778.679,49		03	19/12/2025 a 11/05/2026	R\$ 333.063,90	R\$ 719.338,89	92,38%		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL CAMPINA GRANDE - PB													
CONTRATADA: R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 30.836.850/0001-95													
ART de Execução: PB20250727074						ART de Fiscalização: PB20250769528							
4.2.4	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, ACAMABENTO LAVADO TIPO FULGET, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS E APLICAÇÃO DO PISO.	m²	450,00	R\$ 70,06	R\$ 85,47	R\$ 38.461,50	450,00	-	450,00	R\$ 38.461,50	R\$ -	R\$ 38.461,50	100,00%
4.2.5	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, ACAMABENTO LAVADO TIPO FULGET, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS E APLICAÇÃO DO PISO.	m²	690,00	R\$ 70,06	R\$ 85,47	R\$ 58.974,30	690,00	-	690,00	R\$ 58.974,30	R\$ -	R\$ 58.974,30	100,00%
4.3	PAVIMENTO ELEVADO					R\$ 66.355,06				R\$ -	R\$ 49.880,32	R\$ 49.880,32	75,17%
4.3.1	COLCHÃO DE AREIA	m²	71,25	R\$ 121,34	R\$ 148,03	R\$ 10.547,13	67,50	67,50	R\$ -	R\$ 9.992,03	R\$ 9.992,03	R\$ 9.992,03	94,74%
4.3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	m	130,07	R\$ 32,32	R\$ 39,43	R\$ 5.128,66	130,07	130,07	R\$ -	R\$ 5.128,66	R\$ 5.128,66	R\$ 5.128,66	100,00%
4.3.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.	m²	703,00	R\$ 59,09	R\$ 72,09	R\$ 50.679,27	482,17	482,17	R\$ -	R\$ 34.759,64	R\$ 34.759,64	R\$ 34.759,64	68,59%
4.4	MEIO FIO E CALHAS					R\$ 47.384,65				R\$ 11.552,99	R\$ 35.831,66	R\$ 47.384,65	100,00%
4.4.1	CAIHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE CONCRETO PRÉ MOLDADA.	m	92,94	R\$ 101,25	R\$ 123,53	R\$ 11.480,88	92,94	92,94	R\$ -	R\$ 11.480,88	R\$ 11.480,88	R\$ 11.480,88	100,00%
4.4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO	m	910,57	R\$ 32,32	R\$ 39,43	R\$ 35.903,77	293,00	617,57	910,57	R\$ 11.552,99	R\$ 24.350,79	R\$ 35.903,77	100,00%
4.5	CANTEIROS					R\$ 31.874,26				R\$ 31.874,26	R\$ -	R\$ 31.874,26	100,00%
4.5.1	RESTAURO - EMBOÇO ESPECIAL DE PAREDE, SPESSURA 3CM, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,24:0,74 (CAL, ARENOSO E AREIA MÉDIA)	m²	46,19	R\$ 36,77	R\$ 44,86	R\$ 2.072,08	46,19	-	46,19	R\$ 2.072,08	R\$ -	R\$ 2.072,08	100,00%
4.5.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	m²	184,77	R\$ 3,10	R\$ 3,78	R\$ 698,43	184,77	-	184,77	R\$ 698,43	R\$ -	R\$ 698,43	100,00%
4.5.3	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01	m²	184,77	R\$ 16,17	R\$ 19,72	R\$ 3.643,66	184,77	-	184,77	R\$ 3.643,66	R\$ -	R\$ 3.643,66	100,00%
4.5.4	APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA RISCADA EM CORES DIVERSAS	m²	184,77	R\$ 40,70	R\$ 49,65	R\$ 9.173,83	184,77	-	184,77	R\$ 9.173,83	R\$ -	R\$ 9.173,83	100,00%
4.5.5	GRANITO VERDE UBATUBA EM PISO	m²	60,51	R\$ 220,62	R\$ 269,15	R\$ 16.286,26	60,51	-	60,51	R\$ 16.286,26	R\$ -	R\$ 16.286,26	100,00%
4.6	ÁREAS PERMEÁVEL					R\$ 6.587,58				R\$ 2.466,73	R\$ -	R\$ 2.466,73	37,45%
4.6.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF. 05/2022	m²	137,91	R\$ 16,98	R\$ 20,71	R\$ 2.856,11	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.6.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF. 01/2024	m	56,66	R\$ 31,09	R\$ 37,92	R\$ 2.148,54	56,66	-	56,66	R\$ 2.148,54	R\$ -	R\$ 2.148,54	100,00%
4.6.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF. 01/2024	m	7,88	R\$ 33,10	R\$ 40,38	R\$ 318,19	7,88	-	7,88	R\$ 318,19	R\$ -	R\$ 318,19	100,00%
4.6.4	ÁRVORE PORTE PEQUENO (MULUNGÚ) - PLANTADA	und	8,00	R\$ 35,05	R\$ 42,76	R\$ 342,08	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.6.5	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF. 05/2018	und	2,00	R\$ 103,76	R\$ 126,58	R\$ 253,16	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.6.6	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF. 05/2018	und	10,00	R\$ 54,88	R\$ 66,95	R\$ 669,50	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.7	ACESSIBILIDADE					R\$ 16.259,03				R\$ 16.259,03	R\$ -	R\$ 16.259,03	100,00%
4.7.1	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	107,69	R\$ 123,76	R\$ 150,98	R\$ 16.259,03	107,69	-	107,69	R\$ 16.259,03	R\$ -	R\$ 16.259,03	100,00%
5	SERVIÇOS DIVERSOS					R\$ 83.086,70				R\$ 49.791,23	R\$ -	R\$ 49.791,23	59,93%
5.1	EQUIPAMENTOS					R\$ 24.680,60				R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.1.1	FRADE ESFERA EM CONCRETO, 30CM DE DIÂMETRO, COM FCK=25 MPA, PARA PROTEÇÃO DE CALÇADAS, INCLUSIVE FURAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	und	84,00	R\$ 162,45	R\$ 198,18	R\$ 16.647,12	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.1.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	m²	19,20	R\$ 11,50	R\$ 14,03	R\$ 269,37	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.1.3	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF. 11/2021	und	3,00	R\$ 1.082,74	R\$ 1.320,94	R\$ 3.962,82	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.1.4	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 M	und	1,00	R\$ 1.620,34	R\$ 1.976,81	R\$ 1.976,81	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.1.5	TUBO AÇO GALVANIZADO D=3" P/BICICLETÁRIO, DIMENSÃO: H=75CM, L=75CM, FIXADO EMBASE DE CONCRETO, PINTADO C/ESMALTE SINTETICO, EXCETO BASE DE CONCRETO E PINTURA DE ACABAMENTO	und	6,00	R\$ 249,25	R\$ 304,08	R\$ 1.824,48	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.2	ILUMINAÇÃO					R\$ 49.791,23				R\$ 49.791,23	R\$ -	R\$ 49.791,23	100,00%
5.2.1	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 11/2019	und	4,00	R\$ 2.363,90	R\$ 2.883,95	R\$ 11.535,80	4,00	-	4,00	R\$ 11.535,80	R\$ -	R\$ 11.535,80	100,00%
5.2.2	LUMINÁRIA EM LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED SMD AUTOVOLT 75 W, 5.000 K, IP-66,JRC 70, FP>0,95, 170LM/W, 12.750 LM E 54.000H, COM BASE PARA RELÉ 3 PINOS, MODELO GL421 G-LIGHT OU SIMILAR	und	8,00	R\$ 767,12	R\$ 935,88	R\$ 7.487,04	8,00	-	8,00	R\$ 7.487,04	R\$ -	R\$ 7.487,04	100,00%
5.2.3	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 11/2019	und	9,00	R\$ 2.035,11	R\$ 2.482,83	R\$ 22.345,47	9,00	-	9,00	R\$ 22.345,47	R\$ -	R\$ 22.345,47	100,00%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DAS VIAS E PASSEIOS NO ENTORNO DA PRAÇA CORONEL ANTÔNIO PESSOA, BEM COMO MELHORIAS NA ÁREA INTERNA DA PRAÇA, PRESERVANDO SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS, DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE – PB.

LOCALIDADE: PRAÇA CEL ANTÔNIO PESSOA, 111 - CENTRO CAMPINA GRANDE - PB, 58400-263			Fonte de Recursos	Contrato:	Concorrência Eletrônica	Valor Contratado	BDI: 22,00	Nº do Boletim	Período de execução	Valor do BM	Valor Acumulado	Percentual Total Executado	
			MDR - 1081110-73/2021	2.08.001/2025	9.08.17/2024	R\$ 778.679,49		03	19/12/2025 a 11/05/2026	R\$ 333.063,90	R\$ 719.338,89	92,38%	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL CAMPINA GRANDE - PB													
CONTRATADA: R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 30.836.850/0001-95													
ART de Execução: PB20250727074													
ART de Fiscalização: PB20250769528													
5.2.4	LUMINÁRIA EM LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED SMD AUTOVOLT 75 W, 5.000 K, IP-66/JRC 70, FP>0,95, 170LM/W,12.750 LM E 54.000H, COM BASE PARA RELÉ 3 PINOS, MODELO GL421 G-LIGHT OU SIMILAR	und	9,00	R\$ 767,12	R\$ 935,88	R\$ 8.422,92	9,00	-	9,00	R\$ 8.422,92	R\$ -	R\$ 8.422,92	100,00%
5.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA					R\$ 8.614,87				R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.3.1	LIMPEZA GERAL	m²	3729,38	R\$ 1,89	R\$ 2,31	R\$ 8.614,87		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
			TOTAL CONTRATADO			R\$ 778.679,49	EVOLUÇÃO FINANCEIRA DO BM 03			R\$ 386.274,99	R\$ 333.063,90	R\$ 719.338,89	92,38%
								BM 01	R\$ 159.966,55	CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS			
								BM 02	R\$ 226.308,44	DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS			
								BM 03	R\$ 333.063,90	TREZENTOS E TRINTA E TRES MIL SESSENTA E TRES REAIS E NOVENTA CENTAVOS			

RUAN ASLAN
NUNES PEDROSA
SIMES:08855267400

Assinado de forma digital por RUAN ASLAN NUNES PEDROSA
SIMES:08855267400
Dados: 2026.05.11 19:19:14 -03'00'

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DAS VIAS E PASSEIOS NO ENTORNO DA PRAÇA CORONEL ANTÔNIO PESSOA, BEM COMO MELHORIAS NA ÁREA INTERNA DA PRAÇA, PRESERVANDO SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS, DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE – PB.

LOCALIDADE: PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA, 111 - CENTRO CAMPINA GRANDE - PB, 58400-263	Fonte de Recursos	Contrato:	Concorrência Eletrônica	Valor Contratado	BDI: 22,00	Nº do Boletim	Período de execução	Valor do BM	Valor Acumulado	Percentual Total Executado
	MDR - 1081110-73/2021	2.08.001/2025	9.08.17/2024	R\$ 778.679,49		03	19/12/2025 a 11/05/2026	R\$ 333.063,90	R\$ 719.338,89	92,38%

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL CAMPINA GRANDE - PB

ART de Execução: PB20250727074

ART de Fiscalização: PB20250769528

CONTRATADA: R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 30.836.850/0001-95

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PLANILHA CONTRATADA			EVOLUÇÃO FÍSICA			EVOLUÇÃO FINANCEIRA			PERCENTUAL EXECUTADO
				PREÇO UNIT. SEM/BDI	PREÇO UNIT. C/BDI	VALOR TOTAL (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLU. O PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLU. O PERÍODO	
1	ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA					R\$ 52.382,64				R\$ 14.720,59	R\$ 20.915,10	R\$ 46.969,76	89,67%
1.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	mês	3,00	R\$ 771,00	888,81	R\$ 2.666,43	1,49	1,20	2,69	R\$ 1.022,13	R\$ 1.066,57	R\$ 2.390,90	89,67%
1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO,	mês	3,00	R\$ 670,06	772,45	R\$ 2.317,35	1,49	1,20	2,69	R\$ 888,31	R\$ 926,94	R\$ 2.077,88	89,67%
1.3	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	240,00	R\$ 100,32	R\$ 122,39	R\$ 29.373,60	119,51	95,69	215,20	R\$ 5.900,47	R\$ 11.711,50	R\$ 26.338,33	89,67%
1.4	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	3,00	R\$ 4.924,94	R\$ 6.008,42	R\$ 18.025,26	1,49	1,20	2,69	R\$ 6.909,68	R\$ 7.210,10	R\$ 16.162,65	89,67%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 56.742,51	-	-	-	R\$ 56.742,51	R\$ -	R\$ 56.742,51	100,00%
2.1	FECHAMENTO DE OBRA					R\$ 52.544,71				R\$ 52.544,71	R\$ -	R\$ 52.544,71	100,00%
2.1.1	TAPIUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	487,74	R\$ 78,78	R\$ 96,11	R\$ 46.876,69	487,74	-	487,74	R\$ 46.876,69	R\$ -	R\$ 46.876,69	100,00%
2.1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	18,00	R\$ 258,11	R\$ 314,89	R\$ 5.668,02	18,00	-	18,00	R\$ 5.668,02	R\$ -	R\$ 5.668,02	100,00%
2.2	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS					R\$ 2.119,35				R\$ 2.119,35	R\$ -	R\$ 2.119,35	100,00%
2.2.1	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM - REV 03_10/2022	und	1,00	R\$ 443,26	R\$ 540,77	R\$ 540,77	1,00	-	1,00	R\$ 540,77	R\$ -	R\$ 540,77	100,00%
2.2.2	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFÁSICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR	und	1,00	R\$ 1.293,92	R\$ 1.578,58	R\$ 1.578,58	1,00	-	1,00	R\$ 1.578,58	R\$ -	R\$ 1.578,58	100,00%
2.3	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS					R\$ 2.078,45				R\$ 2.078,45	R\$ -	R\$ 2.078,45	100,00%
2.3.1	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	703,00	R\$ 1,18	R\$ 1,43	R\$ 1.005,29	703,00	-	703,00	R\$ 1.005,29	R\$ -	R\$ 1.005,29	100,00%
2.3.2	LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA	m²	1.850,29	R\$ 0,48	R\$ 0,58	R\$ 1.073,16	1.850,29	-	1.850,29	R\$ 1.073,16	R\$ -	R\$ 1.073,16	100,00%
3	DEMOLIÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHO					R\$ 85.539,26				R\$ 43.247,07	R\$ 42.292,19	R\$ 85.539,26	100,00%
3.1	DEMOLIÇÃO PARA EXECUTAR CALÇADAS					R\$ 30.926,33				R\$ -	R\$ 30.926,33	R\$ 30.926,33	100,00%
3.1.1	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	283,87	R\$ 12,91	R\$ 15,75	R\$ 4.470,95		283,87	283,87	R\$ -	R\$ 4.470,95	R\$ 4.470,95	100,00%
3.1.2	RETIRADA PISO PEDRAS IRREGULARES SEM REAPROVEITAMENTO	m²	425,85	R\$ 3,94	R\$ 4,80	R\$ 2.044,08		425,85	425,85	R\$ -	R\$ 2.044,08	R\$ 2.044,08	100,00%
3.1.3	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	m²	425,85	R\$ 20,76	R\$ 25,32	R\$ 10.782,52		425,85	425,85	R\$ -	R\$ 10.782,52	R\$ 10.782,52	100,00%
3.1.4	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	m²	283,87	R\$ 11,14	R\$ 13,59	R\$ 3.857,79		283,87	283,87	R\$ -	R\$ 3.857,79	R\$ 3.857,79	100,00%
3.1.5	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	482,28	R\$ 16,61	R\$ 20,26	R\$ 9.770,99		482,28	482,28	R\$ -	R\$ 9.770,99	R\$ 9.770,99	100,00%
3.2	DEMOLIÇÃO PARA EXECUTAR PAVIMENTO ELEVADO					R\$ 14.242,78				R\$ 2.876,92	R\$ 11.365,86	R\$ 14.242,78	100,00%
3.2.1	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	703,00	R\$ 16,61	R\$ 20,26	R\$ 14.242,78	142,00	561,00	703,00	R\$ 2.876,92	R\$ 11.365,86	R\$ 14.242,78	100,00%
3.3	DEMOLIÇÃO DE PISO DA PRAÇA E MEIO FIO					R\$ 28.337,87				R\$ 28.337,87	R\$ -	R\$ 28.337,87	100,00%
3.3.1	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1.280,79	R\$ 12,91	R\$ 15,75	R\$ 20.172,44	1.280,79	-	1.280,79	R\$ 20.172,44	R\$ -	R\$ 20.172,44	100,00%
3.3.2	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	m	797,76	R\$ 7,93	R\$ 9,67	R\$ 7.714,33	797,76	-	797,76	R\$ 7.714,33	R\$ -	R\$ 7.714,33	100,00%
3.3.3	REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO SIMPLES (6,00 A 10,00 M) SEM REAPROVEITAMENTO	un	13,00	R\$ 28,45	R\$ 34,70	R\$ 451,10	13,00	-	13,00	R\$ 451,10	R\$ -	R\$ 451,10	100,00%
3.4	CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO					R\$ 12.032,28				R\$ 12.032,28	R\$ -	R\$ 12.032,28	100,00%
3.4.1	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	373,21	R\$ 7,00	R\$ 8,54	R\$ 3.187,21	373,21	-	373,21	R\$ 3.187,21	R\$ -	R\$ 3.187,21	100,00%
3.4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³xkm	3732,10	R\$ 1,95	R\$ 2,37	R\$ 8.845,07	3.732,10	-	3.732,10	R\$ 8.845,07	R\$ -	R\$ 8.845,07	100,00%
4	CONSTRUÇÃO					R\$ 500.928,38				R\$ 210.476,20	R\$ 269.856,60	R\$ 480.332,80	95,89%
4.1	PISO DAS CALÇADAS					R\$ 184.144,62				R\$ -	R\$ 184.144,62	R\$ 184.144,62	100,00%
4.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	m³	37,74	R\$ 548,48	R\$ 669,15	R\$ 25.253,72		37,74	37,74	R\$ -	R\$ 25.253,72	R\$ 25.253,72	100,00%
4.1.2	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	1.790,32	R\$ 2,41	R\$ 2,94	R\$ 5.263,54		1.790,32	1.790,32	R\$ -	R\$ 5.263,54	R\$ 5.263,54	100,00%
4.1.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	1.790,32	R\$ 70,34	R\$ 85,81	R\$ 153.627,36		1.790,32	1.790,32	R\$ -	R\$ 153.627,36	R\$ 153.627,36	100,00%
4.2	PISO DA PRAÇA					R\$ 148.323,18				R\$ 148.323,18	R\$ -	R\$ 148.323,18	100,00%
4.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	m³	38,42	R\$ 548,48	R\$ 669,15	R\$ 25.708,74	38,42	-	38,42	R\$ 25.708,74	R\$ -	R\$ 25.708,74	100,00%
4.2.2	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	1.280,79	R\$ 2,41	R\$ 2,94	R\$ 3.765,52	1.280,79	-	1.280,79	R\$ 3.765,52	R\$ -	R\$ 3.765,52	100,00%
4.2.3	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	m³	51,23	R\$ 342,61	R\$ 417,98	R\$ 21.413,12	51,23	-	51,23	R\$ 21.413,12	R\$ -	R\$ 21.413,12	100,00%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DAS VIAS E PASSEIOS NO ENTORNO DA PRAÇA CORONEL ANTÔNIO PESSOA, BEM COMO MELHORIAS NA ÁREA INTERNA DA PRAÇA, PRESERVANDO SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS, DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE – PB.

LOCALIDADE: PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA, 111 - CENTRO CAMPINA GRANDE - PB, 58400-263		Fonte de Recursos	Contrato:	Concorrência Eletrônica	Valor Contratado	BDI: 22,00	Nº do Boletim	Período de execução	Valor do BM	Valor Acumulado	Percentual Total Executado		
		MDR - 1081110-73/2021	2.08.001/2025	9.08.17/2024	R\$ 778.679,49		03	19/12/2025 a 11/05/2026	R\$ 333.063,90	R\$ 719.338,89	92,38%		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL CAMPINA GRANDE - PB													
CONTRATADA: R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 30.836.850/0001-95													
ART de Execução: PB20250727074						ART de Fiscalização: PB20250769528							
4.2.4	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, ACAMABENTO LAVADO TIPO FULGET, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS E APLICAÇÃO DO PISO.	m²	450,00	R\$ 70,06	R\$ 85,47	R\$ 38.461,50	450,00	-	450,00	R\$ 38.461,50	R\$ -	R\$ 38.461,50	100,00%
4.2.5	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, ACAMABENTO LAVADO TIPO FULGET, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS E APLICAÇÃO DO PISO	m²	690,00	R\$ 70,06	R\$ 85,47	R\$ 58.974,30	690,00	-	690,00	R\$ 58.974,30	R\$ -	R\$ 58.974,30	100,00%
4.3 PAVIMENTO ELEVADO						R\$ 66.355,06				R\$ -	R\$ 49.880,32	R\$ 49.880,32	75,17%
4.3.1	COLCHÃO DE AREIA	m³	71,25	R\$ 121,34	R\$ 148,03	R\$ 10.547,13	67,50	67,50	R\$ -	R\$ 9.992,03	R\$ 9.992,03	R\$ 9.992,03	94,74%
4.3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	m	130,07	R\$ 32,32	R\$ 39,43	R\$ 5.128,66	130,07	130,07	R\$ -	R\$ 5.128,66	R\$ 5.128,66	R\$ 5.128,66	100,00%
4.3.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.	m²	703,00	R\$ 59,09	R\$ 72,09	R\$ 50.679,27	482,17	482,17	R\$ -	R\$ 34.759,64	R\$ 34.759,64	R\$ 34.759,64	68,59%
4.4 MEIO FIO E CALHAS						R\$ 47.384,65				R\$ 11.552,99	R\$ 35.831,66	R\$ 47.384,65	100,00%
4.4.1	CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE CONCRETO PRÉ MOLDADA.	m	92,94	R\$ 101,25	R\$ 123,53	R\$ 11.480,88	92,94	92,94	R\$ -	R\$ 11.480,88	R\$ 11.480,88	R\$ 11.480,88	100,00%
4.4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO	m	910,57	R\$ 32,32	R\$ 39,43	R\$ 35.903,77	293,00	617,57	R\$ 910,57	R\$ 11.552,99	R\$ 24.350,79	R\$ 35.903,77	100,00%
4.5 CANTEIROS						R\$ 31.874,26				R\$ 31.874,26	R\$ -	R\$ 31.874,26	100,00%
4.5.1	RESTAURO - EMBOÇO ESPECIAL DE PAREDE, SPRESSURA 3CM, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,24:0,74 (CAL, ARENOSO E AREIA MÉDIA)	m²	46,19	R\$ 36,77	R\$ 44,86	R\$ 2.072,08	46,19	-	46,19	R\$ 2.072,08	R\$ -	R\$ 2.072,08	100,00%
4.5.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	m²	184,77	R\$ 3,10	R\$ 3,78	R\$ 698,43	184,77	-	184,77	R\$ 698,43	R\$ -	R\$ 698,43	100,00%
4.5.3	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01	m²	184,77	R\$ 16,17	R\$ 19,72	R\$ 3.643,66	184,77	-	184,77	R\$ 3.643,66	R\$ -	R\$ 3.643,66	100,00%
4.5.4	APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA RISCADA EM CORES DIVERSAS	m²	184,77	R\$ 40,70	R\$ 49,65	R\$ 9.173,83	184,77	-	184,77	R\$ 9.173,83	R\$ -	R\$ 9.173,83	100,00%
4.5.5	GRANITO VERDE UBATUBA EM PISO	m²	60,51	R\$ 220,62	R\$ 269,15	R\$ 16.286,26	60,51	-	60,51	R\$ 16.286,26	R\$ -	R\$ 16.286,26	100,00%
4.6 ÁREAS PERMEÁVEL						R\$ 6.587,58				R\$ 2.466,73	R\$ -	R\$ 2.466,73	37,45%
4.6.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF. 05/2022	m²	137,91	R\$ 16,98	R\$ 20,71	R\$ 2.856,11	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.6.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF. 01/2024	m	56,66	R\$ 31,09	R\$ 37,92	R\$ 2.148,54	56,66	-	56,66	R\$ 2.148,54	R\$ -	R\$ 2.148,54	100,00%
4.6.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF. 01/2024	m	7,88	R\$ 33,10	R\$ 40,38	R\$ 318,19	7,88	-	7,88	R\$ 318,19	R\$ -	R\$ 318,19	100,00%
4.6.4	ÁRVORE PORTE PEQUENO (MULUNGÚ) - PLANTADA	und	8,00	R\$ 35,05	R\$ 42,76	R\$ 342,08	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.6.5	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF. 05/2018	und	2,00	R\$ 103,76	R\$ 126,58	R\$ 253,16	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.6.6	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF. 05/2018	und	10,00	R\$ 54,88	R\$ 66,95	R\$ 669,50	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.7 ACESSIBILIDADE						R\$ 16.259,03				R\$ 16.259,03	R\$ -	R\$ 16.259,03	100,00%
4.7.1	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	107,69	R\$ 123,76	R\$ 150,98	R\$ 16.259,03	107,69	-	107,69	R\$ 16.259,03	R\$ -	R\$ 16.259,03	100,00%
5 SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 83.086,70				R\$ 49.791,23	R\$ -	R\$ 49.791,23	59,93%
5.1 EQUIPAMENTOS						R\$ 24.680,60				R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.1.1	FRADE ESFERA EM CONCRETO, 30CM DE DIÂMETRO, COM FCK=25 MPA, PARA PROTEÇÃO DE CALÇADAS, INCLUSIVE FURAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	und	84,00	R\$ 162,45	R\$ 198,18	R\$ 16.647,12	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.1.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	m²	19,20	R\$ 11,50	R\$ 14,03	R\$ 269,37	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.1.3	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF. 11/2021	und	3,00	R\$ 1.082,74	R\$ 1.320,94	R\$ 3.962,82	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.1.4	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 M	und	1,00	R\$ 1.620,34	R\$ 1.976,81	R\$ 1.976,81	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.1.5	TUBO AÇO GALVANIZADO D=3" P/BICICLETÁRIO, DIMENSÃO: H=75CM, L=75CM, FIXADO EMBASE DE CONCRETO, PINTADO C/ESMALTE SINTETICO, EXCETO BASE DE CONCRETO E PINTURA DE ACABAMENTO	und	6,00	R\$ 249,25	R\$ 304,08	R\$ 1.824,48	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.2 ILUMINAÇÃO						R\$ 49.791,23				R\$ 49.791,23	R\$ -	R\$ 49.791,23	100,00%
5.2.1	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 11/2019	und	4,00	R\$ 2.363,90	R\$ 2.883,95	R\$ 11.535,80	4,00	-	4,00	R\$ 11.535,80	R\$ -	R\$ 11.535,80	100,00%
5.2.2	LUMINÁRIA EM LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED SMD AUTOVOLT 75 W, 5.000 K, IP-66,JRC 70, FP>0,95, 170LM/W,12,750 LM E 54.000H, COM BASE PARA RELÉ 3 PINOS, MODELO GL421 G-LIGHT OU SIMILAR	und	8,00	R\$ 767,12	R\$ 935,88	R\$ 7.487,04	8,00	-	8,00	R\$ 7.487,04	R\$ -	R\$ 7.487,04	100,00%
5.2.3	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 11/2019	und	9,00	R\$ 2.035,11	R\$ 2.482,83	R\$ 22.345,47	9,00	-	9,00	R\$ 22.345,47	R\$ -	R\$ 22.345,47	100,00%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DAS VIAS E PASSEIOS NO ENTORNO DA PRAÇA CORONEL ANTÔNIO PESSOA, BEM COMO MELHORIAS NA ÁREA INTERNA DA PRAÇA, PRESERVANDO SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS, DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE – PB.

LOCALIDADE: PRAÇA CEL ANTÔNIO PESSOA, 111 - CENTRO CAMPINA GRANDE - PB, 58400-263			Fonte de Recursos	Contrato:	Concorrência Eletrônica	Valor Contratado	BDI: 22,00	Nº do Boletim	Período de execução	Valor do BM	Valor Acumulado	Percentual Total Executado	
			MDR - 1081110-73/2021	2.08.001/2025	9.08.17/2024	R\$ 778.679,49		03	19/12/2025 a 11/05/2026	R\$ 333.063,90	R\$ 719.338,89	92,38%	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL CAMPINA GRANDE - PB													
CONTRATADA: R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 30.836.850/0001-95													
ART de Execução: PB20250727074							ART de Fiscalização: PB20250769528						
5.2.4	LUMINÁRIA EM LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED SMD AUTOVOLT 75 W, 5.000 K, IP-66/JRC 70, FP>0,95, 170LM/W,12.750 LM E 54.000H, COM BASE PARA RELÉ 3 PINOS, MODELO GL421 G-LIGHT OU SIMILAR	und	9,00	R\$ 767,12	R\$ 935,88	R\$ 8.422,92	9,00	-	9,00	R\$ 8.422,92	R\$ -	R\$ 8.422,92	100,00%
5.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA					R\$ 8.614,87				R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.3.1	LIMPEZA GERAL	m²	3729,38	R\$ 1,89	R\$ 2,31	R\$ 8.614,87		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
			TOTAL CONTRATADO			R\$ 778.679,49	EVOLUÇÃO FINANCEIRA DO BM 03			R\$ 386.274,99	R\$ 333.063,90	R\$ 719.338,89	92,38%
							BM 01	R\$ 159.966,55	CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS				
							BM 02	R\$ 226.308,44	DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS				
							BM 03	R\$ 333.063,90	TREZENTOS E TRINTA E TRES MIL SESSENTA E TRES REAIS E NOVENTA CENTAVOS				

RUAN ASLAN
NUNES PEDROSA
SIMES:08855267400

Assinado de forma digital por RUAN ASLAN NUNES PEDROSA
SIMES:08855267400
Dados: 2026.05.11 19:19:14 -03'00'

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DAS VIAS E PASSEIOS NO ENTORNO DA PRAÇA CORONEL ANTÔNIO PESSOA, BEM COMO MELHORIAS NA ÁREA INTERNA DA PRAÇA, PRESERVANDO SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS, DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE – PB.

LOCALIDADE: PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA, 111 - CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB, 58400-263

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 19/12/2025 a 11/05/2026

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL CAMPINA GRANDE - PB

CONTRATADA: R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 30.836.850/0001-95

CONTRATO : 2.08.001/2025

Concorrência Eletrônica : 9.08.17/2024

MDR - 1081110-73/2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO 3ª MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	Unid	Quant	Memória de Cálculo
1	ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA			
1.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	mês	1,20	Proporcional a Medição
1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	mês	1,20	Proporcional a Medição
1.3	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	95,69	Proporcional a Medição
1.4	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	1,49	Proporcional a Medição
2	SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.1	FECHAMENTO DE OBRA			
2.2	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS			
2.3	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS			
3	DEMOLIÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHO			
3.1	DEMOLIÇÃO PARA EXECUTAR CALÇADAS			
3.1.1	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	283,87	101,38 m x 2,80 m (Áreas de Piso Intertravado Retirados) = 283,87 m²
3.1.2	RETIRADA PISO PEDRAS IRREGULARES SEM REAPROVEITAMENTO	m²	425,85	141,95 x 3,00 m (Áreas de Piso Pedra Retirados) = 425,85 m²
3.1.3	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	m²	425,85	141,95 x 3,00 m (Áreas de Piso Pedra Retirados) = 425,85 m²
3.1.4	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	m²	283,87	113,54 x 2,50 m (Áreas de Piso Cerâmica Retirados) = 283,87 m²
3.1.5	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	482,28	78,53 x 6,14 m (Áreas de Piso Asfáltico Parcialmente Retirados) = 482,28 m²
3.2	DEMOLIÇÃO PARA EXECUTAR PAVIMENTO ELEVADO			
3.2.1	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	561,00	Demolição do Pavimento = 175,00 x 3,20 m = 561,00 m²
3.3	DEMOLIÇÃO DE PISO DA PRAÇA E MEIO FIO			
3.4	CARGA E TRANSPORTE DE ENUTILO			
4	CONSTRUÇÃO			
4.1	PISO DAS CALÇADAS			
4.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	m³	37,74	Área da Calçada x Espessura do Concreto = (1790,32 m² x 0,02 m) = 37,74 m³
4.1.2	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	1790,32	Área de Calçada = 1790,32 m²
4.1.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	1790,32	Área de Calçada = 1790,32 m²
4.2	PISO DA PRAÇA			
4.3	PAVIMENTO ELEVADO			
4.3.1	COLCHÃO DE AREIA	m³	71,25	337,50 x 0,20 m = 67,50 m³
4.3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	m	130,07	Ruas Entorno da Praça Elevadas: 65,03 m x 2,00 lados = 130,07 m
4.3.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.	m²	703,00	78,53 x 6,14 m = 482,17 m²
4.4	MEIO FIO E CALHAS			
4.4.1	CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE CONCRETO PRÉ MOLDADA.	m	92,94	Calhas do Pavimento Elevado: 92,94 m
4.4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO	m	617,57	Soma das Quantidades Executadas: Ruas ao Entorno da Praça = 617,57 m
4.5	CANTEIROS			
4.6	ÁREAS PERMEÁVEL			
4.7	ACESSIBILIDADE			
5	SERVIÇOS DIVERSOS			
5.1	EQUIPAMENTOS			
5.2	ILUMINAÇÃO			
5.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA			

RUAN ASLAN NUNES PEDROSA
SIMES:08855267
400

Assinado de forma digital por RUAN ASLAN NUNES PEDROSA
SIMES:08855267400
Dados: 2026.05.11 19:19:28 -03'00'

Ofício nº: 100/2025

Campina Grande-PB, 11 de maio de 2026

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: Solicitação de autorização de desbloqueio de recursos - Medição nº 3
REF: Contrato de Repasse - Operação nº: 1081110-73/2021 - SICONV nº: 923514

Programa: DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO
Objeto: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA

Proponente /
Tomador: MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 3ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	R\$ 728.679,49	R\$ 311.677,45	R\$ 673.149,23
Contrapartida Financeira:	R\$ 50.000,00	R\$ 21.386,45	R\$ 46.189,66
Outros:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento:	R\$ 778.679,49	R\$ 333.063,90	R\$ 719.338,89
Execução Física:	-	42,77%	92,38%

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.

3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada no SICONV.

4. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

JOAB KLEBER LUCENA MACHADO
MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Programa: DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO
Objeto: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA

1. Informamos abaixo a relação de fornecedores para a Solicitação de Recursos referenciada:





Atenciosamente,



2







RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Engenharia e Consultoria

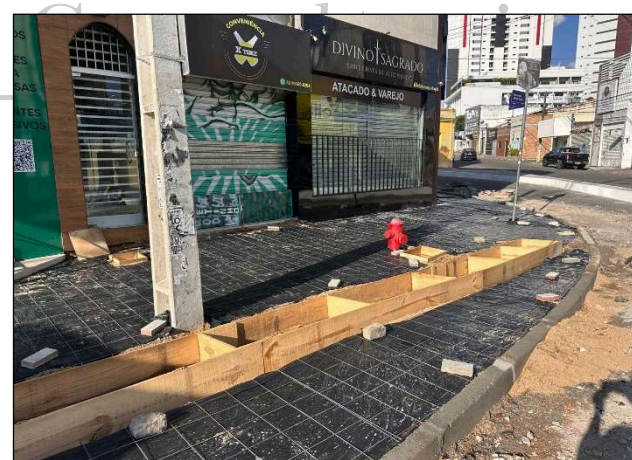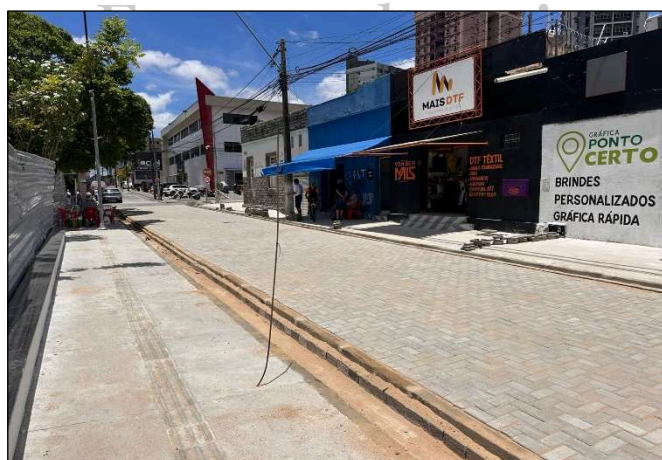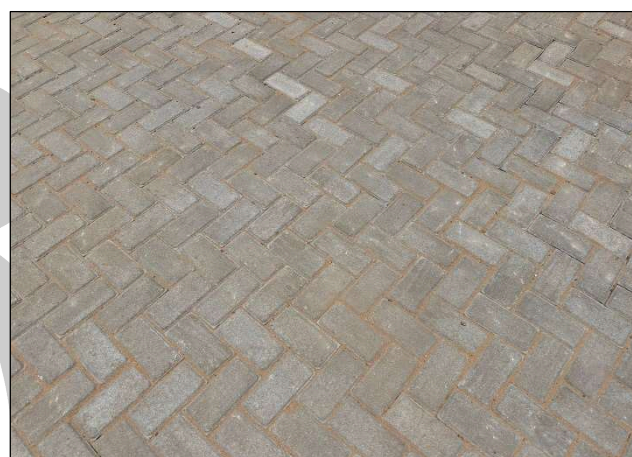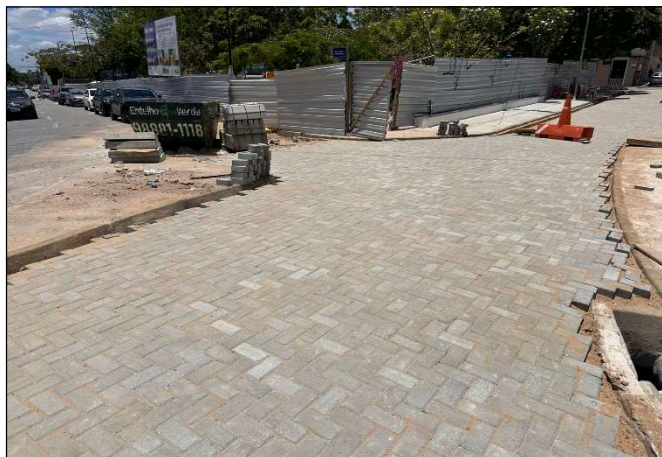

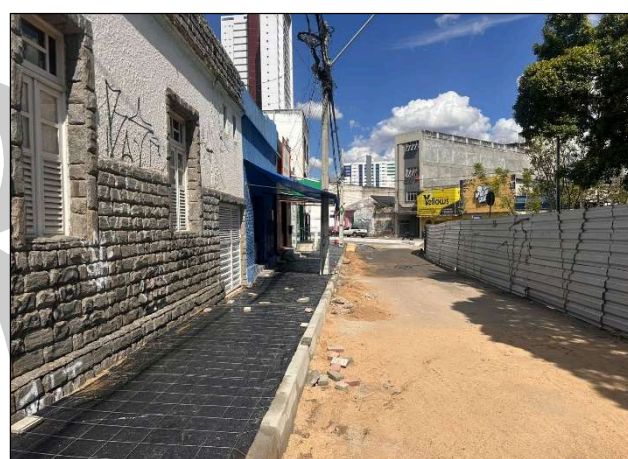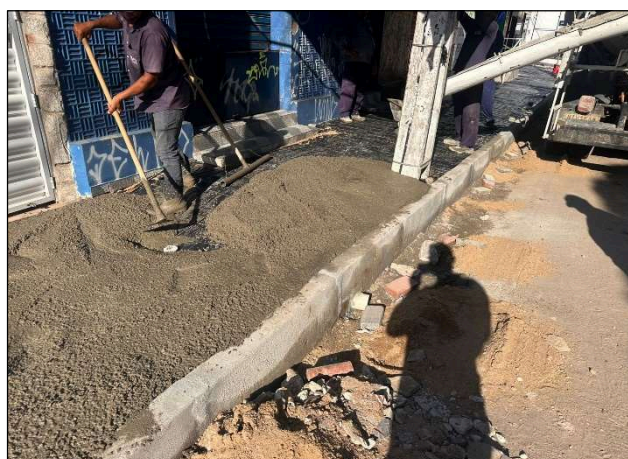

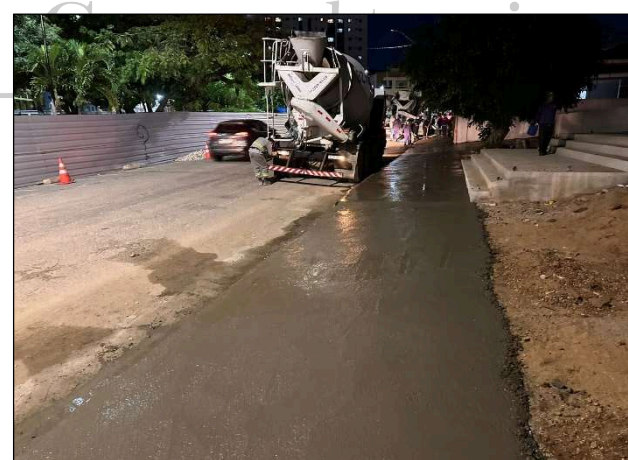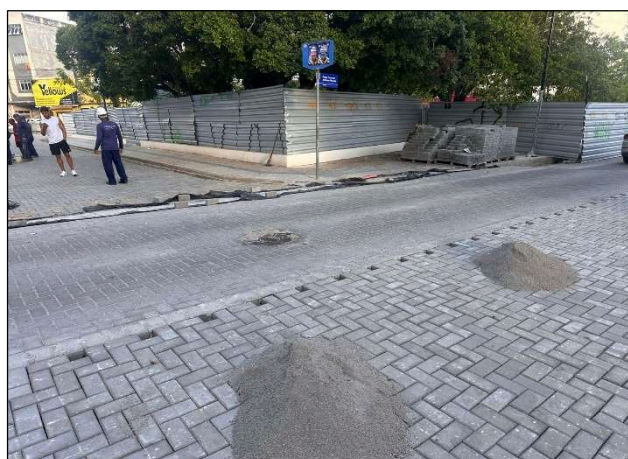

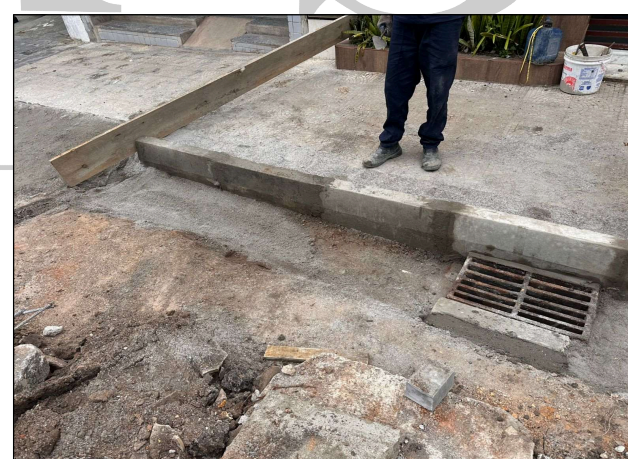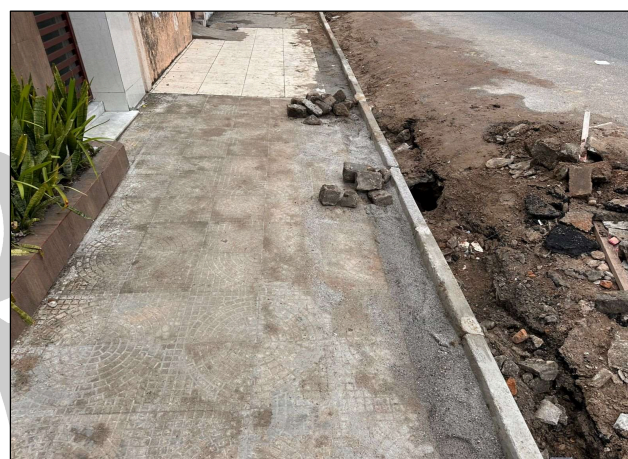





RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1081110-73/2021	Nº SICONV 923514	GESTOR MDR	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO	AÇÃO / MODALIDADE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO	RECURSO OGU não-PAC
PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE			MUNICÍPIO / UF CAMPINA GRANDE / PB	LOCALIDADE / ENDEREÇO CAMPINA GRANDE/PB	VALORES CONTRATADOS (R\$)
Objeto REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA				APELIDO DO EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA	REPASSO 960.019,00
					CONTRAPARTIDA 50.000,00
					INVESTIMENTO 1.010.019,00

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:
Adiantada	mai-26 25,16%

Medição nº:	3	Saldo a Reprogramar:	Repasse (R\$) 231.339,51	Contrapartida (R\$) 0,00
-------------	---	----------------------	-----------------------------	-----------------------------

Acumulado Anterior: 49,61%

Acumulado Anterior: 49,61%								Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.	
Etapas	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Acum. Período Anterior	No Período		Acum. incluindo o Período
	TOTAL							Repasse 728.679,49 CP. Financ. 50.000,00 Outros 0,00 Investimento 778.679,49	361.471,78 24.803,21 0,00 386.274,99	311.677,45 21.386,45 0,00 333.063,90	673.149,23 46.189,66 0,00 719.338,89	92,38%
1	Meta 1.	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA	Licitado / Em Execução	3.729,38	m²	CONTRATO Nº 2.08.001/2025	3	778.679,49	386.274,99	333.063,90	719.338,89	92,38%
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-

Local: Campina Grande-PB

Data: 11 de maio de 2026

Responsável Técnico

Nome: BRENO WESLEY BARBOSA DE SOUZA
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL - FISCAL DO CONTRATO
ART/RRT Fiscal.: PB20210383709

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: JOAB KLEBER LUCENA MACHADO
Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

SOLICITAÇÃO 3º - BOLETIM DE MEDIÇÃO

A empresa **R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI**, CNPJ: 30.836.850/0001-95, sediada na Rua Euclides Magno Bacalhau, n° 195, Centro, Ingá – PB, Cep: 58.380-000, por intermédio do seu representante legal, **RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES**, CPF N° 088.552.674-00, RG N° 8.277.917, residente domiciliado na Rua Euclides Magno Bacalhau, n° 195, Centro, Ingá – PB, Cep: 58380-000, infra-assinado, e para fins de requerer o que segue:

• Solicita de Vossa Senhoria **3º BOLETIM DE MEDIÇÃO**, que tem por objeto os serviços referentes a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DAS VIAS E PASSEIOS NO ENTORNO DA PRAÇA CORONEL ANTÔNIO PESSOA, BEM COMO MELHORIAS NA ÁREA INTERNA DA PRAÇA, PRESERVANDO SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS, DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA**, CONTRATO N° 2.08.001/2025/SECOB/PMCG.

Sem mais para o momento, e aguardando o pronto atendimento da solicitação efetuada e o envio das informações respectivas, aproveito o ensejo para renovar protestos de consideração e apreço.



Campina Grande – PB, 18 de maio de 2026

RUAN ASLAN
NUNES PEDROSA
SIMES:088552674
00

Assinado de forma
digital por RUAN ASLAN
NUNES PEDROSA
SIMES:08855267400
Dados: 2026.05.17
18:44:31 -03'00'

RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES

RESPONSÁVEL TÉCNICO E ADMINISTRADOR
CPF: 088.552.674/00; RG: 8.277.917/CREA – PB:161821195-1
CNPJ: 30.836.850/0001-95
Telefone: (83) 9 9806-7435
E-MAIL: resengenhariaeconsultoria@outlook.com

SOLICITAÇÃO 3º - BOLETIM DE MEDIÇÃO

A empresa **R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI**, CNPJ: 30.836.850/0001-95, sediada na Rua Euclides Magno Bacalhau, n° 195, Centro, Ingá – PB, Cep: 58.380-000, por intermédio do seu representante legal, **RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES**, CPF N° 088.552.674-00, RG N° 8.277.917, residente domiciliado na Rua Euclides Magno Bacalhau, n° 195, Centro, Ingá – PB, Cep: 58380-000, infra-assinado, e para fins de requerer o que segue:

• Solicita de Vossa Senhoria **3º BOLETIM DE MEDIÇÃO**, que tem por objeto os serviços referentes a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DAS VIAS E PASSEIOS NO ENTORNO DA PRAÇA CORONEL ANTÔNIO PESSOA, BEM COMO MELHORIAS NA ÁREA INTERNA DA PRAÇA, PRESERVANDO SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS, DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA**, CONTRATO N° 2.08.001/2025/SECOB/PMCG.

Sem mais para o momento, e aguardando o pronto atendimento da solicitação efetuada e o envio das informações respectivas, aproveito o ensejo para renovar protestos de consideração e apreço.



Campina Grande – PB, 18 de maio de 2026

RUAN ASLAN
NUNES PEDROSA
SIMES:088552674
00

Assinado de forma
digital por RUAN ASLAN
NUNES PEDROSA
SIMES:08855267400
Dados: 2026.05.17
18:44:31 -03'00'

RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES

RESPONSÁVEL TÉCNICO E ADMINISTRADOR

CPF: 088.552.674/00; RG: 8.277.917/CREA – PB:161821195-1

CNPJ: 30.836.850/0001-95

Telefone: (83) 9 9806-7435

E-MAIL: resengenhariaeconsultoria@outlook.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DAS VIAS E PASSEIOS NO ENTORNO DA PRAÇA CORONEL ANTÔNIO PESSOA, BEM COMO MELHORIAS NA ÁREA INTERNA DA PRAÇA, PRESERVANDO SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS, DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE – PB.

LOCALIDADE: PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA, 111 - CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB, 58400-263

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 19/12/2025 a 11/05/2026

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL CAMPINA GRANDE - PB

CONTRATADA: R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 30.836.850/0001-95

CONTRATO : 2.08.001/2025

Concorrência Eletrônica : 9.08.17/2024

MDR - 1081110-73/2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO 3ª MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	Unid	Quant	Memória de Cálculo
1	ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA			
1.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	mês	1,20	Proporcional a Medição
1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	mês	1,20	Proporcional a Medição
1.3	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	95,69	Proporcional a Medição
1.4	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	1,49	Proporcional a Medição
2	SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.1	FECHAMENTO DE OBRA			
2.2	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS			
2.3	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS			
3	DEMOLIÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHO			
3.1	DEMOLIÇÃO PARA EXECUTAR CALÇADAS			
3.1.1	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	283,87	101,38 m x 2,80 m (Áreas de Piso Intertravado Retirados) = 283,87 m²
3.1.2	RETIRADA PISO PEDRAS IRREGULARES SEM REAPROVEITAMENTO	m²	425,85	141,95 x 3,00 m (Áreas de Piso Pedra Retirados) = 425,85 m²
3.1.3	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	m²	425,85	141,95 x 3,00 m (Áreas de Piso Pedra Retirados) = 425,85 m²
3.1.4	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	m²	283,87	113,54 x 2,50 m (Áreas de Piso Cerâmica Retirados) = 283,87 m²
3.1.5	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	482,28	78,53 x 6,14 m (Áreas de Piso Asfáltico Parcialmente Retirados) = 482,28 m²
3.2	DEMOLIÇÃO PARA EXECUTAR PAVIMENTO ELEVADO			
3.2.1	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	561,00	Demolição do Pavimento = 175,00 x 3,20 m = 561,00 m²
3.3	DEMOLIÇÃO DE PISO DA PRAÇA E MEIO FIO			
3.4	CARGA E TRANSPORTE DE ENUTILO			
4	CONSTRUÇÃO			
4.1	PISO DAS CALÇADAS			
4.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	m³	37,74	Área da Calçada x Espessura do Concreto = (1790,32 m² x 0,02 m) = 37,74 m³
4.1.2	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	1790,32	Área de Calçada = 1790,32 m²
4.1.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	1790,32	Área de Calçada = 1790,32 m²
4.2	PISO DA PRAÇA			
4.3	PAVIMENTO ELEVADO			
4.3.1	COLCHÃO DE AREIA	m³	71,25	337,50 x 0,20 m = 67,50 m³
4.3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	m	130,07	Ruas Entorno da Praça Elevadas: 65,03 m x 2,00 lados = 130,07 m
4.3.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.	m²	703,00	78,53 x 6,14 m = 482,17 m²
4.4	MEIO FIO E CALHAS			
4.4.1	CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE CONCRETO PRÉ MOLDADA.	m	92,94	Calhas do Pavimento Elevado: 92,94 m
4.4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO	m	617,57	Soma das Quantidades Executadas: Ruas ao Entorno da Praça = 617,57 m
4.5	CANTEIROS			
4.6	ÁREAS PERMEÁVEL			
4.7	ACESSIBILIDADE			
5	SERVIÇOS DIVERSOS			
5.1	EQUIPAMENTOS			
5.2	ILUMINAÇÃO			
5.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA			

**RUAN ASLAN
NUNES
PEDROSA
SIMES:08855267
400**

Assinado de forma
digital por RUAN
ASLAN NUNES
PEDROSA
SIMES:08855267400
Dados: 2026.05.11
19:19:28 -03'00'

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DAS VIAS E PASSEIOS NO ENTORNO DA PRAÇA CORONEL ANTÔNIO PESSOA, BEM COMO MELHORIAS NA ÁREA INTERNA DA PRAÇA, PRESERVANDO SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS, DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE – PB.

LOCALIDADE:	Fonte de Recursos	Contrato:	Concorrência Eletrônica	Valor Contratado	BDI: 22,00	N° do Boletim	Período de execução	Valor do BM	Valor Acumulado	Percentual Total Executado
	MDR - 1081110-73/2021	2.08.001/2025	9.08.17/2024	R\$ 778.679,49						

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL CAMPINA GRANDE - PB

CONTRATADA: R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 30.836.850/0001-95

ART de Execução: PB20250727074

ART de Fiscalização: PB20250769528

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PLANILHA CONTRATADA			EVOLUÇÃO FÍSICA			EVOLUÇÃO FINANCEIRA			PERCENTUAL EXECUTADO
				PREÇO UNIT. SEM/BDI	PREÇO UNIT. C/BDI	VALOR TOTAL (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLU. O PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLU. O PERÍODO	
1	ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA					R\$ 52.382,64				R\$ 14.720,59	R\$ 20.915,10	R\$ 46.969,76	89,79%
1.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	mês	3,00	R\$ 771,00	R\$ 888,81	R\$ 2.666,43	1,49	1,20	2,69	R\$ 1.022,13	R\$ 1.066,57	R\$ 2.390,90	89,79%
1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO,	mês	3,00	R\$ 670,06	R\$ 772,45	R\$ 2.317,35	1,49	1,20	2,69	R\$ 888,31	R\$ 926,94	R\$ 2.077,88	89,79%
1.3	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	240,00	R\$ 100,32	R\$ 122,39	R\$ 29.373,60	119,51	95,69	215,20	R\$ 5.900,47	R\$ 11.711,50	R\$ 26.338,33	89,79%
1.4	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	3,00	R\$ 4.924,94	R\$ 6.008,42	R\$ 18.025,26	1,49	1,20	2,69	R\$ 6.909,68	R\$ 7.210,10	R\$ 16.162,65	89,79%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 56.742,51				R\$ 56.742,51	R\$ -	R\$ 56.742,51	100,00%
2.1	FECHAMENTO DE OBRA					R\$ 52.544,71				R\$ 52.544,71	R\$ -	R\$ 52.544,71	100,00%
2.1.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	487,74	R\$ 78,78	R\$ 96,11	R\$ 46.876,69	487,74	-	487,74	R\$ 46.876,69	R\$ -	R\$ 46.876,69	100,00%
2.1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	18,00	R\$ 258,11	R\$ 314,89	R\$ 5.668,02	18,00	-	18,00	R\$ 5.668,02	R\$ -	R\$ 5.668,02	100,00%
2.2	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS					R\$ 2.119,35				R\$ 2.119,35	R\$ -	R\$ 2.119,35	100,00%
2.2.1	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM - REV 03_10/2022	und	1,00	R\$ 443,26	R\$ 540,77	R\$ 540,77	1,00	-	1,00	R\$ 540,77	R\$ -	R\$ 540,77	100,00%
2.2.2	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFÁSICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR	und	1,00	R\$ 1.293,92	R\$ 1.578,58	R\$ 1.578,58	1,00	-	1,00	R\$ 1.578,58	R\$ -	R\$ 1.578,58	100,00%
2.3	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS					R\$ 2.078,45				R\$ 2.078,45	R\$ -	R\$ 2.078,45	100,00%
2.3.1	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	703,00	R\$ 1,18	R\$ 1,43	R\$ 1.005,29	703,00	-	703,00	R\$ 1.005,29	R\$ -	R\$ 1.005,29	100,00%
2.3.2	LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA	m²	1850,29	R\$ 0,48	R\$ 0,58	R\$ 1.073,16	1.850,29	-	1.850,29	R\$ 1.073,16	R\$ -	R\$ 1.073,16	100,00%
3	DEMOLIÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHO					R\$ 85.539,26				R\$ 43.247,07	R\$ 42.292,19	R\$ 85.539,26	100,00%
3.1	DEMOLIÇÃO PARA EXECUTAR CALÇADAS					R\$ 30.926,33				R\$ -	R\$ 30.926,33	R\$ 30.926,33	100,00%
3.1.1	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	283,87	R\$ 12,91	R\$ 15,75	R\$ 4.470,95		283,87	283,87	R\$ -	R\$ 4.470,95	R\$ 4.470,95	100,00%
3.1.2	RETIRADA PISO PEDRAS IRREGULARES SEM REAPROVEITAMENTO	m²	425,85	R\$ 3,94	R\$ 4,80	R\$ 2.044,08		425,85	425,85	R\$ -	R\$ 2.044,08	R\$ 2.044,08	100,00%
3.1.3	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	m²	425,85	R\$ 20,76	R\$ 25,32	R\$ 10.782,52		425,85	425,85	R\$ -	R\$ 10.782,52	R\$ 10.782,52	100,00%
3.1.4	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	m²	283,87	R\$ 11,14	R\$ 13,59	R\$ 3.857,79		283,87	283,87	R\$ -	R\$ 3.857,79	R\$ 3.857,79	100,00%
3.1.5	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	482,28	R\$ 16,61	R\$ 20,26	R\$ 9.770,99		482,28	482,28	R\$ -	R\$ 9.770,99	R\$ 9.770,99	100,00%
3.2	DEMOLIÇÃO PARA EXECUTAR PAVIMENTO ELEVADO					R\$ 14.242,78				R\$ 2.876,92	R\$ 11.365,86	R\$ 14.242,78	100,00%
3.2.1	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	703,00	R\$ 16,61	R\$ 20,26	R\$ 14.242,78	142,00	561,00	703,00	R\$ 2.876,92	R\$ 11.365,86	R\$ 14.242,78	100,00%
3.3	DEMOLIÇÃO DE PISO DA PRAÇA E MEIO FIO					R\$ 28.337,87				R\$ 28.337,87	R\$ -	R\$ 28.337,87	100,00%
3.3.1	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1280,79	R\$ 12,91	R\$ 15,75	R\$ 20.172,44	1.280,79	-	1.280,79	R\$ 20.172,44	R\$ -	R\$ 20.172,44	100,00%
3.3.2	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	m	797,76	R\$ 7,93	R\$ 9,67	R\$ 7.714,33	797,76	-	797,76	R\$ 7.714,33	R\$ -	R\$ 7.714,33	100,00%
3.3.3	REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO SIMPLES (6,00 A 10,00 M) SEM REAPROVEITAMENTO	un	13,00	R\$ 28,45	R\$ 34,70	R\$ 451,10	13,00	-	13,00	R\$ 451,10	R\$ -	R\$ 451,10	100,00%
3.4	CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO					R\$ 12.032,28				R\$ 12.032,28	R\$ -	R\$ 12.032,28	100,00%
3.4.1	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	373,21	R\$ 7,00	R\$ 8,54	R\$ 3.187,21	373,21	-	373,21	R\$ 3.187,21	R\$ -	R\$ 3.187,21	100,00%
3.4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³xkm	3732,10	R\$ 1,95	R\$ 2,37	R\$ 8.845,07	3.732,10	-	3.732,10	R\$ 8.845,07	R\$ -	R\$ 8.845,07	100,00%
4	CONSTRUÇÃO					R\$ 500.928,38				R\$ 210.476,20	R\$ 269.856,60	R\$ 480.332,80	95,93%
4.1	PISO DAS CALÇADAS					R\$ 184.144,62				R\$ -	R\$ 184.144,62	R\$ 184.144,62	100,00%
4.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	m³	37,74	R\$ 548,48	R\$ 669,15	R\$ 25.253,72		37,74	37,74	R\$ -	R\$ 25.253,72	R\$ 25.253,72	100,00%
4.1.2	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	1790,32	R\$ 2,41	R\$ 2,94	R\$ 5.263,54		1.790,32	1.790,32	R\$ -	R\$ 5.263,54	R\$ 5.263,54	100,00%
4.1.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	1790,32	R\$ 70,34	R\$ 85,81	R\$ 153.627,36		1.790,32	1.790,32	R\$ -	R\$ 153.627,36	R\$ 153.627,36	100,00%
4.2	PISO DA PRAÇA					R\$ 148.323,18				R\$ 148.323,18	R\$ -	R\$ 148.323,18	100,00%
4.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	m³	38,42	R\$ 548,48	R\$ 669,15	R\$ 25.708,74	38,42	-	38,42	R\$ 25.708,74	R\$ -	R\$ 25.708,74	100,00%
4.2.2	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	1280,79	R\$ 2,41	R\$ 2,94	R\$ 3.765,52	1.280,79	-	1.280,79	R\$ 3.765,52	R\$ -	R\$ 3.765,52	100,00%
4.2.3	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	m³	51,23	R\$ 342,61	R\$ 417,98	R\$ 21.413,12	51,23	-	51,23	R\$ 21.413,12	R\$ -	R\$ 21.413,12	100,00%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DAS VIAS E PASSEIOS NO ENTORNO DA PRAÇA CORONEL ANTÔNIO PESSOA, BEM COMO MELHORIAS NA ÁREA INTERNA DA PRAÇA, PRESERVANDO SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS, DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE – PB.

LOCALIDADE: PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA, 111 - CENTRO CAMPINA GRANDE - PB, 58400-263		Fonte de Recursos	Contrato:	Concorrência Eletrônica	Valor Contratado	BDI: 22,00	Nº do Boletim	Período de execução	Valor do BM	Valor Acumulado	Percentual Total Executado		
		MDR - 1081110-73/2021	2.08.001/2025	9.08.17/2024	R\$ 778.679,49		03	19/12/2025 a 11/05/2026	R\$ 333.063,90	R\$ 719.338,89	92,38%		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL CAMPINA GRANDE - PB													
CONTRATADA: R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 30.836.850/0001-95													
ART de Execução: PB20250727074						ART de Fiscalização: PB20250769528							
4.2.4	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, ACAMABENTO LAVADO TIPO FULGET, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS E APLICAÇÃO DO PISO.	m²	450,00	R\$ 70,06	R\$ 85,47	R\$ 38.461,50	450,00	-	450,00	R\$ 38.461,50	R\$ -	R\$ 38.461,50	100,00%
4.2.5	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, ACAMABENTO LAVADO TIPO FULGET, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS E APLICAÇÃO DO PISO	m²	690,00	R\$ 70,06	R\$ 85,47	R\$ 58.974,30	690,00	-	690,00	R\$ 58.974,30	R\$ -	R\$ 58.974,30	100,00%
4.3	PAVIMENTO ELEVADO					R\$ 66.355,06				R\$ -	R\$ 49.880,32	R\$ 49.880,32	75,04%
4.3.1	COLCHÃO DE AREIA	m³	71,25	R\$ 121,34	R\$ 148,03	R\$ 10.547,13	67,50	67,50	R\$ -	R\$ 9.992,03	R\$ 9.992,03	94,82%	
4.3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	m	130,07	R\$ 32,32	R\$ 39,43	R\$ 5.128,66	130,07	130,07	R\$ -	R\$ 5.128,66	R\$ 5.128,66	100,00%	
4.3.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.	m²	703,00	R\$ 59,09	R\$ 72,09	R\$ 50.679,27	482,17	482,17	R\$ -	R\$ 34.759,64	R\$ 34.759,64	68,99%	
4.4	MEIO FIO E CALHAS					R\$ 47.384,65				R\$ 11.552,99	R\$ 35.831,66	R\$ 47.384,65	100,00%
4.4.1	CAIHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE CONCRETO PRÉ MOLDADA.	m	92,94	R\$ 101,25	R\$ 123,53	R\$ 11.480,88	92,94	92,94	R\$ -	R\$ 11.480,88	R\$ 11.480,88	100,00%	
4.4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO	m	910,57	R\$ 32,32	R\$ 39,43	R\$ 35.903,77	293,00	617,57	R\$ 910,57	R\$ 11.552,99	R\$ 24.350,79	R\$ 35.903,77	100,00%
4.5	CANTEIROS					R\$ 31.874,26				R\$ 31.874,26	R\$ -	R\$ 31.874,26	100,00%
4.5.1	RESTAURO - EMBOÇO ESPECIAL DE PAREDE, SPRESSURA 3CM, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,24:0,74 (CAL, ARENOSO E AREIA MÉDIA)	m²	46,19	R\$ 36,77	R\$ 44,86	R\$ 2.072,08	46,19	-	46,19	R\$ 2.072,08	R\$ -	R\$ 2.072,08	100,00%
4.5.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	m²	184,77	R\$ 3,10	R\$ 3,78	R\$ 698,43	184,77	-	184,77	R\$ 698,43	R\$ -	R\$ 698,43	100,00%
4.5.3	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E BETOQUES - REV 01	m²	184,77	R\$ 16,17	R\$ 19,72	R\$ 3.643,66	184,77	-	184,77	R\$ 3.643,66	R\$ -	R\$ 3.643,66	100,00%
4.5.4	APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA RISCADA EM CORES DIVERSAS	m²	184,77	R\$ 40,70	R\$ 49,65	R\$ 9.173,83	184,77	-	184,77	R\$ 9.173,83	R\$ -	R\$ 9.173,83	100,00%
4.5.5	GRANITO VERDE UBATUBA EM PISO	m²	60,51	R\$ 220,62	R\$ 269,15	R\$ 16.286,26	60,51	-	60,51	R\$ 16.286,26	R\$ -	R\$ 16.286,26	100,00%
4.6	ÁREAS PERMEÁVEL					R\$ 6.587,58				R\$ 2.466,73	R\$ -	R\$ 2.466,73	37,46%
4.6.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF. 05/2022	m²	137,91	R\$ 16,98	R\$ 20,71	R\$ 2.856,11	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.6.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF. 01/2024	m	56,66	R\$ 31,09	R\$ 37,92	R\$ 2.148,54	56,66	-	56,66	R\$ 2.148,54	R\$ -	R\$ 2.148,54	100,00%
4.6.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF. 01/2024	m	7,88	R\$ 33,10	R\$ 40,38	R\$ 318,19	7,88	-	7,88	R\$ 318,19	R\$ -	R\$ 318,19	100,00%
4.6.4	ÁRVORE PORTE PEQUENO (MULUNGÚ) - PLANTADA	und	8,00	R\$ 35,05	R\$ 42,76	R\$ 342,08	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.6.5	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF. 05/2018	und	2,00	R\$ 103,76	R\$ 126,58	R\$ 253,16	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.6.6	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF. 05/2018	und	10,00	R\$ 54,88	R\$ 66,95	R\$ 669,50	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.7	ACESSIBILIDADE					R\$ 16.259,03				R\$ 16.259,03	R\$ -	R\$ 16.259,03	100,00%
4.7.1	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	107,69	R\$ 123,76	R\$ 150,98	R\$ 16.259,03	107,69	-	107,69	R\$ 16.259,03	R\$ -	R\$ 16.259,03	100,00%
5	SERVIÇOS DIVERSOS					R\$ 83.086,70				R\$ 49.791,23	R\$ -	R\$ 49.791,23	59,93%
5.1	EQUIPAMENTOS					R\$ 24.680,60				R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.1.1	FRADE ESFERA EM CONCRETO, 30CM DE DIÂMETRO, COM FCK=25 MPA, PARA PROTEÇÃO DE CALÇADAS, INCLUSIVE FURAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	und	84,00	R\$ 162,45	R\$ 198,18	R\$ 16.647,12	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.1.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	m²	19,20	R\$ 11,50	R\$ 14,03	R\$ 269,37	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.1.3	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF. 11/2021	und	3,00	R\$ 1.082,74	R\$ 1.320,94	R\$ 3.962,82	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.1.4	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 M	und	1,00	R\$ 1.620,34	R\$ 1.976,81	R\$ 1.976,81	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.1.5	TUBO AÇO GALVANIZADO D=3" P/BICICLETÁRIO, DIMENSÃO: H=75CM, L=75CM, FIXADO EMBASE DE CONCRETO, PINTADO C/ESMALTE SINTETICO, EXCETO BASE DE CONCRETO E PINTURA DE ACABAMENTO	und	6,00	R\$ 249,25	R\$ 304,08	R\$ 1.824,48	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.2	ILUMINAÇÃO					R\$ 49.791,23				R\$ 49.791,23	R\$ -	R\$ 49.791,23	100,00%
5.2.1	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 11/2019	und	4,00	R\$ 2.363,90	R\$ 2.883,95	R\$ 11.535,80	4,00	-	4,00	R\$ 11.535,80	R\$ -	R\$ 11.535,80	100,00%
5.2.2	LUMINÁRIA EM LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED SMD AUTOVOLT 75 W, 5.000 K, IP-66,JRC 70, FP>0,95, 170LM/W,12,750 LM E 54.000H, COM BASE PARA RELÉ 3 PINOS, MODELO GL421 G-LIGHT OU SIMILAR	und	8,00	R\$ 767,12	R\$ 935,88	R\$ 7.487,04	8,00	-	8,00	R\$ 7.487,04	R\$ -	R\$ 7.487,04	100,00%
5.2.3	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLS, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 11/2019	und	9,00	R\$ 2.035,11	R\$ 2.482,83	R\$ 22.345,47	9,00	-	9,00	R\$ 22.345,47	R\$ -	R\$ 22.345,47	100,00%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DAS VIAS E PASSEIOS NO ENTORNO DA PRAÇA CORONEL ANTÔNIO PESSOA, BEM COMO MELHORIAS NA ÁREA INTERNA DA PRAÇA, PRESERVANDO SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS, DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE – PB.

LOCALIDADE: PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA, 111 - CENTRO CAMPINA GRANDE - PB, 58400-263		Fonte de Recursos	Contrato:	Concorrência Eletrônica	Valor Contratado	BDI: 22,00	Nº do Boletim	Período de execução	Valor do BM	Valor Acumulado	Percentual Total Executado		
		MDR - 1081110-73/2021	2.08.001/2025	9.08.17/2024	R\$ 778.679,49		03	19/12/2025 a 11/05/2026	R\$ 333.063,90	R\$ 719.338,89	92,38%		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL CAMPINA GRANDE - PB													
CONTRATADA: R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 30.836.850/0001-95													
ART de Execução: PB20250727074													
ART de Fiscalização: PB20250769528													
5.2.4	LUMINÁRIA EM LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED SMD AUTOVOLT 75 W, 5.000 K, IP-66,IRC 70, FP>0,95, 170LM/W,12,750 LM E 54.000H, COM BASE PARA RELÉ 3 PINOS, MODELO GL421 G-LIGHT OU SIMILAR	und	9,00	R\$ 767,12	R\$ 935,88	R\$ 8.422,92	9,00	-	9,00	R\$ 8.422,92	R\$ -	R\$ 8.422,92	100,00%
5.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA					R\$ 8.614,87				R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.3.1	LIMPEZA GERAL	m²	3729,38	R\$ 1,89	R\$ 2,31	R\$ 8.614,87	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
TOTAL CONTRATADO						R\$ 778.679,49	EVOLUÇÃO FINANCEIRA DO BM 03			R\$ 386.274,99	R\$ 333.063,90	R\$ 719.338,89	92,38%
							BM 01	R\$ 159.966,55	CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E SESENTA E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS				
							BM 02	R\$ 226.308,44	DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL TREZENTOS E SESENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS				
							BM 03	R\$ 333.063,90	TREZENTOS E TRINTA E TRES MIL SESENTA E TRES REAIS E NOVENTA CENTAVOS				

RUAN ASLAN
NUNES PEDROSA
SIMES:08855267400
400

Assinado de forma digital por RUAN ASLAN NUNES PEDROSA
SIMES:08855267400
Dados: 2026.05.11 19:19:14 -03'00'



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DAS VIAS E PASSEIOS NO ENTORNO DA PRAÇA CORONEL ANTÔNIO PESSOA, BEM COMO MELHORIAS NA ÁREA INTERNA DA PRAÇA, PRESERVANDO SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS, DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE – PB.

LOCALIDADE: PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA, 111 - CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB, 58400-263

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 19/12/2025 a 11/05/2026

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL CAMPINA GRANDE - PB

CONTRATADA: R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 30.836.850/0001-95

CONTRATO : 2.08.001/2025

Concorrência Eletrônica : 9.08.17/2024

MDR - 1081110-73/2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO 3ª MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	Unid	Quant	Memória de Cálculo
1	ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA			
1.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	mês	1,20	Proporcional a Medição
1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	mês	1,20	Proporcional a Medição
1.3	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	95,69	Proporcional a Medição
1.4	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	1,49	Proporcional a Medição
2	SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.1	FECHAMENTO DE OBRA			
2.2	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS			
2.3	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS			
3	DEMOLIÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHO			
3.1	DEMOLIÇÃO PARA EXECUTAR CALÇADAS			
3.1.1	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	283,87	101,38 m x 2,80 m (Áreas de Piso Intertravado Retirados) = 283,87 m²
3.1.2	RETIRADA PISO PEDRAS IRREGULARES SEM REAPROVEITAMENTO	m²	425,85	141,95 x 3,00 m (Áreas de Piso Pedra Retirados) = 425,85 m²
3.1.3	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	m²	425,85	141,95 x 3,00 m (Áreas de Piso Pedra Retirados) = 425,85 m²
3.1.4	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	m²	283,87	113,54 x 2,50 m (Áreas de Piso Cerâmica Retirados) = 283,87 m²
3.1.5	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	482,28	78,53 x 6,14 m (Áreas de Piso Asfáltico Parcialmente Retirados) = 482,28 m²
3.2	DEMOLIÇÃO PARA EXECUTAR PAVIMENTO ELEVADO			
3.2.1	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	561,00	Demolição do Pavimento = 175,00 x 3,20 m = 561,00 m²
3.3	DEMOLIÇÃO DE PISO DA PRAÇA E MEIO FIO			
3.4	CARGA E TRANSPORTE DE ENUTILHO			
4	CONSTRUÇÃO			
4.1	PISO DAS CALÇADAS			
4.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	m³	37,74	Área da Calçada x Espessura do Concreto = (1790,32 m² x 0,02 m) = 37,74 m³
4.1.2	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	1790,32	Área de Calçada = 1790,32 m²
4.1.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	1790,32	Área de Calçada = 1790,32 m²
4.2	PISO DA PRAÇA			
4.3	PAVIMENTO ELEVADO			
4.3.1	COLCHÃO DE AREIA	m³	71,25	337,50 x 0,20 m = 67,50 m³
4.3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	m	130,07	Ruas Entorno da Praça Elevadas: 65,03 m x 2,00 lados = 130,07 m
4.3.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM.	m²	703,00	78,53 x 6,14 m = 482,17 m²
4.4	MEIO FIO E CALHAS			
4.4.1	CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE CONCRETO PRÉ MOLDADA.	m	92,94	Calhas do Pavimento Elevado: 92,94 m
4.4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO	m	617,57	Soma das Quantidades Executadas: Ruas ao Entorno da Praça = 617,57 m
4.5	CANTEIROS			
4.6	ÁREAS PERMEÁVEL			
4.7	ACESSIBILIDADE			
5	SERVIÇOS DIVERSOS			
5.1	EQUIPAMENTOS			
5.2	ILUMINAÇÃO			
5.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA			

RUAN ASLAN
NUNES
PEDROSA
SIMES:08855267
400

Assinado de forma digital por RUAN ASLAN NUNES PEDROSA
SIMES:08855267400
Dados: 2026.05.11 19:19:28 -03'00'

Assinado por 1 pessoa: CARLOS NEWTON BELO DE FRANCA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/E04-411F-3599-5550-e-intorme-o-cbdaao-E04-411F-3599-5550>

Ofício nº: 100/2025

Campina Grande-PB, 11 de maio de 2026

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: Solicitação de autorização de desbloqueio de recursos - Medição nº 3
REF: Contrato de Repasse - Operação nº: 1081110-73/2021 - SICONV nº: 923514

Programa: DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO
Objeto: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA

Proponente /
Tomador: MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 3ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	R\$ 728.679,49	R\$ 311.677,45	R\$ 673.149,23
Contrapartida Financeira:	R\$ 50.000,00	R\$ 21.386,45	R\$ 46.189,66
Outros:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento:	R\$ 778.679,49	R\$ 333.063,90	R\$ 719.338,89
Execução Física:	-	42,77%	92,38%

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.

3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada no SICONV.

4. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

JOAB KLEBER LUCENA MACHADO
MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE





Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/EF04-411F-3599-5550> e informe o código EF04-411F-3599-5550










RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Engenharia e Consultoria

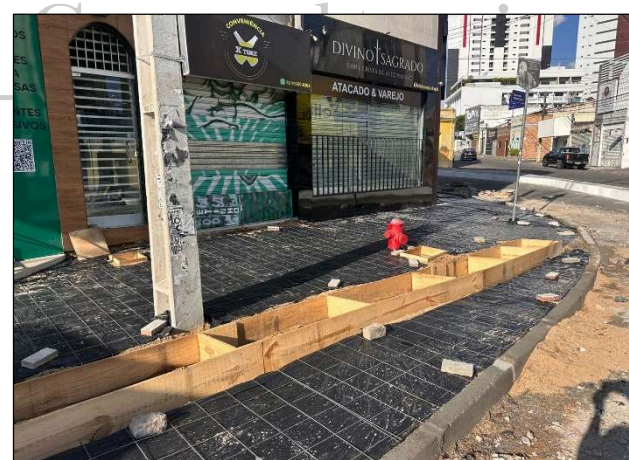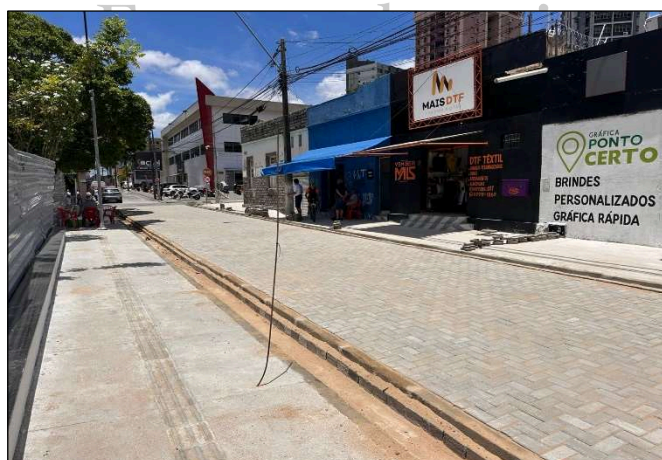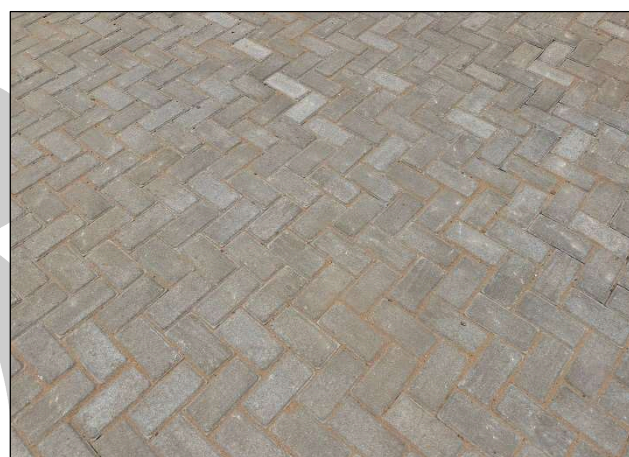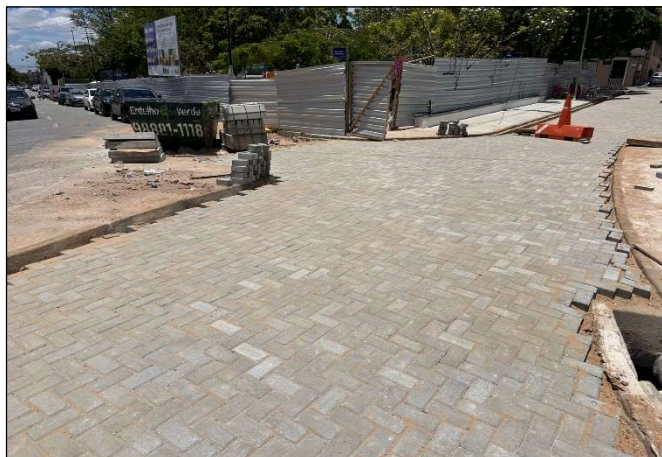

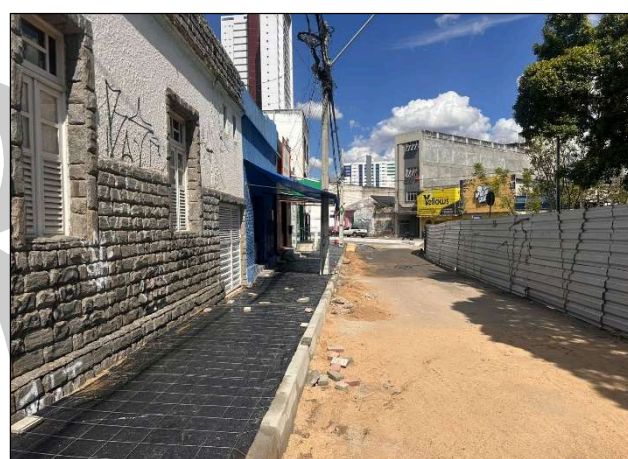

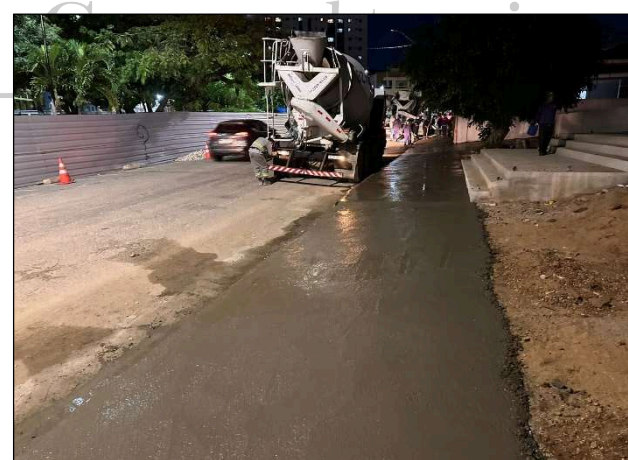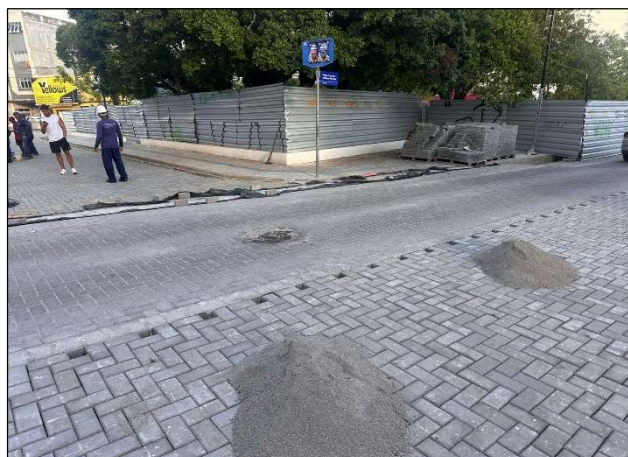

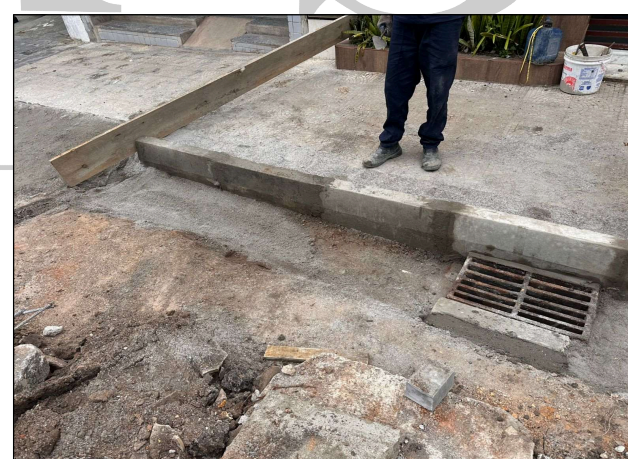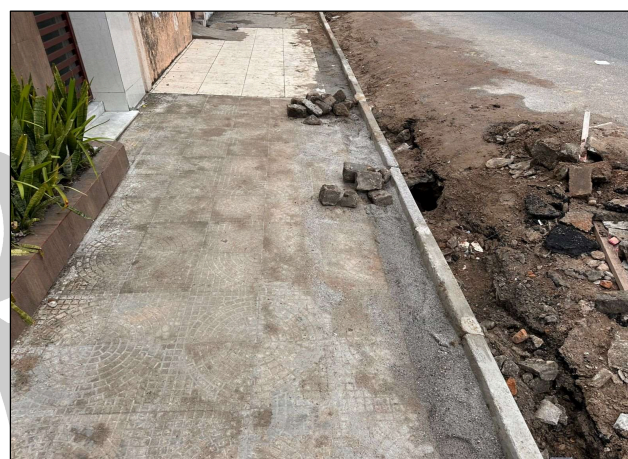





RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1081110-73/2021	Nº SICONV 923514	GESTOR MDR	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO	AÇÃO / MODALIDADE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO	RECURSO OGU não-PAC
PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE			Município / UF CAMPINA GRANDE / PB	Localidade / Endereço CAMPINA GRANDE/PB	Valores Contratados (R\$)
Objeto REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA				APELIDO DO EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA	REPASSO 960.019,00
					CONTRAPARTIDA 50.000,00
					INVESTIMENTO 1.010.019,00

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:
Adiantada	mai-26 25,16%

Medição nº:	3	Saldo a Reprogramar:	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
			231.339,51	0,00

Acumulado Anterior: 49,61%

Etapas	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.
									Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período	
	TOTAL							Repasse 728.679,49	361.471,78	311.677,45	673.149,23	
								CP. Financ. 50.000,00	24.803,21	21.386,45	46.189,66	92,38%
								Outros 0,00	0,00	0,00	0,00	
								Investimento 778.679,49	386.274,99	333.063,90	719.338,89	
1	Meta 1.	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA	Licitado / Em Execução	3.729,38	m²	CONTRATO Nº 2.08.001/2025	3	778.679,49	386.274,99	333.063,90	719.338,89	92,38%
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-

Local: Campina Grande-PB

Data: 11 de maio de 2026

Responsável Técnico

Nome: BRENO WESLEY BARBOSA DE SOUZA
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL - FISCAL DO CONTRATO
ART/RRT Fiscal.: PB20210383709

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: JOAB KLEBER LUCENA MACHADO
Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS



SOLICITAÇÃO 3° - BOLETIM DE MEDIÇÃO

A empresa **R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI**, CNPJ: 30.836.850/0001-95, sediada na Rua Euclides Magno Bacalhau, n° 195, Centro, Ingá – PB, Cep: 58.380-000, por intermédio do seu representante legal, **RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES**, CPF N° 088.552.674-00, RG N° 8.277.917, residente domiciliado na Rua Euclides Magno Bacalhau, n° 195, Centro, Ingá – PB, Cep: 58380-000, infra-assinado, e para fins de requerer o que segue:

• Solicita de Vossa Senhoria **3° BOLETIM DE MEDIÇÃO**, que tem por objeto os serviços referentes a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DAS VIAS E PASSEIOS NO ENTORNO DA PRAÇA CORONEL ANTÔNIO PESSOA, BEM COMO MELHORIAS NA ÁREA INTERNA DA PRAÇA, PRESERVANDO SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS, DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA**, CONTRATO N° 2.08.001/2025/SECOB/PMCG.

Sem mais para o momento, e aguardando o pronto atendimento da solicitação efetuada e o envio das informações respectivas, aproveito o ensejo para renovar protestos de consideração e apreço.



Campina Grande – PB, 18 de maio de 2026

RUAN ASLAN
NUNES PEDROSA
SIMES:088552674
00

Assinado de forma
digital por RUAN ASLAN
NUNES PEDROSA
SIMES:08855267400
Dados: 2026.05.17
18:44:31 -03'00'

RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES

RESPONSÁVEL TÉCNICO E ADMINISTRADOR
CPF: 088.552.674/00; RG: 8.277.917/CREA – PB:161821195-1
CNPJ: 30.836.850/0001-95
Telefone: (83) 9 9806-7435
E-MAIL: resengenhariaeconsultoria@outlook.com



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EF04-411F-3599-5550

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CARLOS NEWTON BELO DE FRANCA COSTA (CPF 133.XXX.XXX-68) em 02/07/2026 16:20:08

GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/EF04-411F-3599-5550>

Ofício nº: 100/2025

Campina Grande-PB, 11 de maio de 2026

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: Solicitação de autorização de desbloqueio de recursos - Medição nº 3
REF: Contrato de Repasse - Operação nº: 1081110-73/2021 - SICONV nº: 923514

Programa: DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO
Objeto: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA

Proponente /
Tomador: MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 3ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	R\$ 728.679,49	R\$ 311.677,45	R\$ 673.149,23
Contrapartida Financeira:	R\$ 50.000,00	R\$ 21.386,45	R\$ 46.189,66
Outros:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento:	R\$ 778.679,49	R\$ 333.063,90	R\$ 719.338,89
Execução Física:	-	42,77%	92,38%

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.

3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada no SICONV.

4. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

JOAB KLEBER LUCENA MACHADO
MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Programa: DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO
Objeto: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA

1. Informamos abaixo a relação de fornecedores para a Solicitação de Recursos referenciada:

Atenciosamente,

2



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1081110-73/2021	Nº SICONV 923514	GESTOR MDR	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO	AÇÃO / MODALIDADE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO	RECURSO OGU não-PAC
PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE			MUNICÍPIO / UF CAMPINA GRANDE / PB	LOCALIDADE / ENDEREÇO CAMPINA GRANDE/PB	VALORES CONTRATADOS (R\$)
Objeto REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA				APELIDO DO EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA	REPASSO 960.019,00
					CONTRAPARTIDA 50.000,00
					INVESTIMENTO 1.010.019,00

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:
Adiantada	mai-26 25,16%

Medição nº:	3	Saldo a Reprogramar:	Repasse (R\$) 231.339,51	Contrapartida (R\$) 0,00
-------------	---	----------------------	-----------------------------	-----------------------------

Acumulado Anterior: 49,61%

Acumulado Anterior: 49,61%								Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.	
Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Acum. Período Anterior	No Período		Acum. incluindo o Período
	TOTAL					Repasse CP. Financ. Outros		728.679,49 50.000,00 0,00	361.471,78 24.803,21 0,00	311.677,45 21.386,45 0,00	673.149,23 46.189,66 0,00	92,38%
						Investimento		778.679,49	386.274,99	333.063,90	719.338,89	
1	Meta 1.	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA	Licitado / Em Execução	3.729,38	m²	CONTRATO Nº 2.08.001/2025	3	778.679,49	386.274,99	333.063,90	719.338,89	92,38%
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-

Local: Campina Grande-PB

Data: 11 de maio de 2026

Responsável Técnico

Nome: BRENO WESLEY BARBOSA DE SOUZA
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL - FISCAL DO CONTRATO
ART/RRT Fiscal.: PB20210383709

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: JOAB KLEBER LUCENA MACHADO
Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
