

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

MEDIÇÃO 09

(11/05/26 a 10/07/26)

OBRA: Parque Estação Nova

Sumário

01. SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES	3
02. ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA	4
03. TERRAPLANAGEM	5
04. GAL 01	6
05. GAL 02	14
06. GAL 03	19
07. GAL 04	25

01. SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINÁRES



-REMOÇÃO DE TRILHOS EM VIAS (INCLUSO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE)

02. ADIMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS



-LOCAÇÃO DE CONTEINER ESCRITÓRIO



-LOCAÇÃO DE CONTEINER ALMOXARIFADO

03. TERRAPLANAGEM




-LOCAL DO DESMONTE DE ROCHA DE 3ª CATEGORIA

04. GAL 01



Quantitativo Aditivo	Descrição	Comprimento	Altura	Faces	Total:	m²
Área	FACE 1	91,03	7,48	1,00	680,90	m²
	FACE 2	8,30	7,48	1,00	62,08	m²
	TOTAL:				742,99	m²



- ANDAIME FACHADEIRO
- MONTAGEM E DESMONTAGEM
- LOCAÇÃO DE ANDAIME



-REMOÇÃO DE TESOURAS

Tabela de Perfis Metálicos (Vigas e Terças)	Tipo:	Comprimento total (m)	Pintura (m ² /m)	Área de Pintura:	Unidade
	C 200x75x25x2.66	1.031,54	0,578	596,23	m ²
	L50,8x50,8x3,2	629,53	0,1894	119,23	m ²
	L101.6X101.6X9.53	0,69	0,381	0,26	m ²
	U75x38x2,00	11,69	0,302	3,53	m ²
	W150X13	27,08	0,73	19,77	m ²
	W250X32.7	191,04	1,13	215,88	m ²
	W250X38.5	33,65	1,14	38,36	m ²
	TOTAL:			993,26	m²

Tabela de Placas	Espessura:	Comprimento Total (m)	Pintura (m ² /m)	Área de Pintura:	Unidade
	5			0	m ²
	8			6	m ²
	10			282	m ²
	11			6	m ²
	12			2	m ²
	TOTAL:			296,00	m²

Tabela de Perfis Metálicos (Pilares)	Tipo:	Comprimento Total (m)	Pintura (m ² /m)	Área de Pintura:	Unidade
	W150x22,5	127,28	0,95	120,92	m ²
	TOTAL:			120,92	m²

-PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)

Tabela de Perfis Metálicos (Vigas e Terças)	Tipo:	Comprimento total (m)	Pintura (m²/m)	Área de Pintura:	Unidade
	C 200x75x25x2.66	1.031,54	0,578	596,23	m²
	L50,8x50,8x3,2	629,53	0,1894	119,23	m²
	L101.6X101.6X9.53	0,69	0,381	0,26	m²
	U75x38x2,00	11,69	0,302	3,53	m²
	W150X13	27,08	0,73	19,77	m²
	W250X32.7	191,04	1,13	215,88	m²
	W250X38.5	33,65	1,14	38,36	m²
TOTAL:				993,26	m²

Tabela de Placas	Espessura:	Comprimento Total (m)	Pintura (m²/m)	Área de Pintura:	Unidade
	5			0	m²
	8			6	m²
	10			282	m²
	11			6	m²
	12			2	m²
TOTAL:				296,00	m²


Tabela de Perfis Metálicos (Pilares)	Tipo:	Comprimento Total (m)	Pintura (m²/m)	Área de Pintura:	Unidade
	W150x22,5	127,28	0,95	120,92	m²
TOTAL:				120,92	m²

Item - 16.5.1.12									
Quantitativo Pintura (Lado Externo)	TELHA	Descrição:	Comprimento:		Largura:		Repetições:	Área:	Un
		Lado A	80,88	X	8,34	X	1	674,54	m²
		Lado B	80,88	X	6,44	X	1	520,87	m²
	Cumeeira	Cobertura	80,88	X	1	X	1	80,88	m²
	Rufo	Lateral A (Leste e Oeste)	8,34	X	1	X	2	16,68	m²
		Lateral B (Leste e Oeste)	6,44	X	1	X	2	12,88	m²
							TOTAL:	1.305,85	m²

-PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO)



-CUMEEIRA TERMOACUSTICA

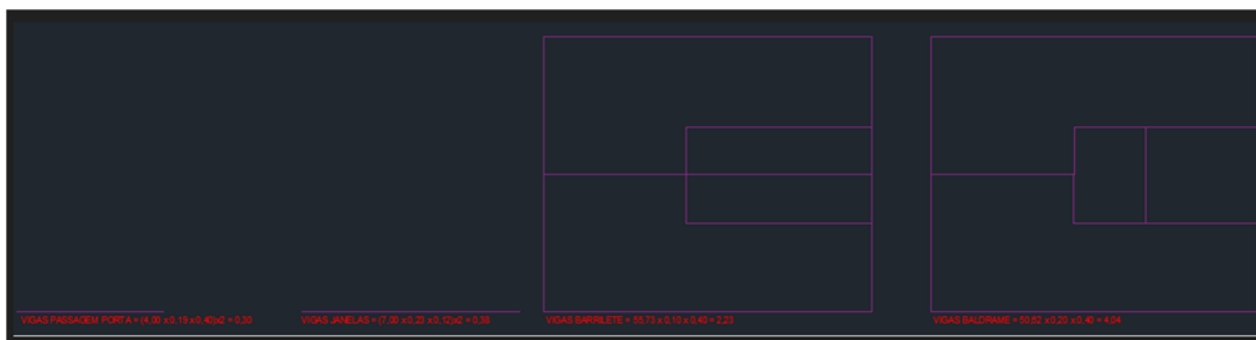


-EXECUÇÃO DE VIGAS



-EXECUÇÃO DE LAJE TRELIÇADA



-BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL

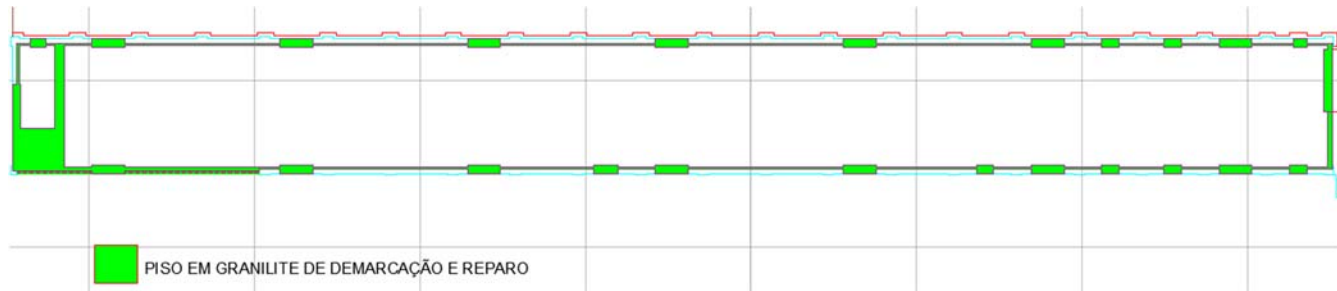

$$A1 = ((J1+J2+J3) \times 0,50) \times 0,07 = ((1,04+0,80+0,95) \times 0,50) = 1,19\text{m}^2$$

$$A2 = P3 \times 0,50 = 3,42 \times 0,50 = 1,71\text{m}^2$$

$$A3 = (P1 \times 0,50) \times 15 = (1,96 \times 0,50) \times 15 = 14,7\text{m}^2$$


$$A4 = (2,90 \times 2,45) + (0,60 \times 4,80) = 7,10 + 2,88 = 9,98\text{m}^2$$

$$A5 = \text{Perímetro} - \text{Portas} - \text{Janelas} \times 0,15 = 137,87 \times 0,15 = 20,68\text{m}^2$$

$$\text{TOTAL} = 54,26\text{m}^2$$


-PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS



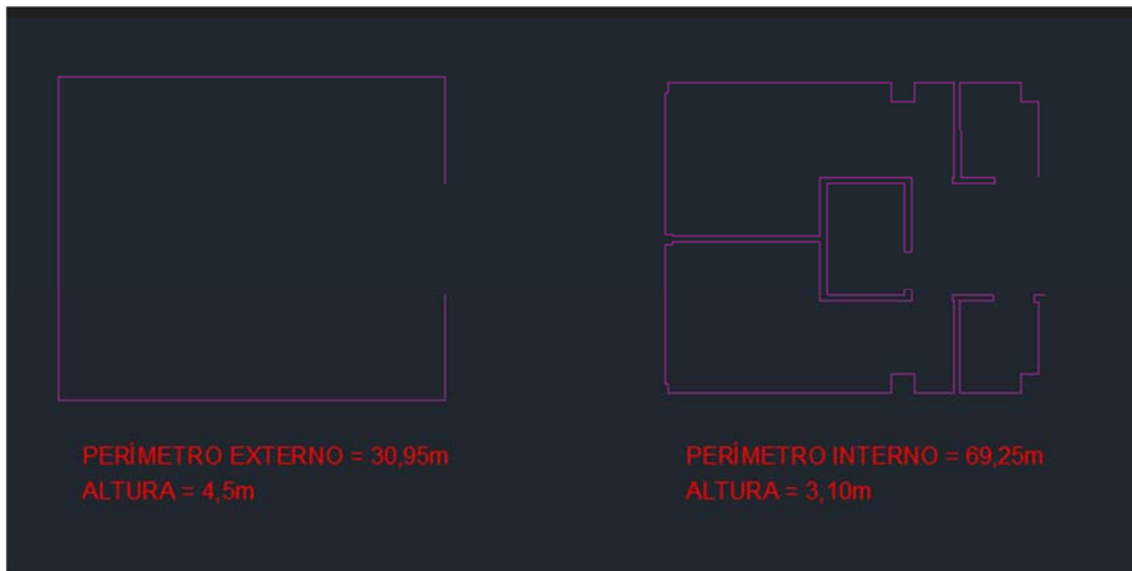

-EMBOÇO



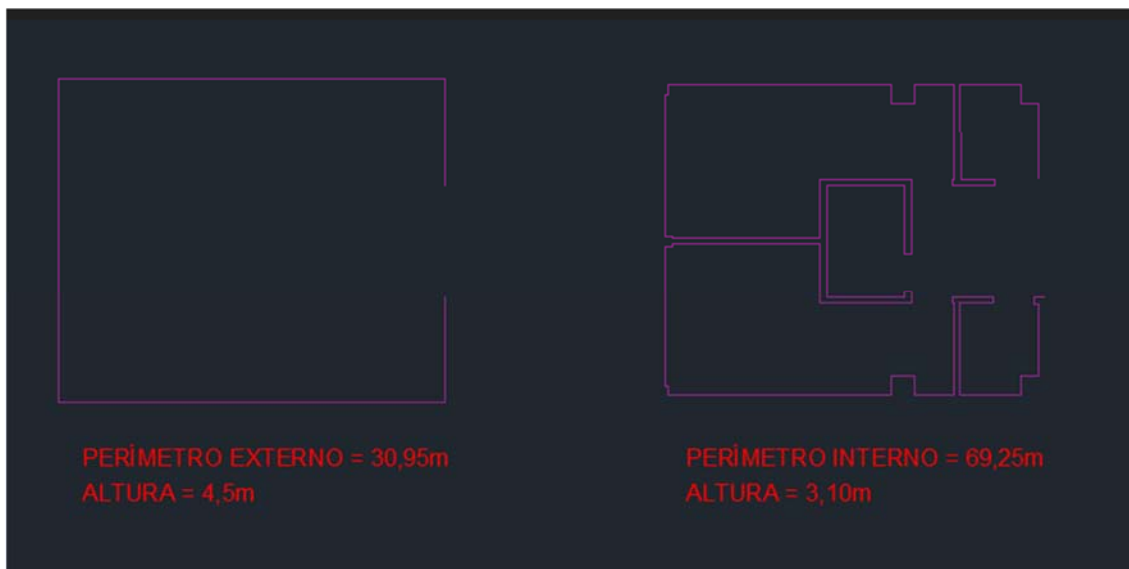

-REBOCO



Corte CC: (Altura das paredes)



-REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DETERIORADO

05. GAL 02



-ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS



-REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DETERIORADO



-RODAPÉ CERÂMICO



-REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE




-SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0




-PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS.

		Desc.	Medida 1 (m)	medida 2. (m)	Área (m²)
Quantitativo Aditivo 17.8.2.4	Área de Coberta	Área 01	1,96	1,68	3,2928
		Perímetro 01	7,24	0,4	2,896
		Área 02	1,96	2,07	4,0572
		Perímetro 02	8,06	0,4	3,224
		TOTAL:			13,47

Quantitativo Contrato 0 m²

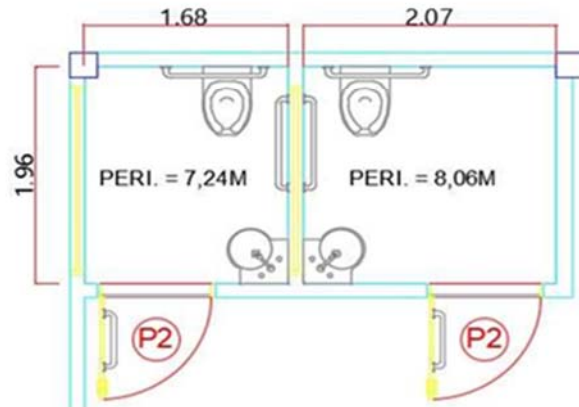

-IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA

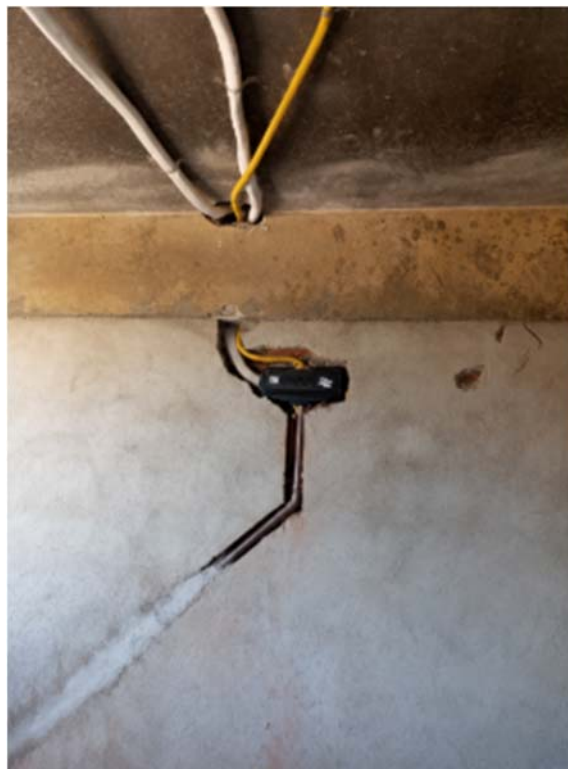

-EXECUÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO


06. GAL 03



-LOCAÇÃO DE ANDAIME



Quantitativo Aditivo	Revestimento Cerâmico de Parede	REVESTIMENTO CERÂMICO			
		PERÍMETRO x ALTURA			
		WC PCD = 7,19x1,80=	12,942	m²	= 12,942
		WC MASC = 7,72x1,80=	13,896	m²	= 13,896
		WC FEM. = 7,72x1,80=	13,896	m²	= 13,896
		PARED. LAV. EXT = 2,19x1,80=	3,942	m²	= 3,942
		COZINHA CAFÉ = 18,03x1,50=	27,045	m²	= 27,045
		DML = 9,16x1,50=	13,74	m²	= 13,74
		DESCOMPRESSÃO = 2,22x1,50=	3,33	m²	= 3,33
		TOTAL:		88,791	

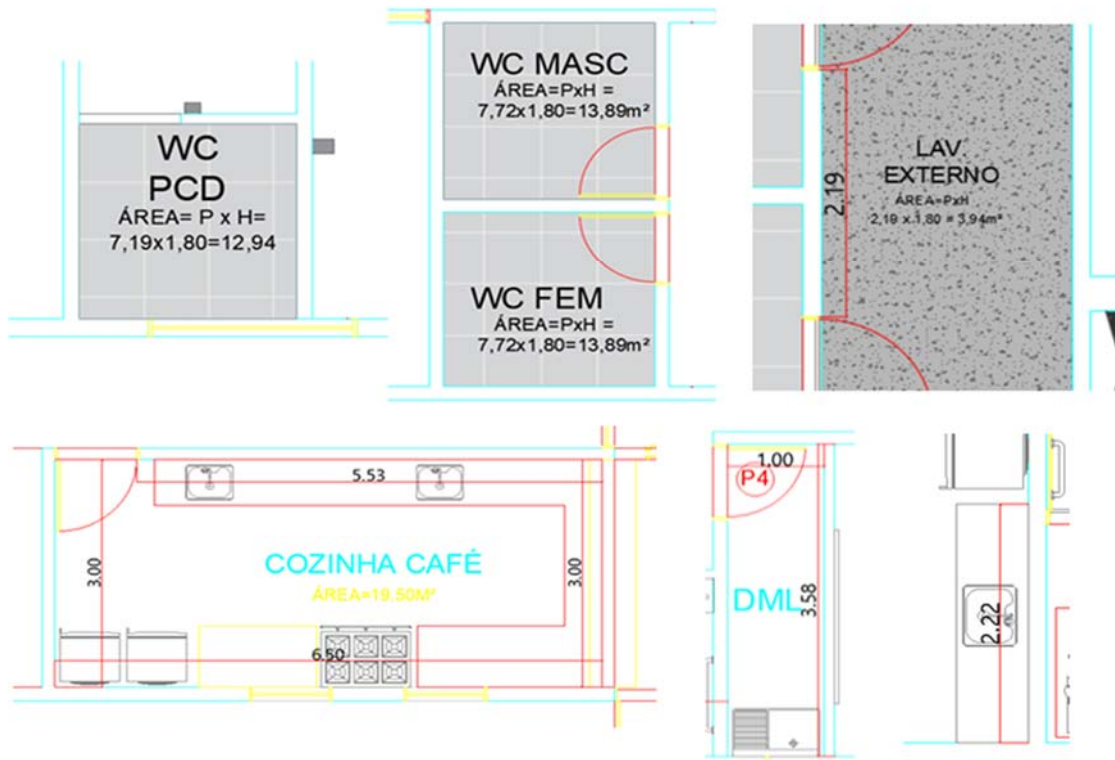


-CERÂMICA DE PAREDE




Quantitativo Aditivo	Contrapiso	ÁREA DE CONTRAPISO			
		A01 = 7,08x9,77	69,172	m²	= 69,1716
		A02 = 6,48x10,02	64,93	m²	= 64,9296
		A03 = 6,65x10,02	66,633	m²	= 66,633
				TOTAL:	200,7342

Quantitativo Contrato 0 m²

Contrapiso

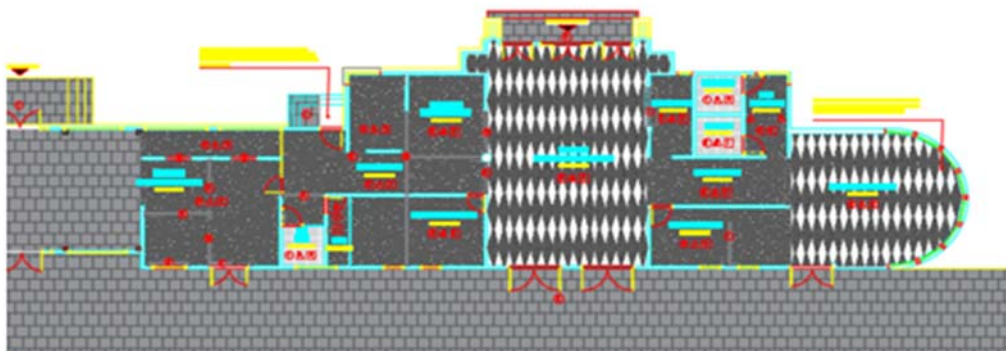

-CONTRAPISO

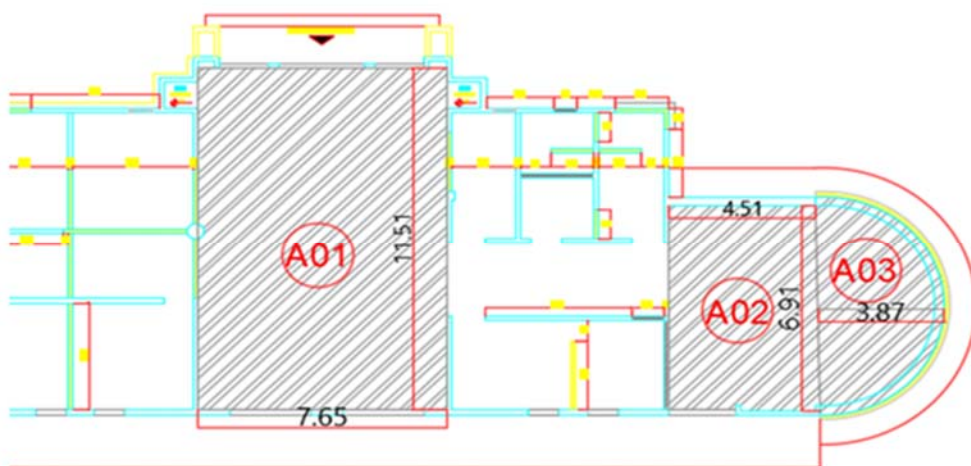


-POLIMENTO DE PISO



○ Quantitativos:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

-REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DETERIORADO

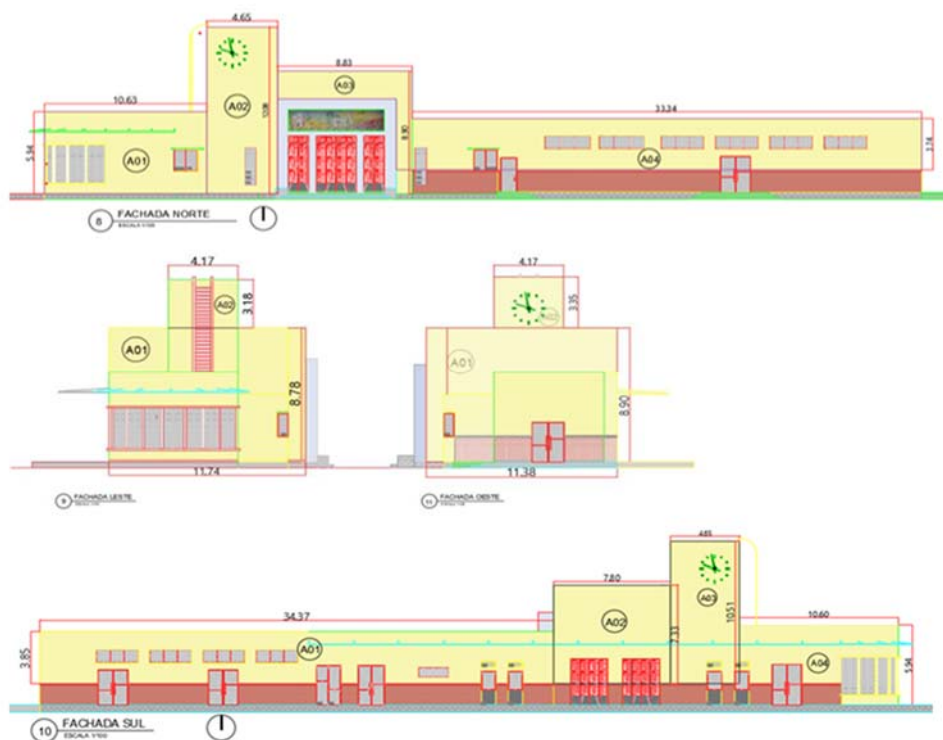

Quantitativo PINTURA FACHADA (EXTERNA)	Descrição	Total:	m²
	FACHADA NORTE		
	A01+A02+A03+A04 - PORTAS E JANELAS (5,94x10,63)+(4,65x12,08)+(8,83x8,90)+(33,34x3,74)-82	240,59	m²
	FACHADA LESTE		
	A01 + A02 - PORTAS E JANELAS (11,74x8,78)+(4,17x3,18)-21	95,34	m²
	FACHADA OESTE		
	A01 + A02 - PORTAS, JANELAS E REV. (11,38x8,90)+(3,35x4,17)-22	93,25	m²
	FACHADA SUL		
	A01+A02+A03+A04 - PORTAS E JANELAS (34,37x3,85)+(7,80x7,33)+(4,65x10,51)+(10,60x5,94)-40	261,33	m²
TOTAL:		690,52	m²

-REMOÇÃO DE ORNATOS

07. GAL 04



-ANDAIME FACHADEIRO

-MONTAGEM E DESMONTAGEM



-REMOÇÃO DE TESSOURAS



-BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL



-PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO



-LAVAGEM DE PAREDE COM CLORO LIQUIDO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 9.08.01/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 363/2025

Período de Medição: 11/05/2026 à 10/07/2026

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DO PÁTIO FERROVIÁRIO DA ESTAÇÃO NOVA, REVITALIZAÇÃO DE VIAS EM SEU ENTORNO, REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CINCO EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS, PARQUE, QUADRAS POLIESPORTIVAS, FONTE ORNAMENTAL E ÁREAS DE CONVIVÊNCIA E LAZER, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.

BM Nº: 9



VALOR DO CONTRATO: R\$ 44.727.122,80

Data: 10/07/2026

Valor Total Medido		
Acumulado Anterior	Executado no Período	Acumulado no Período
R\$ 5.944.685,20	R\$ 969.269,96	R\$ 6.913.955,16

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT COM BDI	TOTAL	PESO (%)	Quantidade Executada				Valor Total Medido		
									Acumulada Anterior	Executado no Período	Acumulada no Período	% Acumulado no Período	Acumulada Anterior	Executada no Período	Acumulada no Período
1			SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES				255.845,37	3,666%							
1.1			DETALHAMENTO PROJETO DE ENGENHARIA				0,00	0,000%							
1.2			AS BUILT				0,00	0,000%							
1.3			ESTRUTURA DE PROTEÇÃO E ISOLAMENTO DAS OBRAS				0,00	0,000%							
1.4			REMOÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS				255.845,37	3,666%							
1.4.4	COMP.081	Próprio	REMOÇÃO DE TRILHOS EM VIAS (INCLUSO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE)	M	6.318,73	40,49	255.845,37	3,666%	3.625,28	2.693,45	6.318,73	100,00%	R\$ 146.787,58	R\$ 109.057,79	R\$ 255.845,37
1.5			LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS GALERIAS				0,00	0,000%							
1.6			LIMPEZA DE TERRENOS				0,00	0,000%							
1.7			DEMOLIÇÕES				0,00	0,000%							
1.8			CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA				0,00	0,000%							
1.9			INTERVENÇÕES ELÉTRICAS - REALOCAÇÃO DE POSTES				0,00	0,000%							
2			ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS				5.060.932,32	72,515%							
2.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL				4.917.819,36	70,464%							
2.1.1	COMP.003	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	24,00	204.909,14	4.917.819,36	70,464%	4,46	0,54	5,00	20,85%	R\$ 913.868,05	R\$ 111.634,49	R\$ 1.025.502,54
2.2			CANTEIRO DE OBRAS				143.112,96	2,051%							
2.2.6	4654	ORSE	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - REV 02_02/2022	mês	96,00	993,84	95.408,64	1,367%	12,00	3,00	15,00	15,63%	R\$ 11.926,08	R\$ 2.981,52	R\$ 14.907,60
2.2.7	4657	ORSE	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40M - REV 02_02/2022	mês	24,00	1.987,68	47.704,32	0,684%	2,00	1,00	3,00	12,50%	R\$ 3.975,36	R\$ 1.987,68	R\$ 5.963,04
3			SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM				172.692,93	2,474%							
3.1			SERVIÇOS INICIAIS				0,00	0,000%							
3.2			ESCOVAÇÃO (VOLUME DE CORTE)				172.692,93	2,474%							
3.2.3	102355	SINAPI	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), EM VALA - COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	m²	876,97	196,92	172.692,93	2,474%	1,75	23,93	25,68	2,93%	R\$ 344,61	R\$ 4.712,88	R\$ 5.057,49
3.3			CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA				0,00	0,000%							
3.4			ATERROS				0,00	0,000%							
4			DRENAGEM				0,00	0,000%							
4.1			DRENOS SUB-SUPERFICIAL				0,00	0,000%							
4.2			MOVIMENTAÇÃO DE SOLO				0,00	0,000%							
4.3			NIVELAMENTO DE VALAS				0,00	0,000%							
4.4			ESCORAMENTO EM VALAS				0,00	0,000%							
4.5			ESGOTAMENTO				0,00	0,000%							
4.6			DRENOS SUB-SUPERFICIAL				0,00	0,000%							
4.7			GALERIA CIRCULAR - TUBO PEAD				0,00	0,000%							
4.8			GALERIA RETANGULAR EM CONCRETO ARMADO - MOLDADO IN LOCO				0,00	0,000%							
4.9			CAIXAS E POÇOS				0,00	0,000%							
4.10			RECUPERAÇÃO TAMPA DO CANAL EXISTENTE				0,00	0,000%							
5			PISOS E PAVIMENTAÇÃO				0,00	0,000%							
5.1			PAVIMENTO TIPO 1				0,00	0,000%							
5.2			PAVIMENTO TIPO 2				0,00	0,000%							
5.3			PAVIMENTO TIPO 3				0,00	0,000%							
5.4			PAVIMENTO TIPO 4				0,00	0,000%							
5.5			PAVIMENTO TIPO 5				0,00	0,000%							
5.6			PAVIMENTO TIPO 6				0,00	0,000%							
5.7			RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS				0,00	0,000%							

6		URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO				0,00	0,000%							
6.1		MOBILIÁRIO URBANO				0,00	0,000%							
6.2		EQUIPAMENTOS PLAYGROUND				0,00	0,000%							
6.3		EQUIPAMENTOS ACADEMIA				0,00	0,000%							
6.4		PAISAGISMO				0,00	0,000%							
6.5		DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO				0,00	0,000%							
7		ESTRUTURAL				0,00	0,000%							
8		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PARQUE				0,00	0,000%							
8.1		SISTEMA DE ESGOTAMENTO PARQUE				0,00	0,000%							
8.2		SISTEMA DE ABASTECIMENTO PARQUE				0,00	0,000%							
8.3		SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS				0,00	0,000%							
9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARQUE				0,00	0,000%							
9.1		ILUMINAÇÃO PÚBLICA				0,00	0,000%							
9.1.1		INFRAESTRUTURA				0,00	0,000%							
9.1.2		INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA (CABOS E DERIVAÇÕES)				0,00	0,000%							
9.1.3		IMPLANTAÇÃO DE POSTE DE 5 METROS DE ALTURA COM DUAS LUMINÁRIAS				0,00	0,000%							
9.1.4		IMPLANTAÇÃO DE POSTE DE 10 METROS DE ALTURA COM DUAS LUMINÁRIAS				0,00	0,000%							
9.1.5		IMPLANTAÇÃO DE POSTE DE 10 METROS DE ALTURA COM UMA LUMINÁRIA				0,00	0,000%							
9.1.6		ILUMINAÇÃO DAS QUADRAS				0,00	0,000%							
9.1.7		MEDIÇÃO E ATERRAMENTO				0,00	0,000%							
9.1.7.1		ATERRAMENTO				0,00	0,000%							
9.1.7.2		MEDIÇÃO TRIFÁSICA				0,00	0,000%							
9.1.7.3		MEDIÇÃO MONOFÁSICA				0,00	0,000%							
10		CFTV E LÓGICA PARQUE				0,00	0,000%							
10.1		CFTV				0,00	0,000%							
10.2		LÓGICA				0,00	0,000%							
10.3		MÃO DE OBRA				0,00	0,000%							
11		IRRIGAÇÃO PARQUE				0,00	0,000%							
11.1		SISTEMA DE ASPERSÃO				0,00	0,000%							
11.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AUTOMAÇÃO				0,00	0,000%							
11.3		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				0,00	0,000%							
11.4		POÇO ARTESIANO				0,00	0,000%							
12		QUADRA POLIESPORTIVA				0,00	0,000%							
12.1		QUADRA DE FUTSAL E BASQUETE				0,00	0,000%							
12.2		ARQUIBANCADA				0,00	0,000%							
12.3		QUADRA DE AREIA				0,00	0,000%							
13		FONTE INTERATIVA E QUEDAS D'ÁGUA COM ILUMINAÇÃO SINCRONIZADA				0,00	0,000%							
13.1		MOVIMENTAÇÃO DE SOLO				0,00	0,000%							
13.2		ESTRUTURA DA FONTE				0,00	0,000%							
13.3		REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO DA FONTE				0,00	0,000%							
13.4		OBRAS CIVIS SISTEMA DE TRATAMENTO				0,00	0,000%							
13.5		SISTEMA ELETROMECÂNICO COM BOMBEAMENTO E ILUMINAÇÃO AUTOMATIZADOS E SINCRONIZADOS				0,00	0,000%							
13.6		SISTEMA DE TRATAMENTO FONTE INTERATIVA				0,00	0,000%							
13.7		SISTEMA DE TRATAMENTO FONTE E QUEDAS D'ÁGUA				0,00	0,000%							
13.8		OUTROS SERVIÇOS				0,00	0,000%							
13.9		LIMPEZA DO TERRENO				0,00	0,000%							
14		REVITALIZAÇÃO BALAUSTRADA E MURO DE CONTENÇÃO				0,00	0,000%							
14.1		MOVIMENTAÇÃO DE SOLO				0,00	0,000%							
14.2		MURO DE ARRIMO				0,00	0,000%							
14.3		RESTAURAÇÃO MURO DE CONTENÇÃO E BALAUSTRADA				0,00	0,000%							
15		SINALIZAÇÃO				0,00	0,000%							
15.1		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				0,00	0,000%							
15.2		SINALIZAÇÃO VERTICAL				0,00	0,000%							

16				GAL-01 (ESTAÇÃO GASTRONÔMICA)														
16.1				SERVIÇOS TÉCNICOS														
16.1.2	00041805	SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANÇIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M	MES	14,00	710,74	9.950,36	0,143%	4,00	1,00	5,00	35,71%	R\$	2.842,96	R\$	710,74	R\$	3.553,70
16.1.3	13311	ORSE	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto montagem, desmontagem e tela	m²xmês	1.485,98	38,73	57.554,76	0,825%	0,00	371,49	371,49	25,00%	R\$	-	R\$	14.388,49	R\$	14.388,49
16.1.4	97063	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	m²	1.485,98	17,69	26.287,44	0,377%	0,00	371,49	371,49	25,00%	R\$	-	R\$	6.571,77	R\$	6.571,77
16.2			SERVIÇOS PRELIMINARES				4.113,47	0,059%										
16.2.5	97651	SINAPI	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	44,00	93,49	4.113,47	0,059%	0,00	44,00	44,00	100,00%	R\$	-	R\$	4.113,47	R\$	4.113,47
16.3			MOVIMENTAÇÃO DE SOLO				0,00	0,000%										
16.3.1			ESCAVAÇÃO (VOLUME DE CORTE)				0,00	0,000%										
16.3.2			ATERRO, REATERRO, LASTRO, ESPALHAMENTO E NIVELAMENTO				0,00	0,000%										
16.3.3			CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA				0,00	0,000%										
16.4			ESGOTAMENTO				0,00	0,000%										
16.5			FUNDAÇÃO E ESTRUTURA				394.386,06	5,651%										
16.5.1			ESTRUTURA METÁLICA				233.223,83	3,342%										
16.5.1.11	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	1.818,09	27,35	49.724,76	0,712%	0,00	1.410,18	1.410,18	77,56%	R\$	-	R\$	38.568,42	R\$	38.568,42
16.5.1.12	100757	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m²	3.123,94	53,99	168.661,52	2,417%	0,00	2.686,47	2.686,47	86,00%	R\$	-	R\$	145.042,51	R\$	145.042,51
16.5.1.13	9077	ORSE	Cumeeira termoacústica	m	80,88	183,45	14.837,55	0,213%	0,00	80,88	80,88	100,00%	R\$	-	R\$	14.837,55	R\$	14.837,55
16.5.2			ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO				169.043,07	2,422%										
16.5.2.3	COMP.120	Próprio	EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA VIGAS EM CONCRETO ARMADO DO GALPÃO 1 , INCLUSO FORMAS E ARMADURAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m³	39,58	4.071,81	161.162,23	2,309%	23,94	6,95	30,89	78,04%	R\$	97.479,13	R\$	28.299,07	R\$	125.778,20
16.5.2.6	4254	ORSE	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM BLOCO CERÂMICO H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.	m²	30,66	257,04	7.880,84	0,113%	0,00	18,20	18,20	59,36%	R\$	-	R\$	4.678,12	R\$	4.678,12
16.6			INSTALAÇÕES PREDIAIS				0,00	0,000%										
16.6.1			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PARA ÁGUA FRIA				0,00	0,000%										
16.6.2			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO				0,00	0,000%										
16.7			FECHAMENTO				0,00	0,000%										
16.7.1			ALVENARIAS				0,00	0,000%										
16.7.2			ESQUADRIAS E FERRAGENS				0,00	0,000%										
16.7.3			COMPLEMENTOS ARQUITETÔNICOS E DIVISÓRIAS				0,00	0,000%										
16.7.4			DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO				0,00	0,000%										
16.8			REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES				316.655,49	4,537%										
16.8.1			PISOS, FORROS E PAREDES				316.655,49	4,537%										
16.8.1.2	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	561,58	112,63	63.250,75	0,906%	220,06	54,26	274,32	48,85%	R\$	24.785,35	R\$	6.111,30	R\$	30.896,65
16.8.1.5	87535	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	2.626,88	37,75	99.164,72	1,421%	955,94	353,94	1.309,88	49,86%	R\$	36.086,73	R\$	13.361,23	R\$	49.447,96
16.8.1.6	3317	ORSE	REBOCO ESPECIAL DE PAREDE 2CM COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA)	m²	2.626,88	42,90	112.693,15	1,615%	220,08	353,94	574,02	21,85%	R\$	9.441,42	R\$	15.184,02	R\$	24.625,44
16.8.1.7	4516	ORSE	Restauro - Remoção de revestimento deteriorado	m²	626,36	31,45	19.700,01	0,282%	0,00	626,36	626,36	100,00%	R\$	-	R\$	19.700,01	R\$	19.700,01
16.8.1.11	26	ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m³	43,85	20,99	920,56	0,013%	0,00	43,85	43,85	100,00%	R\$	-	R\$	920,56	R\$	920,56
16.8.1.13	87737	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M²	384,88	54,37	20.926,30	0,300%	0,00	70,91	70,91	18,42%	R\$	-	R\$	3.855,44	R\$	3.855,44

16.8.2		IMPERMEABILIZAÇÃO				0,00	0,000%							
16.8.3		PINTURA				0,00	0,000%							
16.9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				0,00	0,000%							
16.9.1		ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS				0,00	0,000%							
16.9.2		ATERRAMENTO				0,00	0,000%							
16.9.3		CABO UNIPOLAR (COBRE)				0,00	0,000%							
16.9.4		CAIXA DE PASSAGEM (EMBITIR)				0,00	0,000%							
16.9.5		CONDUTORES DE PROTEÇÃO (SPDA)				0,00	0,000%							
16.9.6		DISPOSITIVOS ELÉTRICOS (EMBITIDO)				0,00	0,000%							
16.9.7		DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO				0,00	0,000%							
16.9.8		ELETROCALHA FURADA				0,00	0,000%							
16.9.9		ELETRODUTOS				0,00	0,000%							
16.9.10		LAMPADAS				0,00	0,000%							
16.9.11		QUADROS				0,00	0,000%							
16.10		COMBATE A INCÊNDIO E SPDA				0,00	0,000%							
16.10.1		COMBATE A INCÊNDIO				0,00	0,000%							
16.11		CFTV E LÓGICA				0,00	0,000%							
16.11.1		SERVIÇO DE INSTALAÇÃO				0,00	0,000%							
16.11.2		CFTV E SEGURANÇA				0,00	0,000%							
16.11.3		ACESSÓRIOS CABEAMENTO METÁLICO				0,00	0,000%							
16.11.4		ACESSÓRIOS CABEAMENTO RACK				0,00	0,000%							
16.11.5		ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS				0,00	0,000%							
16.11.6		ACESSÓRIOS USO GERAL				0,00	0,000%							
16.11.7		CABEAMENTO ESTRUTURADO - METÁLICO				0,00	0,000%							
16.11.8		CABOS TELEFÔNICOS				0,00	0,000%							
16.11.9		CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR				0,00	0,000%							
16.11.10		CANAleta PVC				0,00	0,000%							
16.11.11		DISPOSITIVO DE CABEAMENTO EMBUTIR				0,00	0,000%							
16.11.12		ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL				0,00	0,000%							
16.11.13		ELETRODUTO PVC ROSCA				0,00	0,000%							
16.11.14		RACK				0,00	0,000%							

17			GAL-02 (ESTAÇÃO CIDADANIA)				164.152,79	2,352%										
17.1			SERVIÇOS TÉCNICOS				0,00	0,000%										
17.1.1			LOCAÇÃO E CADASTRO				0,00	0,000%										
17.2			SERVIÇOS PRELIMINARES				0,00	0,000%										
17.2.1			SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA				0,00	0,000%										
17.2.2			DEMOLIÇÃO				0,00	0,000%										
17.3			MOVIMENTAÇÃO DE SOLO				0,00	0,000%										
17.3.1			ESCOVAÇÃO (VOLUME DE CORTE)				0,00	0,000%										
17.3.2			ATERRO, REATERRO, LASTRO, ESPALHAMENTO E NIVELAMENTO				0,00	0,000%										
17.3.3			CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA				0,00	0,000%										
17.4			ESGOTAMENTO				0,00	0,000%										
17.4.1			ESGOTAMENTO COM BOMBAS				0,00	0,000%										
17.5			FUNDAÇÃO E ESTRUTURA				0,00	0,000%										
17.5.1			ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO				0,00	0,000%										
17.5.2			ESTRUTURA EM CONCRETO PRE MOLDADO				0,00	0,000%										
17.5.3			ESTRUTURA METALICA				0,00	0,000%										
17.6			INSTALAÇÕES PREDIAIS				0,00	0,000%										
17.6.1			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PARA ÁGUA FRIA				0,00	0,000%										
17.6.2			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO				0,00	0,000%										
17.7			FECHAMENTO				32.849,00	0,471%										
17.7.1			ALVENARIAS				32.849,00	0,471%										
17.7.1.1	103334	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	198,88	165,17	32.849,00	0,471%	183,90	1,27	185,17	93,11%	R\$	30.374,75	R\$	209,76	R\$	30.584,51
17.7.2			ESQUADRIAS E FERRANGENS				0,00	0,000%										
17.7.3			COMPLEMENTOS ARQUITETÔNICOS E DIVISÓRIAS				0,00	0,000%										
17.7.4			DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO				0,00	0,000%										
17.8			REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES				103.512,65	1,483%										
17.8.1			PISOS, FORROS E PAREDES				102.988,08	1,476%										
17.8.1.4	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	397,76	5,08	2.020,62	0,029%	308,95	2,55	311,50	78,31%	R\$	1.569,45	R\$	12,95	R\$	1.582,40
17.8.1.5	87535	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	397,76	37,75	15.015,44	0,215%	351,94	2,55	354,49	89,12%	R\$	13.285,72	R\$	96,26	R\$	13.381,98
17.8.1.6	3317	ORSE	REBOCO ESPECIAL DE PAREDE 2CM COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA)	m²	958,02	42,90	41.099,05	0,589%	582,26	2,55	584,81	61,04%	R\$	24.978,94	R\$	109,39	R\$	25.088,33
17.8.1.8	4516	ORSE	Restauro - Remoção de revestimento deteriorado	m²	101,25	31,45	3.184,47	0,046%	0,00	101,25	101,25	100,00%	R\$	-	R\$	3.184,47	R\$	3.184,47
17.8.1.13	87737	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	m²	422,19	54,37	22.954,88	0,329%	0,00	422,19	422,19	100,00%	R\$	-	R\$	22.954,88	R\$	22.954,88
17.8.1.14	88650	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	m	257,58	15,58	4.013,44	0,058%	0,00	231,82	231,82	90,00%	R\$	-	R\$	3.612,06	R\$	3.612,06
17.8.1.15	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	m	3,60	115,12	414,42	0,006%	0,00	3,60	3,60	100,00%	R\$	-	R\$	414,42	R\$	414,42
17.8.1.16	98671	SINAPI	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m²	4,34	443,39	1.924,33	0,028%	0,00	4,34	3,91	90,00%	R\$	-	R\$	1.924,33	R\$	1.924,33
17.8.1.18	3315	ORSE	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço 16 - 1:2:10 (cimento /cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	50,96	42,63201	2.172,52	0,031%	0,00	50,96	50,96	100,00%	R\$	-	R\$	2.172,52	R\$	2.172,52
17.8.1.19	104612	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023. PE	m²	82,86	122,97	10.188,91	0,146%	0,00	82,86	82,86	100,00%	R\$	-	R\$	10.188,91	R\$	10.188,91

17.8.2			IMPERMEABILIZAÇÃO				524,57	0,008%								
17.8.2.4	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	13,47	38,94	524,57	0,008%	0,00	13,47	13,47	100,00%	R\$	-	R\$ 524,57	R\$ 524,57
17.8.3			PINTURA				0,00	0,000%								
17.9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				0,00	0,000%								
17.9.1			ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS				0,00	0,000%								
17.9.2			ATERRAMENTO				0,00	0,000%								
17.9.3			CABO UNIPOLAR (COBRE)				0,00	0,000%								
17.9.4			CAIXA DE PASSAGEM (EMBUTIR)				0,00	0,000%								
17.9.5			CONDUTORES DE PROTEÇÃO (SPDA)				0,00	0,000%								
17.9.6			DISPOSITIVOS ELÉTRICOS (EMBUTIDO)				0,00	0,000%								
17.9.7			DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO				0,00	0,000%								
17.9.8			ELETRODUTOS				0,00	0,000%								
17.9.9			LAMPADAS				0,00	0,000%								
17.9.10			PONTO DE LUZ				0,00	0,000%								
17.9.11			QUADROS				0,00	0,000%								
17.10			COMBATE A INCÊNDIO E SPDA				0,00	0,000%								
17.10.1			COMBATE A INCÊNDIO				0,00	0,000%								
17.11			CFTV E LÓGICA				0,00	0,000%								
17.11.1			SERVIÇO DE INSTALAÇÃO				0,00	0,000%								
17.11.2			CFTV E SEGURANÇA				0,00	0,000%								
17.11.3			ACESSÓRIOS CABEAMENTO METÁLICO				0,00	0,000%								
17.11.4			ACESSÓRIOS CABEAMENTO RACK				0,00	0,000%								
17.11.5			ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS				0,00	0,000%								
17.11.6			ACESSÓRIOS USO GERAL				0,00	0,000%								
17.11.7			CABEAMENTO ESTRUTURADO - METÁLICO				0,00	0,000%								
17.11.8			CABOS TELEFÔNICOS				0,00	0,000%								
17.11.9			CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR E SOBREPOR				0,00	0,000%								
17.11.10			DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO				0,00	0,000%								
17.11.11			DISPOSITIVO DE CABEAMENTO EMBUTIR				0,00	0,000%								
17.11.12			ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL				0,00	0,000%								
17.11.13			ELETRODUTO PVC ROSCA				0,00	0,000%								
17.11.14			RACK				0,00	0,000%								
17.12			CLIMATIZAÇÃO				27.791,14	0,398%								
17.12.1	11779	ORSE	Tubulação em cobre Ø 3/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm, multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vvv) - fornecimento e instalação	m	94,00	228,47	21.476,34	0,00	0,00	94,00	94,00	100,00%	R\$	-	R\$ 21.476,34	R\$ 21.476,34
17.12.2	103289	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	m	94,00	35,65	3.351,12	0,00	0,00	94,00	94,00	100,00%	R\$	-	R\$ 3.351,12	R\$ 3.351,12
17.12.3	11679	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	m	94,00	13,94	1.310,75	0,00	0,00	94,00	94,00	100,00%	R\$	-	R\$ 1.310,75	R\$ 1.310,75
17.12.5	104315	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	94,00	17,58	1.652,93	0,00	0,00	94,00	94,00	100,00%	R\$	-	R\$ 1.652,93	R\$ 1.652,93

18			GAL-03 (ESTACÃO NOVA)				154.296,90	2,2122%										
18.1			SERVIÇOS TÉCNICOS				0,00	0,0000%										
18.1.1			LOCAÇÃO E CADASTRO				0,00	0,0000%										
18.2			SERVIÇOS PRELIMINARES				8.528,88	0,1222%										
18.2.1			SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA				8.528,88	0,1222%										
18.2.1.1	00041805	SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANÇIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M	MES	12,00	710,74	8.528,88	0,1222%	4,00	2,00	6,00	50,00%	R\$	2.842,96	R\$	1.421,48	R\$	4.264,44
18.2.2			DEMOLIÇÃO				0,00	0,0000%										
18.3			MOVIMENTAÇÃO DE SOLO				0,00	0,0000%										
18.3.1			ESCAVAÇÃO (VOLUME DE CORTE)				0,00	0,0000%										
18.3.2			ATERRO, REATERRO, LASTRO, ESPALHAMENTO E NIVELAMENTO				0,00	0,0000%										
18.3.3			CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA				0,00	0,0000%										
18.4			ESGOTAMENTO				0,00	0,0000%										
18.4.1			ESGOTAMENTO COM BOMBAS				0,00	0,0000%										
18.5			FUNDAÇÃO E ESTRUTURA				0,00	0,0000%										
18.5.1			ESTRUTURA METÁLICA				0,00	0,0000%										
18.5.2			ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO				0,00	0,0000%										
18.6			INSTALAÇÕES PREDIAIS				32.959,39	0,4722%										
18.6.1			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PARA ÁGUA FRIA				0,00	0,0000%										
18.6.2			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO				0,00	0,0000%										
18.6.3			INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS				32.959,39	0,4722%										
18.6.3.1	89518	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_ 06/2022	UN	9,00	18,19	163,71	0,0022%	0,00	8,00	8,00	88,89%	R\$	-	R\$	145,52	R\$	145,52
18.6.3.2	95695	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ 06/2022	UN	17,00	69,97	1.189,51	0,0177%	0,00	15,00	15,00	88,24%	R\$	-	R\$	1.049,57	R\$	1.049,57
18.6.3.3	89520	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_ 06/2022	UN	4,00	19,04	76,15	0,0011%	0,00	3,00	3,00	75,00%	R\$	-	R\$	57,11	R\$	57,11
18.6.3.4	89590	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ 06/2022	UN	8,00	157,17	1.257,36	0,0188%	0,00	7,00	7,00	87,50%	R\$	-	R\$	1.100,19	R\$	1.100,19
18.6.3.5	89591	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ 06/2022	UN	6,00	159,34	956,04	0,0149%	0,00	5,00	5,00	83,33%	R\$	-	R\$	796,70	R\$	796,70
18.6.3.6	89685	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ 06/2022	UN	2,00	71,03	142,06	0,0022%	0,00	1,00	1,00	50,00%	R\$	-	R\$	71,03	R\$	71,03
18.6.3.7	89531	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_ 06/2022	UN	28,00	46,13	1.291,64	0,0199%	0,00	25,00	25,00	89,29%	R\$	-	R\$	1.153,25	R\$	1.153,25
18.6.3.8	89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ 06/2022	UN	8,00	50,92	407,38	0,0066%	0,00	7,00	7,00	87,50%	R\$	-	R\$	356,46	R\$	356,46
18.6.3.9	89671	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ 06/2022	UN	70,00	52,11	3.647,55	0,0522%	0,00	60,00	60,00	85,71%	R\$	-	R\$	3.126,47	R\$	3.126,47
18.6.3.10	89698	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ 06/2022	UN	4,00	311,23	1.244,92	0,0188%	0,00	3,00	3,00	75,00%	R\$	-	R\$	933,69	R\$	933,69
18.6.3.11	89524	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_ 06/2022	UN	4,00	35,41	141,63	0,0022%	0,00	3,00	3,00	75,00%	R\$	-	R\$	106,22	R\$	106,22
18.6.3.12	89581	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ 06/2022	UN	2,00	39,13	78,25	0,0011%	0,00	2,00	2,00	100,00%	R\$	-	R\$	78,25	R\$	78,25
18.6.3.13	89580	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ 06/2022	M	132,00	79,96	10.554,44	0,1511%	0,00	120,00	120,00	90,91%	R\$	-	R\$	9.594,94	R\$	9.594,94
18.6.3.14	89578	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ 06/2022	M	120,00	38,60	4.631,64	0,0666%	0,00	110,00	110,00	91,67%	R\$	-	R\$	4.245,67	R\$	4.245,67
18.6.3.15	89576	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ 06/2022	M	36,00	31,16	1.121,85	0,0166%	0,00	32,00	32,00	88,89%	R\$	-	R\$	997,20	R\$	997,20
18.6.3.16	9385	ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 50mm	M	24,00	28,20	676,71	0,0106%	0,00	22,00	22,00	91,67%	R\$	-	R\$	620,32	R\$	620,32
18.6.3.17	89563	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_ 06/2022	UN	2,00	40,99	81,98	0,0011%	0,00	2,00	2,00	100,00%	R\$	-	R\$	81,98	R\$	81,98
18.6.3.18	1583	ORSE	Redução excêntrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x50mm	UN	8,00	26,13	209,00	0,0033%	0,00	7,00	7,00	87,50%	R\$	-	R\$	182,88	R\$	182,88
18.6.3.19	1620	ORSE	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 75mm Rev. 01 - 10/2022	UN	6,00	72,49	434,96	0,0066%	0,00	5,00	5,00	83,33%	R\$	-	R\$	362,47	R\$	362,47
18.6.3.20	89735	SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	UN	9,00	29,87	268,85	0,0044%	0,00	8,00	8,00	88,89%	R\$	-	R\$	238,97	R\$	238,97
18.6.3.21	89679	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ 06/2022	UN	30,00	146,13	4.383,76	0,0633%	0,00	27,00	27,00	90,00%	R\$	-	R\$	3.945,39	R\$	3.945,39
18.7			FECHAMENTO				0,00	0,0000%										
18.7.1			ALVENARIAS				0,00	0,0000%										
18.7.2			ESQUADRIAS E FERRANGENS				0,00	0,0000%										
18.7.3			COMPLEMENTOS ARQUITETÔNICOS E DIVISÓRIAS				0,00	0,0000%										
18.7.4			DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO				0,00	0,0000%										
18.8			REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES				99.530,46	1,4262%										
18.8.1			PISOS, FORROS E PAREDES				59.206,91	0,8489%										
18.8.1.7	104612	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_ 02/2023_PE	m²	88,79	122,97	10.918,10	0,1566%	0,00	88,79	88,79	100,00%	R\$	-	R\$	10.918,10	R\$	10.918,10
18.8.1.11	87737	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_ 07/2021	m²	200,73	54,37	10.913,88	0,00	0,00	200,73	200,73	100,00%	R\$	-	R\$	10.913,88	R\$	10.913,88
18.8.1.12	13488	ORSE	Polimento de piso de mármore/granitos	m²	543,60	49,93	27.142,79	0,00	0,00	142,71	142,71	26,25%	R\$	-	R\$	7.125,73	R\$	7.125,73
18.8.1.13	4516	ORSE	Restauro - Remoção de revestimento deteriorado	m²	325,33	31,45	10.232,14	0,00	0,00	325,33	325,33	100,00%	R\$	-	R\$	10.232,14	R\$	10.232,14
18.8.2			IMPERMEABILIZAÇÃO				0,00	0,0000%										
18.8.3			PINTURA				40.323,55	0,5789%										
18.8.3.3	8719	ORSE	Restauro - Remoção de pintura em paredes e ornatos	m²	2.106,28	19,14	40.323,55	0,5789%	0,00	690,52	690,52	32,78%	R\$	-	R\$	13.219,61	R\$	13.219,61
18.9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				13.378,17	0,1922%										
18.9.1			ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS				0,00	0,0000%										
18.9.2			ATERRAMENTO				0,00	0,0000%										
18.9.3			CABOS				13.378,17	0,1922%										
18.9.3.4	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	2.322,60	5,76	13.378,17	0,1922%	1.641,70	490,00	2.131,70	91,78%	R\$	9.456,19	R\$	2.822,40	R\$	12.278,59
18.9.4			CONDUTORES DE PROTEÇÃO (SPDA)				0,00	0,0000%										
18.9.5			DISPOSITIVOS ELÉTRICOS (EMBTUDO)				0,00	0,0000%										

18.9.6		DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO				0,00	0,000%							
18.9.7		ELETROCALHA FURADA				0,00	0,000%							
18.9.8		ELETRODUTOS				0,00	0,000%							
18.9.9		LUMINÁRIAS				0,00	0,000%							
18.9.10		PONTO DE LUZ				0,00	0,000%							
18.9.11		QUADROS				0,00	0,000%							
18.10		COMBATE A INCÊNDIO E SPDA				0,00	0,000%							
18.10.1		COMBATE A INCÊNDIO				0,00	0,000%							
18.11		CFTV E LÓGICA				0,00	0,000%							
18.11.1		SERVIÇO DE INSTALAÇÃO				0,00	0,000%							
18.11.2		CFTV E SEGURANÇA				0,00	0,000%							
18.11.3		ACESSÓRIOS CABEAMENTO METÁLICO				0,00	0,000%							
18.11.4		ACESSÓRIOS CABEAMENTO RACK				0,00	0,000%							
18.11.5		ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS				0,00	0,000%							
18.11.6		ACESSÓRIOS USO GERAL				0,00	0,000%							
18.11.7		CABEAMENTO ESTRUTURADO - METÁLICO				0,00	0,000%							
18.11.8		CABOS TELEFÔNICOS				0,00	0,000%							
18.11.9		CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR				0,00	0,000%							
18.11.10		CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR				0,00	0,000%							
18.11.11		DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO				0,00	0,000%							
18.11.12		DISPOSITIVO DE CABEAMENTO EMBUTIR				0,00	0,000%							
18.11.13		ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL				0,00	0,000%							
18.11.14		ELETRODUTO PVC ROSCA				0,00	0,000%							
18.11.15		RACK				0,00	0,000%							
18.12		RELOGIO				0,00	0,000%							

19.1			GAL-04 (ESTAÇÃO TECNOLÓGICA)				354.300,55	5,077%										
19.1			SERVIÇOS TÉCNICOS				0,00	0,000%										
19.1.1			LOCAÇÃO E CADASTRO				0,00	0,000%										
19.2			SERVIÇOS PRELIMINARES				89.026,31	1,276%										
19.2.1			SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA				9.950,36	0,143%										
19.2.1.1	00041805	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANÇIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (O X L), CABO DE 45 M	MES	14,00	710,74	9.950,36	0,143%	3,00	1,00	4,00	28,57%	R\$	2.132,22	R\$	710,74	R\$	2.842,96
19.2.1.2	13311	ORSE	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto montagem, desmontagem e tela	m²xmês	1.328,60	38,73	51.459,14	0,01	0,00	332,15	332,15	25,00%	R\$	-	R\$	12.864,78	R\$	12.864,78
19.2.1.3	97063	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	m²	1.328,60	17,69	23.503,34	0,00	0,00	332,15	332,15	25,00%	R\$	-	R\$	5.875,83	R\$	5.875,83
19.2.2			DEMOLIÇÃO				4.113,47	0,059%										
19.2.2.5	97651	SINAPI	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	44,00	93,49	4.113,47	0,059%	0,00	44,00	44,00	100,00%	R\$	-	R\$	4.113,47	R\$	4.113,47
19.3			MOVIMENTAÇÃO DE SOLO				0,00	0,000%										
19.3.1			ESCOVAÇÃO (VOLUME DE CORTE)				0,00	0,000%										
19.3.2			ATERRO, REATERRO, LASTRO, ESPALHAMENTO E NIVELAMENTO				0,00	0,000%										
19.3.3			CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA				0,00	0,000%										
19.4			ESGOTAMENTO				0,00	0,000%										
19.4.1			ESGOTAMENTO COM BOMBAS				0,00	0,000%										
19.5			FUNDAÇÃO E ESTRUTURA				160.812,67	2,304%										
19.5.1			ESTRUTURA METÁLICA				160.812,67	2,304%										
19.5.1.8	100757	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m²	2.188,61	53,99	118.163,05	1,693%	0,00	2.162,65	2.162,65	98,81%	R\$	-	R\$	116.761,47	R\$	116.761,47
19.5.1.9	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	1.003,01	27,35	27.432,32	0,393%	0,00	1.003,01	1.003,01	100,00%	R\$	-	R\$	27.432,32	R\$	27.432,32
19.5.1.10	9077	ORSE	Cumeeira termoacústica	m	82,95	183,45	15.217,30	0,218%	0,00	82,95	82,95	100,00%	R\$	-	R\$	15.217,30	R\$	15.217,30
19.5.2			ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO				0,00	0,000%										
19.5.3			ESTRUTURA EM CONCRETO PRE MOLDADO				0,00	0,000%										
19.6			INSTALAÇÕES PREDIAIS				0,00	0,000%										
19.6.1			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PARA ÁGUA FRIA				0,00	0,000%										
19.6.2			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO				0,00	0,000%										
19.7			FECHAMENTO				36.032,92	0,516%										
19.7.1			ALVENARIAS				36.032,92	0,516%										
19.7.1.2	10933	ORSE	Alvenaria bloco concreto estrutural 19x19x39cm, fbk 8 a 10 mpa, esp = 0,19m, com argamassa ac-II, junta 1cm - Rev.01	m²	212,49	169,57	36.032,92	0,516%	0,00	71,09	71,09	33,46%	R\$	-	R\$	12.055,06	R\$	12.055,06
19.7.2			ESQUADRIAS E FERRANGENS				0,00	0,000%										
19.7.3			COMPLEMENTOS ARQUITETÔNICOS E DIVISÓRIAS				0,00	0,000%										
19.7.4			DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO				0,00	0,000%										

19.8			REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES				68.428,65	0,980%								
19.8.1			PISOS, FORROS E PAREDES				68.428,65	0,980%								
19.8.1.8	4516	ORSE	Restauração - Remoção de revestimento deteriorado	m²	765,69	31,45	24.082,16	0,345%	0,00	765,69	765,69	100,00%	R\$	-	R\$ 24.082,16	R\$ 24.082,16
19.8.1.9	7377	ORSE	Preparo de substrato por escarificação mecânica com disco de desbaste, até 0,5cm de profundidade	m²	765,69	45,95	35.186,79	0,504%	0,00	765,69	765,69	100,00%	R\$	-	R\$ 35.186,79	R\$ 35.186,79
19.8.1.10	4408	ORSE	Restauração - Lavagem de paredes com cloro líquido	m²	765,69	5,74	4.394,66	0,063%	0,00	765,69	765,69	100,00%	R\$	-	R\$ 4.394,66	R\$ 4.394,66
19.8.1.12	26	ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m³	80,39	20,99	1.687,65	0,024%	0,00	80,39	80,39	100,00%	R\$	-	R\$ 1.687,65	R\$ 1.687,65
19.8.1.16	87737	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	56,60	54,37	3.077,39	0,044%	0,00	56,60	56,60	100,00%	R\$	-	R\$ 3.077,39	R\$ 3.077,39
19.8.2			PINTURA				0,00	0,000%								
19.9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				0,00	0,000%								
19.9.1			ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS				0,00	0,000%								
19.9.2			ATERRAMENTO				0,00	0,000%								
19.9.3			CABO UNIPOLAR (COBRE)				0,00	0,000%								
19.9.4			CAIXA DE PASSAGEM (EMBITIR)				0,00	0,000%								
19.9.5			CONDUTORES DE PROTEÇÃO (SPDA)				0,00	0,000%								
19.9.6			DISPOSITIVOS ELÉTRICOS (EMBITIDO)				0,00	0,000%								
19.9.7			DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO				0,00	0,000%								
19.9.8			ELETROCALHA FURADA				0,00	0,000%								
19.9.9			ELETRODUTOS				0,00	0,000%								
19.9.10			LAMPADAS				0,00	0,000%								
19.9.11			PONTO DE LUZ				0,00	0,000%								
19.9.12			QUADROS				0,00	0,000%								
19.10			COMBATE A INCÊNDIO E SPDA				0,00	0,000%								
19.10.1			COMBATE A INCÊNDIO				0,00	0,000%								
19.11			CFTV E LÓGICA				0,00	0,000%								
19.11.1			SERVIÇO DE INSTALAÇÃO				0,00	0,000%								
19.11.2			CFTV E SEGURANÇA				0,00	0,000%								
19.11.3			ACESSÓRIOS CABEAMENTO METÁLICO				0,00	0,000%								
19.11.4			ACESSÓRIOS CABEAMENTO RACK				0,00	0,000%								
19.11.5			ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS				0,00	0,000%								
19.11.6			ACESSÓRIOS USO GERAL				0,00	0,000%								
19.11.7			CABEAMENTO ESTRUTURADO - METÁLICO				0,00	0,000%								
19.11.8			CABOS TELEFÔNICOS				0,00	0,000%								
19.11.9			CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR				0,00	0,000%								
19.11.10			DISPOSITIVO DE CABEAMENTO EMBUTIR				0,00	0,000%								
19.11.11			ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL				0,00	0,000%								
19.11.12			ELETRODUTO PVC ROSCA				0,00	0,000%								
19.11.13			RACK				0,00	0,000%								

20		GAL 05 (LANCHONETES)				0,00	0,000%							
20.1		SERVIÇOS TÉCNICOS				0,00	0,000%							
20.1.1		LOCAÇÃO E CADASTRO				0,00	0,000%							
20.2		SERVIÇOS PRELIMINARES				0,00	0,000%							
20.2.1		SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA				0,00	0,000%							
20.2.2		DEMOLIÇÃO				0,00	0,000%							
20.3		MOVIMENTAÇÃO DE SOLO				0,00	0,000%							
20.3.1		ESCOVAÇÃO (VOLUME DE CORTE)				0,00	0,000%							
20.3.2		ATERRO, REATERRO, LASTRO, ESPALHAMENTO E NIVELAMENTO				0,00	0,000%							
20.3.3		CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA				0,00	0,000%							
20.4		ESGOTAMENTO				0,00	0,000%							
20.4.1		ESGOTAMENTO COM BOMBAS				0,00	0,000%							
20.5		FUNDAÇÃO E ESTRUTURA				0,00	0,000%							
20.5.1		ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO				0,00	0,000%							
20.5.2		ESTRUTURA EM CONCRETO PRE MOLDADO				0,00	0,000%							
20.6		INSTALAÇÕES PREDIAIS				0,00	0,000%							
20.6.1		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PARA ÁGUA FRIA				0,00	0,000%							
20.6.2		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO				0,00	0,000%							
20.7		FECHAMENTO				0,00	0,000%							
20.7.1		ALVENARIAS				0,00	0,000%							
20.7.2		ESQUADRIAS E FERRANGENS				0,00	0,000%							
20.7.3		COMPLEMENTOS ARQUITETÔNICOS E DIVISÓRIAS				0,00	0,000%							
20.8		REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES				0,00	0,000%							
20.8.1		PISOS, FORROS E PAREDES				0,00	0,000%							
20.8.2		IMPERMEABILIZAÇÃO				0,00	0,000%							
20.8.3		PINTURA				0,00	0,000%							
20.9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				0,00	0,000%							
20.9.1		ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS				0,00	0,000%							
20.9.2		ATERRAMENTO				0,00	0,000%							
20.9.3		CABO UNIPOLAR (COBRE)				0,00	0,000%							
20.9.4		CAIXA DE PASSAGEM (EMBUTIR)				0,00	0,000%							
20.9.5		CONDUTORES DE PROTEÇÃO (SPDA)				0,00	0,000%							
20.9.6		DISPOSITIVOS ELÉTRICOS (EMBUTIDO)				0,00	0,000%							
20.9.7		DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO				0,00	0,000%							
20.9.8		ELETRODUTOS				0,00	0,000%							
20.9.9		LAMPADAS				0,00	0,000%							
20.9.10		PONTO DE LUZ				0,00	0,000%							
20.9.11		QUADROS				0,00	0,000%							
20.10		COMBATE A INCÊNDIO E SPDA				0,00	0,000%							
20.10.1		COMBATE A INCÊNDIO				0,00	0,000%							
20.11		CFTV E LÓGICA				0,00	0,000%							
20.11.1		SERVIÇO DE INSTALAÇÃO				0,00	0,000%							
20.11.2		CFTV E SEGURANÇA				0,00	0,000%							
20.11.3		ACESSÓRIOS CABEAMENTO METÁLICO				0,00	0,000%							
20.11.4		ACESSÓRIOS CABEAMENTO RACK				0,00	0,000%							
20.11.5		ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS				0,00	0,000%							
20.11.6		ACESSÓRIOS USO GERAL				0,00	0,000%							
20.11.7		CABEAMENTO ESTRUTURADO - METÁLICO				0,00	0,000%							
20.11.8		CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR				0,00	0,000%							
20.11.9		DISPOSITIVO DE CABEAMENTO EMBUTIR				0,00	0,000%							
20.11.10		ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL				0,00	0,000%							
20.11.11		ELETRODUTO PVC ROSCA				0,00	0,000%							
20.11.12		RACK				0,00	0,000%							



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20250752235

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

INICIAL
EQUIPE - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

VIRGÍLIO VILAR BRASILEIRO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1603397345**

Registro: **1603397345AL**

Empresa contratada: **ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA**

Registro : **0000333099-PB**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE**

CPF/CNPJ: **08.993.917/0001-46**

RUA IRINEU JOFFILY

Nº: **304**

Complemento: **1º ANDAR**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CAMPINA GRANDE**

UF: **PB**

CEP: **58400270**

Contrato: **Nº 2.08.015/2025**

Celebrado em: **14/08/2025**

Valor: **R\$ 44.061.267,96**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA PROFESSOR ALMEIDA BARRETO

Nº: **1401**

Complemento:

Bairro: **QUARENTA**

Cidade: **CAMPINA GRANDE**

UF: **PB**

CEP: **58416220**

Data de Início: **14/08/2025**

Previsão de término: **14/02/2028**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE**

CPF/CNPJ: **08.993.917/0001-46**

4. Atividade Técnica

10 - Coordenação	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS	56.000,00	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	56.000,00	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	56.000,00	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	56.000,00	m2
12 - Como construído - `As built` > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS	56.000,00	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

COORDENAÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO PÁTIO FERROVIÁRIO DA ESTAÇÃO NOVA, REVITALIZAÇÃO DE VIAS EM SEU ENTORNO, REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CINCO EDIFICAÇÕES, CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS, PARQUES, QUADRAS POLIESPORTIVAS, FONTE ORNAMENTAL E ÁREAS DE CONVIVÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA; CONFORME CONTRATO Nº 2.08.015/2025 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE E A EMPRESA ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SENGE-PB

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yW292

Impresso em: 29/08/2025 às 11:02:43 por: , ip: 206.42.52.224

sic.creapb.org.br

Tel: (83) 3533 2525

creapb@creapb.org.br

Fax:



CREA-PB
 Conselho Regional de Engenharia
 e Agronomia da Paraíba





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20250752235

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

INICIAL
 EQUIPE - ART PRINCIPAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
 Local data



Documento assinado eletronicamente
 com credenciais de login e senha

VIRGÍLIO VILAR BRASILEIRO
 RNP: 1603397345
 Data: 29/08/2025 11:02:43

VIRGÍLIO VILAR BRASILEIRO - CPF: 379.797.954-15

CONFORME CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - CNPJ: 08.993.917/0001-46

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 271,47** Registrada em: **28/08/2025** Valor pago: **R\$ 271,47** Nosso Número: **5103870**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yW292
 Impresso em: 29/08/2025 às 11:02:43 por: , ip: 206.42.52.224





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA
CNPJ: 41.157.967/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:52:53 do dia 23/06/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/12/2026.

Código de controle da certidão: **9138.DE01.78C5.23C8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA
CNPJ: 41.157.967/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:52:53 do dia 23/06/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/12/2026.

Código de controle da certidão: **9138.DE01.78C5.23C8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 0.261.142/26-72

Contribuinte

ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA

CPF/CNPJ

41.157.967/0001-69

Endereço

AVENIDA HAMILTON DE BARROS SOUTINHO, 797 , BAIRRO JATIUCA, MACEIO/AL -
CEP: 57.035-690

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressaltando o direito de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar outras dívidas que venham a ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que EXISTE débito registrado em nome do Contribuinte, ENTRETANTO, nos termos do disposto no artigo Art. 206 da Lei nº. 5.172/66 - Código Tributário Nacional, este documento tem os mesmos efeitos de CERTIDÃO NEGATIVA.

MACEIÓ (MCZ), 30 de Junho de 2026

Válida até: 28/08/2026

Código de autenticidade: E438E83CBE53D7FE

A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia, no endereço: <http://www.maceio.al.gov.br/semec/>.

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 41.157.967/0001-69

Certidão nº: 62889257/2026

Expedição: 20/07/2026, às 08:16:01

Validade: 16/01/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.157.967/0001-69**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Comprovante de Pagamento de Tributos e Taxas Estaduais e Municipais e contas de concessionárias de Serviços Públicos

Nome do pagador: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA

CNPJ: 41.157.967/0001-69

Conta de debitada: 4245-5/000-575164133-3

Convênio: 469761 PAGFOR - Estação Nova Campina Grande

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos

Compromisso: 1 - PAGFOR - Estação Nova Campina Grande

NSA: 336

Representação numérica do código de barras

85870000108-8 26450385262-6 01071626190-9 31362168509-8

Empresa/Concessionária: MINISTERIO DA FAZENDA

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento empresa: 0007892380001

Informações

Valor nominal: R\$ 10.826,45

Data de vencimento: 20/07/2026

Valor da efetivação R\$ 10.826,45

Data da efetivação 15/07/2026

NSU/RS*:

Informações Adicionais*

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação Bancária: BA46ACB0D2D976E57B9661000



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.157.967/0001-69
Razão social: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA
Endereço: AV HAMILTON DE BARROS SOUTINHO 797 / JATIUCA / MACEIO / AL / 57035-690

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/07/2026 a 13/08/2026

Certificação Número: 2026071500560347810513

Informação obtida em 20/07/2026 08:15:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

CNPJ
41.157.967/0001-69

Razão Social
ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA

Período de Apuração
Junho/2026

Data de Vencimento
20/07/2026

Número do Documento
07.16.26190.3136216-8

Pagar este documento até

20/07/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000501782897

Valor Total do Documento

10.826,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026 CNO:90.025.31085/73	3.824,94			3.824,94
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026 CNO:90.025.31085/73	2.917,30			2.917,30
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026 CNO:90.025.31085/73	233,38			233,38
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026 CNO:90.025.31085/73	1.166,92			1.166,92
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026 CNO:90.025.31085/73	1.750,38			1.750,38
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026 CNO:90.025.31085/73	700,15			700,15
1664	CONTRIBUICAO ADICIONAL TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI - CONTRIBUICAO ADICIONAL PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026 CNO:90.025.31085/73	233,38			233,38
Totais		10.826,45			10.826,45

SENDa (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

09/07/2026 10:21:04

85870000108 8 26450385262 6 01071626190 9 31362168509 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000108 8 26450385262 6 01071626190 9 31362168509 8



CNPJ: 41.157.967/0001-69
Número: 07.16.26190.3136216-8
Pagar até: 20/07/2026
Valor: 10.826,45

Pague com o PIX



MEMORIA DE CÁLCULO DO INSS - PARQUE ESTAÇÃO NOVA - CG - PB - 06/2026

BASE DE CÁLCULO 116.692,37	EMPRESA (20%)	23.338,47	1138-01	0,00 = Empresa - Ret./Comp.
	RAT (3,2778%)	3.824,94	1646-01	3.824,94 = RAT
	SEGURADOS	9.721,33	1082-01	0,00 = Segurados - Sal. Fam/Mat
		36.884,75		
	SAL. FAM/MAT (-)	1.013,10		
		35.871,64	1170-01	2.917,31 SALÁRIO EDUCAÇÃO (2,5%)
	TERCEIROS (5,8%)	6.768,13	1176-01	233,38 INCRA (0,2%)
		42.639,77	1181-01	1.166,92 SENAI (1%)
	SENAI ADICIONAL (0,2%)	233,38	1184-01	1.750,39 Sesi (1,5%)
			1200-01	700,15 SEBRAE (0,6%)
			1664-01	233,38 SENAI ADICIONAL (0,2%)
PRO-LABORE 0,00	EMPRESA (20%)	0,00		
	SEGURADOS	0,00		
		0,00		
RPA NORMAL 0,00	EMPRESA (20%)	0,00		
	SEGURADOS	0,00		
		0,00		
			1138-04	0,00 = RPA Empresa (20%)
			1099-01	0,00 = RPA Segurados
RPA FRETE 0,00	EMPRESA (20%)	0,00		
	SEGURADOS	0,00		
	TERCEIROS (2,5%)	0,00	1218-02	0,00 SEST (1,5%)
		0,00	1221-02	0,00 SENAT (1%)

RESUMO DA GUIA

EMPRESA (20%)	23.338,47
RAT (3,2778%)	3.824,94
SEGURADOS	9.721,33
	36.884,75
RETENÇÃO (-)	10.870,77
COMPENSAÇÃO (-)	21.175,93
SAL. FAM/MAT (-)	1.013,10
	3.824,94
TERCEIROS + SENAI ADIC	7.001,51
	10.826,46

Retenção INSS, NF 5116 de 06/2026, valor **R\$ 21.336,78**, Obra PARQUE ESTAÇÃO NOVA - CG, compensado **R\$ 10.870,77**, restando saldo de **R\$ 10.466,01** para utilizar no próximo mês.

SALDO Retenção INSS, NF 5006 de 05/2026, valor **R\$ 21.175,93**, Obra PARQUE ESTAÇÃO NOVA - CG, compensado **R\$ 21.175,93**, não restando mais saldo.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 5173	
			Código de Verificação LARENB1WQ	
			Emissão da NFS-e 24/07/2026 15:52:03	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço				
CPF/CNPJ: 41.157.967/0001-69		Inscrição 900197773		
Nome/Razão Social: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA				
Endereço Avenida Hamilton de Barros Soutinho		Número: 797		
Complemento:		Bairro: Jatiúca		
CEP: 57035-690 Município: MACEIÓ		UF: AL País: Brasil		
E-mail: contabilidade@engenhariademateriaislt-da.com.br		Telefone: (82)3327-6574		

Tomador de Serviço				
CPF/CNPJ: 08.993.917/0001-46		Inscrição Municipal:		NIF:
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE				
Endereço: Rua IRINEU JOFFILY		Número: 304		
Complemento: 1ª ANDAR		Bairro: CENTRO		
CEP: 58400-270 Município: CAMPINA GRANDE		UF: PB País: Brasil		
E-mail:		Telefone:		

Atividade Econômica	
7.02 / 4213800 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	

Discriminação do Serviço	
Valor referente a 9ª (Nona) medição de execução das OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO PÁTIO FERROVIÁRIO DA ESTAÇÃO NOVA, no município de Campina Grande/PB - Processo Administrativo nº 363/2025 - Concorrência; nº 90801/2025 - Contrato nº 2.08.015/2025 datado de 14/08/2025, Operação de Crédito FONPLATA Contrato BR 42/2023, inscrita no CNO sob nº 90.025.31085/73.	
-Mão de obra (35%)R\$ 339.244,49. -Materiais/ Equipamentos (65%)R\$ 630.025,47. -Retenção para Seguridade Social (11%)R\$ 37.316,89. -Retenção de ISS 60% (5%)R\$ 29.078,10. -Retenção de IR (1,2%)R\$ 11.631,24.	
Conta Crédito: CEF AG-4245; OP-1292; -CTA-575.164.133-3;	

Tributos Federais (R\$)							Valor Aproximado dos Tributos				
PIS	Tipo PIS	COFINS	Tipo COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte	Simple
0,00	Apuração Própria	0,00	Apuração Própria	29.078,10	11.631,24	0,00	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra	35478	Valor do Serviço	969.269,96
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	40.709,34
Simple Nacional	() Sim (X) Não	PIS/COFINS - Apuração Própria	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.0102.90.00	Outras Retenções	0,00
Indicador de Operação	50201	Deduções Previstas em Lei	387.707,98
Situação Tributária	200	Base de Cálculo	581.561,98
Classificação Tributária	200046	Alíquota	5,00
Competência	07/2026	ISSQN	29.078,10
Município Prestação	CAMPINA GRANDE - PB	IBS	552,48
Município Incidência	CAMPINA GRANDE - PB	CBS	4.972,35
ISSQN a Reter	(X) Sim () Não	Valor Líquido	899.482,52

Outras Informações	
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.	
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://maceio.giss.com.br com a utilização do Código de Verificação.	



MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização - DFIS/SEFIN - Rua Cazuzu Barreto, nº 113, Estação Velha - CEP 58.410-103 - Campina Grande/PB - Brasil - Fone: (83) 3310-9417



Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços - RANFS®

Emissão da Nota	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
24/07/2026	06/2026	Campina Grande - PB
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	RANFS® criado em
Nenhum	Exigível em Campina Grande	24/07/2026

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA

Nome Fantasia

ENGEMAT

CPF/CNPJ

41.157.967/0001-69

Endereço

Avenida Hamilton de Barros Soutinho, 797, Jatiúca - CEP: 57035-690 - Maceió - AL

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE

CPF/CNPJ

08.993.917/0001-46

Endereço

Avenida Marechal Floriano Peixoto, 692 - CEP: 58400-180 - Campina Grande - PB

SERVIÇO PRESTADO

07021 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4213800.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente a 9ª (Nona) medição de execução das OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO PÁTIO FERROVIÁRIO DA ESTAÇÃO NOVA, no município de Campina Grande/PB - Processo Administrativo nº 363/2025 - Concorrência; nº 90801/2025 - Contrato nº 2.08.015/2025 datado de 14/08/2025, Operação de Crédito FONPLATA Contrato BR 42/2023, inscrita no CNO sob nº 90.025.31085/73.

-Mão de obra (35%)R\$ 339.244,49.
-Materiais/ Equipamentos (65%)R\$ 630.025,47.
-Retenção para Seguridade Social (11%)R\$ 37.316,89.
-Retenção de ISS 60% (5%)R\$ 29.078,10.
-Retenção de IR (1,2%)R\$ 11.631,24.

Conta Crédito: CEF AG-4245; OP-1292; -CTA-575.164.133-3;

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	29.078,10	11.631,24	0,00	0,00

VALORES

Deduções (R\$)	Desc. Cond. (R\$)	Desc. Incond. (R\$)	Base de Cálculo ISS (R\$)	Alíquota ISS (%)
387.707,98	0,00	0,00	581.561,98	5,00
Valor dos Serviços (R\$)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
969.269,96	*****	29.078,10	899.482,52	969.269,96

OUTRAS INFORMAÇÕES

Benefício fiscal: Dedução Tributária de 40,00 %

Imposto retido pelo tomador.

O valor do ISSQN deste RANFS® foi retido pelo Tomador do Serviço.
