

Protocolo Secretaria de Obras 64.723/2026

De: ARTHUR PEREIRA DE ALMEIDA

Para: SECOB - MC

Data: 08/07/2026 às 15:48:12

Setores (CC):

SECOB - PROTOCOLO, SECOB - MC

Setores envolvidos:

SECOB - PROTOCOLO, SECOB - MC

Medição de Contratos sem Convênio

Nome da Empresa*:

CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA

CNPJ*:

09323098000192

Número do contrato*:

2.08.018/2025

Número da Medição*:

9

Valor da Medição*:

494.429,03

Período da Medição*:

01/06/2026 A 30/06/2026

Prezados, boa tarde,

Segue anexo a 9ª medição para análise e posterior aprovação.

Atenciosamente,

Arthur Pereira de Almeida

Anexos:

CE_052_2026_9_MED_CONTRATO_2_08_018_2025.pdf
REV00_EDJ_CANAL_DO_PRADO_MED9_R1.xlsx
REV00_EDJ_CANAL_DO_PRADO_MED9_R1_BM.pdf
REV00_EDJ_CANAL_DO_PRADO_MED9_R1_MEMORIA_DE_CALCULO.pdf
REV00_EDJ_CRONO_CANAL_DO_PRADO_MED9_.pdf
REV00_EDJ_DIARIO_OBRAS_MED9_.pdf
REV00_EDJ_RELATÓRIO_FOTO_MED9_.pdf

Nº: CE/052/2026

Campina Grande, 08 de JULHO de 2026.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB
Secretaria Municipal de Obras

Att.: Dr. JOAB KLEBER LUCENA MACHADO
Secretário Municipal de Obras

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 9.08.02/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CANALIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL DO PRADO E ÁREAS CIRCUNVIZINHAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.

Assunto: ENCAMINHAMENTO – 09ª MEDIÇÃO

Prezado Secretário;

A CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE Ltda, sediada na Rua Álvaro de Araújo Pereira, 255, Jardim Tavares, 58.402-300, vem a solicitar o pagamento da **medição nº 09**, referente ao **período de 01/06/2026 a 30/06/2026**, no valor de **R\$ 494.429,03 (Quatrocentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e vinte e nove reais e três centavos)**, objeto do contrato nº 2.08.018/2025, firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, para a EXECUÇÃO DE OBRA DE CANALIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL DO PRADO E ÁREAS CIRCUNVIZINHAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.

Confiando na providência de V.Sa., renovamos nossos votos de elevada estima e consideração e subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

ARTHUR PEREIRA DE
ALMEIDA:04731791480

Assinado de forma digital por
ARTHUR PEREIRA DE
ALMEIDA:04731791480
Dados: 2026.07.08 15:36:14 -03'00'

Arthur Pereira de Almeida
Adm. Contratual

CONCORRÊNCIA Nº 9.08.02/2025				MEDIÇÃO Nº: 9 DATA DA EMISSÃO: 08/07/2026 CONTRATO: Nº 2.08.018/2025 VALOR TOTAL DO CONTRATO= 38.554.542,31									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CANALIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL DO PRADO E ÁREAS CIRCUNVIZINHAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB													
DATA DA OS: 17/10/2025				VALOR = R\$ 38.554.542,31 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 8.315.601,23 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 494.429,03 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL = R\$ 8.810.030,26									
MEDIÇÃO: 9													
PERÍODO SIMPLES: 01/06/2026 30/06/2026													
PERÍODO ACUMULADO: 17/10/2025 30/06/2026				BOLETIM DE MEDIÇÃO									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO				R\$ 1.250.014,56		R\$ 289.993,27		R\$ 15.430,02		R\$ 305.423,29		R\$ 944.591,27
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022	m²	R\$ 461,25	36,00	R\$ 16.605,00	36,00	R\$ 16.605,00	-	R\$ -	36,00	R\$ 16.605,00	-	R\$ -
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MES	R\$ 85.942,88	14,00	R\$ 1.203.200,32	3,02	R\$ 259.511,16	0,18	R\$ 15.430,02	3,20	R\$ 274.941,18	10,80	R\$ 928.259,14
1.3	SINALIZAÇÃO COM CAVALETE PLÁSTICO DESMONTÁVEL	un	R\$ 16,29	50,00	R\$ 814,50	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	50,00	R\$ 814,50
1.4	SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - 10 USOS	m	R\$ 5,58	294,00	R\$ 1.640,52	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	294,00	R\$ 1.640,52
1.5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	und	R\$ 13.877,11	2,00	R\$ 27.754,22	1,00	R\$ 13.877,11	-	R\$ -	1,00	R\$ 13.877,11	1,00	R\$ 13.877,11
2.0	INSTALAÇÕES E CANTEIRO DE OBRAS				R\$ 192.835,68		R\$ 154.652,43		R\$ 2.815,59		R\$ 157.468,02		R\$ 35.367,66
2.1	CANTEIRO DE OBRA				R\$ 97.618,78		R\$ 59.435,53		R\$ 2.815,59		R\$ 62.251,12		R\$ 35.367,66
2.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	R\$ 1.055,67	14,00	R\$ 14.779,38	7,00	R\$ 7.389,69	1,00	R\$ 1.055,67	8,00	R\$ 8.445,36	6,00	R\$ 6.334,02
2.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	R\$ 824,74	14,00	R\$ 11.546,36	7,00	R\$ 5.773,18	1,00	R\$ 824,74	8,00	R\$ 6.597,92	6,00	R\$ 4.948,44
2.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	R\$ 1.319,58	14,00	R\$ 18.474,12	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	14,00	R\$ 18.474,12
2.4	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MÊS	R\$ 935,18	14,00	R\$ 13.092,52	7,00	R\$ 6.546,26	1,00	R\$ 935,18	8,00	R\$ 7.481,44	6,00	R\$ 5.611,08
2.5	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, AF_ 02/2016	m²	R\$ 709,40	56,00	R\$ 39.726,40	56,00	R\$ 39.726,40	-	R\$ -	56,00	R\$ 39.726,40	-	R\$ -
2.2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (ÁGUA, ESGOTO, LUZ)				R\$ 41.560,90		R\$ 41.560,90		R\$ -		R\$ 41.560,90		R\$ -
2.2.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO), AF_ 07/2020	UN	R\$ 2.270,40	1,00	R\$ 2.270,40	1,00	R\$ 2.270,40	-	R\$ -	1,00	R\$ 2.270,40	-	R\$ -
2.2.2	POSTE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T 9,00M 200DAN TIPO C14	UN	R\$ 2.808,16	1,00	R\$ 2.808,16	1,00	R\$ 2.808,16	-	R\$ -	1,00	R\$ 2.808,16	-	R\$ -
2.2.3	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 03/2024	UN	R\$ 160,56	1,00	R\$ 160,56	1,00	R\$ 160,56	-	R\$ -	1,00	R\$ 160,56	-	R\$ -
2.2.4	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO), AF_ 03/2024	UN	R\$ 243,77	1,00	R\$ 243,77	1,00	R\$ 243,77	-	R\$ -	1,00	R\$ 243,77	-	R\$ -
2.2.5	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 03/2024	UN	R\$ 167,47	1,00	R\$ 167,47	1,00	R\$ 167,47	-	R\$ -	1,00	R\$ 167,47	-	R\$ -
2.2.6	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA BLOCO DE CIMENTO E CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES INTERNAS 1,80 X 3,60 X 1,80 M.	un	R\$ 27.054,92	1,00	R\$ 27.054,92	1,00	R\$ 27.054,92	-	R\$ -	1,00	R\$ 27.054,92	-	R\$ -
2.2.7	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES), AF_ 12/2020	UN	R\$ 8.855,62	1,00	R\$ 8.855,62	1,00	R\$ 8.855,62	-	R\$ -	1,00	R\$ 8.855,62	-	R\$ -
2.3	FECHAMENTO DO CANTEIRO				R\$ 53.656,00		R\$ 53.656,00		R\$ -		R\$ 53.656,00		R\$ -
2.3.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA, AF_ 03/2024	m²	R\$ 113,71	400,00	R\$ 45.484,00	400,00	R\$ 45.484,00	-	R\$ -	400,00	R\$ 45.484,00	-	R\$ -
2.3.2	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	R\$ 408,60	20,00	R\$ 8.172,00	20,00	R\$ 8.172,00	-	R\$ -	20,00	R\$ 8.172,00	-	R\$ -
3.0	LIMPEZA E DEMOLIÇÕES				R\$ 1.543.155,60		R\$ 1.400.224,06		R\$ -		R\$ 1.400.224,06		R\$ 142.931,53
3.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF_ 03/2024	m²	R\$ 0,73	45.000,00	R\$ 32.850,00	42.727,12	R\$ 31.190,80	-	R\$ -	42.727,12	R\$ 31.190,80	2.272,88	R\$ 1.659,20
3.2	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30 M	un	R\$ 45,52	30,00	R\$ 1.365,60	30,00	R\$ 1.365,60	-	R\$ -	30,00	R\$ 1.365,60	-	R\$ -
3.3	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3), AF_ 07/2020	m³	R\$ 15,18	6.750,00	R\$ 102.465,00	6.181,48	R\$ 93.834,92	-	R\$ -	6.181,48	R\$ 93.834,92	568,52	R\$ 8.630,08
3.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_ 07/2020	m³	R\$ 10,64	19.687,50	R\$ 209.475,00	10.681,78	R\$ 113.654,14	-	R\$ -	10.681,78	R\$ 113.654,14	9.005,72	R\$ 95.820,86
3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), AF_ 07/2020	M3XKM	R\$ 3,20	374.062,50	R\$ 1.197.000,00	362.555,81	R\$ 1.160.178,60	-	R\$ -	362.555,81	R\$ 1.160.178,60	11.506,69	R\$ 36.821,39
4.0	CANAL PRINCIPAL				R\$ 15.669.078,82		R\$ 4.958.975,12		R\$ 476.183,43		R\$ 5.435.158,55		R\$ 10.233.920,26
4.1	ESCAVAÇÃO DA SEÇÃO DO CANAL				R\$ 6.093.452,44		R\$ 2.563.743,16		R\$ 8.212,00		R\$ 2.571.955,16		R\$ 3.521.497,29
4.1.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3), AF_ 07/2020	m³	R\$ 3,90	26.894,66	R\$ 104.889,19	14.160,79	R\$ 55.227,08	-	R\$ -	14.160,79	R\$ 55.227,08	12.733,87	R\$ 49.662,11
4.1.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_ 09/2024	m³	R\$ 13,35	8.964,89	R\$ 119.681,25	906,89	R\$ 12.106,93	80,00	R\$ 1.068,00	986,89	R\$ 13.174,93	7.978,00	R\$ 106.506,33
4.1.3	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE, AF_ 03/2021	m³	R\$ 190,59	8.964,89	R\$ 1.708.618,05	3.716,19	R\$ 708.268,65	-	R\$ -	3.716,19	R\$ 708.268,65	5.248,70	R\$ 1.000.349,39
4.1.4	RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF_ 03/2021	m³	R\$ 27,98	4.482,44	R\$ 125.418,78	3.483,45	R\$ 97.467,03	-	R\$ -	3.483,45	R\$ 97.467,03	998,99	R\$ 27.951,75
4.1.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_ 07/2020	m³	R\$ 10,64	56.478,80	R\$ 600.934,38	23.665,64	R\$ 251.802,43	100,00	R\$ 1.064,00	23.765,64	R\$ 252.866,43	32.713,15	R\$ 348.067,95
4.1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), AF_ 07/2020	M3XKM	R\$ 3,20	1.073.097,12	R\$ 3.433.910,79	449.647,20	R\$ 1.438.871,03	1.900,00	R\$ 6.080,00	451.547,20	R\$ 1.444.951,03	621.549,93	R\$ 1.988.959,76
4.2	ATERRO LATERAL DO CANAL				R\$ 284.243,72		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 284.243,72
4.2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3), AF_ 07/2020	m³	R\$ 15,18	2.509,75	R\$ 38.097,93	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2.509,75	R\$ 38.097,93

CONCORRÊNCIA Nº 9.08.02/2025					MEDIÇÃO Nº: 9 DATA DA EMISSÃO: 08/07/2026 CONTRATO: Nº 2.08.018/2025 VALOR TOTAL DO CONTRATO= 38.554.542,31								
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CANALIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL DO PRADO E ÁREAS CIRCUNVIZINHAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB													
DATA DA OS: 17/10/2025													
MEDIÇÃO: 9					VALOR = R\$ 38.554.542,31 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 8.315.601,23 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 494.429,03 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL = R\$ 8.810.030,26								
PERÍODO SIMPLES: 01/06/2026 30/06/2026													
PERÍODO ACUMULADO: 17/10/2025 30/06/2026					BOLETIM DE MEDIÇÃO								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
4.2.2	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_ 07/2020	m³	R\$ 10,64	2.760,72	R\$ 29.374,06	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2.760,72	R\$ 29.374,06
4.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	R\$ 3,20	22.085,76	R\$ 70.674,43	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	22.085,76	R\$ 70.674,43
4.2.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESURA 15CM- EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_ 09/2024	m³	R\$ 7,65	2.760,72	R\$ 21.119,50	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2.760,72	R\$ 21.119,50
4.2.5	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/ATERRO (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	R\$ 45,27	2.760,72	R\$ 124.977,80	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2.760,72	R\$ 124.977,80
4.3	SINALIZAÇÃO				R\$ 6.567,60		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 6.567,60
4.3.1	SINALIZAÇÃO ABERTA C/ ILUMINACAO P/SEGURANCA TRANSITO VEICULOS PEDESTRES	M	R\$ 3,90	1.684,00	R\$ 6.567,60	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.684,00	R\$ 6.567,60
4.4	ESSOTAMENTO				R\$ 18.524,00		R\$ 1.886,08		R\$ 303,12		R\$ 2.189,20		R\$ 16.334,80
4.4.1	ESSOTAMENTO D'AGUA C/MOTOBOMBA CAPAC. 1 M3/H (06 MESES)	H	R\$ 8,42	2.200,00	R\$ 18.524,00	224,00	R\$ 1.886,08	36,00	R\$ 303,12	260,00	R\$ 2.189,20	1.940,00	R\$ 16.334,80
4.5	FUNDACÃO DO CANAL				R\$ 2.557.498,90		R\$ 781.382,73		R\$ 88.146,81		R\$ 869.529,54		R\$ 1.687.969,35
4.5.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE "10 CM". AF_ 01/2024	m²	R\$ 259,80	3.052,66	R\$ 793.080,02	-	R\$ -	83,04	R\$ 21.573,79	83,04	R\$ 21.573,79	2.969,62	R\$ 771.506,23
4.5.2	ENROCAMENTO COM PEDRA GRANÍTICA ARRUMADA	m³	R\$ 435,26	2.442,12	R\$ 1.062.959,24	1.595,99	R\$ 694.670,61	152,95	R\$ 66.573,02	1.748,94	R\$ 761.243,62	693,18	R\$ 301.715,61
4.5.3	REGULARIZACAO MANUAL E COMPACTACAO COM PLACA VIBRATORIA	M²	R\$ 8,23	8.140,42	R\$ 66.995,62	2.797,03	R\$ 23.019,56	-	R\$ -	2.797,03	R\$ 23.019,56	5.343,39	R\$ 43.976,06
4.5.4	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE "10 CM". AF_ 01/2024	m²	R\$ 259,80	2.442,12	R\$ 634.464,02	245,16	R\$ 63.692,57	-	R\$ -	245,16	R\$ 63.692,57	2.196,96	R\$ 570.771,45
4.6	ESTRUTURA DO CANAL				R\$ 5.266.251,12		R\$ 1.492.742,87		R\$ 358.960,99		R\$ 1.851.703,86		R\$ 3.414.547,26
4.6.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_ 11/2024	m²	R\$ 40,62	7.891,94	R\$ 320.570,76	767,14	R\$ 31.161,23	145,20	R\$ 5.898,02	912,34	R\$ 37.059,25	6.979,60	R\$ 283.511,51
4.6.2	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_ 05/2021	m³	R\$ 673,72	6.961,95	R\$ 4.690.404,14	2.169,42	R\$ 1.461.581,64	524,05	R\$ 353.062,97	2.693,47	R\$ 1.814.644,61	4.268,48	R\$ 2.875.759,53
4.6.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE "10 CM". AF_ 01/2024	m²	R\$ 259,80	550,19	R\$ 142.938,84	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	550,19	R\$ 142.938,84
4.6.4	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE "10 CM". AF_ 01/2024	m²	R\$ 204,18	550,19	R\$ 112.337,38	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	550,19	R\$ 112.337,38
4.7	REVESTIMENTO				R\$ 611.600,57		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 611.600,57
4.7.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 4,0 CM. PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_ 09/2020	m²	R\$ 58,94	10.376,66	R\$ 611.600,57	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	10.376,66	R\$ 611.600,57
4.8	BARBACAS				R\$ 294.624,49		R\$ 104.592,12		R\$ 20.560,51		R\$ 125.152,63		R\$ 169.471,85
4.8.1	DRENO BARBACA, DN 75 MM, SEM MATERIAL DRENANTE. AF_ 07/2021	M	R\$ 48,94	5.916,00	R\$ 289.529,04	2.137,15	R\$ 104.592,12	420,12	R\$ 20.560,51	2.557,27	R\$ 125.152,63	3.358,73	R\$ 164.376,40
4.8.2	GEOTEXTIL, NÃO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTÍNUOS 100% POLIESTER, RESISTÊNCIA A TRACÇÃO + 99 KNM	M²	R\$ 9,57	532,44	R\$ 5.095,45	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	532,44	R\$ 5.095,45
4.9	ENSECADEIRA				R\$ 87.768,96		R\$ 14.628,16		R\$ -		R\$ 14.628,16		R\$ 73.140,80
4.9.1	ENSECADEIRA C/ SACO DE AREIA CREMOCAO	m³	R\$ 457,13	192,00	R\$ 87.768,96	32,00	R\$ 14.628,16	-	R\$ -	32,00	R\$ 14.628,16	160,00	R\$ 73.140,80
4.10	RECUPERAÇÃO DO CANAL EXISTENTE, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO PARCIAL				R\$ 448.547,02		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 448.547,02
4.10.1	DEMOLIÇÃO DE PISO E/OU REVESTIMENTO DE PAREDE EM CIMENTADO OU CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	R\$ 187,70	209,92	R\$ 39.401,98	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	209,92	R\$ 39.401,98
4.10.2	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO CICLÓPICO, COM ROMPEDOR PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m³	R\$ 113,13	636,70	R\$ 72.029,87	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	636,70	R\$ 72.029,87
4.10.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_ 11/2024	m²	R\$ 40,62	81,92	R\$ 3.327,59	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	81,92	R\$ 3.327,59
4.10.4	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_ 05/2021	m³	R\$ 673,72	7,66	R\$ 5.160,69	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	7,66	R\$ 5.160,69
4.10.5	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 4,0 CM. PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_ 09/2020	m²	R\$ 58,94	3.610,77	R\$ 212.818,78	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	3.610,77	R\$ 212.818,78
4.10.6	RASPAGEM E EMPILHAMENTO DE MATERIAL ASSORIADO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA	m³	R\$ 198,84	132,42	R\$ 26.330,39	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	132,42	R\$ 26.330,39
4.10.7	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_ 07/2020	m³	R\$ 10,64	1.252,49	R\$ 13.326,49	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.252,49	R\$ 13.326,49
4.10.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	R\$ 3,20	23.797,26	R\$ 76.151,23	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	23.797,26	R\$ 76.151,23
5.0	VIAS PROJETADAS				R\$ 10.859.875,41		R\$ 402.852,98		R\$ -		R\$ 402.852,98		R\$ 10.457.022,43
5.1	TERRAPLENAGEM				R\$ 10.859.875,41		R\$ 402.852,98		R\$ -		R\$ 402.852,98		R\$ 10.457.022,43
5.1.1	BOTA-FORA				R\$ 1.144.899,44		R\$ 402.852,98		R\$ -		R\$ 402.852,98		R\$ 742.046,46
5.1.1.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_ 07/2020	m³	R\$ 16,81	2.462,23	R\$ 41.390,09	2.395,38	R\$ 40.266,37	-	R\$ -	2.395,38	R\$ 40.266,37	66,85	R\$ 1.123,72
5.1.1.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_ 07/2020	m³	R\$ 22,70	615,56	R\$ 13.973,15	538,45	R\$ 12.222,91	-	R\$ -	538,45	R\$ 12.222,91	77,10	R\$ 1.750,25
5.1.1.3	ESCAVAÇÃO EM 3ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM ROMPEDOR HIDRÁULICO	m³	R\$ 71,25	1.025,93	R\$ 73.097,46	538,45	R\$ 38.364,85	-	R\$ -	538,45	R\$ 38.364,85	487,48	R\$ 34.732,62
5.1.1.4	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_ 07/2020	m³	R\$ 10,64	16.004,50	R\$ 170.287,86	4.367,29	R\$ 46.467,91	-	R\$ -	4.367,29	R\$ 46.467,91	11.637,21	R\$ 123.819,94
5.1.1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	R\$ 3,20	264.422,15	R\$ 846.150,88	82.978,42	R\$ 265.530,94	-	R\$ -	82.978,42	R\$ 265.530,94	181.443,73	R\$ 580.619,93

CONCORRÊNCIA Nº 9.08.02/2025					MEDIÇÃO Nº: 9 DATA DA EMISSÃO: 08/07/2026 CONTRATO: Nº 2.08.018/2025 VALOR TOTAL DO CONTRATO= 38.554.542,31									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CANALIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL DO PRADO E ÁREAS CIRCUNVIZINHAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB														
DATA DA OS: 17/10/2025														
MEDIÇÃO: 9					VALOR = R\$ 38.554.542,31 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 8.315.601,23 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 494.429,03 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL = R\$ 8.810.030,26									
PERÍODO SIMPLES: 01/06/2026 30/06/2026														
PERÍODO ACUMULADO: 17/10/2025 30/06/2026					BOLETIM DE MEDIÇÃO									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO		
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	
5.1.2	ATERRO				R\$ 9.714.975,97		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 9.714.975,97	
5.1.2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERIAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_ 07/2020	m³	R\$ 17,20	45.363,39	R\$ 780.250,34	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	45.363,39	R\$ 780.250,34	
5.1.2.2	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	R\$ 45,27	46.052,12	R\$ 2.084.779,55	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	46.052,12	R\$ 2.084.779,55	
5.1.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	R\$ 3,20	368.416,97	R\$ 1.178.934,31	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	368.416,97	R\$ 1.178.934,31	
5.1.2.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_ 09/2024	m²	R\$ 2,34	17.753,53	R\$ 41.543,26	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	17.753,53	R\$ 41.543,26	
5.1.2.5	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_ 09/2024	m³	R\$ 7,65	57.790,86	R\$ 442.100,10	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	57.790,86	R\$ 442.100,10	
5.1.2.6	ENROCAMENTO COM PEDRA GRANÍTICA ARRUMADA	m³	R\$ 443,68	10.652,12	R\$ 4.726.131,71	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	10.652,12	R\$ 4.726.131,71	
5.1.2.7	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESURA DE *10 CM*. AF_ 01/2024	m²	R\$ 259,80	1.775,35	R\$ 461.236,70	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.775,35	R\$ 461.236,70	
6.0	DRENAGEM				R\$ 740.086,88		R\$ 1.741,77		R\$ -		R\$ 1.741,77		R\$ 738.345,11	
6.1	ESCAVAÇÕES DAS VALAS				R\$ 246.061,48		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 246.061,48	
6.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_ 09/2024	m³	R\$ 10,41	644,00	R\$ 6.704,04	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	644,00	R\$ 6.704,04	
6.1.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_ 09/2024	m³	R\$ 12,99	515,20	R\$ 6.692,44	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	515,20	R\$ 6.692,44	
6.1.3	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_ 03/2021	m³	R\$ 190,59	128,80	R\$ 24.547,99	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	128,80	R\$ 24.547,99	
6.1.4	RETRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_ 03/2021	m³	R\$ 40,92	128,80	R\$ 5.270,49	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	128,80	R\$ 5.270,49	
6.1.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_ 07/2020	m³	R\$ 10,64	180,32	R\$ 1.918,60	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	180,32	R\$ 1.918,60	
6.1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	R\$ 3,20	3.426,08	R\$ 10.963,45	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	3.426,08	R\$ 10.963,45	
6.1.7	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	R\$ 45,27	942,60	R\$ 42.671,50	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	942,60	R\$ 42.671,50	
6.1.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	R\$ 3,20	26.870,57	R\$ 85.985,83	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	26.870,57	R\$ 85.985,83	
6.1.9	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_ 04/2016	m³	R\$ 16,31	1.131,39	R\$ 18.452,97	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.131,39	R\$ 18.452,97	
6.1.10	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_ 08/2020	m²	R\$ 35,49	1.207,50	R\$ 42.854,17	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.207,50	R\$ 42.854,17	
6.2	TUBULAÇÃO				R\$ 265.505,54		R\$ 1.741,77		R\$ -		R\$ 1.741,77		R\$ 263.763,77	
6.2.1	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_ 03/2024	M	R\$ 138,21	700,00	R\$ 96.747,00	10,00	R\$ 1.382,10	-	R\$ -	10,00	R\$ 1.382,10	690,00	R\$ 95.364,90	
6.2.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_ 03/2024	M	R\$ 359,67	50,00	R\$ 17.983,50	1,00	R\$ 359,67	-	R\$ -	1,00	R\$ 359,67	49,00	R\$ 17.623,83	
6.2.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_ 08/2020	m³	R\$ 289,62	208,00	R\$ 60.240,96	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	208,00	R\$ 60.240,96	
6.2.4	ENROCAMENTO COM PEDRA GRANÍTICA ARRUMADA	m³	R\$ 435,26	208,00	R\$ 90.534,08	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	208,00	R\$ 90.534,08	
6.3	DISPOSITIVOS				R\$ 228.519,86		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 228.519,86	
6.3.1	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_ 12/2020	UN	R\$ 1.982,09	100,00	R\$ 198.209,00	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	100,00	R\$ 198.209,00	
6.3.2	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPA. AF_ 12/2020	UN	R\$ 3.247,26	7,00	R\$ 22.730,82	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	7,00	R\$ 22.730,82	
6.3.3	ACRESCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_ 12/2020	M	R\$ 2.174,97	1,47	R\$ 3.197,20	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1,47	R\$ 3.197,20	
6.3.4	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_ 12/2020	UN	R\$ 626,12	7,00	R\$ 4.382,84	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	7,00	R\$ 4.382,84	
7.0	PONTE E PASSARELAS				R\$ 513.615,08		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 513.615,08	
7.1	PONTE				R\$ 305.096,16		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 305.096,16	
7.1.1	ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS, C/ ESCORAS TUBULARES TIPO "B" (H=3,30 A 4,50 M), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	m²	R\$ 49,83	157,20	R\$ 7.833,27	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	157,20	R\$ 7.833,27	
7.1.2	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_ 09/2020	m²	R\$ 58,25	350,44	R\$ 20.413,13	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	350,44	R\$ 20.413,13	
7.1.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_ 06/2022	KG	R\$ 11,78	17,20	R\$ 202,61	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	17,20	R\$ 202,61	
7.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	R\$ 16,52	17,20	R\$ 284,14	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	17,20	R\$ 284,14	
7.1.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_ 06/2022	KG	R\$ 11,90	398,20	R\$ 4.738,58	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	398,20	R\$ 4.738,58	
7.1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	R\$ 14,76	398,20	R\$ 5.877,43	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	398,20	R\$ 5.877,43	
7.1.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_ 06/2022	KG	R\$ 10,97	2.643,20	R\$ 28.995,90	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2.643,20	R\$ 28.995,90	

CONCORRÊNCIA Nº 9.08.02/2025					MEDIÇÃO Nº: 9 DATA DA EMISSÃO: 08/07/2026 CONTRATO: Nº 2.08.018/2025 VALOR TOTAL DO CONTRATO= 38.554.542,31								
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CANALIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL DO PRADO E ÁREAS CIRCUNVIZINHAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB													
DATA DA OS: 17/10/2025													
MEDIÇÃO: 9					VALOR = R\$ 38.554.542,31 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 8.315.601,23 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 494.429,03 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL = R\$ 8.810.030,26								
PERÍODO SIMPLES: 01/06/2026 30/06/2026													
PERÍODO ACUMULADO: 17/10/2025 30/06/2026					BOLETIM DE MEDIÇÃO								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
7.1.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$ 13,18	2.643,20	R\$ 34.837,37	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2.643,20	R\$ 34.837,37
7.1.9	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	R\$ 9,41	265,80	R\$ 2.501,17	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	265,80	R\$ 2.501,17
7.1.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$ 11,09	265,80	R\$ 2.947,72	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	265,80	R\$ 2.947,72
7.1.11	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	KG	R\$ 9,33	2.518,50	R\$ 23.497,60	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2.518,50	R\$ 23.497,60
7.1.12	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$ 10,76	2.518,50	R\$ 27.099,06	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2.518,50	R\$ 27.099,06
7.1.13	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022	KG	R\$ 10,99	1.509,20	R\$ 16.586,10	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.509,20	R\$ 16.586,10
7.1.14	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$ 12,25	1.509,20	R\$ 18.487,70	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.509,20	R\$ 18.487,70
7.1.15	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4" - ALT=0,80M, C/1(UM) TUBO HORIZONTAL INTERMEDIÁRIO (4"), E PILARES A CADA 3,00M, EXCLUSIVE OS PILARES	m	R\$ 575,66	78,60	R\$ 45.246,87	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	78,60	R\$ 45.246,87
7.1.16	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA	m³	R\$ 691,03	94,85	R\$ 65.547,51	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	94,85	R\$ 65.547,51
7.2	PASSARELAS			R\$	208.518,92	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	208.518,92
7.2.1	ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS, C/ ESCORAS TUBULARES TIPO "B" (H=3,30 A 4,50 ML) COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	m²	R\$ 49,83	78,24	R\$ 3.898,69	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	78,24	R\$ 3.898,69
7.2.2	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_08/2020	m²	R\$ 58,25	111,10	R\$ 6.471,57	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	111,10	R\$ 6.471,57
7.2.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	R\$ 11,78	28,46	R\$ 335,24	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	28,46	R\$ 335,24
7.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$ 16,52	28,46	R\$ 470,14	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	28,46	R\$ 470,14
7.2.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	R\$ 11,78	68,45	R\$ 806,31	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	68,45	R\$ 806,31
7.2.6	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$ 15,09	68,45	R\$ 1.032,88	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	68,45	R\$ 1.032,88
7.2.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	R\$ 11,90	216,15	R\$ 2.572,18	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	216,15	R\$ 2.572,18
7.2.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$ 14,76	216,15	R\$ 3.190,37	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	216,15	R\$ 3.190,37
7.2.9	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	R\$ 10,97	560,35	R\$ 6.147,06	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	560,35	R\$ 6.147,06
7.2.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$ 13,18	560,35	R\$ 7.385,43	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	560,35	R\$ 7.385,43
7.2.11	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	R\$ 9,41	525,80	R\$ 4.947,75	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	525,80	R\$ 4.947,75
7.2.12	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$ 11,09	525,80	R\$ 5.831,09	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	525,80	R\$ 5.831,09
7.2.13	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	KG	R\$ 11,61	5.325,44	R\$ 61.828,35	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	5.325,44	R\$ 61.828,35
7.2.14	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$ 10,76	5.325,44	R\$ 57.301,73	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	5.325,44	R\$ 57.301,73
7.2.15	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA	m	R\$ 135,35	195,60	R\$ 26.474,46	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	195,60	R\$ 26.474,46
7.2.16	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=25MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA	m³	R\$ 671,82	29,51	R\$ 19.825,67	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	29,51	R\$ 19.825,67
8.0	PAVIMENTAÇÃO			R\$	4.423.261,92	R\$	1.107.161,60	R\$	-	R\$	1.107.161,60	R\$	3.316.100,32
8.1	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_08/2024	m³	R\$ 33,70	7.101,41	R\$ 239.317,58	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	7.101,41	R\$ 239.317,58
8.2	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	R\$ 45,27	7.101,41	R\$ 321.480,92	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	7.101,41	R\$ 321.480,92
8.3	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	m³	R\$ 128,07	3.550,71	R\$ 454.738,91	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	3.550,71	R\$ 454.738,91
8.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M³). AF_07/2020	m³	R\$ 10,07	8.521,69	R\$ 85.813,46	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	8.521,69	R\$ 85.813,46
8.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	M³XKM	R\$ 3,20	68.173,56	R\$ 218.155,37	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	68.173,56	R\$ 218.155,37
8.6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	m³	R\$ 7,65	7.101,41	R\$ 54.325,80	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	7.101,41	R\$ 54.325,80
8.7	EXECUÇÃO DE IMPIRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	m²	R\$ 8,30	17.753,53	R\$ 147.354,29	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	17.753,53	R\$ 147.354,29
8.8	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLOAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m²	R\$ 1.703,52	887,68	R\$ 1.512.174,67	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	887,68	R\$ 1.512.174,67
8.9	DERIPA - 06.000.00 - DEFENSA METÁLICA REFLETIVA MALEÁVEL, SIMPLES FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M	R\$ 826,24	1.682,20	R\$ 1.389.900,92	1.340,00	R\$ 1.107.161,60	-	R\$ -	1.340,00	R\$ 1.107.161,60	342,20	R\$ 282.739,32
9.0	CALÇADAS, CICLOVIAS E ÁREAS VERDES			R\$	2.343.448,54	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.343.448,54
9.1	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 08 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ÁREA E BRITA COMERCIAIS	m	R\$ 50,98	3.753,77	R\$ 191.367,19	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	3.753,77	R\$ 191.367,19
9.2	ASSENTAMENTO DE GUARDA-FIO EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X1300 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	R\$ 44,65	7.212,62	R\$ 322.043,48	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	7.212,62	R\$ 322.043,48
9.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO, COM A UTILIZAÇÃO DE FIBRA POLIPROPILENO, ACABAMENTO CONVENCIONAL	m²	R\$ 1.440,76	968,88	R\$ 1.395.923,54	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	968,88	R\$ 1.395.923,54
9.4	GRAMA NATIVA CAPIM DE BURRO OU BATATAIS, EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	m²	R\$ 23,85	2.912,97	R\$ 69.474,33	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2.912,97	R\$ 69.474,33
9.5	CONFECCÃO DE BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 MM	m	R\$ 227,90	1.600,00	R\$ 364.640,00	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.600,00	R\$ 364.640,00

CONCORRÊNCIA Nº 9.08.02/2025				MEDIÇÃO Nº: 9 DATA DA EMISSÃO: 08/07/2026 CONTRATO: Nº 2.08.018/2025 VALOR TOTAL DO CONTRATO= 38.554.542,31									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CANALIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL DO PRADO E ÁREAS CIRCUNVIZINHAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB													
DATA DA OS: 17/10/2025													
MEDIÇÃO: 9				VALOR = R\$ 38.554.542,31 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 8.315.601,23 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 494.429,03 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL = R\$ 8.810.030,26									
PERÍODO SIMPLES: 01/06/2026 30/06/2026													
PERÍODO ACUMULADO: 17/10/2025 30/06/2026				BOLETIM DE MEDIÇÃO									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
10.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				R\$ 1.019.169,82		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.019.169,82
10.1	ILUMINAÇÃO				R\$ 1.012.304,18		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.012.304,18
10.1.1	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3) LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL, DE INTERFERÊNCIA. AF_ 09/2024	m³	R\$ 7,81	366,70	R\$ 2.863,92	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	366,70	R\$ 2.863,92
10.1.2	CONCRETAGEM COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	m³	R\$ 677,94	61,10	R\$ 41.422,13	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	61,10	R\$ 41.422,13
10.1.3	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	R\$ 9,77	1.300,00	R\$ 12.701,00	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.300,00	R\$ 12.701,00
10.1.4	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, 0,6/1 KV, 4 CONDUTORES DE 4 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	R\$ 214,71	1.900,00	R\$ 407.949,00	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.900,00	R\$ 407.949,00
10.1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0 6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	M	R\$ 14,20	40,00	R\$ 568,00	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	40,00	R\$ 568,00
10.1.6	CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	R\$ 16,84	150,00	R\$ 2.526,00	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	150,00	R\$ 2.526,00
10.1.7	CONEXÃO EM DERIVAÇÃO PARALELA - 6,0-1,5MM² DE EMENDA, PARA CABO MULTIPOLAR (14X4,0) MM2, CABO PASSANTE 1,5-6,0MM2 E CABO DERIVADO 1,5-2,5MM2, ACOMPANHADO DE JUNTA COM GEL, CONECTOR DE BORNES PENTA-POLAR ISOLADA E CHAVE SEXTAVADA DE APERTO, GRAU DE PROTEÇÃO IPX8, CONFORME NORMA CEI EN 50393	UN	R\$ 22,19	110,00	R\$ 2.440,90	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	110,00	R\$ 2.440,90
10.1.8	CONEXÃO DE EMENDA - 6,0/1,5MM² EM DERIVAÇÃO "T", PARA CABO MULTIPOLAR (14X4,0) MM2, DERIVAÇÃO PARA CABO MULTIPOLAR 10X1,5MM2, ACOMPANHADO DE JUNTA COM GEL, SEPARADOR DAS FASES E BRACADEIRAS, GRAU DE PROTEÇÃO IPX8, CONFORME NORMA CEI EN 50393	UN	R\$ 138,77	110,00	R\$ 15.264,70	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	110,00	R\$ 15.264,70
10.1.9	BLOQUEADOR DE VAZAMENTO DE CORRENTE: DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE PESSOAS E ANIMAIS CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS EM POSTES METÁLICOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, IP 68 IK 08 CORRENTE DE BLOQUEIO 30mA, MÁXIMA CORRENTE DE CARGA 5A; ALIMENTAÇÃO 220V/60HZ; TEMPO DE ATUAÇÃO < 50MS ; RESET IMÃ; CAIXA COM PROTEÇÃO UV	un	R\$ 280,34	104,00	R\$ 29.155,36	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	104,00	R\$ 29.155,36
10.1.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	M	R\$ 17,09	22,00	R\$ 375,98	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	22,00	R\$ 375,98
10.1.11	ELETRODUTO DUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	R\$ 12,19	1.830,00	R\$ 22.307,70	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.830,00	R\$ 22.307,70
10.1.12	DER/JPB - 06.000.00 - DEFENSA METÁLICA REFLETIVA MALEAVEL SIMPLES FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	m	R\$ 826,24	52,00	R\$ 42.964,48	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	52,00	R\$ 42.964,48
10.1.13	LUMINÁRIA LED 76W - LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM ALUMÍNIO FUNDIDO LEDHP (LED HIGH POWER), SUPORTE DE MONTAGEM AJUSTÁVEL, FACHO ABERTO, POTÊNCIA 110W, TEMPERATURA DE COR - 4.000K - IRC >70, FLUXO LUMINOSO - 13.600 LUMENS, FATOR DE POTÊNCIA 0,92, TENSÃO 220 V - IP 66, VIDA ÚTIL - 78.000 HORAS, REF-BRP482 LED136 NW 76W DWL P7 0-10 OU SIMILAR	un	R\$ 1.495,18	52,00	R\$ 77.749,36	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	52,00	R\$ 77.749,36
10.1.14	POSTE METÁLICO CURVO DUPLO - POSTE METÁLICO DUPLO CURVO COM 12M DE ALTURA UTIL, PARA INSTALAÇÃO COM BASE E CHUMBADORES, EM AÇO CARBONO 1010/1020 GALVANIZAÇÃO A FOGO E PINTURA EPOXI, CONFORME NBR 14744 E NBR 6323.	un	R\$ 4.695,79	52,00	R\$ 244.181,08	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	52,00	R\$ 244.181,08
10.1.15	BASE METÁLICA PARA POSTE - BASE METÁLICA PARA POSTE EM CHAPA #3/8" GALVANIZADA A FOGO MEDINDO 0,30X0,30M, CONFORME DETALHE EM ANEXO	UN	R\$ 394,58	52,00	R\$ 20.518,16	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	52,00	R\$ 20.518,16
10.1.16	BASE EM CONCRETO PARA POSTE 0,40X0,40X0,80M	UN	R\$ 154,58	52,00	R\$ 8.038,16	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	52,00	R\$ 8.038,16
10.1.17	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,80X0,80MX0,20M (COM BASE NO ORSE 6419)	UN	R\$ 384,09	56,00	R\$ 21.509,04	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	56,00	R\$ 21.509,04
10.1.18	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,50 X 0,50 X 0,50M	un	R\$ 394,21	56,00	R\$ 22.075,76	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	56,00	R\$ 22.075,76
10.1.19	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2023	UN	R\$ 101,13	52,00	R\$ 5.258,76	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	52,00	R\$ 5.258,76
10.1.20	GRAMPO METÁLICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATÉ 5/8", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2	UN	R\$ 44,26	52,00	R\$ 2.301,52	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	52,00	R\$ 2.301,52
10.1.21	RELE FOTOELÉTRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	R\$ 41,42	104,00	R\$ 4.307,68	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	104,00	R\$ 4.307,68
10.1.22	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 31,45	193,50	R\$ 6.085,57	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	193,50	R\$ 6.085,57
10.1.23	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 26,40	193,50	R\$ 5.108,40	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	193,50	R\$ 5.108,40
10.1.24	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIÚRNO. AF_ 06/2014	CHP	R\$ 331,03	44,20	R\$ 14.631,52	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	44,20	R\$ 14.631,52
10.2	QUADRO DE PROTEÇÃO				R\$ 1.869,75		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.869,75
10.2.1	CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X40X20 CM	un	R\$ 289,69	2,00	R\$ 579,38	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 579,38
10.2.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	R\$ 84,64	2,00	R\$ 169,28	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 169,28
10.2.3	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	R\$ 79,42	2,00	R\$ 158,84	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 158,84
10.2.4	BARRAMENTO TRIFÁSICO	m	R\$ 192,82	2,00	R\$ 385,64	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 385,64
10.2.5	TRILHO SUPORTE P/ FIXAÇÃO RÁPIDA DIN	M	R\$ 13,50	1,00	R\$ 13,50	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 13,50
10.2.6	POSTE BALIZADOR PARA JARDIM, EM ALUMÍNIO PRETO, + LED 12 W BRANCO FRIO 374,00 (12x30x115) (AR LUMEN OU SIMILAR)	un	R\$ 136,93	2,00	R\$ 273,86	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 273,86
10.2.7	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 31,45	5,00	R\$ 157,25	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	5,00	R\$ 157,25
10.2.8	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 26,40	5,00	R\$ 132,00	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	5,00	R\$ 132,00
10.3	MEDIÇÃO				R\$ 4.995,89		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 4.995,89
10.3.1	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 40MM, D=1 1/2"	un	R\$ 4,63	8,00	R\$ 37,04	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	8,00	R\$ 37,04
10.3.2	CABECOTE DE ALUMÍNIO DE 1 1/2"	un	R\$ 19,81	8,00	R\$ 158,48	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	8,00	R\$ 158,48
10.3.3	CABO DE COBRE NU 16 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (7,04MIKG)	kg	R\$ 158,39	5,70	R\$ 902,82	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	5,70	R\$ 902,82

CONCORRÊNCIA Nº 9.08.02/2025				MEDIÇÃO Nº: 9 DATA DA EMISSÃO: 06/07/2026 CONTRATO: Nº 2.06.018/2025 VALOR TOTAL DO CONTRATO= 38.554.542,31									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CANALIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL DO PRADO E ÁREAS CIRCUNVIZINHAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB													
DATA DA OS: 17/10/2025													
MEDIÇÃO: 9				VALOR = R\$ 38.554.542,31 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 8.315.601,23 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 494.429,03 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL = R\$ 8.810.030,26									
PERÍODO SIMPLES: 01/06/2026 30/06/2026													
PERÍODO ACUMULADO: 17/10/2025 30/06/2026				BOLETIM DE MEDIÇÃO									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
10.3.4	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLÁSTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRÃO ENERGISA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 345,93	2,00	R\$ 691,86	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 691,86
10.3.5	CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATÉ 16 MM²	UN	R\$ 9,12	2,00	R\$ 18,24	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 18,24
10.3.6	GRAMPO METÁLICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATÉ 5/8", CONDUTOR DE 10 A 25 MM²	UN	R\$ 44,26	8,00	R\$ 354,08	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	8,00	R\$ 354,08
10.3.7	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2"	UN	R\$ 97,02	2,00	R\$ 194,04	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 194,04
10.3.8	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	R\$ 84,64	2,00	R\$ 169,28	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 169,28
10.3.9	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, SEMI-PESADO, DIÂMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM	M	R\$ 27,19	12,00	R\$ 326,28	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	12,00	R\$ 326,28
10.3.10	FITA AÇO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	UN	R\$ 112,73	1,00	R\$ 112,73	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 112,73
10.3.11	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AE. 08/2023	UN	R\$ 101,13	6,00	R\$ 606,78	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	6,00	R\$ 606,78
10.3.12	LUVA PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, COM ROSCA, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2")	UN	R\$ 5,35	4,00	R\$ 21,40	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	4,00	R\$ 21,40
10.3.13	MASSA PARA CALAFETAR JUNTAS	KG	R\$ 33,10	2,00	R\$ 66,20	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 66,20
10.3.14	FILETE DE MÁRMORE BRANCO, 2 CM, PARA ACABAMENTOS	m	R\$ 48,15	20,00	R\$ 963,00	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	20,00	R\$ 963,00
10.3.15	TERMINAL P/ FIO OU CABO, A COMPRESSÃO POR INDENTACÃO, DE COBRE/ELETROLÍTICO, ESTANHADO, BITOLA 10MM²	Un	R\$ 1,66	16,00	R\$ 26,56	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	16,00	R\$ 26,56
10.3.16	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 31,45	6,00	R\$ 188,70	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	6,00	R\$ 188,70
10.3.17	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 26,40	6,00	R\$ 158,40	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	6,00	R\$ 158,40
				TOTAL =	R\$ 38.554.542,31		R\$ 8.315.601,23		R\$ 494.429,03		R\$ 8.810.030,26		R\$ 29.744.512,02

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CANALIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL DO PRADO E ÁREAS CIRCUNVIZINHAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB																				
MEMÓRIA DE CÁLCULO																				
ITEM	SERVIÇOS	ESTACA				COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	ALTURA	VOLUME	EMPOLAMENTO	DENSIDADE	PESO	DMT	MÊS	H	UN	QUANTIDADES		OBSERVAÇÃO
		Inicial		Final														Parciais	Totais	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO																	Executado	2,54	
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA																	0,01	0,01	MEDICAÇÃO 01
																		0,27	0,27	MEDICAÇÃO 02
																		0,43	0,43	MEDICAÇÃO 03
																		0,21	0,21	MEDICAÇÃO 04
																		0,63	0,63	MEDICAÇÃO 05
																		0,99	0,99	MEDICAÇÃO 06
																		0,27	0,27	MEDICAÇÃO 07
																		0,20	0,20	MEDICAÇÃO 08
																		0,28	0,28	MEDICAÇÃO 09
2.0	INSTALAÇÕES E CANTEIRO DE OBRAS																			
2.1	CANTEIRO DE OBRA																			
2.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)																	Executado	7,00	
															1,00			1,00		MEDICAÇÃO 02
															1,00			1,00		MEDICAÇÃO 03
															1,00			1,00		MEDICAÇÃO 04
															1,00			1,00		MEDICAÇÃO 05
															1,00			1,00		MEDICAÇÃO 06
															1,00			1,00		MEDICAÇÃO 07
															1,00			1,00		MEDICAÇÃO 08
															1,00			1,00		MEDICAÇÃO 09
2.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)																	Executado	7,00	
															1,00			1,00		MEDICAÇÃO 02
															1,00			1,00		MEDICAÇÃO 03
															1,00			1,00		MEDICAÇÃO 04
															1,00			1,00		MEDICAÇÃO 05
															1,00			1,00		MEDICAÇÃO 06
															1,00			1,00		MEDICAÇÃO 07
															1,00			1,00		MEDICAÇÃO 08
															1,00			1,00		MEDICAÇÃO 09
2.4	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M																	Executado	7,00	
															1,00			1,00		MEDICAÇÃO 02
															1,00			1,00		MEDICAÇÃO 03
															1,00			1,00		MEDICAÇÃO 04
															1,00			1,00		MEDICAÇÃO 05
															1,00			1,00		MEDICAÇÃO 06
															1,00			1,00		MEDICAÇÃO 07
															1,00			1,00		MEDICAÇÃO 08
															1,00			1,00		MEDICAÇÃO 09
4.0	CANAL PRINCIPAL																			
4.1	ESCAVAÇÃO DA SEÇÃO DO CANAL																			
4.1.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024																	Executado	986,89	
										1.292,98			0,20					258,60		MEDICAÇÃO 03 (DESVIO E31+0,00 m a 43+8,31 m)
										648,29								648,29		MEDICAÇÃO 07 (SEÇÃO E20+2,11M A 22+3,16m)
										80,00								80,00		MEDICAÇÃO 09
4.1.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020																	Executado	22.591,86	
										1.629,15								1.629,15		MEDICAÇÃO 03 (DESVIO E31+0,00 m a 43+8,31 m)
										3.320,77								3.320,77		MEDICAÇÃO 04 (SEÇÃO DO CANAL E40+17,83m a 43+19,89 m)
										11.002,29								11.002,29		MEDICAÇÃO 05 (SEÇÃO DO CANAL E31 A E44+10,43)
										5.453,26								5.453,26		E22+1,65M A 22+13,97m e E31m A E44+10,43m
										1.186,37								1.186,37		MEDICAÇÃO 07 (SEÇÃO E20+2,11M A 22+3,16m)
										1.073,79								1.073,79		MEDICAÇÃO 08 (SEÇÃO 18+18,11 A 22+14,71)
										100,00								100,00		MEDICAÇÃO 09
4.1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020																	Executado	433.720,95	

[illegible]

[illegible]

Obra: Canal do Prado																			
Cronograma Físico e Financeiro																			
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.250.014,56	1,42%	1,83%	4,03%	1,50%	4,35%	6,82%	1,89%	1,36%	1,23%	15,11%	15,11%	15,11%	15,11%	15,11%			
			R\$ 17.763,78	R\$ 22.928,62	R\$ 50.412,02	R\$ 18.745,55	R\$ 54.341,40	R\$ 85.211,66	R\$ 23.596,72	R\$ 16.993,53	R\$ 15.430,02	R\$ 188.918,25	R\$ 188.918,25	R\$ 188.918,25	R\$ 188.918,25	R\$ 188.918,25			
2	INSTALAÇÕES E CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 192.835,68		1,46%	71,44%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	3,67%	3,67%	3,67%	3,67%	3,67%			
				R\$ 2.815,59	R\$ 137.758,89	R\$ 2.815,59	R\$ 2.815,59	R\$ 2.815,59	R\$ 2.815,59	R\$ 2.815,59	R\$ 2.815,59	R\$ 7.073,53	R\$ 7.073,53	R\$ 7.073,53	R\$ 7.073,53	R\$ 7.073,53			
3	LIMPEZA E DEMOLIÇÕES	R\$ 1.543.155,60	30,90%	46,47%			11,50%			1,83%		4,63%	4,63%						
			R\$ 476.774,71	R\$ 717.040,50			R\$ 178.203,54			R\$ 28.205,31		R\$ 71.465,77	R\$ 71.465,77						
4	CANAL PRINCIPAL	R\$ 15.669.078,82			1,10%	3,35%	9,60%	9,87%	3,26%	4,47%	3,04%	21,77%	21,77%	21,77%	21,77%				
					R\$ 172.874,01	R\$ 524.818,28	R\$ 1.504.928,56	R\$ 1.545.854,00	R\$ 510.784,29	R\$ 699.715,98	R\$ 476.183,43	R\$ 3.411.306,76	R\$ 3.411.306,76	R\$ 3.411.306,76	R\$ 3.411.306,76				
5	VIAS PROJETADAS	R\$ 10.859.875,41			2,95%			0,63%		0,13%		24,07%	24,07%	24,07%	24,07%				
					R\$ 320.085,06			R\$ 68.790,05		R\$ 13.977,87		R\$ 2.614.255,61	R\$ 2.614.255,61	R\$ 2.614.255,61	R\$ 2.614.255,61				
6	DRENAGEM	R\$ 740.086,88								0,24%		49,88%	49,88%						
										R\$ 1.741,77		R\$ 369.172,56	R\$ 369.172,56						
7	PONTE E PASSARELAS	R\$ 513.615,08										50,00%	50,00%						
												R\$ 256.807,54	R\$ 256.807,54						
8	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 4.423.261,92						25,03%				18,74%	18,74%	18,74%	18,74%				
								R\$ 1.107.161,60				R\$ 829.025,08	R\$ 829.025,08	R\$ 829.025,08	R\$ 829.025,08				
9	CALÇADAS, CICLOVIAS E ÁREAS VERDES	R\$ 2.343.448,54										25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
												R\$ 585.862,14	R\$ 585.862,14	R\$ 585.862,14	R\$ 585.862,14				
10	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 1.019.169,82										10,00%	15,00%	20,00%	45,00%	10,00%			
												R\$ 101.916,98	R\$ 152.875,47	R\$ 203.833,96	R\$ 458.626,42	R\$ 101.916,98			
Porcentagem			1,28%	1,93%	1,77%	1,42%	4,51%	7,29%	1,39%	1,98%	1,28%	21,88%	22,01%	20,34%	12,15%	0,77%			
Custo			R\$ 494.538,49	R\$ 742.784,72	R\$ 681.129,98	R\$ 546.379,42	R\$ 1.740.289,09	R\$ 2.809.832,90	R\$ 537.196,60	R\$ 763.450,04	R\$ 494.429,03	R\$ 8.435.904,21	R\$ 8.486.762,71	R\$ 7.840.275,33	R\$ 4.683.761,03	R\$ 297.908,77			
Porcentagem Acumulado			1,28%	3,21%	4,98%	6,39%	10,91%	18,19%	19,59%	21,57%	22,85%	44,73%	66,74%	87,08%	99,23%	100,00%			
Custo Acumulado			R\$ 494.538,49	R\$ 1.237.323,20	R\$ 1.918.453,18	R\$ 2.464.832,60	R\$ 4.205.121,69	R\$ 7.014.954,59	R\$ 7.552.151,20	R\$ 8.315.601,23	R\$ 8.810.030,27	R\$ 17.245.934,48	R\$ 25.732.597,19	R\$ 33.572.872,52	R\$ 38.256.633,54	R\$ 38.554.542,31			



GRUPO
ROCHA
CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	194	Data do relatório	01/06/2026	Dia da semana	Segunda-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição	Índice pluviométrico
Manhã	☀️ Claro	Praticável	3 mm
Tarde	☀️ Claro	Praticável	

Mão de obra (31)						
Auxiliar de Topografia 1	Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Mão de Obra Própria (29)
Servente 8	Pedreiro 1	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	
Carpinteiro 3	Motorista de Veículo Pesado 4	Auxiliar de Serviços Gerais 1				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (7)					
Escavadeira 2	Caminhão Basculante 4	Retro Escavadeira 1			

Atividades (6)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Esgotamento d'água.	Em Andamento
Limpeza de material de 1ª categoria e 2ª categoria. Lado E (Est-14 a Est-18) / Lado D (Est-16 a Est-18)	Em Andamento
Execução da escavação do desvio Lado E (Est-15 a Est-18)	Em Andamento
Execução de enrocamento de pedra para implantação do piso do canal principal (Est-31+10 e Est-32+10)	Em Andamento
Desmontagem e montagem das fôrmas das paredes laterais do canal principal.	Em Andamento

Fotos (7)




06:56 | 01/06/2026
Seg
2159 Rua Espírito Santo, Jardim Paulistano, Campina Grande PB, 58415-265
Lat/Long: 7°16'1"S, 35°53'26"W
Tempo: Nuvens 21°C
Altitude: 493.1m
Bússola: 285° W



07:52 | 01/06/2026
Seg
2040 Rua Sergipe, Tambor, Campina Grande PB, 58414-460
Lat/Long: 7°14'45"S, 35°53'22"W
Tempo: Nuvens 21°C
Altitude: 495.6m
Bússola: 250° W

Precipitação de final de semana.

1 / 2

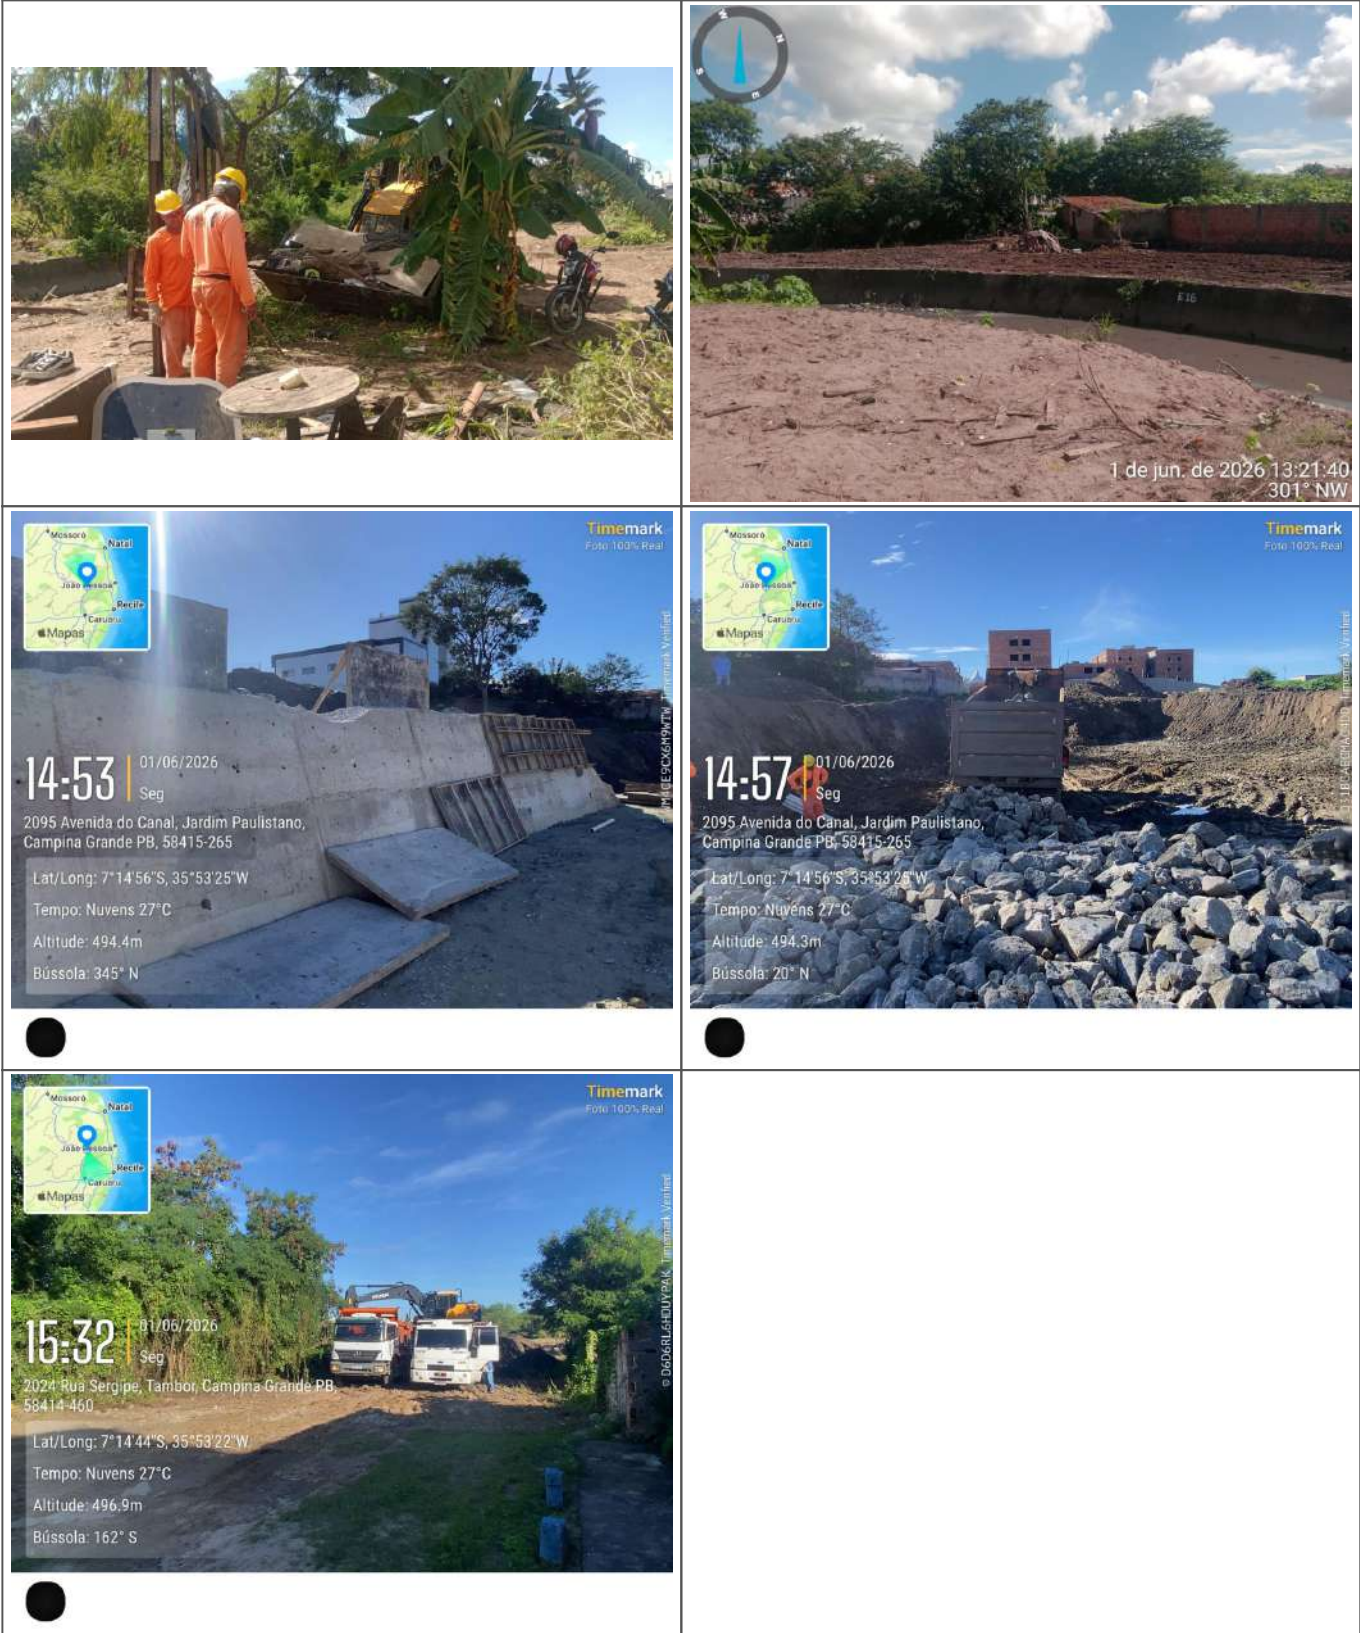

Pedro Saulo
CONSTRUTORA ROCHA CARVALHO
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899375

Assinatura

[Signature]
FELIPE RIBEIRO DE SOUZA
RND - CIV - 0341184244

Assinatura

[Signature]
Luiz Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - SEC08 PMGO

Assinatura



GRUPO
ROCHA
CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	195	Data do relatório	02/06/2026	Dia da semana	Terça-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				


Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Nublado	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (31)						
Auxiliar de Topografia 1	Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Mão de Obra Própria (29)
Servente 8	Pedreiro 1	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	
Carpinteiro 3	Motorista de Veículo Pesado 4	Auxiliar de Serviços Gerais 1				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (7)					
Escavadeira 2	Caminhão Basculante 4	Retro Escavadeira 1			

Atividades (6)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Limpeza de material de 1ª categoria e 2ª categoria. Lado E (Est-14 a Est-18) / Lado D (Est-16 a Est-18)	Em Andamento
Execução de enrocamento de pedra para implantação do piso do canal principal (Est-31+10 e Est-32+10)	Em Andamento
Desmontagem e montagem das fôrmas das paredes laterais do canal principal	Em Andamento
Execução da escavação do desvio Lado E (Est-15 a Est-18)	Em Andamento
Concretagem da parede do canal principal. Lado D (Est-33+15 a Est-35 terceira etapa / Est-40 a Est-42+7 Terceira etapa)	Em Andamento



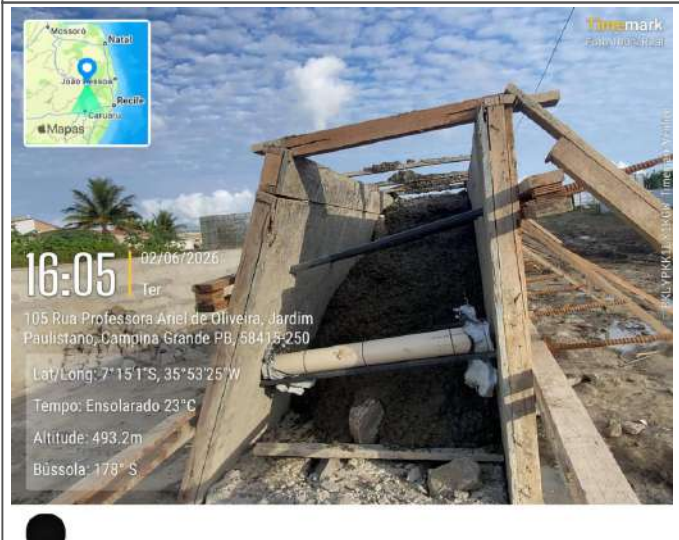

Vídeos (1)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:11


CONSTRUTORA ROCHA CARVALHO EIRE
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899375

Assinatura


Felipe Henrique Soares Pinto
Eng. Civil - CREA 1621394060

Assinatura


Luiz Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394060
Eng. Civil - SECCO8 PMGO

Assinatura



GRUPO
ROCHA
CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	196	Data do relatório	03/06/2026	Dia da semana	Quarta-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Nublado	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (31)						
Auxiliar de Topografia 1	Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Mão de Obra Própria (29)
Servente 8	Pedreiro 1	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	
Carpinteiro 3	Motorista de Veículo Pesado 4	Auxiliar de Serviços Gerais 1				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (7)					
Escavadeira 2	Caminhão Basculante 4	Retro Escavadeira 1			

Atividades (5)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Limpeza de material de 1ª categoria e 2ª categoria. Lado E (Est-14 a Est-18) Lado D (Est-16 a Est-18)	Em Andamento
Execução de enrocamento de pedra para implantação do piso do canal principal (Est-31+10 e Est-32+10)	Em Andamento
Desmontagem e montagem das fôrmas das paredes laterais do canal principal.	Em Andamento
Execução da escavação do desvio Lado E (Est-15 a Est-18)	Em Andamento



08:08 | 03/06/2026
Qua
2159 Rua Espírito Santo, Jardim Paulistano,
Campina Grande PB, 58415-265
Lat/Long: 7°15'3"S, 35°53'25"W
Tempo: Nuvens 22°C
Altitude: 488.9m
Bússola: 2° N





3 de jun. de 2026 08:59:17
184° S
1991 Rua Espírito Santo
Jardim Paulistano
Campina Grande
Paraíba
Altitude: 489.1msnm
Velocidade: 0.5km/h






Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899375
Assinatura


Luiz Henrique Soares Pires
Eng. Civil - SECCO P/MGO
Assinatura


Luiz Henrique Soares Pires
CREA - PB 1621394060
Eng. Civil - SECCO P/MGO
Assinatura



Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	197	Data do relatório	04/06/2026	Dia da semana	Quinta-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (32)

Mão de Obra (32)						
Auxiliar de Topografia 1	Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Mão de Obra Própria (30)
Servente 8	Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	
Carpinteiro 3	Motorista de Veículo Pesado 4	Auxiliar de Serviços Gerais 1				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (7)



Escavadeira 2	Caminhão Basculante 4	Retro Escavadeira 1			
------------------	--------------------------	------------------------	--	--	--

Atividades (5)

Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Limpeza de material de 1ª categoria e 2ª categoria Lado E (Est-10 a Est-18)	Em Andamento
Execução de enrocamento de pedra para implantação do piso do canal principal (Est-31+10 e Est-32+10)	Em Andamento
Desmontagem e montagem das fôrmas das paredes laterais do canal principal.	Em Andamento
Concretagem da parede do canal principal Lado D (Est-33+15 a Est-35 *Complemento Terceira Etapa / Est-36 a Est-36+12 Terceira etapa)	Em Andamento

Fotos (8)



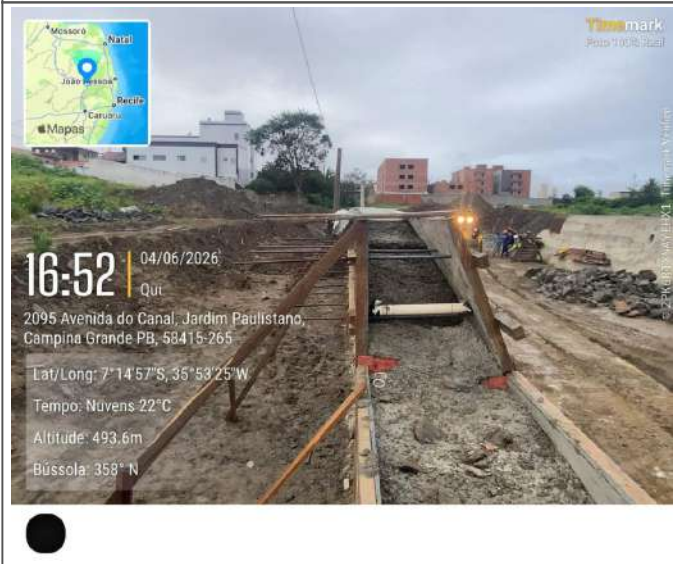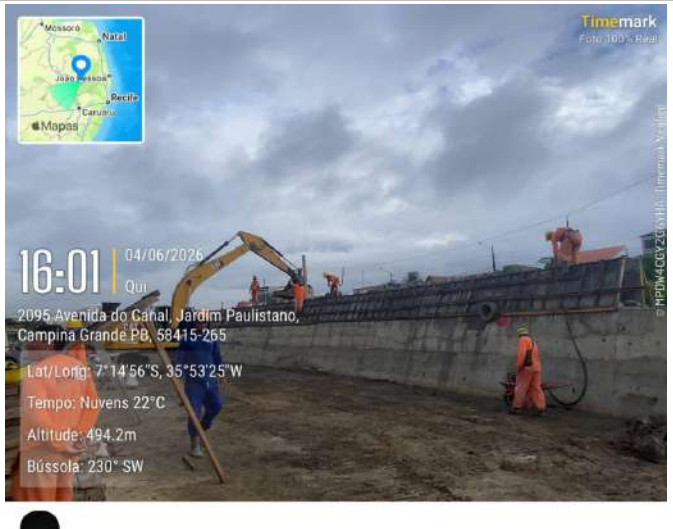


Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899375

Assinatura


Luiz Henrique Soares Pinto
Eng. Civil - CREA PB 1621899375

Assinatura


Luiz Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - SECOP PMGO

Assinatura



Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório n°	198	Data do relatório	05/06/2026	Dia da semana	Sexta-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (32)

Auxiliar de Topografia 1	Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Mão de Obra Própria (30)
Servente 8	Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	
Carpinteiro 3	Motorista de Veículo Pesado 4	Auxiliar de Serviços Gerais 1				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (7)


Escavadeira 2	Caminhão Basculante 4	Retro Escavadeira 1			
------------------	--------------------------	------------------------	--	--	--

Atividades (5)

Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Limpeza de material de 1ª categoria e 2ª categoria Lado E (Est-10 a Est-18)	Em Andamento
Execução de enrocamento de pedra para implantação do canal principal entre a Est-31+10 e a Est-32+10. (Efetuando a regularização e o nivelamento das pedras)	Em Andamento
Execução dos barbacãs no enrocamento de pedra para implantação do piso do Canal principal.	Em Andamento
Desmontagem e montagem das fôrmas das paredes laterais do canal principal.	Em Andamento

Fotos (5)

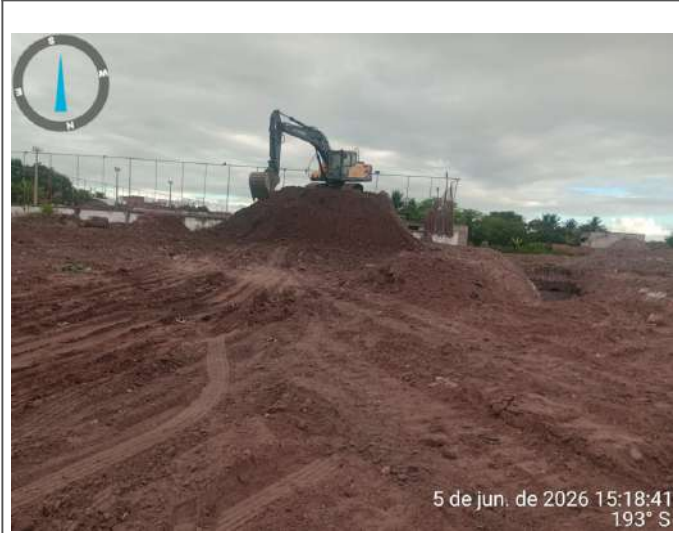

 5 de jun. de 2026 15:18:41 193° S	 15:24 05/06/2026 Sex 2159 Rua Espírito Santo, Jardim Paulistano, Campina Grande PB, 58415-265 Lat/Long: 7°14'58"S, 35°53'26"W Tempo: Nuvens 24°C Altitude: 493.8m Bússola: 154° SE
 5 de jun. de 2026 16:52:02 7.2490566666666666S 35.89061W 2184 Rua Espírito Santo Jardim Paulistano Campina Grande Paraíba #CONSTRUTORA ROCHA	


CONSTRUTORA ROCHA CALDETE
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899375
Assinatura


Felipe Augusto de Almeida
Eng. Civil - 054318402441
Assinatura


Luiz Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394060
Eng. Civil - SECCO6 PMGO
Assinatura



GRUPO

ROCHA

CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	199	Data do relatório	06/06/2026	Dia da semana	Sábado
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (31)

Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Servente 8	Mão de Obra Própria (29)
Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	Carpinteiro 3	
Motorista de Veículo Pesado 4	Auxiliar de Serviços Gerais 1					
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (7)

Escavadeira 2	Caminhão Basculante 4	Retro Escavadeira 1			
------------------	--------------------------	------------------------	--	--	--


Atividades (5)

Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Limpeza de material de 1ª categoria e 2ª categoria. Lado E (Est-10 a Est-18)	Em Andamento
Desmontagem e montagem das fôrmas das paredes laterais do canal principal.	Em Andamento
Execução do desvio Lado E entre a Est-15 e a Est-18 (Colocação de Pedras no talude do desvio)	Em Andamento
Concretagem do lastro (piso) do canal principal entre a Est-32 e a Est-33	Em Andamento

Fotos (11)



6 de jun. de 2026 07:21:45
180° S

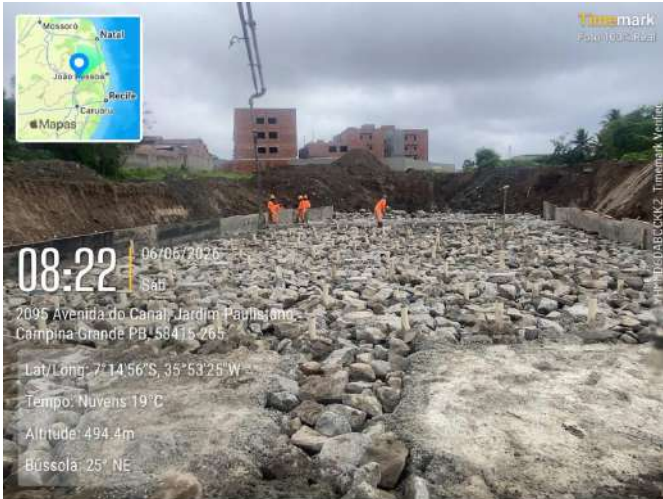

08:22 | 06/06/2026
São
2095 Avenida do Canal, Jardim Pavilhão,
Campina Grande PB, 58415-265
Lat/Long: 7°14'56"S, 35°53'25"W
Tempo: Nuvens 19°C
Altitude: 494.4m
Bússola: 25° NE

1 / 3





Vídeos (1)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:08


CONSTRUTORA ROCHA CARVALHO
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899375
Assinatura


Felipe Augusto de Almeida
Eng. Civil - CREA 184324441
Assinatura


Luiz Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - SECCO6 PMGO
Assinatura



GRUPO
ROCHA
CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	200	Data do relatório	08/06/2026	Dia da semana	Segunda-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição	Índice pluviométrico
Manhã	☀️ Claro	Praticável	12.5 mm
Tarde	☀️ Claro	Praticável	

Mão de obra (33)						
Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Servente 8	Mão de Obra Própria (31)
Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	Carpinteiro 3	
Motorista de Veículo Pesado 4	Auxiliar de Serviços Gerais 1	Auxiliar de Topografia 2				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (7)					
Escavadeira 2	Caminhão Basculante 4	Retro Escavadeira 1			

Atividades (5)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Limpeza de material de 1ª categoria e 2ª categoria Lado E (Est-10 a Est-18)	Em Andamento
Desmontagem e montagem das fôrmas das paredes laterais do canal principal	Em Andamento
Colocação dos barbacãs no enrocamento de pedra para implantação do piso do canal principal entre a Est-31+10 e a Est-32.	Em Andamento
Execução do desvio Lado E entre a Est-15 e a Est-18 (Colocação de Pedras no talude do desvio)	Em Andamento

Fotos (6)

12,5 mm /chuva no domingo



Vídeos (1)

[Vídeo 1 \(visualizar\).mp4](#)

Desvio Lado E (Est-15 e a Est-18)

00:05

Assinatura


Felice Gualtieri, Tirocinante allo Stato
ING. CIVIL - C.N.R. 1884202447

Assinatura


Luis Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - SECOP IPMCG



GRUPO
ROCHA
CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	201	Data do relatório	09/06/2026	Dia da semana	Terça-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (33)						
Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Servente 8	Mão de Obra Própria (31)
Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	Carpinteiro 3	
Motorista de Veículo Pesado 4	Auxiliar de Serviços Gerais 1	Auxiliar de Topografia 2				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)


Equipamentos (7)					
Escavadeira 2	Caminhão Basculante 4	Retro Escavadeira 1			

Atividades (5)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Limpeza de material de 1ª categoria e 2ª categoria Lado E (Est-10 a Est-18)	Em Andamento
Desmontagem e montagem das fôrmas das paredes laterais do canal principal.	Em Andamento
Execução do desvio Lado E entre a Est-15 e a Est-18	Em Andamento
Concretagem das parede do canal principal Lado D (Est-36+12 a Est-37+17 Terceira Etapa) e Concretagem do Lastró (piso) do canal principal (Est-31+10 a Est-32).	Em Andamento

Fotos (6)





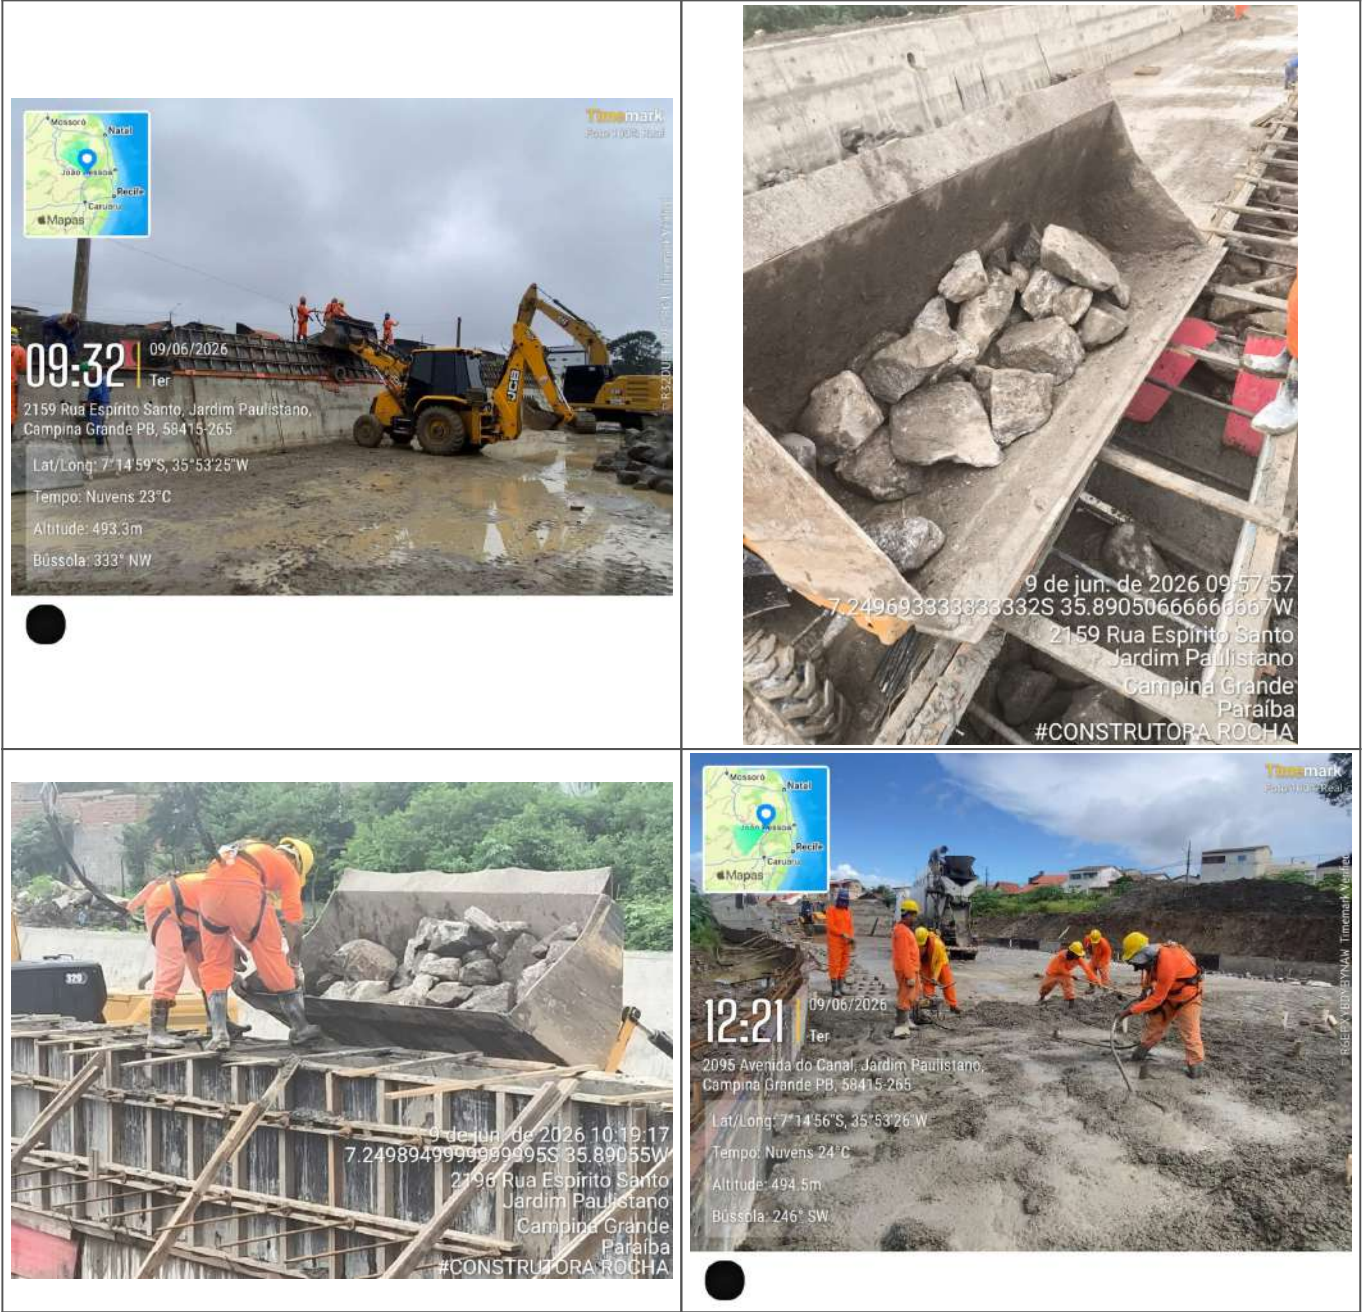

Vídeos (2)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:23
Vídeo 2 (visualizar).mp4	00:14


CONSTRUTORA ROCHA CARVALHO
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899375
Assinatura


Assinatura


Luiz Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - SEC08 PMGO
Assinatura

 GRUPO ROCHA CAVALCANTE					
Relatório Diário de Obra (RDO)					
Relatório nº	202	Data do relatório	10/06/2026	Dia da semana	Quarta-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (32)						
Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Servente 8	Mão de Obra Própria (30)
Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	Carpinteiro 3	
Motorista de Veículo Pesado 3	Auxiliar de Serviços Gerais 1	Auxiliar de Topografia 2				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (6)					
Escavadeira 2	Caminhão Basculante 3	Retro Escavadeira 1			

Atividades (4)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Limpeza de material de 1ª categoria e 2ª categoria. Lado D (Est-16 a Est-18)	Em Andamento
Desmontagem e montagem das fôrmas das paredes laterais do canal principal.	Em Andamento
Execução do desvio Lado E entre a Est-15 e a Est-18	Em Andamento

Fotos (7)



10 de jun. de 2026 13:49:01
6° N



10 de jun. de 2026 14:54:01
57° NE



Treinamento de trabalho em altura (baseado na NR-35).



 GRUPO ROCHA CAVALCANTE					
Relatório Diário de Obra (RDO)					
Relatório nº	203	Data do relatório	11/06/2026	Dia da semana	Quinta-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (32)						
Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Servente 8	Mão de Obra Própria (30)
Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	Carpinteiro 3	
Motorista de Veículo Pesado 3	Auxiliar de Serviços Gerais 1	Auxiliar de Topografia 2				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (6)					
Escavadeira 2	Caminhão Basculante 3	Retro Escavadeira 1			

Atividades (5)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Esgotamento d'água.	Em Andamento
Desmontagem e montagem das fôrmas das paredes laterais do canal principal.	Em Andamento
Montagem de fôrma para execução do enrocamento de pedra para implantação do piso do canal principal entre a Est-20 e a Est-22	Em Andamento
Limpeza mecanizada entre a Est-30 e a Est-31	Em Andamento

Fotos (7)	
 09:09 11/06/2026 Qui 2159 Rua Espírito Santo, Jardim Paulistano, Campina Grande PB, 58415-265 Lat/Long: 7°14'57"S, 35°53'25"W Tempo: Ensolarado 24°C Altitude: 493.5m Bússola: 183° S	 11 de jun. de 2026 10:41:25 7.249411666666666S 35.89048883333333W 2160 Rua Espírito Santo, Jardim Paulistano, Campina Grande, Paraíba #CONSTRUTORA ROCHA



Vídeos (1)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:18


CONSTRUTORA ROCHA CARVALHO
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899375
Assinatura


Assinatura


Luiz Henrique Soares Pires
CREA-PB 1621394060
Eng. Civil - SECOP PMGO
Assinatura


 GRUPO ROCHA CAVALCANTE					
Relatório Diário de Obra (RDO)					
Relatório nº	204	Data do relatório	12/06/2026	Dia da semana	Sexta-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				


Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (32)						
Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Servente 8	Mão de Obra Própria (30)
Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	Carpinteiro 3	
Motorista de Veículo Pesado 3	Auxiliar de Serviços Gerais 1	Auxiliar de Topografia 2				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (6)					
Escavadeira 2	Caminhão Basculante 3	Retro Escavadeira 1			

Atividades (4)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Desmontagem e montagem das fôrmas das paredes laterais do canal principal.	Em Andamento
Montagem de fôrma para execução do enrocamento de pedra para implantação do piso do canal principal entre a Est-20 e a Est-22	Em Andamento
Limpeza mecanizada entre a Est-30 e a Est-31	Em Andamento

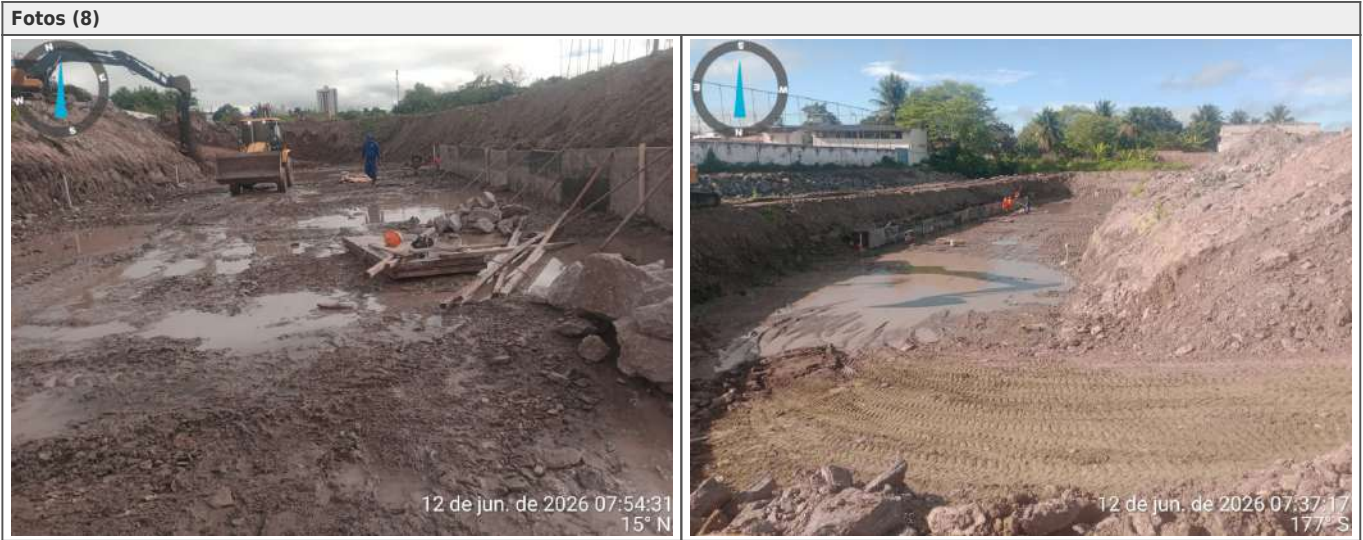

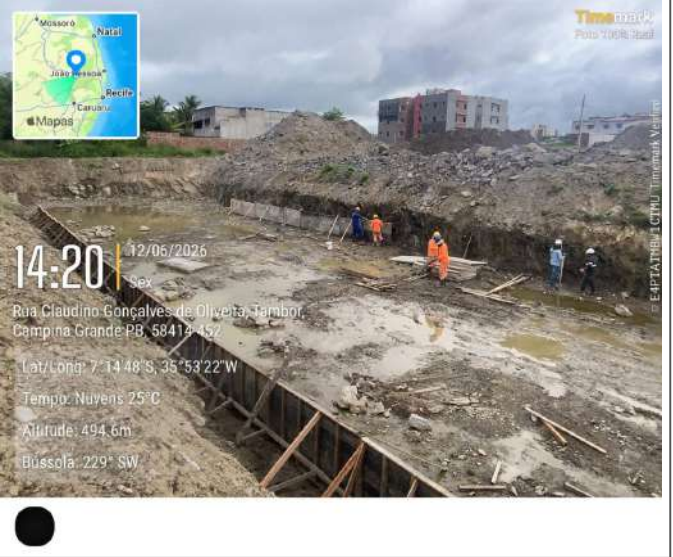 12 de jun. de 2026 07:37:21 176° S	 13:59 12/06/2026 Sex 2159-Rua Espírito Santo, Jardim Paulistano, Campina Grande PB, 58415-265 Lat/Long: 7°15'1"S, 35°53'26"W Tempo: Nuvens 25°C Altitude: 494.3m Bússola: 86° E
 14:06 12/06/2026 Sex 2095 Avenida do Canal, Jardim Paulistano, Campina Grande PB, 58415-265 Lat/Long: 7°14'53"S, 35°53'25"W Tempo: Nuvens 25°C Altitude: 495.4m Bússola: 248° W	 14:16 12/06/2026 Sex Rua Claudino Gonçalves de Oliveira, Tambor, Campina Grande PB, 58414-452 Lat/Long: 7°14'47"S, 35°53'22"W Tempo: Nuvens 25°C Altitude: 495.6m Bússola: 183° S
 14:03 12/06/2026 Sex 2095 Avenida do Canal, Jardim Paulistano, Campina Grande PB, 58415-265 Lat/Long: 7°14'55"S, 35°53'25"W Tempo: Nuvens 25°C Altitude: 505.5m Bússola: 52° NE	 14:20 12/06/2026 Sex Rua Claudino Gonçalves de Oliveira, Tambor, Campina Grande PB, 58414-452 Lat/Long: 7°14'48"S, 35°53'22"W Tempo: Nuvens 25°C Altitude: 494.6m Bússola: 229° SW

Vídeos (1)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:16


Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899375
Assinatura


Luiz Henrique Soares Pinto
Eng. Civil - 0341184044
Assinatura


Luiz Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394060
Eng. Civil - SEC08 PMGO
Assinatura



Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório n°	205	Data do relatório	13/06/2026	Dia da semana	Sábado
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (26)

Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Encarregado Geral 1	Servente 5	Pedreiro 2	Mão de Obra Própria (24)
Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Almoxarife 1	Carpinteiro 3	Motorista de Veículo Pesado 3	Auxiliar de Topografia 2	
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)


Equipamentos (6)

Escavadeira 2	Caminhão Basculante 3	Retro Escavadeira 1			
------------------	--------------------------	------------------------	--	--	--

Atividades (5)

Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Desmontagem e montagem das fôrmas das paredes laterais do canal principal.	Em Andamento
Limpeza mecanizada entre as Est-30 e a Est-31	Em Andamento
Concretagem da parede lateral do Canal principal Lado D (Est-37+17 a Est-40 Terceira Etapa).	Em Andamento
Execução de enrocamento de pedra para implantação do piso do canal principal entre a Est-20 e a Est-22	Em Andamento

Fotos (5)

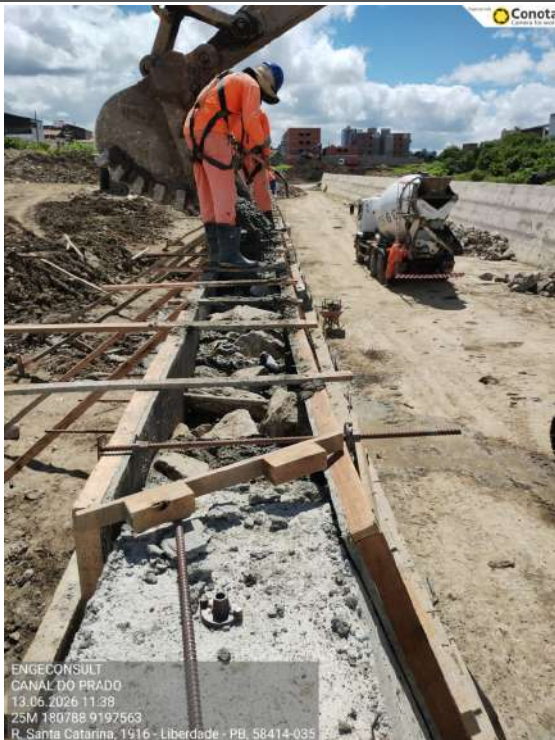




CONSTRUTORA ROCHA CARVALHO
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899375
Assinatura


Felipe Augusto de Almeida
Eng. Civil - CREA 18402441
Assinatura


Luiz Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - SECCO P/MGO
Assinatura

 GRUPO ROCHA CAVALCANTE					
Relatório Diário de Obra (RDO)					
Relatório nº	206	Data do relatório	15/06/2026	Dia da semana	Segunda-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (32)						
Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Servente 8	Mão de Obra Própria (30)
Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	Carpinteiro 3	
Motorista de Veículo Pesado 3	Auxiliar de Serviços Gerais 1	Auxiliar de Topografia 2				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (6)					
Escavadeira 2	Caminhão Basculante 3	Retro Escavadeira 1			

Atividades (5)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Desmontagem e montagem das fôrmas das paredes laterais do canal principal.	Em Andamento
Montagem de fôrma para execução do enrocamento de pedra para implantação do piso do canal principal entre a Est-20 e a Est-22	Em Andamento
Execução de enrocamento de pedra para implantação do piso do canal principal entre a Est-20 a Est-22	Em Andamento
Escavação mecanizada na Est-30	Em Andamento

Fotos (6)	
 08:00 15/06/2026 Seg 2095 Avenida do Canal, Jardim Paulistano, Campina Grande PB, 58415-265 Lat/Long: 7°14'56"S, 35°53'25"W Tempo: Nuvens 22°C Altitude: 494,5m Bússola: 38° NE	 08:45 15/06/2026 Seg 1541 Rua Francisco Ernesto do Rego, Jardim Campina Grande PB, 58415-620 Lat/Long: 7°14'48"S, 35°53'22"W Tempo: Nuvens 22°C Altitude: 495,3m Bússola: 296° NW


CONSTRUTORA ROCHA CARVALHEITE
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899375
Assinatura


Felipe Augusto de Almeida
Eng. Civil - CREA 18430441
Assinatura


Luiz Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - SECCOB PMGO
Assinatura



Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	207	Data do relatório	16/06/2026	Dia da semana	Terça-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição	Índice pluviométrico
Manhã	☀️ Claro	Praticável	5 mm
Tarde	☀️ Claro	Praticável	

Mão de obra (32)

Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Servente 8	Mão de Obra Própria (30)
Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	Carpinteiro 3	
Motorista de Veículo Pesado 3	Auxiliar de Serviços Gerais 1	Auxiliar de Topografia 2				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (6)

Escavadeira 2	Caminhão Basculante 3	Retro Escavadeira 1			
------------------	--------------------------	------------------------	--	--	--


Atividades (6)

Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Desmontagem e montagem das fôrmas das paredes laterais do canal principal.	Em Andamento
Montagem de fôrma para execução do enrocamento de pedra para implantação do piso do canal principal entre a Est-20 e a Est-22	Em Andamento
Execução de enrocamento de pedra para implantação do piso do canal principal entre a Est-20 a Est-22	Em Andamento
Escavação mecanizada na Est-30	Em Andamento
Concretagem da Parede Lateral do Canal Principal Lado E (Est-32 a Est-33 Primeira Etapa)	Em Andamento

Fotos (6)



Precipitação de 5 mm na noite anterior

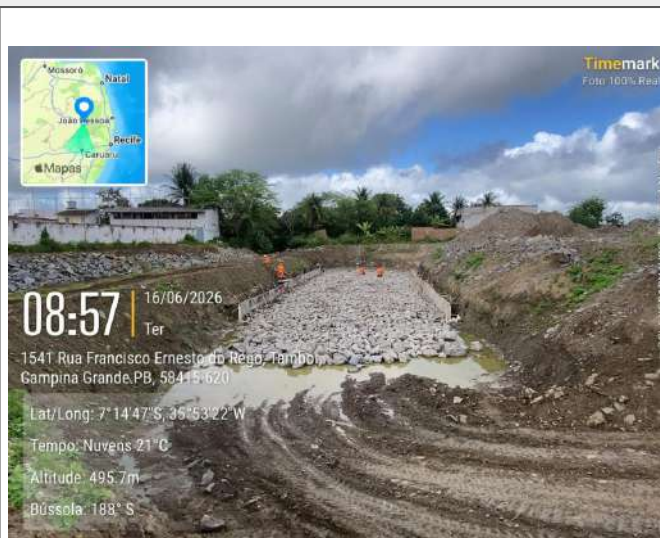




Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899375
Assinatura


Felipe Henrique Soares Pires
Eng. Civil - CREA 18422441
Assinatura


Luiz Henrique Soares Pires
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - BEC06 PMGO
Assinatura

 GRUPO ROCHA CAVALCANTE					
Relatório Diário de Obra (RDO)					
Relatório nº	208	Data do relatório	17/06/2026	Dia da semana	Quarta-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (32)						
Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Servente 8	Mão de Obra Própria (30)
Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	Carpinteiro 3	
Motorista de Veículo Pesado 3	Auxiliar de Serviços Gerais 1	Auxiliar de Topografia 2				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (6)					
Escavadeira 2	Caminhão Basculante 3	Retro Escavadeira 1			

Atividades (5)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Desmontagem e montagem das fôrmas das paredes laterais do canal principal	Em Andamento
Execução dos barbacãs no enrocamento de pedra para implantação do piso do canal principal (Est-20 a Est-22)	Em Andamento
Escavação mecanizada na Est-30	Em Andamento
Concretagem da Parede Lateral do Canal Principal Lado D (Est-32 a Est-33 Primeira Etapa)	Em Andamento

Fotos (8)	
 17 de jun. de 2026 08:21:27 7.246529999999999S 35.88961833333334W 612a Rua Prefeito Antonio Luiz Coutinho Jambor Campina Grande Paraíba #CONSTRUTORA ROCHA	 TimeMark Foto 100% Real 10:20 17/06/2026 Qua 2159 Rua Espírito Santo, Jardim Paulistano, Campina Grande PB, 58415-255 Lat/Long: 7° 14' 56" S, 35° 53' 25" W Tempo: Ensolado 24°C Altitude: 494.5m Bússola: 8° N



Pedro Saulo
CONSTRUTORA ROCHA CARVALHO
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899375

Assinatura

Luiz Henrique
FELIPE RIBEIRO TEIXEIRA
Eng. Civil - 05411842044

Assinatura

Luiz Henrique
Luiz Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394060
Eng. Civil - SEC08 PMGO

Assinatura



Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório n°	209	Data do relatório	18/06/2026	Dia da semana	Quinta-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				



Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável
Noite	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (32)						
Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Servente 8	Mão de Obra Própria (30)
Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	Carpinteiro 3	
Motorista de Veículo Pesado 3	Auxiliar de Serviços Gerais 1	Auxiliar de Topografia 2				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (6)					
Escavadeira 2	Caminhão Basculante 3	Retro Escavadeira 1			

Atividades (7)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Desmontagem e montagem das fôrmas das paredes laterais do canal principal.	Em Andamento
Transporte de Pedras.	Em Andamento
Execução dos barbacãs para implantação do piso do canal principal entre a Est-20 e a Est-22	Em Andamento
Escavação mecanizada na Est-30	Em Andamento
Concretagem da Parede Lateral do Canal Principal Lado D (Est-32 a Est-33 Segunda Etapa) Obs. 1 caminhão.	Em Andamento
Concretagem do Lastro (piso) do Canal Principal entre a Est-20+1 e a Est-22	Em Andamento

Fotos (8)

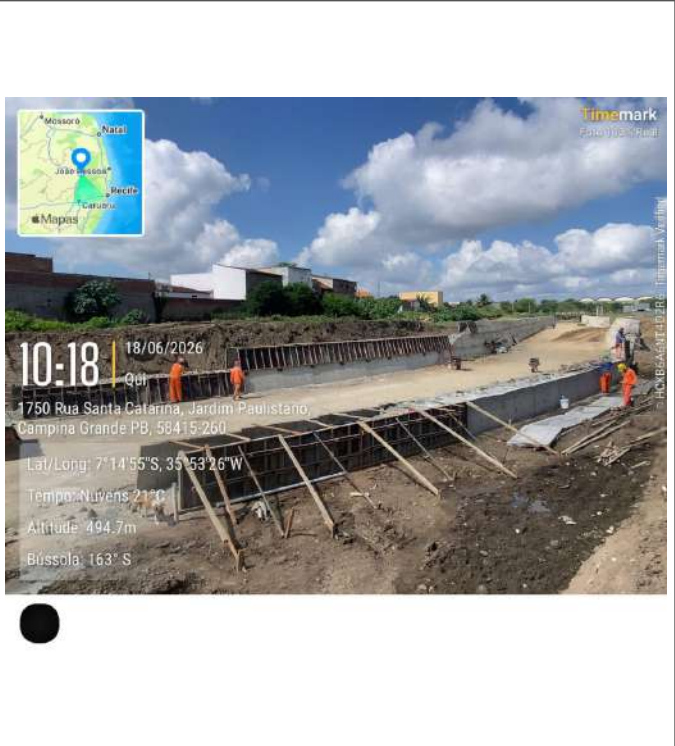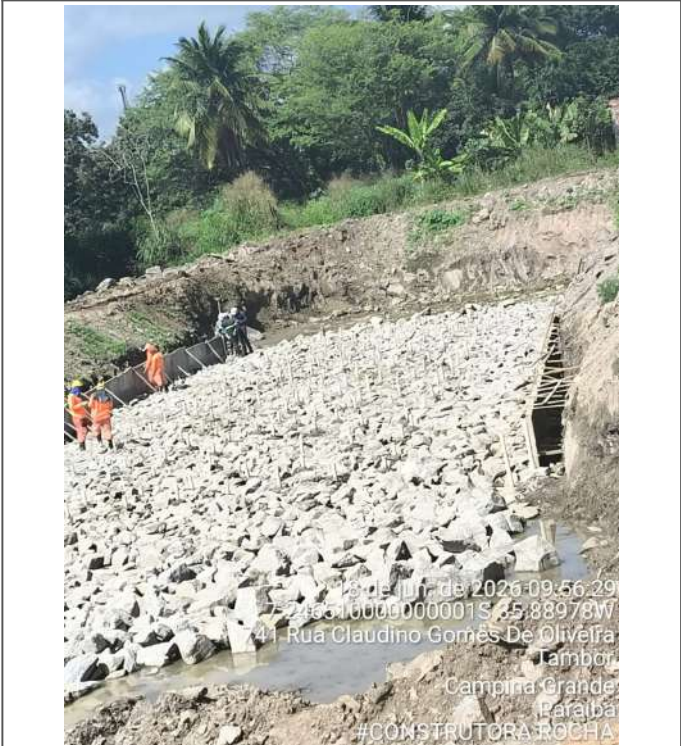




CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899375

Assinatura


Felipe Augusto de Almeida Silva
Eng. Civil - CREA 184324441

Assinatura


Luiz Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - SECCO8 PMGO

Assinatura



GRUPO
ROCHA
CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	210	Data do relatório	19/06/2026	Dia da semana	Sexta-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (32)						
Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Servente 8	Mão de Obra Própria (30)
Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	Carpinteiro 3	
Motorista de Veículo Pesado 3	Auxiliar de Serviços Gerais 1	Auxiliar de Topografia 2				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (6)					
Escavadeira 2	Caminhão Basculante 3	Retro Escavadeira 1			

Atividades (4)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Desmontagem e montagem das fôrmas das paredes laterais do canal principal.	Em Andamento
Acabamento dos tubos de espera no Canal Principal.	Em Andamento
Transporte de Pedras.	Em Andamento

Fotos (2)



19 de Jun de 2026 08:11:02
7 24682166666666666666 S 35 3897W
1997 RUI ESPRITO SANTO
Jardim Paulistano
Campina Grande
Paraíba
#CONSTRUTORA ROCHA



11:29

19/06/2026

Sex

1766 Rua Santa Catarina, Jardim Paulistano, Campina Grande PB, 58415-260

Lat/L ong: 7°14'55" S, 35°53'26" W

Tempo: Nuvens 26°C


Altitude: 494.5m

Bússola: 168° S




Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899375
Assinatura


Felipe Roberto Teixeira de Melo
Eng. Civil - CREA 18422441
Assinatura


Luis Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - SEC016 PMGO
Assinatura

Criado por: Bertini Antoine (25/06/2026 10:34)
Última modificação: Luiz Henrique (07/07/2026 14:30)

1 / 1

 GRUPO ROCHA CAVALCANTE					
Relatório Diário de Obra (RDO)					
Relatório nº	212	Data do relatório	20/06/2026	Dia da semana	Sábado
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				
Condição climática		Tempo		Condição	
Manhã		☀️ Claro		Praticável	
Tarde		☀️ Claro		Praticável	
Ocorrências (1)					
Não Trabalha/Sem expediente. Dia parado					
Comentários (1)					
Felipe Melo 07/07/2026 13:30 Dia sem atividade, a Construtora deu folga aos funcionários e só retornará às atividades na próxima quinta-feira 25/06/2026.					


CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899375

Assinatura


CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE
Felipe Melo
Eng. Civil - CREA 1621899375

Assinatura


CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE
Luiz Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - SECCO 06 PMGO

Assinatura

 GRUPO ROCHA CAVALCANTE					
Relatório Diário de Obra (RDO)					
Relatório nº	213	Data do relatório	22/06/2026	Dia da semana	Segunda-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				
Condição climática		Tempo		Condição	
Manhã		☀️ Claro		Praticável	
Tarde		☀️ Claro		Praticável	
Ocorrências (1)					
Dia do acordo de recesso de São João. Sem expediente.					


Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899375

Assinatura


Felipe Augusto de Almeida
Eng. Civil - CREA 184324441

Assinatura


Luis Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - SECOD PMGO

Assinatura

 GRUPO ROCHA CAVALCANTE					
Relatório Diário de Obra (RDO)					
Relatório nº	214	Data do relatório	23/06/2026	Dia da semana	Terça-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				
Condição climática		Tempo		Condição	
Manhã		☀️ Claro		Praticável	
Tarde		☀️ Claro		Praticável	
Ocorrências (1)					
Dia do acordo de recesso de São João. Sem expediente.					


CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899375

Assinatura


CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE
Felipe Augusto de Almeida
Eng. Civil - CREA 18432441

Assinatura


CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE
Luiz Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - SECOD PMGO

Assinatura

 GRUPO ROCHA CAVALCANTE					
Relatório Diário de Obra (RDO)					
Relatório nº	215	Data do relatório	24/06/2026	Dia da semana	Quarta-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				
Condição climática		Tempo		Condição	
Manhã		☀️ Claro		Praticável	
Tarde		☀️ Claro		Praticável	
Ocorrências (1)					
Feriado de São João.					


CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899375

Assinatura


FELIPE AUGUSTO DE ALMEIDA BRITO
Eng. Civil - CREA 184318/2024

Assinatura


Luiz Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - SECCO8 PMGO

Assinatura



GRUPO
ROCHA
CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	211	Data do relatório	25/06/2026	Dia da semana	Quinta-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição	Índice pluviométrico
Manhã	☀️ Claro	Praticável	18 mm
Tarde	☀️ Claro	Praticável	

Mão de obra (30)						
Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Servente 8	Mão de Obra Própria (28)
Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	Carpinteiro 1	
Motorista de Veículo Pesado 3	Auxiliar de Serviços Gerais 1	Auxiliar de Topografia 2				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (6)					
Escavadeira 2	Caminhão Basculante 3	Retro Escavadeira 1			

Atividades (5)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Execução de enrocamento de pedra para implantação do piso do canal principal na Est-31	Em Andamento
Desmontagem e montagem das fôrmas das paredes laterais do canal principal.	Em Andamento
Transporte de Pedras.	Em Andamento
Concretagem das paredes laterais do Canal Principal Lado E (Est-32+10 a Est-33+10 Segunda Etapa) e Lado D (Est-32+13 a Est-33+10 Segunda Etapa)	Em Andamento

Fotos (5)



06:37 | 25/06/2026
Qui
2159 Rua Espírito Santo, Jardim Paulistano,
Campina Grande PB, 58415-265
Lat/Long: 7°15'1"S, 35°53'26"W
Tempo: Nuvens 19°C
Altitude: 493.2m
Bússola: 279° W



Time mark
Fóto 100% Real
© Google Maps, U.S.A., TimeMark Verifield

Precipitação durante o recesso de São João, de 20/06 a 25/06



06:37 | 25/06/2026
Qui
2159 Rua Espírito Santo, Jardim Paulistano,
Campina Grande PB, 58415-265
Lat/Long: 7°15'1"S, 35°53'26"W
Tempo: Nuvens 19°C
Altitude: 493.1m
Bússola: 280° W



Time mark
Fóto 100% Real
© Google Maps, U.S.A., TimeMark Verifield




CONSTRUTORA ROCHA CARVALHEI
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899375

Assinatura


Felipe Augusto de Almeida Ribeiro
Eng. Civil - CREA 184420441

Assinatura


Luiz Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394060
Eng. Civil - BEC008 PMGO

Assinatura



GRUPO
ROCHA
CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	216	Data do relatório	26/06/2026	Dia da semana	Sexta-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Chuvoso	Impraticável
Tarde	☁ Chuvoso	Impraticável

Ocorrências (1)

Chuva o dia todo.

Dia Chuvoso

Comentários (1)

Felipe Melo 07/07/2026 13:45
Devido as chuvas que caíram na madrugada e durante praticamente o dia todo, não houveram atividades na obra neste dia.

Vídeos (4)

Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:16
Vídeo 2 (visualizar).mp4	00:08
Vídeo 3 (visualizar).mp4	00:24
Vídeo 4 (visualizar).mp4	00:13



CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899375

Assinatura



Felipe Melo
Eng. Civil - CREA 184328441

Assinatura



Luiz Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - BEC008 PMGO

Assinatura



Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	217	Data do relatório	29/06/2026	Dia da semana	Segunda-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				


Condição climática	Tempo	Condição	Índice pluviométrico
Manhã	☀ Claro	Praticável	60 mm
Tarde	☀ Claro	Praticável	
Noite	☁ Chuvoso	Praticável	

Mão de obra (30)						
Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Servente 8	Mão de Obra Própria (28)
Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	Carpinteiro 1	
Motorista de Veículo Pesado 3	Auxiliar de Serviços Gerais 1	Auxiliar de Topografia 2				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (6)					
Escavadeira 2	Caminhão Basculante 3	Retro Escavadeira 1			

Atividades (4)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Esgotamento d'água	Em Andamento
Desmontagem e montagem das fôrmas das paredes laterais do canal principal.	Em Andamento
Transporte de Pedras.	Em Andamento

Fotos (4)

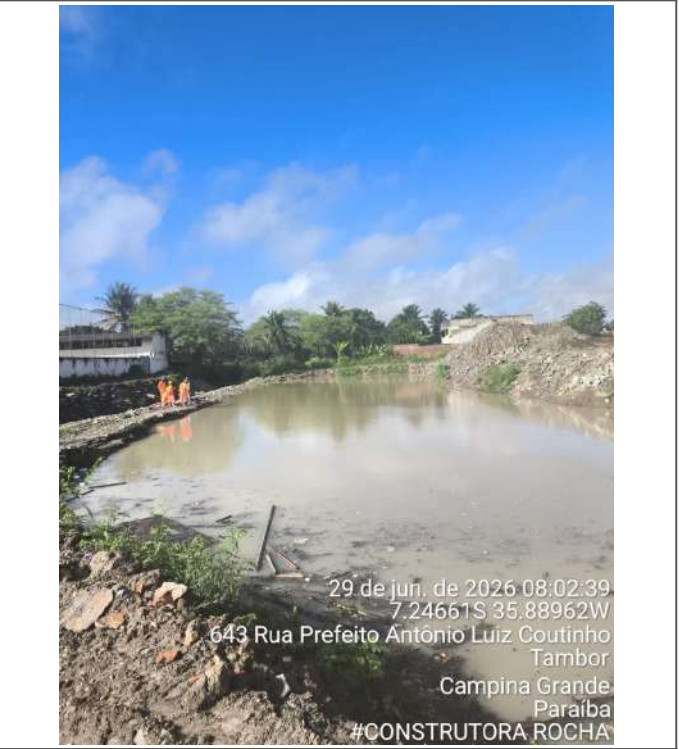


CONSTRUTORA ROCHA CARVALHO
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899375

Assinatura


CONSTRUTORA ROCHA CARVALHO
Felipe Augusto de Almeida
Eng. Civil - CREA 1621899375

Assinatura


Luiz Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - SECCO P/MGO

Assinatura



GRUPO
ROCHA
CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	218	Data do relatório	30/06/2026	Dia da semana	Terça-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (30)						
Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Servente 8	Mão de Obra Própria (28)
Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	Carpinteiro 1	
Motorista de Veículo Pesado 3	Auxiliar de Serviços Gerais 1	Auxiliar de Topografia 2				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (6)					
Escavadeira 2	Caminhão Basculante 3	Retro Escavadeira 1			

Atividades (5)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Esgotamento d'água	Em Andamento
Desmontagem e montagem das fôrmas das paredes laterais do canal principal.	Em Andamento
Transporte de Pedras.	Em Andamento
Concretagem da parede lateral do canal principal Lado E (Est-32+8 a Est-33 Segunda Etapa)	Em Andamento

Fotos (6)



Timemark
Foto 100% Real

07:14

30/06/2026

Ter

2159 Rua Espírito Santo, Jardim Paulistano, Campina Grande PB, 58415-265

Lat/Long: 7°16'1"S, 35°53'26"W

Tempo: Nuvens 19°C

Altitude: 493.0m

Bússola: 174° S



Timemark
Foto 100% Real

09:27

30/06/2026

Ter

97 Rua Professora Ariel de Oliveira, Jardim Paulistano, Campina Grande PB, 58415-250



Lat/Long: 7°14'56"S, 35°53'26"W

Tempo: Nuvens 22°C

Altitude: 494.4m

Bússola: 62° NE

1 / 2

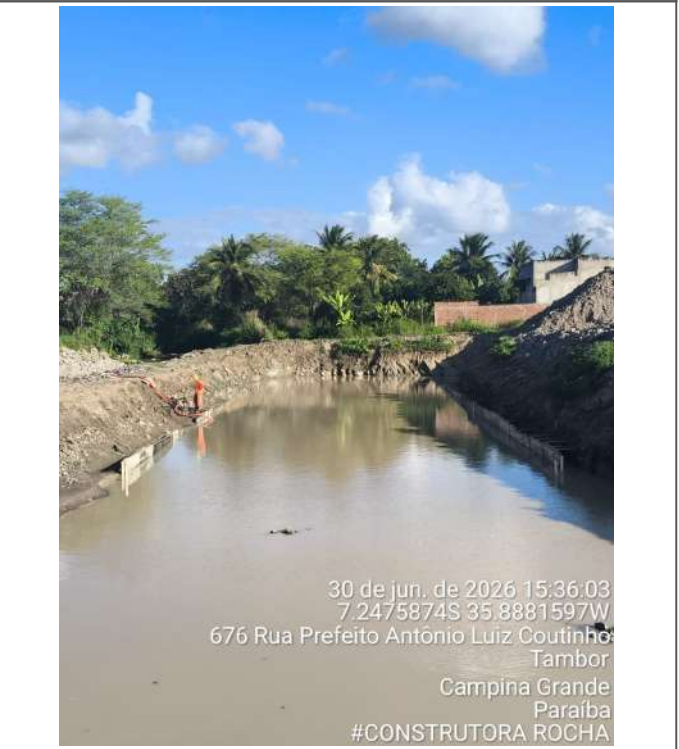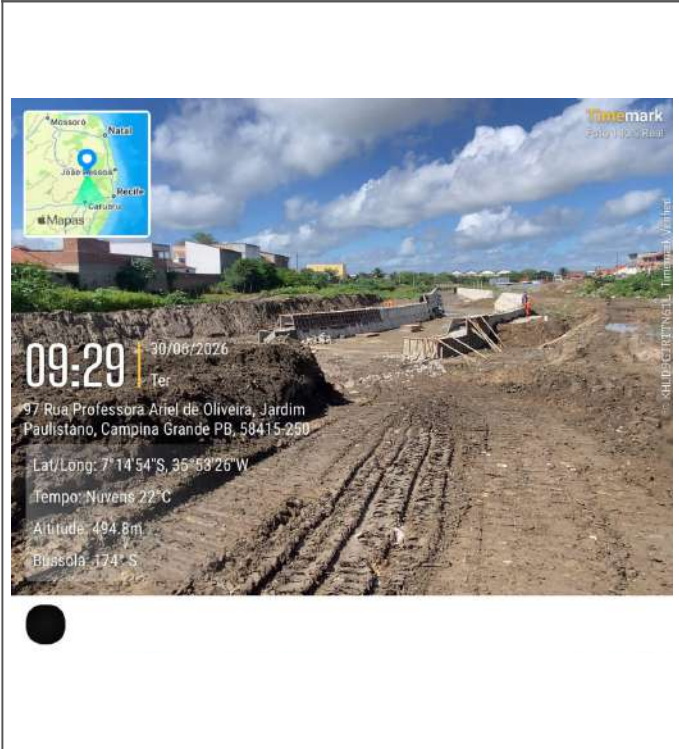


CONSTRUTORA ROCHA CARVALHO
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899375
Assinatura


CONSTRUTORA ROCHA CARVALHO
Felipe Ribeiro de Almeida
Eng. Civil - CREA 1621899375
Assinatura


CONSTRUTORA ROCHA CARVALHO
Luiz Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - SECCOB PMGO
Assinatura

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS



EMPRESA: **CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA**

CONTRATO: **N.º: 2.08.018/2025**

MEDIÇÃO: **8ª**

PERÍODO LÍQUIDO: **01/06/2026 A 30/06/2026**

FOTO 01



TRECHO **CANAL DO PRADO**

FOTO 02



TRECHO **CANAL DO PRADO**

FOTO 03



TRECHO **CANAL DO PRADO**

FOTO 04



TRECHO **CANAL DO PRADO**

FOTO 05



TRECHO **CANAL DO PRADO**

FOTO 06



TRECHO **CANAL DO PRADO**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS



EMPRESA: **CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA**

CONTRATO: **N.º: 2.08.018/2025**

MEDIÇÃO: **8ª**

PERÍODO LÍQUIDO: **01/06/2026 A 30/06/2026**

FOTO 07



TRECHO **CANAL DO PRADO**

FOTO 08



TRECHO **CANAL DO PRADO**

FOTO 09



TRECHO **CANAL DO PRADO**

FOTO 10



TRECHO **CANAL DO PRADO**

FOTO 11



TRECHO **CANAL DO PRADO**

FOTO 12



TRECHO **CANAL DO PRADO**

Protocolo Secretaria de Obras 64.723/2026

De: ARTHUR PEREIRA DE ALMEIDA

Para: SECOB - MC

Data: 08/07/2026 às 15:48:12

Setores (CC):

SECOB - PROTOCOLO, SECOB - MC

Setores envolvidos:

SECOB - PROTOCOLO, SECOB - MC

Medição de Contratos sem Convênio

Nome da Empresa*:

CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA

CNPJ*:

09323098000192

Número do contrato*:

2.08.018/2025

Número da Medição*:

9

Valor da Medição*:

494.429,03

Período da Medição*:

01/06/2026 A 30/06/2026

Prezados, boa tarde,

Segue anexo a 9ª medição para análise e posterior aprovação.

Atenciosamente,

Arthur Pereira de Almeida

Anexos:

CE_052_2026_9_MED_CONTRATO_2_08_018_2025.pdf
REV00_EDI_CANAL_DO_PRADO_MED9_R1.xlsx
REV00_EDI_CANAL_DO_PRADO_MED9_R1_BM.pdf
REV00_EDI_CANAL_DO_PRADO_MED9_R1_MEMORIA_DE_CALCULO.pdf
REV00_EDI_CRONO_CANAL_DO_PRADO_MED9_.pdf
REV00_EDI_DIARIO_OBRAS_MED9_.pdf
REV00_EDI_RELATÓRIO_FOTO_MED9_.pdf

Nº: CE/052/2026

Campina Grande, 08 de JULHO de 2026.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB
Secretaria Municipal de Obras

Att.: Dr. JOAB KLEBER LUCENA MACHADO
Secretário Municipal de Obras

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 9.08.02/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CANALIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL DO PRADO E ÁREAS CIRCUNVIZINHAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.

Assunto: ENCAMINHAMENTO – 09ª MEDIÇÃO

Prezado Secretário;

A CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE Ltda, sediada na Rua Álvaro de Araújo Pereira, 255, Jardim Tavares, 58.402-300, vem a solicitar o pagamento da **medição nº 09**, referente ao **período de 01/06/2026 a 30/06/2026**, no valor de **R\$ 494.429,03 (Quatrocentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e vinte e nove reais e três centavos)**, objeto do contrato nº 2.08.018/2025, firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, para a EXECUÇÃO DE OBRA DE CANALIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL DO PRADO E ÁREAS CIRCUNVIZINHAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.

Confiando na providência de V.Sa., renovamos nossos votos de elevada estima e consideração e subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

ARTHUR PEREIRA DE
ALMEIDA:04731791480

Assinado de forma digital por
ARTHUR PEREIRA DE
ALMEIDA:04731791480
Dados: 2026.07.08 15:36:14 -03'00'

Arthur Pereira de Almeida
Adm. Contratual

Documento de propriedade da Construtora Rocha Cavalcante LTDA., sendo proibida a reprodução parcial ou total sem autorização prévia, sob penalidades legais.

CONCORRÊNCIA Nº 9.08.02/2025				MEDIÇÃO Nº: 9 DATA DA EMISSÃO: 08/07/2026 CONTRATO: Nº 2.08.018/2025 VALOR TOTAL DO CONTRATO= 38.554.542,31									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CANALIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL DO PRADO E ÁREAS CIRCUNVIZINHAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB													
DATA DA OS: 17/10/2025													
MEDIÇÃO: 9				VALOR = R\$ 38.554.542,31 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 8.315.601,23 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 494.429,03 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL = R\$ 8.810.030,26									
PERÍODO SIMPLES: 01/06/2026 30/06/2026													
PERÍODO ACUMULADO: 17/10/2025 30/06/2026				BOLETIM DE MEDIÇÃO									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO				R\$ 1.250.014,56		R\$ 289.993,27		R\$ 15.430,02		R\$ 305.423,29		R\$ 944.591,27
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022	m²	R\$ 461,25	36,00	R\$ 16.605,00	36,00	R\$ 16.605,00	-	R\$ -	36,00	R\$ 16.605,00	-	R\$ -
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MES	R\$ 85.942,88	14,00	R\$ 1.203.200,32	3,02	R\$ 259.511,16	0,18	R\$ 15.430,02	3,20	R\$ 274.941,18	10,80	R\$ 928.259,14
1.3	SINALIZAÇÃO COM CAVALETE PLÁSTICO DESMONTÁVEL	un	R\$ 16,29	50,00	R\$ 814,50	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	50,00	R\$ 814,50
1.4	SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - 10 USOS	m	R\$ 5,58	294,00	R\$ 1.640,52	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	294,00	R\$ 1.640,52
1.5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	und	R\$ 13.877,11	2,00	R\$ 27.754,22	1,00	R\$ 13.877,11	-	R\$ -	1,00	R\$ 13.877,11	1,00	R\$ 13.877,11
2.0	INSTALAÇÕES E CANTEIRO DE OBRAS				R\$ 192.835,68		R\$ 154.652,43		R\$ 2.815,59		R\$ 157.468,02		R\$ 35.367,66
2.1	CANTEIRO DE OBRA				R\$ 97.618,78		R\$ 59.435,53		R\$ 2.815,59		R\$ 62.251,12		R\$ 35.367,66
2.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	R\$ 1.055,67	14,00	R\$ 14.779,38	7,00	R\$ 7.389,69	1,00	R\$ 1.055,67	8,00	R\$ 8.445,36	6,00	R\$ 6.334,02
2.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	R\$ 824,74	14,00	R\$ 11.546,36	7,00	R\$ 5.773,18	1,00	R\$ 824,74	8,00	R\$ 6.597,92	6,00	R\$ 4.948,44
2.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	R\$ 1.319,58	14,00	R\$ 18.474,12	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	14,00	R\$ 18.474,12
2.4	LOCAÇÃO DE CONTÊNER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MÊS	R\$ 935,18	14,00	R\$ 13.092,52	7,00	R\$ 6.546,26	1,00	R\$ 935,18	8,00	R\$ 7.481,44	6,00	R\$ 5.611,08
2.5	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_ 02/2016	m²	R\$ 709,40	56,00	R\$ 39.726,40	56,00	R\$ 39.726,40	-	R\$ -	56,00	R\$ 39.726,40	-	R\$ -
2.2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (ÁGUA, ESGOTO, LUZ)				R\$ 41.560,90		R\$ 41.560,90		R\$ -		R\$ 41.560,90		R\$ -
2.2.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_ 07/2020	UN	R\$ 2.270,40	1,00	R\$ 2.270,40	1,00	R\$ 2.270,40	-	R\$ -	1,00	R\$ 2.270,40	-	R\$ -
2.2.2	POSTE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLA T 9,00M/200DAN TIPO C14	UN	R\$ 2.808,16	1,00	R\$ 2.808,16	1,00	R\$ 2.808,16	-	R\$ -	1,00	R\$ 2.808,16	-	R\$ -
2.2.3	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2024	UN	R\$ 160,56	1,00	R\$ 160,56	1,00	R\$ 160,56	-	R\$ -	1,00	R\$ 160,56	-	R\$ -
2.2.4	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_ 03/2024	UN	R\$ 243,77	1,00	R\$ 243,77	1,00	R\$ 243,77	-	R\$ -	1,00	R\$ 243,77	-	R\$ -
2.2.5	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2024	UN	R\$ 167,47	1,00	R\$ 167,47	1,00	R\$ 167,47	-	R\$ -	1,00	R\$ 167,47	-	R\$ -
2.2.6	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA BLOCO DE CIMENTO E CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES INTERNAS 1,80 X 3,60 X 1,80 M.	un	R\$ 27.054,92	1,00	R\$ 27.054,92	1,00	R\$ 27.054,92	-	R\$ -	1,00	R\$ 27.054,92	-	R\$ -
2.2.7	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_ 12/2020	UN	R\$ 8.855,62	1,00	R\$ 8.855,62	1,00	R\$ 8.855,62	-	R\$ -	1,00	R\$ 8.855,62	-	R\$ -
2.3	FECHAMENTO DO CANTEIRO				R\$ 53.656,00		R\$ 53.656,00		R\$ -		R\$ 53.656,00		R\$ -
2.3.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_ 03/2024	m²	R\$ 113,71	400,00	R\$ 45.484,00	400,00	R\$ 45.484,00	-	R\$ -	400,00	R\$ 45.484,00	-	R\$ -
2.3.2	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	R\$ 408,60	20,00	R\$ 8.172,00	-	R\$ -	-	R\$ -	20,00	R\$ 8.172,00	-	R\$ -
3.0	LIMPEZA E DEMOLIÇÕES				R\$ 1.543.155,60		R\$ 1.400.224,06		R\$ -		R\$ 1.400.224,06		R\$ 142.931,53
3.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_ 03/2024	m²	R\$ 0,73	45.000,00	R\$ 32.850,00	42.727,12	R\$ 31.190,80	-	R\$ -	42.727,12	R\$ 31.190,80	2.272,88	R\$ 1.659,20
3.2	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30 M	un	R\$ 45,52	30,00	R\$ 1.365,60	30,00	R\$ 1.365,60	-	R\$ -	30,00	R\$ 1.365,60	-	R\$ -
3.3	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_ 07/2020	m³	R\$ 15,18	6.750,00	R\$ 102.465,00	6.181,48	R\$ 93.834,92	-	R\$ -	6.181,48	R\$ 93.834,92	568,52	R\$ 8.630,08
3.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_ 07/2020	m³	R\$ 10,64	19.687,50	R\$ 209.475,00	10.681,78	R\$ 113.654,14	-	R\$ -	10.681,78	R\$ 113.654,14	9.005,72	R\$ 95.820,86
3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	R\$ 3,20	374.062,50	R\$ 1.197.000,00	362.555,81	R\$ 1.160.178,60	-	R\$ -	362.555,81	R\$ 1.160.178,60	11.506,69	R\$ 36.821,39
4.0	CANAL PRINCIPAL				R\$ 15.669.078,82		R\$ 4.958.975,12		R\$ 476.183,43		R\$ 5.435.158,55		R\$ 10.233.920,26
4.1	ESCAVAÇÃO DA SEÇÃO DO CANAL				R\$ 6.093.452,44		R\$ 2.563.743,16		R\$ 8.212,00		R\$ 2.571.955,16		R\$ 3.521.497,29
4.1.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_ 07/2020	m³	R\$ 3,90	26.894,66	R\$ 104.889,19	14.160,79	R\$ 55.227,08	-	R\$ -	14.160,79	R\$ 55.227,08	12.733,87	R\$ 49.662,11
4.1.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_ 09/2024	m³	R\$ 13,35	8.964,89	R\$ 119.681,25	906,89	R\$ 12.106,93	80,00	R\$ 1.068,00	986,89	R\$ 13.174,93	7.978,00	R\$ 106.506,33
4.1.3	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_ 03/2021	m³	R\$ 190,59	8.964,89	R\$ 1.708.618,05	3.716,19	R\$ 708.268,65	-	R\$ -	3.716,19	R\$ 708.268,65	5.248,70	R\$ 1.000.349,39
4.1.4	RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_ 03/2021	m³	R\$ 27,98	4.482,44	R\$ 125.418,78	3.483,45	R\$ 97.467,03	-	R\$ -	3.483,45	R\$ 97.467,03	998,99	R\$ 27.951,75
4.1.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_ 07/2020	m³	R\$ 10,64	56.478,80	R\$ 600.934,38	23.665,64	R\$ 251.802,43	100,00	R\$ 1.064,00	23.765,64	R\$ 252.866,43	32.713,15	R\$ 348.067,95
4.1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	R\$ 3,20	1.073.097,12	R\$ 3.433.910,79	449.647,20	R\$ 1.438.871,03	1.900,00	R\$ 6.080,00	451.547,20	R\$ 1.444.951,03	621.549,93	R\$ 1.988.959,76
4.2	ATERRO LATERAL DO CANAL				R\$ 284.243,72		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 284.243,72
4.2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_ 07/2020	m³	R\$ 15,18	2.509,75	R\$ 38.097,93	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2.509,75	R\$ 38.097,93

CONCORRÊNCIA Nº 9.08.02/2025					MEDIÇÃO Nº: 9 DATA DA EMISSÃO: 08/07/2026 CONTRATO: Nº 2.08.018/2025 VALOR TOTAL DO CONTRATO= 38.554.542,31								
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CANALIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL DO PRADO E ÁREAS CIRCUNVIZINHAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB													
DATA DA OS: 17/10/2025													
MEDIÇÃO: 9					VALOR = R\$ 38.554.542,31 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 8.315.601,23 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 494.429,03 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL = R\$ 8.810.030,26								
PERÍODO SIMPLES: 01/06/2026 30/06/2026													
PERÍODO ACUMULADO: 17/10/2025 30/06/2026					BOLETIM DE MEDIÇÃO								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
4.2.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_ 07/2020	m³	R\$ 10,64	2.760,72	R\$ 29.374,06	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2.760,72	R\$ 29.374,06
4.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	R\$ 3,20	22.085,76	R\$ 70.674,43	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	22.085,76	R\$ 70.674,43
4.2.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSEURA 15CM- EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_ 09/2024	m³	R\$ 7,65	2.760,72	R\$ 21.119,50	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2.760,72	R\$ 21.119,50
4.2.5	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	R\$ 45,27	2.760,72	R\$ 124.977,80	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2.760,72	R\$ 124.977,80
4.3	SINALIZAÇÃO			R\$ 6.567,60		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
4.3.1	SINALIZAÇÃO ABERTA C/ ILUMINACAO P/SEGURANCA TRANSITO VEICULOS PEDESTRES	M	R\$ 3,90	1.684,00	R\$ 6.567,60	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.684,00	R\$ 6.567,60
4.4	ESSOTAMENTO			R\$ 18.524,00		R\$ 1.886,08		R\$ 303,12		R\$ 2.189,20		R\$ 16.334,80	
4.4.1	ESSOTAMENTO D'AGUA C/MOTOBOMBA CAPAC. 1 M3/H (06 MESES)	H	R\$ 8,42	2.200,00	R\$ 18.524,00	224,00	R\$ 1.886,08	36,00	R\$ 303,12	260,00	R\$ 2.189,20	1.940,00	R\$ 16.334,80
4.5	FUNDACÃO DO CANAL			R\$ 2.557.498,90		R\$ 781.382,73		R\$ 88.146,81		R\$ 869.529,54		R\$ 1.687.969,35	
4.5.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSEURA DE "10 CM". AF_ 01/2024	m²	R\$ 259,80	3.052,66	R\$ 793.080,02	-	R\$ -	83,04	R\$ 21.573,79	83,04	R\$ 21.573,79	2.969,62	R\$ 771.506,23
4.5.2	ENROCAMENTO COM PEDRA GRANÍTICA ARRUMADA	m³	R\$ 435,26	2.442,12	R\$ 1.062.959,24	1.595,99	R\$ 694.670,61	152,95	R\$ 66.573,02	1.748,94	R\$ 761.243,62	693,18	R\$ 301.715,61
4.5.3	REGULARIZACAO MANUAL E COMPACTACAO COM PLACA VIBRATORIA	M²	R\$ 8,23	8.140,42	R\$ 66.995,62	2.797,03	R\$ 23.019,56	-	R\$ -	2.797,03	R\$ 23.019,56	5.343,39	R\$ 43.976,06
4.5.4	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSEURA DE "10 CM". AF_ 01/2024	m²	R\$ 259,80	2.442,12	R\$ 634.464,02	245,16	R\$ 63.692,57	-	R\$ -	245,16	R\$ 63.692,57	2.196,96	R\$ 570.771,45
4.6	ESTRUTURA DO CANAL			R\$ 5.266.251,12		R\$ 1.492.742,87		R\$ 358.960,99		R\$ 1.851.703,86		R\$ 3.414.547,26	
4.6.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_ 11/2024	m²	R\$ 40,62	7.891,94	R\$ 320.570,76	767,14	R\$ 31.161,23	145,20	R\$ 5.898,02	912,34	R\$ 37.059,25	6.979,60	R\$ 283.511,51
4.6.2	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_ 05/2021	m³	R\$ 673,72	6.961,95	R\$ 4.690.404,14	2.169,42	R\$ 1.461.581,64	524,05	R\$ 353.062,97	2.693,47	R\$ 1.814.644,61	4.268,48	R\$ 2.875.759,53
4.6.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSEURA DE "10 CM". AF_ 01/2024	m²	R\$ 259,80	550,19	R\$ 142.938,84	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	550,19	R\$ 142.938,84
4.6.4	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSEURA DE "10 CM". AF_ 01/2024	m²	R\$ 204,18	550,19	R\$ 112.337,38	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	550,19	R\$ 112.337,38
4.7	REVESTIMENTO			R\$ 611.600,57		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 611.600,57	
4.7.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSEURA 4,0 CM. PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_ 09/2020	m²	R\$ 58,94	10.376,66	R\$ 611.600,57	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	10.376,66	R\$ 611.600,57
4.8	BARBACA			R\$ 294.624,49		R\$ 104.592,12		R\$ 20.560,51		R\$ 125.152,63		R\$ 169.471,85	
4.8.1	DRENO BARBACA, DN 75 MM, SEM MATERIAL DRENANTE. AF_ 07/2021	M	R\$ 48,94	5.916,00	R\$ 289.529,04	2.137,15	R\$ 104.592,12	420,12	R\$ 20.560,51	2.557,27	R\$ 125.152,63	3.358,73	R\$ 164.376,40
4.8.2	GEOTEXTIL, NÃO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTÍNUOS 100% POLIESTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO + 99 KNM	M²	R\$ 9,57	532,44	R\$ 5.095,45	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	532,44	R\$ 5.095,45
4.9	ENSECADEIRA			R\$ 87.768,96		R\$ 14.628,16		R\$ -		R\$ 14.628,16		R\$ 73.140,80	
4.9.1	ENSECADEIRA C/ SACO DE AREIA CREMOCAO	m³	R\$ 457,13	192,00	R\$ 87.768,96	32,00	R\$ 14.628,16	-	R\$ -	32,00	R\$ 14.628,16	160,00	R\$ 73.140,80
4.10	RECUPERAÇÃO DO CANAL EXISTENTE, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO PARCIAL			R\$ 448.547,02		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 448.547,02	
4.10.1	DEMOLIÇÃO DE PISO E/OU REVESTIMENTO DE PAREDE EM CIMENTADO OU CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	R\$ 187,70	209,92	R\$ 39.401,98	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	209,92	R\$ 39.401,98
4.10.2	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO CICLÓPICO, COM ROMPEDOR PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m³	R\$ 113,13	636,70	R\$ 72.029,87	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	636,70	R\$ 72.029,87
4.10.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_ 11/2024	m²	R\$ 40,62	81,92	R\$ 3.327,59	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	81,92	R\$ 3.327,59
4.10.4	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_ 05/2021	m³	R\$ 673,72	7,66	R\$ 5.160,69	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	7,66	R\$ 5.160,69
4.10.5	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSEURA 4,0 CM. PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_ 09/2020	m²	R\$ 58,94	3.610,77	R\$ 212.818,78	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	3.610,77	R\$ 212.818,78
4.10.6	RASPAGEM E EMPILHAMENTO DE MATERIAL ASSORIADO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA	m³	R\$ 198,84	132,42	R\$ 26.330,39	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	132,42	R\$ 26.330,39
4.10.7	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_ 07/2020	m³	R\$ 10,64	1.252,49	R\$ 13.326,49	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.252,49	R\$ 13.326,49
4.10.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	R\$ 3,20	23.797,26	R\$ 76.151,23	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	23.797,26	R\$ 76.151,23
5.0	VIAS PROJETADAS			R\$ 10.859.875,41		R\$ 402.852,98		R\$ -		R\$ 402.852,98		R\$ 10.457.022,43	
5.1	TERRAPLENAGEM			R\$ 10.859.875,41		R\$ 402.852,98		R\$ -		R\$ 402.852,98		R\$ 10.457.022,43	
5.1.1	BOTA-FORA			R\$ 1.144.899,44		R\$ 402.852,98		R\$ -		R\$ 402.852,98		R\$ 742.046,46	
5.1.1.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_ 07/2020	m³	R\$ 16,81	2.462,23	R\$ 41.390,09	2.395,38	R\$ 40.266,37	-	R\$ -	2.395,38	R\$ 40.266,37	66,85	R\$ 1.123,72
5.1.1.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_ 07/2020	m³	R\$ 72,70	615,56	R\$ 13.973,15	538,45	R\$ 12.222,91	-	R\$ -	538,45	R\$ 12.222,91	77,10	R\$ 1.750,25
5.1.1.3	ESCAVAÇÃO EM 3ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM ROMPEDOR HIDRÁULICO	m³	R\$ 21,25	1.025,93	R\$ 73.097,46	538,45	R\$ 38.364,85	-	R\$ -	538,45	R\$ 38.364,85	487,48	R\$ 34.732,62
5.1.1.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_ 07/2020	m³	R\$ 10,64	16.004,50	R\$ 170.287,86	4.367,29	R\$ 46.467,91	-	R\$ -	4.367,29	R\$ 46.467,91	11.637,21	R\$ 123.819,94
5.1.1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	R\$ 3,20	264.422,15	R\$ 846.150,88	82.978,42	R\$ 265.530,94	-	R\$ -	82.978,42	R\$ 265.530,94	181.443,73	R\$ 580.619,93

CONCORRÊNCIA Nº 9.08.02/2025				MEDIÇÃO Nº: 9 DATA DA EMISSÃO: 08/07/2026 CONTRATO: Nº 2.08.018/2025 VALOR TOTAL DO CONTRATO= 38.554.542,31									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CANALIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL DO PRADO E ÁREAS CIRCUNVIZINHAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB													
DATA DA OS: 17/10/2025													
MEDIÇÃO: 9				VALOR = R\$ 38.554.542,31 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 8.315.601,23 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 494.429,03 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL = R\$ 8.810.030,26									
PERÍODO SIMPLES: 01/06/2026 30/06/2026													
PERÍODO ACUMULADO: 17/10/2025 30/06/2026				BOLETIM DE MEDIÇÃO									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
5.1.2	ATERRO				R\$ 9.714.975,97		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 9.714.975,97
5.1.2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_ 07/2020	m³	R\$ 17,20	45.363,39	R\$ 780.250,34	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	45.363,39	R\$ 780.250,34
5.1.2.2	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	R\$ 45,27	46.052,12	R\$ 2.084.779,55	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	46.052,12	R\$ 2.084.779,55
5.1.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	R\$ 3,20	368.416,97	R\$ 1.178.934,31	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	368.416,97	R\$ 1.178.934,31
5.1.2.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_ 09/2024	m²	R\$ 2,34	17.753,53	R\$ 41.543,26	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	17.753,53	R\$ 41.543,26
5.1.2.5	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO /95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO (ESPESURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_ 09/2024	m³	R\$ 7,65	57.790,86	R\$ 442.100,10	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	57.790,86	R\$ 442.100,10
5.1.2.6	ENROCAMENTO COM PEDRA GRANÍTICA ARRUMADA	m³	R\$ 443,68	10.652,12	R\$ 4.726.131,71	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	10.652,12	R\$ 4.726.131,71
5.1.2.7	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESURA DE *10 CM*. AF_ 01/2024	m²	R\$ 259,80	1.775,35	R\$ 461.236,70	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.775,35	R\$ 461.236,70
6.0	DRENAGEM				R\$ 740.096,82		R\$ 1.741,77		R\$ -		R\$ 1.741,77		R\$ 738.345,11
6.1	ESCAVAÇÕES DAS VALAS				R\$ 246.061,48		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 246.061,48
6.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_ 09/2024	m³	R\$ 10,41	644,00	R\$ 6.704,04	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	644,00	R\$ 6.704,04
6.1.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_ 09/2024	m³	R\$ 12,99	515,20	R\$ 6.692,44	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	515,20	R\$ 6.692,44
6.1.3	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_ 03/2021	m³	R\$ 190,59	128,80	R\$ 24.547,99	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	128,80	R\$ 24.547,99
6.1.4	RETIrada DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM RETROESCAVADERA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_ 03/2021	m³	R\$ 40,92	128,80	R\$ 5.270,49	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	128,80	R\$ 5.270,49
6.1.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADERA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_ 07/2020	m³	R\$ 10,64	180,32	R\$ 1.918,60	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	180,32	R\$ 1.918,60
6.1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	R\$ 3,20	3.426,08	R\$ 10.963,45	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	3.426,08	R\$ 10.963,45
6.1.7	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	R\$ 45,27	942,60	R\$ 42.671,50	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	942,60	R\$ 42.671,50
6.1.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	R\$ 3,20	26.870,57	R\$ 85.985,83	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	26.870,57	R\$ 85.985,83
6.1.9	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADERA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 0,8 M³ / POTÊNCIA 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_ 04/2016	m³	R\$ 16,31	1.131,39	R\$ 18.452,97	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.131,39	R\$ 18.452,97
6.1.10	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_ 08/2020	m²	R\$ 35,49	1.207,50	R\$ 42.854,17	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.207,50	R\$ 42.854,17
6.2	TUBULAÇÃO				R\$ 265.505,54		R\$ 1.741,77		R\$ -		R\$ 1.741,77		R\$ 263.763,77
6.2.1	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_ 03/2024	M	R\$ 138,21	700,00	R\$ 96.747,00	10,00	R\$ 1.382,10	-	R\$ -	10,00	R\$ 1.382,10	690,00	R\$ 95.364,90
6.2.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_ 03/2024	M	R\$ 359,67	50,00	R\$ 17.983,50	1,00	R\$ 359,67	-	R\$ -	1,00	R\$ 359,67	49,00	R\$ 17.623,83
6.2.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_ 09/2020	m³	R\$ 289,62	208,00	R\$ 60.240,96	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	208,00	R\$ 60.240,96
6.2.4	ENROCAMENTO COM PEDRA GRANÍTICA ARRUMADA	m³	R\$ 435,26	208,00	R\$ 90.534,08	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	208,00	R\$ 90.534,08
6.3	DISPOSITIVOS				R\$ 228.519,86		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 228.519,86
6.3.1	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_ 12/2020	UN	R\$ 1.982,09	100,00	R\$ 198.209,00	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	100,00	R\$ 198.209,00
6.3.2	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPA. AF_ 12/2020	UN	R\$ 3.247,26	7,00	R\$ 22.730,82	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	7,00	R\$ 22.730,82
6.3.3	ACRESCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_ 12/2020	M	R\$ 2.174,97	1,47	R\$ 3.197,20	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1,47	R\$ 3.197,20
6.3.4	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_ 12/2020	UN	R\$ 626,12	7,00	R\$ 4.382,84	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	7,00	R\$ 4.382,84
7.0	PONTE E PASSARELAS				R\$ 513.615,08		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 513.615,08
7.1	PONTE				R\$ 305.096,16		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 305.096,16
7.1.1	ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS, C/ ESCORAS TUBULARES TIPO "B" (H=3,30 A 4,50 M), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	m²	R\$ 49,83	157,20	R\$ 7.833,27	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	157,20	R\$ 7.833,27
7.1.2	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_ 09/2020	m²	R\$ 58,25	350,44	R\$ 20.413,13	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	350,44	R\$ 20.413,13
7.1.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_ 06/2022	KG	R\$ 11,78	17,20	R\$ 202,61	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	17,20	R\$ 202,61
7.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	R\$ 16,52	17,20	R\$ 284,14	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	17,20	R\$ 284,14
7.1.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_ 06/2022	KG	R\$ 11,90	398,20	R\$ 4.738,58	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	398,20	R\$ 4.738,58
7.1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	R\$ 14,76	398,20	R\$ 5.877,43	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	398,20	R\$ 5.877,43
7.1.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_ 06/2022	KG	R\$ 10,97	2.643,20	R\$ 28.995,90	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2.643,20	R\$ 28.995,90

CONCORRÊNCIA Nº 9.08.02/2025					MEDIÇÃO Nº: 9 DATA DA EMISSÃO: 08/07/2026 CONTRATO: Nº 2.08.018/2025 VALOR TOTAL DO CONTRATO= 38.554.542,31								
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CANALIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL DO PRADO E ÁREAS CIRCUNVIZINHAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB													
DATA DA OS: 17/10/2025													
MEDIÇÃO: 9					VALOR = R\$ 38.554.542,31 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 8.315.601,23 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 494.429,03 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL = R\$ 8.810.030,26								
PERÍODO SIMPLES: 01/06/2026 30/06/2026													
PERÍODO ACUMULADO: 17/10/2025 30/06/2026					BOLETIM DE MEDIÇÃO								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
7.1.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$ 13,18	2.643,20	R\$ 34.837,37	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2.643,20	R\$ 34.837,37
7.1.9	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	R\$ 9,41	265,80	R\$ 2.501,17	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	265,80	R\$ 2.501,17
7.1.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$ 11,09	265,80	R\$ 2.947,72	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	265,80	R\$ 2.947,72
7.1.11	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	KG	R\$ 9,33	2.518,50	R\$ 23.497,60	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2.518,50	R\$ 23.497,60
7.1.12	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$ 10,76	2.518,50	R\$ 27.099,06	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2.518,50	R\$ 27.099,06
7.1.13	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022	KG	R\$ 10,99	1.509,20	R\$ 16.586,10	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.509,20	R\$ 16.586,10
7.1.14	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$ 12,25	1.509,20	R\$ 18.487,70	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.509,20	R\$ 18.487,70
7.1.15	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4" - ALT=0,80M, C/1(UM) TUBO HORIZONTAL INTERMEDIÁRIO (4"), E PILARES A CADA 3,00M, EXCLUSIVE OS PILARES	m	R\$ 575,66	78,60	R\$ 45.246,87	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	78,60	R\$ 45.246,87
7.1.16	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA	m³	R\$ 691,03	94,85	R\$ 65.547,51	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	94,85	R\$ 65.547,51
7.2	PASSARELAS			R\$	208.518,92	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	208.518,92
7.2.1	ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS, C/ ESCORAS TUBULARES TIPO "B" (H=3,30 A 4,50 ML) COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	m²	R\$ 49,83	78,24	R\$ 3.898,69	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	78,24	R\$ 3.898,69
7.2.2	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_08/2020	m²	R\$ 58,25	111,10	R\$ 6.471,57	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	111,10	R\$ 6.471,57
7.2.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	R\$ 11,78	28,46	R\$ 335,24	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	28,46	R\$ 335,24
7.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$ 16,52	28,46	R\$ 470,14	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	28,46	R\$ 470,14
7.2.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	R\$ 11,78	68,45	R\$ 806,31	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	68,45	R\$ 806,31
7.2.6	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$ 15,09	68,45	R\$ 1.032,88	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	68,45	R\$ 1.032,88
7.2.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	R\$ 11,90	216,15	R\$ 2.572,18	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	216,15	R\$ 2.572,18
7.2.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$ 14,76	216,15	R\$ 3.190,37	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	216,15	R\$ 3.190,37
7.2.9	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	R\$ 10,97	560,35	R\$ 6.147,06	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	560,35	R\$ 6.147,06
7.2.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$ 13,18	560,35	R\$ 7.385,43	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	560,35	R\$ 7.385,43
7.2.11	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	R\$ 9,41	525,80	R\$ 4.947,75	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	525,80	R\$ 4.947,75
7.2.12	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$ 11,09	525,80	R\$ 5.831,09	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	525,80	R\$ 5.831,09
7.2.13	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	KG	R\$ 11,61	5.325,44	R\$ 61.828,35	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	5.325,44	R\$ 61.828,35
7.2.14	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$ 10,76	5.325,44	R\$ 57.301,73	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	5.325,44	R\$ 57.301,73
7.2.15	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA	m	R\$ 135,35	195,60	R\$ 26.474,46	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	195,60	R\$ 26.474,46
7.2.16	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=25MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA	m³	R\$ 671,82	29,51	R\$ 19.825,67	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	29,51	R\$ 19.825,67
8.0	PAVIMENTAÇÃO			R\$	4.423.261,92	R\$	1.107.161,60	R\$	-	R\$	1.107.161,60	R\$	3.316.100,32
8.1	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	m³	R\$ 33,70	7.101,41	R\$ 239.317,58	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	7.101,41	R\$ 239.317,58
8.2	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	R\$ 45,27	7.101,41	R\$ 321.480,92	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	7.101,41	R\$ 321.480,92
8.3	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	m³	R\$ 128,07	3.550,71	R\$ 454.738,91	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	3.550,71	R\$ 454.738,91
8.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 M³) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M³). AF_07/2020	m³	R\$ 10,07	8.521,69	R\$ 85.813,46	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	8.521,69	R\$ 85.813,46
8.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	M³XKM	R\$ 3,20	68.173,56	R\$ 218.155,37	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	68.173,56	R\$ 218.155,37
8.6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	m³	R\$ 7,65	7.101,41	R\$ 54.325,80	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	7.101,41	R\$ 54.325,80
8.7	EXECUÇÃO DE IMPIRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	m²	R\$ 8,30	17.753,53	R\$ 147.354,29	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	17.753,53	R\$ 147.354,29
8.8	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLOAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m²	R\$ 1.703,52	887,68	R\$ 1.512.174,67	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	887,68	R\$ 1.512.174,67
8.9	DERIPA - 06.000.00 - DEFENSA METÁLICA REFLETIVA MALEÁVEL, SIMPLES FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M	R\$ 826,24	1.682,20	R\$ 1.389.900,92	1.340,00	R\$ 1.107.161,60	-	R\$ -	1.340,00	R\$ 1.107.161,60	342,20	R\$ 282.739,32
9.0	CALÇADAS, CICLOVIAS E ÁREAS VERDES			R\$	2.343.448,54	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.343.448,54
9.1	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 08 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ÁREA E BRITA COMERCIAIS	m	R\$ 50,98	3.753,77	R\$ 191.367,19	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	3.753,77	R\$ 191.367,19
9.2	ASSENTAMENTO DE GUARDA-FIO EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X1300 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	R\$ 44,65	7.212,62	R\$ 322.043,48	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	7.212,62	R\$ 322.043,48
9.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO, COM A UTILIZAÇÃO DE FIBRA POLIPROPILENO, ACABAMENTO CONVENCIONAL	m²	R\$ 1.440,76	968,88	R\$ 1.395.923,54	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	968,88	R\$ 1.395.923,54
9.4	GRAMA NATIVA CAPIM DE BURRO OU BATATAIS, EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	m²	R\$ 23,85	2.912,97	R\$ 69.474,33	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2.912,97	R\$ 69.474,33
9.5	CONFECCÃO DE BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 MM	m	R\$ 227,90	1.600,00	R\$ 364.640,00	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.600,00	R\$ 364.640,00

CONCORRÊNCIA Nº 9.08.02/2025					MEDIÇÃO Nº:		9	DATA DA EMISSÃO:		08/07/2026	CONTRATO:		Nº 2.08.018/2025	VALOR TOTAL DO CONTRATO=		38.554.542,31
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CANALIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL DO PRADO E ÁREAS CIRCUNVIZINHAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB																
DATA DA OS:		17/10/2025														
MEDIÇÃO:		9														
PERÍODO SIMPLES:		01/06/2026 30/06/2026														
PERÍODO ACUMULADO:		17/10/2025 30/06/2026														
BOLETIM DE MEDIÇÃO																
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO				
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO			
10.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				R\$ 1.019.169,82	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-			
10.1	ILUMINAÇÃO				R\$ 1.012.304,18	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-			
10.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3) LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL, DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	R\$ 7,81	366,70	R\$ 2.863,92	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	366,70	R\$ 2.863,92			
10.1.2	CONCRETAGEM COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m³	R\$ 677,94	61,10	R\$ 41.422,13	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	61,10	R\$ 41.422,13			
10.1.3	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	R\$ 9,77	1.300,00	R\$ 12.701,00	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.300,00	R\$ 12.701,00			
10.1.4	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, 0,6/1 KV, 4 CONDUTORES DE 4 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	R\$ 214,71	1.900,00	R\$ 407.949,00	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.900,00	R\$ 407.949,00			
10.1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	R\$ 14,20	40,00	R\$ 568,00	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	40,00	R\$ 568,00			
10.1.6	CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	R\$ 16,84	150,00	R\$ 2.526,00	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	150,00	R\$ 2.526,00			
10.1.7	CONEXÃO EM DERIVAÇÃO PARALELA - 6,0-1,5MM² DE EMENDA, PARA CABO MULTIPOLAR (14X4,0) MM2, CABO PASSANTE 1,5-6,0MM2 E CABO DERIVADO 1,5-2,5MM2, ACOMPANHADO DE JUNTA COM GEL, CONECTOR DE BORNES PENTA-POLAR ISOLADA E CHAVE SEXTAVADA DE APERTO, GRAU DE PROTEÇÃO IPX8, CONFORME NORMA CEI EN 50393	UN	R\$ 22,19	110,00	R\$ 2.440,90	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	110,00	R\$ 2.440,90			
10.1.8	CONEXÃO DE EMENDA - 6,0/1,5MM² EM DERIVAÇÃO "T", PARA CABO MULTIPOLAR (14X4,0) MM2, DERIVAÇÃO PARA CABO MULTIPOLAR 1(3X1,5)MM2, ACOMPANHADO DE JUNTA COM GEL, SEPARADOR DAS FASES E BRACADEIRAS, GRAU DE PROTEÇÃO IPX8, CONFORME NORMA CEI EN 50393	UN	R\$ 138,77	110,00	R\$ 15.264,70	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	110,00	R\$ 15.264,70			
10.1.9	BLOQUEADOR DE VAZAMENTO DE CORRENTE: DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE PESSOAS E ANIMAIS CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS EM POSTES METÁLICOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, IP 68 IK 08 CORRENTE DE BLOQUEIO 30mA, MÁXIMA CORRENTE DE CARGA 5A; ALIMENTAÇÃO 220V/60HZ; TEMPO DE ATUAÇÃO < 50MS ; RESET IMÁ; CAIXA COM PROTEÇÃO UV	un	R\$ 280,34	104,00	R\$ 29.155,36	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	104,00	R\$ 29.155,36			
10.1.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	R\$ 17,09	22,00	R\$ 375,98	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	22,00	R\$ 375,98			
10.1.11	ELETRODUTO/IDUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	R\$ 12,19	1.830,00	R\$ 22.307,70	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.830,00	R\$ 22.307,70			
10.1.12	DER/PP - 06.000.00 - DEFENSA METÁLICA REFLETIVA MALEAVEL SIMPLES FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	m	R\$ 826,24	52,00	R\$ 42.964,48	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	52,00	R\$ 42.964,48			
10.1.13	LUMINÁRIA LED 76W - LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM ALUMÍNIO FUNDIDO (LEDPILED HIGH POWER), SUPORTE DE MONTAGEM AJUSTÁVEL, FACHO ABERTO, POTÊNCIA 110W, TEMPERATURA DE COR - 4.000K - IRC >70, FLUXO LUMINOSO - 13.600 LUMENS, FATOR DE POTÊNCIA 0,92, TENSÃO 220 V - IP 66, VIDA ÚTIL - 78.000 HORAS, REF-BRP482 LED136 NW 76W DWL P7 0-10 OU SIMILAR	un	R\$ 1.495,18	52,00	R\$ 77.749,36	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	52,00	R\$ 77.749,36			
10.1.14	POSTE METÁLICO CURVO DUPLO - POSTE METÁLICO DUPLO CURVO COM 12M DE ALTURA UTIL, PARA INSTALAÇÃO COM BASE E CHUMBADORES, EM AÇO CARBONO 1010/1020 GALVANIZAÇÃO A FOGO E PINTURA EPOXI, CONFORME NBR 14744 E NBR 6323.	un	R\$ 4.695,79	52,00	R\$ 244.181,08	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	52,00	R\$ 244.181,08			
10.1.15	BASE METÁLICA PARA POSTE - BASE METÁLICA PARA POSTE EM CHAPA #3/8" GALVANIZADA A FOGO MEDINDO 0,30X0,30M, CONFORME DETALHE EM ANEXO	UN	R\$ 394,58	52,00	R\$ 20.518,16	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	52,00	R\$ 20.518,16			
10.1.16	BASE EM CONCRETO PARA POSTE 0,40X0,40X0,80M	UN	R\$ 154,58	52,00	R\$ 8.038,16	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	52,00	R\$ 8.038,16			
10.1.17	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,80X0,80MX0,20M (COM BASE NO ORSE 6419)	UN	R\$ 384,09	56,00	R\$ 21.509,04	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	56,00	R\$ 21.509,04			
10.1.18	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,50 X 0,50 X 0,50M	un	R\$ 394,21	56,00	R\$ 22.075,76	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	56,00	R\$ 22.075,76			
10.1.19	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	R\$ 101,13	52,00	R\$ 5.258,76	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	52,00	R\$ 5.258,76			
10.1.20	GRAMPO METÁLICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATÉ 5/8", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2	UN	R\$ 44,26	52,00	R\$ 2.301,52	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	52,00	R\$ 2.301,52			
10.1.21	RELE FOTOELÉTRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	R\$ 41,42	104,00	R\$ 4.307,68	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	104,00	R\$ 4.307,68			
10.1.22	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 31,45	193,50	R\$ 6.085,57	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	193,50	R\$ 6.085,57			
10.1.23	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 26,40	193,50	R\$ 5.108,40	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	193,50	R\$ 5.108,40			
10.1.24	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIÚRNO. AF_06/2014	CHP	R\$ 331,03	44,20	R\$ 14.631,52	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	44,20	R\$ 14.631,52			
10.2	QUADRO DE PROTEÇÃO				R\$ 1.869,75	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-			
10.2.1	CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X40X20 CM	un	R\$ 289,69	2,00	R\$ 579,38	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 579,38			
10.2.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	R\$ 84,64	2,00	R\$ 169,28	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 169,28			
10.2.3	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	R\$ 79,42	2,00	R\$ 158,84	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 158,84			
10.2.4	BARRAMENTO TRIFÁSICO	m	R\$ 192,82	2,00	R\$ 385,64	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 385,64			
10.2.5	TRILHO SUPORTE P/ FIXAÇÃO RÁPIDA DIN	M	R\$ 13,50	1,00	R\$ 13,50	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 13,50			
10.2.6	POSTE BALIZADOR PARA JARDIM, EM ALUMÍNIO PRETO, + LED 12 W BRANCO FRIO ST1301(1 STAR) LUMEN OU SIMILAR	un	R\$ 136,93	2,00	R\$ 273,86	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 273,86			
10.2.7	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 31,45	5,00	R\$ 157,25	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	5,00	R\$ 157,25			
10.2.8	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 26,40	5,00	R\$ 132,00	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	5,00	R\$ 132,00			
10.3	MEDIÇÃO				R\$ 4.995,89	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-			
10.3.1	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 40MM, D=1 1/2"	un	R\$ 4,63	8,00	R\$ 37,04	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	8,00	R\$ 37,04			
10.3.2	CABECOTE DE ALUMÍNIO DE 1 1/2"	un	R\$ 19,81	8,00	R\$ 158,48	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	8,00	R\$ 158,48			
10.3.3	CABO DE COBRE NU 16 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (7,04MIKG)	kg	R\$ 158,39	5,70	R\$ 902,82	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	5,70	R\$ 902,82			

CONCORRÊNCIA Nº 9.08.02/2025				MEDIÇÃO Nº: 9 DATA DA EMISSÃO: 06/07/2026 CONTRATO: Nº 2.06.018/2025 VALOR TOTAL DO CONTRATO= 38.554.542,31									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CANALIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL DO PRADO E ÁREAS CIRCUNVIZINHAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB													
DATA DA OS: 17/10/2025													
MEDIÇÃO: 9				VALOR = R\$ 38.554.542,31 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 8.315.601,23 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 494.429,03 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL = R\$ 8.810.030,26									
PERÍODO SIMPLES: 01/06/2026 30/06/2026													
PERÍODO ACUMULADO: 17/10/2025 30/06/2026				BOLETIM DE MEDIÇÃO									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
10.3.4	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLÁSTICO, PARA ALQUAR 1 DISJUNTOR (PADRÃO ENERGISA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 345,93	2,00	R\$ 691,86	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 691,86
10.3.5	CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATÉ 16 MM²	UN	R\$ 9,12	2,00	R\$ 18,24	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 18,24
10.3.6	GRAMPO METÁLICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATÉ 5/8", CONDUTOR DE 10 A 25 MM²	UN	R\$ 44,26	8,00	R\$ 354,08	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	8,00	R\$ 354,08
10.3.7	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2"	UN	R\$ 97,02	2,00	R\$ 194,04	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 194,04
10.3.8	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	R\$ 84,64	2,00	R\$ 169,28	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 169,28
10.3.9	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, SEMI-PESADO, DIÂMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM	M	R\$ 27,19	12,00	R\$ 326,28	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	12,00	R\$ 326,28
10.3.10	FITA AÇO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	UN	R\$ 112,73	1,00	R\$ 112,73	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 112,73
10.3.11	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AE. 08/2023	UN	R\$ 101,13	6,00	R\$ 606,78	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	6,00	R\$ 606,78
10.3.12	LUVA PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, COM ROSCA, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2")	UN	R\$ 5,35	4,00	R\$ 21,40	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	4,00	R\$ 21,40
10.3.13	MASSA PARA CALAFETAR JUNTAS	KG	R\$ 33,10	2,00	R\$ 66,20	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 66,20
10.3.14	FILETE DE MÁRMORE BRANCO, 2 CM, PARA ACABAMENTOS	m	R\$ 48,15	20,00	R\$ 963,00	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	20,00	R\$ 963,00
10.3.15	TERMINAL P/ FIO OU CABO, A COMPRESSÃO POR INDENTACÃO, DE COBRE/ELETROLÍTICO, ESTANHADO, BITOLA 10MM²	Un	R\$ 1,66	16,00	R\$ 26,56	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	16,00	R\$ 26,56
10.3.16	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 31,45	6,00	R\$ 188,70	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	6,00	R\$ 188,70
10.3.17	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 26,40	6,00	R\$ 158,40	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	6,00	R\$ 158,40
				TOTAL =	R\$ 38.554.542,31		R\$ 8.315.601,23		R\$ 494.429,03		R\$ 8.810.030,26		R\$ 29.744.512,02

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CANALIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL DO PRADO E ÁREAS CIRCUNVIZINHAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB																				
MEMÓRIA DE CÁLCULO																				
ITEM	SERVIÇOS	ESTACA				COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	ALTURA	VOLUME	EMPOLAMENTO	DENSIDADE	PESO	DMT	MÊS	H	UN	QUANTIDADES		OBSERVAÇÃO
		Inicial		Final														Parciais	Totais	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO																	Executado	2,54	
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA																	0,01	0,01	MEDICAÇÃO 01
																		0,27	0,27	MEDICAÇÃO 02
																		0,43	0,43	MEDICAÇÃO 03
																		0,21	0,21	MEDICAÇÃO 04
																		0,63	0,63	MEDICAÇÃO 05
																		0,99	0,99	MEDICAÇÃO 06
																		0,27	0,27	MEDICAÇÃO 07
																		0,20	0,20	MEDICAÇÃO 08
																		0,28	0,28	MEDICAÇÃO 09
2.0	INSTALAÇÕES E CANTEIRO DE OBRAS																			
2.1	CANTEIRO DE OBRA																			
2.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)																	Executado	7,00	
																		1,00	1,00	MEDICAÇÃO 02
																		1,00	1,00	MEDICAÇÃO 03
																		1,00	1,00	MEDICAÇÃO 04
																		1,00	1,00	MEDICAÇÃO 05
																		1,00	1,00	MEDICAÇÃO 06
																		1,00	1,00	MEDICAÇÃO 07
																		1,00	1,00	MEDICAÇÃO 08
																		1,00	1,00	MEDICAÇÃO 09
2.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)																	Executado	7,00	
																		1,00	1,00	MEDICAÇÃO 02
																		1,00	1,00	MEDICAÇÃO 03
																		1,00	1,00	MEDICAÇÃO 04
																		1,00	1,00	MEDICAÇÃO 05
																		1,00	1,00	MEDICAÇÃO 06
																		1,00	1,00	MEDICAÇÃO 07
																		1,00	1,00	MEDICAÇÃO 08
																		1,00	1,00	MEDICAÇÃO 09
2.4	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M																	Executado	7,00	
																		1,00	1,00	MEDICAÇÃO 02
																		1,00	1,00	MEDICAÇÃO 03
																		1,00	1,00	MEDICAÇÃO 04
																		1,00	1,00	MEDICAÇÃO 05
																		1,00	1,00	MEDICAÇÃO 06
																		1,00	1,00	MEDICAÇÃO 07
																		1,00	1,00	MEDICAÇÃO 08
																		1,00	1,00	MEDICAÇÃO 09
4.0	CANAL PRINCIPAL																			
4.1	ESCAVAÇÃO DA SEÇÃO DO CANAL																			
4.1.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024																	Executado	986,89	
										1.292,98			0,20					258,60		MEDICAÇÃO 03 (DESVIO E31+0,00 m a 43+8,31 m)
										648,29								648,29		MEDICAÇÃO 07 (SEÇÃO E20+2,11M A 22+3,16m)
										80,00								80,00		MEDICAÇÃO 09
4.1.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020																	Executado	22.591,86	
										1.629,15								1.629,15		MEDICAÇÃO 03 (DESVIO E31+0,00 m a 43+8,31 m)
										3.320,77								3.320,77		MEDICAÇÃO 04 (SEÇÃO DO CANAL E40+17,83m a 43+19,89 m)
										11.002,29								11.002,29		MEDICAÇÃO 05 (SEÇÃO DO CANAL E31 A E44+10,43)
										5.453,26								5.453,26		E22+1,65M A 22+13,97m e E31m A E44+10,43m
										1.186,37								1.186,37		MEDICAÇÃO 07 (SEÇÃO E20+2,11M A 22+3,16m)
										1.073,79								1.073,79		MEDICAÇÃO 08 (SEÇÃO 18+18,11 A 22+14,71)
										100,00								100,00		MEDICAÇÃO 09
4.1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020																	Executado	433.720,95	

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CANALIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL DO PRADO E ÁREAS CIRCUNVIZINHAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB																			
MEMÓRIA DE CÁLCULO																			
ITEM	SERVIÇOS	ESTACA						QUANTIDADES											
		Inicial			Final			COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	ALTURA	VOLUME	EMPOLAMENTO	DENSIDADE	PESO	DMT	MÊS	H	UN
																			Parciais
																			Totais
4.6.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024																		Executado
								88,37		97,21	1,10								97,21
								151,43		166,57	1,10								166,57
										2,42								108,00	261,36
										2,42								100,00	242,00
										2,42								60,00	145,20
4.6.2	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021																		Executado
								1.102,98			0,30	330,89							330,89
												798,22							798,22
												479,18							479,18
												561,13							561,13
												524,05							524,05
4.8	BARBACAS																		
4.8.1	DRENO BARBACÁ, DN 75 MM, SEM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021																		Executado
								0,60											130,00
								0,60											1.008,00
								0,60											1.152,00
								406,75											406,75
								356,40											356,40
								420,12											420,12
								0,60										144,00	86,40
								91,67										33,33	91,67

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CANALIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL DO PRADO E ÁREAS CIRCUNVIZINHAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB																			
MEMÓRIA DE CÁLCULO																			
ITEM	SERVIÇOS	ESTACA						QUANTIDADES											
		Inicial			Final			COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	ALTURA	VOLUME	EMPOLAMENTO	DENSIDADE	PESO	DMT	MÊS	H	UN
								478,67											133,33
								526,53											146,67

Obra: Canal do Prado																			
Cronograma Físico e Financeiro																			
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.250.014,56	1,42%	1,83%	4,03%	1,50%	4,35%	6,82%	1,89%	1,36%	1,23%	15,11%	15,11%	15,11%	15,11%	15,11%	15,11%	15,11%	15,11%
			R\$ 17.763,78	R\$ 22.928,62	R\$ 50.412,02	R\$ 18.745,55	R\$ 54.341,40	R\$ 85.211,66	R\$ 23.596,72	R\$ 16.993,53	R\$ 15.430,02	R\$ 188.918,25	R\$ 188.918,25	R\$ 188.918,25	R\$ 188.918,25	R\$ 188.918,25	R\$ 188.918,25	R\$ 188.918,25	R\$ 188.918,25
2	INSTALAÇÕES E CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 192.835,68		1,46%	71,44%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	3,67%	3,67%	3,67%	3,67%	3,67%	3,67%	3,67%	3,67%
				R\$ 2.815,59	R\$ 137.758,89	R\$ 2.815,59	R\$ 2.815,59	R\$ 2.815,59	R\$ 2.815,59	R\$ 2.815,59	R\$ 2.815,59	R\$ 7.073,53	R\$ 7.073,53	R\$ 7.073,53	R\$ 7.073,53	R\$ 7.073,53	R\$ 7.073,53	R\$ 7.073,53	R\$ 7.073,53
3	LIMPEZA E DEMOLIÇÕES	R\$ 1.543.155,60	30,90%	46,47%			11,50%			1,83%		4,63%	4,63%						
			R\$ 476.774,71	R\$ 717.040,50			R\$ 178.203,54			R\$ 28.205,31		R\$ 71.465,77	R\$ 71.465,77						
4	CANAL PRINCIPAL	R\$ 15.669.078,82			1,10%	3,35%	9,60%	9,87%	3,26%	4,47%	3,04%	21,77%	21,77%	21,77%	21,77%				
					R\$ 172.874,01	R\$ 524.818,28	R\$ 1.504.928,56	R\$ 1.545.854,00	R\$ 510.784,29	R\$ 699.715,98	R\$ 476.183,43	R\$ 3.411.306,76	R\$ 3.411.306,76	R\$ 3.411.306,76	R\$ 3.411.306,76				
5	VIAS PROJETADAS	R\$ 10.859.875,41			2,95%			0,63%		0,13%		24,07%	24,07%	24,07%	24,07%				
					R\$ 320.085,06			R\$ 68.790,05		R\$ 13.977,87		R\$ 2.614.255,61	R\$ 2.614.255,61	R\$ 2.614.255,61	R\$ 2.614.255,61				
6	DRENAGEM	R\$ 740.086,88								0,24%		49,88%	49,88%						
										R\$ 1.741,77		R\$ 369.172,56	R\$ 369.172,56						
7	PONTE E PASSARELAS	R\$ 513.615,08										50,00%	50,00%						
												R\$ 256.807,54	R\$ 256.807,54						
8	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 4.423.261,92						25,03%				18,74%	18,74%	18,74%	18,74%				
								R\$ 1.107.161,60				R\$ 829.025,08	R\$ 829.025,08	R\$ 829.025,08	R\$ 829.025,08				
9	CALÇADAS, CICLOVIAS E ÁREAS VERDES	R\$ 2.343.448,54										25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
												R\$ 585.862,14	R\$ 585.862,14	R\$ 585.862,14	R\$ 585.862,14				
10	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 1.019.169,82										10,00%	15,00%	20,00%	45,00%	10,00%			
												R\$ 101.916,98	R\$ 152.875,47	R\$ 203.833,96	R\$ 458.626,42	R\$ 101.916,98			
Porcentagem			1,28%	1,93%	1,77%	1,42%	4,51%	7,29%	1,39%	1,98%	1,28%	21,88%	22,01%	20,34%	42,15%	0,77%			
Custo		R\$	494.538,49	R\$ 742.784,72	R\$ 681.129,98	R\$ 546.379,42	R\$ 1.740.289,09	R\$ 2.809.832,90	R\$ 537.196,60	R\$ 763.450,04	R\$ 494.429,03	R\$ 8.435.904,21	R\$ 8.486.762,71	R\$ 7.840.275,33	R\$ 4.683.761,03	R\$ 297.908,72			
Porcentagem Acumulado			1,28%	3,21%	4,98%	6,39%	10,91%	18,19%	19,59%	21,57%	22,85%	44,73%	66,74%	87,08%	99,23%	100,00%			
Custo Acumulado		R\$	494.538,49	R\$ 1.237.323,20	R\$ 1.918.453,18	R\$ 2.464.832,60	R\$ 4.205.121,69	R\$ 7.014.954,59	R\$ 7.552.151,20	R\$ 8.315.601,23	R\$ 8.810.030,27	R\$ 17.245.934,48	R\$ 25.732.597,19	R\$ 33.572.872,52	R\$ 38.256.633,54	R\$ 38.554.542,31			





GRUPO
ROCHA
CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	194	Data do relatório	01/06/2026	Dia da semana	Segunda-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição	Índice pluviométrico
Manhã	☀️ Claro	Praticável	3 mm
Tarde	☀️ Claro	Praticável	

Mão de obra (31)						
Auxiliar de Topografia 1	Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Mão de Obra Própria (29)
Servente 8	Pedreiro 1	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	
Carpinteiro 3	Motorista de Veículo Pesado 4	Auxiliar de Serviços Gerais 1				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (7)					
Escavadeira 2	Caminhão Basculante 4	Retro Escavadeira 1			

Atividades (6)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Esgotamento d'água.	Em Andamento
Limpeza de material de 1ª categoria e 2ª categoria. Lado E (Est-14 a Est-18) / Lado D (Est-16 a Est-18)	Em Andamento
Execução da escavação do desvio Lado E (Est-15 a Est-18)	Em Andamento
Execução de enrocamento de pedra para implantação do piso do canal principal (Est-31+10 e Est-32+10)	Em Andamento
Desmontagem e montagem das fôrmas das paredes laterais do canal principal.	Em Andamento

Fotos (7)



06:56

01/06/2026

Seg

2159 Rua Espírito Santo, Jardim Paulistano, Campina Grande PB, 58415-265

Lat/Long: 7°16'1"S, 35°53'26"W

Tempo: Nuvens 21°C

Altitude: 493.1m

Bússola: 285° W

07:52

01/06/2026

Seg

2040 Rua Sergipe, Tambor, Campina Grande PB, 58414-460


Lat/Long: 7°14'45"S, 35°53'22"W

Tempo: Nuvens 21°C

Altitude: 495.6m

Bússola: 250° W

Precipitação de final de semana.

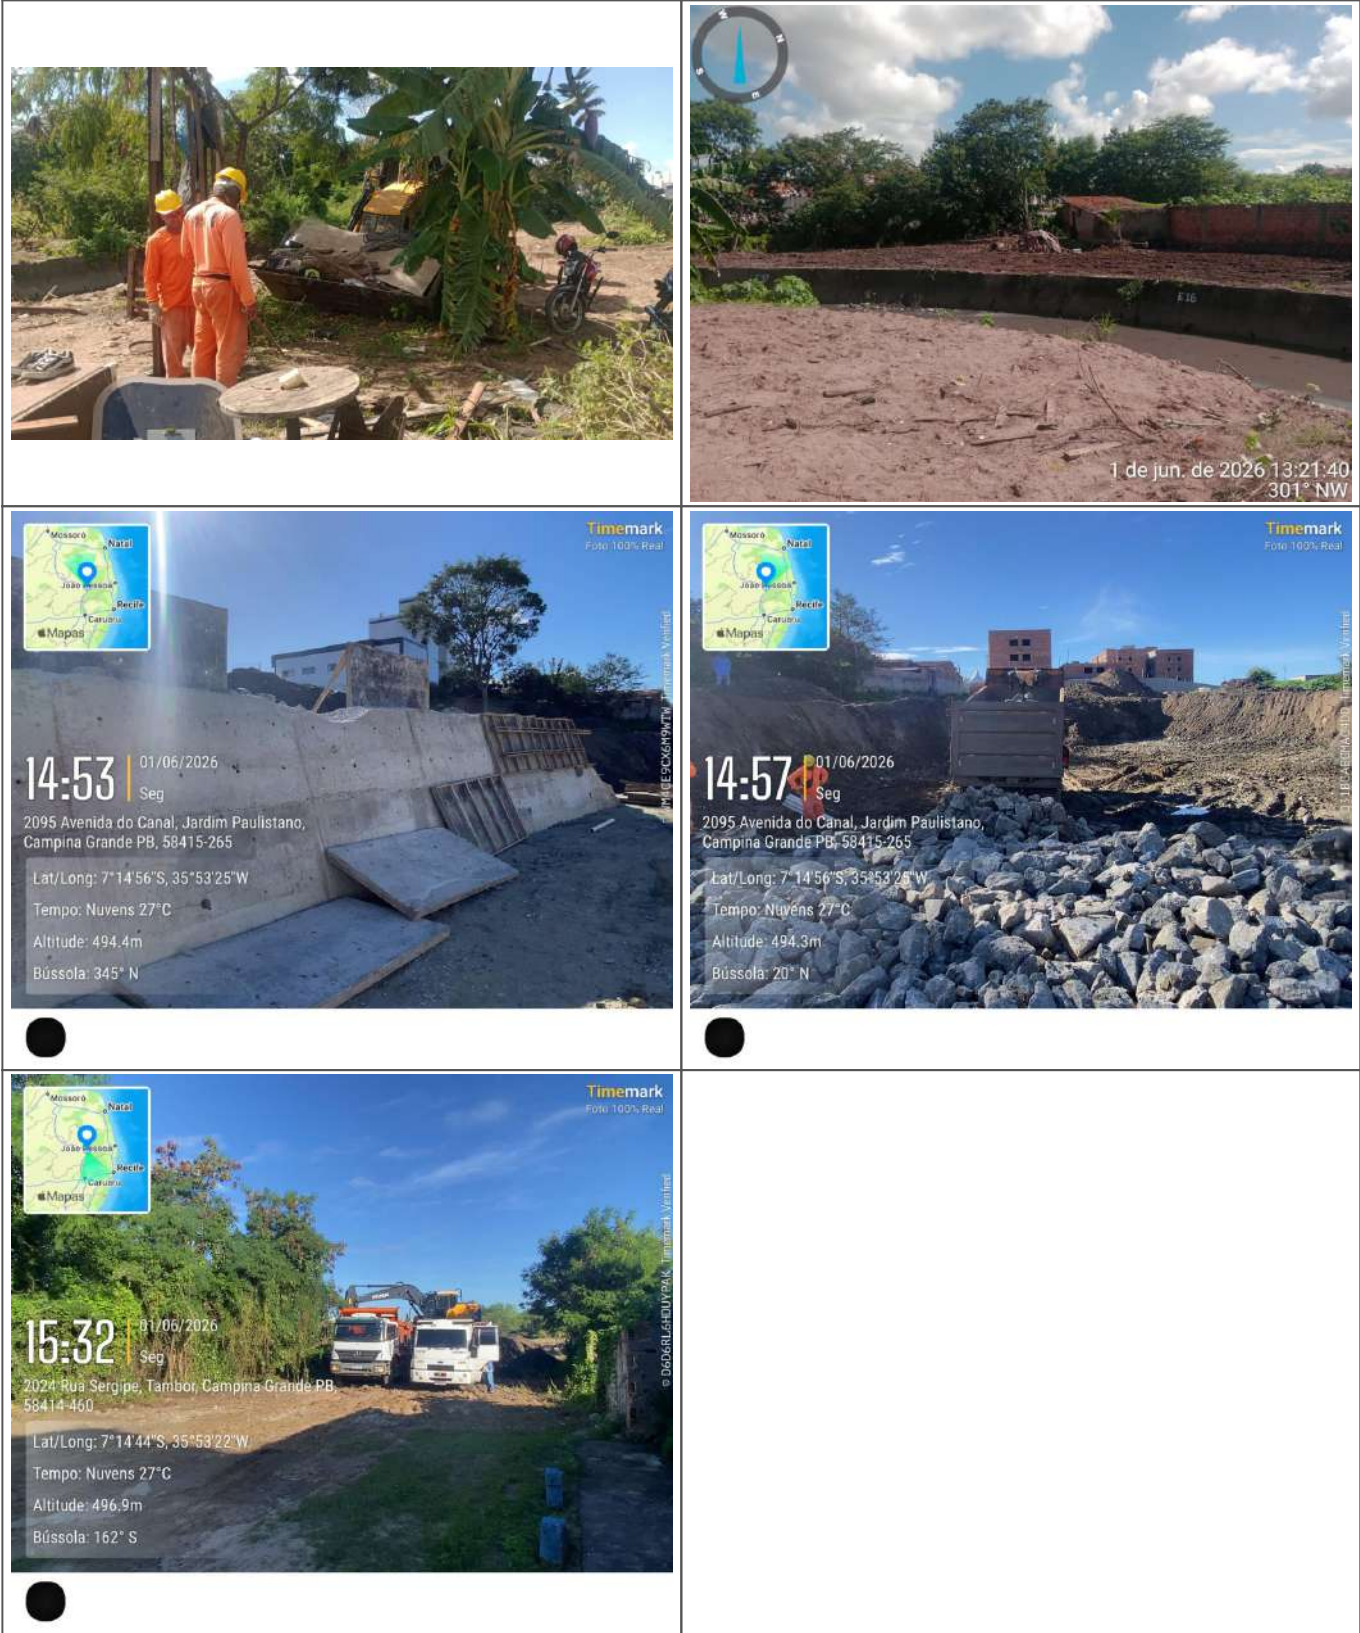


Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899375

Assinatura


Luiz Henrique Soares Pires
Eng. Civil - SECCOB PMGO

Assinatura


João Neto de Oliveira
Eng. Civil - SECCOB PMGO

Assinatura





GRUPO
ROCHA
CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	195	Data do relatório	02/06/2026	Dia da semana	Terça-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Nublado	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (31)						
Auxiliar de Topografia 1	Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Mão de Obra Própria (29)
Servente 8	Pedreiro 1	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	
Carpinteiro 3	Motorista de Veículo Pesado 4	Auxiliar de Serviços Gerais 1				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (7)					
Escavadeira 2	Caminhão Basculante 4	Retro Escavadeira 1			

Atividades (6)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Limpeza de material de 1ª categoria e 2ª categoria. Lado E (Est-14 a Est-18) / Lado D (Est-16 a Est-18)	Em Andamento
Execução de enrocamento de pedra para implantação do piso do canal principal (Est-31+10 e Est-32+10)	Em Andamento
Desmontagem e montagem das fôrmas das paredes laterais do canal principal	Em Andamento
Execução da escavação do desvio Lado E (Est-15 a Est-18)	Em Andamento
Concretagem da parede do canal principal. Lado D (Est-33+15 a Est-35 terceira etapa / Est-40 a Est-42+7 Terceira etapa)	Em Andamento

Fotos (7)



2 de jun. de 2026 07:54:51
220° SW



2 de jun. de 2026 07:54:59
55° NE

Assinado por 2 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA e RUI BARBOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/9944-AC36-2ED4-74A9> e informe o código 9944-AC36-2ED4-74A9

 2 de jun. de 2026 07:56:16 40° NE	
	 2 de jun. de 2026 17:09:00 182° S
 2 de jun. de 2026 17:11:21 199° S	

Vídeos (1)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:11


CONSTRUTORA ROSSO E ASSOCIADOS
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899375

Assinatura


Felipe Augusto de Almeida Brito
Eng. Civil - CREA 18433441

Assinatura


Luiz Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394060
Eng. Civil - SECCO6 PMGO

Assinatura





GRUPO
ROCHA
CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	196	Data do relatório	03/06/2026	Dia da semana	Quarta-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Nublado	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (31)						
Auxiliar de Topografia 1	Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Mão de Obra Própria (29)
Servente 8	Pedreiro 1	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	
Carpinteiro 3	Motorista de Veículo Pesado 4	Auxiliar de Serviços Gerais 1				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (7)					
Escavadeira 2	Caminhão Basculante 4	Retro Escavadeira 1			

Atividades (5)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Limpeza de material de 1ª categoria e 2ª categoria. Lado E (Est-14 a Est-18) Lado D (Est-16 a Est-18)	Em Andamento
Execução de enrocamento de pedra para implantação do piso do canal principal (Est-31+10 e Est-32+10)	Em Andamento
Desmontagem e montagem das fôrmas das paredes laterais do canal principal.	Em Andamento
Execução da escavação do desvio Lado E (Est-15 a Est-18)	Em Andamento



08:08 | 03/06/2026
Qua
2159 Rua Espírito Santo, Jardim Paulistano,
Campina Grande PB, 58415-265
Lat/Long: 7°15'3"S, 35°53'25"W
Tempo: Nuvens 22°C
Altitude: 488.9m
Bússola: 2° N





3 de jun. de 2026 08:59:17
184° S
1991 Rua Espírito Santo
Jardim Paulistano
Campina Grande
Paraíba
Altitude: 489.1msnm
Velocidade: 0.5km/h



Assinado por 2 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA e RUI BARBOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/9944-AC36-2ED4-74A9> e informe o código 9944-AC36-2ED4-74A9






Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899375
Assinatura


Luiz Henrique Soares Pires
Eng. Civil - BEC08 PMGO
Assinatura


RUI BARBOSA
Assinatura

GRUPO
ROCHA
CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	197	Data do relatório	04/06/2026	Dia da semana	Quinta-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (32)						
Auxiliar de Topografia 1	Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Mão de Obra Própria (30)
Servente 8	Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	
Carpinteiro 3	Motorista de Veículo Pesado 4	Auxiliar de Serviços Gerais 1				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (7)					
Escavadeira 2	Caminhão Basculante 4	Retro Escavadeira 1			

Atividades (5)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Limpeza de material de 1ª categoria e 2ª categoria Lado E (Est-10 a Est-18)	Em Andamento
Execução de enrocamento de pedra para implantação do piso do canal principal (Est-31+10 e Est-32+10)	Em Andamento
Desmontagem e montagem das fôrmas das paredes laterais do canal principal.	Em Andamento
Concretagem da parede do canal principal Lado D (Est-33+15 a Est-35 *Complemento Terceira Etapa / Est-36 a Est-36+12 Terceira etapa)	Em Andamento

Fotos (8)

08:06

04/06/2026

Qui

2095 Avenida do Canal, Jardim Paulistano, Campina Grande PB, 58415-265

Lat/Long: 7°14'56"S, 35°53'26"W

Tempo: Nuvens 21°C

Altitude: 494.5m

Bússola: 37° NE

08:06

04/06/2026

Qui

2095 Avenida do Canal, Jardim Paulistano, Campina Grande PB, 58415-265

Lat/Long: 7°14'56"S, 35°53'26"W



Tempo: Nuvens 21°C

Altitude: 494.5m

Bússola: 188° S

Assinado por 2 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA e RUI BARBOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/9944-AC36-2ED4-74A9> e informe o código 9944-AC36-2ED4-74A9

1 / 2

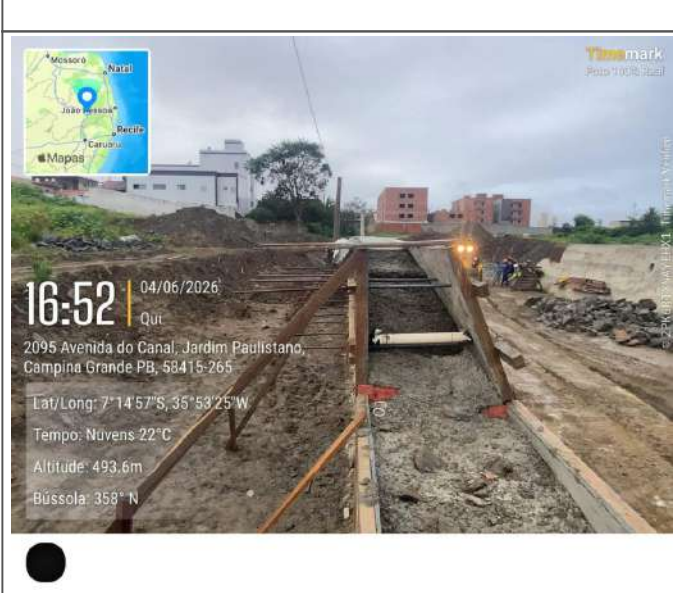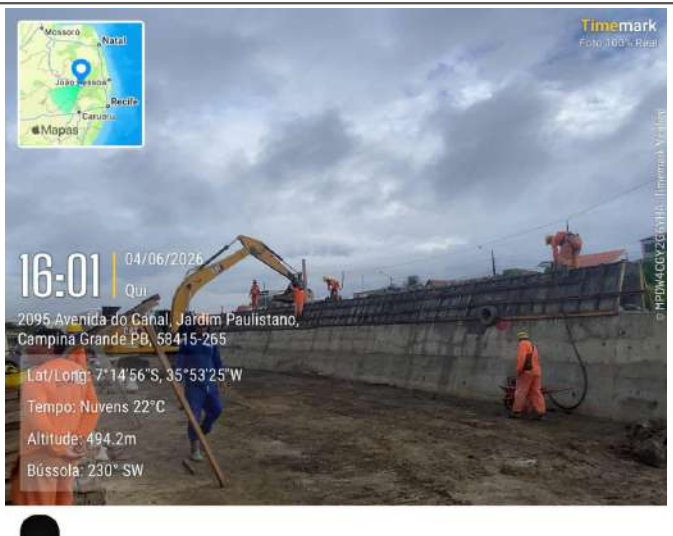

Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899375

Assinatura

Luiz Henrique Soares Pires
Eng. Civil - CREA PB 1621899375

Assinatura

João Neto de Oliveira
Eng. Civil - CREA PB 1621899375

Assinatura





GRUPO
ROCHA
CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	198	Data do relatório	05/06/2026	Dia da semana	Sexta-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (32)						
Auxiliar de Topografia 1	Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Mão de Obra Própria (30)
Servente 8	Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	
Carpinteiro 3	Motorista de Veículo Pesado 4	Auxiliar de Serviços Gerais 1				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (7)					
Escavadeira 2	Caminhão Basculante 4	Retro Escavadeira 1			

Atividades (5)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Limpeza de material de 1ª categoria e 2ª categoria Lado E (Est-10 a Est-18)	Em Andamento
Execução de enrocamento de pedra para implantação do canal principal entre a Est-31+10 e a Est-32+10. (Efetuando a regularização e o nivelamento das pedras)	Em Andamento
Execução dos barbacãs no enrocamento de pedra para implantação do piso do Canal principal.	Em Andamento
Desmontagem e montagem das fôrmas das paredes laterais do canal principal.	Em Andamento

Fotos (5)



07:56

05/06/2026

Sex

1760 Avenida Assis Chateaubriand, Tambor, Campina Grande PB, 58105-421

Lat/Long: 7°14'46"S, 35°53'22"W

Tempo: Nuvens 21°C

Altitude: 495,8m

Bússola: 306° NW



08:10

05/06/2026

Sex

2159 Rua Espírito Santo, Jardim Paulistano, Campina Grande PB, 58415-265

Lat/Long: 7°14'56"S, 35°53'25"W


Tempo: Nuvens 21°C

Altitude: 494,5m

Bússola: 29° NE

Assinado por 2 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA e RUI BARBOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/9944-AC36-2ED4-74A9> e informe o código 9944-AC36-2ED4-74A9

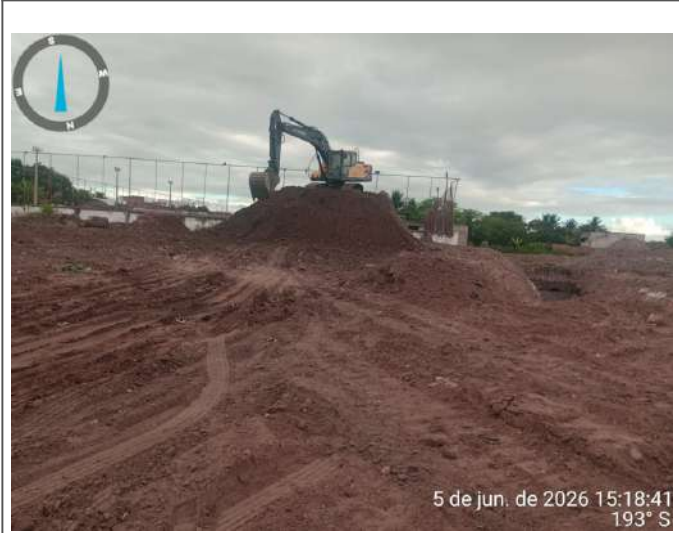

 5 de jun. de 2026 15:18:41 193° S	 15:24 05/06/2026 Sex 2159 Rua Espírito Santo, Jardim Paulistano, Campina Grande PB, 58415-265 Lat/Long: 7°14'58"S, 35°53'26"W Tempo: Nuvens 24°C Altitude: 493.8m Bússola: 154° SE
 5 de jun. de 2026 16:52:02 7.2490566666666666S 35.89061W 2184 Rua Espírito Santo Jardim Paulistano Campina Grande Paraíba #CONSTRUTORA ROCHA	


CONSTRUTORA ROCHA CALDETE
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899375
Assinatura


Felipe Augusto de Almeida
Eng. Civil - CREA 184324441
Assinatura


Luiz Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - BEC008 PMGO
Assinatura





GRUPO
ROCHA
CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	199	Data do relatório	06/06/2026	Dia da semana	Sábado
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (31)						
Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Servente 8	Mão de Obra Própria (29)
Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	Carpinteiro 3	
Motorista de Veículo Pesado 4	Auxiliar de Serviços Gerais 1					
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (7)					
Escavadeira 2	Caminhão Basculante 4	Retro Escavadeira 1			

Atividades (5)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Limpeza de material de 1ª categoria e 2ª categoria. Lado E (Est-10 a Est-18)	Em Andamento
Desmontagem e montagem das fôrmas das paredes laterais do canal principal.	Em Andamento
Execução do desvio Lado E entre a Est-15 e a Est-18 (Colocação de Pedras no talude do desvio)	Em Andamento
Concretagem do lastro (piso) do canal principal entre a Est-32 e a Est-33	Em Andamento

Fotos (11)



6 de jun. de 2026 07:21:45
180° S



08:22 | 06/06/2026
São
2095 Avenida do Canal, Jardim Pavilhão,
Campina Grande PB 58415-265
Lat/Long: 7° 14' 56" S, 35° 53' 26" W
Tempo: Nuvens 19 °C
Altitude: 494.4m
Bússola: 25° NE

Assinado por 2 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA e RUI BARBOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/9944-AC36-2ED4-74A9> e informe o código 9944-AC36-2ED4-74A9







Vídeos (1)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:08


CONSTRUTORA ROSSO CARVALHO ETE
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899375
Assinatura


FELIPE AUGUSTO DE ALMEIDA
Eng. Civil - CREA 184330/PA
Assinatura


Luiz Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394060
Eng. Civil - SECCO8 PMGO
Assinatura



GRUPO
ROCHA
CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	200	Data do relatório	08/06/2026	Dia da semana	Segunda-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição	Índice pluviométrico
Manhã	☀️ Claro	Praticável	12.5 mm
Tarde	☀️ Claro	Praticável	

Mão de obra (33)						
Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Servente 8	Mão de Obra Própria (31)
Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	Carpinteiro 3	
Motorista de Veículo Pesado 4	Auxiliar de Serviços Gerais 1	Auxiliar de Topografia 2				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (7)					
Escavadeira 2	Caminhão Basculante 4	Retro Escavadeira 1			

Atividades (5)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Limpeza de material de 1ª categoria e 2ª categoria Lado E (Est-10 a Est-18)	Em Andamento
Desmontagem e montagem das fôrmas das paredes laterais do canal principal	Em Andamento
Colocação dos barbacãs no enrocamento de pedra para implantação do piso do canal principal entre a Est-31+10 e a Est-32.	Em Andamento
Execução do desvio Lado E entre a Est-15 e a Est-18 (Colocação de Pedras no talude do desvio)	Em Andamento

Fotos (6)



08:08 | 08/06/2026 | Seg

2159 Rua Espírito Santo, Jardim Paulistano, Campina Grande PB, 58415-265

Lat/Long: 7°15'1"S, 35°53'26"W

Tempo: Nuvens 20°C

Altitude: 492.8m

Bússola: 351° N

12,5 mm /chuva no domingo



08:39 | 08/06/2026 | Seg

2095 Avenida do Canal, Jardim Paulistano, Campina Grande PB, 58415-265

Lat/Long: 7°14'56"S, 35°53'25"W

Tempo: Nuvens 20°C

Altitude: 494.8m

Bússola: 37° NE

Assinado por 2 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA e RUI BARBOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/9944-AC36-2ED4-74A9> e informe o código 9944-AC36-2ED4-74A9





Vídeos (1)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4 Desvio Lado E (Est-15 e a Est-18)	00:05


CONSTRUTORA ROCHA CALDEIRA
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899375
Assinatura


FELIPE RIBEIRO PEREIRA RIBEIRO
Eng. Civil - CREA 1621899375
Assinatura


Luiz Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - BEC008 PMGO
Assinatura



GRUPO
ROCHA
CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	201	Data do relatório	09/06/2026	Dia da semana	Terça-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (33)						
Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Servente 8	Mão de Obra Própria (31)
Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	Carpinteiro 3	
Motorista de Veículo Pesado 4	Auxiliar de Serviços Gerais 1	Auxiliar de Topografia 2				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)


Equipamentos (7)					
Escavadeira 2	Caminhão Basculante 4	Retro Escavadeira 1			

Atividades (5)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Limpeza de material de 1ª categoria e 2ª categoria Lado E (Est-10 a Est-18)	Em Andamento
Desmontagem e montagem das fôrmas das paredes laterais do canal principal.	Em Andamento
Execução do desvio Lado E entre a Est-15 e a Est-18	Em Andamento
Concretagem das parede do canal principal Lado D (Est-36+12 a Est-37+17 Terceira Etapa) e Concretagem do Lastro (piso) do canal principal (Est-31+10 a Est-32).	Em Andamento

Fotos (6)



Assinado por 2 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA e RUI BARBOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/9944-AC36-2ED4-74A9> e informe o código 9944-AC36-2ED4-74A9

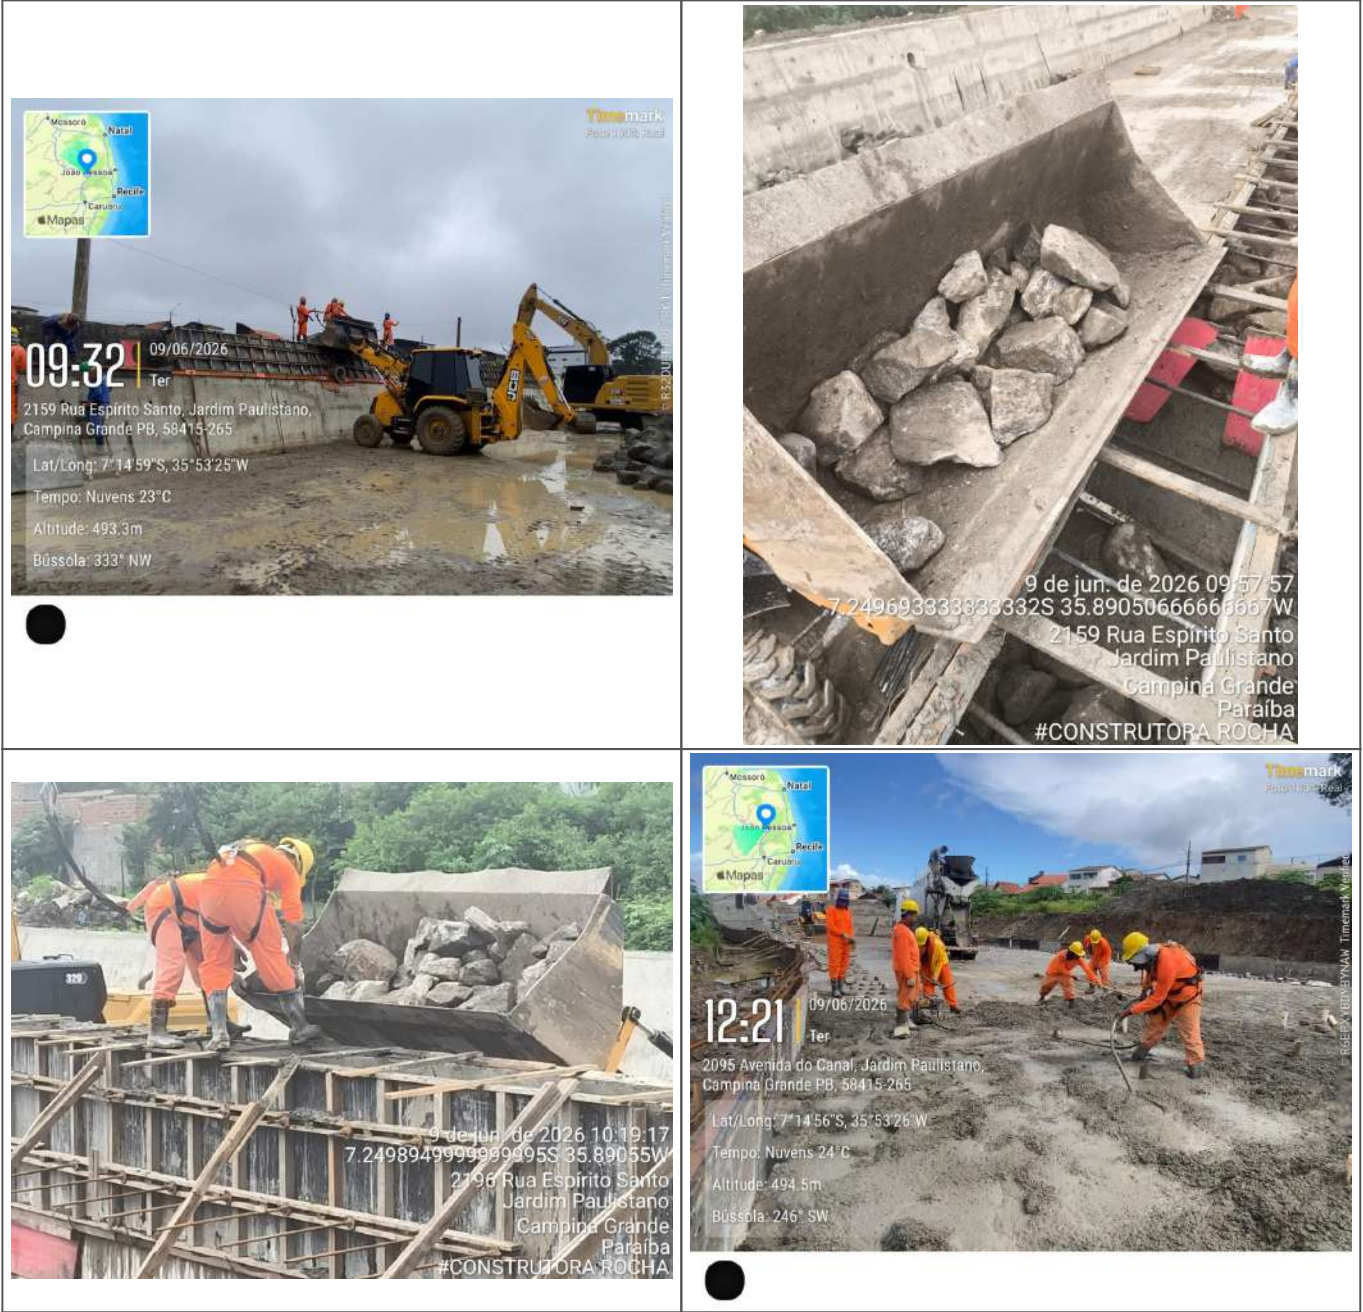

Vídeos (2)		
Vídeo 1 (visualizar).mp4		00:23
Vídeo 2 (visualizar).mp4		00:14


Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899375

Assinatura


Luiz Henrique Soares Pinto
Eng. Civil - CREA PB 1621899375

Assinatura


João Neto de Oliveira
Eng. Civil - CREA PB 1621899375

Assinatura



GRUPO
ROCHA
CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	202	Data do relatório	10/06/2026	Dia da semana	Quarta-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (32)						
Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Servente 8	Mão de Obra Própria (30)
Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	Carpinteiro 3	
Motorista de Veículo Pesado 3	Auxiliar de Serviços Gerais 1	Auxiliar de Topografia 2				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (6)					
Escavadeira 2	Caminhão Basculante 3	Retro Escavadeira 1			

Atividades (4)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Limpeza de material de 1ª categoria e 2ª categoria. Lado D (Est-16 a Est-18)	Em Andamento
Desmontagem e montagem das fôrmas das paredes laterais do canal principal.	Em Andamento
Execução do desvio Lado E entre a Est-15 e a Est-18	Em Andamento

Fotos (7)





Assinado por 2 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA e RUI BARBOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/9944-AC36-2ED4-74A9> e informe o código 9944-AC36-2ED4-74A9

Treinamento de trabalho em altura (baseado na NR-35).



Vídeos (1)

[Vídeo 1 \(visualizar\).mp4](#)

00:26

Assinatura

Assinatura


Luis Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - SECOB IPMCG



Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	203	Data do relatório	11/06/2026	Dia da semana	Quinta-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (32)

Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Servente 8	Mão de Obra Própria (30)
Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	Carpinteiro 3	
Motorista de Veículo Pesado 3	Auxiliar de Serviços Gerais 1	Auxiliar de Topografia 2				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)


Equipamentos (6)


Escavadeira 2	Caminhão Basculante 3	Retro Escavadeira 1			
-------------------------	---------------------------------	-------------------------------	--	--	--

Atividades (5)

Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Esgotamento d'água.	Em Andamento
Desmontagem e montagem das fôrmas das paredes laterais do canal principal.	Em Andamento
Montagem de fôrma para execução do enrocamento de pedra para implantação do piso do canal principal entre a Est-20 e a Est-22	Em Andamento
Limpeza mecanizada entre a Est-30 e a Est-31	Em Andamento

Fotos (7)

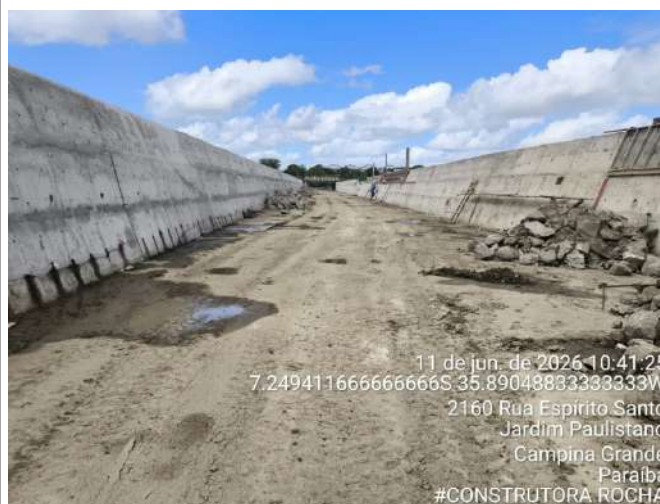

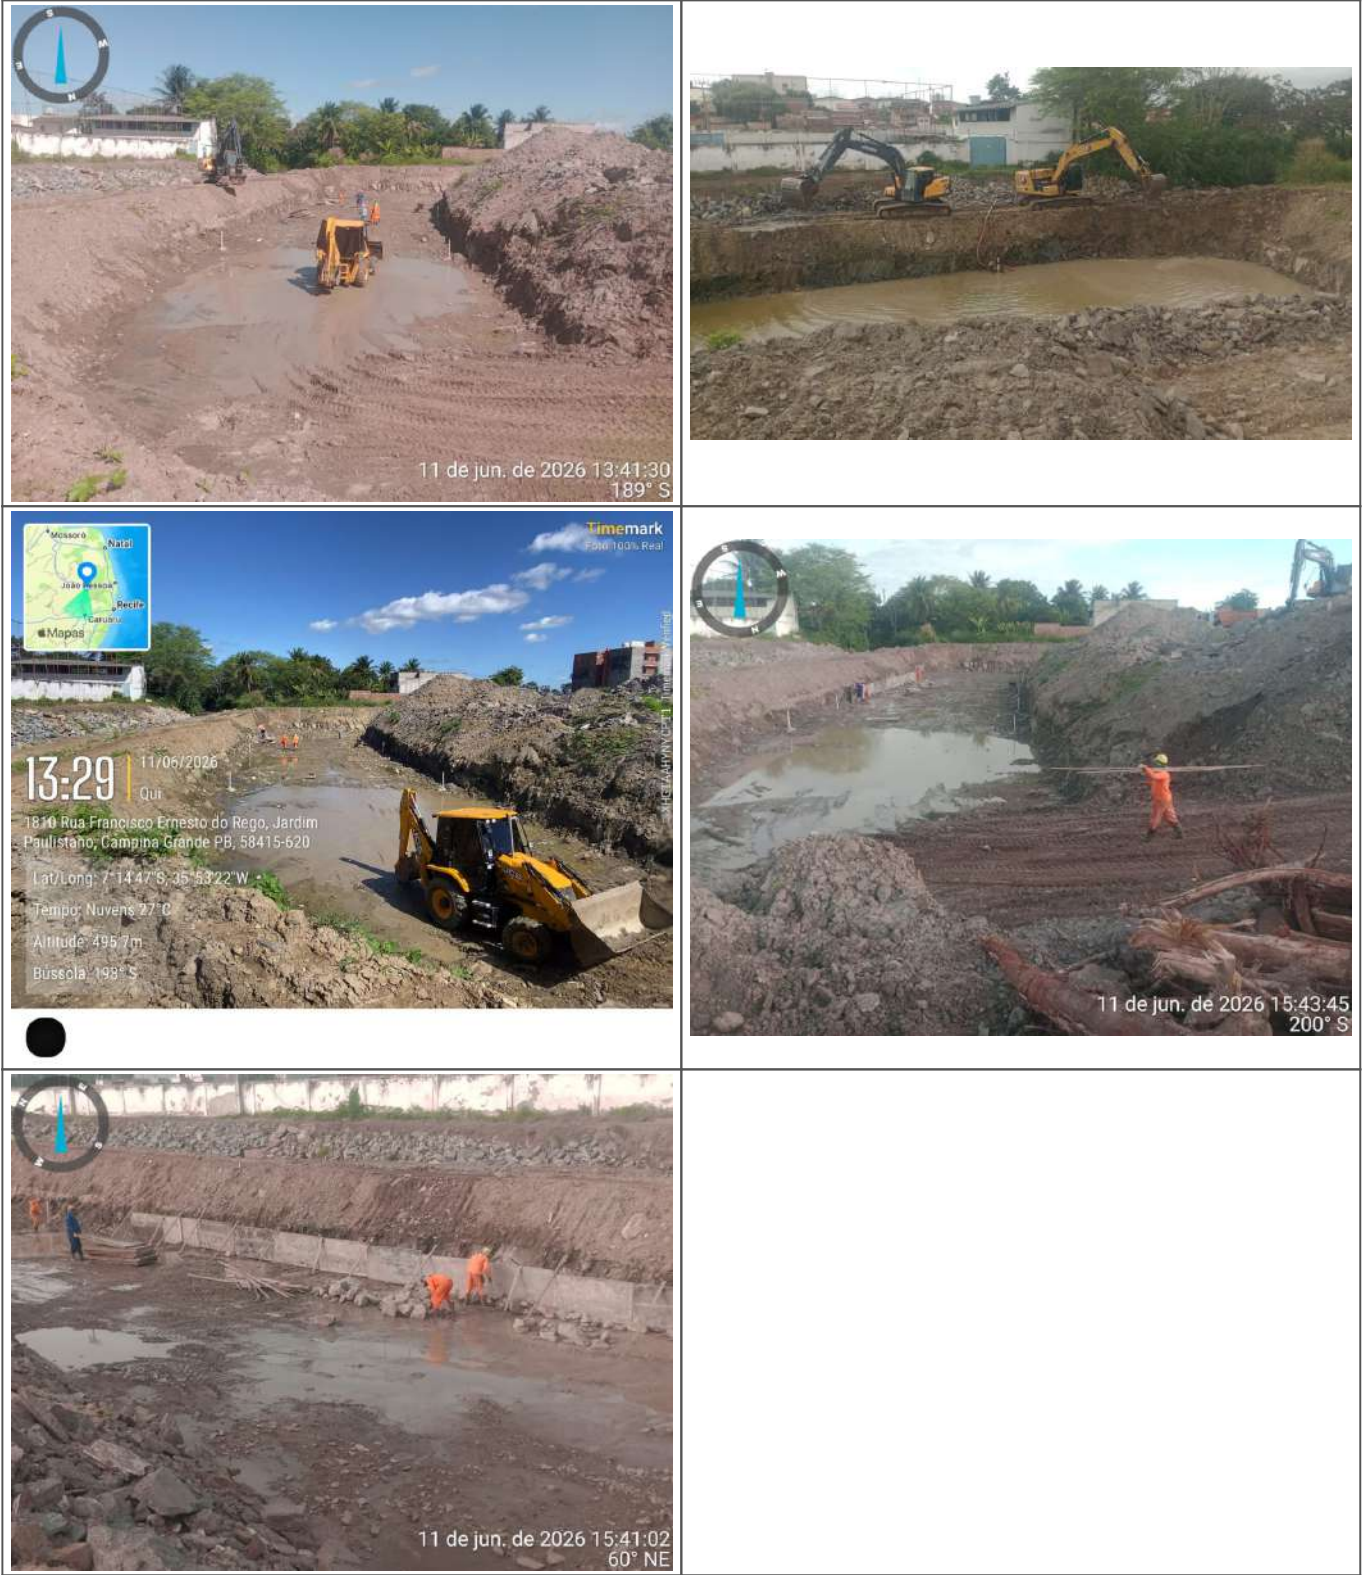

Vídeos (1)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:18


Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899375

Assinatura


Luiz Henrique Soares Pinto
Eng. Civil - SECCO P/MGO

Assinatura


Rui Barbosa
Eng. Civil - SECCO P/MGO

Assinatura





GRUPO
ROCHA
CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	204	Data do relatório	12/06/2026	Dia da semana	Sexta-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (32)						
Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Servente 8	Mão de Obra Própria (30)
Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	Carpinteiro 3	
Motorista de Veículo Pesado 3	Auxiliar de Serviços Gerais 1	Auxiliar de Topografia 2				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (6)					
Escavadeira 2	Caminhão Basculante 3	Retro Escavadeira 1			

Atividades (4)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Desmontagem e montagem das fôrmas das paredes laterais do canal principal.	Em Andamento
Montagem de fôrma para execução do enrocamento de pedra para implantação do piso do canal principal entre a Est-20 e a Est-22	Em Andamento
Limpeza mecanizada entre a Est-30 e a Est-31	Em Andamento

Fotos (8)



Assinado por 2 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA e RUI BARBOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/9944-AC36-2ED4-74A9> e informe o código 9944-AC36-2ED4-74A9

Vídeos (1)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:16


Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899375

Assinatura


Luiz Henrique Soares Pinto
Eng. Civil - CRECOP PMGO

Assinatura


Rui Barbosa
Eng. Civil - CRECOP PMGO

Assinatura



 GRUPO ROCHA CAVALCANTE					
Relatório Diário de Obra (RDO)					
Relatório nº	205	Data do relatório	13/06/2026	Dia da semana	Sábado
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (26)						
Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Encarregado Geral 1	Servente 5	Pedreiro 2	Mão de Obra Própria (24)
Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Almoxarife 1	Carpinteiro 3	Motorista de Veículo Pesado 3	Auxiliar de Topografia 2	
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (6)					
Escavadeira 2	Caminhão Basculante 3	Retro Escavadeira 1			

Atividades (5)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Desmontagem e montagem das fôrmas das paredes laterais do canal principal.	Em Andamento
Limpeza mecanizada entre as Est-30 e a Est-31	Em Andamento
Concretagem da parede lateral do Canal principal Lado D (Est-37+17 a Est-40 Terceira Etapa).	Em Andamento
Execução de enrocamento de pedra para implantação do piso do canal principal entre a Est-20 e a Est-22	Em Andamento

Fotos (5)	
 ENGECONSULT CANAL DO PRADO 13.06.2026 11:38 25M 180788 9197563 R. Santa Catarina, 1916 - Liberdade - PB, 58414-035	

Assinado por 2 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA e RUI BARBOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/9944-AC36-2ED4-74A9> e informe o código 9944-AC36-2ED4-74A9




CONSTRUTORA ROSSO CARVALHO E
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899375
Assinatura


Felipe Augusto de Almeida
Eng. Civil - CREA 18422441
Assinatura


Luiz Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - BEC016 PMGO
Assinatura





GRUPO
ROCHA
CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	206	Data do relatório	15/06/2026	Dia da semana	Segunda-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				


Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (32)						
Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Servente 8	Mão de Obra Própria (30)
Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	Carpinteiro 3	
Motorista de Veículo Pesado 3	Auxiliar de Serviços Gerais 1	Auxiliar de Topografia 2				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (6)					
Escavadeira 2	Caminhão Basculante 3	Retro Escavadeira 1			

Atividades (5)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Desmontagem e montagem das fôrmas das paredes laterais do canal principal.	Em Andamento
Montagem de fôrma para execução do enrocamento de pedra para implantação do piso do canal principal entre a Est-20 e a Est-22	Em Andamento
Execução de enrocamento de pedra para implantação do piso do canal principal entre a Est-20 a Est-22	Em Andamento
Escavação mecanizada na Est-30	Em Andamento

Fotos (6)

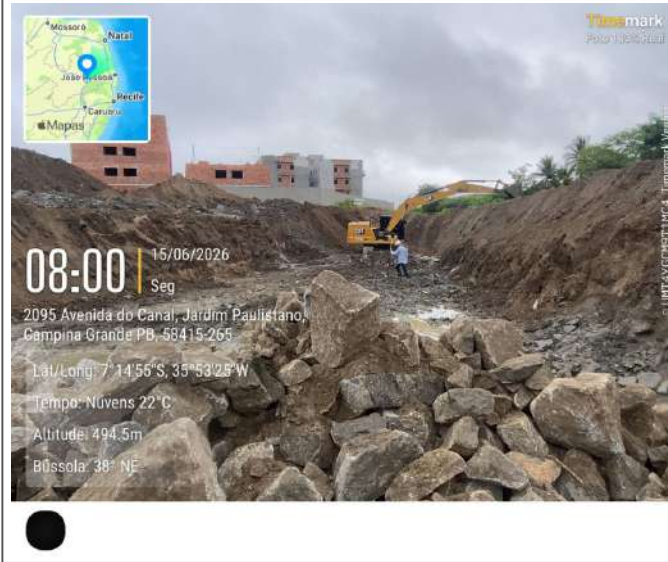



Assinado por 2 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA e RUI BARBOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/9944-AC36-2ED4-74A9> e informe o código 9944-AC36-2ED4-74A9


CONSTRUTORA ROCHA CALDEIRA
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899375
Assinatura


CONSTRUTORA ROCHA CALDEIRA
Luiz Henrique Soares Pires
Eng. Civil - CREA 1621899375
Assinatura


CONSTRUTORA ROCHA CALDEIRA
Luiz Henrique Soares Pires
CREA-PB 1621394060
Eng. Civil - SECCO 08 PMGO
Assinatura

GRUPO ROCHA CAVALCANTE					
Relatório Diário de Obra (RDO)					
Relatório nº	207	Data do relatório	16/06/2026	Dia da semana	Terça-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição	Índice pluviométrico
Manhã	☀️ Claro	Praticável	5 mm
Tarde	☀️ Claro	Praticável	

Mão de obra (32)						
Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Servente 8	Mão de Obra Própria (30)
Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	Carpinteiro 3	
Motorista de Veículo Pesado 3	Auxiliar de Serviços Gerais 1	Auxiliar de Topografia 2				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (6)					
Escavadeira 2	Caminhão Basculante 3	Retro Escavadeira 1			

Atividades (6)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Desmontagem e montagem das fôrmas das paredes laterais do canal principal.	Em Andamento
Montagem de fôrma para execução do enrocamento de pedra para implantação do piso do canal principal entre a Est-20 e a Est-22	Em Andamento
Execução de enrocamento de pedra para implantação do piso do canal principal entre a Est-20 a Est-22	Em Andamento
Escavação mecanizada na Est-30	Em Andamento
Concretagem da Parede Lateral do Canal Principal Lado E (Est-32 a Est-33 Primeira Etapa)	Em Andamento

Fotos (6)	
Timemark Foto: 100% Real 06:59 16/06/2026 Ter 2159 Rua Espírito Santo, Jardim Paulistano, Campina Grande PB, 58415-265 Lat/Long: 7° 15' 1" S, 35° 53' 26" W Tempo: Nuvens 21°C Altitude: 493.0m Bússola: 292° W Precipitação de 5 mm na noite anterior	Timemark Foto: 100% Real 08:57 16/06/2026 Ter 1541 Rua Francisco Ernesto do Rego, Jambolô, Campina Grande PB, 58415-3620 Lat/Long: 7° 14' 47" S, 35° 53' 22" W Tempo: Nuvens 21°C Altitude: 495.7m Bússola: 188° S




Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899375

Assinatura


Felipe Henrique Soares Pinto
Eng. Civil - 05411842044

Assinatura


Luiz Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - BEC08 PMGO

Assinatura





GRUPO

ROCHA

CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	208	Data do relatório	17/06/2026	Dia da semana	Quarta-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (32)						
Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Servente 8	Mão de Obra Própria (30)
Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	Carpinteiro 3	
Motorista de Veículo Pesado 3	Auxiliar de Serviços Gerais 1	Auxiliar de Topografia 2				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (6)					
Escavadeira 2	Caminhão Basculante 3	Retro Escavadeira 1			

Atividades (5)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Desmontagem e montagem das fôrmas das paredes laterais do canal principal	Em Andamento
Execução dos barbacãs no enrocamento de pedra para implantação do piso do canal principal (Est-20 a Est-22)	Em Andamento
Escavação mecanizada na Est-30	Em Andamento
Concretagem da Parede Lateral do Canal Principal Lado D (Est-32 a Est-33 Primeira Etapa)	Em Andamento

Fotos (8)



17 de jun. de 2026 08:21:27

7.246529999999999S 35.88961833333333W

612a Rua Prefeito Antonio Luiz Coutinho

Tambor

Campina Grande

Paraíba

#CONSTRUTORA ROCHA



10:20

17/06/2026

Qua

2159 Rua Espírito Santo, Jardim Paulistano, Campina Grande PB, 58415-255

Lat/Long: 7°14'56"S, 35°53'25"W

Tempo: Ensolarado 24°C

Altitude: 494.5m

Bússola: 8° N

Assinado por 2 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA e RUI BARBOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/9944-AC36-2ED4-74A9> e informe o código 9944-AC36-2ED4-74A9




Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899375

Assinatura


Luiz Henrique Soares Pinto
Eng. Civil - 05411842041

Assinatura


João Neto de Oliveira
Eng. Civil - 05411842041

Assinatura



Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	209	Data do relatório	18/06/2026	Dia da semana	Quinta-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				



Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável
Noite	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (32)						
Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Servente 8	Mão de Obra Própria (30)
Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	Carpinteiro 3	
Motorista de Veículo Pesado 3	Auxiliar de Serviços Gerais 1	Auxiliar de Topografia 2				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (6)					
Escavadeira 2	Caminhão Basculante 3	Retro Escavadeira 1			

Atividades (7)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Desmontagem e montagem das fôrmas das paredes laterais do canal principal.	Em Andamento
Transporte de Pedras.	Em Andamento
Execução dos barbacãs para implantação do piso do canal principal entre a Est-20 e a Est-22	Em Andamento
Escavação mecanizada na Est-30	Em Andamento
Concretagem da Parede Lateral do Canal Principal Lado D (Est-32 a Est-33 Segunda Etapa) Obs. 1 caminhão.	Em Andamento
Concretagem do Lastro (piso) do Canal Principal entre a Est-20+1 e a Est-22	Em Andamento

Fotos (8)

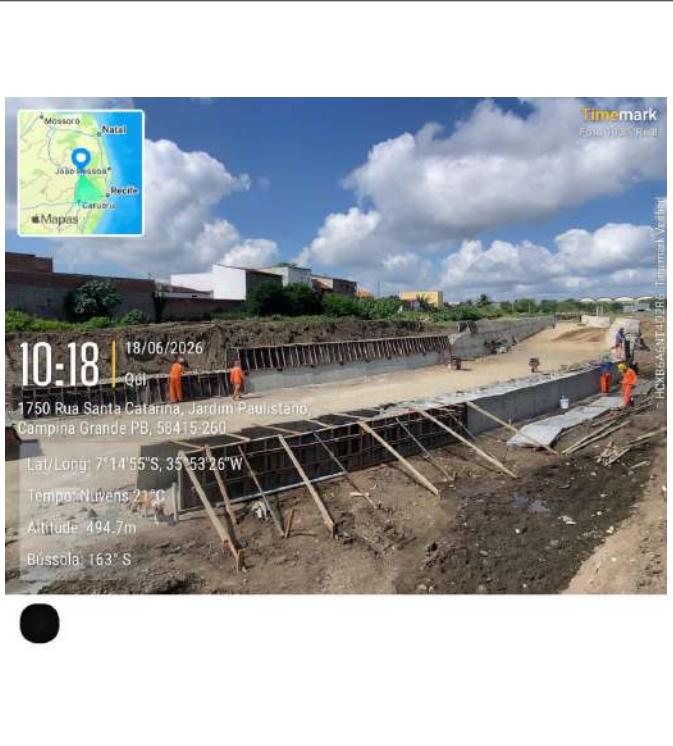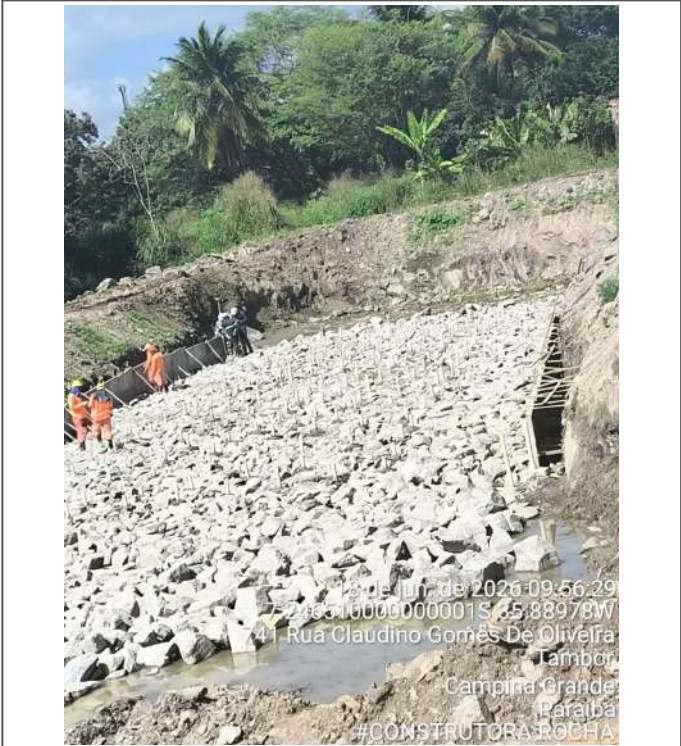




CONSTRUTORA ROCHA CARVALHO
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899375

Assinatura


Felipe Augusto de Almeida Silva
Eng. Civil - CREA 184324441

Assinatura


Luiz Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - SECCO 01 PMGO

Assinatura





Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	210	Data do relatório	19/06/2026	Dia da semana	Sexta-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (32)

Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Servente 8	Mão de Obra Própria (30)
Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	Carpinteiro 3	
Motorista de Veículo Pesado 3	Auxiliar de Serviços Gerais 1	Auxiliar de Topografia 2				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (6)

Escavadeira 2	Caminhão Basculante 3	Retro Escavadeira 1			
-------------------------	---------------------------------	-------------------------------	--	--	--

Atividades (4)

Atividades (4)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Desmontagem e montagem das fôrmas das paredes laterais do canal principal.	Em Andamento
Acabamento dos tubos de espera no Canal Principal.	Em Andamento
Transporte de Pedras.	Em Andamento

Fotos (2)



Pedro Saulo
CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899315

Assinatura

Felipe Gustavo Tenreiro Males
ENG. CIVIL - CREA 180422044-1

Assinatura


Luis Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - SECOB IPMCG

Assinatura



GRUPO
ROCHA
CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	212	Data do relatório	20/06/2026	Dia da semana	Sábado
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Ocorrências (1)

Não Trabalha/Sem expediente.

Dia parado

Comentários (1)

Felipe Melo 07/07/2026 13:30
Dia sem atividade, a Construtora deu folga aos funcionários e só retornará às atividades na próxima quinta-feira 25/06/2026.



Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899375

Assinatura



Felipe Melo
Eng. Civil - CREA 1621899375

Assinatura



Luiz Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - BEC008 PMGO

Assinatura



 GRUPO ROCHA CAVALCANTE					
Relatório Diário de Obra (RDO)					
Relatório nº	213	Data do relatório	22/06/2026	Dia da semana	Segunda-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				
Condição climática		Tempo		Condição	
Manhã		☀️ Claro		Praticável	
Tarde		☀️ Claro		Praticável	
Ocorrências (1)					
Dia do acordo de recesso de São João. Sem expediente.					


Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899375

Assinatura


Felipe Augusto de Almeida
Eng. Civil - CREA 18432441

Assinatura


Luis Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - BEC008 PMGO

Assinatura

 GRUPO ROCHA CAVALCANTE					
Relatório Diário de Obra (RDO)					
Relatório nº	214	Data do relatório	23/06/2026	Dia da semana	Terça-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				
Condição climática		Tempo		Condição	
Manhã		☀️ Claro		Praticável	
Tarde		☀️ Claro		Praticável	
Ocorrências (1)					
Dia do acordo de recesso de São João. Sem expediente.					


Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899375

Assinatura


Felipe Augusto de Almeida
Eng. Civil - CREA 18432441

Assinatura


Luis Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - BEC008 PMGO

Assinatura

 GRUPO ROCHA CAVALCANTE					
Relatório Diário de Obra (RDO)					
Relatório nº	215	Data do relatório	24/06/2026	Dia da semana	Quarta-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				
Condição climática		Tempo		Condição	
Manhã		☀️ Claro		Praticável	
Tarde		☀️ Claro		Praticável	
Ocorrências (1)					
Feriado de São João.					


Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899375
Assinatura


Felipe Augusto de Almeida
Eng. Civil - CREA 18432441
Assinatura


Luiz Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - BEC008 PMGO
Assinatura





GRUPO
ROCHA
CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	211	Data do relatório	25/06/2026	Dia da semana	Quinta-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição	Índice pluviométrico
Manhã	☀️ Claro	Praticável	18 mm
Tarde	☀️ Claro	Praticável	

Mão de obra (30)						
Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Servente 8	Mão de Obra Própria (28)
Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	Carpinteiro 1	
Motorista de Veículo Pesado 3	Auxiliar de Serviços Gerais 1	Auxiliar de Topografia 2				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (6)					
Escavadeira 2	Caminhão Basculante 3	Retro Escavadeira 1			

Atividades (5)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Execução de enrocamento de pedra para implantação do piso do canal principal na Est-31	Em Andamento
Desmontagem e montagem das fôrmas das paredes laterais do canal principal.	Em Andamento
Transporte de Pedras.	Em Andamento
Concretagem das paredes laterais do Canal Principal Lado E (Est-32+10 a Est-33+10 Segunda Etapa) e Lado D (Est-32+13 a Est-33+10 Segunda Etapa)	Em Andamento

Fotos (5)



06:37 | 25/06/2026
Qui
2159 Rua Espírito Santo, Jardim Paulistano, Campina Grande PB, 58415-265
Lat/Long: 7°15'1"S, 35°53'26"W
Tempo: Nuvens 19°C
Altitude: 493.2m
Bússola: 279° W



Time mark
Foto 100% Real
© Google/Mapas/Mapas LT, Imagem Verificada

Precipitação durante o recesso de São João, de 20/06 a 25/06



06:37 | 25/06/2026
Qui
2159 Rua Espírito Santo, Jardim Paulistano, Campina Grande PB, 58415-265
Lat/Long: 7°15'1"S, 35°53'26"W
Tempo: Nuvens 19°C
Altitude: 493.1m
Bússola: 280° W



Time mark
Foto 100% Real
© Google/Mapas/Mapas LT, Imagem Verificada

Assinado por 2 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA e RUI BARBOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/9944-AC36-2ED4-74A9> e informe o código 9944-AC36-2ED4-74A9






Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899375

Assinatura


Felipe Augusto de Almeida
Eng. Civil - CREA 18422441

Assinatura


Luis Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394060
Eng. Civil - BEC008 PMGO

Assinatura



GRUPO
ROCHA
CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	216	Data do relatório	26/06/2026	Dia da semana	Sexta-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Chuvoso	Impraticável
Tarde	☁ Chuvoso	Impraticável

Ocorrências (1)

Chuva o dia todo.

Dia Chuvoso

Comentários (1)

Felipe Melo 07/07/2026 13:45
Devido as chuvas que caíram na madrugada e durante praticamente o dia todo, não houveram atividades na obra neste dia.

Vídeos (4)

Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:16
Vídeo 2 (visualizar).mp4	00:08
Vídeo 3 (visualizar).mp4	00:24
Vídeo 4 (visualizar).mp4	00:13



Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899375

Assinatura



Felipe Melo
Eng. Civil - 254318420441

Assinatura



Luiz Henrique Soares Pinto
CREA - PB 1621394360
Eng. Civil - BEC008 PMGO

Assinatura



 GRUPO ROCHA CAVALCANTE					
Relatório Diário de Obra (RDO)					
Relatório nº	217	Data do relatório	29/06/2026	Dia da semana	Segunda-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição	Índice pluviométrico
Manhã	☀ Claro	Praticável	60 mm
Tarde	☀ Claro	Praticável	
Noite	☁ Chuvoso	Praticável	


Mão de obra (30)						
Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Servente 8	Mão de Obra Própria (28)
Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	Carpinteiro 1	
Motorista de Veículo Pesado 3	Auxiliar de Serviços Gerais 1	Auxiliar de Topografia 2				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (6)					
Escavadeira 2	Caminhão Basculante 3	Retro Escavadeira 1			

Atividades (4)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Esgotamento d'água	Em Andamento
Desmontagem e montagem das fôrmas das paredes laterais do canal principal.	Em Andamento
Transporte de Pedras.	Em Andamento

Fotos (4)

Assinado por 2 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA e RUI BARBOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/9944-AC36-2ED4-74A9>

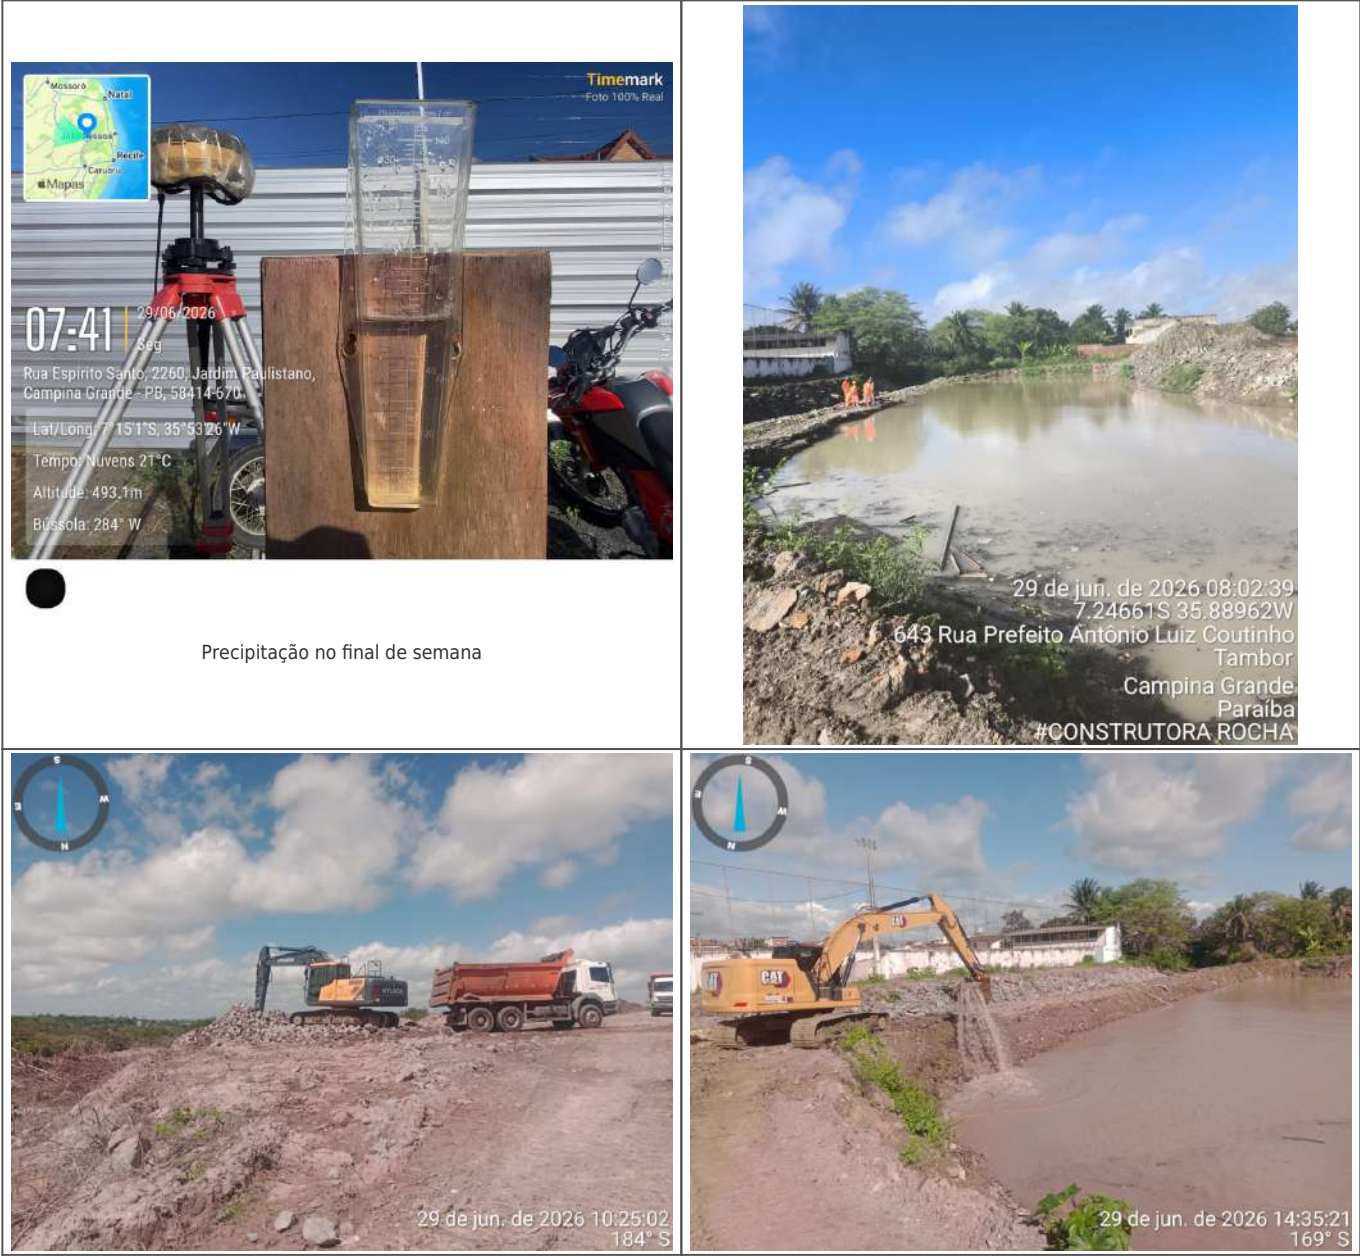

Precipitação no final de semana


Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899375
Assinatura


Felipe Augusto de Almeida Melo
Eng. Civil - CREA 18482441
Assinatura


Luiz Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - BEC06 PMGO
Assinatura





GRUPO
ROCHA
CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	218	Data do relatório	30/06/2026	Dia da semana	Terça-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (30)						
Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Servente 8	Mão de Obra Própria (28)
Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	Carpinteiro 1	
Motorista de Veículo Pesado 3	Auxiliar de Serviços Gerais 1	Auxiliar de Topografia 2				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (6)					
Escavadeira 2	Caminhão Basculante 3	Retro Escavadeira 1			

Atividades (5)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Esgotamento d'água	Em Andamento
Desmontagem e montagem das fôrmas das paredes laterais do canal principal.	Em Andamento
Transporte de Pedras.	Em Andamento
Concretagem da parede lateral do canal principal Lado E (Est-32+8 a Est-33 Segunda Etapa)	Em Andamento

Fotos (6)



07:14

30/06/2026

Ter

2159 Rua Espírito Santo, Jardim Paulistano, Campina Grande PB, 58415-265

Lat/Long: 7°16'1"S, 35°53'26"W

Tempo: Nuvens 19°C

Altitude: 493.0m

Bússola: 174° S



09:27

30/06/2026

Ter

97 Rua Professora Ariel de Oliveira, Jardim Paulistano, Campina Grande PB, 58415-250

Lat/Long: 7°14'50"S, 35°53'26"W

Tempo: Nuvens 22°C



Altitude: 494.4m

Bússola: 62° NE

Assinado por 2 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA e RUI BARBOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/9944-AC36-2ED4-74A9> e informe o código 9944-AC36-2ED4-74A9

1 / 2



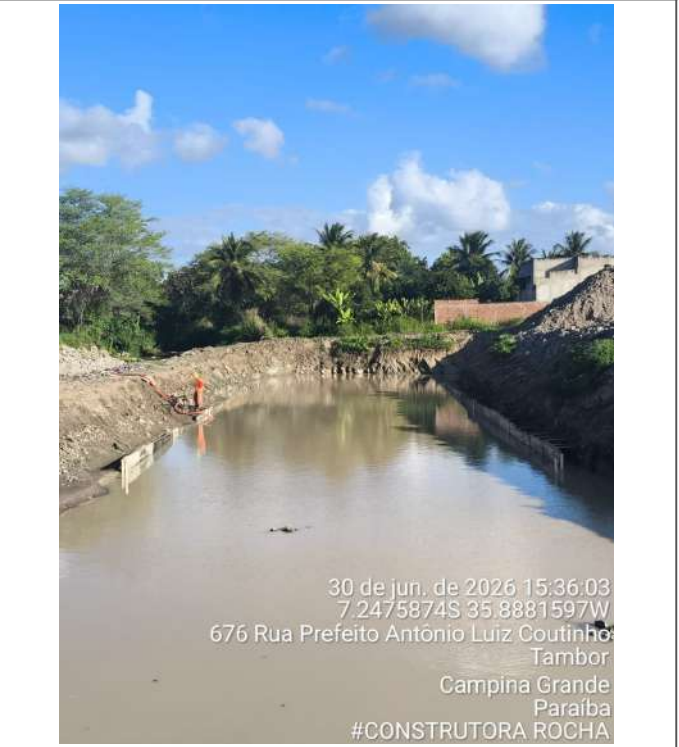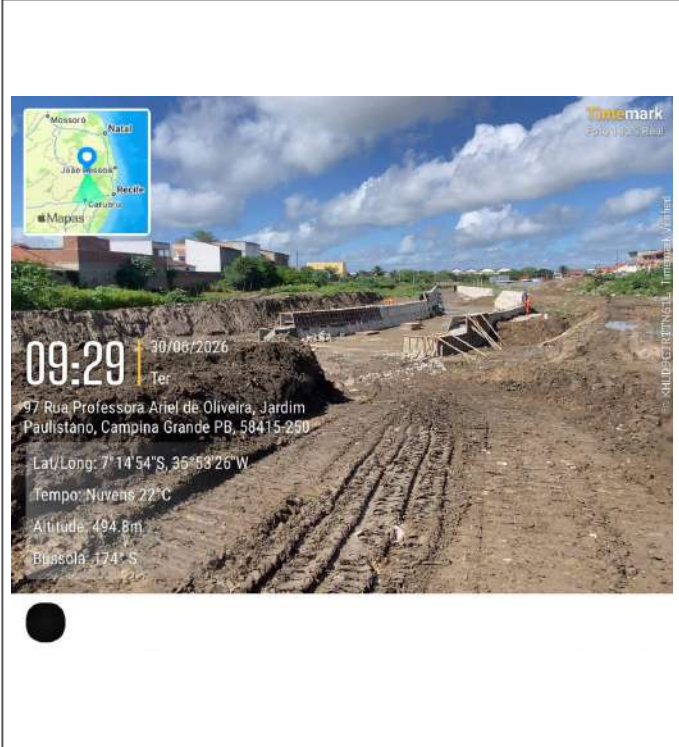


CONSTRUTORA ROCHA CALDETE
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899375
Assinatura


CONSTRUTORA ROCHA CALDETE
Luiz Henrique Soares Pinto
Eng. Civil - CREA PB 1621899375
Assinatura


CONSTRUTORA ROCHA CALDETE
Luiz Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - SECCOB PMGO
Assinatura

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS



EMPRESA: **CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA**

CONTRATO: **N.º: 2.08.018/2025**

MEDIÇÃO: **8ª**

PERÍODO LÍQUIDO: **01/06/2026 A 30/06/2026**

FOTO 01



TRECHO **CANAL DO PRADO**

FOTO 02



TRECHO **CANAL DO PRADO**

FOTO 03



TRECHO **CANAL DO PRADO**

FOTO 04



TRECHO **CANAL DO PRADO**

FOTO 05



TRECHO **CANAL DO PRADO**

FOTO 06



TRECHO **CANAL DO PRADO**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS



EMPRESA: **CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA**

CONTRATO: **N.º: 2.08.018/2025**

MEDIÇÃO: **8ª**

PERÍODO LÍQUIDO: **01/06/2026 A 30/06/2026**

FOTO 07



TRECHO **CANAL DO PRADO**

FOTO 08



TRECHO **CANAL DO PRADO**

FOTO 09



TRECHO **CANAL DO PRADO**

FOTO 10



TRECHO **CANAL DO PRADO**

FOTO 11



TRECHO **CANAL DO PRADO**

FOTO 12



TRECHO **CANAL DO PRADO**



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9944-AC36-2ED4-74A9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JOAO NETO DE OLIVEIRA (CPF 072.XXX.XXX-04) em 08/07/2026 15:58:04 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)



RUI BARBOSA (CPF 113.XXX.XXX-87) em 15/07/2026 10:57:26 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



JOAO NETO DE OLIVEIRA (CPF 072.XXX.XXX-04) em 16/07/2026 11:47:45 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/9944-AC36-2ED4-74A9>

Nº: CE/052/2026

Campina Grande, 08 de JULHO de 2026.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB
Secretaria Municipal de Obras

Att.: Dr. JOAB KLEBER LUCENA MACHADO
Secretário Municipal de Obras

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 9.08.02/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CANALIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL DO PRADO E ÁREAS CIRCUNVIZINHAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.

Assunto: ENCAMINHAMENTO – 09ª MEDIÇÃO

Prezado Secretário;

A CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE Ltda, sediada na Rua Álvaro de Araújo Pereira, 255, Jardim Tavares, 58.402-300, vem a solicitar o pagamento da **medição nº 09**, referente ao **período de 01/06/2026 a 30/06/2026**, no valor de **R\$ 494.429,03 (Quatrocentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e vinte e nove reais e três centavos)**, objeto do contrato nº 2.08.018/2025, firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, para a EXECUÇÃO DE OBRA DE CANALIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL DO PRADO E ÁREAS CIRCUNVIZINHAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.

Confiando na providência de V.Sa., renovamos nossos votos de elevada estima e consideração e subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

ARTHUR PEREIRA DE
ALMEIDA:04731791480

Assinado de forma digital por
ARTHUR PEREIRA DE
ALMEIDA:04731791480
Dados: 2026.07.08 15:36:14 -03'00'

Arthur Pereira de Almeida
Adm. Contratual

CONCORRÊNCIA Nº 9.08.02/2025				MEDIÇÃO Nº: 9 DATA DA EMISSÃO: 08/07/2026 CONTRATO: Nº 2.08.018/2025 VALOR TOTAL DO CONTRATO= 38.554.542,31									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CANALIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL DO PRADO E ÁREAS CIRCUNVIZINHAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB													
DATA DA OS: 17/10/2025				VALOR = R\$ 38.554.542,31 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 8.315.601,23 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 494.429,03 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL = R\$ 8.810.030,26									
MEDIÇÃO: 9													
PERÍODO SIMPLES: 01/06/2026 30/06/2026													
PERÍODO ACUMULADO: 17/10/2025 30/06/2026				BOLETIM DE MEDIÇÃO									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO				R\$ 1.250.014,56		R\$ 289.993,27		R\$ 15.430,02		R\$ 305.423,29		R\$ 944.591,27
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022	m²	R\$ 461,25	36,00	R\$ 16.605,00	36,00	R\$ 16.605,00	-	R\$ -	36,00	R\$ 16.605,00	-	R\$ -
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MES	R\$ 85.942,88	14,00	R\$ 1.203.200,32	3,02	R\$ 259.511,16	0,18	R\$ 15.430,02	3,20	R\$ 274.941,18	10,80	R\$ 928.259,14
1.3	SINALIZAÇÃO COM CAVALETE PLÁSTICO DESMONTÁVEL	un	R\$ 16,29	50,00	R\$ 814,50	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	50,00	R\$ 814,50
1.4	SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - 10 USOS	m	R\$ 5,58	294,00	R\$ 1.640,52	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	294,00	R\$ 1.640,52
1.5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	und	R\$ 13.877,11	2,00	R\$ 27.754,22	1,00	R\$ 13.877,11	-	R\$ -	1,00	R\$ 13.877,11	1,00	R\$ 13.877,11
2.0	INSTALAÇÕES E CANTEIRO DE OBRAS				R\$ 192.835,68		R\$ 154.652,43		R\$ 2.815,59		R\$ 157.468,02		R\$ 35.367,66
2.1	CANTEIRO DE OBRA				R\$ 97.618,78		R\$ 59.435,53		R\$ 2.815,59		R\$ 62.251,12		R\$ 35.367,66
2.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	R\$ 1.055,67	14,00	R\$ 14.779,38	7,00	R\$ 7.389,69	1,00	R\$ 1.055,67	8,00	R\$ 8.445,36	6,00	R\$ 6.334,02
2.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	R\$ 824,74	14,00	R\$ 11.546,36	7,00	R\$ 5.773,18	1,00	R\$ 824,74	8,00	R\$ 6.597,92	6,00	R\$ 4.948,44
2.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	R\$ 1.319,58	14,00	R\$ 18.474,12	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	14,00	R\$ 18.474,12
2.4	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MÊS	R\$ 935,18	14,00	R\$ 13.092,52	7,00	R\$ 6.546,26	1,00	R\$ 935,18	8,00	R\$ 7.481,44	6,00	R\$ 5.611,08
2.5	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, AF_ 02/2016	m²	R\$ 709,40	56,00	R\$ 39.726,40	56,00	R\$ 39.726,40	-	R\$ -	56,00	R\$ 39.726,40	-	R\$ -
2.2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (ÁGUA, ESGOTO, LUZ)				R\$ 41.560,90		R\$ 41.560,90		R\$ -		R\$ 41.560,90		R\$ -
2.2.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO), AF_ 07/2020	UN	R\$ 2.270,40	1,00	R\$ 2.270,40	1,00	R\$ 2.270,40	-	R\$ -	1,00	R\$ 2.270,40	-	R\$ -
2.2.2	POSTE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T 9,00M 200DAN TIPO C14	UN	R\$ 2.808,16	1,00	R\$ 2.808,16	1,00	R\$ 2.808,16	-	R\$ -	1,00	R\$ 2.808,16	-	R\$ -
2.2.3	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 03/2024	UN	R\$ 160,56	1,00	R\$ 160,56	1,00	R\$ 160,56	-	R\$ -	1,00	R\$ 160,56	-	R\$ -
2.2.4	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO), AF_ 03/2024	UN	R\$ 243,77	1,00	R\$ 243,77	1,00	R\$ 243,77	-	R\$ -	1,00	R\$ 243,77	-	R\$ -
2.2.5	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 03/2024	UN	R\$ 167,47	1,00	R\$ 167,47	1,00	R\$ 167,47	-	R\$ -	1,00	R\$ 167,47	-	R\$ -
2.2.6	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA BLOCO DE CIMENTO E CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES INTERNAS 1,80 X 3,60 X 1,80 M.	un	R\$ 27.054,92	1,00	R\$ 27.054,92	1,00	R\$ 27.054,92	-	R\$ -	1,00	R\$ 27.054,92	-	R\$ -
2.2.7	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES), AF_ 12/2020	UN	R\$ 8.855,62	1,00	R\$ 8.855,62	1,00	R\$ 8.855,62	-	R\$ -	1,00	R\$ 8.855,62	-	R\$ -
2.3	FECHAMENTO DO CANTEIRO				R\$ 53.656,00		R\$ 53.656,00		R\$ -		R\$ 53.656,00		R\$ -
2.3.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA, AF_ 03/2024	m²	R\$ 113,71	400,00	R\$ 45.484,00	400,00	R\$ 45.484,00	-	R\$ -	400,00	R\$ 45.484,00	-	R\$ -
2.3.2	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	R\$ 408,60	20,00	R\$ 8.172,00	20,00	R\$ 8.172,00	-	R\$ -	20,00	R\$ 8.172,00	-	R\$ -
3.0	LIMPEZA E DEMOLIÇÕES				R\$ 1.543.155,60		R\$ 1.400.224,06		R\$ -		R\$ 1.400.224,06		R\$ 142.931,53
3.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF_ 03/2024	m²	R\$ 0,73	45.000,00	R\$ 32.850,00	42.727,12	R\$ 31.190,80	-	R\$ -	42.727,12	R\$ 31.190,80	2.272,88	R\$ 1.659,20
3.2	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30 M	un	R\$ 45,52	30,00	R\$ 1.365,60	30,00	R\$ 1.365,60	-	R\$ -	30,00	R\$ 1.365,60	-	R\$ -
3.3	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3), AF_ 07/2020	m³	R\$ 15,18	6.750,00	R\$ 102.465,00	6.181,48	R\$ 93.834,92	-	R\$ -	6.181,48	R\$ 93.834,92	568,52	R\$ 8.630,08
3.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_ 07/2020	m³	R\$ 10,64	19.687,50	R\$ 209.475,00	10.681,78	R\$ 113.654,14	-	R\$ -	10.681,78	R\$ 113.654,14	9.005,72	R\$ 95.820,86
3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), AF_ 07/2020	M3XKM	R\$ 3,20	374.062,50	R\$ 1.197.000,00	362.555,81	R\$ 1.160.178,60	-	R\$ -	362.555,81	R\$ 1.160.178,60	11.506,69	R\$ 36.821,39
4.0	CANAL PRINCIPAL				R\$ 15.669.078,82		R\$ 4.958.975,12		R\$ 476.183,43		R\$ 5.435.158,55		R\$ 10.233.920,26
4.1	ESCAVAÇÃO DA SEÇÃO DO CANAL				R\$ 6.093.452,44		R\$ 2.563.743,16		R\$ 8.212,00		R\$ 2.571.955,16		R\$ 3.521.497,29
4.1.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3), AF_ 07/2020	m³	R\$ 3,90	26.894,66	R\$ 104.889,19	14.160,79	R\$ 55.227,08	-	R\$ -	14.160,79	R\$ 55.227,08	12.733,87	R\$ 49.662,11
4.1.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_ 09/2024	m³	R\$ 13,35	8.964,89	R\$ 119.681,25	906,89	R\$ 12.106,93	80,00	R\$ 1.068,00	986,89	R\$ 13.174,93	7.978,00	R\$ 106.506,33
4.1.3	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE, AF_ 03/2021	m³	R\$ 190,59	8.964,89	R\$ 1.708.618,05	3.716,19	R\$ 708.268,65	-	R\$ -	3.716,19	R\$ 708.268,65	5.248,70	R\$ 1.000.349,39
4.1.4	RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF_ 03/2021	m³	R\$ 27,98	4.482,44	R\$ 125.418,78	3.483,45	R\$ 97.467,03	-	R\$ -	3.483,45	R\$ 97.467,03	998,99	R\$ 27.951,75
4.1.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_ 07/2020	m³	R\$ 10,64	56.478,80	R\$ 600.934,38	23.665,64	R\$ 251.802,43	100,00	R\$ 1.064,00	23.765,64	R\$ 252.866,43	32.713,15	R\$ 348.067,95
4.1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), AF_ 07/2020	M3XKM	R\$ 3,20	1.073.097,12	R\$ 3.433.910,79	449.647,20	R\$ 1.438.871,03	1.900,00	R\$ 6.080,00	451.547,20	R\$ 1.444.951,03	621.549,93	R\$ 1.988.959,76
4.2	ATERRO LATERAL DO CANAL				R\$ 284.243,72		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 284.243,72
4.2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3), AF_ 07/2020	m³	R\$ 15,18	2.509,75	R\$ 38.097,93	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2.509,75	R\$ 38.097,93

CONCORRÊNCIA Nº 9.08.02/2025					MEDIÇÃO Nº: 9 DATA DA EMISSÃO: 08/07/2026 CONTRATO: Nº 2.08.018/2025 VALOR TOTAL DO CONTRATO= 38.554.542,31								
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CANALIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL DO PRADO E ÁREAS CIRCUNVIZINHAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB													
DATA DA OS: 17/10/2025													
MEDIÇÃO: 9					VALOR = R\$ 38.554.542,31 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 8.315.601,23 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 494.429,03 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL = R\$ 8.810.030,26								
PERÍODO SIMPLES: 01/06/2026 30/06/2026													
PERÍODO ACUMULADO: 17/10/2025 30/06/2026					BOLETIM DE MEDIÇÃO								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
4.2.2	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_ 07/2020	m³	R\$ 10,64	2.760,72	R\$ 29.374,06	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2.760,72	R\$ 29.374,06
4.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	R\$ 3,20	22.085,76	R\$ 70.674,43	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	22.085,76	R\$ 70.674,43
4.2.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESURA 15CM- EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_ 09/2024	m³	R\$ 7,65	2.760,72	R\$ 21.119,50	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2.760,72	R\$ 21.119,50
4.2.5	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/ATERRO (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	R\$ 45,27	2.760,72	R\$ 124.977,80	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2.760,72	R\$ 124.977,80
4.3	SINALIZAÇÃO				R\$ 6.567,60		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 6.567,60
4.3.1	SINALIZAÇÃO ABERTA C/ ILUMINACAO P/SEGURANCA TRANSITO VEICULOS PEDESTRES	M	R\$ 3,90	1.684,00	R\$ 6.567,60	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.684,00	R\$ 6.567,60
4.4	ESSOTAMENTO				R\$ 18.524,00		R\$ 1.886,08		R\$ 303,12		R\$ 2.189,20		R\$ 16.334,80
4.4.1	ESSOTAMENTO D'AGUA C/MOTOBOMBA CAPAC. 1 M3/H (06 MESES)	H	R\$ 8,42	2.200,00	R\$ 18.524,00	224,00	R\$ 1.886,08	36,00	R\$ 303,12	260,00	R\$ 2.189,20	1.940,00	R\$ 16.334,80
4.5	FUNDACAO DO CANAL				R\$ 2.557.498,90		R\$ 781.382,73		R\$ 88.146,81		R\$ 869.529,54		R\$ 1.687.969,35
4.5.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE "10 CM". AF_ 01/2024	m²	R\$ 259,80	3.052,66	R\$ 793.080,02	-	R\$ -	83,04	R\$ 21.573,79	83,04	R\$ 21.573,79	2.969,62	R\$ 771.506,23
4.5.2	ENROCAMENTO COM PEDRA GRANITICA ARRUMADA	m³	R\$ 435,26	2.442,12	R\$ 1.062.959,24	1.595,99	R\$ 694.670,61	152,95	R\$ 66.573,02	1.748,94	R\$ 761.243,62	693,18	R\$ 301.715,61
4.5.3	REGULARIZACAO MANUAL E COMPACTACAO COM PLACA VIBRATORIA	M²	R\$ 8,23	8.140,42	R\$ 66.995,62	2.797,03	R\$ 23.019,56	-	R\$ -	2.797,03	R\$ 23.019,56	5.343,39	R\$ 43.976,06
4.5.4	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE "10 CM". AF_ 01/2024	m²	R\$ 259,80	2.442,12	R\$ 634.464,02	245,16	R\$ 63.692,57	-	R\$ -	245,16	R\$ 63.692,57	2.196,96	R\$ 570.771,45
4.6	ESTRUTURA DO CANAL				R\$ 5.266.251,12		R\$ 1.492.742,87		R\$ 358.960,99		R\$ 1.851.703,86		R\$ 3.414.547,26
4.6.1	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZACOES. AF_ 11/2024	m²	R\$ 40,62	7.891,94	R\$ 320.570,76	767,14	R\$ 31.161,23	145,20	R\$ 5.898,02	912,34	R\$ 37.059,25	6.979,60	R\$ 283.511,51
4.6.2	CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_ 05/2021	m³	R\$ 673,72	6.961,95	R\$ 4.690.404,14	2.169,42	R\$ 1.461.581,64	524,05	R\$ 353.062,97	2.693,47	R\$ 1.814.644,61	4.268,48	R\$ 2.875.759,53
4.6.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE "10 CM". AF_ 01/2024	m²	R\$ 259,80	550,19	R\$ 142.938,84	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	550,19	R\$ 142.938,84
4.6.4	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE "10 CM". AF_ 01/2024	m²	R\$ 204,18	550,19	R\$ 112.337,38	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	550,19	R\$ 112.337,38
4.7	REVESTIMENTO				R\$ 611.600,57		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 611.600,57
4.7.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 4,0 CM. PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_ 09/2020	m²	R\$ 58,94	10.376,66	R\$ 611.600,57	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	10.376,66	R\$ 611.600,57
4.8	BARBACAS				R\$ 294.624,49		R\$ 104.592,12		R\$ 20.560,51		R\$ 125.152,63		R\$ 169.471,85
4.8.1	DRENO BARBACA, DN 75 MM, SEM MATERIAL DRENANTE. AF_ 07/2021	M	R\$ 48,94	5.916,00	R\$ 289.529,04	2.137,15	R\$ 104.592,12	420,12	R\$ 20.560,51	2.557,27	R\$ 125.152,63	3.358,73	R\$ 164.376,40
4.8.2	GEOTEXTIL, NÃO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTÍNUOS 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRACAO + 99 KNM	M²	R\$ 9,57	532,44	R\$ 5.095,45	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	532,44	R\$ 5.095,45
4.9	ENSECADEIRA				R\$ 87.768,96		R\$ 14.628,16		R\$ -		R\$ 14.628,16		R\$ 73.140,80
4.9.1	ENSECADEIRA C/ SACO DE AREIA CREMOCAO	m³	R\$ 457,13	192,00	R\$ 87.768,96	32,00	R\$ 14.628,16	-	R\$ -	32,00	R\$ 14.628,16	160,00	R\$ 73.140,80
4.10	RECUPERACAO DO CANAL EXISTENTE, INCLUSIVE DEMOLICAO PARCIAL				R\$ 448.547,02		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 448.547,02
4.10.1	DEMOLICAO DE PISO E/OU REVESTIMENTO DE PAREDE EM CIMENTADO OU CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE ROMPEDOR ELETRICO, SEM REAPROVITAMENTO	m²	R\$ 187,70	209,92	R\$ 39.401,98	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	209,92	R\$ 39.401,98
4.10.2	DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO CICLOPICO, COM ROMPEDOR PNEUMATICO INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m³	R\$ 113,13	636,70	R\$ 72.029,87	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	636,70	R\$ 72.029,87
4.10.3	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZACOES. AF_ 11/2024	m²	R\$ 40,62	81,92	R\$ 3.327,59	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	81,92	R\$ 3.327,59
4.10.4	CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_ 05/2021	m³	R\$ 673,72	7,66	R\$ 5.160,69	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	7,66	R\$ 5.160,69
4.10.5	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 4,0 CM. PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_ 09/2020	m²	R\$ 58,94	3.610,77	R\$ 212.818,78	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	3.610,77	R\$ 212.818,78
4.10.6	RASPAGEM E EMPILHAMENTO DE MATERIAL ASSORIADO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA	m³	R\$ 198,84	132,42	R\$ 26.330,39	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	132,42	R\$ 26.330,39
4.10.7	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_ 07/2020	m³	R\$ 10,64	1.252,49	R\$ 13.326,49	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.252,49	R\$ 13.326,49
4.10.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	R\$ 3,20	23.797,26	R\$ 76.151,23	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	23.797,26	R\$ 76.151,23
5.0	VIAS PROJETADAS				R\$ 10.859.875,41		R\$ 402.852,98		R\$ -		R\$ 402.852,98		R\$ 10.457.022,43
5.1	TERRAPLENAGEM				R\$ 10.859.875,41		R\$ 402.852,98		R\$ -		R\$ 402.852,98		R\$ 10.457.022,43
5.1.1	BOTA-FORA				R\$ 1.144.899,44		R\$ 402.852,98		R\$ -		R\$ 402.852,98		R\$ 742.046,46
5.1.1.1	ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_ 07/2020	m³	R\$ 16,81	2.462,23	R\$ 41.390,09	2.395,38	R\$ 40.266,37	-	R\$ -	2.395,38	R\$ 40.266,37	66,85	R\$ 1.123,72
5.1.1.2	ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICACAO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_ 07/2020	m³	R\$ 22,70	615,56	R\$ 13.973,15	538,45	R\$ 12.222,91	-	R\$ -	538,45	R\$ 12.222,91	77,10	R\$ 1.750,25
5.1.1.3	ESCAVACAO EM 3ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM ROMPEDOR HIDRÁULICO	m³	R\$ 71,25	1.025,93	R\$ 73.097,46	538,45	R\$ 38.364,85	-	R\$ -	538,45	R\$ 38.364,85	487,48	R\$ 34.732,62
5.1.1.4	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_ 07/2020	m³	R\$ 10,64	16.004,50	R\$ 170.287,86	4.367,29	R\$ 46.467,91	-	R\$ -	4.367,29	R\$ 46.467,91	11.637,21	R\$ 123.819,94
5.1.1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	R\$ 3,20	264.422,15	R\$ 846.150,88	82.978,42	R\$ 265.530,94	-	R\$ -	82.978,42	R\$ 265.530,94	181.443,73	R\$ 580.619,93

CONCORRÊNCIA Nº 9.08.02/2025					MEDIÇÃO Nº: 9 DATA DA EMISSÃO: 08/07/2026 CONTRATO: Nº 2.08.018/2025 VALOR TOTAL DO CONTRATO= 38.554.542,31									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CANALIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL DO PRADO E ÁREAS CIRCUNVIZINHAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB														
DATA DA OS: 17/10/2025					VALOR = R\$ 38.554.542,31 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 8.315.601,23 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 494.429,03 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL = R\$ 8.810.030,26									
MEDIÇÃO: 9														
PERÍODO SIMPLES: 01/06/2026 30/06/2026														
PERÍODO ACUMULADO: 17/10/2025 30/06/2026					BOLETIM DE MEDIÇÃO									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO		
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	
5.1.2	ATERRO				R\$ 9.714.975,97		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 9.714.975,97	
5.1.2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (3,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_ 07/2020	m³	R\$ 17,20	45.363,39	R\$ 780.250,34	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	45.363,39	R\$ 780.250,34	
5.1.2.2	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	R\$ 45,27	46.052,12	R\$ 2.084.779,55	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	46.052,12	R\$ 2.084.779,55	
5.1.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	R\$ 3,20	368.416,97	R\$ 1.178.934,31	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	368.416,97	R\$ 1.178.934,31	
5.1.2.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_ 09/2024	m²	R\$ 2,34	17.753,53	R\$ 41.543,26	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	17.753,53	R\$ 41.543,26	
5.1.2.5	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_ 09/2024	m³	R\$ 7,65	57.790,86	R\$ 442.100,10	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	57.790,86	R\$ 442.100,10	
5.1.2.6	ENROCAMENTO COM PEDRA GRANÍTICA ARRUMADA	m³	R\$ 443,68	10.652,12	R\$ 4.726.131,71	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	10.652,12	R\$ 4.726.131,71	
5.1.2.7	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESURA DE *10 CM*. AF_ 01/2024	m²	R\$ 259,80	1.775,35	R\$ 461.236,70	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.775,35	R\$ 461.236,70	
6.0	DRENAGEM				R\$ 740.086,88		R\$ 1.741,77		R\$ -		R\$ 1.741,77		R\$ 738.345,11	
6.1	ESCAVAÇÕES DAS VALAS				R\$ 246.061,48		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 246.061,48	
6.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_ 09/2024	m³	R\$ 10,41	644,00	R\$ 6.704,04	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	644,00	R\$ 6.704,04	
6.1.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_ 09/2024	m³	R\$ 12,99	515,20	R\$ 6.692,44	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	515,20	R\$ 6.692,44	
6.1.3	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_ 03/2021	m³	R\$ 190,59	128,80	R\$ 24.547,99	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	128,80	R\$ 24.547,99	
6.1.4	RETRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM RETROESCAVADERA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_ 03/2021	m³	R\$ 40,92	128,80	R\$ 5.270,49	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	128,80	R\$ 5.270,49	
6.1.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_ 07/2020	m³	R\$ 10,64	180,32	R\$ 1.918,60	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	180,32	R\$ 1.918,60	
6.1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	R\$ 3,20	3.426,08	R\$ 10.963,45	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	3.426,08	R\$ 10.963,45	
6.1.7	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	R\$ 45,27	942,60	R\$ 42.671,50	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	942,60	R\$ 42.671,50	
6.1.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	R\$ 3,20	26.870,57	R\$ 85.985,83	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	26.870,57	R\$ 85.985,83	
6.1.9	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 0,8 M³ / POTÊNCIA 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_ 04/2016	m³	R\$ 16,31	1.131,39	R\$ 18.452,97	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.131,39	R\$ 18.452,97	
6.1.10	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_ 08/2020	m²	R\$ 35,49	1.207,50	R\$ 42.854,17	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.207,50	R\$ 42.854,17	
6.2	TUBULAÇÃO				R\$ 265.505,54		R\$ 1.741,77		R\$ -		R\$ 1.741,77		R\$ 263.763,77	
6.2.1	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_ 03/2024	M	R\$ 138,21	700,00	R\$ 96.747,00	10,00	R\$ 1.382,10	-	R\$ -	10,00	R\$ 1.382,10	690,00	R\$ 95.364,90	
6.2.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_ 03/2024	M	R\$ 359,67	50,00	R\$ 17.983,50	1,00	R\$ 359,67	-	R\$ -	1,00	R\$ 359,67	49,00	R\$ 17.623,83	
6.2.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_ 08/2020	m³	R\$ 289,62	208,00	R\$ 60.240,96	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	208,00	R\$ 60.240,96	
6.2.4	ENROCAMENTO COM PEDRA GRANÍTICA ARRUMADA	m³	R\$ 435,26	208,00	R\$ 90.534,08	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	208,00	R\$ 90.534,08	
6.3	DISPOSITIVOS				R\$ 228.519,86		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 228.519,86	
6.3.1	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_ 12/2020	UN	R\$ 1.982,09	100,00	R\$ 198.209,00	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	100,00	R\$ 198.209,00	
6.3.2	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAÇO. AF_ 12/2020	UN	R\$ 3.247,26	7,00	R\$ 22.730,82	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	7,00	R\$ 22.730,82	
6.3.3	ACRESCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_ 12/2020	M	R\$ 2.174,97	1,47	R\$ 3.197,20	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1,47	R\$ 3.197,20	
6.3.4	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_ 12/2020	UN	R\$ 626,12	7,00	R\$ 4.382,84	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	7,00	R\$ 4.382,84	
7.0	PONTE E PASSARELAS				R\$ 513.615,08		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 513.615,08	
7.1	PONTE				R\$ 305.096,16		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 305.096,16	
7.1.1	ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS, C/ ESCORAS TUBULARES TIPO "B" (H=3,30 A 4,50 M), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	m²	R\$ 49,83	157,20	R\$ 7.833,27	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	157,20	R\$ 7.833,27	
7.1.2	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_ 09/2020	m²	R\$ 58,25	350,44	R\$ 20.413,13	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	350,44	R\$ 20.413,13	
7.1.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_ 06/2022	KG	R\$ 11,78	17,20	R\$ 202,61	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	17,20	R\$ 202,61	
7.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	R\$ 16,52	17,20	R\$ 284,14	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	17,20	R\$ 284,14	
7.1.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_ 06/2022	KG	R\$ 11,90	398,20	R\$ 4.738,58	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	398,20	R\$ 4.738,58	
7.1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	R\$ 14,76	398,20	R\$ 5.877,43	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	398,20	R\$ 5.877,43	
7.1.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_ 06/2022	KG	R\$ 10,97	2.643,20	R\$ 28.995,90	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2.643,20	R\$ 28.995,90	

CONCORRÊNCIA Nº 9.08.02/2025				MEDIÇÃO Nº: 9 DATA DA EMISSÃO: 06/07/2026 CONTRATO: Nº 2.08.018/2025 VALOR TOTAL DO CONTRATO= 38.554.542,31									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CANALIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL DO PRADO E ÁREAS CIRCUNVIZINHAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB													
DATA DA OS: 17/10/2025				VALOR = R\$ 38.554.542,31 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 8.315.601,23 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 494.429,03 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL = R\$ 8.810.030,26									
MEDIÇÃO: 9													
PERÍODO SIMPLES: 01/06/2026 30/06/2026													
PERÍODO ACUMULADO: 17/10/2025 30/06/2026				BOLETIM DE MEDIÇÃO									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
7.1.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$ 13,18	2.643,20	R\$ 34.837,37	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2.643,20	R\$ 34.837,37
7.1.9	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	R\$ 9,41	265,80	R\$ 2.501,17	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	265,80	R\$ 2.501,17
7.1.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$ 11,09	265,80	R\$ 2.947,72	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	265,80	R\$ 2.947,72
7.1.11	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	KG	R\$ 9,33	2.518,50	R\$ 23.497,60	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2.518,50	R\$ 23.497,60
7.1.12	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$ 10,76	2.518,50	R\$ 27.099,06	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2.518,50	R\$ 27.099,06
7.1.13	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022	KG	R\$ 10,99	1.509,20	R\$ 16.586,10	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.509,20	R\$ 16.586,10
7.1.14	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$ 12,25	1.509,20	R\$ 18.487,70	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.509,20	R\$ 18.487,70
7.1.15	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4" - ALT=0,80M, C/1(UM) TUBO HORIZONTAL INTERMEDIÁRIO (4"), E PILARES A CADA 3,00M, EXCLUSIVE OS PILARES	m	R\$ 575,66	78,60	R\$ 45.246,87	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	78,60	R\$ 45.246,87
7.1.16	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA	m³	R\$ 691,03	94,85	R\$ 65.547,51	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	94,85	R\$ 65.547,51
7.2	PASSARELAS			R\$	208.518,92	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	208.518,92
7.2.1	ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS, C/ ESCORAS TUBULARES TIPO "B" (H=3,30 A 4,50 ML) COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	m²	R\$ 49,83	78,24	R\$ 3.898,69	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	78,24	R\$ 3.898,69
7.2.2	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_06/2020	m²	R\$ 58,25	111,10	R\$ 6.471,57	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	111,10	R\$ 6.471,57
7.2.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	R\$ 11,78	28,46	R\$ 335,24	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	28,46	R\$ 335,24
7.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$ 16,52	28,46	R\$ 470,14	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	28,46	R\$ 470,14
7.2.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	R\$ 11,78	68,45	R\$ 806,31	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	68,45	R\$ 806,31
7.2.6	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$ 15,09	68,45	R\$ 1.032,88	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	68,45	R\$ 1.032,88
7.2.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	R\$ 11,90	216,15	R\$ 2.572,18	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	216,15	R\$ 2.572,18
7.2.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$ 14,76	216,15	R\$ 3.190,37	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	216,15	R\$ 3.190,37
7.2.9	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	R\$ 10,97	560,35	R\$ 6.147,06	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	560,35	R\$ 6.147,06
7.2.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$ 13,18	560,35	R\$ 7.385,43	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	560,35	R\$ 7.385,43
7.2.11	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	R\$ 9,41	525,80	R\$ 4.947,75	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	525,80	R\$ 4.947,75
7.2.12	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$ 11,09	525,80	R\$ 5.831,09	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	525,80	R\$ 5.831,09
7.2.13	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	KG	R\$ 11,61	5.325,44	R\$ 61.828,35	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	5.325,44	R\$ 61.828,35
7.2.14	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$ 10,76	5.325,44	R\$ 57.301,73	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	5.325,44	R\$ 57.301,73
7.2.15	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA	m	R\$ 135,35	195,60	R\$ 26.474,46	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	195,60	R\$ 26.474,46
7.2.16	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=25MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA	m³	R\$ 671,82	29,51	R\$ 19.825,67	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	29,51	R\$ 19.825,67
8.0	PAVIMENTAÇÃO			R\$	4.423.261,92	R\$	1.107.161,60	R\$	-	R\$	1.107.161,60	R\$	3.316.100,32
8.1	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	m³	R\$ 33,70	7.101,41	R\$ 239.317,58	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	7.101,41	R\$ 239.317,58
8.2	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	R\$ 45,27	7.101,41	R\$ 321.480,92	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	7.101,41	R\$ 321.480,92
8.3	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	m³	R\$ 128,07	3.550,71	R\$ 454.738,91	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	3.550,71	R\$ 454.738,91
8.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M³). AF_07/2020	m³	R\$ 10,07	8.521,69	R\$ 85.813,46	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	8.521,69	R\$ 85.813,46
8.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 3,20	68.173,56	R\$ 218.155,37	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	68.173,56	R\$ 218.155,37
8.6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	m³	R\$ 7,65	7.101,41	R\$ 54.325,80	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	7.101,41	R\$ 54.325,80
8.7	EXECUÇÃO DE IMPIRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	m²	R\$ 8,30	17.753,53	R\$ 147.354,29	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	17.753,53	R\$ 147.354,29
8.8	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLOAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m²	R\$ 1.703,52	887,68	R\$ 1.512.174,67	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	887,68	R\$ 1.512.174,67
8.9	DERIPA - 06.000.00 - DEFENSA METÁLICA REFLETIVA MALEÁVEL, SIMPLES FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M	R\$ 826,24	1.682,20	R\$ 1.389.900,92	1.340,00	R\$ 1.107.161,60	-	R\$ -	1.340,00	R\$ 1.107.161,60	342,20	R\$ 282.739,32
9.0	CALÇADAS, CICLOVIAS E ÁREAS VERDES			R\$	2.343.448,54	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.343.448,54
9.1	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 08 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ÁREA E BRITA COMERCIAIS	m	R\$ 50,98	3.753,77	R\$ 191.367,19	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	3.753,77	R\$ 191.367,19
9.2	ASSENTAMENTO DE GUARDA-FIO EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X1300 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	R\$ 44,65	7.212,62	R\$ 322.043,48	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	7.212,62	R\$ 322.043,48
9.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO, COM A UTILIZAÇÃO DE FIBRA POLIPROPILENO, ACABAMENTO CONVENCIONAL	m²	R\$ 1.440,76	968,88	R\$ 1.395.923,54	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	968,88	R\$ 1.395.923,54
9.4	GRAMA NATIVA CAPIM DE BURRO OU BATATAIS, EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	m²	R\$ 23,85	2.912,97	R\$ 69.474,33	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2.912,97	R\$ 69.474,33
9.5	CONFECCO DE BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 MM	m	R\$ 227,90	1.600,00	R\$ 364.640,00	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.600,00	R\$ 364.640,00

CONCORRÊNCIA Nº 9.08.02/2025				MEDIÇÃO Nº: 9 DATA DA EMISSÃO: 08/07/2026 CONTRATO: Nº 2.08.018/2025 VALOR TOTAL DO CONTRATO= 38.554.542,31									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CANALIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL DO PRADO E ÁREAS CIRCUNVIZINHAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB													
DATA DA OS: 17/10/2025													
MEDIÇÃO: 9				VALOR = R\$ 38.554.542,31 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 8.315.601,23 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 494.429,03 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL = R\$ 8.810.030,26									
PERÍODO SIMPLES: 01/06/2026 30/06/2026													
PERÍODO ACUMULADO: 17/10/2025 30/06/2026				BOLETIM DE MEDIÇÃO									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
10.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				R\$ 1.019.169,82		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.019.169,82
10.1	ILUMINAÇÃO				R\$ 1.012.304,18		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.012.304,18
10.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL, DE INTERFERÊNCIA. AF_ 09/2024	m³	R\$ 7,81	366,70	R\$ 2.863,92	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	366,70	R\$ 2.863,92
10.1.2	CONCRETAGEM COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	m³	R\$ 677,94	61,10	R\$ 41.422,13	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	61,10	R\$ 41.422,13
10.1.3	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,61 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	R\$ 9,77	1.300,00	R\$ 12.701,00	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.300,00	R\$ 12.701,00
10.1.4	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, 0,61 KV, 4 CONDUTORES DE 4 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	R\$ 214,71	1.900,00	R\$ 407.949,00	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.900,00	R\$ 407.949,00
10.1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0 61/0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	M	R\$ 14,20	40,00	R\$ 568,00	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	40,00	R\$ 568,00
10.1.6	CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	R\$ 16,84	150,00	R\$ 2.526,00	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	150,00	R\$ 2.526,00
10.1.7	CONEXÃO EM DERIVAÇÃO PARALELA - 6,0-1,5MM² DE EMENDA, PARA CABO MULTIPOLAR (14X4,0) MM2, CABO PASSANTE 1,5-6,0MM2 E CABO DERIVADO 1,5-2,5MM2, ACOMPANHADO DE JUNTA COM GEL, CONECTOR DE BORNES PENTA-POLAR ISOLADA E CHAVE SEXTAVADA DE APERTO, GRAU DE PROTEÇÃO IPX8, CONFORME NORMA CEI EN 50393	UN	R\$ 22,19	110,00	R\$ 2.440,90	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	110,00	R\$ 2.440,90
10.1.8	CONEXÃO DE EMENDA - 6,0/1,5MM² EM DERIVAÇÃO "T", PARA CABO MULTIPOLAR (14X4,0) MM2, DERIVAÇÃO PARA CABO MULTIPOLAR 1(0X1,5)MM2, ACOMPANHADO DE JUNTA COM GEL, SEPARADOR DAS FASES E BRACADEIRAS, GRAU DE PROTEÇÃO IPX8, CONFORME NORMA CEI EN 50393	UN	R\$ 138,77	110,00	R\$ 15.264,70	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	110,00	R\$ 15.264,70
10.1.9	BLOQUEADOR DE VAZAMENTO DE CORRENTE: DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE PESSOAS E ANIMAIS CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS EM POSTES METÁLICOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, IP 68 IK 08, CORRENTE DE BLOQUEIO 30mA, MÁXIMA CORRENTE DE CARGA 5A, ALIMENTAÇÃO 220V/60HZ, TEMPO DE ATUAÇÃO < 50MS , RESET IMÂ, CAIXA COM PROTEÇÃO UV	un	R\$ 280,34	104,00	R\$ 29.155,36	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	104,00	R\$ 29.155,36
10.1.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	M	R\$ 17,09	22,00	R\$ 375,98	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	22,00	R\$ 375,98
10.1.11	ELETRODUTO/IDUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	R\$ 12,19	1.830,00	R\$ 22.307,70	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.830,00	R\$ 22.307,70
10.1.12	DER/JPB - 06.000.00 - DEFENSA METÁLICA REFLETIVA MALEAVEL SIMPLES FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	m	R\$ 826,24	52,00	R\$ 42.964,48	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	52,00	R\$ 42.964,48
10.1.13	LUMINÁRIA LED 76W - LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM ALUMÍNIO FUNDIDO LEDHP (LED HIGH POWER), SUPORTE DE MONTAGEM AJUSTÁVEL, FACHO ABERTO, POTÊNCIA 110W, TEMPERATURA DE COR - 4.000K - IRC >70, FLUXO LUMINOSO - 13.600 LUMENS, FATOR DE POTÊNCIA 0,92, TENSÃO 220 V - IP 66, VIDA ÚTIL - 78.000 HORAS, REF-BRP482 LED136 NW 76W DWL P7 0-10 OU SIMILAR	un	R\$ 1.495,18	52,00	R\$ 77.749,36	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	52,00	R\$ 77.749,36
10.1.14	POSTE METÁLICO CURVO DUPLO - POSTE METÁLICO DUPLO CURVO COM 12M DE ALTURA UTIL, PARA INSTALAÇÃO COM BASE E CHUMBADORES, EM AÇO CARBONO 1010/1020 GALVANIZAÇÃO A FOGO E PINTURA EPOXI, CONFORME NBR 14744 E NBR 6323.	un	R\$ 4.695,79	52,00	R\$ 244.181,08	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	52,00	R\$ 244.181,08
10.1.15	BASE METÁLICA PARA POSTE -BASE METÁLICA PARA POSTE EM CHAPA #3/8" GALVANIZADA A FOGO MEDINDO 0,30X0,30M, CONFORME DETALHE EM ANEXO	UN	R\$ 394,58	52,00	R\$ 20.518,16	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	52,00	R\$ 20.518,16
10.1.16	BASE EM CONCRETO PARA POSTE 0,40X0,40X0,80M	UN	R\$ 154,58	52,00	R\$ 8.038,16	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	52,00	R\$ 8.038,16
10.1.17	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,80X0,80MX0,20M (COM BASE NO ORSE 6419)	UN	R\$ 384,09	56,00	R\$ 21.509,04	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	56,00	R\$ 21.509,04
10.1.18	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,50 X 0,50 X 0,50M	un	R\$ 394,21	56,00	R\$ 22.075,76	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	56,00	R\$ 22.075,76
10.1.19	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2023	UN	R\$ 101,13	52,00	R\$ 5.258,76	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	52,00	R\$ 5.258,76
10.1.20	GRAMPO METÁLICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATÉ 5/8", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2	UN	R\$ 44,26	52,00	R\$ 2.301,52	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	52,00	R\$ 2.301,52
10.1.21	RELE FOTOELÉTRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	R\$ 41,42	104,00	R\$ 4.307,68	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	104,00	R\$ 4.307,68
10.1.22	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 31,45	193,50	R\$ 6.085,57	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	193,50	R\$ 6.085,57
10.1.23	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 26,40	193,50	R\$ 5.108,40	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	193,50	R\$ 5.108,40
10.1.24	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIÚRNO. AF_ 06/2014	CHP	R\$ 331,03	44,20	R\$ 14.631,52	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	44,20	R\$ 14.631,52
10.2	QUADRO DE PROTEÇÃO				R\$ 1.869,75		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.869,75
10.2.1	CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X40X20 CM	un	R\$ 289,69	2,00	R\$ 579,38	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 579,38
10.2.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	R\$ 84,64	2,00	R\$ 169,28	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 169,28
10.2.3	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	R\$ 79,42	2,00	R\$ 158,84	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 158,84
10.2.4	BARRAMENTO TRIFÁSICO	m	R\$ 192,82	2,00	R\$ 385,64	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 385,64
10.2.5	TRILHO SUPORTE P/ FIXAÇÃO RÁPIDA DIN	M	R\$ 13,50	1,00	R\$ 13,50	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 13,50
10.2.6	POSTE BALIZADOR PARA JARDIM, EM ALUMÍNIO PRETO, + LED 12 W BRANCO FRIO 374,00 LUMENS, 1200LM, 1200LM	un	R\$ 136,93	2,00	R\$ 273,86	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 273,86
10.2.7	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 31,45	5,00	R\$ 157,25	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	5,00	R\$ 157,25
10.2.8	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 26,40	5,00	R\$ 132,00	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	5,00	R\$ 132,00
10.3	MEDIÇÃO				R\$ 4.995,89		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 4.995,89
10.3.1	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 40MM, D=1 1/2"	un	R\$ 4,63	8,00	R\$ 37,04	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	8,00	R\$ 37,04
10.3.2	CABECOTE DE ALUMÍNIO DE 1 1/2"	un	R\$ 19,81	8,00	R\$ 158,48	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	8,00	R\$ 158,48
10.3.3	CABO DE COBRE NU 16 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (7,04MIKG)	kg	R\$ 158,39	5,70	R\$ 902,82	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	5,70	R\$ 902,82

CONCORRÊNCIA Nº 9.08.02/2025				MEDIÇÃO Nº: 9 DATA DA EMISSÃO: 06/07/2026 CONTRATO: Nº 2.06.018/2025 VALOR TOTAL DO CONTRATO= 38.554.542,31									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CANALIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL DO PRADO E ÁREAS CIRCUNVIZINHAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB													
DATA DA OS: 17/10/2025													
MEDIÇÃO: 9				VALOR = R\$ 38.554.542,31 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 8.315.601,23 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 494.429,03 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL = R\$ 8.810.030,26									
PERÍODO SIMPLES: 01/06/2026 30/06/2026													
PERÍODO ACUMULADO: 17/10/2025 30/06/2026				BOLETIM DE MEDIÇÃO									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
10.3.4	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLÁSTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRÃO ENERGISA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 345,93	2,00	R\$ 691,86	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 691,86
10.3.5	CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATÉ 16 MM²	UN	R\$ 9,12	2,00	R\$ 18,24	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 18,24
10.3.6	GRAMPO METÁLICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATÉ 5/8", CONDUTOR DE 10 A 25 MM²	UN	R\$ 44,26	8,00	R\$ 354,08	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	8,00	R\$ 354,08
10.3.7	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2"	UN	R\$ 97,02	2,00	R\$ 194,04	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 194,04
10.3.8	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	R\$ 84,64	2,00	R\$ 169,28	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 169,28
10.3.9	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, SEMI-PESADO, DIÂMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM	M	R\$ 27,19	12,00	R\$ 326,28	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	12,00	R\$ 326,28
10.3.10	FITA AÇO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	UN	R\$ 112,73	1,00	R\$ 112,73	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 112,73
10.3.11	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AE. 08/2023	UN	R\$ 101,13	6,00	R\$ 606,78	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	6,00	R\$ 606,78
10.3.12	LUVA PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, COM ROSCA, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2")	UN	R\$ 5,35	4,00	R\$ 21,40	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	4,00	R\$ 21,40
10.3.13	MASSA PARA CALAFETAR JUNTAS	KG	R\$ 33,10	2,00	R\$ 66,20	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 66,20
10.3.14	FILETE DE MÁRMORE BRANCO, 2 CM, PARA ACABAMENTOS	m	R\$ 48,15	20,00	R\$ 963,00	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	20,00	R\$ 963,00
10.3.15	TERMINAL P/ FIO OU CABO, A COMPRESSÃO POR INDENTACÃO, DE COBRE/ELETROLÍTICO, ESTANHADO, BITOLA 10MM²	Un	R\$ 1,66	16,00	R\$ 26,56	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	16,00	R\$ 26,56
10.3.16	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 31,45	6,00	R\$ 188,70	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	6,00	R\$ 188,70
10.3.17	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 26,40	6,00	R\$ 158,40	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	6,00	R\$ 158,40
				TOTAL =	R\$ 38.554.542,31		R\$ 8.315.601,23		R\$ 494.429,03		R\$ 8.810.030,26		R\$ 29.744.512,02

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CANALIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL DO PRADO E ÁREAS CIRCUNVIZINHAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB																				
MEMÓRIA DE CÁLCULO																				
ITEM	SERVIÇOS	ESTACA				COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	ALTURA	VOLUME	EMPOLAMENTO	DENSIDADE	PESO	DMT	MÊS	H	UN	Parciais	Totais	OBSERVAÇÃO
		Inicial			Final															
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO																			
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA																	Executado	2,54	
																		0.01	0.01	MEDICAÇÃO 01
																		0.27	0.27	MEDICAÇÃO 02
																		0.43	0.43	MEDICAÇÃO 03
																		0.21	0.21	MEDICAÇÃO 04
																		0.63	0.63	MEDICAÇÃO 05
																		0.99	0.99	MEDICAÇÃO 06
																		0.27	0.27	MEDICAÇÃO 07
																		0.20	0.20	MEDICAÇÃO 08
																		0.28	0.28	MEDICAÇÃO 09
2.0	INSTALAÇÕES E CANTEIRO DE OBRAS																			
2.1	CANTEIRO DE OBRA																			
2.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)																	Executado	7,00	
															1,00			1,00		MEDICAÇÃO 02
															1,00			1,00		MEDICAÇÃO 03
															1,00			1,00		MEDICAÇÃO 04
															1,00			1,00		MEDICAÇÃO 05
															1,00			1,00		MEDICAÇÃO 06
															1,00			1,00		MEDICAÇÃO 07
															1,00			1,00		MEDICAÇÃO 08
															1,00			1,00		MEDICAÇÃO 09
2.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)																	Executado	7,00	
															1,00			1,00		MEDICAÇÃO 02
															1,00			1,00		MEDICAÇÃO 03
															1,00			1,00		MEDICAÇÃO 04
															1,00			1,00		MEDICAÇÃO 05
															1,00			1,00		MEDICAÇÃO 06
															1,00			1,00		MEDICAÇÃO 07
															1,00			1,00		MEDICAÇÃO 08
															1,00			1,00		MEDICAÇÃO 09
2.4	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M																	Executado	7,00	
															1,00			1,00		MEDICAÇÃO 02
															1,00			1,00		MEDICAÇÃO 03
															1,00			1,00		MEDICAÇÃO 04
															1,00			1,00		MEDICAÇÃO 05
															1,00			1,00		MEDICAÇÃO 06
															1,00			1,00		MEDICAÇÃO 07
															1,00			1,00		MEDICAÇÃO 08
															1,00			1,00		MEDICAÇÃO 09
4.0	CANAL PRINCIPAL																			
4.1	ESCAVAÇÃO DA SEÇÃO DO CANAL																			
4.1.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024																	Executado	986,89	
										1.292,98			0,20					258,60		MEDICAÇÃO 03 (DESVIO E31+0,00 m a 43+8,31 m)
										648,29								648,29		MEDICAÇÃO 07 (SEÇÃO E20+2,11M A 22+3,16m)
										80,00								80,00		MEDICAÇÃO 09
4.1.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020																	Executado	22.591,86	
										1.629,15								1.629,15		MEDICAÇÃO 03 (DESVIO E31+0,00 m a 43+8,31 m)
										3.320,77								3.320,77		MEDICAÇÃO 04 (SEÇÃO DO CANAL E40+17,83m a 43+19,89 m)
										11.002,29								11.002,29		MEDICAÇÃO 05 (SEÇÃO DO CANAL E31 A E44+10,43)
										5.453,26								5.453,26		E22+1,65M A 22+13,97m e E31m A E44+10,43m
										1.186,37								1.186,37		MEDICAÇÃO 07 (SEÇÃO E20+2,11M A 22+3,16m)
										1.073,79								1.073,79		MEDICAÇÃO 08 (SEÇÃO 18+18,11 A 22+14,71)
										100,00								100,00		MEDICAÇÃO 09
4.1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020																	Executado	433.720,95	

[illegible]

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CANALIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL DO PRADO E ÁREAS CIRCUNVIZINHAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB																						
MEMÓRIA DE CÁLCULO																						
ITEM	SERVIÇOS	ESTACA						QUANTIDADES													OBSERVAÇÃO	
		Inicial			Final			COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	ALTURA	VOLUME	EMPOLAMENTO	DENSIDADE	PESO	DMT	MÊS	H	UN	Parciais		Totais
4.6.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024																			Executado	912,34	
								88,37		97,21	1,10									97,21		MEDIÇÃO 05 (SEÇÃO DO CANAL E39+19.63 a 44+8.00)
								151,43		166,57	1,10									166,57		MEDIÇÃO 06 (PAREDE DO CANAL E34+10 a 43)
										2,42									108,00	261,36		MEDIÇÃO 07 (1º LANCE LD e 2º e 3º LANCE LE)
										2,42									100,00	242,00		MEDIÇÃO 08 (PAREDE LADO ESQUERDO E33+4.00m a E43) E (PAREDE LADO DIREITO E33+5.14m a E44+11.20m)
										2,42									60,00	145,20		MEDIÇÃO 09 SEÇÃO DO CANAL (EST. 20 a 22) - 18 und PAREDE ESQ. - 12und PAREDE DIR. - 11und
4.6.2	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021																			Executado	2.693,47	
								1.102,98			0,30	330,89								330,89		MEDIÇÃO 05 (SEÇÃO DO CANAL E39+19.63 a 44+8.00)
												798,22								798,22		MEDIÇÃO 06 PAREDE ESQ. E34+12.23 a E43 - 270 m² SEÇÃO DO CANAL E33+13.72 a 44+8.00) - 528.22 m²
												479,18								479,18		MEDIÇÃO 07 (PAREDE LE E33+4.00m a E43 E PAREDE LD E33+5.14m a E42+16.52M)
												561,13								561,13		MEDIÇÃO 08 (PAREDE LADO ESQUERDO E33+4.00m a E43) E (PAREDE LADO DIREITO E33+5.14m a E44+11.20m)
												524,05								524,05		MEDIÇÃO 09 SEÇÃO DO CANAL E31+10m a E44+8.00 e da E20 a E22 - 349.95 m² PAREDE E31+10m a E44+8.00-174.10m²
4.8	BARBACÁS																					
4.8.1	DRENO BARBACÁ, DN 75 MM, SEM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021																			Executado	2.557,27	
								0,60												130,00	78,00	MEDIÇÃO 04 (SEÇÃO DO CANAL E39+19.63 a 43+10.00)
								0,60												1.008,00	604,80	MEDIÇÃO 05 (SEÇÃO DO CANAL E43+10.00 a 44+8.00)
								0,60												1.152,00	691,20	MEDIÇÃO 06 (SEÇÃO DO CANAL E33 a 39+19)
								406,75												406,75		MEDIÇÃO 07 (1º LANCE PAREDE ESQ. E33 A E43) + (2º LANCE PAREDE ESQ. E33 A E43) + (1º LANCE PAREDE DIR. E34 A E42+10)
								356,40												356,40		MEDIÇÃO 08 (PAREDE LADO ESQUERDO E33+4.00m a E43) E (PAREDE LADO DIREITO E33+5.14m a E44+11.20m)
								420,12												420,12		
								0,60												144,00	86,40	MEDIÇÃO 09 TOTAL EXECUTADO - TOTAL MEDIDO DE PAREDE (BM7 e BM8) 1.142,70-763,15 = 333,72 TOTAL APLICADO NO LASTRO (EST. 20 a 22): 144 *0,60 = 86,40m TOTAL GERAL = 333,72+86,40m
								91,67												33,33	91,67	MEDIÇÃO 09 ALTURA 2,10 LADO ESQUERDO: 33+10 A 32 = 30m LADO EDIREITO: 33 A 32 = 20m

[illegible]

Obra: Canal do Prado																			
Cronograma Físico e Financeiro																			
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.250.014,56	1,42%	1,83%	4,03%	1,50%	4,35%	6,82%	1,89%	1,36%	1,23%	15,11%	15,11%	15,11%	15,11%	15,11%	15,11%	15,11%	15,11%
			R\$ 17.763,78	R\$ 22.928,62	R\$ 50.412,02	R\$ 18.745,55	R\$ 54.341,40	R\$ 85.211,66	R\$ 23.596,72	R\$ 16.993,53	R\$ 15.430,02	R\$ 188.918,25	R\$ 188.918,25	R\$ 188.918,25	R\$ 188.918,25	R\$ 188.918,25	R\$ 188.918,25	R\$ 188.918,25	R\$ 188.918,25
2	INSTALAÇÕES E CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 192.835,68		1,46%	71,44%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	3,67%	3,67%	3,67%	3,67%	3,67%	3,67%	3,67%	3,67%
			R\$ 2.815,59	R\$ 137.758,89	R\$ 2.815,59	R\$ 2.815,59	R\$ 2.815,59	R\$ 2.815,59	R\$ 2.815,59	R\$ 2.815,59	R\$ 2.815,59	R\$ 7.073,53	R\$ 7.073,53	R\$ 7.073,53	R\$ 7.073,53	R\$ 7.073,53	R\$ 7.073,53	R\$ 7.073,53	R\$ 7.073,53
3	LIMPEZA E DEMOLIÇÕES	R\$ 1.543.155,60	36,90%	46,47%			11,50%			1,83%		4,63%	4,63%						
			R\$ 476.774,71	R\$ 717.040,50		R\$ 178.203,54				R\$ 28.205,31		R\$ 71.465,77	R\$ 71.465,77						
4	CANAL PRINCIPAL	R\$ 15.669.078,82			1,10%	3,35%	9,60%	9,87%	3,26%	4,47%	3,04%	21,77%	21,77%	21,77%	21,77%				
					R\$ 172.874,01	R\$ 524.818,28	R\$ 1.504.928,56	R\$ 1.545.854,00	R\$ 510.784,29	R\$ 699.715,98	R\$ 476.183,43	R\$ 3.411.306,76	R\$ 3.411.306,76	R\$ 3.411.306,76	R\$ 3.411.306,76				
5	VIAS PROJETADAS	R\$ 10.859.875,41			2,95%			0,63%		0,13%		24,07%	24,07%	24,07%	24,07%				
					R\$ 320.085,06			R\$ 66.790,05		R\$ 13.977,87		R\$ 2.614.255,61	R\$ 2.614.255,61	R\$ 2.614.255,61	R\$ 2.614.255,61				
6	DRENAGEM	R\$ 740.086,88								0,24%		49,88%	49,88%						
										R\$ 1.741,77		R\$ 369.172,56	R\$ 369.172,56						
7	PONTE E PASSARELAS	R\$ 513.615,08										50,00%	50,00%						
												R\$ 256.807,54	R\$ 256.807,54						
8	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 4.423.261,92						25,03%				18,74%	18,74%	18,74%	18,74%				
								R\$ 1.107.161,60				R\$ 829.025,08	R\$ 829.025,08	R\$ 829.025,08	R\$ 829.025,08				
9	CALÇADAS, CICLOVIAS E ÁREAS VERDES	R\$ 2.343.448,54										25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
												R\$ 585.862,14	R\$ 585.862,14	R\$ 585.862,14	R\$ 585.862,14				
10	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 1.019.169,82										10,00%	15,00%	20,00%	45,00%	10,00%			
												R\$ 101.916,98	R\$ 152.875,47	R\$ 203.833,96	R\$ 458.626,42	R\$ 101.916,98			
Porcentagem			1,28%	1,93%	1,77%	1,42%	4,51%	7,29%	1,39%	1,98%	1,28%	21,88%	22,01%	20,34%	12,15%	0,77%			
Custo			R\$ 494.538,49	R\$ 742.784,72	R\$ 681.129,98	R\$ 546.379,42	R\$ 1.740.289,09	R\$ 2.809.832,90	R\$ 537.196,60	R\$ 763.450,04	R\$ 494.429,03	R\$ 8.435.904,21	R\$ 8.486.762,71	R\$ 7.840.275,33	R\$ 4.683.761,03	R\$ 297.908,77			
Porcentagem Acumulado			1,28%	3,21%	4,98%	6,39%	10,91%	18,19%	19,59%	21,57%	22,85%	44,73%	66,74%	87,08%	99,23%	100,00%			
Custo Acumulado			R\$ 494.538,49	R\$ 1.237.323,20	R\$ 1.918.453,18	R\$ 2.464.832,60	R\$ 4.205.121,69	R\$ 7.014.954,59	R\$ 7.552.151,20	R\$ 8.315.601,23	R\$ 8.810.030,27	R\$ 17.245.934,48	R\$ 25.732.597,19	R\$ 33.572.872,52	R\$ 38.256.633,54	R\$ 38.554.542,31			



GRUPO
ROCHA
CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	194	Data do relatório	01/06/2026	Dia da semana	Segunda-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição	Índice pluviométrico
Manhã	☀️ Claro	Praticável	3 mm
Tarde	☀️ Claro	Praticável	

Mão de obra (31)						
Auxiliar de Topografia 1	Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Mão de Obra Própria (29)
Servente 8	Pedreiro 1	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	
Carpinteiro 3	Motorista de Veículo Pesado 4	Auxiliar de Serviços Gerais 1				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (7)					
Escavadeira 2	Caminhão Basculante 4	Retro Escavadeira 1			

Atividades (6)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Esgotamento d'água.	Em Andamento
Limpeza de material de 1ª categoria e 2ª categoria. Lado E (Est-14 a Est-18) / Lado D (Est-16 a Est-18)	Em Andamento
Execução da escavação do desvio Lado E (Est-15 a Est-18)	Em Andamento
Execução de enrocamento de pedra para implantação do piso do canal principal (Est-31+10 e Est-32+10)	Em Andamento
Desmontagem e montagem das fôrmas das paredes laterais do canal principal.	Em Andamento

Fotos (7)



06:56 | 01/06/2026
Seg

2159 Rua Espírito Santo, Jardim Paulistano, Campina Grande PB, 58415-265

Lat/Long: 7°15'1"S, 35°53'26"W

Tempo: Nuvens 21°C

Altitude: 493.1m

Bússola: 285° W



Precipitação de final de semana.



07:52 | 01/06/2026
Seg

2040 Rua Sergipe, Tambor, Campina Grande PB, 58414-460

Lat/Long: 7°14'45"S, 35°53'22"W


Tempo: Nuvens 21°C

Altitude: 495.6m

Bússola: 250° W



1 / 2

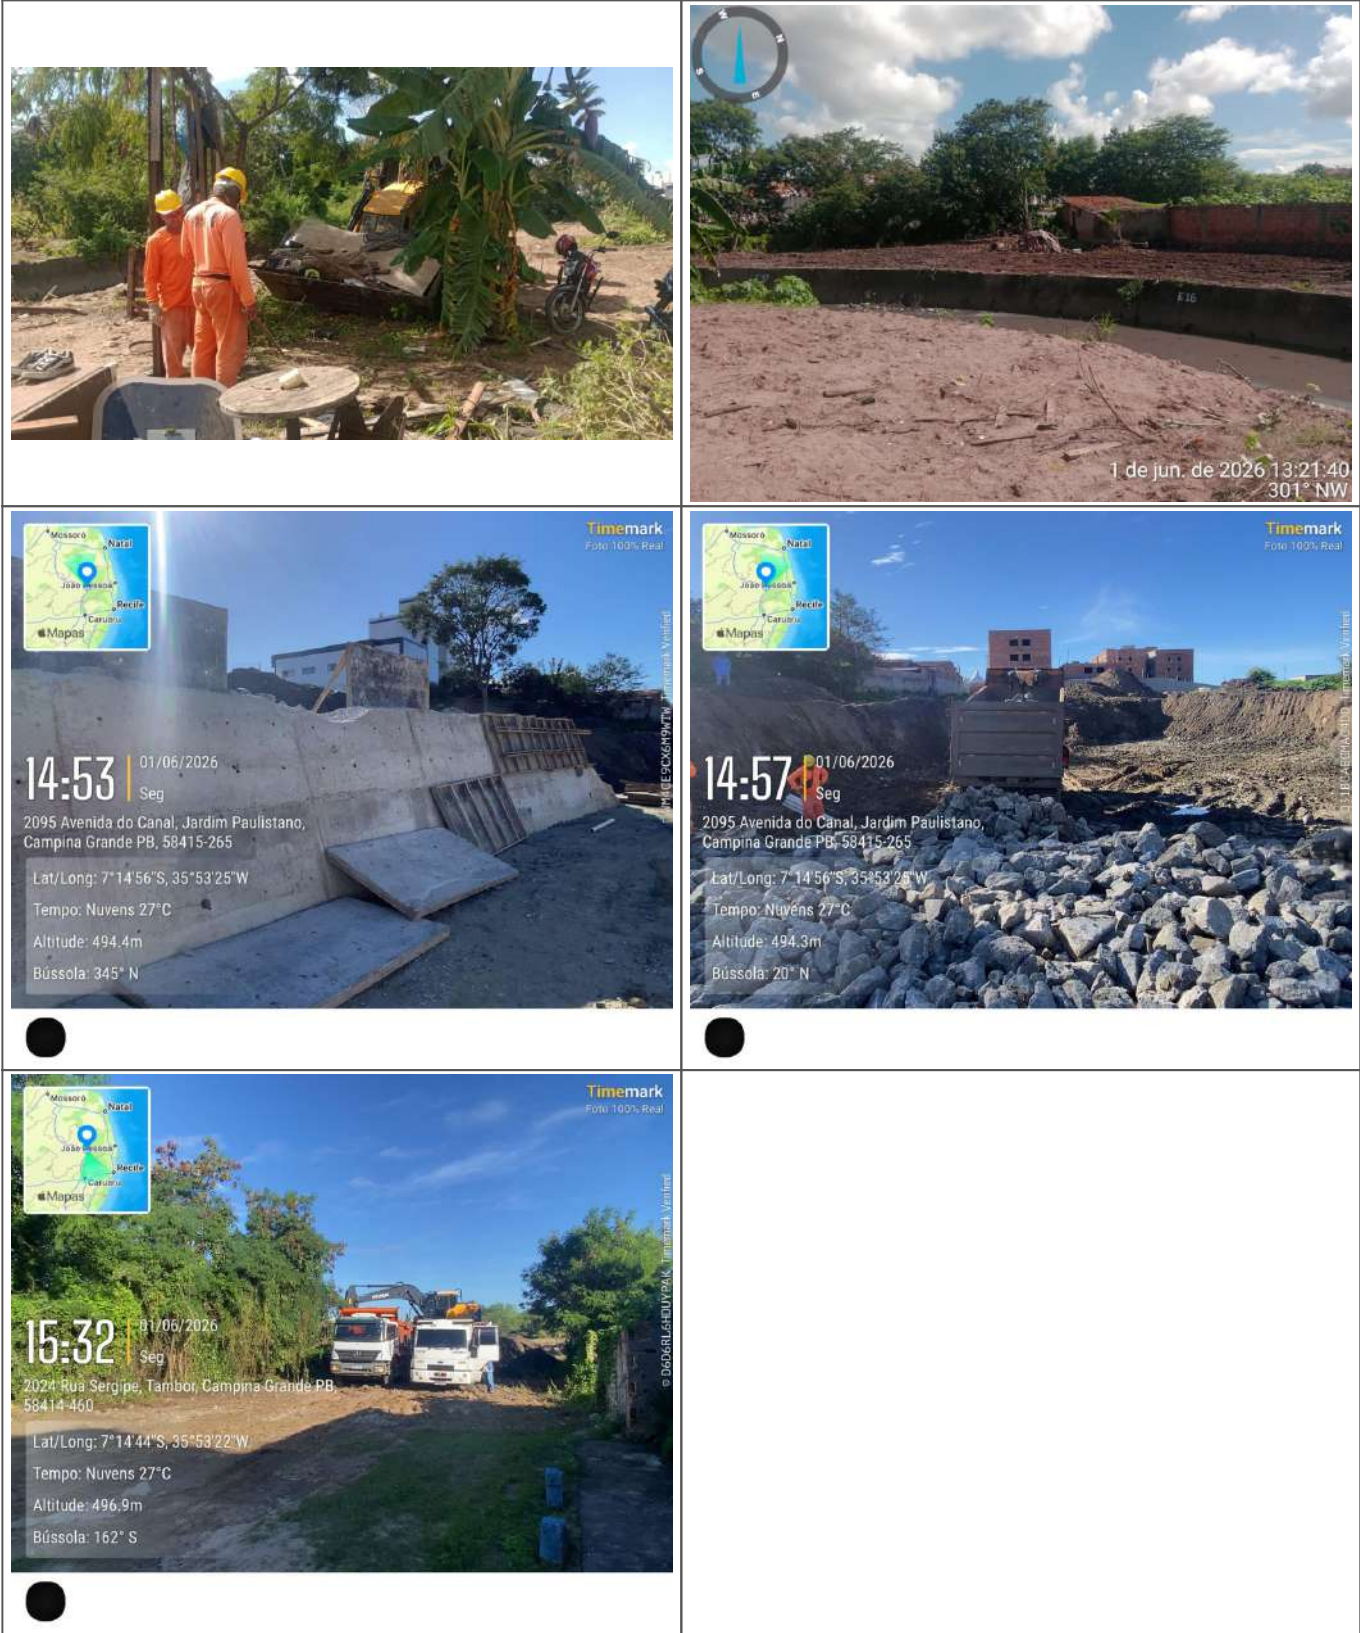


CONSTRUTORA ROCHA CARVALHO
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899315
Assinatura


Felipe Ribeiro
Eng. Civil - CREA 18422041
Assinatura


Luiz Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - SECOB PMGO
Assinatura

 GRUPO ROCHA CAVALCANTE					
Relatório Diário de Obra (RDO)					
Relatório nº	195	Data do relatório	02/06/2026	Dia da semana	Terça-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Nublado	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (31)						
Auxiliar de Topografia 1	Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Mão de Obra Própria (29)
Servente 8	Pedreiro 1	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	
Carpinteiro 3	Motorista de Veículo Pesado 4	Auxiliar de Serviços Gerais 1				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (7)					
Escavadeira 2	Caminhão Basculante 4	Retro Escavadeira 1			

Atividades (6)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Limpeza de material de 1ª categoria e 2ª categoria. Lado E (Est-14 a Est-18) / Lado D (Est-16 a Est-18)	Em Andamento
Execução de enrocamento de pedra para implantação do piso do canal principal (Est-31+10 e Est-32+10)	Em Andamento
Desmontagem e montagem das fôrmas das paredes laterais do canal principal	Em Andamento
Execução da escavação do desvio Lado E (Est-15 a Est-18)	Em Andamento
Concretagem da parede do canal principal. Lado D (Est-33+15 a Est-35 terceira etapa / Est-40 a Est-42+7 Terceira etapa)	Em Andamento

Fotos (7)





Vídeos (1)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:11


CONSTRUTORA ROSSO CARVALHO
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899315

Assinatura


Felipe Augusto Teixeira de Melo
Eng. Civil - CREA 184422441

Assinatura


Luis Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - SECCO8 PMGO

Assinatura



GRUPO
ROCHA
CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	196	Data do relatório	03/06/2026	Dia da semana	Quarta-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Nublado	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (31)						
Auxiliar de Topografia 1	Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Mão de Obra Própria (29)
Servente 8	Pedreiro 1	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	
Carpinteiro 3	Motorista de Veículo Pesado 4	Auxiliar de Serviços Gerais 1				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (7)					
Escavadeira 2	Caminhão Basculante 4	Retro Escavadeira 1			

Atividades (5)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Limpeza de material de 1ª categoria e 2ª categoria. Lado E (Est-14 a Est-18) Lado D (Est-16 a Est-18)	Em Andamento
Execução de enrocamento de pedra para implantação do piso do canal principal (Est-31+10 e Est-32+10)	Em Andamento
Desmontagem e montagem das fôrmas das paredes laterais do canal principal.	Em Andamento
Execução da escavação do desvio Lado E (Est-15 a Est-18)	Em Andamento



08:08 | 03/06/2026
Qua
2159 Rua Espírito Santo, Jardim Paulistano,
Campina Grande PB, 58415-265
Lat/Long: 7°15'3"S, 35°53'25"W
Tempo: Nuvens 22°C
Altitude: 488.9m
Bússola: 2° N





3 de jun. de 2026 08:59:17
184° S
1991 Rua Espírito Santo
Jardim Paulistano
Campina Grande
Paraíba
Altitude: 489.1msnm
Velocidade: 0.5km/h






CONSTRUTORA ROSSO CARVALHO
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899315
Assinatura


Felipe Augusto Teixeira de Melo
Eng. Civil - CREA 184422441
Assinatura


Luiz Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - SECCO P/MGO
Assinatura



Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	197	Data do relatório	04/06/2026	Dia da semana	Quinta-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (32)

Auxiliar de Topografia 1	Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Mão de Obra Própria (30)
Servente 8	Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	
Carpinteiro 3	Motorista de Veículo Pesado 4	Auxiliar de Serviços Gerais 1				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (7)



Escavadeira 2	Caminhão Basculante 4	Retro Escavadeira 1			
------------------	--------------------------	------------------------	--	--	--

Atividades (5)

Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Limpeza de material de 1ª categoria e 2ª categoria Lado E (Est-10 a Est-18)	Em Andamento
Execução de enrocamento de pedra para implantação do piso do canal principal (Est-31+10 e Est-32+10)	Em Andamento
Desmontagem e montagem das fôrmas das paredes laterais do canal principal.	Em Andamento
Concretagem da parede do canal principal Lado D (Est-33+15 a Est-35 *Complemento Terceira Etapa / Est-36 a Est-36+12 Terceira etapa)	Em Andamento

Fotos (8)



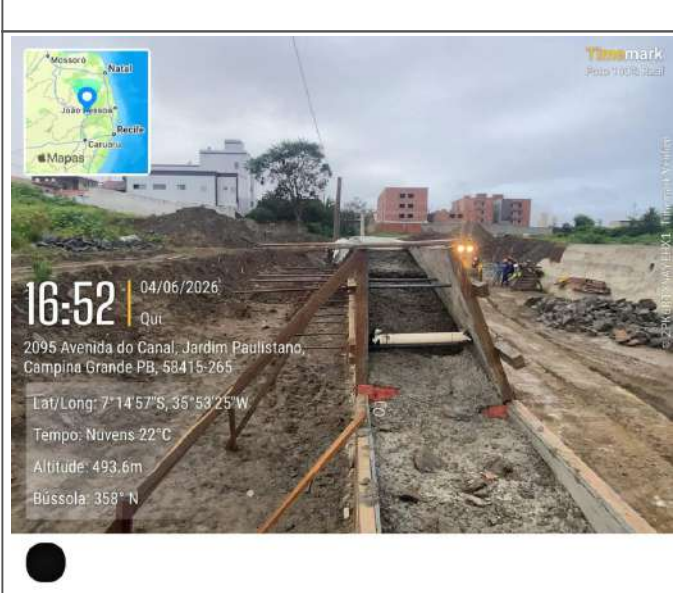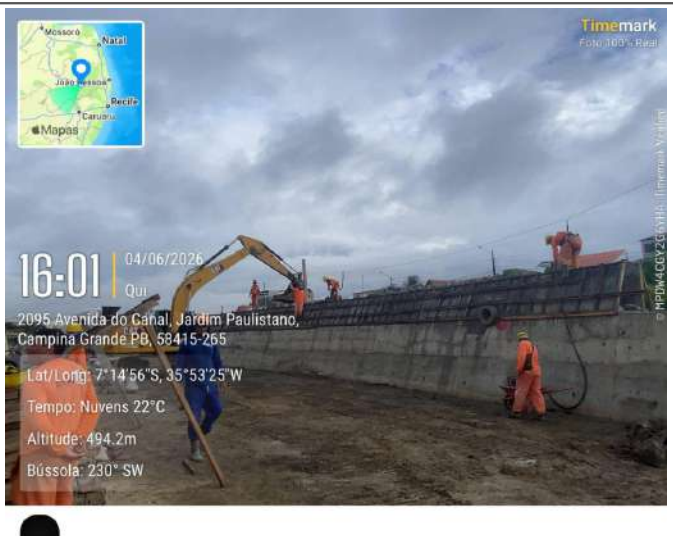

Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899315

Assinatura

Felipe Ribeiro de Almeida
Eng. Civil - CREA 18422041

Assinatura

Luis Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - SEC08 PMGO

Assinatura



Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	198	Data do relatório	05/06/2026	Dia da semana	Sexta-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (32)

Auxiliar de Topografia 1	Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Mão de Obra Própria (30)
Servente 8	Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	
Carpinteiro 3	Motorista de Veículo Pesado 4	Auxiliar de Serviços Gerais 1				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)


Equipamentos (7)

Escavadeira 2	Caminhão Basculante 4	Retro Escavadeira 1			
------------------	--------------------------	------------------------	--	--	--

Atividades (5)

Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Limpeza de material de 1ª categoria e 2ª categoria Lado E (Est-10 a Est-18)	Em Andamento
Execução de enrocamento de pedra para implantação do canal principal entre a Est-31+10 e a Est-32+10. (Efetuando a regularização e o nivelamento das pedras)	Em Andamento
Execução dos barbacãs no enrocamento de pedra para implantação do piso do Canal principal.	Em Andamento
Desmontagem e montagem das fôrmas das paredes laterais do canal principal.	Em Andamento

Fotos (5)

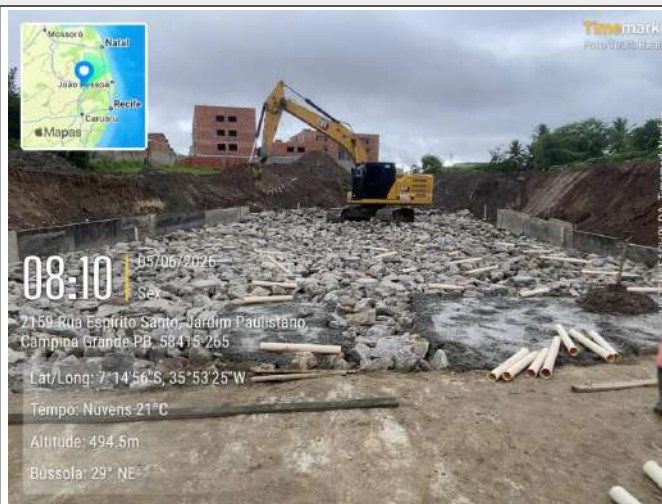

 5 de jun. de 2026 15:18:41 193° S	 15:24 05/06/2026 Sex 2159 Rua Espírito Santo, Jardim Paulistano, Campina Grande PB, 58415-265 Lat/Long: 7°14'58"S, 35°53'26"W Tempo: Nuvens 24°C Altitude: 493.8m Bússola: 154° SE
 5 de jun. de 2026 16:52:02 7.2490566666666666S 35.89061W 2184 Rua Espírito Santo Jardim Paulistano Campina Grande Paraíba #CONSTRUTORA ROCHA	


CONSTRUTORA ROCHA CARVALHEI
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899315
Assinatura


Felipe Augusto Teixeira de Melo
Eng. Civil - CREA 184422441
Assinatura


Luiz Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - BEC008 PMGO
Assinatura



GRUPO
ROCHA
CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	199	Data do relatório	06/06/2026	Dia da semana	Sábado
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (31)						
Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Servente 8	Mão de Obra Própria (29)
Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	Carpinteiro 3	
Motorista de Veículo Pesado 4	Auxiliar de Serviços Gerais 1					
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)


Equipamentos (7)					
Escavadeira 2	Caminhão Basculante 4	Retro Escavadeira 1			

Atividades (5)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Limpeza de material de 1ª categoria e 2ª categoria. Lado E (Est-10 a Est-18)	Em Andamento
Desmontagem e montagem das fôrmas das paredes laterais do canal principal.	Em Andamento
Execução do desvio Lado E entre a Est-15 e a Est-18 (Colocação de Pedras no talude do desvio)	Em Andamento
Concretagem do lastro (piso) do canal principal entre a Est-32 e a Est-33	Em Andamento

Fotos (11)



6 de jun. de 2026 07:21:45
180° S

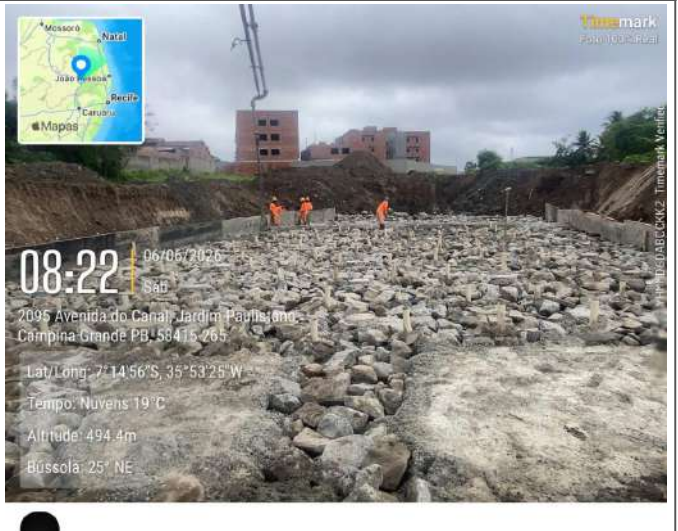

08:22 | 06/06/2026
São
2095 Avenida do Canal, Jardim Pavilhão,
Campina Grande PB, 58415-265
Lat/Long: 7° 14' 56" S, 35° 53' 26" W
Tempo: Nuvens 19 °C
Altitude: 494.4m
Bússola: 25° NE

1 / 3





Vídeos (1)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:08


CONSTRUTORA ROCHA CARVALHO
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899315
Assinatura


Felipe Ribeiro de Almeida
Eng. Civil - CREA 184422441
Assinatura


Luiz Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - SEC08 PMGO
Assinatura



GRUPO
ROCHA
CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	200	Data do relatório	08/06/2026	Dia da semana	Segunda-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição	Índice pluviométrico
Manhã	☀️ Claro	Praticável	12.5 mm
Tarde	☀️ Claro	Praticável	

Mão de obra (33)						
Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Servente 8	Mão de Obra Própria (31)
Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	Carpinteiro 3	
Motorista de Veículo Pesado 4	Auxiliar de Serviços Gerais 1	Auxiliar de Topografia 2				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (7)					
Escavadeira 2	Caminhão Basculante 4	Retro Escavadeira 1			

Atividades (5)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Limpeza de material de 1ª categoria e 2ª categoria Lado E (Est-10 a Est-18)	Em Andamento
Desmontagem e montagem das fôrmas das paredes laterais do canal principal	Em Andamento
Colocação dos barbacãs no enrocamento de pedra para implantação do piso do canal principal entre a Est-31+10 e a Est-32.	Em Andamento
Execução do desvio Lado E entre a Est-15 e a Est-18 (Colocação de Pedras no talude do desvio)	Em Andamento

Fotos (6)



12,5 mm /chuva no domingo





Vídeos (1)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4 Desvio Lado E (Est-15 e a Est-18)	00:05


CONSTRUTORA ROCHA CARVALHO
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899315
Assinatura


Felipe Henrique Soares Pinto
Eng. Civil - CREA 184422441
Assinatura


Luiz Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - BEC008 PMGO
Assinatura



GRUPO
ROCHA
CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	201	Data do relatório	09/06/2026	Dia da semana	Terça-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (33)						
Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Servente 8	Mão de Obra Própria (31)
Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	Carpinteiro 3	
Motorista de Veículo Pesado 4	Auxiliar de Serviços Gerais 1	Auxiliar de Topografia 2				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (7)					
Escavadeira 2	Caminhão Basculante 4	Retro Escavadeira 1			

Atividades (5)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Limpeza de material de 1ª categoria e 2ª categoria Lado E (Est-10 a Est-18)	Em Andamento
Desmontagem e montagem das fôrmas das paredes laterais do canal principal.	Em Andamento
Execução do desvio Lado E entre a Est-15 e a Est-18	Em Andamento
Concretagem das parede do canal principal Lado D (Est-36+12 a Est-37+17 Terceira Etapa) e Concretagem do Lastro (piso) do canal principal (Est-31+10 a Est-32).	Em Andamento


Fotos (6)



9 de jun. de 2026 15:29:44
219° SW



9 de jun. de 2026 15:01:04
71° E

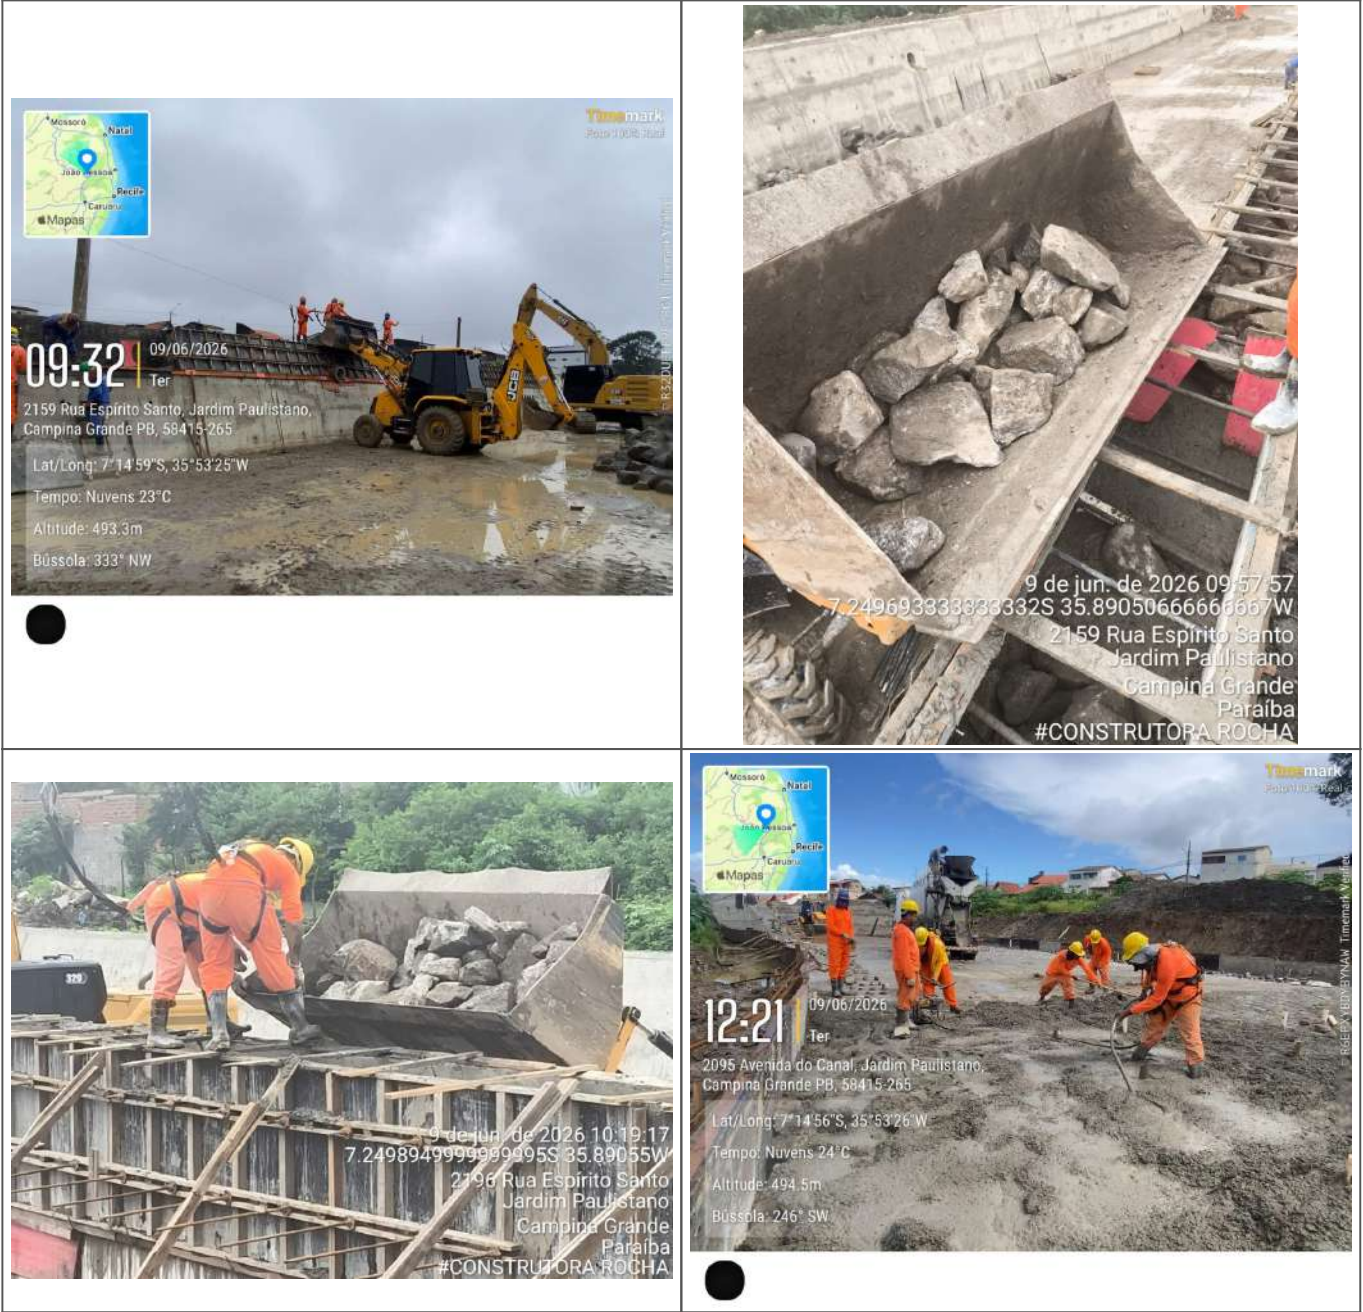

Vídeos (2)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:23
Vídeo 2 (visualizar).mp4	00:14


Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899315
Assinatura


Assinatura


Luiz Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - BEC08 PMGO
Assinatura

 GRUPO ROCHA CAVALCANTE					
Relatório Diário de Obra (RDO)					
Relatório nº	202	Data do relatório	10/06/2026	Dia da semana	Quarta-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (32)						
Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Servente 8	Mão de Obra Própria (30)
Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	Carpinteiro 3	
Motorista de Veículo Pesado 3	Auxiliar de Serviços Gerais 1	Auxiliar de Topografia 2				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (6)					
Escavadeira 2	Caminhão Basculante 3	Retro Escavadeira 1			

Atividades (4)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Limpeza de material de 1ª categoria e 2ª categoria. Lado D (Est-16 a Est-18)	Em Andamento
Desmontagem e montagem das fôrmas das paredes laterais do canal principal.	Em Andamento
Execução do desvio Lado E entre a Est-15 e a Est-18	Em Andamento

Fotos (7)	
 10 de jun. de 2026 13:49:01 6° N	 10 de jun. de 2026 14:54:01 57° NE



Treinamento de trabalho em altura (baseado na NR-35).





Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	203	Data do relatório	11/06/2026	Dia da semana	Quinta-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (32)


Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Servente 8	Mão de Obra Própria (30)
Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	Carpinteiro 3	
Motorista de Veículo Pesado 3	Auxiliar de Serviços Gerais 1	Auxiliar de Topografia 2				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (6)

Escavadeira 2	Caminhão Basculante 3	Retro Escavadeira 1			
-------------------------	---------------------------------	-------------------------------	--	--	--

Atividades (5)

Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Esgotamento d'água.	Em Andamento
Desmontagem e montagem das fôrmas das paredes laterais do canal principal.	Em Andamento
Montagem de fôrma para execução do enrocamento de pedra para implantação do piso do canal principal entre a Est-20 e a Est-22	Em Andamento
Limpeza mecanizada entre a Est-30 e a Est-31	Em Andamento

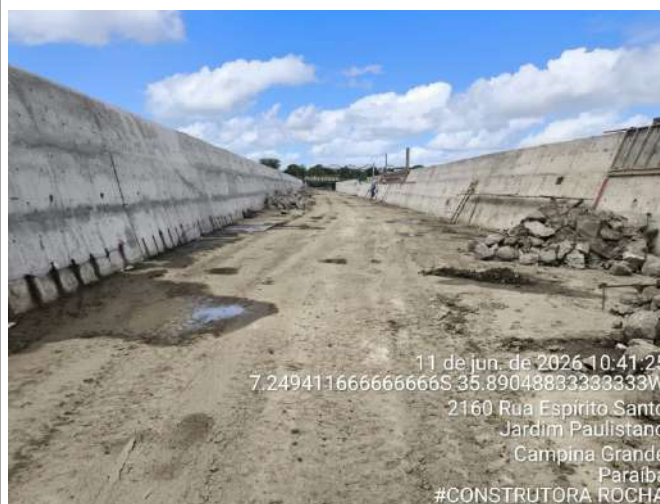Fotos (7)



Vídeos (1)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:18


Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899315
Assinatura


Felipe Ribeiro
Eng. Civil - CREA 184422441
Assinatura


Luis Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - BEC08 PMGO
Assinatura


 GRUPO ROCHA CAVALCANTE					
Relatório Diário de Obra (RDO)					
Relatório nº	204	Data do relatório	12/06/2026	Dia da semana	Sexta-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (32)						
Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Servente 8	Mão de Obra Própria (30)
Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	Carpinteiro 3	
Motorista de Veículo Pesado 3	Auxiliar de Serviços Gerais 1	Auxiliar de Topografia 2				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (6)					
Escavadeira 2	Caminhão Basculante 3	Retro Escavadeira 1			

Atividades (4)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Desmontagem e montagem das fôrmas das paredes laterais do canal principal.	Em Andamento
Montagem de fôrma para execução do enrocamento de pedra para implantação do piso do canal principal entre a Est-20 e a Est-22	Em Andamento
Limpeza mecanizada entre a Est-30 e a Est-31	Em Andamento

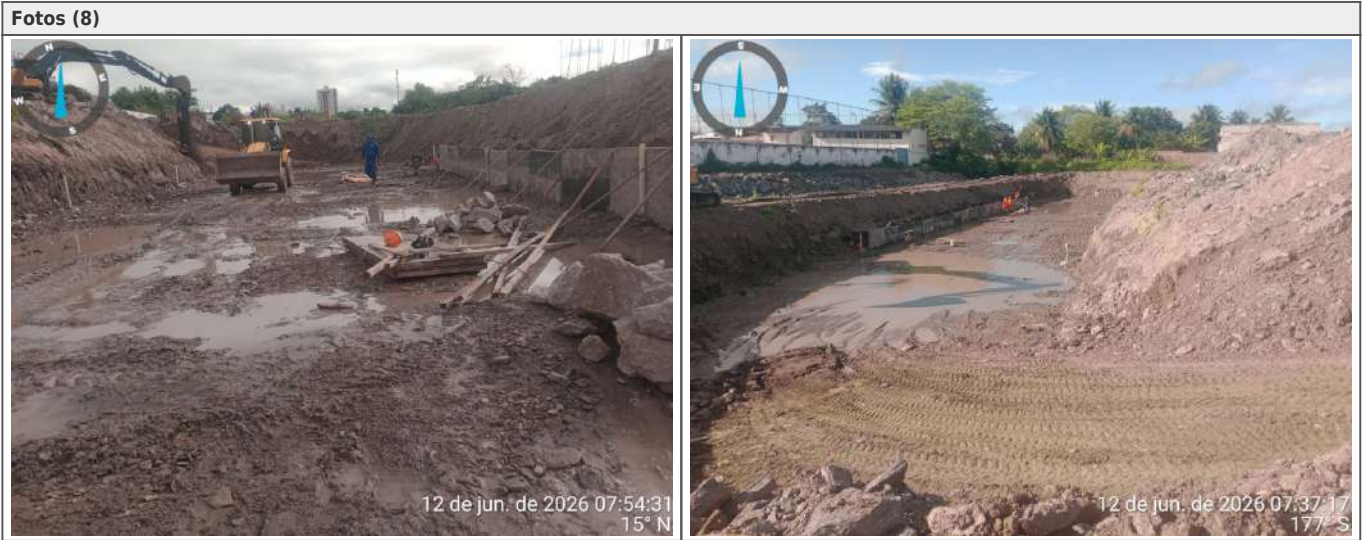

Vídeos (1)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:16


Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899315
Assinatura


Luiz Henrique Soares Pinto
Eng. Civil - CREA 18422041
Assinatura


Bertini Antoine
Eng. Civil - CREA 1621394360
Assinatura



Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	205	Data do relatório	13/06/2026	Dia da semana	Sábado
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (26)

Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Encarregado Geral 1	Servente 5	Pedreiro 2	Mão de Obra Própria (24)
Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Almoxarife 1	Carpinteiro 3	Motorista de Veículo Pesado 3	Auxiliar de Topografia 2	
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)


Equipamentos (6)

Escavadeira 2	Caminhão Basculante 3	Retro Escavadeira 1			
------------------	--------------------------	------------------------	--	--	--

Atividades (5)

Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Desmontagem e montagem das fôrmas das paredes laterais do canal principal.	Em Andamento
Limpeza mecanizada entre as Est-30 e a Est-31	Em Andamento
Concretagem da parede lateral do Canal principal Lado D (Est-37+17 a Est-40 Terceira Etapa).	Em Andamento
Execução de enrocamento de pedra para implantação do piso do canal principal entre a Est-20 e a Est-22	Em Andamento

Fotos (5)

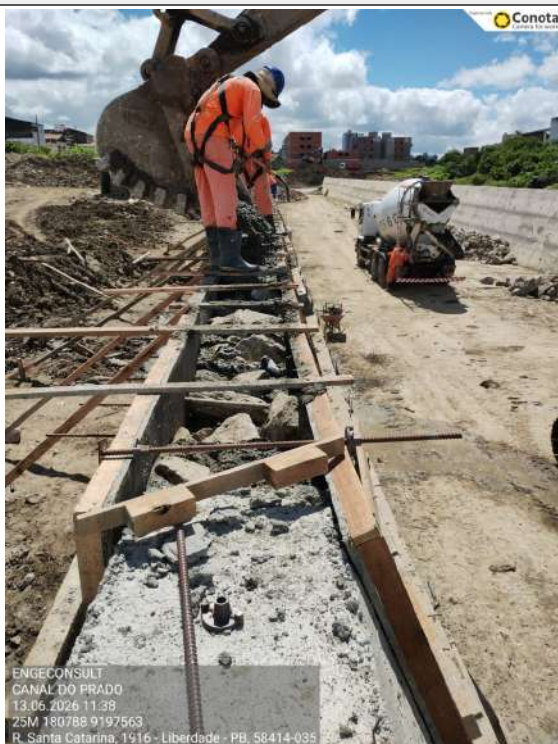




CONSTRUTORA RIOS CARVALHO
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899315
Assinatura


Felipe Ribeiro
Eng. Civil - CREA 184422441
Assinatura


Luiz Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - SECCO P/MGO
Assinatura

 GRUPO ROCHA CAVALCANTE					
Relatório Diário de Obra (RDO)					
Relatório nº	206	Data do relatório	15/06/2026	Dia da semana	Segunda-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (32)						
Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Servente 8	Mão de Obra Própria (30)
Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	Carpinteiro 3	
Motorista de Veículo Pesado 3	Auxiliar de Serviços Gerais 1	Auxiliar de Topografia 2				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (6)					
Escavadeira 2	Caminhão Basculante 3	Retro Escavadeira 1			

Atividades (5)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Desmontagem e montagem das fôrmas das paredes laterais do canal principal.	Em Andamento
Montagem de fôrma para execução do enrocamento de pedra para implantação do piso do canal principal entre a Est-20 e a Est-22	Em Andamento
Execução de enrocamento de pedra para implantação do piso do canal principal entre a Est-20 a Est-22	Em Andamento
Escavação mecanizada na Est-30	Em Andamento

Fotos (6)	
	


CONSTRUTORA ROCHA CARVALHEIRA
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899315
Assinatura


Assinatura


Luiz Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - SECOP PMGO
Assinatura

GRUPO ROCHA CAVALCANTE					
Relatório Diário de Obra (RDO)					
Relatório nº	207	Data do relatório	16/06/2026	Dia da semana	Terça-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição	Índice pluviométrico
Manhã	☀️ Claro	Praticável	5 mm
Tarde	☀️ Claro	Praticável	

Mão de obra (32)						
Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Servente 8	Mão de Obra Própria (30)
Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	Carpinteiro 3	
Motorista de Veículo Pesado 3	Auxiliar de Serviços Gerais 1	Auxiliar de Topografia 2				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (6)					
Escavadeira 2	Caminhão Basculante 3	Retro Escavadeira 1			

Atividades (6)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Desmontagem e montagem das fôrmas das paredes laterais do canal principal.	Em Andamento
Montagem de fôrma para execução do enrocamento de pedra para implantação do piso do canal principal entre a Est-20 e a Est-22	Em Andamento
Execução de enrocamento de pedra para implantação do piso do canal principal entre a Est-20 a Est-22	Em Andamento
Escavação mecanizada na Est-30	Em Andamento
Concretagem da Parede Lateral do Canal Principal Lado E (Est-32 a Est-33 Primeira Etapa)	Em Andamento

Fotos (6)	
 Foto: 100% Real  06:59 16/06/2026 Ter 2159 Rua Espírito Santo, Jardim Paulistano, Campina Grande PB, 58415-265 Lat/Long: 7° 15' 1" S, 35° 53' 26" W Tempo: Nuvens 21°C Altitude: 493.0m Bússola: 292° W  Precipitação de 5 mm na noite anterior	 Foto: 100% Real  08:57 16/06/2026 Ter 1541 Rua Francisco Ernesto do Rego, Jambolô, Campina Grande PB, 58415-3620 Lat/Long: 7° 14' 47" S, 35° 53' 22" W Tempo: Nuvens 21°C Altitude: 495.7m Bússola: 188° S 




COSTRUTORA ROCHA CARVALHEIRA
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899315
Assinatura


Felipe Ribeiro
Eng. CIV. - CREA 184422441
Assinatura


Luiz Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - BEC08 PMGO
Assinatura



Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	208	Data do relatório	17/06/2026	Dia da semana	Quarta-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (32)

Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Servente 8	Mão de Obra Própria (30)
Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	Carpinteiro 3	
Motorista de Veículo Pesado 3	Auxiliar de Serviços Gerais 1	Auxiliar de Topografia 2				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (6)

Escavadeira 2	Caminhão Basculante 3	Retro Escavadeira 1			
------------------	--------------------------	------------------------	--	--	--

Atividades (5)

Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Desmontagem e montagem das fôrmas das paredes laterais do canal principal	Em Andamento
Execução dos barbâcs no enrocamento de pedra para implantação do piso do canal principal (Est-20 a Est-22)	Em Andamento
Escavação mecanizada na Est-30	Em Andamento
Concretagem da Parede Lateral do Canal Principal Lado D (Est-32 a Est-33 Primeira Etapa)	Em Andamento

Fotos (8)



Pedro Saulo do N. Pereira
CONSTRUTORA RIOS CARVALHO
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899315

Assinatura

Felipe Ribeiro
FELIPE RIBEIRO
Eng. Civil - CREA 18422041

Assinatura

Luiz Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - BEC08 PMGO

Assinatura



Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	209	Data do relatório	18/06/2026	Dia da semana	Quinta-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				



Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável
Noite	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (32)						
Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Servente 8	Mão de Obra Própria (30)
Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	Carpinteiro 3	
Motorista de Veículo Pesado 3	Auxiliar de Serviços Gerais 1	Auxiliar de Topografia 2				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (6)					
Escavadeira 2	Caminhão Basculante 3	Retro Escavadeira 1			

Atividades (7)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Desmontagem e montagem das fôrmas das paredes laterais do canal principal.	Em Andamento
Transporte de Pedras.	Em Andamento
Execução dos barbacãs para implantação do piso do canal principal entre a Est-20 e a Est-22	Em Andamento
Escavação mecanizada na Est-30	Em Andamento
Concretagem da Parede Lateral do Canal Principal Lado D (Est-32 a Est-33 Segunda Etapa) Obs. 1 caminhão.	Em Andamento
Concretagem do Lastro (piso) do Canal Principal entre a Est-20+1 e a Est-22	Em Andamento

Fotos (8)

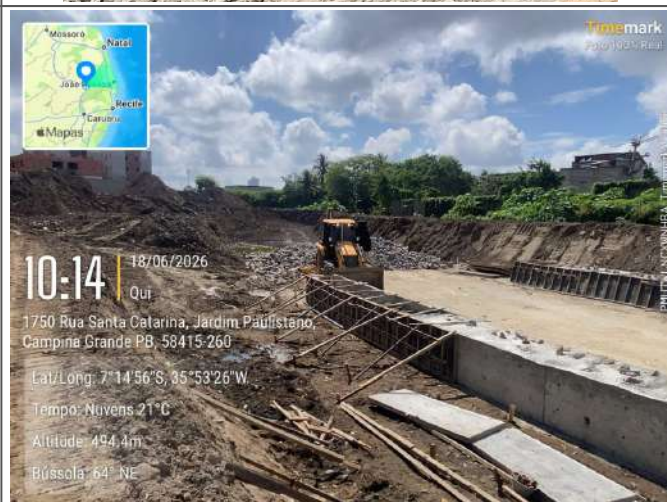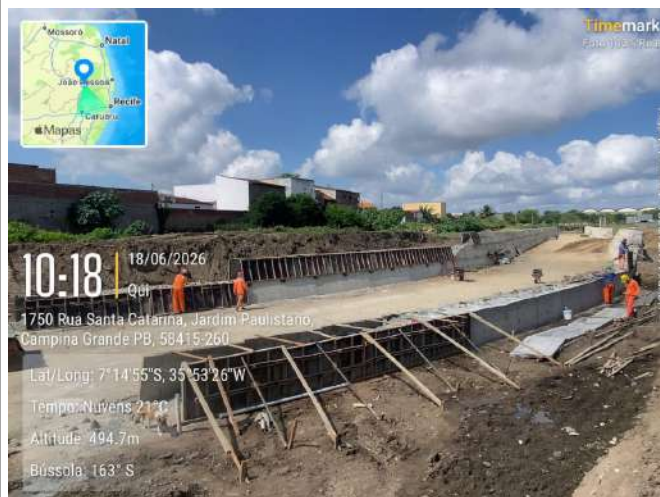




CONSTRUTORA ROCHA CARVALHO
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899315
Assinatura


Felipe Ribeiro
Eng. Civil - CREA 184422441
Assinatura


Luiz Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - SECCO P/MGO
Assinatura



GRUPO
ROCHA
CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	210	Data do relatório	19/06/2026	Dia da semana	Sexta-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (32)						
Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Servente 8	Mão de Obra Própria (30)
Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	Carpinteiro 3	
Motorista de Veículo Pesado 3	Auxiliar de Serviços Gerais 1	Auxiliar de Topografia 2				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (6)					
Escavadeira 2	Caminhão Basculante 3	Retro Escavadeira 1			

Atividades (4)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Desmontagem e montagem das fôrmas das paredes laterais do canal principal.	Em Andamento
Acabamento dos tubos de espera no Canal Principal.	Em Andamento
Transporte de Pedras.	Em Andamento

Fotos (2)



19 de Jun de 2026 08:11:02

7 24682166666666666666 S 35 3897 W

1997 Rôdi Espírito Santo

Jardim Paulistano

Campina Grande

Paraíba

#CONSTRUTORA ROCHA



11:29 | 19/06/2026 | Sex

1766 Rua Santa Catarina, Jardim Paulistano, Campina Grande PB, 58415-260

Lat/L ong: 7°14'55" S, 35°53'26" W

Tempo: Nuvens 26°C

Altitude: 494.5m

Bússola: 168° S




CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899315
Assinatura


Felipe Ribeiro Teixeira de Melo
Eng. Civil - CREA 184020461
Assinatura


Luis Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - BEC08 PMGO
Assinatura

 GRUPO ROCHA CAVALCANTE					
Relatório Diário de Obra (RDO)					
Relatório nº	212	Data do relatório	20/06/2026	Dia da semana	Sábado
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				
Condição climática		Tempo		Condição	
Manhã		☀️ Claro		Praticável	
Tarde		☀️ Claro		Praticável	
Ocorrências (1)					
Não Trabalha/Sem expediente. Dia parado					
Comentários (1)					
Felipe Melo 07/07/2026 13:30 Dia sem atividade, a Construtora deu folga aos funcionários e só retornará às atividades na próxima quinta-feira 25/06/2026.					


CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899315
Assinatura


CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE
Felipe Melo
Eng. Civil - CREA 184422441
Assinatura


Luiz Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - SECCOB PMGO
Assinatura

 GRUPO ROCHA CAVALCANTE					
Relatório Diário de Obra (RDO)					
Relatório nº	213	Data do relatório	22/06/2026	Dia da semana	Segunda-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				
Condição climática		Tempo		Condição	
Manhã		☀️ Claro		Praticável	
Tarde		☀️ Claro		Praticável	
Ocorrências (1)					
Dia do acordo de recesso de São João. Sem expediente.					


CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899315
Assinatura


CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE
Felipe Augusto Teixeira do Prado
Eng. Civil - CREA 184422641
Assinatura


Luis Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - SECCOB PMGO
Assinatura

 GRUPO ROCHA CAVALCANTE					
Relatório Diário de Obra (RDO)					
Relatório nº	214	Data do relatório	23/06/2026	Dia da semana	Terça-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				
Condição climática		Tempo		Condição	
Manhã		☀️ Claro		Praticável	
Tarde		☀️ Claro		Praticável	
Ocorrências (1)					
Dia do acordo de recesso de São João. Sem expediente.					



Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899315

Assinatura



Felipe Augusto Teixeira do Prado
Eng. Civil - CREA 184422441

Assinatura



Luis Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - BEC008 PMGO

Assinatura

 GRUPO ROCHA CAVALCANTE					
Relatório Diário de Obra (RDO)					
Relatório nº	215	Data do relatório	24/06/2026	Dia da semana	Quarta-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				
Condição climática		Tempo		Condição	
Manhã		☀️ Claro		Praticável	
Tarde		☀️ Claro		Praticável	
Ocorrências (1)					
Feriado de São João.					


CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899315
Assinatura


CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE
Felipe Augusto Teixeira de Melo
Eng. Civil - CREA 184422441
Assinatura


Luis Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - SEC08 PMGO
Assinatura

 GRUPO ROCHA CAVALCANTE					
Relatório Diário de Obra (RDO)					
Relatório nº	211	Data do relatório	25/06/2026	Dia da semana	Quinta-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição	Índice pluviométrico
Manhã	☀️ Claro	Praticável	18 mm
Tarde	☀️ Claro	Praticável	

Mão de obra (30)						
Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Servente 8	Mão de Obra Própria (28)
Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	Carpinteiro 1	
Motorista de Veículo Pesado 3	Auxiliar de Serviços Gerais 1	Auxiliar de Topografia 2				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (6)					
Escavadeira 2	Caminhão Basculante 3	Retro Escavadeira 1			

Atividades (5)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Execução de enrocamento de pedra para implantação do piso do canal principal na Est-31	Em Andamento
Desmontagem e montagem das fôrmas das paredes laterais do canal principal.	Em Andamento
Transporte de Pedras.	Em Andamento
Concretagem das paredes laterais do Canal Principal Lado E (Est-32+10 a Est-33+10 Segunda Etapa) e Lado D (Est-32+13 a Est-33+10 Segunda Etapa)	Em Andamento

Fotos (5)	
 06:37 25/06/2026 Qui 2159 Rua Espírito Santo, Jardim Paulistano, Campina Grande PB, 58415-265 Lat/Long: 7°15'1\"S, 35°53'26\"W Tempo: Nuvens 19°C Altitude: 493.2m Bússola: 279° W Precipitação durante o recesso de São João, de 20/06 a 25/06	 06:37 25/06/2026 Qui 2159 Rua Espírito Santo, Jardim Paulistano, Campina Grande PB, 58415-265 Lat/Long: 7°15'1\"S, 35°53'26\"W Tempo: Nuvens 19°C Altitude: 493.1m Bússola: 280° W




CONSTRUTORA ROCHA CARVALHO
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899315
Assinatura


Felipe Ribeiro
Eng. CIVIL - CREA 184422441
Assinatura


Luiz Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - BEC08 PMGO
Assinatura



GRUPO
ROCHA
CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	216	Data do relatório	26/06/2026	Dia da semana	Sexta-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Chuvoso	Impraticável
Tarde	☁ Chuvoso	Impraticável

Ocorrências (1)

Chuva o dia todo.

Dia Chuvoso

Comentários (1)

Felipe Melo 07/07/2026 13:45
Devido as chuvas que caíram na madrugada e durante praticamente o dia todo, não houveram atividades na obra neste dia.

Vídeos (4)

Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:16
Vídeo 2 (visualizar).mp4	00:08
Vídeo 3 (visualizar).mp4	00:24
Vídeo 4 (visualizar).mp4	00:13



Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899315

Assinatura



Felipe Melo
Eng. Civil - CREA 184422441

Assinatura



Luiz Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - BEC008 PMGO

Assinatura



Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	217	Data do relatório	29/06/2026	Dia da semana	Segunda-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				


Condição climática	Tempo	Condição	Índice pluviométrico
Manhã	☀ Claro	Praticável	60 mm
Tarde	☀ Claro	Praticável	
Noite	☁ Chuvoso	Praticável	

Mão de obra (30)						
Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Servente 8	Mão de Obra Própria (28)
Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	Carpinteiro 1	
Motorista de Veículo Pesado 3	Auxiliar de Serviços Gerais 1	Auxiliar de Topografia 2				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (6)					
Escavadeira 2	Caminhão Basculante 3	Retro Escavadeira 1			

Atividades (4)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Esgotamento d'água	Em Andamento
Desmontagem e montagem das fôrmas das paredes laterais do canal principal.	Em Andamento
Transporte de Pedras.	Em Andamento

Fotos (4)

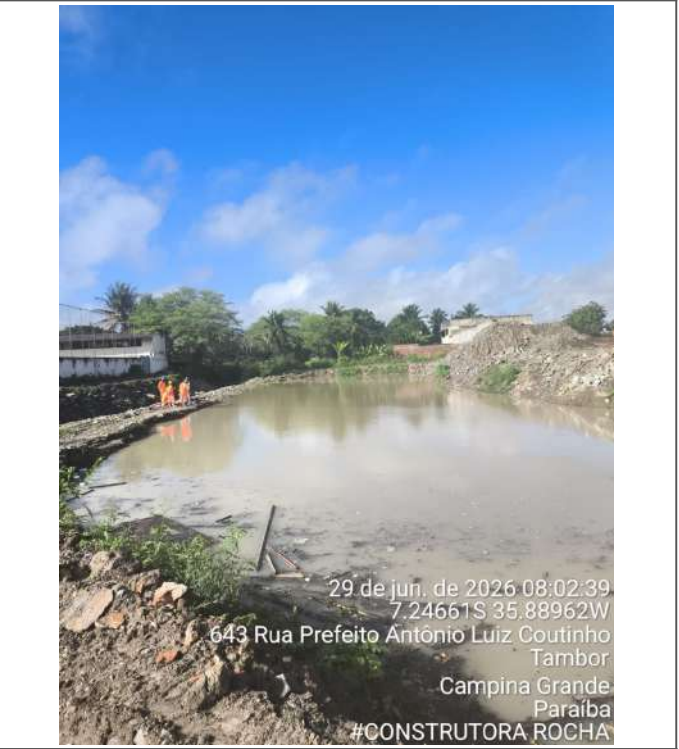


CONSTRUTORA ROCHA CARVALHEI
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899315

Assinatura


Felipe Ribeiro
Eng. Civil - CREA 184422441

Assinatura


Luiz Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - SECCO P/MGO

Assinatura



GRUPO
ROCHA
CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	218	Data do relatório	30/06/2026	Dia da semana	Terça-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (30)						
Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Servente 8	Mão de Obra Própria (28)
Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	Carpinteiro 1	
Motorista de Veículo Pesado 3	Auxiliar de Serviços Gerais 1	Auxiliar de Topografia 2				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (6)					
Escavadeira 2	Caminhão Basculante 3	Retro Escavadeira 1			

Atividades (5)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Esgotamento d'água	Em Andamento
Desmontagem e montagem das fôrmas das paredes laterais do canal principal.	Em Andamento
Transporte de Pedras.	Em Andamento
Concretagem da parede lateral do canal principal Lado E (Est-32+8 a Est-33 Segunda Etapa)	Em Andamento

Fotos (6)



Timemark
Foto 100% Real

07:14

30/06/2026

Ter

2159 Rua Espírito Santo, Jardim Paulistano, Campina Grande PB, 58415-265

Lat/Long: 7°16'1"S, 35°53'26"W

Tempo: Nuvens 19°C

Altitude: 493.0m

Bússola: 174° S



Timemark
Foto 100% Real

09:27

30/06/2026

Ter

97 Rua Professora Ariel de Oliveira, Jardim Paulistano, Campina Grande PB, 58415-250



Lat/Long: 7°14'56"S, 35°53'26"W

Tempo: Nuvens 22°C

Altitude: 494.4m

Bússola: 62° NE

1 / 2

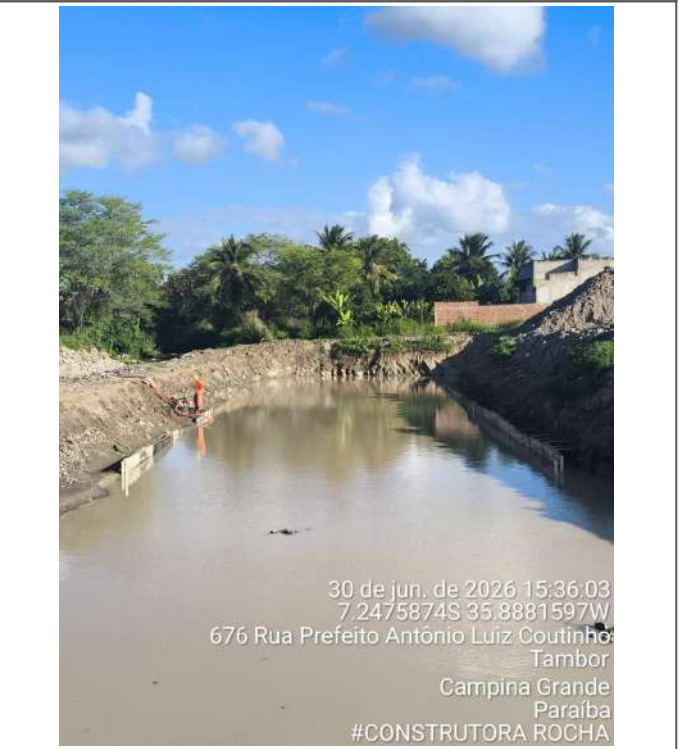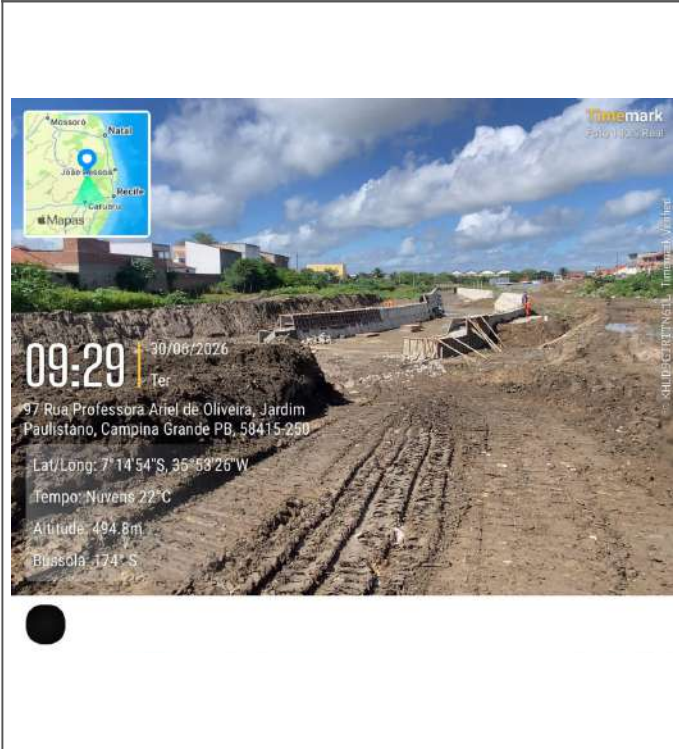


CONSTRUTORA ROCHA CARVALHO
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899315
Assinatura


Felipe Ribeiro
Eng. Civil - CREA 184422441
Assinatura


Luís Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - SECOP PMGO
Assinatura

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS



EMPRESA: **CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA**

CONTRATO: **N.º: 2.08.018/2025**

MEDIÇÃO: **8ª**

PERÍODO LÍQUIDO: **01/06/2026 A 30/06/2026**

FOTO 01



TRECHO

CANAL DO PRADO

FOTO 02



TRECHO

CANAL DO PRADO

FOTO 03



TRECHO

CANAL DO PRADO

FOTO 04



TRECHO

CANAL DO PRADO

FOTO 05



TRECHO

CANAL DO PRADO

FOTO 06



TRECHO

CANAL DO PRADO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS



EMPRESA: **CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA**

CONTRATO: **N.º: 2.08.018/2025**

MEDIÇÃO: **8ª**

PERÍODO LÍQUIDO: **01/06/2026 A 30/06/2026**

FOTO 07



TRECHO **CANAL DO PRADO**

FOTO 08



TRECHO **CANAL DO PRADO**

FOTO 09



TRECHO **CANAL DO PRADO**

FOTO 10



TRECHO **CANAL DO PRADO**

FOTO 11



TRECHO **CANAL DO PRADO**

FOTO 12



TRECHO **CANAL DO PRADO**
