



Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Nota Natalense

Nº da Nota: 0000002131
Competência: FEV/2026
Data Prestação Serviço: 27/02/2026
Nº da Nota Substituída: 2128

Data/Hora de Emissão: 04/03/2026 às 11:29:53 **Código de Verificação:** 005072844

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ: 04.751.986/0001-92 **Inscrição Municipal:** 144.062-4
Razão Social: F DOIS ENGENHARIA LTDA
Endereço: R DOUTOR MUCIO GALVAO, 426, Barro Vermelho, 59022-530
Município: NATAL **UF:** RN
Telefone: (84) 3234-3390 **E-mail:** FDOIS@FDOISENGENHARIA.COM.BR



Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE
CPF/CNPJ/NIF: 08.993.917/0001-46 **Inscrição Municipal:**
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, 304, CENTRO, 58400-058
Cidade: CAMPINA GRANDE **Estado:** PB
Telefone: (83) 98815-2930 **E-mail:**

Serviços

7.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
NBS: 101012200 - Serviços de construção de edificações comerciais

Item	Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Valor Total
1	REFERENTE A MEDIÇÃO 01 DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DOS ARMAZENS DA FEIRA CENTRAL DE CAMPINA GRANDE - ETAPA 01. CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 90807/2025 E CONTRATO Nº 2.08.020/2025. PERÍODO DE EXECUÇÃO 08/01/2026 A 27/02/2026. VALOR DE MATERIAL: R\$ 62.988,80 VALOR DE MÃO DE OBRA: R\$ 94.483,20 CASE DE CÁLCULO DO ISS: R\$ 94.483,20 RETENÇÃO DE IR 1,2% BANCO DO BRASIL AG: 0022-1 C/C: 42596-6 CNO: 90.026.99939/71	1,0000	157.472,00	157.472,00

Valor Total da NFS-e R\$: 157.472,00

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
62.988,80	94.483,20	5,00	4.724,16	0,00
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	1.889,66	0,00	0,00	0,00

Outras Informações

Chave NFS-e Nacional: 24081021204751986000192000000000213126031439190704
ISS retido na fonte.
Local da prestação do serviço: CAMPINA GRANDE/PB.
Natureza da operação: Tributação fora do município de Natal.

	BOLETIM DE MEDIÇÃO 001		VLR CONTRATO INICIAL:	R\$	4.585.646,22	100,00%
			VLR ADITIVO DE ACRÉSCIMO:			0,00%
			VLR ADITIVO DE SUPRESSÃO:			0,00%
	OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DOS ARMAZÉNS DA FEIRA CENTRAL DE CAMPINA GRANDE - ETAPA 01 BAIRRO CENTRO, ESTADO DA PARAÍBA.	ARMAZÉNS DA FEIRA DE CAMPINA GRANDE-PB	VLR CONTRATO VIGENTE:	R\$	4.585.646,22	100,00%
	LOCALIZAÇÃO: CAMPINA GRANDE/RN	Nº DO CONTRATO: 2.08.020/2025	MEDIÇÃO ANTERIOR:	R\$	-	0,00%
	CONTRATADA: FDOIS ENGENHARIA LTDA CNPJ: 04.751.986/0001-92	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 08/01/2026 A 27/02/2026	MEDIÇÃO DO PERÍODO:	R\$	157.472,00	3,43%
			MEDIÇÃO ACUMULADA:	R\$	157.472,00	3,43%
			SALDO A MEDIR:	R\$	4.428.174,22	96,57%

Item	Descrição	Und	CONTRATO			MEDIDO NO PERÍODO			MEDIDO ANTERIOR		MEDIDO ACUMULADO			SALDO A MEDIR		
			Quant.	P. Unit. c/ BDI	Total	Quant.	Valor Total	(%)	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	(%)	Quant.	Valor Total	(%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 85.951,72		R\$ 32.372,48	37,66%		R\$ -		R\$ 32.372,48	37,66%		R\$ 53.579,21	62,34%
1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF. 03/2024	M2	2.830,28	R\$ 0,74	R\$ 2.094,40	2084,08	R\$ 1.542,21	73,63%		R\$ -	2084,08	R\$ 1.542,21	73,63%	746,20	R\$ 552,18	26,36%
1.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA.	M2	176,00	R\$ 112,48	R\$ 19.796,48	84,40	R\$ 9.493,31	47,95%		R\$ -	84,40	R\$ 9.493,31	47,95%	91,60	R\$ 10.303,16	52,05%
1.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 03/2024	M	121,00	R\$ 71,73	R\$ 8.679,33	92,39	R\$ 6.627,13	76,36%		R\$ -	92,39	R\$ 6.627,13	76,36%	28,61	R\$ 2.052,19	23,64%
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022_P5	M2	8,00	R\$ 542,48	R\$ 4.339,84	8,00	R\$ 4.339,84	100,00%		R\$ -	8,00	R\$ 4.339,84	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%
1.5	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF. 07/2020	UN	1,00	R\$ 2.289,57	R\$ 2.289,57		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 2.289,57	100,00%
1.6	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 04/2025	UN	1,00	R\$ 901,76	R\$ 901,76		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 901,76	100,00%
1.7	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPL0 T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	1,00	R\$ 584,76	R\$ 584,76		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 584,76	100,00%
1.8	HIDRÔMETRO DN 1/2" 3,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2024	UN	1,00	R\$ 158,56	R\$ 158,56		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 158,56	100,00%
1.9	LOCAÇAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	12,00	R\$ 1.313,95	R\$ 15.767,40	2,00	R\$ 2.627,90	16,67%		R\$ -	2,00	R\$ 2.627,90	16,67%	10,00	R\$ 13.139,50	83,33%
1.10	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER	UN	6,00	R\$ 1.259,41	R\$ 7.556,46	3,00	R\$ 3.778,23	50,00%		R\$ -	3,00	R\$ 3.778,23	50,00%	3,00	R\$ 3.778,23	50,00%
1.11	LOCAÇÃO DE CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISÓRIOS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTIEIRO DE OBRAS	UN	12,00	R\$ 930,76	R\$ 11.169,12	2,00	R\$ 1.861,52	16,67%		R\$ -	2,00	R\$ 1.861,52	16,67%	10,00	R\$ 9.307,60	83,33%
1.12	LOCAÇAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIOS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	12,00	R\$ 1.051,17	R\$ 12.614,04	2,00	R\$ 2.102,34	16,67%		R\$ -	2,00	R\$ 2.102,34	16,67%	10,00	R\$ 10.511,70	83,33%
2	DEMOLUÇÃO				R\$ 93.767,94		R\$ 93.768,21	100,00%		R\$ -		R\$ 93.768,21	100,00%		-R\$ 0,27	0,00%
2.1	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	m³	375,78	R\$ 56,86	R\$ 21.366,85	375,78	R\$ 21.366,85	100,00%		R\$ -	375,78	R\$ 21.366,85	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%
2.2	DEMOLUÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	m³	311,09	R\$ 77,63	R\$ 24.149,91	311,09	R\$ 24.150,18	100,00%		R\$ -	311,09	R\$ 24.150,18	100,00%	0,00	-R\$ 0,27	0,00%
2.3	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2	735,83	R\$ 5,16	R\$ 3.796,88	735,83	R\$ 3.796,88	100,00%		R\$ -	735,83	R\$ 3.796,88	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	23.397,00	R\$ 1,90	R\$ 44.454,30	23397,00	R\$ 44.454,30	100,00%		R\$ -	23397,00	R\$ 44.454,30	100,00%	0,00	R\$ -	0,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 96.968,72		R\$ 15.841,98	16,34%		R\$ -		R\$ 15.841,98	16,34%		R\$ 81.126,74	83,66%
3.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF. 07/2020	m³	1.296,72	R\$ 17,78	R\$ 23.055,68	891,00	R\$ 15.841,98	68,71%		R\$ -	891,00	R\$ 15.841,98	68,71%	405,72	R\$ 7.213,70	31,29%
3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	38.901,60	R\$ 1,90	R\$ 73.913,04		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	38.901,60	R\$ 73.913,04	100,00%
4	INFRAESTRUTURA				R\$ 1.734.718,25		R\$ 15.489,33	0,89%		R\$ -		R\$ 15.489,33	0,89%		R\$ 1.719.228,92	99,11%
4.1	MURO DE CONTENÇÃO															
4.1.1	LOCAÇÃO, ESCAVACAO															
4.1.1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 03/2024	M	214,62	R\$ 71,73	R\$ 15.394,69	62,25	R\$ 4.465,19	29,00%		R\$ -	62,25	R\$ 4.465,19	29,00%	152,37	R\$ 10.929,50	71,00%
4.1.1.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF. 07/2020	m³	2.345,83	R\$ 17,02	R\$ 39.926,02	319,03	R\$ 5.429,91	13,60%		R\$ -	319,03	R\$ 5.429,91	13,60%	2.026,80	R\$ 34.496	

Item	Descrição	Und	CONTRATO			MEDIDO NO PERÍODO			MEDIDO ANTERIOR		MEDIDO ACUMULADO			SALDO A MEDIR		
			Quant.	P. Unit. c/ BDI	Total	Quant.	Valor Total	(%)	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	(%)	Quant.	Valor Total	(%)
4.1.4.1	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 11/2024	m³	658,61	R\$ 813,80	R\$ 535.976,81		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	658,61	R\$ 535.976,81	100,00%
4.1.4.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF 05/2021	m³	38,26	R\$ 460,98	R\$ 17.637,09		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	38,26	R\$ 17.637,09	100,00%
4.2	PARDE DE CONCRETO ARMADO															
4.2.1	ARMAÇÃO															
4.2.1.1	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PLATIBANDAS, TELA Q-503	KG	3.350,90	R\$ 15,03	R\$ 50.364,02		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	3.350,90	R\$ 50.364,02	100,00%
4.2.1.2	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF 12/2024	KG	569,40	R\$ 12,45	R\$ 7.089,03		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	569,40	R\$ 7.089,03	100,00%
4.2.1.3	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 12,5 MM DE DIÂMETRO. AF 12/2024	KG	45,70	R\$ 9,56	R\$ 436,89		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	45,70	R\$ 436,89	100,00%
4.2.1.4	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 20,0 MM DE DIÂMETRO. AF 06/2019	KG	130,40	R\$ 11,34	R\$ 1.478,73		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	130,40	R\$ 1.478,73	100,00%
4.2.2	FORMA															
4.2.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF 11/2024	M2	242,60	R\$ 40,38	R\$ 9.796,18		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	242,60	R\$ 9.796,18	100,00%
4.2.3	CONCRETO															
4.2.3.1	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 11/2024	m³	34,40	R\$ 813,80	R\$ 27.994,72		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	34,40	R\$ 27.994,72	100,00%
4.3	FUNCADAO BLOCOS E SAPATAS															
4.3.1	ESCAVAÇÃO															
4.3.1.1	ESCAVAÇÃO DE BLOCO															
4.3.1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 01/2024	m³	115,60	R\$ 161,31	R\$ 18.647,43	34,68	R\$ 5.594,23	30,00%		R\$ -	34,68	R\$ 5.594,23	30,00%	80,92	R\$ 13.053,20	70,00%
4.3.1.2	ESCAVAÇÃO DE SAPATAS															
4.3.1.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	m³	96,78	R\$ 28,97	R\$ 2.803,71		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	96,78	R\$ 2.803,71	100,00%
4.3.1.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 01/2024	m³	428,78	R\$ 161,31	R\$ 69.166,50		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	428,78	R\$ 69.166,50	100,00%
4.3.1.2.3	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	m³	310,75	R\$ 28,97	R\$ 9.002,42		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	310,75	R\$ 9.002,42	100,00%
4.3.2	ARMAÇÃO															
4.3.2.1	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	264,60	R\$ 22,05	R\$ 5.834,43		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	264,60	R\$ 5.834,43	100,00%
4.3.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	28,16	R\$ 19,77	R\$ 556,72		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	28,16	R\$ 556,72	100,00%
4.3.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	246,44	R\$ 17,77	R\$ 4.379,23		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	246,44	R\$ 4.379,23	100,00%
4.3.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	1.140,00	R\$ 15,51	R\$ 17.681,40		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	1.140,00	R\$ 17.681,40	100,00%
4.3.2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	3.380,57	R\$ 11,94	R\$ 40.364,00		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	3.380,57	R\$ 40.364,00	100,00%
4.3.2.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	1.267,40	R\$ 11,25	R\$ 14.258,25		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	1.267,40	R\$ 14.258,25	100,00%
4.3.3	CONCRETO															
4.3.3.1	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	m³	104,00	R\$ 932,10	R\$ 96.938,40		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	104,00	R\$ 96.938,40	100,00%
4.3.3.2	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	m³	19,55	R\$ 893,57	R\$ 17.469,29		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	19,55	R\$ 17.469,29	100,00%
4.3.3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	M2	14,46	R\$ 45,24	R\$ 654,17		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	14,46	R\$ 654,17	100,00%
4.3.4	FORMA															
4.3.4.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	M2	180,15	R\$ 273,56	R\$ 49.281,83		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	180,15	R\$ 49.281,83	100,00%
4.3.4.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	M2	53,76	R\$ 213,00	R\$ 11.450,88		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	53,76	R\$ 11.450,88	100,00%
5	SISTEMA DE COBERTA				R\$ 1.206.372,36		R\$ -	0,00%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%		R\$ 1.206.372,36	100,00%
5.1	COBERTA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO	UN	1,00	R\$ 578.233,14	R\$ 578.233,14		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 578.233,14	100,00%
5.2	POLICARBONATO CHAPA COMPACTA CRISTAL 12,0X2050X3000 LEXAN EXELLO 2UV E ACESSÓRIOS	VB	1,00	R\$ 506.363,34	R\$ 506.363,34		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 506.363,34	100,00%
5.3	CHAPA PERFURADA EM AÇO INOX COM D= 1,2 mm, DISTÂNCIA ENTRE OS FUROS 2,2MM	PC	1,00	R\$ 111.226,44	R\$ 111.226,44		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 111.226,44	100,00%
5.4	INSTALAÇÃO DE COBERTA DE ESTRUTURA METÁLICA	M2	648,00	R\$ 16,28	R\$ 10.549,44		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	648,00	R\$ 10.549	

Item	Descrição	Und	CONTRATO			MEDIDO NO PERÍODO			MEDIDO ANTERIOR		MEDIDO ACUMULADO			SALDO A MEDIR		
			Quant.	P. Unit. c/ BDI	Total	Quant.	Valor Total	(%)	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	(%)	Quant.	Valor Total	(%)
8.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS NA PAREDE. AF_02/2023 PE	m²	52,50	R\$ 99,51	R\$ 5.224,27		R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00	R\$ -	0,00%	52,50	R\$ 5.224,27	100,00%
8.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 7X26 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	m²	52,50	R\$ 181,04	R\$ 9.504,60		R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00	R\$ -	0,00%	52,50	R\$ 9.504,60	100,00%
8.2	REVESTIMENTO DE PISO															
8.2.1	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	66,62	R\$ 106,28	R\$ 7.080,37		R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00	R\$ -	0,00%	66,62	R\$ 7.080,37	100,00%
8.2.2	PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO LAVADO TIPO FULGET, COR NATURAL, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSO JUNTA PLÁSTICA	m²	318,00	R\$ 106,28	R\$ 33.797,04		R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00	R\$ -	0,00%	318,00	R\$ 33.797,04	100,00%
8.2.3	PISO FULGET (GRANITO LAVADO) EM PLACAS DE 100x100 CM E JUNTAS EM LATÃO	m²	170,31	R\$ 486,90	R\$ 82.923,93		R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00	R\$ -	0,00%	170,31	R\$ 82.923,93	100,00%
8.2.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	m²	230,01	R\$ 106,65	R\$ 24.530,56		R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00	R\$ -	0,00%	230,01	R\$ 24.530,56	100,00%
8.2.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	350,24	R\$ 103,92	R\$ 36.396,94		R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00	R\$ -	0,00%	350,24	R\$ 36.396,94	100,00%
8.2.6	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF_01/2024	M	78,55	R\$ 40,27	R\$ 3.163,20		R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00	R\$ -	0,00%	78,55	R\$ 3.163,20	100,00%
8.2.7	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	21,20	R\$ 163,15	R\$ 3.458,78		R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00	R\$ -	0,00%	21,20	R\$ 3.458,78	100,00%
8.2.8	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	365,45	R\$ 231,21	R\$ 84.495,69		R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00	R\$ -	0,00%	365,45	R\$ 84.495,69	100,00%
8.3	PINTURA															
8.3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM VERNIZ/HIDROREPELENTE	M2	895,77	R\$ 33,44	R\$ 29.954,54		R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00	R\$ -	0,00%	895,77	R\$ 29.954,54	100,00%
8.4	FORROS															
8.4.1	FORRO EM PLACA CIMENTÍCIA PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	M2	90,01	R\$ 139,60	R\$ 12.565,39		R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00	R\$ -	0,00%	90,01	R\$ 12.565,39	100,00%
8.5	REVESTIMENTO DE FACHADA															
8.5.1	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022	m²	860,68	R\$ 104,18	R\$ 89.665,64		R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00	R\$ -	0,00%	860,68	R\$ 89.665,64	100,00%
8.5.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	860,68	R\$ 8,90	R\$ 7.660,05		R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00	R\$ -	0,00%	860,68	R\$ 7.660,05	100,00%
8.5.3	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	735,04	R\$ 24,51	R\$ 18.015,83		R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00	R\$ -	0,00%	735,04	R\$ 18.015,83	100,00%
8.5.4	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	230,53	R\$ 11,31	R\$ 2.607,29		R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00	R\$ -	0,00%	230,53	R\$ 2.607,29	100,00%
8.5.5	REVESTIMENTO DE PAREDE EM GRANILITE, INCLUSO JUNTAS DE LATÃO ENTRE PLACAS	m²	9,77	R\$ 344,87	R\$ 3.369,37		R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00	R\$ -	0,00%	9,77	R\$ 3.369,37	100,00%
8.5.6	REVESTIMENTO DE PAREDE EM GRANILITE, INCLUSO JUNTAS DE LATÃO ENTRE PLACAS	m²	77,00	R\$ 10,82	R\$ 833,14		R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00	R\$ -	0,00%	77,00	R\$ 833,14	100,00%
8.6	MUROS															
8.6.1	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022	m²	626,64	R\$ 104,18	R\$ 65.283,35		R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00	R\$ -	0,00%	626,64	R\$ 65.283,35	100,00%
9	BANCADAS				R\$ 10.833,89		R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ 10.833,89	R\$ 10.833,89	100,00%
9.1	GRANITO															
9.1.1	BANCADA DE GRANITO PETRO SÃO MARCOS	m²	6,86	R\$ 1.323,40	R\$ 9.078,52		R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00	R\$ -	0,00%	6,86	R\$ 9.078,52	100,00%
9.1.2	TESTEIRA EM GRANITO PETRO SÃO MARCOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	1,38	R\$ 1.272,01	R\$ 1.755,37		R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00	R\$ -	0,00%	1,38	R\$ 1.755,37	100,00%
10	ESQUADRIAS				R\$ 40.203,23		R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ 40.203,23	R\$ 40.203,23	100,00%
10.1	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO															
10.1.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,78	R\$ 817,35	R\$ 3.089,58		R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00	R\$ -	0,00%	3,78	R\$ 3.089,58	100,00%
10.1.2	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	55,81	R\$ 665,00	R\$ 37.113,65		R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00	R\$ -	0,00%	55,81	R\$ 37.113,65	100,00%
11	LOUÇAS E METAIS				R\$ 3.588,52		R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ 3.588,52	R\$ 3.588,52	100,00%
11.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 179,78	R\$ 719,12		R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00	R\$ -	0,00%	4,00	R\$ 719,12	100,00%
11.2	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍ															

Item	Descrição	Und	CONTRATO			MEDIDO NO PERÍODO			MEDIDO ANTERIOR		MEDIDO ACUMULADO			SALDO A MEDIR		
			Quant.	P. Unit. c/ BDI	Total	Quant.	Valor Total	(%)	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	(%)	Quant.	Valor Total	(%)
12.1.3	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, SEM INTERRUPTOR, COM ELETRODUTO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, (COM LUMINÁRIA - 1,5 E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	33,00	R\$ 165,44	R\$ 5.459,52	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00%	33,00	R\$ 5.459,52 100,00%
12.1.4	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, SEM INTERRUPTOR, COM ELETRODUTO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, (COM LUMINÁRIA - 12W E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	25,00	R\$ 243,02	R\$ 6.075,50	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00%	25,00	R\$ 6.075,50 100,00%
12.1.5	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, SEM INTERRUPTOR, COM ELETRODUTO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, (COM LUMINÁRIA - 18W E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	4,00	R\$ 658,20	R\$ 2.632,80	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00%	4,00	R\$ 2.632,80 100,00%
12.1.6	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, SEM INTERRUPTOR, COM ELETRODUTO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, (COM LUMINÁRIA - 50W E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	3,00	R\$ 2.109,87	R\$ 6.329,61	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00%	3,00	R\$ 6.329,61 100,00%
12.1.7	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, SEM INTERRUPTOR, COM ELETRODUTO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, (COM LUMINÁRIA - 70W E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	8,00	R\$ 422,56	R\$ 3.380,48	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00%	8,00	R\$ 3.380,48 100,00%
12.1.8	QUADRO DE ENERGIA PARA 4 DISJUNTORES	UN	4,00	R\$ 176,74	R\$ 706,96	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00%	4,00	R\$ 706,96 100,00%
12.2	ÁGUA FRIA															
12.2.1	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023	UN	8,00	R\$ 644,84	R\$ 5.158,72	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00%	8,00	R\$ 5.158,72 100,00%
12.2.2	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	4,00	R\$ 149,32	R\$ 597,28	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00%	4,00	R\$ 597,28 100,00%
12.3	SANITÁRIO															
12.3.1	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA COZINHA (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023_PA	UN	8,00	R\$ 157,32	R\$ 1.258,56	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00%	8,00	R\$ 1.258,56 100,00%
12.3.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 97,54	R\$ 390,16	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00%	4,00	R\$ 390,16 100,00%
12.3.3	CAIXA DE GORDURA 65X65X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	1,00	R\$ 276,07	R\$ 276,07	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00%	1,00	R\$ 276,07 100,00%
12.3.4	CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	4,00	R\$ 265,88	R\$ 1.063,52	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00%	4,00	R\$ 1.063,52 100,00%
12.4	PLUVIAL															
12.4.1	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	22,00	R\$ 59,79	R\$ 1.315,38	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00%	22,00	R\$ 1.315,38 100,00%
12.4.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	82,71	R\$ 52,23	R\$ 4.319,94	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00%	82,71	R\$ 4.319,94 100,00%
12.4.3	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	64,84	R\$ 118,45	R\$ 7.680,29	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00%	64,84	R\$ 7.680,29 100,00%
12.4.4	GRELHA METÁLICA EM FERRO FUNDIDO 15 X 50 CM	UN	10,00	R\$ 47,85	R\$ 478,50	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00%	10,00	R\$ 478,50 100,00%
12.4.5	CAIXA DE AREIA 0,6 X 0,6 COM GRELHA	UN	11,00	R\$ 852,21	R\$ 9.374,31	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00%	11,00	R\$ 9.374,31 100,00%
13	OUTROS				R\$ 207.755,51	R\$	-	0,00%	R\$	-		R\$	-	0,00%	R\$ 207.755,51	100,00%
13.1	PAISAGISMO															
13.1.1	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024	UN	1.122,00	R\$ 92,65	R\$ 103.953,30	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00%	1.122,00	R\$ 103.953,30 100,00%
13.1.2	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_07/2024	UN	7,00	R\$ 161,60	R\$ 1.131,20	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00%	7,00	R\$ 1.131,20 100,00%
13.1.3	BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA, 2 DEMÃO	m	38,50	R\$ 233,03	R\$ 8.971,65	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00%	38,50	R\$ 8.971,65 100,00%
13.1.4	JARDINEIRAS REDONDA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO DE ATÉ 1,50 M DE ALTURA	UN	40,00	R\$ 955,26	R\$ 38.210,40	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00%	40,00	R\$ 38.210,40 100,00%
13.1.5	Rocha granítica 1,0m x 1,0m x 1,0m	UN	6,00	R\$ 1.800,59	R\$ 10.803,54	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00%	6,00	R\$ 10.803,54 100,00%
13.1.6	Rocha granítica 0,5m x 0,5m x 0,5m	UN	60,00	R\$ 219,66	R\$ 13.179,60	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00%	60,00	R\$ 13.179,60 100,00%
13.1.7	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	10,78	R\$ 127,04	R\$ 1.369,49	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00%	10,78	R\$ 1.369,49 100,00%
13.2	ACESSÓRIOS															
13.2.1	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	4,00	R\$ 1.437,91	R\$ 5.751,64	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00%	4,00	R\$ 5.751,64 100,00%
13.2.2	OBRA DE ARTE	VB	1,00	R\$ 20.209,06	R\$ 20.209,06	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00%	1,00	R\$ 20.209,06 100,00%
13.3	BRINQUEDOS															
13.3.1	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - GANGORRA DUPLA	UN	1,00	R\$ 1.628,59	R\$ 1.628,59	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00%	1,00	R\$ 1.628,59 100,00%
13.3.2	SUPORTE PARA APOIO DE BICICLETAS, MODELO U INVERTIDO FIXAÇÃO CHUMBADA/PARAFUSADA	UN	4,00	R\$ 636,76	R\$ 2.547,04	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00	R\$	-	0,00%	4,00	R\$ 2.547,04 100,00%
14	MOBILIÁRIO				R\$ 249.566,84	R\$	-	0,00%	R\$	-		R\$	-	0,00%	R\$ 249.566,84	100

Item	Descrição	Und	CONTRATO			MEDIDO NO PERÍODO			MEDIDO ANTERIOR		MEDIDO ACUMULADO			SALDO A MEDIR		
			Quant.	P. Unit. c/ BDI	Total	Quant.	Valor Total	(%)	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	(%)	Quant.	Valor Total	(%)
15.9	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	360,00	R\$ 23,04	R\$ 8.294,40		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	360,00	R\$ 8.294,40	100,00%
15.10	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 03/2024	M	60,00	R\$ 25,57	R\$ 1.534,20		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	60,00	R\$ 1.534,20	100,00%
15.11	PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL W150 X 13KG ASTM A572, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	800,40	R\$ 19,43	R\$ 15.551,77		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	800,40	R\$ 15.551,77	100,00%
15.12	PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL W150 X 22,5 KG ASTM A572, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	1.113,80	R\$ 20,74	R\$ 23.100,21		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	1.113,80	R\$ 23.100,21	100,00%
15.13	ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	20,00	R\$ 34,66	R\$ 693,20		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	20,00	R\$ 693,20	100,00%
TOTAL GERAL:					R\$ 4.585.646,22		R\$ 157.472,00	3,43%		R\$ -		R\$ 157.472,00	3,43%		R\$ 4.428.174,19	96,57%


F DOIS ENGENHARIA LTDA
FABIANO ANDRÉ DA SILVA VERAS
REPRESENTANTE LEGAL/TÉCNICO
CPF nº 025.999.934-23
CREA 2101469308



1.1

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

	LARGURA (M)	COMPRIMENTO (M)	ÁREA (M²)
ÁREA DO TERRENO	43,6	65,8	2868,88
ÁREA COM EDIFICAÇÕES A SEREM DEMOLIDAS	43,6	18	-784,8
ÁREA DE LIMPEZA			2084,08
			2084,08

1.2

TAPUME COM TELHA METÁLICA.

	ALTURA (M)	COMPRIMENTO (M)	ÁREA (M²)
TAPUME RUA MANOEL PEREIRA	2	17,2	34,4
TAPUME FACHADA SUL	2	25	50
			84,4

1.9

LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS	QTD
JANEIRO	1
FEVEREIRO	1
	2

1.10

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER

	QTD
ALMOXARIFADO	1
ESCRITÓRIO	1
BANHEIRO	1
	3

1.11

LOCAÇÃO DE CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS

MÊS	QTD
JANEIRO	1
FEVEREIRO	1
	2

1.12

LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS	QTD
JANEIRO	1
FEVEREIRO	1
	2

1.3

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO (M)
GABARITO LOCAÇÃO PILARES ESTRUTURA METAL	92,39
	92,39

ANEXO 01 - CROQUI LOCAÇÃO DE OBRA

1.4

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

DESCRIÇÃO	QUANT	ALT	COMP	TOTAL (M²)
PLACA DE OBRA	1	2	4	8
				8

2.1

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	M²	M³
6,36	0,4	3,5	22,26	8,904
15,36	0,4	3,5	53,76	21,504
2,14	0,4	3,5	7,49	2,996
1,57	0,4	3,5	5,495	2,198
7,16	0,4	3,5	25,06	10,024
5,19	0,4	3,5	18,165	7,266
15,11	0,4	3,5	52,885	21,154
1,51	0,4	3,5	5,285	2,114
1,51	0,4	3,5	5,285	2,114
6,11	0,4	3,5	21,385	8,554
3,13	0,4	3,5	10,955	4,382
2	0,4	3,5	7	2,8
12,73	0,4	3,5	44,555	17,822
11,25	0,4	3,5	39,375	15,75
4,4	0,4	3,5	15,4	6,16
12,15	0,4	3,5	42,525	17,01
4	0,4	3,5	14	5,6
4	0,4	3,5	14	5,6
5,9	0,4	3,5	20,65	8,26
1,25	0,4	3,5	4,375	1,75
2	0,4	3,5	7	2,8
10,14	0,4	3,5	35,49	14,196
4,1	0,4	3,5	14,35	5,74
0,79	0,4	3,5	2,765	1,106
7,47	0,4	3,5	26,145	10,458
4	0,4	3,5	14	5,6
4,57	0,4	3,5	15,995	6,398
34,69	0,4	3,5	121,415	48,566
10	0,4	3,5	35	14
2,64	0,4	3,5	9,24	3,696
10,53	0,4	3,5	36,855	14,742
3,37	0,4	3,5	11,795	4,718
5,72	0,4	3,5	20,02	8,008
6,86	0,4	3,5	24,01	9,604
5,68	0,4	3,5	19,88	7,952
5,67	0,4	3,5	19,845	7,938
2	0,4	3,5	7	2,8

2	0,4	3,5	7	2,8
2,05	0,4	3,5	7,175	2,87
30,05	0,4	3,5	105,175	42,07
24,02	0,4	3,5	84,07	33,628
6,16	0,4	3,5	21,56	8,624
3,57	0,4	3,5	12,495	4,998
2,57	0,4	3,5	8,995	3,598
8,64	0,4	3,5	30,24	12,096
3,59	0,4	3,5	12,565	5,026
15,6	0,4	3,5	54,6	21,84
4,63	0,4	3,5	16,205	6,482
3,41	0,4	3,5	11,935	4,774
1,62	0,4	3,5	5,67	2,268
6,91	0,4	3,5	24,185	9,674
2,96	0,4	3,5	10,36	4,144
5,23	0,4	3,5	18,305	7,322
36,52	0,4	3,5	127,82	51,128
12,62	0,4	3,5	44,17	17,668
5,85	0,4	3,5	20,475	8,19
12,35	0,4	3,5	43,225	17,29
8,45	0,4	3,5	29,575	11,83

MEDIDO BM 001

618,604
375,78

ANEXO 02 - CROQUI DEMOLIÇÃO

OBS: VERIFICOU-SE QUE AS PAREDES TINHAM 40 CM DE ESPESSURA

2.2 DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DESCRIÇÃO	VOLUME (M³)
TÉRREO	264,54
2º PAVIMENTO	43,99
MARQUISE	2,56
	311,09

OBS: VOLUMES CONFORME LEVANTAMENTO DO PROJETO DE DEMOLIÇÃO

2.3 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DESCRIÇÃO	ÁREA (M²)
COBERTURA EM TELHA CERÂMICA	436,3
COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO	299,5
	735,8

OBS: ÁREAS CONFORME LEVANTAMENTO DO PROJETO DE DEMOLIÇÃO

2.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

DESCRIÇÃO	QTD	VOLUME	COEF RDC MUITO PESADO (T/M³)	TONELADAS	DISTÂNCIA DA OBRA PARA DESTINAÇÃO	TXKM
CAÇAMBAS DE 12M³	134,0	1608,0	1,6	2572,8	11	28300,8
					MEDIDO BM 001	23397

OBS: PLANILHAS DE CONTROLE DE CAÇAMBAS EM ANEXO

OBS: MATERIAL TRANSPORTADO INCLUI ENTULHO DE DEMOLIÇÃO, LIMPEZA DE VEGETAÇÃO E PARTE DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE

3.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M³) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, DMT ATÉ 200M.

DESCRIÇÃO	LARGURA (M)	COMPRIMENTO (M)	ALTURA MÉDIA (M)	VOLUME (M³)
CROQUI DE ESCAVAÇÃO PARA REBAIXAMENTO PARA O PLATÔ DE 1,4M	9	33	3	891,0
				891,0

ANEXO 03 - CROQUI MOVIMENTO DE TERRA

4.1.1.1 MURO - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

DESCRIÇÃO	QUANT	COMP	TOTAL
Muro Tipo 02	1,00	62,25	62,25

4.1.1.2 MURO - ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M³). AF_07/2020

DESCRIÇÃO	QUANT (M)	ALTURA DA BASE	ALTURA DA PAREDE ENTERRADA	ALTURA DA PAREDE+ ALTURA DA BASE +CONCRETO MAGRO	LARGURA DA BASE	LARG. BASE + FOLGA ESCAVACAO	VOLUME (M³)
Muro 02	62,25	0,45	0,75	1,25	3,70	4,10	319,03

4.3.1.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

DESCRIÇÃO	QUANT	ALT	LARG	COMP	FOLGA	TOTAL
B1-P1	1,00	1,20	1,40	1,40	0,30	4,34
B2-P2	1,00	1,20	1,40	1,40	0,30	4,34
B3-P3	1,00	1,20	1,40	1,40	0,30	4,34
B4-P4	1,00	1,20	1,40	1,40	0,30	4,34
B5-P5	1,00	1,20	1,40	1,40	0,30	4,34
B6-P6	1,00	1,20	1,40	1,40	0,30	4,34
B7-P7	1,00	1,20	1,40	1,40	0,30	4,34
B8-P8	1,00	1,20	1,40	1,40	0,30	4,34
						34,68

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 1ª MEDIÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS


PERÍODO: 08/01/2026 a 28/05/2026



LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL




TAPUME COM TELHA METÁLICA.

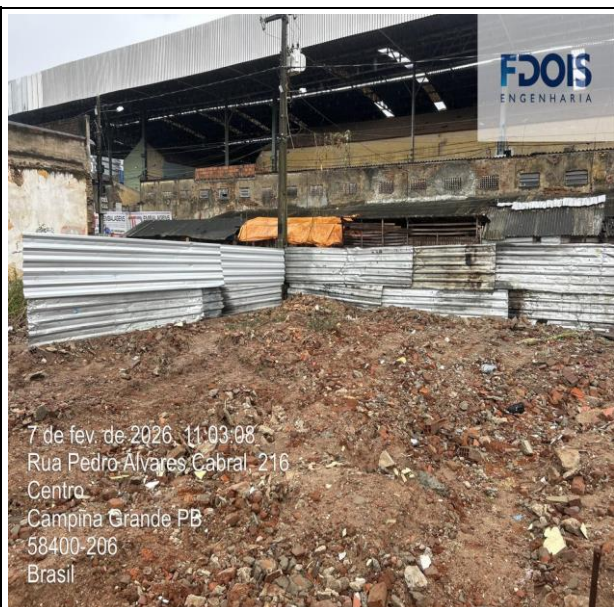

TAPUME COM TELHA METÁLICA.



LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA

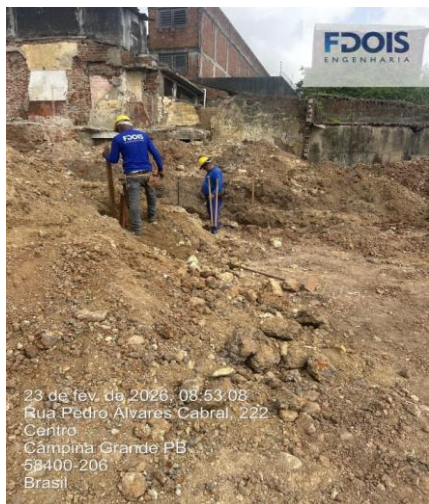

23 de fev. de 2026, 08:53:08
Rua Pedro Álvares Cabral, 222
Centro
Campina Grande PB
58400-206
Brasil

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA



FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA



LOCACAO DE CONTAINER



MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER



LOCAÇÃO DE CONTAINER



LOCACAO DE CONTAINER



DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA



DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA




DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA




DEMOLIÇÃO DE LAJES



REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO

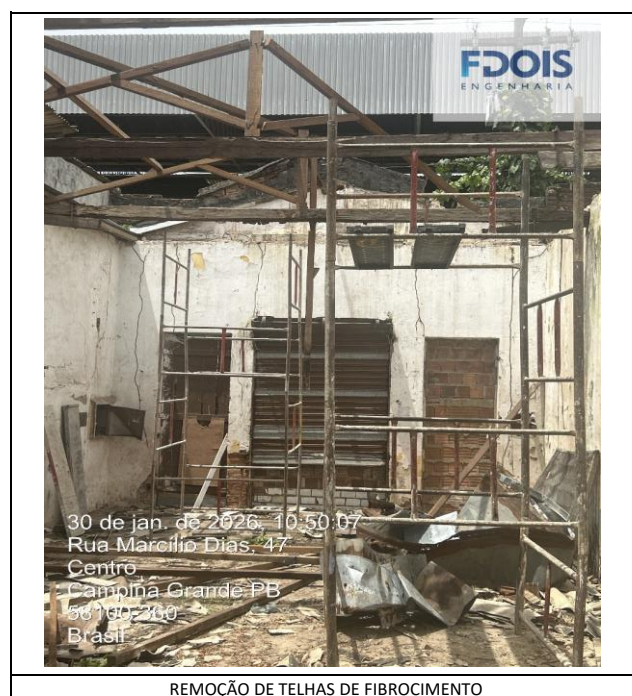


REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO

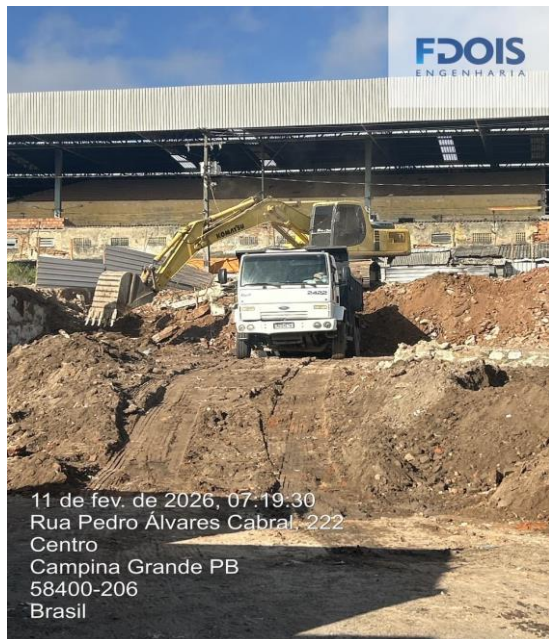

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE




TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE

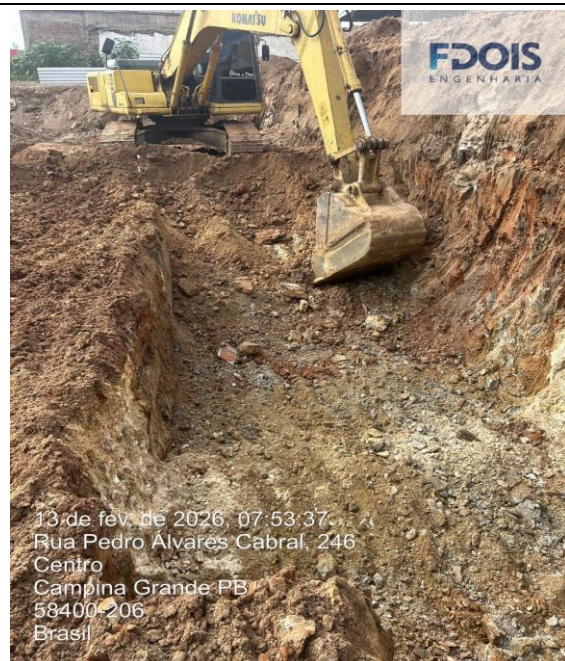

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL



TRANSPORTE COM CAMINHÃO

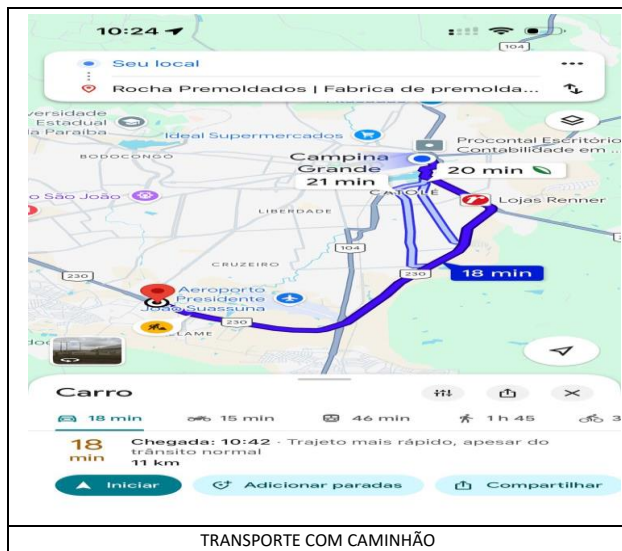


TRANSPORTE COM CAMINHÃO



TRANSPORTE COM CAMINHÃO



LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA

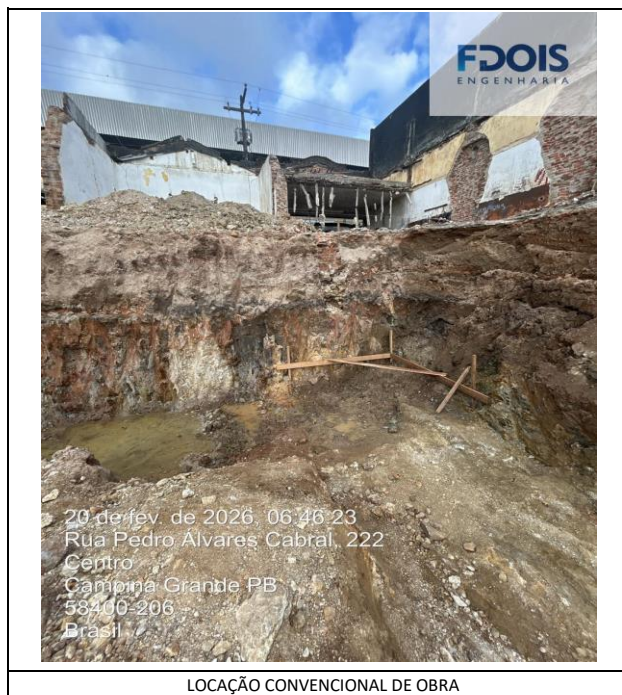

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA



LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA



ESCAVAÇÃO HORIZONTAL



ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO



ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA PARA CONTENÇÃO



ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO



ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO

A handwritten signature in blue ink.

CPF nº 025.999.934-23
CREA 2101469308
RG Nº 1.357.262 – SSP/RN
