

Recife, 05 de Agosto de 2026.

Ofício Nº 008/2026

À Prefeitura Municipal de Campina Grande
SECOB - Secretaria de Obras

A/c Sr. Luiz Gonzaga de Medeiros Júnior – Fiscal de Obra

Ref.: Contrato Nº 2.08.004/2026, decorrente da Concorrência (LPI) Nº 9.08.09/2025

Assunto: Solicitação de Realização da 2ª Medição dos Serviços Executados

Prezado Senhor,

A 2DTech Instalações e Energia LTDA, inscrita no CNPJ Nº 47.031.634/0001-75 empresa responsável pela execução da obra de Reforma e Restauração de Edificação Histórica Pertencente à Prefeitura Municipal de Campina Grande, localizada neste município, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico E Artístico Nacional (IPHAN), vem, respeitosamente, por meio deste, encaminhar a 2ª medição dos serviços executados no período de 01/07/2026 a 31/07/2026, no valor total de R\$ 64.724,07 (sessenta e quatro mil e setecentos e vinte e quatro reais e sete centavos), para fins de conferência, aprovação e prosseguimento dos procedimentos administrativos necessários ao respectivo pagamento.

Na oportunidade, encaminhamos a documentação pertinente para análise e permanecemos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

DANIEL ALMEIDA DA
MOTA:044868594
99

Assinado de forma digital
por DANIEL ALMEIDA DA
MOTA:04486859499
Dados: 2026.08.06
14:08:00 -03'00'

Daniel Almeida da Mota
Responsável Técnico
2DTech Instalações e Energia Ltda
CNPJ: 47.031.634/0001-75

PLANILHA CONTRATUAL									CONTROLE DE MEDIÇÃO							
Orçamento Sintético									Físico				Financeiro			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. Com Bdi	Valor Total	Acum. até o Período Anterior	Medido no Período	Acum. Inclui Período	Saldo	Acum. até o Período Anterior	Medido no Período	Acum. Inclui Período	Saldo
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					510.865,90					-	31.910,41	31.910,41	478.955,49
1.1	4656	ORSE	LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M	mês	6,00	962,26	1.188,77	7.132,62		1,00	1,00	5,00		1.188,77	1.188,77	5.943,85
1.2	4657	ORSE	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40M - REV 02_02/2022	mês	6,00	1.600,00	1.976,64	11.859,84			-	6,00		-	-	11.859,84
1.3	CO 04.10.0050	SCO	ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTURA, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DA PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSÁRIO A SUA UTILIZAÇÃO, EXCLUSIVE: TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME, ATÉ A OBRA (VIDE ITEM AD 15.10.0200), PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO OU SIMILAR (VIDE ITENS CO 05.05.0400 E CO 05.15.0300). MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES (VIDE ITEM CO 05.15.0100).(DESONERADO)	m2.mes	2.400,00	7,70	9,51	22.824,00			-	2.400,00		-	-	22.824,00
1.4	4926	ORSE	PLATAFORMA DE MADEIRA COM TÁBUAS DE PINHO DE 2ª PARA REPAROS EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	m²	30,00	236,44	292,09	8.762,70			-	30,00		-	-	8.762,70
1.5	7307	ORSE	CIMBRAMENTO / ESCORAMENTO TUBULAR DESMONTÁVEL, PARA PONTE OU VIADUTO, EDIFICAÇÃO CIVIL E INDUSTRIAL, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	m³	921,92	67,35	83,20	76.703,74		324,00	324,00	597,92		26.956,80	26.956,80	49.746,94
1.6	02.06.040	CPOS/CDHU	LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA, COM ALTURA APROXIMADA DE 20 M, CAPACIDADE DE CARGA DE 227 KG, DIESEL	unxmês	3,00	24.730,52	30.552,08	91.656,24			-	3,00		-	-	91.656,24
1.7	COMP.003	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	6,00	39.383,58	48.654,46	291.926,76		0,0128965	0,01290	5,99		3.764,84	3.764,84	288.160,92
2			SERVIÇOS INICIAIS					99.511,67					-	-	-	99.511,67
2.1	C4913	SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m²	7.398,61	8,10	10,00	73.986,10			-	7.398,61		-	-	73.986,10
2.2	3806402	SICRO3	LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'ÁGUA SOB PRESSÃO	m²	7.398,61	2,58	3,18	23.527,57			-	7.398,61		-	-	23.527,57
2.3	97649	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	360,00	4,50	5,55	1.998,00			-	360,00		-	-	1.998,00
3			PROTEÇÃO SUPERFICIAL					153.668,81					-	-	-	153.668,81
3.1	CPU.265	Próprio	APLICAÇÃO A SOLUÇÃO REALCALINIZADORA COM PULVERIZADOR COSTAL- 5 DEMÃOS	m²	5.676,72	21,92	27,07	153.668,81			-	5.676,72		-	-	153.668,81
4			RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	96,53				639.013,34					-	-	-	639.013,34
4.1			REPAROS RASOS					209.506,89					-	-	-	209.506,89
4.1.1	11912	ORSE	CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, COM MÁQUINA E DISCO DIAMANTADO - REV 01	m	225,96	13,89	17,15	3.875,21			-	225,96		-	-	3.875,21
4.1.2	7385	ORSE	PREPARO DE SUBSTRATO POR DEMOLIÇÃO COM USO DE MARTELETE PNEUMÁTICO, PARA ESPESSURA DE ATÉ 5,0CM	m²	9,10	194,61	240,42	2.187,82			-	9,10		-	-	2.187,82
4.1.3	106122	SINAPI	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	m³	9,10	72,85	89,99	818,90			-	9,10		-	-	818,90
4.1.4	100716	SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	m²	607,66	24,28	29,99	18.223,72			-	607,66		-	-	18.223,72
4.1.5	C1523	SEINFRA	JATEAMENTO DE AR COMPRIMIDO, P/LIMPEZA DE SUPERFÍCIES	m²	607,66	18,06	22,31	13.556,89			-	607,66		-	-	13.556,89
4.1.6	7948	ORSE	FURO EM CONCRETO COM BROCA DE VÍDEA, UTILIZANDO MARTELE ELÉTRICO (DIÂMETRO: 1/2 " / PROFUNDIDADE: 15 CM)	un	200,00	19,66	24,28	4.856,00			-	200,00		-	-	4.856,00

PLANILHA CONTRATUAL									CONTROLE DE MEDIÇÃO							
Orçamento Sintético									Físico				Financeiro			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. Com Bdi	Valor Total	Acum. até o Período Anterior	Medido no Período	Acum. Inclui Período	Saldo	Acum. até o Período Anterior	Medido no Período	Acum. Inclui Período	Saldo
4.1.7	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	20,00	12,92	15,96	319,20			-	20,00		-	-	319,20
4.1.8	13172	ORSE	APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, FLUIDO, SIKADURS2 OU SIMILAR	Kg	12,00	119,36	147,45	1.769,40			-	12,00		-	-	1.769,40
4.1.9	C3106	SEINFRA	REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO)	KG	637,56	24,68	30,48	19.432,82			-	637,56		-	-	19.432,82
4.1.10	2314	ORSE	PINTURA DE PROTEÇÃO E/OU ACABAMENTO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE PRIMER EPOXI RICO EM ZINCO, E = 35 MICRA - R1	m²	607,66	19,08	23,57	14.322,54			-	607,66		-	-	14.322,54
4.1.11	16.35.021	FDE	PREPARACAO DO SUBSTRATOS POR SATURACAO COM AGUA	m²	607,66	7,43	9,17	5.572,24			-	607,66		-	-	5.572,24
4.1.12	4920	ORSE	PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO BASE ACRÍLICA	m²	607,66	17,07	21,08	12.809,47			-	607,66		-	-	12.809,47
4.1.13	11.090.0600-A	EMOP	RECUPERACAO DE ESTRUTURA,CAVIDADES E ARESTAS EM CONCRETO ARM ADO,COM ARGAMASSA TIXOTROPICA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO COM ESPESSURA ATE 3CM 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	m³	9,10	8.129,59	10.043,29	91.393,93			-	9,10		-	-	91.393,93
4.1.14	3643	ORSE	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM SARRAFEAMENTO MANUAL	m²	607,66	10,61	13,10	7.960,34			-	607,66		-	-	7.960,34
4.1.15	4922	ORSE	CURA ÚMIDA POR ASPERSÃO DE ÁGUA DURANTE 3 DIAS	m²	607,66	16,53	20,42	12.408,41			-	607,66		-	-	12.408,41
4.2			REPAROS SEMI-PROFUNDOS					257.535,71					-	-	-	257.535,71
4.2.1	11912	ORSE	CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, COM MAQUINA E DISCO DIAMANTADO - REV 01	m	135,58	13,89	17,15	2.325,19			-	135,58		-	-	2.325,19
4.2.2	7385	ORSE	PREPARO DE SUBSTRATO POR DEMOLIÇÃO COM USO DE MARTELETE PNEUMÁTICO, PARA ESPESSURA DE ATÉ 5,0CM	m²	7,29	194,61	240,42	1.752,66			-	7,29		-	-	1.752,66
4.2.3	106122	SINAPI	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	m³	7,29	72,85	89,99	656,02			-	7,29		-	-	656,02
4.2.4	100716	SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	m²	364,60	24,28	29,99	10.934,35			-	364,60		-	-	10.934,35
4.2.5	C1523	SEINFRA	JATEAMENTO DE AR COMPRIMIDO, P/LIMPEZA DE SUPERFÍCIES	m²	365,60	18,06	22,31	8.156,53			-	365,60		-	-	8.156,53
4.2.6	7948	ORSE	FURO EM CONCRETO COM BROCA DE VÍDEA, UTILIZANDO MARTELE ELÉTRICO (DIÂMETRO: 1/2 " / PROFUNDIDADE: 15 CM)	un	200,00	19,66	24,28	4.856,00			-	200,00		-	-	4.856,00
4.2.7	13172	ORSE	APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, FLUIDO, SIKADURS2 OU SIMILAR	Kg	12,00	119,36	147,45	1.769,40			-	12,00		-	-	1.769,40
4.2.8	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	20,00	12,92	15,96	319,20			-	20,00		-	-	319,20
4.2.9	C3106	SEINFRA	REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO)	KG	1.148,28	24,68	30,48	34.999,57			-	1.148,28		-	-	34.999,57
4.2.10	2314	ORSE	PINTURA DE PROTEÇÃO E/OU ACABAMENTO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE PRIMER EPOXI RICO EM ZINCO, E = 35 MICRA - R1	m²	364,60	19,08	23,57	8.593,62			-	364,60		-	-	8.593,62
4.2.11	16.35.021	FDE	PREPARACAO DO SUBSTRATOS POR SATURACAO COM AGUA	m²	364,60	7,43	9,17	3.343,38			-	364,60		-	-	3.343,38
4.2.12	4928	ORSE	FORMA PARA RECUPERAÇÃO DE CONCRETO COM CHAPAS PLASTIFICADAS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	m²	364,60	299,25	369,69	134.788,97			-	364,60		-	-	134.788,97

PLANILHA CONTRATUAL									CONTROLE DE MEDIÇÃO							
Orçamento Sintético									Físico				Financeiro			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. Com Bdi	Valor Total	Acum. até o Período Anterior	Medido no Período	Acum. Inclui Período	Saldo	Acum. até o Período Anterior	Medido no Período	Acum. Inclui Período	Saldo
4.2.13	11.015.0019-0	EMOP	GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTENCIA),INCLUSIVE PREPARO,LANCAMENTO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS	m³	7,29	3.644,15	4.501,98	32.819,43			-	7,29		-	-	32.819,43
4.2.14	3643	ORSE	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM SARRAFEAMENTO MANUAL	m²	364,60	10,61	13,10	4.776,26			-	364,60		-	-	4.776,26
4.2.15	4922	ORSE	CURA ÚMIDA POR ASPERSÃO DE ÁGUA DURANTE 3 DIAS	m²	364,60	16,53	20,42	7.445,13			-	364,60		-	-	7.445,13
4.3			REPAROS PROFUNDOS					171.970,74					-	-	-	171.970,74
4.3.1	11912	ORSE	CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, COM MÁQUINA E DISCO DIAMANTADO - REV 01	m	90,38	13,89	17,15	1.550,01			-	90,38		-	-	1.550,01
4.3.2	7385	ORSE	PREPARO DE SUBSTRATO POR DEMOLIÇÃO COM USO DE MARTELETE PNEUMÁTICO, PARA ESPESSURA DE ATÉ 5,0CM	m²	6,07	194,61	240,42	1.459,34			-	6,07		-	-	1.459,34
4.3.3	106122	SINAPI	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	m³	6,07	72,85	89,99	546,23			-	6,07		-	-	546,23
4.3.4	100716	SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	m²	243,07	24,28	29,99	7.289,66			-	243,07		-	-	7.289,66
4.3.5	C1523	SEINFRA	JATEAMENTO DE AR COMPRIMIDO, P/LIMPEZA DE SUPERFÍCIES	m²	243,07	18,06	22,31	5.422,89			-	243,07		-	-	5.422,89
4.3.6	7948	ORSE	FURO EM CONCRETO COM BROCA DE VÍDEA, UTILIZANDO MARTELE ELÉTRICO (DIÂMETRO: 1/2" / PROFUNDIDADE: 15 CM)	un	200,00	19,66	24,28	4.856,00			-	200,00		-	-	4.856,00
4.3.7	13172	ORSE	APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, FLUIDO, SIKADUR52 OU SIMILAR	Kg	12,00	119,36	147,45	1.769,40			-	12,00		-	-	1.769,40
4.3.8	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	20,00	12,92	15,96	319,20			-	20,00		-	-	319,20
4.3.9	C3106	SEINFRA	REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO)	KG	425,04	24,68	30,48	12.955,21			-	425,04		-	-	12.955,21
4.3.10	2314	ORSE	PINTURA DE PROTEÇÃO E/OU ACABAMENTO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE PRIMER EPOXI RICO EM ZINCO, E = 35 MICRA - R1	m²	243,07	19,08	23,57	5.729,15			-	243,07		-	-	5.729,15
4.3.11	16.35.021	FDE	PREPARACAO DO SUBSTRATOS POR SATURACAO COM AGUA	m²	243,07	7,43	9,17	2.228,95			-	243,07		-	-	2.228,95
4.3.12	4928	ORSE	FORMA PARA RECUPERAÇÃO DE CONCRETO COM CHAPAS PLASTIFICADAS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	m²	243,07	299,25	369,69	89.860,54			-	243,07		-	-	89.860,54
4.3.13	4925	ORSE	MICROCONCRETO FLUIDO	m³	6,07	3.978,80	4.915,40	29.836,47			-	6,07		-	-	29.836,47
4.3.14	3643	ORSE	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM SARRAFEAMENTO MANUAL	m²	243,07	10,61	13,10	3.184,21			-	243,07		-	-	3.184,21
4.3.15	4922	ORSE	CURA ÚMIDA POR ASPERSÃO DE ÁGUA DURANTE 3 DIAS	m²	243,07	16,53	20,42	4.963,48			-	243,07		-	-	4.963,48
5			REFORÇO ESTRUTURAL					525.936,70					-	-	-	525.936,70
5.1			REPAROS NAS LAJES E VIGAS					497.107,29					-	-	-	497.107,29
5.1.1	7307	ORSE	CIMBRAMENTO / ESCORAMENTO TUBULAR DESMONTÁVEL, PARA PONTE OU VIADUTO, EDIFICAÇÃO CIVIL E INDUSTRIAL, INCLUSAS MONTAGEM E DESMONTAGEM	m³	506,42	67,35	83,20	42.134,14			-	506,42		-	-	42.134,14
5.1.2	7385	ORSE	PREPARO DE SUBSTRATO POR DEMOLIÇÃO COM USO DE MARTELETE PNEUMÁTICO, PARA ESPESSURA DE ATÉ 5,0CM	m²	60,16	194,61	240,42	14.463,66			-	60,16		-	-	14.463,66

PLANILHA CONTRATUAL									CONTROLE DE MEDIÇÃO							
Orçamento Sintético									Físico				Financeiro			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. Com Bdi	Valor Total	Acum. até o Período Anterior	Medido no Período	Acum. Inclui Período	Saldo	Acum. até o Período Anterior	Medido no Período	Acum. Inclui Período	Saldo
5.1.3	C1524	SEINFRA	JATEAMENTO DE AREIA À SECO EM SUPERFÍCIES	m²	506,54	15,54	19,19	9.720,50			-	506,54		-	-	9.720,50
5.1.4	106122	SINAPI	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	m³	60,16	72,85	89,99	5.413,79			-	60,16		-	-	5.413,79
5.1.5	2314	ORSE	PINTURA DE PROTEÇÃO E/OU ACABAMENTO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE PRIMER EPOXI RICO EM ZINCO, E = 35 MICRA - R1	m²	506,54	19,08	23,57	11.939,14			-	506,54		-	-	11.939,14
5.1.6	16.35.021	FDE	PREPARACAO DO SUBSTRATOS POR SATURACAO COM AGUA	m²	506,54	7,43	9,17	4.644,97			-	506,54		-	-	4.644,97
5.1.7	7949	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANCORAGEM DE BARRA DE 15CM DE AÇO CA-50 Ø 1/2"	un	283,99	8,81	10,88	3.089,81			-	283,99		-	-	3.089,81
5.1.8	11266	ORSE	ARMAÇAO AÇO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. - REV 01	kg	5.011,27	13,23	16,34	81.884,15			-	5.011,27		-	-	81.884,15
5.1.9	7119715	SICRO3	ÂNODO DE SACRIFÍCIO PARA PROTEÇÃO DO CASCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	81,60	1.510,21	1.865,71	152.241,93			-	81,60		-	-	152.241,93
5.1.10	87407	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019	m³	60,16	1.856,14	2.293,07	137.951,09			-	60,16		-	-	137.951,09
5.1.11	3643	ORSE	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM SARRAFEAMENTO MANUAL	m²	506,54	10,61	13,10	6.635,67			-	506,54		-	-	6.635,67
5.1.12	4922	ORSE	CURA ÚMIDA POR ASPERSÃO DE ÁGUA DURANTE 3 DIAS	m²	506,54	16,53	20,42	10.343,54			-	506,54		-	-	10.343,54
5.1.13	C2900	SEINFRA	PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	m²	506,54	26,60	32,86	16.644,90			-	506,54		-	-	16.644,90
5.2			DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE LAJES TRELIÇADAS					28.829,41					-	-	-	28.829,41
5.2.1	97629	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	11,13	69,32	85,63	953,06			-	11,13		-	-	953,06
5.2.2	106122	SINAPI	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	m³	13,91	72,85	89,99	1.251,98			-	13,91		-	-	1.251,98
5.2.3	106122	SINAPI	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	m³	13,91	72,85	89,99	1.251,98			-	13,91		-	-	1.251,98
5.2.4	7823	ORSE	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=16CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=12CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.	m²	92,81	221,29	273,38	25.372,39			-	92,81		-	-	25.372,39
6			PINTURA DE PROTEÇÃO					510.208,13					-	-	-	510.208,13
6.1	C2900	SEINFRA	PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	m²	7.398,61	26,60	32,86	243.118,32			-	7.398,61		-	-	243.118,32
6.2	16.48.003	FDE	APLICACAO MANUAL DE ESTUQUE E PREPARO DE PASTA	m²	7.398,61	20,44	25,25	186.814,90			-	7.398,61		-	-	186.814,90
6.3	7386	ORSE	PREPARO DE SUBSTRATO (SUPERFÍCIE DE CONCRETO) POR LIXAMENTO MANUAL	m²	7.398,61	8,79	10,85	80.274,91			-	7.398,61		-	-	80.274,91

PLANILHA CONTRATUAL									CONTROLE DE MEDIÇÃO							
Orçamento Sintético									Físico				Financeiro			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. Com Bdi	Valor Total	Acum. até o Período Anterior	Medido no Período	Acum. Inclui Período	Saldo	Acum. até o Período Anterior	Medido no Período	Acum. Inclui Período	Saldo
7			LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA					35.136,27					-	-	-	35.136,27
7.1	26	ORSE	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	m³	149,40	18,44	22,78	3.403,33			-	149,40		-	-	3.403,33
7.2	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.107,52	2,39	2,95	9.167,18			-	3.107,52		-	-	9.167,18
7.3	2450	ORSE	LIMPEZA GERAL	m²	7.398,61	2,47	3,05	22.565,76			-	7.398,61		-	-	22.565,76
							Total Geral	2.474.340,82					-	31.910,41	31.910,41	2.442.430,41
									Valor Total							

PLANILHA CONTRATUAL									CONTROLE DE MEDIÇÃO							
Orçamento Sintético									Físico				Financeiro			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. Com Bdi	Valor Total	Acum. até o Período Anterior	Medido no Período	Acum. Inclui Período	Saldo	Acum. até o Período Anterior	Medido no Período	Acum. Inclui Período	Saldo
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					833.286,36					8.526,01	12.967,39	21.493,40	811.792,96
1.1	CP.SAD-08	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	mês	12,00	52.846,69	65.286,80	783.441,60	0,0108828	0,0112499	0,02	11,98	8.526,01	8.813,66	17.339,67	766.104,93
1.2	4654	ORSE	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - REV 02_02/2022	mês	12,00	800,00	988,32	11.859,84	-	1,00	1,00	11,00	-	988,32	988,32	10.871,52
1.3	4657	ORSE	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40M - REV 02_02/2022	mês	12,00	1.600,00	1.976,64	23.719,68	-	1,00	1,00	11,00	-	1.976,64	1.976,64	21.743,04
1.4	4656	ORSE	LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M	mês	12,00	962,26	1.188,77	14.265,24	-	1,00	1,00	11,00	-	1.188,77	1.188,77	13.076,47
2			SERVIÇOS INICIAIS					69.356,39					39.990,46	1.012,80	41.003,26	28.365,13
2.1	018501	SBC	ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR ATE ALTURA 12,0 METROS	mês	12,00	545,80	674,28	8.091,36		1,00	1,00	11,00		674,28	674,28	7.417,08
2.2	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	m	120,00	22,84	28,21	3.385,20		12,00	12,00	108,00	-	338,52	338,52	3.046,68
2.3	97061	SINAPI	COLOCAÇÃO DE TELA FACHADEIRA PERIMETRAL. AF_03/2024	m²	2.662,11	5,44	6,72	17.889,37			-	2.662,11		-	-	17.889,37
2.4	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	284,30	93,38	115,36	32.796,84	284,30		284,30	-	32.796,84	-	32.796,84	-
2.5	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	12,50	465,84	575,49	7.193,62	12,50		12,50	-	7.193,62	-	7.193,62	-
3			DEMOLIÇÕES					30.296,59					-	18.578,17	18.578,17	11.718,42
3.1			PAREDES					4.352,14					-	2.025,97	2.025,97	2.326,17
3.1.1	10963	ORSE	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO E=0,09M SEM REVESTIMENTO	m³	74,84	26,07	32,20	2.409,84		2,60	2,60	72,24	-	83,67	83,67	2.326,17
3.1.2	97638	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	197,59	7,96	9,83	1.942,30		197,59	197,59	-	-	1.942,30	1.942,30	-
3.2			PISOS					538,56					-	176,41	176,41	362,15
3.2.1	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	4,05	93,07	114,97	465,62		0,90	0,90	3,15	-	103,47	103,47	362,15
3.2.2	18	ORSE	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	m²	4,05	14,58	18,01	72,94		4,05	4,05	-	-	72,94	72,94	-

PLANILHA CONTRATUAL									CONTROLE DE MEDIÇÃO							
Orçamento Sintético									Físico				Financeiro			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. Com Bdi	Valor Total	Acum. até o Período Anterior	Medido no Período	Acum. Inclui Período	Saldo	Acum. até o Período Anterior	Medido no Período	Acum. Inclui Período	Saldo
3.3			FORROS					3.177,97					-	197,95	197,95	2.980,02
3.3.1	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	885,23	2,91	3,59	3.177,97		55,14	55,14	830,09	-	197,95	197,95	2.980,02
3.4			COBERTA					8.105,76					-	7.612,78	7.612,78	482,98
3.4.1	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	516,06	7,60	9,38	4.840,64		516,06	516,06	-	-	4.840,64	4.840,64	-
3.4.2	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	516,06	3,52	4,34	2.239,70		516,06	516,06	-	-	2.239,70	2.239,70	-
3.4.3	104803	SINAPI	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	183,44	4,53	5,59	1.025,42		95,25	95,25	88,19	-	532,44	532,44	482,98
3.5			REMOÇÃO DE ENTULHO					14.122,16					-	8.565,06	8.565,06	5.557,10
3.5.1	26	ORSE	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	m³	242,73	18,44	22,78	5.529,38		112,88	112,88	129,85	-	2.571,48	2.571,48	2.957,90
3.5.2	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.912,81	2,39	2,95	8.592,78		2.031,73	2.031,73	881,08	-	5.993,58	5.993,58	2.593,20
4			CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES					459.465,29					-	-	-	459.465,29
4.1			PAREDES					48.748,22					-	-	-	48.748,22
4.1.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	430,22	91,72	113,31	48.748,22			-	430,22	-	-	-	48.748,22
4.2			RAMPA DE ACESSO EXTERNA					21.682,06					-	-	-	21.682,06
4.2.1	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	11,29	93,07	114,97	1.298,01			-	11,29	-	-	-	1.298,01
4.2.2	100350	SINAPI	MURO DE ARRIMO COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL, ATÉ 1,6 M DE ALTURA (EXCETO FUNDAÇÃO). AF_11/2024	m²	11,47	397,32	490,84	5.629,93			-	11,47	-	-	-	5.629,93
4.2.3	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	10,53	125,99	155,64	1.638,88			-	10,53	-	-	-	1.638,88
4.2.4	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	8,27	767,28	947,89	7.839,05			-	8,27	-	-	-	7.839,05
4.2.5	00007156	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m²	107,51	22,18	27,40	2.945,77			-	107,51	-	-	-	2.945,77
4.2.6	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	13,30	141,84	175,22	2.330,42			-	13,30	-	-	-	2.330,42
4.3			FORRO					262.025,20					-	-	-	262.025,20
4.3.1	10626	ORSE	MADEIRAMENTO PARA FORRO DE GESSO EM PLACAS COM PEÇA EM MADEIRA 7,5CM X 10CM	m²	1.770,46	67,16	82,96	146.877,36			-	1.770,46	-	-	-	146.877,36
4.3.2	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	1.770,46	45,93	56,74	100.455,90			-	1.770,46	-	-	-	100.455,90
4.3.3	99054	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS	m²	204,88	58,05	71,71	14.691,94			-	204,88	-	-	-	14.691,94
4.4			COBERTA					109.818,50					-	-	-	109.818,50
4.4.1	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	516,06	91,65	113,22	58.428,31			-	516,06	-	-	-	58.428,31
4.4.2	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	516,06	64,29	79,42	40.985,48			-	516,06	-	-	-	40.985,48
4.4.3	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	183,44	45,92	56,72	10.404,71			-	183,44	-	-	-	10.404,71

PLANILHA CONTRATUAL									CONTROLE DE MEDIÇÃO							
Orçamento Sintético									Físico				Financeiro			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. Com Bdi	Valor Total	Acum. até o Período Anterior	Medido no Período	Acum. Inclui Período	Saldo	Acum. até o Período Anterior	Medido no Período	Acum. Inclui Período	Saldo
4.5			MANUTENÇÃO RESERVATÓRIOS EXISTENTES					14.814,83					-	-	-	14.814,83
4.5.1	12362	ORSE	RESTAURO - REBOCO ESPECIAL DE PAREDE, SPESSURA 3CM, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,24:0,74 (CAL, ARENOSO E AREIA MÉDIA)	m²	137,71	53,56	66,16	9.110,89			-	137,71	-	-	-	9.110,89
4.5.2	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	137,71	33,53	41,42	5.703,94			-	137,71	-	-	-	5.703,94
4.6			MANUTENÇÃO DE PISOS E LAJES EXTERNAS					2.376,48					-	-	-	2.376,48
4.6.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	37,80	1,94	2,39	90,34			-	37,80	-	-	-	90,34
4.6.2	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	m²	37,80	48,96	60,48	2.286,14			-	37,80	-	-	-	2.286,14
5			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					295.892,85					-	-	-	295.892,85
5.1			CABOS					193.764,96					-	-	-	193.764,96
5.1.1	9205	ORSE	CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 10MM² - 0,6KV/1KV/90°	m	279,30	16,49	20,37	5.689,34			-	279,30	-	-	-	5.689,34
5.1.2	7916	ORSE	CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 35MM² - 0,6KV/1KV/90°	m	1,00	45,70	56,45	56,45			-	1,00	-	-	-	56,45
5.1.3	8071	ORSE	CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 70MM² - 0,6KV/1KV/90°	m	3,00	93,23	115,17	345,51			-	3,00	-	-	-	345,51
5.1.4	9204	ORSE	CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 16MM² - 0,6KV/1KV/90°	m	478,76	24,08	29,74	14.238,32			-	478,76	-	-	-	14.238,32
5.1.5	8070	ORSE	CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 25MM² - 0,6KV/1KV/90°	m	219,50	34,44	42,54	9.337,53			-	219,50	-	-	-	9.337,53
5.1.6	7917	ORSE	CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 50MM² - 0,6KV/1KV/90°	m	185,84	63,80	78,81	14.646,05			-	185,84	-	-	-	14.646,05
5.1.7	9003105	SIURB	CABO DE COBRE 6MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV - CLASSE 5 - FLEXÍVEL - ISOLAÇÃO EM EPR 90 C	m	429,55	9,50	11,73	5.038,62			-	429,55	-	-	-	5.038,62
5.1.8	3796	ORSE	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 1,5MM², 450/ 750V / 70°C	m	3.738,90	7,07	8,73	32.640,59			-	3.738,90	-	-	-	32.640,59
5.1.9	3797	ORSE	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 2,5MM², 450/ 750V / 70°C	m	10.375,81	7,99	9,87	102.409,24			-	10.375,81	-	-	-	102.409,24
5.1.10	3798	ORSE	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 4MM², 450/ 750V / 70°C	m	621,66	9,66	11,93	7.416,40			-	621,66	-	-	-	7.416,40
5.1.11	3799	ORSE	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 6MM², 450/ 750V / 70°C	m	137,30	11,48	14,18	1.946,91			-	137,30	-	-	-	1.946,91
5.2			ACESSÓRIOS E ELETRODUTOS					42.072,21					-	-	-	42.072,21
5.2.1	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	232,00	13,48	16,65	3.862,80			-	232,00	-	-	-	3.862,80
5.2.2	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	1,00	14,55	17,97	17,97			-	1,00	-	-	-	17,97
5.2.3	11264	ORSE	CURVA 45° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1")	un	1,00	8,16	10,08	10,08			-	1,00	-	-	-	10,08
5.2.4	91920	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	1,00	20,86	25,77	25,77			-	1,00	-	-	-	25,77
5.2.5	10805	ORSE	CURVA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, DIÂM = 3" - REV.01	un	1,00	64,55	79,74	79,74			-	1,00	-	-	-	79,74
5.2.6	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	28,00	11,86	14,65	410,20			-	28,00	-	-	-	410,20
5.2.7	91882	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	9,00	9,47	11,69	105,21			-	9,00	-	-	-	105,21
5.2.8	91886	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	11,00	13,63	16,83	185,13			-	11,00	-	-	-	185,13
5.2.9	91884	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	15,00	10,49	12,95	194,25			-	15,00	-	-	-	194,25
5.2.10	056207	SBC	LUVA GALVANIZADA DIAM. 2.1/2"	un	3,00	61,48	75,95	227,85			-	3,00	-	-	-	227,85
5.2.11	053637	SBC	LUVA GALVANIZADA 2"	un	1,00	58,10	71,77	71,77			-	1,00	-	-	-	71,77
5.2.12	055192	SBC	LUVA GALVANIZADA 2.1/2"	un	1,00	61,49	75,96	75,96			-	1,00	-	-	-	75,96

PLANILHA CONTRATUAL									CONTROLE DE MEDIÇÃO							
Orçamento Sintético									Físico				Financeiro			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. Com Bdi	Valor Total	Acum. até o Período Anterior	Medido no Período	Acum. Inclui Período	Saldo	Acum. até o Período Anterior	Medido no Período	Acum. Inclui Período	Saldo
5.2.13	91847	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	20,45	13,13	16,22	331,69			-	20,45	-	-	-	331,69
5.2.14	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	2.148,00	12,17	15,03	32.284,44			-	2.148,00	-	-	-	32.284,44
5.2.15	91850	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	11,50	10,73	13,25	152,37			-	11,50	-	-	-	152,37
5.2.16	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	100,47	18,06	22,31	2.241,48			-	100,47	-	-	-	2.241,48
5.2.17	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	32,36	18,63	23,01	744,60			-	32,36	-	-	-	744,60
5.2.18	91869	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	31,16	17,80	21,99	685,20			-	31,16	-	-	-	685,20
5.2.19	93010	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	1,02	38,82	47,95	48,90			-	1,02	-	-	-	48,90
5.2.20	93011	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	1,00	47,57	58,76	58,76			-	1,00	-	-	-	58,76
5.2.21	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	14,83	14,09	17,40	258,04			-	14,83	-	-	-	258,04
5.3			ENTRADA DE ENERGIA					4.109,97					-	-	-	4.109,97
5.3.1	97894	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020	un	2,00	593,93	733,74	1.467,48			-	2,00	-	-	-	1.467,48
5.3.2	4718	ORSE	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300MM	un	1,00	349,76	432,09	432,09			-	1,00	-	-	-	432,09
5.3.3	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	un	1,00	86,68	107,08	107,08			-	1,00	-	-	-	107,08
5.3.4	104750	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	un	1,00	16,34	20,18	20,18			-	1,00	-	-	-	20,18
5.3.5	101548	SINAPI	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	un	5,00	7,24	8,94	44,70			-	5,00	-	-	-	44,70
5.3.6	C5030	SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=8,00M, PESO APROXIMADO 570 KG	un	1,00	1.149,24	1.419,77	1.419,77			-	1,00	-	-	-	1.419,77
5.3.7	3249	ORSE	POSTE AUXILIAR P/ENTRADA ENERGIA, TRIFASICO, EM FERRO GALVANIZADO D=3" E H=6,0M, COMPLETO	un	1,00	500,79	618,67	618,67			-	1,00	-	-	-	618,67
5.4			DISPOSITIVOS E ACAMENTOS					35.236,12					-	-	-	35.236,12
5.4.1	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	6,00	34,56	42,69	256,14			-	6,00	-	-	-	256,14
5.4.2	91961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	2,00	55,56	68,63	137,26			-	2,00	-	-	-	137,26
5.4.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	90,00	28,39	35,07	3.156,30			-	90,00	-	-	-	3.156,30
5.4.4	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	17,00	43,22	53,39	907,63			-	17,00	-	-	-	907,63
5.4.5	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	3,00	58,05	71,71	215,13			-	3,00	-	-	-	215,13
5.4.6	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	315,00	33,51	41,39	13.037,85			-	315,00	-	-	-	13.037,85

PLANILHA CONTRATUAL									CONTROLE DE MEDIÇÃO							
Orçamento Sintético									Físico				Financeiro			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. Com Bdi	Valor Total	Acum. até o Período Anterior	Medido no Período	Acum. Inclui Período	Saldo	Acum. até o Período Anterior	Medido no Período	Acum. Inclui Período	Saldo
5.4.7	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	10,00	48,29	59,65	596,50			-	10,00	-	-	-	596,50
5.4.8	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	2,00	35,53	43,89	87,78			-	2,00	-	-	-	87,78
5.4.9	97595	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	un	8,00	93,30	115,26	922,08			-	8,00	-	-	-	922,08
5.4.10	93667	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	un	7,00	61,76	76,29	534,03			-	7,00	-	-	-	534,03
5.4.11	7832	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),65KA	un	1,00	785,48	970,38	970,38			-	1,00	-	-	-	970,38
5.4.12	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	un	1,00	61,76	76,29	76,29			-	1,00	-	-	-	76,29
5.4.13	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	un	3,00	66,91	82,66	247,98			-	3,00	-	-	-	247,98
5.4.14	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	un	1,00	71,02	87,73	87,73			-	1,00	-	-	-	87,73
5.4.15	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	un	4,00	77,42	95,64	382,56			-	4,00	-	-	-	382,56
5.4.16	106020	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	un	1,00	96,11	118,73	118,73			-	1,00	-	-	-	118,73
5.4.17	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	un	1,00	137,64	170,04	170,04			-	1,00	-	-	-	170,04
5.4.18	8490	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),10KA	un	2,00	539,29	666,23	1.332,46			-	2,00	-	-	-	1.332,46
5.4.19	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	un	65,00	10,33	12,76	829,40			-	65,00	-	-	-	829,40
5.4.20	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	un	30,00	10,33	12,76	382,80			-	30,00	-	-	-	382,80
5.4.21	106029	SINAPI	DISPOSITIVO DPS 60KA-275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	un	20,00	17,01	21,01	420,20			-	20,00	-	-	-	420,20
5.4.22	13149	ORSE	DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA	un	1,00	313,00	386,68	386,68			-	1,00	-	-	-	386,68
5.4.23	93676	SINAPI	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	un	1,00	151,74	187,45	187,45			-	1,00	-	-	-	187,45
5.4.24	97711	SINAPI	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	un	2,00	165,84	204,87	409,74			-	2,00	-	-	-	409,74
5.4.25	9004075	SIURB	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 63A SENSIBILIDADE 30MA - 380V	un	3,00	482,95	596,63	1.789,89			-	3,00	-	-	-	1.789,89
5.4.26	101878	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	un	3,00	392,65	485,07	1.455,21			-	3,00	-	-	-	1.455,21
5.4.27	12227	ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 30 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	un	1,00	742,24	916,96	916,96			-	1,00	-	-	-	916,96
5.4.28	106023	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	un	4,00	949,44	1.172,93	4.691,72			-	4,00	-	-	-	4.691,72
5.4.29	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	un	5,00	85,68	105,84	529,20			-	5,00	-	-	-	529,20
5.5			ILUMINAÇÃO					20.709,59					-	-	-	20.709,59
5.5.1	105555	SINAPI	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM DOIS REFLETORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	un	27,00	7,16	8,84	238,68			-	27,00	-	-	-	238,68
5.5.2	13177	ORSE	LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 40W*, 6500K G- LIGHT OU SIMILAR	un	25,00	359,68	444,34	11.108,50			-	25,00	-	-	-	11.108,50
5.5.3	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	un	207,00	27,24	33,65	6.965,55			-	207,00	-	-	-	6.965,55

PLANILHA CONTRATUAL									CONTROLE DE MEDIÇÃO							
Orçamento Sintético									Físico				Financeiro			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. Com Bdi	Valor Total	Acum. até o Período Anterior	Medido no Período	Acum. Inclui Período	Saldo	Acum. até o Período Anterior	Medido no Período	Acum. Inclui Período	Saldo
5.5.4	100902	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	un	79,00	24,56	30,34	2.396,86			-	79,00	-	-	-	2.396,86
6			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					201.717,46					-	-	-	201.717,46
6.1			INSTALAÇÕES					73.482,47					-	-	-	73.482,47
6.1.1			ALIMENTAÇÃO					5.171,64					-	-	-	5.171,64
6.1.1.1	1021	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" X 1"	un	1,00	33,05	40,82	40,82			-	1,00	-	-	-	40,82
6.1.1.2	13070	ORSE	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO SCHNEIDER BC-92S R 2 1/2" 3CV 220/380V TRIFÁSICO- BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO SCHNEIDER BC-92S R 2 1/2 3CV 127/220V TRIFÁSICO OU SIMILAR	un	1,00	3.386,86	4.184,12	4.184,12			-	1,00	-	-	-	4.184,12
6.1.1.3	89410	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	6,00	10,29	12,71	76,26			-	6,00	-	-	-	76,26
6.1.1.4	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	1,00	8,05	9,94	9,94			-	1,00	-	-	-	9,94
6.1.1.5	89424	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	5,00	5,98	7,38	36,90			-	5,00	-	-	-	36,90
6.1.1.6	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	55,80	11,95	14,76	823,60			-	55,80	-	-	-	823,60
6.1.2			ESGOTO					29.979,37					-	-	-	29.979,37
6.1.2.1	1094	ORSE	CAP DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 25MM	un	46,00	3,59	4,43	203,78			-	46,00	-	-	-	203,78
6.1.2.2	4717	ORSE	CAIXA DE GORDURA EM PVC 300MM	un	1,00	447,67	553,05	553,05			-	1,00	-	-	-	553,05
6.1.2.3	104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	15,00	60,14	74,29	1.114,35			-	15,00	-	-	-	1.114,35
6.1.2.4	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	1,00	87,14	107,65	107,65			-	1,00	-	-	-	107,65
6.1.2.5	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	34,00	11,73	14,49	492,66			-	34,00	-	-	-	492,66
6.1.2.6	3674	ORSE	SIFÃO PARA PIA DE COZINHA EM PVC, ASTRA SC12, 1 1/2" X 50 MM, ACABAMENTO CROMADO OU SIMILAR	un	3,00	57,31	70,80	212,40			-	3,00	-	-	-	212,40
6.1.2.7	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	33,00	9,33	11,52	380,16			-	33,00	-	-	-	380,16
6.1.2.8	1598	ORSE	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 50 X 40MM	un	16,00	9,33	11,52	184,32			-	16,00	-	-	-	184,32
6.1.2.9	1540	ORSE	CURVA 90° CURTA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂM = 100MM	un	22,00	41,11	50,78	1.117,16			-	22,00	-	-	-	1.117,16
6.1.2.10	1600	ORSE	CURVA 90° CURTA PVC SOLDÁVEL P/ ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM	un	34,00	12,51	15,45	525,30			-	34,00	-	-	-	525,30
6.1.2.11	1553	ORSE	JOELHO 45° EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PREDIAL, DIÂM = 100MM	un	21,00	27,63	34,13	716,73			-	21,00	-	-	-	716,73
6.1.2.12	1209	ORSE	JOELHO 45° PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ESGOTO PRIMÁRIO DIÂMENTRO 150MM REV.01 10/2022	un	3,00	85,70	105,87	317,61			-	3,00	-	-	-	317,61
6.1.2.13	1128	ORSE	JOELHO 45° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 40MM	un	19,00	18,88	23,32	443,08			-	19,00	-	-	-	443,08
6.1.2.14	1551	ORSE	JOELHO 45° EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PREDIAL, DIÂM = 50MM	un	18,00	12,12	14,97	269,46			-	18,00	-	-	-	269,46
6.1.2.15	1626	ORSE	JOELHO 45° EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PREDIAL, DIÂM = 75MM	un	1,00	19,72	24,36	24,36			-	1,00	-	-	-	24,36
6.1.2.16	1556	ORSE	JOELHO 90° EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PREDIAL, DIÂM = 100MM	un	7,00	26,84	33,15	232,05			-	7,00	-	-	-	232,05
6.1.2.17	1135	ORSE	JOELHO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25MM	un	1,00	8,91	11,00	11,00			-	1,00	-	-	-	11,00
6.1.2.18	1137	ORSE	JOELHO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 40MM	un	3,00	18,83	23,26	69,78			-	3,00	-	-	-	69,78
6.1.2.19	1138	ORSE	JOELHO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 50MM	un	6,00	18,34	22,65	135,90			-	6,00	-	-	-	135,90
6.1.2.20	1140	ORSE	JOELHO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 75MM	un	75,00	104,05	128,54	9.640,50			-	75,00	-	-	-	9.640,50

PLANILHA CONTRATUAL									CONTROLE DE MEDIÇÃO							
Orçamento Sintético									Físico				Financeiro			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. Com Bdi	Valor Total	Acum. até o Período Anterior	Medido no Período	Acum. Inclui Período	Saldo	Acum. até o Período Anterior	Medido no Período	Acum. Inclui Período	Saldo
6.1.2.21	1672	ORSE	JOELHO DE 90° COM BOLSA PARA ANEL, EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM	un	31,00	16,27	20,09	622,79			-	31,00	-	-	-	622,79
6.1.2.22	1562	ORSE	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM	un	19,00	47,92	59,20	1.124,80			-	19,00	-	-	-	1.124,80
6.1.2.23	1564	ORSE	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 100MM	un	24,00	56,23	69,46	1.667,04			-	24,00	-	-	-	1.667,04
6.1.2.24	7595	ORSE	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 150 X 150MM	un	1,00	226,75	280,12	280,12			-	1,00	-	-	-	280,12
6.1.2.25	1527	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 100 MM	m	107,00	41,07	50,73	5.428,11			-	107,00	-	-	-	5.428,11
6.1.2.26	1528	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 150 MM	m	11,30	70,16	86,67	979,37			-	11,30	-	-	-	979,37
6.1.2.27	1524	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 40 MM	m	35,80	17,33	21,40	766,12			-	35,80	-	-	-	766,12
6.1.2.28	1525	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 50 MM	m	32,00	24,41	30,15	964,80			-	32,00	-	-	-	964,80
6.1.2.29	1526	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 75 MM	m	2,40	37,03	45,74	109,77			-	2,40	-	-	-	109,77
6.1.2.30	89796	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	5,00	41,88	51,73	258,65			-	5,00	-	-	-	258,65
6.1.2.31	104346	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	1,00	43,71	53,99	53,99			-	1,00	-	-	-	53,99
6.1.2.32	1595	ORSE	VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100MM	un	33,00	23,86	29,47	972,51			-	33,00	-	-	-	972,51
6.1.3			PLUVIAL					15.848,72					-	-	-	15.848,72
6.1.3.1	054651	SBC	CAIXA AREIA P/AP60X60X40CM EM BL. CONC/GRELHA ESC/REAT.MANUAL	un	3,00	948,32	1.171,55	3.514,65			-	3,00	-	-	-	3.514,65
6.1.3.2	1597	ORSE	ADAPTADOR PARA VÁLVULA DE PIA E LAVATÓRIO, EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM REV. 01 - 10/2022	un	1,00	5,88	7,26	7,26			-	1,00	-	-	-	7,26
6.1.3.3	1600	ORSE	CURVA 90° CURTA PVC SOLDÁVEL P/ ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM	un	5,00	12,51	15,45	77,25			-	5,00	-	-	-	77,25
6.1.3.4	89591	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	un	2,00	126,43	156,19	312,38			-	2,00	-	-	-	312,38
6.1.3.5	105170	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	un	26,00	5,04	6,22	161,72			-	26,00	-	-	-	161,72
6.1.3.6	105180	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	un	5,00	12,11	14,96	74,80			-	5,00	-	-	-	74,80
6.1.3.7	89529	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	un	1,00	35,59	43,96	43,96			-	1,00	-	-	-	43,96
6.1.3.8	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	5,00	4,89	6,04	30,20			-	5,00	-	-	-	30,20
6.1.3.9	1560	ORSE	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM REV.01 - 10/2022	un	2,00	34,62	42,76	85,52			-	2,00	-	-	-	85,52
6.1.3.10	104171	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	un	1,00	91,61	113,17	113,17			-	1,00	-	-	-	113,17
6.1.3.11	89549	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	un	2,00	18,55	22,91	45,82			-	2,00	-	-	-	45,82

PLANILHA CONTRATUAL									CONTROLE DE MEDIÇÃO							
Orçamento Sintético									Físico				Financeiro			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. Com Bdi	Valor Total	Acum. até o Período Anterior	Medido no Período	Acum. Inclui Período	Saldo	Acum. até o Período Anterior	Medido no Período	Acum. Inclui Período	Saldo
6.1.3.12	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	47,00	66,05	81,59	3.834,73			-	47,00	-	-	-	3.834,73
6.1.3.13	89508	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	361,30	16,25	20,07	7.251,29			-	361,30	-	-	-	7.251,29
6.1.3.14	89509	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	2,00	21,96	27,12	54,24			-	2,00	-	-	-	54,24
6.1.3.15	94692	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	un	2,00	17,63	21,78	43,56			-	2,00	-	-	-	43,56
6.1.3.16	1275	ORSE	JOELHO DE 45º DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 1"	un	7,00	22,92	28,31	198,17			-	7,00	-	-	-	198,17
6.1.4			VENTILAÇÃO					7.751,27					-	-	-	7.751,27
6.1.4.1	89810	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	1,00	28,63	35,36	35,36			-	1,00	-	-	-	35,36
6.1.4.2	89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	1,00	10,30	12,72	12,72			-	1,00	-	-	-	12,72
6.1.4.3	89806	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	11,00	21,07	26,02	286,22			-	11,00	-	-	-	286,22
6.1.4.4	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	12,00	9,59	11,84	142,08			-	12,00	-	-	-	142,08
6.1.4.5	89805	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	17,00	20,12	24,85	422,45			-	17,00	-	-	-	422,45
6.1.4.6	89569	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	un	1,00	89,34	110,37	110,37			-	1,00	-	-	-	110,37
6.1.4.7	89827	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	1,00	19,23	23,75	23,75			-	1,00	-	-	-	23,75
6.1.4.8	89830	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	11,00	37,21	45,96	505,56			-	11,00	-	-	-	505,56
6.1.4.9	1560	ORSE	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MMREV.01 - 10/2022	un	5,00	34,62	42,76	213,80			-	5,00	-	-	-	213,80
6.1.4.10	1655	ORSE	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM	un	2,00	18,60	22,97	45,94			-	2,00	-	-	-	45,94
6.1.4.11	1657	ORSE	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM =100 X 75MM	un	1,00	24,21	29,90	29,90			-	1,00	-	-	-	29,90
6.1.4.12	104356	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	2,00	28,25	34,90	69,80			-	2,00	-	-	-	69,80
6.1.4.13	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	1,00	10,39	12,83	12,83			-	1,00	-	-	-	12,83
6.1.4.14	1527	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 100 MM	m	37,00	41,07	50,73	1.877,01			-	37,00	-	-	-	1.877,01
6.1.4.15	1525	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 50 MM	m	23,00	24,41	30,15	693,45			-	23,00	-	-	-	693,45
6.1.4.16	1526	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 75 MM	m	43,60	37,03	45,74	1.994,26			-	43,60	-	-	-	1.994,26
6.1.4.17	104352	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	2,00	38,34	47,36	94,72			-	2,00	-	-	-	94,72

PLANILHA CONTRATUAL									CONTROLE DE MEDIÇÃO							
Orçamento Sintético									Físico				Financeiro			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. Com Bdi	Valor Total	Acum. até o Período Anterior	Medido no Período	Acum. Inclui Período	Saldo	Acum. até o Período Anterior	Medido no Período	Acum. Inclui Período	Saldo
6.1.4.18	104354	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	16,00	43,92	54,25	868,00			-	16,00	-	-	-	868,00
6.1.4.19	89825	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	11,00	16,95	20,94	230,34			-	11,00	-	-	-	230,34
6.1.4.20	104349	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	1,00	31,77	39,24	39,24			-	1,00	-	-	-	39,24
6.1.4.21	89829	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	1,00	35,19	43,47	43,47			-	1,00	-	-	-	43,47
6.1.5			ÁGUA FRIA					14.731,47					-	-	-	14.731,47
6.1.5.1	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un	12,00	95,05	117,42	1.409,04			-	12,00	-	-	-	1.409,04
6.1.5.2	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un	20,00	100,14	123,71	2.474,20			-	20,00	-	-	-	2.474,20
6.1.5.3	89385	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	12,00	6,74	8,32	99,84			-	12,00	-	-	-	99,84
6.1.5.4	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	52,00	6,12	7,56	393,12			-	52,00	-	-	-	393,12
6.1.5.5	103948	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	7,00	7,25	8,95	62,65			-	7,00	-	-	-	62,65
6.1.5.6	103993	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	1,00	9,03	11,15	11,15			-	1,00	-	-	-	11,15
6.1.5.7	104014	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	1,00	9,98	12,32	12,32			-	1,00	-	-	-	12,32
6.1.5.8	89410	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	76,00	10,29	12,71	965,96			-	76,00	-	-	-	965,96
6.1.5.9	89415	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	1,00	15,29	18,88	18,88			-	1,00	-	-	-	18,88
6.1.5.10	103982	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	3,00	22,55	27,85	83,55			-	3,00	-	-	-	83,55
6.1.5.11	89368	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	1,00	13,92	17,19	17,19			-	1,00	-	-	-	17,19
6.1.5.12	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	8,00	8,84	10,92	87,36			-	8,00	-	-	-	87,36
6.1.5.13	89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	9,00	12,21	15,08	135,72			-	9,00	-	-	-	135,72
6.1.5.14	103980	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	1,00	16,47	20,34	20,34			-	1,00	-	-	-	20,34
6.1.5.15	103956	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	6,00	13,25	16,36	98,16			-	6,00	-	-	-	98,16

PLANILHA CONTRATUAL									CONTROLE DE MEDIÇÃO							
Orçamento Sintético									Físico				Financeiro			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. Com Bdi	Valor Total	Acum. até o Período Anterior	Medido no Período	Acum. Inclui Período	Saldo	Acum. até o Período Anterior	Medido no Período	Acum. Inclui Período	Saldo
6.1.5.16	89532	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	2,00	6,54	8,07	16,14			-	2,00	-	-	-	-
6.1.5.17	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	237,50	11,95	14,76	3.505,50			-	237,50	-	-	-	-
6.1.5.18	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	55,30	18,42	22,75	1.258,07			-	55,30	-	-	-	-
6.1.5.19	103978	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	16,40	25,38	31,35	514,14			-	16,40	-	-	-	-
6.1.5.20	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	93,00	11,12	13,73	1.276,89			-	93,00	-	-	-	-
6.1.5.21	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	7,00	15,78	19,49	136,43			-	7,00	-	-	-	-
6.1.5.22	104011	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	1,00	23,55	29,09	29,09			-	1,00	-	-	-	-
6.1.5.23	89445	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	2,00	17,64	21,79	43,58			-	2,00	-	-	-	-
6.1.5.24	104012	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	3,00	21,83	26,96	80,88			-	3,00	-	-	-	-
6.1.5.25	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	2,00	15,50	19,14	38,28			-	2,00	-	-	-	-
6.1.5.26	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	109,00	12,30	15,19	1.655,71			-	109,00	-	-	-	-
6.1.5.27	89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	12,00	19,38	23,94	287,28			-	12,00	-	-	-	-
6.2			RESERVATÓRIOS					5.697,36					-	-	-	5.697,36
6.2.1	1448	ORSE	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 1.000 LITROS	un	1,00	1.094,10	1.351,65	1.351,65			-	1,00	-	-	-	1.351,65
6.2.2	102617	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	un	1,00	3.517,66	4.345,71	4.345,71			-	1,00	-	-	-	4.345,71
6.3			BANHEIROS					112.594,91					-	-	-	112.594,91
6.3.1	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	41,00	516,71	638,34	26.171,94			-	41,00	-	-	-	26.171,94
6.3.2	8211	ORSE	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 DA DECA OU SIMILAR	un	41,00	411,20	507,99	20.827,59			-	41,00	-	-	-	20.827,59
6.3.3	10345	ORSE	MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM SIFÃO INTEGRADO, ENGATE FLEXÍVEL CROMADO 1/2", REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO DE FIXAÇÃO	un	12,00	640,85	791,70	9.500,40			-	12,00	-	-	-	9.500,40
6.3.4	93396	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	27,00	647,45	799,85	21.595,95			-	27,00	-	-	-	21.595,95
6.3.5	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	2,00	309,93	382,88	765,76			-	2,00	-	-	-	765,76
6.3.6	7350	ORSE	LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO (DECA-IZY, REF L-10117 OU SIMILAR) SEM COLUNA, C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA	un	11,00	647,83	800,32	8.803,52			-	11,00	-	-	-	8.803,52
6.3.7	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	13,00	82,14	101,47	1.319,11			-	13,00	-	-	-	1.319,11

PLANILHA CONTRATUAL									CONTROLE DE MEDIÇÃO							
Orçamento Sintético									Físico				Financeiro			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. Com Bdi	Valor Total	Acum. até o Período Anterior	Medido no Período	Acum. Inclui Período	Saldo	Acum. até o Período Anterior	Medido no Período	Acum. Inclui Período	Saldo
6.3.8	102237	SINAPI	BOX FRONTAL DE CORRER, COM VIDRO TEMPERADO 8 MM, 190X100CM, 1 FOLHA FIXA, 1 FOLHA MÓVEL, PERFIS E FERRAGENS EM ALUMÍNIO. AF_01/2021	m²	3,40	160,53	198,31	674,25			-	3,40	-	-	-	674,25
6.3.9	2022	ORSE	CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO (HERC REF 1980 OU SIMILAR), C/ REGISTRO DE PRESSÃO DE PVC	un	1,00	72,91	90,07	90,07			-	1,00	-	-	-	90,07
6.3.10	102262	SINAPI	PORTA DE CABINE SANITÁRIA EM VIDRO TEMPERADO 8MM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTE, TRINCO E CONTRA-TRINCO. AF_01/2021	un	28,00	660,47	815,94	22.846,32			-	28,00	-	-	-	22.846,32
6.4			COPAS E DML					9.942,72					-	-	-	9.942,72
6.4.1	93441	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	5,00	1.077,86	1.331,58	6.657,90			-	5,00	-	-	-	6.657,90
6.4.2	86875	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	7,00	379,85	469,26	3.284,82			-	7,00	-	-	-	3.284,82
7			CLIMATIZAÇÃO					233.521,82					-	-	-	233.521,82
7.1	103244	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	un	37,00	2.327,49	2.875,38	106.389,06			-	37,00	-	-	-	106.389,06
7.2	103247	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	un	16,00	2.584,67	3.193,10	51.089,60			-	16,00	-	-	-	51.089,60
7.3	103253	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	un	12,00	5.129,46	6.336,93	76.043,16			-	12,00	-	-	-	76.043,16
8			REVESTIMENTOS					690.669,14					-	-	-	690.669,14
8.1			PAREDES					95.730,17					-	-	-	95.730,17
8.1.1	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	708,64	109,35	135,09	95.730,17			-	708,64	-	-	-	95.730,17
8.2			PISO					524.179,30					-	-	-	524.179,30
8.2.1	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	1.625,84	94,36	116,57	189.524,16			-	1.625,84	-	-	-	189.524,16
8.2.2	CP.SAD-07	Próprio	RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM - INCLUSIVE APLICAÇÃO E FORNECIMENTO	m	1.787,31	49,35	60,96	108.954,41			-	1.787,31	-	-	-	108.954,41
8.2.3	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	191,11	85,08	105,10	20.085,66			-	191,11	-	-	-	20.085,66
8.2.4	45	ORSE	APICOAMENTO TOTAL DE PISO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS	m²	3.604,26	5,47	6,75	24.328,75			-	3.604,26	-	-	-	24.328,75
8.2.5	88476	SINAPI	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	452,92	23,71	29,29	13.266,02			-	452,92	-	-	-	13.266,02
8.2.6	14015	ORSE	PISO VINILICO PLACAS 91,4 X 91,4 CM, E=3MM, ACABAMENTO CIMENTO CLARO, FIXADO C/COLA, LINHA INOVA SYDNEY, DURAFLOOR OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DO PISO	m²	452,92	270,00	333,55	151.071,46			-	452,92	-	-	-	151.071,46
8.2.7	10046	ORSE	RODAPÉ VINILICO H=5CM, E=1MM, FIXADO C/ COLA, SOBRE EMBOÇO	m	362,00	37,90	46,82	16.948,84			-	362,00	-	-	-	16.948,84
8.3			DIVISÓRIAS					70.759,67					-	-	-	70.759,67
8.3.1	174	ORSE	DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU MARMORITE POLIDO, E=3CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS	m²	97,18	589,39	728,13	70.759,67			-	97,18	-	-	-	70.759,67
9			PINTURA					244.749,10					-	-	-	244.749,10
9.1			REMOÇÃO					24.594,20					-	-	-	24.594,20
9.1.1	CP.SAD-01	Próprio	LIXAMENTO MECANIZADO DE PAREDES E TETO - (BASE SINAPI 104648 E 104647)	m²	6.472,16	3,08	3,80	24.594,20			-	6.472,16	-	-	-	24.594,20
9.2			NOVAS					220.154,90					-	-	-	220.154,90
9.2.1	104648	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023	m²	4.701,70	13,61	16,81	79.035,57			-	4.701,70	-	-	-	79.035,57

PLANILHA CONTRATUAL									CONTROLE DE MEDIÇÃO							
Orçamento Sintético									Físico				Financeiro			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. Com Bdi	Valor Total	Acum. até o Período Anterior	Medido no Período	Acum. Inclui Período	Saldo	Acum. até o Período Anterior	Medido no Período	Acum. Inclui Período	Saldo
9.2.2	104647	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023	m²	1.770,46	24,07	29,73	52.635,77			-	1.770,46	-	-	-	52.635,77
9.2.3	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	4.701,70	10,45	12,90	60.651,93			-	4.701,70	-	-	-	60.651,93
9.2.4	104640	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1.770,46	12,73	15,72	27.831,63			-	1.770,46	-	-	-	27.831,63
10			ESQUADRIAS					373.327,71						255,30	255,30	373.072,41
10.1			REMOÇÃO					2.128,86					-	255,30	255,30	1.873,56
10.1.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	182,11	9,47	11,69	2.128,86		21,84	21,84	160,27	-	255,30	255,30	1.873,56
10.2			RECUPERAÇÃO					56.522,42					-	-	-	56.522,42
10.2.1			PORTAS					994,63					-	-	-	994,63
10.2.1.1	ED-48516	SETOP	REMOÇÃO MANUAL DE VIDRO EM ESQUADRIAS, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE LIMPEZA DO ENCAIXE, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m²	1,50	7,38	9,11	13,66			-	1,50	-	-	-	13,66
10.2.1.2	99821	SINAPI	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	m²	6,00	2,99	3,69	22,14			-	6,00	-	-	-	22,14
10.2.1.3	CP.SAD-02	Próprio	LIXAMENTO E PINTURA DE ESQUADRIAS DE FERRO	m²	3,00	40,99	50,63	151,89			-	3,00	-	-	-	151,89
10.2.1.4	1859	ORSE	REVISÃO DE ESQUADRIA DE FERRO	m²	3,00	137,21	169,50	508,50			-	3,00	-	-	-	508,50
10.2.1.5	CP.SAD-03	Próprio	REASSENTAMENTO DE VIDRO FANTASIA	m²	1,50	7,82	9,66	14,49			-	1,50	-	-	-	14,49
10.2.1.6	CP.SAD-04	Próprio	ASSENTAMENTO DE VIDRO FANTASIA - INCLUSO VIDRO	m²	1,50	153,23	189,30	283,95			-	1,50	-	-	-	283,95
10.2.2			JANELAS					55.527,79					-	-	-	55.527,79
10.2.2.1	ED-48516	SETOP	REMOÇÃO MANUAL DE VIDRO EM ESQUADRIAS, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE LIMPEZA DO ENCAIXE, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m²	121,64	7,38	9,11	1.108,14			-	121,64	-	-	-	1.108,14
10.2.2.2	99821	SINAPI	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	m²	374,29	2,99	3,69	1.381,13			-	374,29	-	-	-	1.381,13
10.2.2.3	CP.SAD-02	Próprio	LIXAMENTO E PINTURA DE ESQUADRIAS DE FERRO	m²	131,00	40,99	50,63	6.632,53			-	131,00	-	-	-	6.632,53
10.2.2.4	1859	ORSE	REVISÃO DE ESQUADRIA DE FERRO	m²	131,00	137,21	169,50	22.204,50			-	131,00	-	-	-	22.204,50
10.2.2.5	CP.SAD-03	Próprio	REASSENTAMENTO DE VIDRO FANTASIA	m²	121,64	7,82	9,66	1.175,04			-	121,64	-	-	-	1.175,04
10.2.2.6	CP.SAD-04	Próprio	ASSENTAMENTO DE VIDRO FANTASIA - INCLUSO VIDRO	m²	121,64	153,23	189,30	23.026,45			-	121,64	-	-	-	23.026,45
10.3			NOVAS ESQUADRIAS					314.676,43					-	-	-	314.676,43
10.3.1			PORTAS					314.676,43					-	-	-	314.676,43
10.3.1.1	CP.SAD-09	Próprio	P.01 - PORTA DE ROLO METÁLICA, ACIONAMENTO MANUAL OU MOTORIZADO (CONFORME PROJETO), PINTURA ESMALTE SINTÉTICO OU GALVANIZAÇÃO, GUIA LATERAL E EIXO COM MOLAS, FERRAGENS COMPLETAS	un	2,00	2.613,50	3.228,71	6.457,42			-	2,00	-	-	-	6.457,42
10.3.1.2	CP.SAD-10	Próprio	P.02 - PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, DUAS FOLHAS MÓVEIS SOBRE TRILHO SUPERIOR DE ALUMÍNIO, ROLDANAS, PUXADORES E FERRAGENS COMPLETAS.	un	2,00	3.188,30	3.938,82	7.877,64			-	2,00	-	-	-	7.877,64
10.3.1.3	CP.SAD-11	Próprio	P.03 - PORTA EM MADEIRA SEMIOCA 0,60 X 2,10M, COM FOLHA DE ABRIR ARTICULADA POR DOBRADIÇAS METÁLICAS. ACABAMENTO COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO, LISA. BATENTE EM MADEIRA COMPATÍVEL, GUARNIÇÕES E FORRA DIMENSIONADA CONFORME ESPESSURA DA PAREDE, EM AMBOS OS LADOS. FERRAGENS COMPLETAS (FECHADURA E DOBRADIÇAS).	un	17,00	1.097,74	1.356,14	23.054,38			-	17,00	-	-	-	23.054,38
10.3.1.4	CP.SAD-12	Próprio	P.04 - PORTA EM MADEIRA SEMIOCA 0,70 X 2,10M, COM FOLHA DE ABRIR ARTICULADA POR DOBRADIÇAS METÁLICAS. ACABAMENTO COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO, LISA. BATENTE EM MADEIRA COMPATÍVEL, GUARNIÇÕES E FORRA DIMENSIONADA CONFORME ESPESSURA DA PAREDE, EM AMBOS OS LADOS. FERRAGENS COMPLETAS (FECHADURA E DOBRADIÇAS).	un	20,00	1.271,77	1.571,14	31.422,80			-	20,00	-	-	-	31.422,80

PLANILHA CONTRATUAL									CONTROLE DE MEDIÇÃO							
Orçamento Sintético									Físico				Financeiro			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. Com Bdi	Valor Total	Acum. até o Período Anterior	Medido no Período	Acum. Inclui Período	Saldo	Acum. até o Período Anterior	Medido no Período	Acum. Inclui Período	Saldo
10.3.1.5	CP.SAD-13	Próprio	P.05 - PORTA MADEIRA SEMIOCA 0,80 X 2,10M, FOLHA DE ABRIR, DOBRADIÇAS METÁLICAS, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO LISA, BATENTE E GUARNIÇÕES COM FORRA CONFORME ESPESSURA DA PAREDE, FERRAGENS COMPLETAS.	un	48,00	1.524,11	1.882,88	90.378,24			-	48,00	-	-	-	90.378,24
10.3.1.6	CP.SAD-14	Próprio	P.06 - PORTA MADEIRA SEMIOCA 0,90 X 2,10M, FOLHA DE ABRIR, DOBRADIÇAS METÁLICAS, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO LISA, BATENTE E GUARNIÇÕES COM FORRA CONFORME ESPESSURA DA PAREDE, FERRAGENS COMPLETAS.	un	14,00	1.879,88	2.322,40	32.513,60			-	14,00	-	-	-	32.513,60
10.3.1.7	CP.SAD-15	Próprio	P.07 - PORTA MADEIRA SEMIOCA 1,00 X 2,10M, FOLHA DE ABRIR, DOBRADIÇAS METÁLICAS, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO LISA, BATENTE E GUARNIÇÕES COM FORRA CONFORME ESPESSURA DA PAREDE, FERRAGENS COMPLETAS.	un	1,00	1.025,04	1.266,33	1.266,33			-	1,00	-	-	-	1.266,33
10.3.1.8	CP.SAD-16	Próprio	P.08 - PORTA COM ESQUADRIA MINIMALISTA DE ALUMÍNIO E VIDRO, 1 FOLHA	un	4,00	1.095,15	1.352,94	5.411,76			-	4,00	-	-	-	5.411,76
10.3.1.9	CP.SAD-17	Próprio	P.09 - PORTA DE FERRO COM VIDRO 1,60 X 2,95M, FOLHA DE ABRIR, DOBRADIÇA METÁLICA, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO.	un	18,00	3.674,80	4.539,84	81.717,12			-	18,00	-	-	-	81.717,12
10.3.1.10	CP.SAD-18	Próprio	PORTA DE FERRO COM VIDRO 2,50 X 2,95M, FOLHA DE ABRIR, DOBRADIÇA METÁLICA, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	un	2,00	5.534,87	6.837,77	13.675,54			-	2,00	-	-	-	13.675,54
10.3.1.11	CP.SAD-19	Próprio	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	un	9,00	1.879,88	2.322,40	20.901,60			-	9,00	-	-	-	20.901,60
11			ACESSIBILIDADE					54.568,55					-	-	-	54.568,55
11.1	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	52,00	194,64	240,45	12.503,40			-	52,00	-	-	-	12.503,40
11.2	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	40,53	141,84	175,22	7.101,66			-	40,53	-	-	-	7.101,66
11.3	105005	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	m²	2,35	189,89	234,59	551,28			-	2,35	-	-	-	551,28
11.4	99860	SINAPI	CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019	M	66,00	163,87	202,44	13.361,04			-	66,00	-	-	-	13.361,04
11.5	200626	SBC	SINALIZAÇÃO EM FITA ANTIDERRAPANTE PRETA PARA DEGRAUS 20X3CM	un	176,00	7,99	9,87	1.737,12			-	176,00	-	-	-	1.737,12
11.6	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	18,00	327,06	404,04	7.272,72			-	18,00	-	-	-	7.272,72
11.7	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	31,00	314,42	388,43	12.041,33			-	31,00	-	-	-	12.041,33
12			COMBATE A INCÊNDIO					36.742,92					-	-	-	36.742,92
12.1			EQUIPAMENTOS					34.248,85					-	-	-	34.248,85
12.1.1	11829	ORSE	ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) "APERTE AQUI", P/INSTAL. INCENDIO - ENDEREÇÁVEL	un	4,00	179,98	222,34	889,36			-	4,00	-	-	-	889,36
12.1.2	1505	ORSE	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 4 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 4,5M, TEMPO DE DESCARGA 11S, NBR9443, 9444, 10721	un	12,00	198,95	245,78	2.949,36			-	12,00	-	-	-	2.949,36
12.1.3	101906	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	un	1,00	853,79	1.054,77	1.054,77			-	1,00	-	-	-	1.054,77
12.1.4	7860	ORSE	LUMINÁRIA AUTÔNOMA DE EMERGENCIA COM LÂMPADA HALÓGENA H3/12V, REF. LUX 110, DA LUXTRON OU SIMILAR - REV.01	un	31,00	302,48	373,68	11.584,08			-	31,00	-	-	-	11.584,08
12.1.5	10446	ORSE	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO - FORNECIMENTO	un	4,00	332,75	411,07	1.644,28			-	4,00	-	-	-	1.644,28
12.1.6	055002	SBC	HIDRANTE-ABRIGO DE INCENDIO DE EMBUTIR 90X120X30CM COMPLETO	un	4,00	3.263,52	4.031,75	16.127,00			-	4,00	-	-	-	16.127,00

PLANILHA CONTRATUAL									CONTROLE DE MEDIÇÃO							
Orçamento Sintético									Físico				Financeiro			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. Com Bdi	Valor Total	Acum. até o Período Anterior	Medido no Período	Acum. Inclui Período	Saldo	Acum. até o Período Anterior	Medido no Período	Acum. Inclui Período	Saldo
12.2			SINALIZAÇÃO					2.494,07					-	-	-	2.494,07
12.2.1	12887	ORSE	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM LOGOTIPO "COMANDO MANUAL DE ALARME DE INCENDIO"- PLACA E2	un	4,00	23,83	29,43	117,72			-	4,00	-	-	-	117,72
12.2.2	12888	ORSE	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL"- PLACA E5	un	13,00	16,69	20,61	267,93			-	13,00	-	-	-	267,93
12.2.3	12885	ORSE	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 30X30 CM, EM PVC , COM LOGOTIPO "ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE"- PLACA E7	un	4,00	21,39	26,42	105,68			-	4,00	-	-	-	105,68
12.2.4	11853	ORSE	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	un	87,00	18,64	23,02	2.002,74			-	87,00	-	-	-	2.002,74
13			FACHADA					144.761,50					-	-	-	144.761,50
13.1			PINTURA					144.761,50					-	-	-	144.761,50
13.1.1	CP.SAD-01	Próprio	LIXAMENTO MECANIZADO DE PAREDES E TETO - (BASE SINAPI 104648 E 104647)	m²	2.045,81	3,08	3,80	7.774,07			-	2.045,81	-	-	-	7.774,07
13.1.2	96133	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_ 03/2024	m²	2.045,81	41,56	51,34	105.031,88			-	2.045,81	-	-	-	105.031,88
13.1.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	m²	2.045,81	12,65	15,62	31.955,55			-	2.045,81	-	-	-	31.955,55
14			SERVIÇOS FINAIS					6.303,50			-	-	-	-	-	6.303,50
14.1	2450	ORSE	LIMPEZA GERAL	m²	1.816,95	2,47	3,05	5.541,69			-	1.816,95	-	-	-	5.541,69
14.2	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_ 04/2019	m²	318,75	1,94	2,39	761,81			-	318,75	-	-	-	761,81
								Valor Final do Orçamento					48.516,47	32.813,66	81.330,13	3.593.325,05
								3.674.659,18					Valor Total			

RESUMO DE MEDIÇÕES		Valor
MEDIDO NO PERÍODO (FASE 01)		R\$ 31.910,41
MEDIDO NO PERÍODO (FASE 02)		R\$ 32.813,66
VALOR TOTAL MEDIDO		R\$ 64.724,07

Assinado por 4 pessoas: LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS JUNIOR, R
BELO DE FRANCA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/91BB-E722-267B-15BB> e informe o código 91BB-E722-267B-15BB



Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E RESTAURAÇÃO DE EDIFICAÇÃO HISTÓRICA PERTENCENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, TOMBADA PELO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL (IPHAN).

Período da Medição: 01/07/2026 à 31/07/2026[illegible]

DANIEL ALMEIDA
DA
MOTA:04486859499

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E RESTAURAÇÃO DE EDIFICAÇÃO HISTÓRICA PERTENCENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, TOMBADA PELO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL (IPHAN).

Período da Medição: 01/07/2026 à 31/07/2026

MEMÓRIA DE CÁLCULO														
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	Local	Und	Quant.	Comp.	Largura	Altura	Área	Espessura	Empolamento	Volume	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	CP.SAD-08	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA											0,0112499
			Período Acumulado 16/06/2026 à 31/07/2026											
			Serviços executados acumulado (R\$)			63.990,46								
			Valor da obra sem administração (R\$)			2.891.217,58								
			% de Administração Acumulado (R\$ 63.990,46/ R\$ 2.891.217,58)		%	0,02213270								
			Medido BM 01			0,0108828								
			Valor a medir neste BM			0,0112499								0,0112499
1.2	4654	ORSE	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - REV 02_02/2022		mês	1,00								1,00
					mês	1,00								1,00
										QUANTIDADE CONTRATADA		=	12,00	mês
										QUANTIDADE EXECUTADA		=	1,00	mês
										QUANTIDADE MEDIDA		=	1,00	mês
										SALDO		=	11,00	mês
1.3	4657	ORSE	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40M - REV 02_02/2022		mês	1,00								1,00
										QUANTIDADE CONTRATADA		=	12,00	mês
										QUANTIDADE EXECUTADA		=	1,00	mês
										QUANTIDADE MEDIDA		=	1,00	mês
										SALDO		=	11,00	mês
1.4	4656	ORSE	LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M		mês	1,00								1,00
										QUANTIDADE CONTRATADA		=	12,00	mês
										QUANTIDADE EXECUTADA		=	1,00	mês
										QUANTIDADE MEDIDA		=	1,00	mês
										SALDO		=	11,00	mês
2			SERVIÇOS INICIAIS											
2.1	018501	SBC	ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR ATE ALTURA 12,0 METROS		mês	1,00								1,00
										QUANTIDADE CONTRATADA		=	12,00	mês
										QUANTIDADE EXECUTADA		=	1,00	mês
										QUANTIDADE MEDIDA		=	1,00	mês
										SALDO		=	11,00	mês
2.2	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024		m	3,00			4,00					12,00
										QUANTIDADE CONTRATADA		=	120,00	m

DANIEL ALMEIDA
DA
MOTA:04486859499

Assinado de forma digital
por DANIEL ALMEIDA DA
MOTA:04486859499
Dados: 2026.08.06 14:06:59
-03'00'



Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E RESTAURAÇÃO DE EDIFICAÇÃO HISTÓRICA PERTENCENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, TOMBADA PELO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL (IPHAN).

Período da Medição: 01/07/2026 à 31/07/2026

MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	Local	Und	Quant.	Comp.	Largura	Altura	Área	Espessura	Empolamento	Total
										QUANTIDADE EXECUTADA	=	1,00	m
										QUANTIDADE MEDIDA	=	12,00	m
										SALDO	=	108,00	m
2.4	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024										284,30
			Perímetro executado entorno do prédio				136,93		2,00				273,85
			Fechamento dos vãos do elevador 01			5,00	1,10		1,10				6,05
			Fechamento dos vãos do elevador 02			4,00	1,00		1,10				4,40
										QUANTIDADE CONTRATADA	=	284,30	M²
										QUANTIDADE EXECUTADA	=	284,30	M²
										QUANTIDADE MEDIDA	=	284,30	M²
										SALDO	=	0,00	M²
2.5	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS										12,50
			Placa Fonplata				4,00	3,00					12,00
			Placa CREA				1,00	0,50					0,50
										QUANTIDADE CONTRATADA	=	12,50	M²
										QUANTIDADE EXECUTADA	=	12,50	M²
										QUANTIDADE MEDIDA	=	12,50	M²
										SALDO	=	0,00	M²
3			DEMOLIÇÕES										
3.1			PAREDES										
3.1.1	10963	ORSE	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO E=0,09M SEM REVESTIMENTO										2,60
			SUBSOLO	WC 03	m³		1,45		3,40		0,15		0,74
			TÉRREO	EXPOSIÇÃO 01	m³		0,98		3,80		0,15		0,56
			1º PAVIMENTO	SALA ADMINISTRATIVA 07	m³		2,55		3,40		0,15		1,30
										QUANTIDADE CONTRATADA	=	74,84	M³
										QUANTIDADE EXECUTADA	=	2,60	M³
										QUANTIDADE MEDIDA	=	2,60	M³
										SALDO	=	72,24	M³
3.1.2	97638	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023										197,59
			TÉRREO	WC MASCULINO	m²		9,43		3,00				28,29
				DML	m²		1,1		3,00				3,30
				WC FEMININO	m²		4,66		3,00				13,98
				EXPOSIÇÃO 01	m²		22,21		3,00				66,63
				EXPOSIÇÃO 02	m²		10,77		3,00				32,31
			1º PAVIMENTO	SALA DO PREFEITO	m²		9,187		3,00				27,56
				SALA ADMINISTRATIVA 08	m²		2,55		3,00				7,65
				WC FEMININO	m²		2,32		3,00				6,96
				SALA ADMINISTRATIVA 07	m²		1,56		2,62				4,09
				SALA ADMINISTRATIVA 06	m²		1,56		2,62				4,09
				SALA DE T.I.	m²		1,56		1,75				2,73
										QUANTIDADE CONTRATADA	=	197,59	M²
										QUANTIDADE EXECUTADA	=	197,59	M²

DANIEL ALMEIDA
DA
MOTA:04486859499

Assinado de forma digital por
DANIEL ALMEIDA DA
MOTA:04486859499
Dados: 2026.08.06 14:07:09 -03'00'



MEMÓRIA DE CÁLCULO														
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	Local	Und	Quant.	Comp.	Largura	Altura	Área	Espessura	Empolamento	Volume	Total
										QUANTIDADE MEDIDA		=	197,59	M²
										SALDO		=	0,00	M²
3.2			PISOS											
3.2.1	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023											0,90
			1º PAVIMENTO	WC PREFEITO						1,54	0,10			0,15
				LAVABO						1,54	0,10			0,15
				APOIO						5,92	0,10			0,59
										QUANTIDADE CONTRATADA		=	4,05	M³
										QUANTIDADE EXECUTADA		=	0,90	M³
										QUANTIDADE MEDIDA		=	0,90	M³
										SALDO		=	3,15	M³
3.2.2	18	ORSE	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO											9,00
			1º PAVIMENTO	WC PREFEITO						1,54				1,54
				LAVABO						1,54				1,54
				APOIO						5,92				5,92
										QUANTIDADE CONTRATADA		=	4,05	M³
										QUANTIDADE EXECUTADA		=	9,00	M³
										QUANTIDADE MEDIDA		=	4,05	M³
										SALDO		=	-4,95	M³
3.3			FORROS											
3.3.1	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023											55,14
			SUBSOLO	ATENDIMENTO 01	m²					27,45				27,45
				APOIO / COPA	m²					14,55				14,55
			TÉRREO	LOJA DO MUSEU	m²		4,41	2,98						13,14
										QUANTIDADE CONTRATADA		=	885,23	M³
										QUANTIDADE EXECUTADA		=	55,14	M³
										QUANTIDADE MEDIDA		=	55,14	M³
										SALDO		=	830,09	M³
3.4			COBERTA											
3.4.1	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023											580,62
			COBERTURA (TÉRREO)		m²					115,76				115,76
			COBERTURA (2º PAVIMENTO)		m²					23,51				23,51
			COBERTURA (3º PAVIMENTO)		m²					106,2				106,20
			COBERTURA (COBERTA)		m²					335,15				335,15
										QUANTIDADE CONTRATADA		=	516,06	M³
										QUANTIDADE EXECUTADA		=	580,62	M³
										QUANTIDADE MEDIDA		=	516,06	M³
										SALDO		=	-64,56	M³

DANIEL ALMEIDA DA
MOTA:04486859499
99

Assinado de forma digital por DANIEL ALMEIDA DA MOTA:04486859499
Dados: 2026.08.06 14:07:18 -03'00'



Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E RESTAURAÇÃO DE EDIFICAÇÃO HISTÓRICA PERTENCENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, TOMBADA PELO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL (IPHAN).

Período da Medição: 01/07/2026 à 31/07/2026

MEMÓRIA DE CÁLCULO															
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	Local	Und	Quant.	Comp.	Largura	Altura	Área	Espessura	Empolamento	Volume	Total	
3.4.2	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023											580,62	
			COBERTURA (TÉRREO)		m²					115,76				115,76	
			COBERTURA (2º PAVIMENTO)		m²					23,51				23,51	
			COBERTURA (3º PAVIMENTO)		m²					106,2				106,20	
			COBERTURA (COBERTA)		m²					335,15				335,15	
			Saldo a medir - (Excedente)		m²	64,56									
										QUANTIDADE CONTRATADA		=	516,06	M²	
										QUANTIDADE EXECUTADA		=	580,62	M²	
										QUANTIDADE MEDIDA		=	516,06	M²	
										SALDO		=	-64,56	M²	
3.4.3	104803	SINAPI	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023											95,25	
			DEMOLIÇÃO DE RUFOS (1º PAVIMENTO)		m		30,62							30,62	
			DEMOLIÇÃO DE RUFOS (3º PAVIMENTO)		m		13,34							13,34	
			DEMOLIÇÃO DE RUFOS (COBERTA)		m		51,29							51,29	
										QUANTIDADE CONTRATADA		=	183,44	M	
										QUANTIDADE EXECUTADA		=	95,25	M	
										QUANTIDADE MEDIDA		=	95,25	M	
										SALDO		=	88,19	M	
3.5			REMOÇÃO DE ENTULHO												
3.5.1	26	ORSE	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO											112,88	
			SUBSOLO - ALVENARIA	WC 03	m³		1,65		3,40		0,15	1,30		1,09	
			TÉRREO - ALVENARIA	EXPOSIÇÃO 01	m³		1,40		3,80		0,15	1,30		1,04	
			1º PAVIMENTO - ALVENARIA	SALA ADMINISTRATIVA 07	m³		2,55		3,40		0,15	1,30		1,69	
			TÉRREO - GESSO	WC MASCULINO	m³		10,67		3,00		0,10	1,30		4,16	
				DML	m³		1,15		3,00		0,10	1,30		0,45	
				WC FEMININO	m³		4,99		3,00		0,10	1,30		1,95	
				EXPOSIÇÃO 01	m³		22,21		3,00		0,10	1,30		8,66	
				EXPOSIÇÃO 02	m³		10,75		3,00		0,10	1,30		4,19	
			1º PAVIMENTO - GESSO	SALA DO PREFEITO	m³		9,76		3,00		0,10	1,30		3,81	
				SALA ADMINISTRATIVA 08	m³		2,75		3,00		0,10	1,30		1,07	
				WC FEMININO	m³		3,31		3,00		0,10	1,30		1,29	
			COBERTA - (TELHAS)	COBERTURA (TÉRREO)	m³					115,76	0,10	1,30		15,05	
				COBERTURA (2º PAVIMENTO)	m³						23,51	0,10	1,30		3,06
				COBERTURA (3º PAVIMENTO)	m³						106,20	0,10	1,30		13,81
				COBERTURA (COBERTA)	m³						335,15	0,10	1,30		43,57
			DEMOLIÇÃO DE RUFOS	DEMOLIÇÃO DE RUFOS (1º PAVIMENTO)	m³		30,62	0,15			0,05	1,30		0,23	
				DEMOLIÇÃO DE RUFOS (3º PAVIMENTO)	m³		13,34	0,20				0,05	1,30		0,13
				DEMOLIÇÃO DE RUFOS (COBERTA)	m³		51,29	0,15				0,05	1,30		0,38
			SUBSOLO (FORRO)	ATENDIMENTO 01	m³					27,75	0,10	1,30		3,61	
				APOIO / COPA	m³						14,9	0,10	1,30		1,94
			TÉRREO (FORRO)	LOJA DO MUSEU	m³		4,41	2,98			0,10	1,30		1,71	
										QUANTIDADE CONTRATADA		=	242,73	M³	
										QUANTIDADE EXECUTADA		=	112,88	M³	
										QUANTIDADE MEDIDA		=	106,53	M³	
										SALDO		=	129,85	M³	

DANIEL ALMEIDA
DA
MOTA:0448685949
9

Assinado de forma digital
por DANIEL ALMEIDA DA
MOTA:04486859499
Dados: 2026.08.06
14:07:27 -03'00'



Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E RESTAURAÇÃO DE EDIFICAÇÃO HISTÓRICA PERTENCENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, TOMBADA PELO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL (IPHAN).

Período da Medição: 01/07/2026 à 31/07/2026

MEMÓRIA DE CÁLCULO														
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	Local	Und	Quant.	Comp.	Largura	Altura	Área	Espessura	Empolamento	Volume	Total
3.5.2	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020											2.031,90
			DMT UTILIZADO - 30 KM (REFERENTE ÀS CAÇAMBAS ESTACIONARIAS)		M3XKM	18,00							112,88	2.031,90
										QUANTIDADE CONTRATADA		=	2.912,81	M3XKM
										QUANTIDADE EXECUTADA		=	2.031,66	M3XKM
										QUANTIDADE MEDIDA		=	2.031,66	M3XKM
										SALDO		=	881,15	M3XKM
10			ESQUADRIAS											
10.1			REMOÇÃO											
10.1.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023											21,84
			TÉRREO			8,00		0,80	2,10					13,44
			1º PAVIMENTO			5,00		0,80	2,10					8,40
										QUANTIDADE CONTRATADA		=	182,11	M²
										QUANTIDADE EXECUTADA		=	21,84	M²
										QUANTIDADE MEDIDA		=	21,84	M²
										SALDO		=	160,27	M²

DANIEL ALMEIDA
DA
MOTA:0448685949
9

Assinado de forma digital
por DANIEL ALMEIDA DA
MOTA:04486859499
Dados: 2026.08.06
14:07:37 -03'00'



Prefeitura Municipal de Campina Grande			
OBRA:	Fase 1 e fase 2 - SAD - Reforma e Recuperação	CONTRATO:	Nº 2.08.004/2026
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E RESTAURAÇÃO DE EDIFICAÇÃO HISTÓRICA PERTENCENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, TOMBADA PELO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL (IPHAN).		
PERÍODO:	01/07/2026 à 31/07/2026		DATA: 04/08/2026



ITEM 1.1 (FASE 01) -LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M -



ITEM 1.5 (FASE 01) -CIMBRAMENTO / ESCORAMENTO TUBULAR DESMONTÁVEL, PARA PONTE OU VIADUTO, EDIFICAÇÃO CIVIL E INDUSTRIAL, INCLUSAS MONTAGEM E DESMONTAGEM



ITEM 2.3 (FASE 01) -REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM RREAPROVEITAMENTO. AF_09/2023




ITEM 1.2 (FASE 02) -LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - REV 02_02/2022

Prefeitura Municipal de Campina Grande			
OBRA:	Fase 1 e fase 2 - SAD - Reforma e Recuperação	CONTRATO:	Nº 2.08.004/2026
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E RESTAURAÇÃO DE EDIFICAÇÃO HISTÓRICA PERTENCENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, TOMBADA PELO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL (IPHAN).		
PERÍODO:	01/07/2026 à 31/07/2026		DATA: 04/08/2026



ITEM 1.3 (FASE 02) -LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40M - REV 02_02/2022

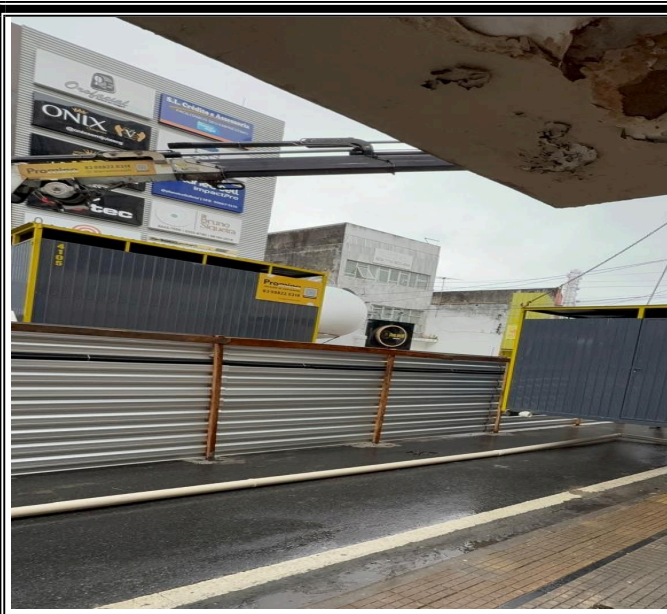

ITEM 1.4 (FASE 02) -LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M



ITEM 2.2 (FASE 02) -MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE"



ITEM 3.1.1 (FASE 02) DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO


DANIEL
ALMEIDA DA
MOTA:04486859
499

Assinado de forma
digital por DANIEL
ALMEIDA DA
MOTA:04486859499
Dados: 2026.08.06
14:00:46 -03'00'

Prefeitura Municipal de Campina Grande			
OBRA:	Fase 1 e fase 2 - SAD - Reforma e Recuperação	CONTRATO:	Nº 2.08.004/2026
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E RESTAURAÇÃO DE EDIFICAÇÃO HISTÓRICA PERTENCENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, TOMBADA PELO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL (IPHAN).		
PERÍODO:	01/07/2026 à 31/07/2026		DATA: 04/08/2026



ITEM 3.1.2 (FASE 02) -REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

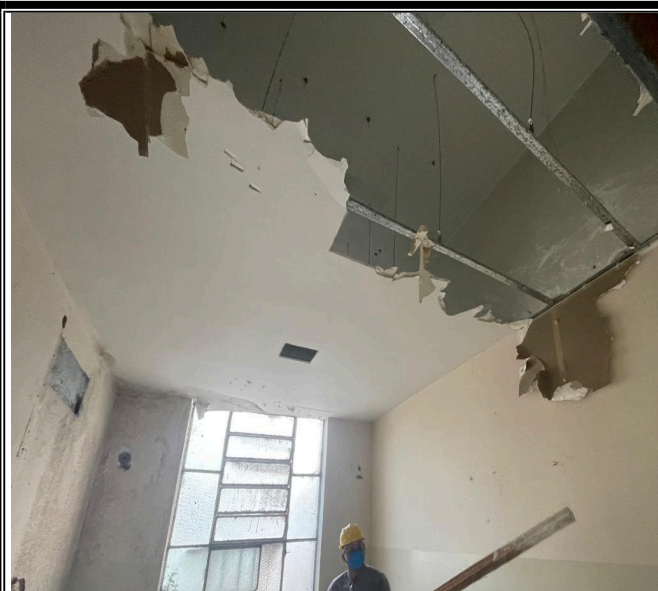

ITEM 3.3.1 (FASE 02) - REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO



ITEM 3.4.1 (FASE 02) -REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO



ITEM 3.4.2 (FASE – 02) - REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

DANIEL ALMEIDA
DA
MOTA:044868594
99

Assinado de forma digital
por DANIEL ALMEIDA DA
MOTA:044868594
Dados: 2026.08.06
14:00:56 -03'00'

Prefeitura Municipal de Campina Grande			
OBRA:	Fase 1 e fase 2 - SAD - Reforma e Recuperação	CONTRATO:	Nº 2.08.004/2026
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E RESTAURAÇÃO DE EDIFICAÇÃO HISTÓRICA PERTENCENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, TOMBADA PELO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL (IPHAN).		
PERÍODO:	01/07/2026 à 31/07/2026		DATA: 04/08/2026



ITEM 3.4.3 (FASE 02) - REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO



ITEM 3.5.1 (FASE 02) - COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO



REMOÇÃO DE ENTULHOS DA OBRA



DMT DO ATERRO – 18KM

DANIEL ALMEIDA
DA
MOTA:04486859499

Assinado de forma digital por
DANIEL ALMEIDA DA
MOTA:04486859499
Dados: 2026.08.06 14:01:07
-03'00'

· Quarta-feira · 1 de julho de 2026

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

Manhã: Nublado · Tarde: Nublado · Noite: Nublado

EFETIVO / MÃO DE OBRA

Função	Qtd	Turno	Horas	Tipo	Fornecedor
Arquiteto de Restauro	1	INTEGRAL	—	PROPRIO	—
Carpinteiro	1	INTEGRAL	—	PROPRIO	—
Encarregado	1	INTEGRAL	—	PROPRIO	—
Engenheiro	2	INTEGRAL	—	PROPRIO	—
Servente	3	INTEGRAL	—	PROPRIO	—
Vigia	2	INTEGRAL	—	PROPRIO	—

ATIVIDADES REALIZADAS

Descrição	Qtd	Unidade	%	Status
Execução do Chumbamento dos barrotes destinados à instalação da placa da obra				Em andamento
Tapume com telha metálica. AF_03/2024				Em andamento

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Descrição	Qtd	Horas de uso	Observação
Martelete 30Kg	1	9	—
Gerador a Gasolina	1	9	—


PENDÊNCIAS

Descrição	Responsável	Prazo	Prioridade	Status
Permanece pendente a disponibilização dos projetos de instalações elétricas, hidrossanitários e de incêndio, indispensáveis ao planejamento e à execução dos serviços	—	—	Alta	Aberta

VISITAS

Nome	Empresa	Tipo	Chegada	Saída	Motivo
Glaynes Cardoso	—	FISCAL_CONTRATANTE	08:30:00	—	—
Renally	—	OUTRO	08:40:00	—	—

GALERIA DE FOTOS (6)

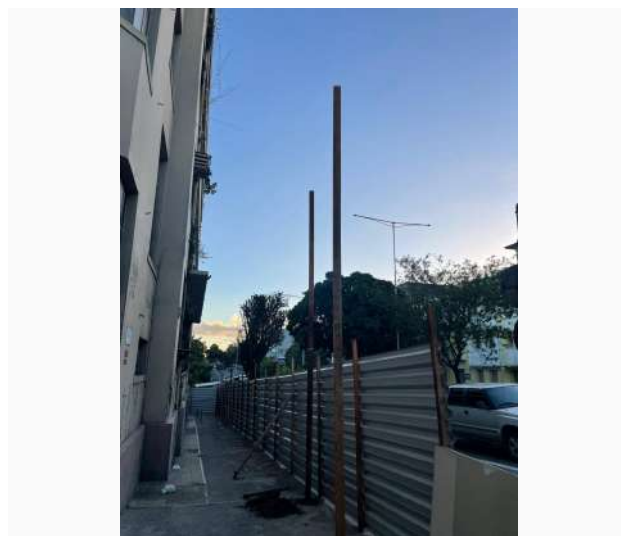

Assinado por 4 pessoas: LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS JUNIOR, RUI BARBOSA, RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO e CARLOS NEWTON BELO DE FRANCA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/91BB-E722-267B-15BB> e informe o código 91BB-E722-267B-15BB

GALERIA DE FOTOS — CONTINUAÇÃO



· Quinta-feira · 2 de julho de 2026

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

Manhã: Nublado · Tarde: Ensolarado

EFETIVO / MÃO DE OBRA

Função	Qtd	Turno	Horas	Tipo	Fornecedor
Arquiteto de restauro	1	INTEGRAL	—	PRÓPRIO	—
Carpinteiro	1	INTEGRAL	—	PRÓPRIO	—
Encarregado	1	INTEGRAL	—	PRÓPRIO	—
Engenheiro	2	INTEGRAL	—	PRÓPRIO	—
Engenheiro fiscal	1	INTEGRAL	—	PRÓPRIO	—
Servente	4	INTEGRAL	—	PRÓPRIO	—
Vigia	2	INTEGRAL	—	PRÓPRIO	—

ATIVIDADES REALIZADAS

Descrição			%	Status
Execução de tapume com telha metálica			90%	Em andamento

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Descrição	Qtd		Observação
Martelete 30Kg	1		—
Gerador a Gasolina	1		—

MATERIAIS RECEBIDOS

Material	Qtd	Unid.	Fornecedor	NF	Data NF
Banheiro químico	1	und	—	—	—



OCORRÊNCIAS

Tipo	Severidade	Descrição	Paralisação
Mudança de projeto	Média	Solicitada a alteração do texto da placa da obra pelo órgão responsável, após a confecção e entrega da placa no canteiro de obras	Sim

VISITAS

Nome	Empresa	Tipo	Chegada	Saída	Motivo
JOAB MACHADO	—	OUTRO	13:30:00	14:46:00	—
MARIANA DAMASCENO	—	OUTRO	13:30:00	14:46:00	—

GALERIA DE FOTOS (5)

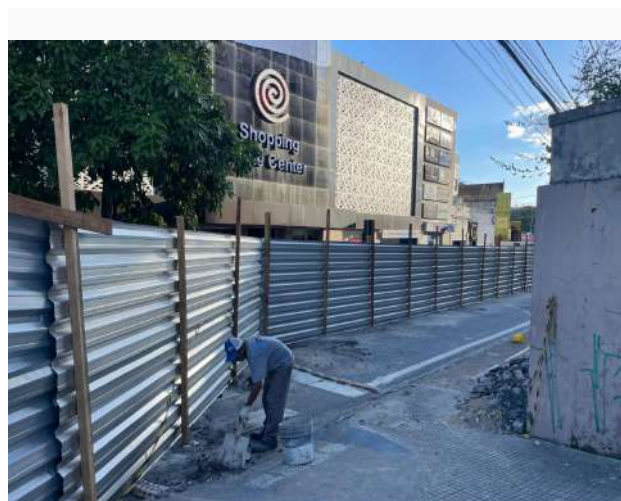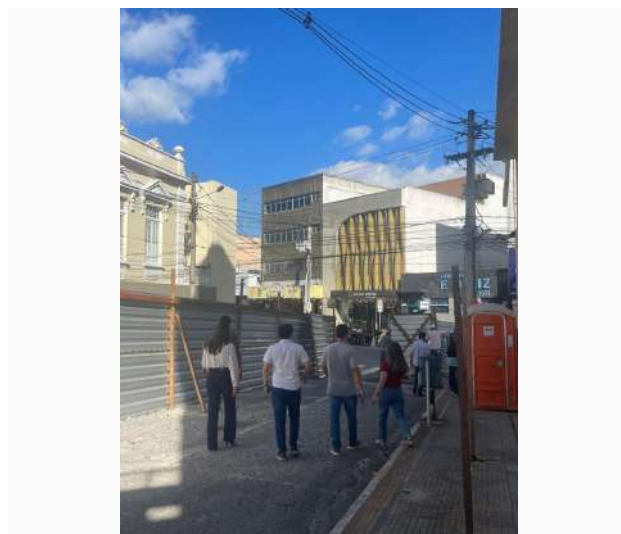

GALERIA DE FOTOS — CONTINUAÇÃO



Sexta-feira · 3 de julho de 2026

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

Manhã: Ensolarado · Tarde: Nublado

EFETIVO / MÃO DE OBRA

Função	Qtd	Turno	Horas	Tipo	Fornecedor
Arquiteto de restauro	1	INTEGRAL	—	PROPRIO	—
Carpinteiro	1	INTEGRAL	—	PROPRIO	—
Encarregado	1	INTEGRAL	—	PROPRIO	—
Engenheiro	2	INTEGRAL	—	PROPRIO	—
Engenheiro fiscal	1	INTEGRAL	—	PROPRIO	—
Servente	4	INTEGRAL	—	PROPRIO	—
Vigia	2	INTEGRAL	—	PROPRIO	—


ATIVIDADES REALIZADAS

Descrição	Qtd	Unidade	%	Status
Execução de tapume com telha metálica	0	—	100%	Concluída

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Descrição	Qtd	Horas de uso	Observação
Gerador a Gasolina	1	—	—
Martelete 30Kg	1	—	—

GALERIA DE FOTOS (4)

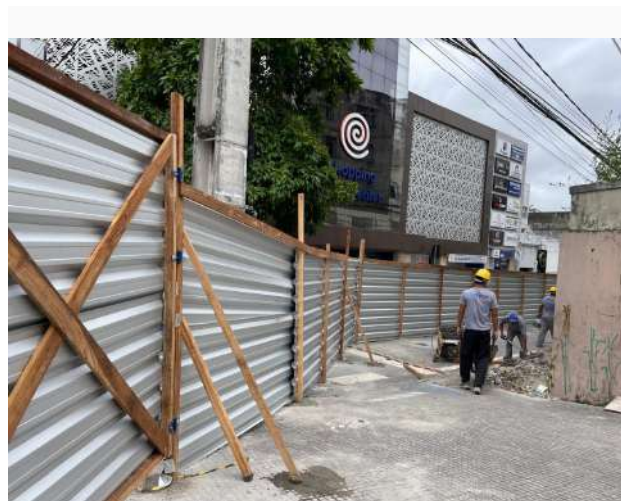

Assinaturas

RESPONSÁVEL TÉCNICO

DANIEL ALMEIDA DA MOTA:04486859499

Assinado de forma digital por
DANIEL ALMEIDA DA
MOTA:04486859499
Dados: 2026.08.06 13:59:40 -03'00'

Nome: Daniel Almeida da Mota
2DTech Intalações e Energia Ltda
CNPJ: 47.031.634/0001-75

FISCAL / CONTRATANTE

Nome: Glaydston Leone
Engenheiro Fiscal
Data: __/__/__

Segunda-feira · 6 de julho de 2026

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

Manhã: Ensolarado · Tarde: Ensolarado · Noite: Nublado

EFETIVO / MÃO DE OBRA

Função	Qtd	Turno	Horas	Tipo	Fornecedor
Vigia	2	INTEGRAL	—	PROPRIO	—
Engenheiro	2	INTEGRAL	—	PROPRIO	—
Engenheiro fiscal	1	INTEGRAL	—	PROPRIO	—
Mestre de obras	1	INTEGRAL	—	PROPRIO	—
Servente	2	INTEGRAL	—	PROPRIO	—

ATIVIDADES REALIZADAS

Descrição	Qtd	Unidade	%	Status
Realizada a instalação da placa da obra, após a execução dos ajustes no texto, conforme solicitação do órgão responsável	1	UND	100%	Concluída

OCORRÊNCIAS

Tipo	Severidade	Descrição	Paralisação
Outros	Baixa	Fomos autorizados pelo Engenheiro Fiscal, Glaydston Leone, a realizar a demolição do trecho curvo da calçada, localizado na esquina das Ruas Maciel Pinheiro e Afonso Campos, com a finalidade de facilitar o acesso e a entrada de materiais no canteiro de obras.	Não

GALERIA DE FOTOS (2)



Terça-feira · 7 de julho de 2026

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

Manhã: Ensolarado · Tarde: Ensolarado · Noite: Nublado

EFETIVO / MÃO DE OBRA

Função	Qtd	Turno	Horas	Tipo	Fornecedor
Eletricista	1	INTEGRAL	—	PROPRIO	—
Encarregado	1	INTEGRAL	—	PROPRIO	—
Engenheiro	2	INTEGRAL	—	PROPRIO	—
Vigia	2	INTEGRAL	—	PROPRIO	—
Mestre de obras	1	INTEGRAL	—	PROPRIO	—
Pedreiro	1	INTEGRAL	—	PROPRIO	—
Servente	2	INTEGRAL	—	PROPRIO	—


ATIVIDADES REALIZADAS

Descrição				Status
Foi executado o serviço de infraestrutura da entrada de energia elétrica, contemplando a instalação do poste auxiliar da edificação, conforme as especificações técnicas e orientações da fiscalização da obra.				Em andamento
Foi entregue na obra um contêiner destinado ao almoxarifado, sem banheiro, para utilização no apoio às atividades e armazenamento de materiais no canteiro de obras.				Concluída

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Descrição	Qtd	Horas de uso	Observação
Gerador a Gasolina	1	—	—

GALERIA DE FOTOS (4)

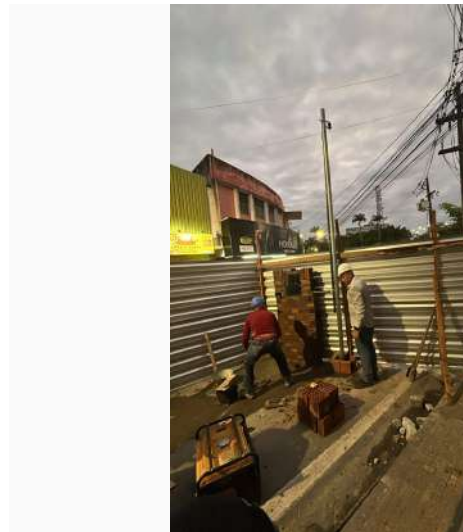

Quarta-feira · 8 de julho de 2026

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

Manhã: Ensolarado · Tarde: Ensolarado · Noite: Nublado

EFETIVO / MÃO DE OBRA

Função	Qtd	Turno	Horas	Tipo	Fornecedor
Eletricista	1	INTEGRAL	—	PROPRIO	—
Encarregado	1	INTEGRAL	—	PROPRIO	—
Engenheiro	2	INTEGRAL	—	PROPRIO	—
Engenheiro fiscal	1	INTEGRAL	—	PROPRIO	—
Mestre de obras	1	INTEGRAL	—	PROPRIO	—
Servente	2	INTEGRAL	—	PROPRIO	—
Vigia	2	INTEGRAL	—	PROPRIO	—

ATIVIDADES REALIZADAS

Descrição	Qtd	Unidade	Status
Foi entregue na obra um contêiner destinado a escritório, equipado com banheiro, para apoio às atividades administrativas e operacionais do canteiro de obras			Concluída
Foi executada a infraestrutura da rede elétrica provisória, contemplando a interligação entre o ponto de entrada de energia e os contêineres do canteiro de obras, garantindo as condições necessárias para a futura energização e alimentação elétrica das instalações provisórias.			Em andamento
Foi executado o serviço de limpeza da área do subsolo, utilizando jato de água sob pressão, com o objetivo de remover sujeiras, poeira, resíduos e materiais acumulados, proporcionando melhores condições para o andamento das atividades subsequentes			Em andamento
Foi realizada a execução do sistema de aterramento, concluindo os serviços de infraestrutura da entrada de energia elétrica da edificação, conforme as especificações técnicas e as orientações da fiscalização da obra.			Concluída

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Descrição	Qtd	Horas de uso	Observação
Gerador a Gasolina	1	—	—

OCORRÊNCIAS

Tipo	Severidade	Descrição	Paralisação
Outros	Baixa	LIMPEZA DO LOCAL- Serviço executado mediante autorização da fiscalização, embora não esteja contemplado na planilha contratual nem faça parte do escopo originalmente contratado	Não
Outros	Baixa	LIGAÇÃO DE ENERGIA PARA CONTAINER- O serviço executado não está contemplado na planilha contratual do item de canteiro de obras, tendo sido realizado em função da necessidade de viabilizar a alimentação provisória de energia elétrica dos contêineres e o adequado funcionamento das instalações do canteiro.	Não

GALERIA DE FOTOS (6)



GALERIA DE FOTOS — CONTINUAÇÃO



· Quinta-feira · 9 de julho de 2026

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

Manhã: Ensolarado · Tarde: Ensolarado · Noite: Nublado

EFETIVO / MÃO DE OBRA

Função	Qtd	Turno	Horas	Tipo	Fornecedor
Engenheiro	2	INTEGRAL	—	PROPRIO	—
Mestre de obras	1	INTEGRAL	—	PROPRIO	—
Pedreiro	1	INTEGRAL	—	PROPRIO	—
Servente	3	INTEGRAL	—	PROPRIO	—
Vigia	2	INTEGRAL	—	PROPRIO	—


ATIVIDADES REALIZADAS

Descrição				Status
Foi realizada a demolição de trecho do passeio, incluindo a remoção da tampa de uma caixa existente no local, cuja finalidade era inicialmente desconhecida. Após alinhamento com a fiscalização da obra, foi autorizada a execução da demolição para viabilizar a interligação da rede de esgoto dos contêineres de apoio ao sistema de esgotamento existente. Os serviços foram executados conforme orientação da fiscalização, tomando os devidos cuidados durante a intervenção.				Concluída
Execução da remoção da porta metálica de enrolar existente, incluindo folha, guias laterais, eixo e demais acessórios, com acondicionamento do material removido e liberação do vão para execução das etapas subsequentes da obra				Concluída
Remoção dos remanescentes de grades metálicas existentes nas paredes, com retirada dos elementos de fixação e regularização dos pontos de ancoragem para posterior recuperação das superfícies				Concluída
Execução da demolição do trecho do passeio para adequação e renivelamento do piso, visando possibilitar o acesso e a entrada de materiais na obra, no trecho localizado entre as Ruas Afonso Campos e Maciel Pinheiro, conforme orientação da fiscalização				Em andamento
Iniciados os serviços de execução das ligações provisórias de esgoto para atendimento aos contêineres do canteiro de obras, contemplando a implantação da tubulação e as interligações necessárias à rede coletora existente				Em andamento

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Descrição	Qtd	Horas de uso	Observação
Gerador a Gasolina	1	—	—
Martelete 30Kg	1	—	—

GALERIA DE FOTOS (8)

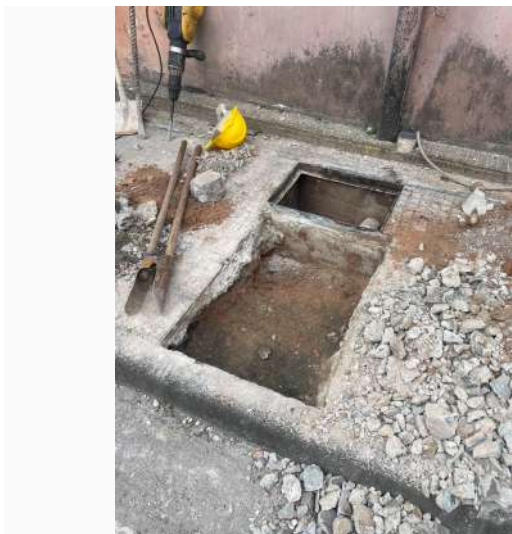

GALERIA DE FOTOS — CONTINUAÇÃO



Sexta-feira · 10 de julho de 2026

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

Manhã: Ensolarado · Tarde: Ensolarado · Noite: Nublado

EFETIVO / MÃO DE OBRA

Função	Qtd	Turno	Horas	Tipo	Fornecedor
Engenheiro	2	INTEGRAL	—	PROPRIO	—
Engenheiro fiscal	1	INTEGRAL	—	PROPRIO	—
Mestre de obras	1	INTEGRAL	—	PROPRIO	—
Vigia	2	INTEGRAL	—	PROPRIO	—

OCORRÊNCIAS

Tipo	Severidade	Descrição	Paralisação
Outros	Baixa	Não houve execução de serviços em campo nesta data, em virtude da fase de mobilização da equipe operacional. As atividades concentraram-se na conclusão dos procedimentos administrativos necessários à contratação dos colaboradores, incluindo conferência documental, realização de exames admissionais e demais exigências para regularização da equipe. O retorno das atividades operacionais está previsto para a próxima segunda-feira, com a equipe devidamente mobilizada.	

Assinaturas

ENCARREGADO / RESPONSÁVEL TÉCNICO

DANIEL ALMEIDA DA
MOTA:04486859499

Assinado de forma digital por
DANIEL ALMEIDA DA
MOTA:04486859499
Dados: 2026.08.06 14:00:02 -03'00'

Nome: Daniel Almeida da Mota
2DTech Instalações e Energia Ltda
CNPJ: 47.031.634/0001-75

FISCAL / CONTRATANTE

Nome: Glaydston Leone
Engenheiro Fiscal
Data: __/__/__:

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: FASE 2- SAD - REFORMA E RECUPERAÇÃO

RESP. TÉCNICO: DANIEL ALMEIDA MOTA

ENDEREÇO: AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO,
692- CENTRO, CAMPINA GRANDEINÍCIO: 22/06/2026
PRAZO: 18 MESESDATA:
13/07/2026

MANHÃ	X			
TARDE		X		
NOITE		X		

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	2	AJUDANTE GERAL	4
ENGENHEIRO FISCAL	1	ARMADOR	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	1
COMPRADOR	-	ALMOXARIFE	1
VIGIA	2		

TAREFAS REALIZADAS

- 1) REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO- FASE 02
- 2) COLETA E CARGA DE ENTULHO DE FORMA MANUAL - FASE 02
- 3) REALIZADO O ENCHIMENTO DA CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (PAPA METRALHA)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1) FOI REALIZADA A DEMOLIÇÃO DA PAREDE DE GESSO CONFORME PROJETO, APÓS A DEMOLIÇÃO, CONSTATOU-SE A EXISTÊNCIA DE UMA PAREDE DE ALVENARIA NÃO PREVISTA, OCULTANDO A JANELA INDICADA EM PROJETO, CASO SEJA MANTIDA A JANELA, SERÁ NECESSÁRIA A DEMOLIÇÃO DA ALVENARIA E A SUBSTITUIÇÃO DA ESQUADRIA POR UMA NOVA.
- 2) NA MADRUGADA DE DOMINGO PARA SEGUNDA-FEIRA, FOI CONSTATADA A INVASÃO DO CANTEIRO DE OBRAS POR DOIS INDIVÍDUOS QUE REALIZARAM O FURTO DE APROXIMADAMENTE 47 METROS DE CABOS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA DO CANTEIRO DE OBRAS.

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Assinado por 4 pessoas: LUIZ GONÇALVES DE MEDEIROS JUNIOR, RUI BARBOSA, RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO e CARLOS NEWTON BELO DE FRANCA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/91BB-E722-267B-15BB>

RELATÓRIO DIÁRIO FOTOGRÁFICO

OBRA:	REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO (ANTIGO GRANDE HOTEL)
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
CONTRATADA:	AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 692, CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB

DATA:	SERVIÇOS EXECUTADOS NESTE DIA
13/07/2026	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (FASE 02)
	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO (FASE 02)
	REALIZADO O ENCHIMENTO DA CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (PAPA METRALHA)



REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (FASE 02)



REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (FASE 02)



REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (FASE 02)



REALIZADO O ENCHIMENTO DA CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (PAPA METRALHA)

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: FASE 2- SAD - REFORMA E RECUPERAÇÃO

RESP. TÉCNICO: DANIEL ALMEIDA MOTA

ENDEREÇO: AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 692- CENTRO, CAMPINA GRANDE

INÍCIO: 22/06/2026

PRAZO: 18 MESES

DATA:				
14/07/2026				
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE		X		

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	2	AJUDANTE GERAL	4
ENGENHEIRO FISCAL	1	ARMADOR	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	1
COMPRADOR	-	ALMOXARIFE	1
VIGIA	2		

TAREFAS REALIZADAS
1) INSTALAÇÕES DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO
2) REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - FASE 02
3) REALIZADO O ENCHIMENTO DA CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (PAPA METRALHA)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

OCORRÊNCIAS
1)
2)
3)
4)
5)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Assinado por 4 pessoas: LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS JUNIOR, RUI BARBOSA, RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO e CARLOS NEWTON BELO DE FRANCA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/91BB-E722-267B-15BB>



RELATÓRIO DIÁRIO FOTOGRÁFICO

OBRA:	REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO (ANTIGO GRANDE HOTEL)
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
CONTRATADA:	AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 692, CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB


DATA:	SERVIÇOS EXECUTADOS NESTE DIA
14/07/2026	INSTALAÇÕES DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO
	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (FASE 02)
	REALIZADO O ENCHIMENTO DA CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (PAPA METRALHA)



INSTALAÇÕES DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO



REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (FASE 02)

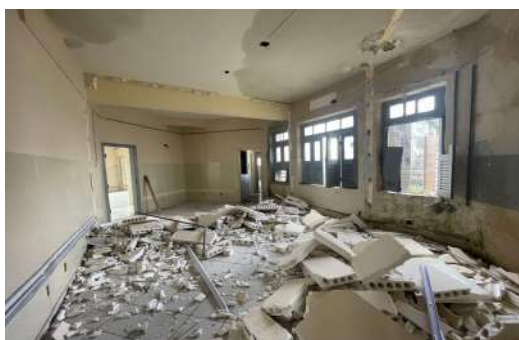

REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (FASE 02)



REALIZADO O ENCHIMENTO DA CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (PAPA METRALHA)

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: FASE 2- SAD - REFORMA E RECUPERAÇÃO

RESP. TÉCNICO: DANIEL ALMEIDA MOTA

ENDEREÇO: AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 692- CENTRO, CAMPINA GRANDE

INÍCIO: 22/06/2026

PRAZO: 18 MESES

DATA: 15/07/2026



MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE		X		

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		Assinado por 4 pessoas: LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS JUNIOR, RUI BARBOSA, RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO e CARLOS NEWTON BELO DE FRANCA COSTA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/91BB-E722-267B-15BB e informe o código 91BB-E722-267B-15BB
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
ENGENHEIRO CIVIL	2	AJUDANTE GERAL	4	
ENGENHEIRO FISCAL	1	ARMADOR		
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	1	
COMPRADOR	-	ALMOXARIFE	1	
VIGIA	2			

- TAREFAS REALIZADAS
- 1)

MONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE"
- 2)

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO
- 3)

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL
- 4)

COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO
- 5)

REALIZADO O ENCHIMENTO DA CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (PAPA METRALHA)
- 6)

INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA
- 7)
- 8)
- 9)

- OCORRÊNCIAS
- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO FOTOGRÁFICO

OBRA:	FASE 2- SAD - REFORMA E RECUPERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
ENDEREÇO:	AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 692, CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB

DATA:	SERVIÇOS EXECUTADOS NESTE DIA
15/07/2026	MONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE"
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO
	INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA
	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL
	REALIZADO O ENCHIMENTO DA CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (PAPA METRALHA)



MONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE"



DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO



INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA



REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL



COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO



REALIZADO O ENCHIMENTO DA CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (PAPA METRALHA)

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: FASE 2- SAD - REFORMA E RECUPERAÇÃO

RESP. TÉCNICO: DANIEL ALMEIDA MOTA

ENDEREÇO: AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 692- CENTRO, CAMPINA GRANDE

INÍCIO: 22/06/2026

PRAZO: 18 MESES

DATA: 16/07/2026



MANHÃ			X	
TARDE			X	
NOITE		X		

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	2	AJUDANTE GERAL	4
ENGENHEIRO FISCAL	1	ARMADOR	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	1
COMPRADOR	-	ALMOXARIFE	1
VIGIA	2		

TAREFAS REALIZADAS

- 1) REALIZADO O ENCHIMENTO DA CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (PAPA METRALHA)
- 2) REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - FASE 02
- 3) LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS
- 4) REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Assinado por 4 pessoas: LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS JUNIOR, RUI BARBOSA, RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO e CARLOS NEWTON BELO DE FRANCA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/91BB-E722-267B-15BB>



RELATÓRIO DIÁRIO FOTOGRÁFICO

OBRA:	FASE 2- SAD - REFORMA E RECUPERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
ENDEREÇO:	AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 692, CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB

DATA:	SERVIÇOS EXECUTADOS NESTE DIA
16/07/2026	REALIZADO O ENCHIMENTO DA CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (PAPA METRALHA)
	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - FASE 02
	LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS
	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL



REALIZADO O ENCHIMENTO DA CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (PAPA METRALHA)




LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS



REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - FASE 02



REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL

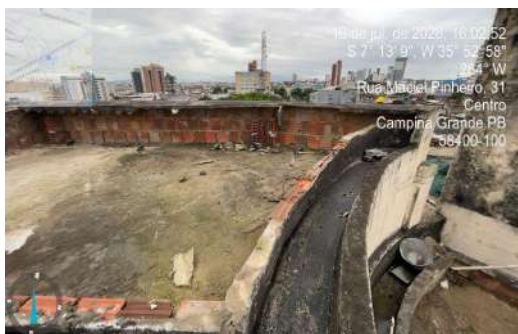

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL



REALIZADO O ENCHIMENTO DA CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (PAPA METRALHA)

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: FASE 2- SAD - REFORMA E RECUPERAÇÃO

RESP. TÉCNICO: DANIEL ALMEIDA MOTA

ENDEREÇO: AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 692- CENTRO, CAMPINA GRANDE

INÍCIO: 22/06/2026

PRAZO: 18 MESES

DATA: 17/07/2026



MANHÃ			X	
TARDE			X	
NOITE		X		

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	2	AJUDANTE GERAL	4
ENGENHEIRO FISCAL	1	ARMADOR	-
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	1
COMPRADOR	-	ALMOXARIFE	1
VIGIA	2		

TAREFAS REALIZADAS

- 1) COLETA E CARGA DE ENTULHO DE FORMA MANUAL - FASE 02
- 2) REALIZADO O ENCHIMENTO DA CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (PAPA METRALHA)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Assinado por 4 pessoas: LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS JUNIOR, RUI BARBOSA, RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO e CARLOS NEWTON BELO DE FRANCA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/91BB-E722-267B-15BB>



RELATÓRIO DIÁRIO FOTOGRÁFICO

OBRA:	FASE 2- SAD - REFORMA E RECUPERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
ENDEREÇO:	AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 692, CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB

DATA:	SERVIÇOS EXECUTADOS NESTE DIA
17/07/2026	COLETA E CARGA DE ENTULHO DE FORMA MANUAL - FASE 02
	REALIZADO O ENCHIMENTO DA CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (PAPA METRALHA)



COLETA E CARGA DE ENTULHO DE FORMA MANUAL - FASE 02



COLETA E CARGA DE ENTULHO DE FORMA MANUAL - FASE 02



COLETA E CARGA DE ENTULHO DE FORMA MANUAL - FASE 02



REALIZADO O ENCHIMENTO DA CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (PAPA METRALHA)

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: FASE 2- SAD - REFORMA E RECUPERAÇÃO

RESP. TÉCNICO: DANIEL ALMEIDA MOTA

ENDEREÇO: AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 692- CENTRO, CAMPINA GRANDE

INÍCIO: 22/06/2026

PRAZO: 18 MESES

DATA: 18/07/2026



MANHÃ			X	
TARDE			X	
NOITE		X		

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	-	AJUDANTE GERAL	
ENGENHEIRO FISCAL	-	ARMADOR	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	
COMPRADOR	-	ALMOXARIFE	
VIGIA	2		

TAREFAS REALIZADAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1) NÃO HOUVE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NESTE DIA
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Assinado por 4 pessoas: LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS JUNIOR, RUI BARBOSA, RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO e CARLOS NEWTON BELO DE FRANCA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/91BB-E722-267B-15BB> e informe o código 91BB-E722-267B-15BB



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: FASE 2- SAD - REFORMA E RECUPERAÇÃO

RESP. TÉCNICO: DANIEL ALMEIDA MOTA

ENDEREÇO: AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 692- CENTRO, CAMPINA GRANDE

INÍCIO: 22/06/2026

PRAZO: 18 MESES

DATA: 19/07/2026



MANHÃ		X		
TARDE			X	
NOITE		X		

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	-	AJUDANTE GERAL	-
ENGENHEIRO FISCAL	-	ARMADOR	-
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	-
COMPRADOR	-	ALMOXARIFE	-
VIGIA	2		

TAREFAS REALIZADAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1) NÃO HOUVE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NESTE DIA
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Assinado por 4 pessoas: LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS JUNIOR, RUI BARBOSA, RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO e CARLOS NEWTON BELO DE FRANCA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/91BB-E722-267B-15BB>



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: FASE 2- SAD - REFORMA E RECUPERAÇÃO

RESP. TÉCNICO: DANIEL ALMEIDA MOTA

ENDEREÇO: AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 692- CENTRO, CAMPINA GRANDE

INÍCIO: 16/06/2026

PRAZO: 18 MESES

DATA: 20/07/2026









MANHÃ		X		
TARDE		X		
NOITE		X		

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	2	AJUDANTE GERAL	4		
ENGENHEIRO FISCAL	1	ARMADOR	-		
ARQUITETO DE RESTAURO	1	CARPINTEIRO	-		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	1		
TECNICO DE SEGURANÇA	-	ALMOXARIFE	1		
VIGIA	2				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
- 2) INSTALAÇÃO HIDROSANITARIA NO CANTEIRO DE OBRAS WC CONTAINERES
- 3) RECUO DE TAPUME NO TRECHO DA AV. FLORIANO PEIXOTO (EXIGÊNCIA SECOB)
- 4) REALIZADO O ENCHIMENTO DA CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (PAPA METRALHA)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Assinado por 4 pessoas: LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS JUNIOR, RUI BARBOSA, RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO e CARLOS NEWTON BELO DE FRANCA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/91BB-E722-267B-15BB> e informe o código 91BB-E722-267B-15BB



RELATÓRIO DIÁRIO FOTOGRÁFICO

OBRA:	FASE 2- SAD - REFORMA E RECUPERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
ENDEREÇO:	AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 692, CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB

DATA:	SERVIÇOS EXECUTADOS NESTE DIA
20/07/2026	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
	INSTALAÇÃO HIDROSANITARIA NO CANTEIRO DE OBRAS WC CONTAINERES
	REALIZADO O ENCHIMENTO DA CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (PAPA METRALHA)
	RECUO DE TAPUME NO TRECHO DA AV. FLORIANO PEIXOTO (EXIGÊNCIA SECOP)



Assinado por 4 pessoas: LUIZ GONZAGA DE MENEZES JUNIOR, RUI BARBOSA, RAIMUNDO ALVES TONIO DE SOUZA CARVALHO e CARLOS NEWTON BELLO DE FRANCA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/91BB-E722-267B-15BB> e informe o código 91BB-E722-267B-15BB

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA:

FASE 2- SAD - REFORMA E RECUPERAÇÃO

RESP. TÉCNICO:

DANIEL ALMEIDA MOTA

ENDEREÇO:

AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO,
692- CENTRO, CAMPINA GRANDE

INÍCIO:

16/06/2026

PRAZO:

18 MESES

DATA:

21/07/2026









MANHÃ		X		
TARDE	X			
NOITE		X		

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	2	AJUDANTE GERAL	4
ENGENHEIRO FISCAL	1	ARMADOR	-
ARQUITETO DE RESTAURO	1	CARPINTEIRO	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	1
COMPRADOR	-	ALMOXARIFE	1
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	VIGIA	2

TAREFAS REALIZADAS

- 1) PROTEÇÃO DO PISO DO HALL PRINCIPAL DE ENTRADA DO EDIFÍCIO
- 2) CONCLUSÃO DO RECUO EM TRECHO DO TAPUME NA AV. FLORIANO PEIXOTO (EXIGENCIA DA SECOB)
- 3) DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE ALVENARIA DE FORMA MANUAL (EXPOSIÇÃO 01)
- 4) REALIZADO O ENCHIMENTO DA CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (PAPA METRALHA)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1) REUNIÃO REGISTRADA EM ATA 004/2026 E REALIZADA COM A PRESENÇA DOS: LUIZ GONZAGA(SECOB) - RENALLY SALES(SECOB) - ANDRÉ MOTA(2DTECH) - EDSON GUILHERME(2DTECH) - PHILIFE NEANDER(2DTECH) - SERGIO LOPES(ENGECONSULT) - GLAYDSTON LEONE(ENGECONSULT)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Assinado por 4 pessoas: LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS JUNIOR, RUI BARBOSA, RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO e CARLOS NEWTON BELO DE FRANCA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/91BB-E722-267B-15BB> e informe o código 91BB-E722-267B-15BB



RELATÓRIO DIÁRIO FOTOGRÁFICO

OBRA:	FASE 2- SAD - REFORMA E RECUPERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
ENDEREÇO:	AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 692, CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB

DATA:	SERVIÇOS EXECUTADOS NESTE DIA
21/07/2026	PROTEÇÃO DO PISO DO HALL PRINCIPAL DE ENTRADA DO EDIFÍCIO
	CONCLUSÃO DO RECUO EM TRECHO DO TAPUME NA AV. FLORIANO PEIXOTO (EXIGENCIA DA SECOB)
	REALIZADO O ENCHIMENTO DA CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (PAPA METRALHA)
	DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE ALVENARIA DE FORMA MANUAL (EXPOSIÇÃO 01)




PROTEÇÃO DO PISO DO HALL PRINCIPAL DE ENTRADA DO EDIFÍCIO



CONCLUSÃO DO RECUO EM TRECHO DO TAPUME NA AV. FLORIANO PEIXOTO (EXIGENCIA DA SECOB)



REALIZADO O ENCHIMENTO DA CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (PAPA METRALHA)

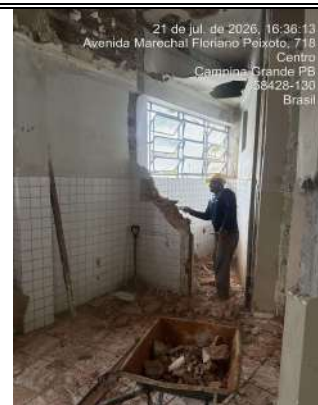

DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE ALVENARIA DE FORMA MANUAL (EXPOSIÇÃO 01)

Assinado por 4 pessoas: LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS JUNIOR, RUI BARBOSA, RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO e CARLOS NEWTON BELO DE FRANCA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/91BB-E742-267B-15BB> e informe o código 91BB-E742-267B-15BB

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: FASE 2- SAD - REFORMA E RECUPERAÇÃO

RESP. TÉCNICO: DANIEL ALMEIDA MOTA

ENDEREÇO: AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 692- CENTRO, CAMPINA GRANDE

INÍCIO: 16/06/2026

PRAZO: 18 MESES

DATA: 22/07/2026









MANHÃ			X	
TARDE	X			
NOITE		X		

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	2	AJUDANTE GERAL	4
ENGENHEIRO FISCAL	1	ARMADOR	-
ARQUITETO DE RESTAURO		CARPINTEIRO	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	1
COMPRADOR	-	ALMOXARIFE	1
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	VIGIA	2

TAREFAS REALIZADAS

- 1) REMOÇÃO DE COBERTA E MADEIRAMENTO
- 2) DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
- 3) COLETA DA CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (PAPA METRALHA)
- 4) DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE ALVENARIA FINAL DA EXPOSIÇÃO 03
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Assinado por 4 pessoas: LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS JUNIOR, RUI BARBOSA, RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO e CARLOS NEWTON BELO DE FRANCA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/91BB-E722-267B-15BB> e informe o código 91BB-E722-267B-15BB



RELATÓRIO DIÁRIO FOTOGRÁFICO

OBRA:	FASE 2- SAD - REFORMA E RECUPERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
ENDEREÇO:	AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 692, CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB

DATA:	SERVIÇOS EXECUTADOS NESTE DIA
22/07/2026	REMOÇÃO DE COBERTA E MADEIRAMENTO
	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
	COLETA DA CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (PAPA METRALHA)
	DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE ALVENARIA FINAL DA EXPOSIÇÃO 03



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: FASE 2- SAD - REFORMA E RECUPERAÇÃO

RESP. TÉCNICO: DANIEL ALMEIDA MOTA

ENDEREÇO: AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO,
692- CENTRO, CAMPINA GRANDEINÍCIO: 16/06/2026
PRAZO: 18 MESES

DATA:

23/07/2026



MANHÃ			X	
TARDE			X	
NOITE		X		

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	2	AJUDANTE GERAL	4		
ENGENHEIRO FISCAL	1	ARMADOR	-		
ARQUITETO DE RESTAURO	1	CARPINTEIRO	-		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	1		
COMPRADOR	-	ALMOXARIFE	1		
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	VIGIA	2		

TAREFAS REALIZADAS

- 1) RETIRADA DE TELHA FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL
- 2) REMOÇÃO DE GRADE DE FERRO COBERTA SUBSOLO
- 3) DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE ALVENARIA 1º PAV SL ADM 08
- 4) REALIZADO O ENCHIMENTO DA CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (PAPA METRALHA)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Assinado por 4 pessoas: LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS JUNIOR, RUI BARBOSA, RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO e CARLOS NEWTON BELO DE FRANCA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/91BB-E722-267B-15BB>

RELATÓRIO DIÁRIO FOTOGRÁFICO

OBRA:	FASE 2- SAD - REFORMA E RECUPERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
ENDEREÇO:	AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 692, CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB

DATA:	SERVIÇOS EXECUTADOS NESTE DIA
23/07/2026	RETIRADA DE TELHA FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL
	REMOÇÃO DE GRADE DE FERRO COBERTA SUBSOLO
	DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE ALVENARIA 1º PAV SL ADM 08
	REALIZADO O ENCHIMENTO DA CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (PAPA METRALHA)



RETIRADA DE TELHA FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL



REMOÇÃO DE GRADE DE FERRO COBERTA SUBSOLO



DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE ALVENARIA 1º PAV SL ADM 08



REALIZADO O ENCHIMENTO DA CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (PAPA METRALHA)

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: FASE 2- SAD - REFORMA E RECUPERAÇÃO

RESP. TÉCNICO: DANIEL ALMEIDA MOTA

ENDEREÇO: AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 692- CENTRO, CAMPINA GRANDE

INÍCIO: 16/06/2026

PRAZO: 18 MESES

DATA: 24/07/2026



MANHÃ		X		
TARDE			X	
NOITE		X		

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	2	AJUDANTE GERAL	4		
ENGENHEIRO FISCAL	1	ARMADOR	-		
ARQUITETO DE RESTAURO	1	CARPINTEIRO	-		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	1		
COMPRADOR	-	ALMOXARIFE	1		
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	VIGIA	2		

TAREFAS REALIZADAS	
1)	DEMOLIÇÃO DE PORTA HALL ENTRADA
2)	INSTALAÇÃO DE ENERGIA NO QUADRO DO CANTEIRO DE OBRA
3)	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL
4)	
5)	
6)	
7)	
8)	
9)	

OCORRÊNCIAS	
1)	
2)	
3)	
4)	
5)	

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Assinado por 4 pessoas: LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS JUNIOR, RUI BARBOSA, RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO e CARLOS NEWTON BELLO DE FRANCA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/91BB-E722-267B-15BB>



RELATÓRIO DIÁRIO FOTOGRÁFICO

OBRA:	FASE 2- SAD - REFORMA E RECUPERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
ENDEREÇO:	AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 692, CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB

DATA:	SERVIÇOS EXECUTADOS NESTE DIA
24/07/2026	DEMOLIÇÃO DE PORTA HALL ENTRADA
	INSTALAÇÃO DE ENERGIA NO QUADRO DO CANTEIRO DE OBRA
	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: FASE 2- SAD - REFORMA E RECUPERAÇÃO

RESP. TÉCNICO: DANIEL ALMEIDA MOTA

ENDEREÇO: AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 692- CENTRO, CAMPINA GRANDE

INÍCIO: 16/06/2026

PRAZO: 18 MESES

DATA: 25/07/2026



MANHÃ			X	
TARDE			X	
NOITE		X		

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	-	AJUDANTE GERAL	-		
ENGENHEIRO FISCAL	-	ARMADOR	-		
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO	-		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	-		
COMPRADOR	-	ALMOXARIFE	-		
VIGIA	2				

TAREFAS REALIZADAS	
1)	
2)	
3)	
4)	
5)	
6)	
7)	
8)	
9)	

OCORRÊNCIAS	
1)	NÃO HOUVE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NESTE DIA
2)	
3)	
4)	
5)	

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Assinado por 4 pessoas: LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS JUNIOR, RUI BARBOSA, RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO e CARLOS NEWTON BELO DE FRANCA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/91BB-E722-267B-15BB>



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: FASE 2- SAD - REFORMA E RECUPERAÇÃO

RESP. TÉCNICO: DANIEL ALMEIDA MOTA

ENDEREÇO: AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 692- CENTRO, CAMPINA GRANDE

INÍCIO: 16/06/2026

PRAZO: 18 MESES

DATA: 26/07/2026



MANHÃ		X		
TARDE	X			
NOITE		X		

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	-	AJUDANTE GERAL	-		
ENGENHEIRO FISCAL	-	ARMADOR	-		
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO	-		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	-		
COMPRADOR	-	ALMOXARIFE	-		
VIGIA	2				

TAREFAS REALIZADAS	
1)	
2)	
3)	
4)	
5)	
6)	
7)	
8)	
9)	

OCORRÊNCIAS	
1)	NÃO HOUVE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NESTE DIA
2)	
3)	
4)	
5)	

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Assinado por 4 pessoas: LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS JUNIOR, RUI BARBOSA, RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO e CARLOS NEWTON BELO DE FRANCA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/91BB-E722-267B-15BB>



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: FASE 2- SAD - REFORMA E RECUPERAÇÃO

RESP. TÉCNICO: DANIEL ALMEIDA MOTA

ENDEREÇO: AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO,
692- CENTRO, CAMPINA GRANDEINÍCIO: 16/06/2026
PRAZO: 18 MESESDATA:
27/07/2026

MANHÃ	X			
TARDE		X		
NOITE		X		

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	2	AJUDANTE GERAL	5		
ENGENHEIRO FISCAL	1	ARMADOR	-		
ARQUITETO RESTAURO	1	CARPINTEIRO	-		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	1		
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	ALMOXARIFE	1		
VIGIA	2				
MESTRE DE OBRAS	1				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) REMOÇÃO VERTICAL DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL
- 2) INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NO CANTEIRO DE OBRAS
- 3) COLETA E CARGA DE ENTULHO DE FORMA MANUAL
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

1)

2)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Assinado por 4 pessoas: LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS JUNIOR, RUI BARBOSA, RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO e CARLOS NEWTON BELO DE FRANCA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/91BB-E722-267B-15BB> e informe o código 91BB-E722-267B-15BB

RELATÓRIO DIÁRIO FOTOGRÁFICO

OBRA:	FASE 2- SAD - REFORMA E RECUPERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
ENDEREÇO:	AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 692, CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB

DATA:	SERVIÇOS EXECUTADOS NESTE DIA
27/07/2026	REMOÇÃO VERTICAL DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL
	INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NO CANTEIRO DE OBRAS
	COLETA E CARGA DE ENTULHO DE FORMA MANUAL

REMOÇÃO VERTICAL DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL

INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NO CANTEIRO DE OBRAS

INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NO CANTEIRO DE OBRAS

COLETA E CARGA DE ENTULHO DE FORMA MANUAL

Assinado por 4 pessoas: LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS JUNIOR, RUI BARBOSA, RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO e CARLOS NEWTON BELLO DE FRANCA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/91BB-E722-267B-15BB>

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: FASE 2- SAD - REFORMA E RECUPERAÇÃO

RESP. TÉCNICO: DANIEL ALMEIDA MOTA

ENDEREÇO: AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 692- CENTRO, CAMPINA GRANDE

INÍCIO: 16/06/2026

PRAZO: 18 MESES

DATA: 28/07/2026



MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE		X		

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	2	AJUDANTE GERAL	5		
ENGENHEIRO FISCAL	2	ARMADOR	-		
ARQUITETO DE RESTAURO	1	CARPINTEIRO	-		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	1		
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	ALMOXARIFE	1		
VIGIA	2				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INSTALAÇÕES DE REDE E CARRINHO ROBO
- 2) REMOÇÃO VERTICAL DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL
- 3) COLETA E CARGA DE ENTULHO DE FORMA MANUAL
- 4) INSTAÇÃO CERCA ELÉTRICA NO TAPUME
- 5) DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE DRYWALL DE FORMA MANUAL SL ADM 06 + APOIO 09
- 6) DEMOLIÇÃO REBAIXO DE PISO MARTELETE WC PREFEITO
- 7) DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE DRYWALL DE FORMA MANUAL SALA T.I.
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Assinado por 4 pessoas: LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS JUNIOR, RUI BARBOSA, RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO e CARLOS NEWTON BELO DE FRANCA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/91BB-E722-267B-15BB>



OBRA:	FASE 2- SAD - REFORMA E RECUPERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
ENDEREÇO:	AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 692, CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB

DATA: 28/07/2026	SERVIÇOS EXECUTADOS NESTE DIA
	INSTALAÇÕES DE REDE E CARRINHO ROBO
	REMOÇÃO VERTICAL DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL
	COLETA E CARGA DE ENTULHO DE FORMA MANUAL
	INSTAÇÃO CERCA ELÉTRICA NO TAPUME
	DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE DRYWALL DE FORMA MANUAL SL ADM 06 + APOIO 09
	DEMOLIÇÃO REBAIXO DE PISO MARTELETE WC PREFEITO
	DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE DRYWALL DE FORMA MANUAL SALA T.I.



INSTALAÇÕES DE REDE E CARRINHO ROBO



REMOÇÃO VERTICAL DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL



COLETA E CARGA DE ENTULHO DE FORMA MANUAL



INSTAÇÃO CERCA ELÉTRICA NO TAPUME



DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE DRYWALL DE FORMA MANUAL SL ADM 06 + APOIO 09



DEMOLIÇÃO REBAIXO DE PISO MARTELETE WC PREFEITO



DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE DRYWALL DE FORMA MANUAL SALA T.I.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: FASE 2- SAD - REFORMA E RECUPERAÇÃO

RESP. TÉCNICO: DANIEL ALMEIDA MOTA

ENDEREÇO: AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 692- CENTRO, CAMPINA GRANDE

INÍCIO: 16/06/2026

PRAZO: 18 MESES

DATA: 29/07/2026



MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE		X		

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	2	AJUDANTE GERAL	5		
ENGENHEIRO FISCAL	1	ARMADOR	-		
ARQUITETO RESTAURO	-	CARPINTEIRO	-		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	1		
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	ALMOXARIFE	1		
VIGIA	2				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) REALIZADO O ENCHIMENTO DA CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (PAPA METRALHA)
- 2) DEMOLIÇÃO REBAIXO DE PISO MARTELETE LAVABO 1ºPAV
- 3) COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO
- 4) FECHAMENTO+CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA SUBSOLO (APOIO SESUMA)
- 5) CHEGADA CONTAINER ESCRITORIO 02
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

Assinado por 4 pessoas: LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS JUNIOR, RUI BARBOSA, RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO e CARLOS NEWTON BELO DE FRANCA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/91BB-E722-267B-15BB>



OBRA:	FASE 2- SAD - REFORMA E RECUPERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
ENDEREÇO:	AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 692, CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB

DATA:	SERVIÇOS EXECUTADOS NESTE DIA
29/07/2026	REALIZADO O ENCHIMENTO DA CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (PAPA METRALHA)
	DEMOLIÇÃO REBAIXO DE PISO MARTELETE LAVABO 1ºPAV
	FECHAMENTO+CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA SUBSOLO (APOIO SESUMA)
	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO
	CHEGADA CONTAINER ESCRITORIO 02



REALIZADO O ENCHIMENTO DA CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (PAPA METRALHA)



DEMOLIÇÃO REBAIXO DE PISO MARTELETE LAVABO 1ºPAV



FECHAMENTO+CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA SUBSOLO (APOIO SESUMA)



COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO



CHEGADA CONTAINER ESCRITORIO 02

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: FASE 2- SAD - REFORMA E RECUPERAÇÃO

RESP. TÉCNICO: DANIEL ALMEIDA MOTA

ENDEREÇO: AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 692- CENTRO, CAMPINA GRANDE

INÍCIO: 16/06/2026

PRAZO: 18 MESES

DATA: 30/07/2026









MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE		X		

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	2	AJUDANTE GERAL	5		
ENGENHEIRO FISCAL	1	ARMADOR	-		
ARQUITETO RESTAURO	1	CARPINTEIRO	-		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	1		
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	ALMOXARIFE	1		
VIGIA	2				

TAREFAS REALIZADAS

- 1) REALIZADO O ENCHIMENTO DA CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (PAPA METRALHA)
- 2) REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
- 3) COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO
- 4) DEMOLIÇÃO REBAIXO DE PISO MARTELETE APOIO/APOIO PREF 1ºPAV
- 5) MONTAGEM MOVEIS CONTAINER
- 6) MONTAGEM ESCORA TUBULAR ESCORAMENTO LAJE TERREO EXP 01
- 7) MONTAGEM ESCORA TUBULAR ESCORAMNETO LAJE SUBSOLO ATEND 01/02
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO
PHILIPPE NEANDER CAU A126393-5

FISCALIZAÇÃO
GLAYDSTON LEONE CREA 2005805890

CONSULTORIA
LUIZ GONZAGA CREA 161656629

Assinado por 4 pessoas: LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS JUNIOR, RUI BARBOSA, RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO e CARLOS NEWTON BELO DE FRANCA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/91BB-E722-267B-15BB> e informe o código 91BB-E722-267B-15BB



OBRA:	FASE 2- SAD - REFORMA E RECUPERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
ENDEREÇO:	AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 692, CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB


DATA:	SERVIÇOS EXECUTADOS NESTE DIA
30/07/2026	COLETA E CARGA DE ENTULHO DE FORMA MANUAL
	REALIZADO O ENCHIMENTO DA CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (PAPA METRALHA)
	DEMOLIÇÃO REBAIXO DE PISO MARTELETE APOIO/APOIO PREF 1ºPAV
	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
	MONTAGEM ESCORA TUBULAR ESCORAMNETO LAJE SUBSOLO ATEND 01/02
	MONTAGEM ESCORA TUBULAR ESCORAMNETO LAJE TERREO EXPOSIÇÃO 01



COLETA E CARGA DE ENTULHO DE FORMA MANUAL




DEMOLIÇÃO REBAIXO DE PISO MARTELETE APOIO/APOIO PREF 1ºPAV

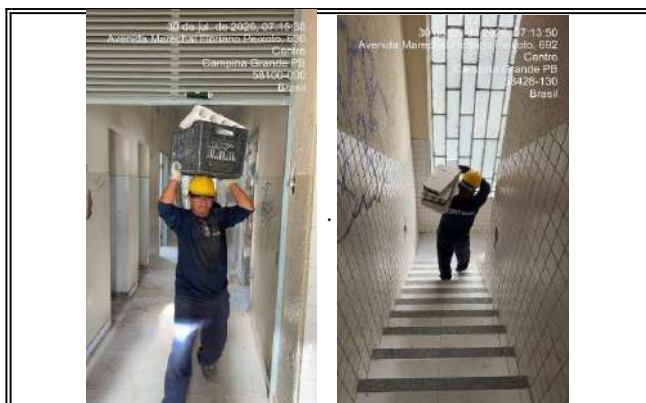

REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO



REALIZADO O ENCHIMENTO DA CAÇAMBA ESTACIONARIA (PAPA METRALHA)

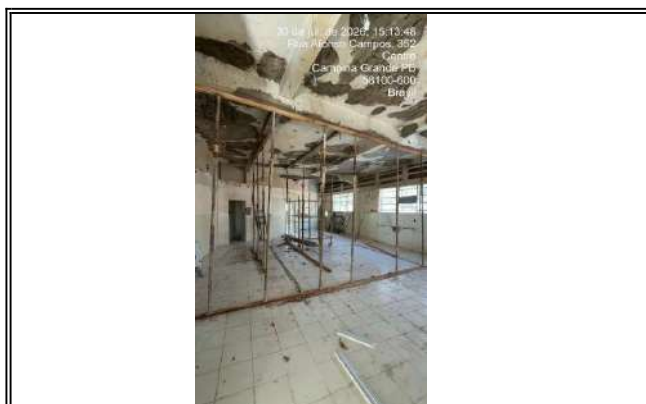

MONTAGEM ESCORA TUBULAR ESCORAMNETO LAJE TERREO EXPOSIÇÃO 01



MONTAGEM ESCORA TUBULAR ESCORAMNETO LAJE SUBSOLO ATEND 01/02

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA:FASE 2- SAD - REFORMA E RECUPERAÇÃO

RESP. TÉCNICO: DANIEL ALMEIDA MOTA

ENDEREÇO: AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 692- CENTRO, CAMPINA GRANDE

INÍCIO: 16/06/2026

PRAZO: 18 MESES

DATA:31/07/2026



MANHÃ			X	
TARDE			X	
NOITE		X		

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	2	AJUDANTE GERAL	5		
ENGENHEIRO FISCAL	1	ARMADOR	-		
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO	-		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	1		
COMPRADOR	-	ALMOXARIFE	1		
VIGIA	2				

TAREFAS REALIZADAS	
1)	DEMOLIÇÃO MANUAL DE RUFO
2)	CHEGADA CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (PAPA METRALHA)
3)	REMOÇÃO VERTICAL DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL
4)	INSTALAÇÃO DE INTERNET NO CANTAEIRO DE OBRAS
5)	
6)	
7)	
8)	
9)	

OCORRÊNCIAS	
1)	
2)	
3)	
4)	
5)	

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO
PHILIPPE NEANDER CAU A126393-5

FISCALIZAÇÃO
GLAYDSTON LEONE CREA 2005805890

CONSULTORIA
LUIZ GONZAGA CREA 16165662-8

Assinado por 4 pessoas: LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS JUNIOR, RUI BARBOSA, RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO e CARLOS NEWTON BELO DE FRANCA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/91BB-E722-267B-15BB>



OBRA:	FASE 2- SAD - REFORMA E RECUPERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
ENDEREÇO:	AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 692, CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB

DATA:	SERVIÇOS EXECUTADOS NESTE DIA
31/07/2026	DEMOLIÇÃO MANUAL DE RUFO
	CHEGADA CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (PAPA METRALHA)
	REMOÇÃO VERTICAL DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL
	INSTALAÇÃO DE INTERNET NO CANTAEIRO DE OBRAS



Documento assinado digitalmente
gov.br PHILIPPE NEANDER DE ARAUJO BEZERRA COSTA
Data: 03/08/2026 12:58:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RESPONSÁVEL TÉCNICO
PHILIPPE NEANDER CAU A126393-5

Documento assinado digitalmente
gov.br GLAYDSTON PEREIRA LEONE
Data: 03/08/2026 13:02:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONSULTORIA
GLAYDSTON LEONE CREA 2005805890

Documento assinado digitalmente
gov.br LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS JUNIOR
Data: 03/08/2026 14:00:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FISCALIZAÇÃO
LUIZ GONZAGA CREA 1616566299

DANIEL ALMEIDA
DA
MOTA:04486859499

Assinado de forma digital por
DANIEL ALMEIDA DA
MOTA:04486859499
Dados: 2026.08.06 13:58:57
-03'00'

Assinado por 4 pessoas: LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS JUNIOR, RUI BARBOSA, RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO e CARLOS NEWTON BELO DE FRANCA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/91BB-E722-267B-15BB> e informe o código 91BB-E722-267B-15BB



Obra

FASE 1 - SAD - RECUPERAÇÃO E REPARO ESTRUTURAL

Contrato Nº 2.08.004/2026

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E RESTAURAÇÃO DE EDIFICAÇÃO HISTÓRICA PERTENCENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, TOMBADA PELO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL (IPHAN).

Período da Medição: 01/07/2026 à 31/07/2026

Cronograma Físico e Financeiro

Cronograma Físico e Financeiro									
Item	Descrição	Total Por Etapa	Executado	agosto-26	setembro-26	outubro-26	novembro-26	dezembro-26	janeiro-27
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	6,25%	15,63%	15,63%	15,63%	15,63%	15,63%	15,63%
		510.865,90	31.910,41	79.825,92	79.825,92	79.825,92	79.825,92	79.825,92	79.825,92
2	SERVIÇOS INICIAIS	100%		50,00%	50,00%				
		99.511,67		49.755,84	49.755,84				
3	PROTEÇÃO SUPERFICIAL	100%			100,00%				
		153.668,81			153.668,81				
4	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	100%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
		639.013,34			159.753,34	159.753,34	159.753,34	159.753,34	
5	REFORÇO ESTRUTURAL	100%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
		525.936,70			131.484,18	131.484,18	131.484,18	131.484,18	
6	PINTURA DE PROTEÇÃO	100%				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		510.208,13				127.552,03	127.552,03	127.552,03	127.552,03
7	LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	100%							100,00%
		35.136,27							35.136,27
Porcentagem		R\$ 2.474.340,82		5,24%	23,22%	20,15%	20,15%	20,15%	9,80%
Custo				129.581,75	574.488,07	498.615,46	498.615,46	498.615,46	242.514,22
Porcentagem Acumulado			1,29%	6,53%	29,74%	49,90%	70,05%	90,20%	100,00%
Custo Acumulado			31.910,41	161.492,16	735.980,23	1.234.595,69	1.733.211,15	2.231.826,60	2.474.340,82

DANIEL ALMEIDA DA
MOTA:0448685949
9

Assinado de forma digital por DANIEL ALMEIDA DA MOTA:0448685949
Dados: 2026.08.06 14:01:44 -03'00'



Contrato Nº 2.08.004/2026

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E RESTAURAÇÃO DE EDIFICAÇÃO HISTÓRICA
PERTENCENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, TOMBADA PELO INSTITUTO DO
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL (IPHAN).

Período da Medição: 01/07/2026 à 31/07/2026

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	Executado	agosto-26	setembro-26	outubro-26	novembro-26	dezembro-26	janeiro-27	fevereiro-27	março-27	abril-27	maio-27	junho-27	julho-27
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	2,58%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%
		833.286,36	21.493,40	67.649,41	67.649,41	67.649,41	67.649,41	67.649,41	67.649,41	67.649,41	67.649,41	67.649,41	67.649,41	67.649,41	67.649,41
2	SERVIÇOS INICIAIS	100%	59,12%	40,88%											
		69.356,39	41.003,26	28.353,13											
3	DEMOLIÇÕES	100%	61,32%	38,68%											
		30.296,59	18.578,17	11.718,42											
4	CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES	100%			10%	20%	20%	30%	20%						
		459.465,29			45.946,53	91.893,06	91.893,06	137.839,59	91.893,06						
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100%					20%	20%	30%	30%					
		295.892,85					59.178,57	59.178,57	88.767,86	88.767,86					
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100%						20%	20%	30%	30%				
		201.717,46						40.343,49	40.343,49	60.515,24	60.515,24				
7	CLIMATIZAÇÃO	100%									50%		50%		
		233.521,82									116.760,91		116.760,91		
8	REVESTIMENTOS	100%							35%	35%	30%				
		690.669,14							241.734,20	241.734,20	207.200,74				
9	PINTURA	100%								30%	35%	35%			
		244.749,10								73.424,73	85.662,19	85.662,19			
10	ESQUADRIAS	100%	0,07%		9,93%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	25,00%					
		373.327,71	255,30		37.077,47	55.999,16	55.999,16	55.999,16	74.665,54	93.331,93					
11	ACESSIBILIDADE	100%										35,00%	35,00%	30,00%	
		54.568,55										19.098,99	19.098,99	16.370,57	
12	COMBATE A INCÊNDIO	100%												50,00%	50,00%
		36.742,92												18.371,46	18.371,46
13	FACHADA	100%							15,00%	20,00%	25,00%	25,00%	15,00%		
		144.761,50							21.714,23	28.952,30	36.190,38	36.190,38	21.714,23		
14	SERVIÇOS FINAIS	100%													100,00%
		6.303,50													6.303,50
Porcentagem		R\$ 3.674.659,18		3,94%	3,09%	5,87%	7,48%	9,82%	17,06%	17,81%	15,62%	5,68%	6,13%	2,79%	2,51%
Custo				144.798,43	113.595,94	215.541,63	274.720,20	361.010,22	626.767,78	654.375,66	573.978,86	208.600,97	225.223,54	102.391,44	92.324,37
Porcentagem Acumulado			2,21%	2,21%	5,30%	11,17%	18,65%	28,47%	45,53%	63,33%	78,95%	84,63%	90,76%	93,55%	96,06%
Custo Acumulado			R\$ 81.330,13	226.128,56	339.724,51	555.266,13	829.986,33	1.190.996,55	1.817.764,34	2.472.140,00	3.046.118,86	3.254.719,83	3.479.943,37	3.582.334,81	3.674.659,18

DANIEL ALMEIDA
DA
MOTA:04486859499

Assinado de forma digital por
DANIEL ALMEIDA DA
MOTA:04486859499
Dados: 2026.08.06 14:01:53
-03'00'



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 91BB-E722-267B-15BB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS JUNIOR (CPF 083.XXX.XXX-58) em 18/08/2026 16:17:27 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RUI BARBOSA (CPF 113.XXX.XXX-87) em 18/08/2026 16:28:17 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO (CPF 203.XXX.XXX-91) em 18/08/2026 16:57:06 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ CARLOS NEWTON BELO DE FRANCA COSTA (CPF 133.XXX.XXX-68) em 19/08/2026 09:29:24 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/91BB-E722-267B-15BB>
