

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 SECOP - SECRETARIA DE OBRAS
 OBJETO: PROJETOS DE ENGENHARIA
 CONTRATO: N° 2.08.017/2023

ORDEM DE SERVIÇO : 26/09/2023
 DATA : 06/11/2023
 MEDIÇÃO : 2ª MEDIÇÃO
 PERÍODO : 15/10/2023 a 31/10/2023



MEDIÇÃO CONSOLIDADA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALORES CONTRATO (R\$)		EXECUTADO MÊS ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO		SALDO CONTRATUAL		
				UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	A EXECUTAR %
1														
CANAL DO PRADO														
1.1	TOPOGRÁFICO	m	840,00	14,88	12.500,00	840,00	12.500,00	-	-	840,00	12.500,00	-	-	0,00%
1.2	HIDROLÓGICO	und	1,00	6.000,00	6.000,00	1,00	6.000,00	-	-	1,00	6.000,00	-	-	0,00%
1.3	GEOLÓGICO	und	1,00	4.500,00	4.500,00	0,10	450,00	0,30	1.350,00	0,40	1.800,00	0,60	2.700,00	60,00%
1.4	GEOTÉCNICO	m	840,00	8,63	7.250,00	336,00	2.900,00	336,00	2.900,00	672,00	5.800,00	168,00	1.450,00	20,00%
1.5	GEOMÉTRICO	m	840,00	19,64	16.500,00	168,00	3.300,00	336,00	6.600,00	504,00	9.900,00	336,00	6.600,00	40,00%
1.6	TERRAPLENAGEM	m	840,00	25,95	21.800,00	-	-	336,00	8.720,00	336,00	8.720,00	504,00	13.080,00	60,00%
1.7	PAVIMENTAÇÃO	m	840,00	9,76	8.200,00	-	-	-	-	-	-	840,00	8.200,00	100,00%
1.8	DRENAGEM	m	840,00	27,98	23.500,00	-	-	-	-	-	-	840,00	23.500,00	100,00%
1.9	ESGOTAMENTO	m	840,00	14,29	12.000,00	-	-	-	-	-	-	840,00	12.000,00	100,00%
1.10	ESTRUTURAL	m	840,00	13,75	11.550,00	-	-	-	-	-	-	840,00	11.550,00	100,00%
1.11	PAISAGÍSTICO	m	840,00	8,57	7.200,00	84,00	720,00	252,00	2.160,00	336,00	2.880,00	504,00	4.320,00	60,00%
1.12	ILUMINAÇÃO	m	840,00	17,05	14.320,00	252,00	4.296,00	420,00	7.160,00	672,00	11.456,00	168,00	2.864,00	20,00%
1.13	SINALIZAÇÃO	m	840,00	9,82	8.250,00	-	-	-	-	-	-	840,00	8.250,00	100,00%
1.14	DESAPROPRIAÇÃO	m	840,00	4,76	4.000,00	-	-	-	-	-	-	840,00	4.000,00	100,00%
1.15	AMBIENTAL	und	1,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	1,00	20.000,00	100,00%
1.16	OBRAS COMPLEMENTARES	m	840,00	11,90	10.000,00	-	-	-	-	-	-	840,00	10.000,00	100,00%
1.17	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m	840,00	38,10	32.000,00	-	-	-	-	-	-	840,00	32.000,00	100,00%
2														
REFORMA DO AÇUDE VELHO / TRATAMENTO														
2.1	TOPOGRÁFICO	m2	260.000,00	0,04	11.200,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	11.200,00	100,00%
2.2	TOPOBATIMÉTRICO	m2	260.000,00	0,06	16.400,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	16.400,00	100,00%
2.3	HIDROLÓGICO	m2	260.000,00	0,09	22.500,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	22.500,00	100,00%
2.4	GEOTÉCNICO/GEOLÓGICO	m2	260.000,00	0,03	8.900,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	8.900,00	100,00%
2.5	GEOMÉTRICO	m2	260.000,00	0,08	20.150,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	20.150,00	100,00%
2.6	TERRAPLENAGEM	m2	260.000,00	0,06	16.450,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	16.450,00	100,00%
2.7	PAVIMENTAÇÃO	m2	260.000,00	0,10	25.200,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	25.200,00	100,00%
2.8	DRENAGEM	m2	260.000,00	0,16	41.500,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	41.500,00	100,00%
2.9	ARQUITETÔNICO	m2	260.000,00	0,17	45.000,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	45.000,00	100,00%
2.10	HIDRO-SANITÁRIO	m2	260.000,00	0,07	18.450,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	18.450,00	100,00%
2.11	ABSTECIMENTO	m2	260.000,00	0,05	12.000,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	12.000,00	100,00%
2.12	ESGOTAMENTO	m2	260.000,00	0,05	12.000,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	12.000,00	100,00%
2.13	TRATAMENTO DE EFLUENTE	m2	260.000,00	0,15	38.400,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	38.400,00	100,00%
2.14	DRAGAGEM	m2	260.000,00	0,04	10.000,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	10.000,00	100,00%
2.15	ESTRUTURAL	m2	260.000,00	0,15	38.000,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	38.000,00	100,00%
2.16	PAISAGÍSTICO	m2	260.000,00	0,11	28.700,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	28.700,00	100,00%
2.17	ILUMINAÇÃO	m2	260.000,00	0,10	25.000,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	25.000,00	100,00%
2.18	SINALIZAÇÃO	m2	260.000,00	0,05	14.200,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	14.200,00	100,00%
2.19	DESAPROPRIAÇÃO	m2	260.000,00	0,02	6.400,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	6.400,00	100,00%
2.20	AMBIENTAL	und	1,00	38.250,00	38.250,00	-	-	-	-	-	-	1,00	38.250,00	100,00%
2.21	OBRAS COMPLEMENTARES	m2	260.000,00	0,05	12.500,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	12.500,00	100,00%
2.22	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m2	260.000,00	0,15	39.800,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	39.800,00	100,00%
3														
ORLA DO AÇUDE DE BODOCONGÓ														
3.1	TOPOGRÁFICO	m2	510.000,00	0,02	8.500,00	510.000,00	8.500,00	-	-	510.000,00	8.500,00	-	-	0,00%
3.2	TOPOBATIMÉTRICO	m2	510.000,00	0,02	12.000,00	102.000,00	2.400,00	51.000,00	1.200,00	153.000,00	3.600,00	357.000,00	8.400,00	70,00%
3.3	HIDROLÓGICO	m2	510.000,00	0,02	8.000,00	510.000,00	8.000,00	-	-	510.000,00	8.000,00	-	-	0,00%
3.4	GEOTÉCNICO/GEOLÓGICO	m2	510.000,00	0,01	6.400,00	-	-	-	-	-	-	510.000,00	6.400,00	100,00%
3.5	GEOMÉTRICO	m2	510.000,00	0,00	0,01	204.000,00	0,00	102.000,00	0,00	306.000,00	0,01	204.000,00	0,00	40,00%
3.6	TERRAPLENAGEM	m2	510.000,00	0,02	12.000,00	153.000,00	3.600,00	102.000,00	2.400,00	255.000,00	6.000,00	255.000,00	6.000,00	50,00%
3.7	PAVIMENTAÇÃO	m2	510.000,00	0,02	8.000,00	-	-	-	-	-	-	510.000,00	8.000,00	100,00%
3.8	DRENAGEM	m2	510.000,00	0,05	24.200,00	-	-	-	-	-	-	510.000,00	24.200,00	100,00%
3.9	HIDRO-SANITÁRIO	m2	510.000,00	0,02	9.500,00	-	-	510.000,00	9.500,00	510.000,00	9.500,00	-	-	0,00%
3.10	ESGOTAMENTO	m2	510.000,00	0,02	9.500,00	-	-	510.000,00	9.500,00	510.000,00	9.500,00	-	-	0,00%
3.11	TRATAMENTO DE EFLUENTE	m2	510.000,00	0,06	28.200,00	-	-	-	-	-	-	510.000,00	28.200,00	100,00%
3.12	DRAGAGEM	m2	510.000,00	0,02	8.000,00	-	-	-	-	-	-	510.000,00	8.000,00	100,00%
3.13	ILUMINAÇÃO	m2	510.000,00	0,03	14.700,00	-	-	-	-	-	-	510.000,00	14.700,00	100,00%
3.14	SINALIZAÇÃO	m2	510.000,00	0,02	9.000,00	-	-	-	-	-	-	510.000,00	9.000,00	100,00%

Mariana Damasceno Delfino
 SECOP / PMCG
 Matrícula 29289

ATECEL Associação Técnico Científica
 Ernesto Luiz de Oliveira Júnior

Francisco Barbosa de Lucena
 ENGENHEIRO - CREA 1603211195

Raimundo S. Carvalho
 Nº 100.104.517-4
 Coordenador de Obras
 SECOP/PMCG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 SECOB - SECRETARIA DE OBRAS
 OBJETO: PROJETOS DE ENGENHARIA
 CONTRATO: N° 2.08.017/2023

ORDEM DE SERVIÇO : 26/09/2023
 DATA : 06/11/2023
 MEDIÇÃO : 2ª MEDIÇÃO
 PERÍODO : 15/10/2023 a 31/10/2023



MEDIÇÃO CONSOLIDADA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALORES CONTRATO (R\$)		EXECUTADO MÊS ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO		SALDO CONTRATUAL		
				UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	A EXECUTAR %
3.15	AMBIENTAL	m2	510.000,00	0,03	15.250,00	-	-	-	-	-	-	510.000,00	15.250,00	100,00%
3.16	OBRAS COMPLEMENTARES	m2	510.000,00	0,02	8.000,00	-	-	-	-	-	-	510.000,00	8.000,00	100,00%
3.17	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m2	510.000,00	0,04	22.800,00	-	-	-	-	-	-	510.000,00	22.800,00	100,00%
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CORREDORES DE ÔNIBUS													
4.1	TOPOGRÁFICO	m	10.000,00	2,60	26.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	26.000,00	100,00%
4.2	GEOTÉCNICO	m	10.000,00	3,20	32.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	32.000,00	100,00%
4.3	TRÁFEGO	m	10.000,00	2,97	29.700,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	29.700,00	100,00%
4.4	GEOMETRIA	m	10.000,00	3,18	31.800,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	31.800,00	100,00%
4.5	TERRAPLENAGEM	m	10.000,00	3,20	32.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	32.000,00	100,00%
4.6	PAVIMENTAÇÃO	m	10.000,00	2,83	28.250,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	28.250,00	100,00%
4.7	DRENAGEM	m	10.000,00	3,53	35.250,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	35.250,00	100,00%
4.8	SINALIZAÇÃO	m	10.000,00	2,20	22.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	22.000,00	100,00%
4.9	OBRAS COMPLEMENTARES	m	10.000,00	0,85	8.500,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	8.500,00	100,00%
4.10	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m	10.000,00	2,65	26.500,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	26.500,00	100,00%
5	ESTAÇÃO NOVA FERROVIÁRIA													
5.1	HIDROLÓGICO	m2	56.800,00	0,15	8.500,00	56.800,00	8.500,00	-	-	56.800,00	8.500,00	-	-	0,00%
5.2	GEOTÉCNICO	m2	56.800,00	0,25	14.000,00	56.800,00	14.000,00	-	-	56.800,00	14.000,00	-	-	0,00%
5.3	INVENTÁRIO	m2	56.800,00	0,15	8.700,00	-	-	-	-	-	-	56.800,00	8.700,00	100,00%
5.4	ARQUITETÔNICO	m2	56.800,00	0,57	32.100,00	34.080,00	19.260,00	11.360,00	6.420,00	45.440,00	25.680,00	11.360,00	6.420,00	20,00%
5.5	ESTRUTURAL	m2	56.800,00	0,81	46.200,00	34.080,00	27.720,00	-	-	34.080,00	27.720,00	22.720,00	18.480,00	40,00%
5.6	RESTAURAÇÃO PREDIAL	m2	56.800,00	0,62	35.000,00	25.560,00	15.750,00	-	-	25.560,00	15.750,00	31.240,00	19.250,00	55,00%
5.7	REABILITAÇÃO DE IMOVEIS	m2	56.800,00	0,26	14.800,00	25.560,00	6.660,00	-	-	25.560,00	6.660,00	31.240,00	8.140,00	55,00%
5.8	GEOMÉTRICO	m2	56.800,00	0,46	26.000,00	22.720,00	10.400,00	-	-	22.720,00	10.400,00	34.080,00	15.600,00	60,00%
5.9	TERRAPLENAGEM	m2	56.800,00	0,67	38.000,00	17.040,00	11.400,00	11.360,00	7.600,00	28.400,00	19.000,00	28.400,00	19.000,00	50,00%
5.10	PAVIMENTAÇÃO	m2	56.800,00	0,26	14.600,00	-	-	17.040,00	4.380,00	17.040,00	4.380,00	39.760,00	10.220,00	70,00%
5.11	DRENAGEM	m2	56.800,00	0,68	38.400,00	-	-	17.040,00	11.520,00	17.040,00	11.520,00	39.760,00	26.880,00	70,00%
5.12	HIDRO-SANITÁRIO	m2	56.800,00	0,53	30.250,00	34.080,00	18.150,00	-	-	34.080,00	18.150,00	22.720,00	12.100,00	40,00%
5.13	PÂNICO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊDIO	m2	56.800,00	0,51	28.700,00	-	-	-	-	-	-	56.800,00	28.700,00	100,00%
5.14	ELÉTRICO E SPDA	m2	56.800,00	0,45	25.400,00	-	-	-	-	-	-	56.800,00	25.400,00	100,00%
5.15	LÓGICA E CMTV	m2	56.800,00	0,33	18.500,00	-	-	-	-	-	-	56.800,00	18.500,00	100,00%
5.16	PAISAGÍSTICO	m2	56.800,00	0,15	8.500,00	19.880,00	2.975,00	-	-	19.880,00	2.975,00	36.920,00	5.525,00	65,00%
5.17	ILUMINAÇÃO (LUMINOTÉCNICO)	m2	56.800,00	0,21	11.800,00	19.880,00	4.130,00	-	-	19.880,00	4.130,00	36.920,00	7.670,00	65,00%
5.18	SINALIZAÇÃO	m2	56.800,00	0,40	22.500,00	-	-	-	-	-	-	56.800,00	22.500,00	100,00%
5.19	DESAPROPRIAÇÃO	m2	56.800,00	0,11	6.500,00	-	-	-	-	-	-	56.800,00	6.500,00	100,00%
5.20	AMBIENTAL	m2	56.800,00	0,37	21.200,00	-	-	-	-	-	-	56.800,00	21.200,00	100,00%
5.21	OBRAS COMPLEMENTARES	m2	56.800,00	0,14	8.000,00	-	-	-	-	-	-	56.800,00	8.000,00	100,00%
5.22	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m2	56.800,00	0,62	35.000,00	-	-	-	-	-	-	56.800,00	35.000,00	100,00%
6	TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL													
6.1	LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO CADASTRAL	m2	2.100,00	2,48	5.200,00	-	-	-	-	-	-	2.100,00	5.200,00	100,00%
6.2	DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO	m2	2.100,00	2,48	5.200,00	-	-	-	-	-	-	2.100,00	5.200,00	100,00%
6.3	RESTAURAÇÃO PREDIAL	m2	2.100,00	3,81	8.000,00	-	-	-	-	-	-	2.100,00	8.000,00	100,00%
6.4	DRENAGEM	m2	2.100,00	2,14	4.500,00	-	-	-	-	-	-	2.100,00	4.500,00	100,00%
6.5	HIDRO-SANITÁRIO	m2	2.100,00	3,90	8.200,00	-	-	-	-	-	-	2.100,00	8.200,00	100,00%
6.6	ELÉTRICO E SPDA	m2	2.100,00	6,10	12.800,00	-	-	-	-	-	-	2.100,00	12.800,00	100,00%
6.7	LÓGICA E CMTV	m2	2.100,00	4,05	8.500,00	-	-	-	-	-	-	2.100,00	8.500,00	100,00%
6.8	PAISAGÍSTICO	m2	2.100,00	2,29	4.800,00	-	-	-	-	-	-	2.100,00	4.800,00	100,00%
6.9	LUMINOTÉCNICO	m2	2.100,00	5,24	11.000,00	-	-	-	-	-	-	2.100,00	11.000,00	100,00%
6.10	PÂNICO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊDIO	m2	2.100,00	5,81	12.200,00	-	-	-	-	-	-	2.100,00	12.200,00	100,00%
6.11	ACÚSTICO	m2	2.100,00	5,48	11.500,00	-	-	-	-	-	-	2.100,00	11.500,00	100,00%
6.12	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m2	2.100,00	9,52	20.000,00	-	-	-	-	-	-	2.100,00	20.000,00	100,00%
7	BIBLIOTECA MUNICIPAL FÉLIX ARAÚJO													
7.1	LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO CADASTRAL	m2	340,00	17,65	6.000,00	-	-	-	-	-	-	340,00	6.000,00	100,00%
7.2	DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO	m2	340,00	13,24	4.500,00	-	-	-	-	-	-	340,00	4.500,00	100,00%
7.3	ESTRUTURAL	m2	340,00	21,32	7.250,00	-	-	-	-	-	-	340,00	7.250,00	100,00%
7.4	RESTAURAÇÃO PREDIAL	m2	340,00	18,24	6.200,00	-	-	-	-	-	-	340,00	6.200,00	100,00%
7.5	HIDRO-SANITÁRIO	m2	340,00	14,12	4.800,00	-	-	-	-	-	-	340,00	4.800,00	100,00%

Mariana Damasceno Delfino
 SECOB / PMCG
 Matrícula 29289

ATECEL - Associação Técnico Científica
 Ernesto Luiz de Oliveira Júnior

Francisco Barbosa de Lucena
 ENGENHEIRO - CREA 1603211195

Amunildo S. Carvalho
 Matrícula 104.517/4
 Coordenador de Obras
 SECOB/PMCG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 SECOP - SECRETARIA DE OBRAS
 OBJETO: PROJETOS DE ENGENHARIA
 CONTRATO: N° 2.08.017/2023

ORDEM DE SERVIÇO : 26/09/2023
 DATA : 06/11/2023
 MEDIÇÃO : 2ª MEDIÇÃO
 PERÍODO : 15/10/2023 a 31/10/2023



MEDIÇÃO CONSOLIDADA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALORES CONTRATO (R\$)		EXECUTADO MÊS ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO		SALDO CONTRATUAL		
				UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	A EXECUTAR %
7.6	ELÉTRICO E SPDA	m2	340,00	24,26	8.250,00	-	-	-	-	-	-	340,00	8.250,00	100,00%
7.7	LÓGICA E CMTV	m2	340,00	19,12	6.500,00	-	-	-	-	-	-	340,00	6.500,00	100,00%
7.8	LUMINOTÉCNICO	m2	340,00	25,59	8.700,00	-	-	-	-	-	-	340,00	8.700,00	100,00%
7.9	PÂNICO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	m2	340,00	27,94	9.500,00	-	-	-	-	-	-	340,00	9.500,00	100,00%
7.10	ACÚSTICO	m2	340,00	10,29	3.500,00	-	-	-	-	-	-	340,00	3.500,00	100,00%
7.11	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m2	340,00	19,12	6.500,00	-	-	-	-	-	-	340,00	6.500,00	100,00%
8	PRAÇA CLEMENTINO PROCÓPIO													
8.1	TOPOGRÁFICO	m2	13.000,00	0,65	8.500,00	-	-	-	-	-	-	13.000,00	8.500,00	100,00%
8.2	HIDROLÓGICO	m2	13.000,00	0,48	6.200,00	-	-	-	-	-	-	13.000,00	6.200,00	100,00%
8.3	TRÁFEGO	m2	13.000,00	0,35	4.500,00	-	-	-	-	-	-	13.000,00	4.500,00	100,00%
8.4	GEOMÉTRICO	m2	13.000,00	0,00	0,01	-	-	-	-	-	-	13.000,00	0,01	100,00%
8.5	TERRAPLENAGEM	m2	13.000,00	0,35	4.500,00	-	-	-	-	-	-	13.000,00	4.500,00	100,00%
8.6	PAVIMENTAÇÃO	m2	13.000,00	0,32	4.200,00	-	-	-	-	-	-	13.000,00	4.200,00	100,00%
8.7	DRENAGEM	m2	13.000,00	0,62	8.000,00	-	-	-	-	-	-	13.000,00	8.000,00	100,00%
8.8	ESGOTAMENTO	m2	13.000,00	0,52	6.800,00	-	-	-	-	-	-	13.000,00	6.800,00	100,00%
8.9	PAISAGÍSTICO	m2	13.000,00	0,75	9.800,00	-	-	-	-	-	-	13.000,00	9.800,00	100,00%
8.10	ILUMINAÇÃO E LUMINOTÉCNICO	m2	13.000,00	0,52	6.800,00	-	-	-	-	-	-	13.000,00	6.800,00	100,00%
8.11	SINALIZAÇÃO	m2	13.000,00	0,31	4.000,00	-	-	-	-	-	-	13.000,00	4.000,00	100,00%
8.12	AMBIENTAL	m2	13.000,00	0,92	12.000,00	-	-	-	-	-	-	13.000,00	12.000,00	100,00%
8.13	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m2	13.000,00	0,73	9.450,00	-	-	-	-	-	-	13.000,00	9.450,00	100,00%
9	FEIRA DA PRATA													
9.1	LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO CADASTRAL	m2	13.200,00	0,70	9.250,00	-	-	-	-	-	-	13.200,00	9.250,00	100,00%
9.2	LAUDOS ESTRUTURAIIS (METÁLICO)	m2	13.200,00	1,89	25.000,00	-	-	-	-	-	-	13.200,00	25.000,00	100,00%
9.3	DRENAGEM	m2	13.200,00	0,62	8.200,00	-	-	-	-	-	-	13.200,00	8.200,00	100,00%
9.4	ABASTECIMENTO INTERNO	m2	13.200,00	0,97	12.800,00	-	-	-	-	-	-	13.200,00	12.800,00	100,00%
9.5	ESGOTAMENTO	m2	13.200,00	0,91	12.000,00	-	-	-	-	-	-	13.200,00	12.000,00	100,00%
9.6	LÓGICA E CMTV	m2	13.200,00	1,10	14.500,00	-	-	-	-	-	-	13.200,00	14.500,00	100,00%
9.7	PAISAGÍSTICO	m2	13.200,00	0,61	8.000,00	-	-	-	-	-	-	13.200,00	8.000,00	100,00%
9.8	ELÉTRICO E LUMINOTÉCNICO	m2	13.200,00	2,65	35.000,00	-	-	-	-	-	-	13.200,00	35.000,00	100,00%
9.9	SINALIZAÇÃO EXTERNA E INTERNA	m2	13.200,00	0,74	9.800,00	-	-	-	-	-	-	13.200,00	9.800,00	100,00%
9.10	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m2	13.200,00	1,21	16.000,00	-	-	-	-	-	-	13.200,00	16.000,00	100,00%
10	PARQUE TECNOLÓGICO DE CAMPINA GRANDE													
10.1	TOPOGRÁFICO	m2	260.000,00	0,05	12.500,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	12.500,00	100,00%
10.2	HIDROLÓGICO	m2	260.000,00	0,06	15.500,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	15.500,00	100,00%
10.3	GEOTÉCNICO	m2	260.000,00	0,07	18.000,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	18.000,00	100,00%
10.4	GEOMÉTRICO	m2	260.000,00	0,06	14.800,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	14.800,00	100,00%
10.5	TERRAPLENAGEM	m2	260.000,00	0,09	24.000,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	24.000,00	100,00%
10.6	PAVIMENTAÇÃO	m2	260.000,00	0,06	15.600,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	15.600,00	100,00%
10.7	DRENAGEM	m2	260.000,00	0,10	26.800,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	26.800,00	100,00%
10.8	PAISAGÍSTICO	m2	260.000,00	0,05	12.500,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	12.500,00	100,00%
10.9	ILUMINAÇÃO E LUMINOTÉCNICO EXTERNO	m2	260.000,00	0,07	17.600,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	17.600,00	100,00%
10.10	SINALIZAÇÃO	m2	260.000,00	0,03	8.500,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	8.500,00	100,00%
10.11	AMBIENTAL	m2	260.000,00	0,07	18.200,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	18.200,00	100,00%
10.12	OBRAS COMPLEMENTARES	m2	260.000,00	0,03	8.000,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	8.000,00	100,00%
10.13	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m2	260.000,00	0,09	23.000,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	23.000,00	100,00%
11	DUPLICAÇÃO AVENIDA AEROCULUBE													
11.1	TOPOGRÁFICO	m	1.400,00	6,07	8.500,00	-	-	-	-	-	-	1.400,00	8.500,00	100,00%
11.2	HIDROLÓGICO	m	1.400,00	8,93	12.500,00	-	-	-	-	-	-	1.400,00	12.500,00	100,00%
11.3	GEOTÉCNICO/GEOLÓGICO	m	1.400,00	5,71	8.000,00	-	-	-	-	-	-	1.400,00	8.000,00	100,00%
11.4	TRÁFEGO	m	1.400,00	6,79	9.500,00	-	-	-	-	-	-	1.400,00	9.500,00	100,00%
11.5	GEOMÉTRICO	m	1.400,00	8,71	12.200,00	-	-	-	-	-	-	1.400,00	12.200,00	100,00%
11.6	TERRAPLENAGEM	m	1.400,00	11,79	16.500,00	-	-	-	-	-	-	1.400,00	16.500,00	100,00%
11.7	PAVIMENTAÇÃO	m	1.400,00	10,36	14.500,00	-	-	-	-	-	-	1.400,00	14.500,00	100,00%
11.8	DRENAGEM	m	1.400,00	14,18	19.850,00	-	-	-	-	-	-	1.400,00	19.850,00	100,00%
11.9	PAISAGÍSTICO	m	1.400,00	3,21	4.500,00	-	-	-	-	-	-	1.400,00	4.500,00	100,00%
11.10	ELÉTRICO E LUMINOTÉCNICO	m	1.400,00	8,43	11.800,00	-	-	-	-	-	-	1.400,00	11.800,00	100,00%

Mariana Damasceno Delfino
 SECOP / PMCG
 Matrícula 29289

ATECEL - Associação Técnico Científica
 Ernesto Luiz de Oliveira Júnior

Francisco Barbosa de Lucena
 ENGENHEIRO, CREA 1603211195

Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN-15704/1517/4
 Coordenador de Obras
 SECOP/PMCG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 SECOP - SECRETARIA DE OBRAS
 OBJETO: PROJETOS DE ENGENHARIA
 CONTRATO: N° 2.08.017/2023

ORDEM DE SERVIÇO : 26/09/2023
 DATA : 06/11/2023
 MEDIÇÃO : 2ª MEDIÇÃO
 PERÍODO : 15/10/2023 a 31/10/2023



MEDIÇÃO CONSOLIDADA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALORES CONTRATO (R\$)		EXECUTADO MÊS ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO		SALDO CONTRATUAL		
				UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	A EXECUTAR %
11.11	SINALIZAÇÃO	m	1.400,00	6,43	9.000,00	-	-	-	-	-	-	1.400,00	9.000,00	100,00%
11.12	DESAPROPRIAÇÃO	m	1.400,00	12,50	17.500,00	-	-	-	-	-	-	1.400,00	17.500,00	100,00%
11.13	AMBIENTAL	m	1.400,00	4,64	6.500,00	-	-	-	-	-	-	1.400,00	6.500,00	100,00%
11.14	OBRAS COMPLEMENTARES	m	1.400,00	4,68	6.550,00	-	-	-	-	-	-	1.400,00	6.550,00	100,00%
11.15	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m	1.400,00	7,50	10.500,00	-	-	-	-	-	-	1.400,00	10.500,00	100,00%
12 AV. JOSUÉ SYLVESTRE														
12.1	TOPOGRÁFICO/HIDROLÓGICO	m	840,00	13,39	11.250,00	840,00	11.250,00	-	-	840,00	11.250,00	-	-	0,00%
12.2	GEOTÉCNICO/GEOLÓGICO	m	840,00	7,74	6.500,00	840,00	6.500,00	-	-	840,00	6.500,00	-	-	0,00%
12.3	TRÁFEGO	m	840,00	11,31	9.500,00	840,00	9.500,00	-	-	840,00	9.500,00	-	-	0,00%
12.4	GEOMÉTRICO	m	840,00	14,05	11.800,00	840,00	11.800,00	-	-	840,00	11.800,00	-	-	0,00%
12.5	TERRAPLENAGEM	m	840,00	22,02	18.500,00	840,00	18.500,00	-	-	840,00	18.500,00	-	-	0,00%
12.6	PAVIMENTAÇÃO	m	840,00	14,29	12.000,00	840,00	12.000,00	-	-	840,00	12.000,00	-	-	0,00%
12.7	DRENAGEM	m	840,00	31,55	26.500,00	588,00	18.550,00	252,00	7.950,00	840,00	26.500,00	-	-	0,00%
12.8	PAISAGÍSTICO	m	840,00	9,76	8.200,00	588,00	5.740,00	252,00	2.460,00	840,00	8.200,00	-	-	0,00%
12.9	ELÉTRICO E LUMINOTÉCNICO	m	840,00	16,07	13.500,00	-	-	840,00	13.500,00	840,00	13.500,00	-	-	0,00%
12.10	SINALIZAÇÃO	m	840,00	11,31	9.500,00	-	-	840,00	9.500,00	840,00	9.500,00	-	-	0,00%
12.11	DESAPROPRIAÇÃO	m	840,00	41,67	35.000,00	-	-	840,00	35.000,00	840,00	35.000,00	-	-	0,00%
12.12	AMBIENTAL	m	840,00	17,86	15.000,00	-	-	840,00	15.000,00	840,00	15.000,00	-	-	0,00%
12.13	OBRAS COMPLEMENTARES	m	840,00	9,52	8.000,00	-	-	840,00	8.000,00	840,00	8.000,00	-	-	0,00%
12.14	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m	840,00	29,76	25.000,00	-	-	840,00	25.000,00	840,00	25.000,00	-	-	0,00%
13 AV. FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA														
13.1	TOPOGRÁFICO	m	4.400,00	-	-	4.400,00	-	-	-	4.400,00	-	-	-	#DIV/0!
13.2	HIDROLÓGICO	m	4.400,00	3,64	16.000,00	1.760,00	6.400,00	1.320,00	4.800,00	3.080,00	11.200,00	1.320,00	4.800,00	30,00%
13.3	TRÁFEGO	m	4.400,00	1,86	8.200,00	-	-	1.320,00	2.460,00	1.320,00	2.460,00	3.080,00	5.740,00	70,00%
13.4	GEOTÉCNICO/GEOLÓGICO	m	4.400,00	3,24	14.250,00	-	-	-	-	-	-	4.400,00	14.250,00	100,00%
13.5	GEOMÉTRICO	m	4.400,00	3,30	14.500,00	-	-	-	-	-	-	4.400,00	14.500,00	100,00%
13.6	TERRAPLENAGEM	m	4.400,00	4,89	21.500,00	-	-	-	-	-	-	4.400,00	21.500,00	100,00%
13.7	PAVIMENTAÇÃO	m	4.400,00	3,11	13.700,00	-	-	-	-	-	-	4.400,00	13.700,00	100,00%
13.8	DRENAGEM	m	4.400,00	6,77	29.800,00	-	-	-	-	-	-	4.400,00	29.800,00	100,00%
13.9	PAISAGÍSTICO	m	4.400,00	2,73	12.000,00	-	-	-	-	-	-	4.400,00	12.000,00	100,00%
13.10	ELÉTRICO E LUMINOTÉCNICO	m	4.400,00	3,55	15.600,00	-	-	-	-	-	-	4.400,00	15.600,00	100,00%
13.11	SINALIZAÇÃO	m	4.400,00	3,18	14.000,00	-	-	-	-	-	-	4.400,00	14.000,00	100,00%
13.12	DESAPROPRIAÇÃO	m	4.400,00	7,09	31.200,00	-	-	-	-	-	-	4.400,00	31.200,00	100,00%
13.13	AMBIENTAL	m	4.400,00	3,36	14.800,00	-	-	-	-	-	-	4.400,00	14.800,00	100,00%
13.14	OBRAS COMPLEMENTARES	m	4.400,00	1,36	6.000,00	-	-	-	-	-	-	4.400,00	6.000,00	100,00%
13.15	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m	4.400,00	6,25	27.500,00	-	-	-	-	-	-	4.400,00	27.500,00	100,00%
14 PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA														
14.1	TOPOGRÁFICO	m	10.000,00	3,39	33.900,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	33.900,00	100,00%
14.2	HIDROLÓGICO	m	10.000,00	1,68	16.800,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	16.800,00	100,00%
14.3	GEOTÉCNICO	m	10.000,00	2,15	21.500,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	21.500,00	100,00%
14.4	INVENTÁRIO	m	10.000,00	1,18	11.800,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	11.800,00	100,00%
14.5	ARQUITETÔNICO E URBANÍSTICO	m	10.000,00	2,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	20.000,00	100,00%
14.6	ESTRUTURAL	m	10.000,00	1,18	11.800,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	11.800,00	100,00%
14.7	GEOMÉTRICO	m	10.000,00	0,97	9.700,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	9.700,00	100,00%
14.8	TERRAPLENAGEM	m	10.000,00	1,20	12.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	12.000,00	100,00%
14.9	PAVIMENTAÇÃO	m	10.000,00	2,66	26.600,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	26.600,00	100,00%
14.10	DRENAGEM	m	10.000,00	2,89	28.900,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	28.900,00	100,00%
14.11	PAISAGÍSTICO	m	10.000,00	0,94	9.400,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	9.400,00	100,00%
14.12	LUMINOTÉCNICO	m	10.000,00	1,65	16.500,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	16.500,00	100,00%
14.13	SINALIZAÇÃO	m	10.000,00	1,69	16.900,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	16.900,00	100,00%
14.14	DESAPROPRIAÇÃO	m	10.000,00	0,95	9.500,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	9.500,00	100,00%
14.15	AMBIENTAL	m	10.000,00	0,88	8.800,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	8.800,00	100,00%
14.16	OBRAS COMPLEMENTARES	m	10.000,00	0,36	3.600,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	3.600,00	100,00%
14.17	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m	10.000,00	2,30	23.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	23.000,00	100,00%
15 GERENCIAMENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO														
15.1	ENGENHEIRO COORDENADOR	mês	12,00	12.500,00	150.000,00	0,60	7.500,00	0,57	7.083,33	1,17	14.583,33	10,83	135.416,67	90,28%

Mariana Damasceno Delfino
 SECOP / PMCG
 Matrícula 29289

ATECEL - Associação Técnico Científica
 Ernesto Luiz de Oliveira Júnior
 Francisco Barbosa de Lucena
 ENGENHEIRO - CREA 1603211195

Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN 1603211195
 Coordenador de Obras
 SECOP/PMCG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 SECOP - SECRETARIA DE OBRAS
 OBJETO: PROJETOS DE ENGENHARIA
 CONTRATO: N° 2.08.017/2023

ORDEM DE SERVIÇO : 26/09/2023
 DATA : 06/11/2023
 MEDIÇÃO : 2ª MEDIÇÃO
 PERÍODO : 15/10/2023 a 31/10/2023



MEDIÇÃO CONSOLIDADA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALORES CONTRATO (R\$)		EXECUTADO MÊS ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO		SALDO CONTRATUAL		
				UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	A EXECUTAR %
15.2	ENGENHEIRO JÚNIOR	mês	12,00	8.000,00	96.000,00	0,60	4.800,00	0,57	4.533,33	1,17	9.333,33	10,83	86.666,67	90,28%
15.3	CADISTA (DESENHISTA)	mês	12,00	4.500,00	54.000,00	0,60	2.700,00	0,57	2.550,00	1,17	5.250,00	10,83	48.750,00	90,28%
15.4	GERENTE DE RECURSOS HUMANOS	mês	12,00	7.250,00	87.000,00	0,60	4.350,00	0,57	4.108,33	1,17	8.458,33	10,83	78.541,67	90,28%
15.5	GERENTE JURÍDICO	mês	12,00	7.250,00	87.000,00	0,60	4.350,00	0,57	4.108,33	1,17	8.458,33	10,83	78.541,67	90,28%
15.6	MOTORISTA	mês	12,00	3.500,00	42.000,00	0,60	2.100,00	0,57	1.983,33	1,17	4.083,33	10,83	37.916,67	90,28%
15.7	VEÍCULO TIPO SEDAN	mês	12,00	3.000,00	36.000,00	0,60	1.800,00	0,57	1.700,00	1,17	3.500,00	10,83	32.500,00	90,28%
15.8	MOBILIÁRIO	mês	12,00	4.500,00	54.000,00	0,60	2.700,00	0,57	2.550,00	1,17	5.250,00	10,83	48.750,00	90,28%
15.9	EQUIPAMENTOS (NOTEBOOK, MONITORES, IMPRESSORAS, ETC)	mês	12,00	4.000,00	48.000,00	0,60	2.400,00	0,57	2.266,67	1,17	4.666,67	10,83	43.333,33	90,28%
15.10	MOBILIZAÇÃO (COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO)	mês	12,00	3.444,44	41.333,33	0,60	2.066,67	0,57	1.951,85	1,17	4.018,52	10,83	37.314,81	90,28%
15.11	IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO, MATERIAIS, GUIAS, TAXAS, DIVERSOS	mês	12,00	2.000,00	24.000,00	0,60	1.200,00	0,57	1.133,33	1,17	2.333,33	10,83	21.666,67	90,28%
15.12	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS (10% SOBRE O ESTIMADO MENSAL - ESTUDOS, PROJETOS E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS) - (Hum doze avos da soma de Estimativa dos Custos de Projeto)	mês	12,00	36.120,36	433.444,37	0,60	21.672,22	0,57	20.468,21	1,17	42.140,42	10,83	391.303,94	90,28%
9	VALORES TOTAIS	SOMA			4.373.847,72		349.489,89		259.516,73	-	609.006,62		3.764.841,10	86,08%

ATECEL - Associação Técnico Científica
 Ernesto Luiz de Oliveira Júnior
 FRANCISCO BARBOSA DE LUCENA
 Eng. Responsável ATECEL

RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
 Coordenador de Obras - SECOP
 Coordenador de Obras
 SECOP/PMCG

Mariana Damasceno Delfino
 SECOP / PMCG
 Matrícula 29289

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECOB - SECRETARIA DE OBRAS

OBJETO: PROJETOS DE ENGENHARIA


CONTRATO: N° 2.08.017/202:

ELABORAÇÃO: ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JÚNIOR



O. SERVIÇO : 26/09/2023
 DATA : 06/11/2023
 MEDIÇÃO : 2ª MEDIÇÃO
 PERÍODO : 15/10/2023 a 31/10/2023

CURVA "S"

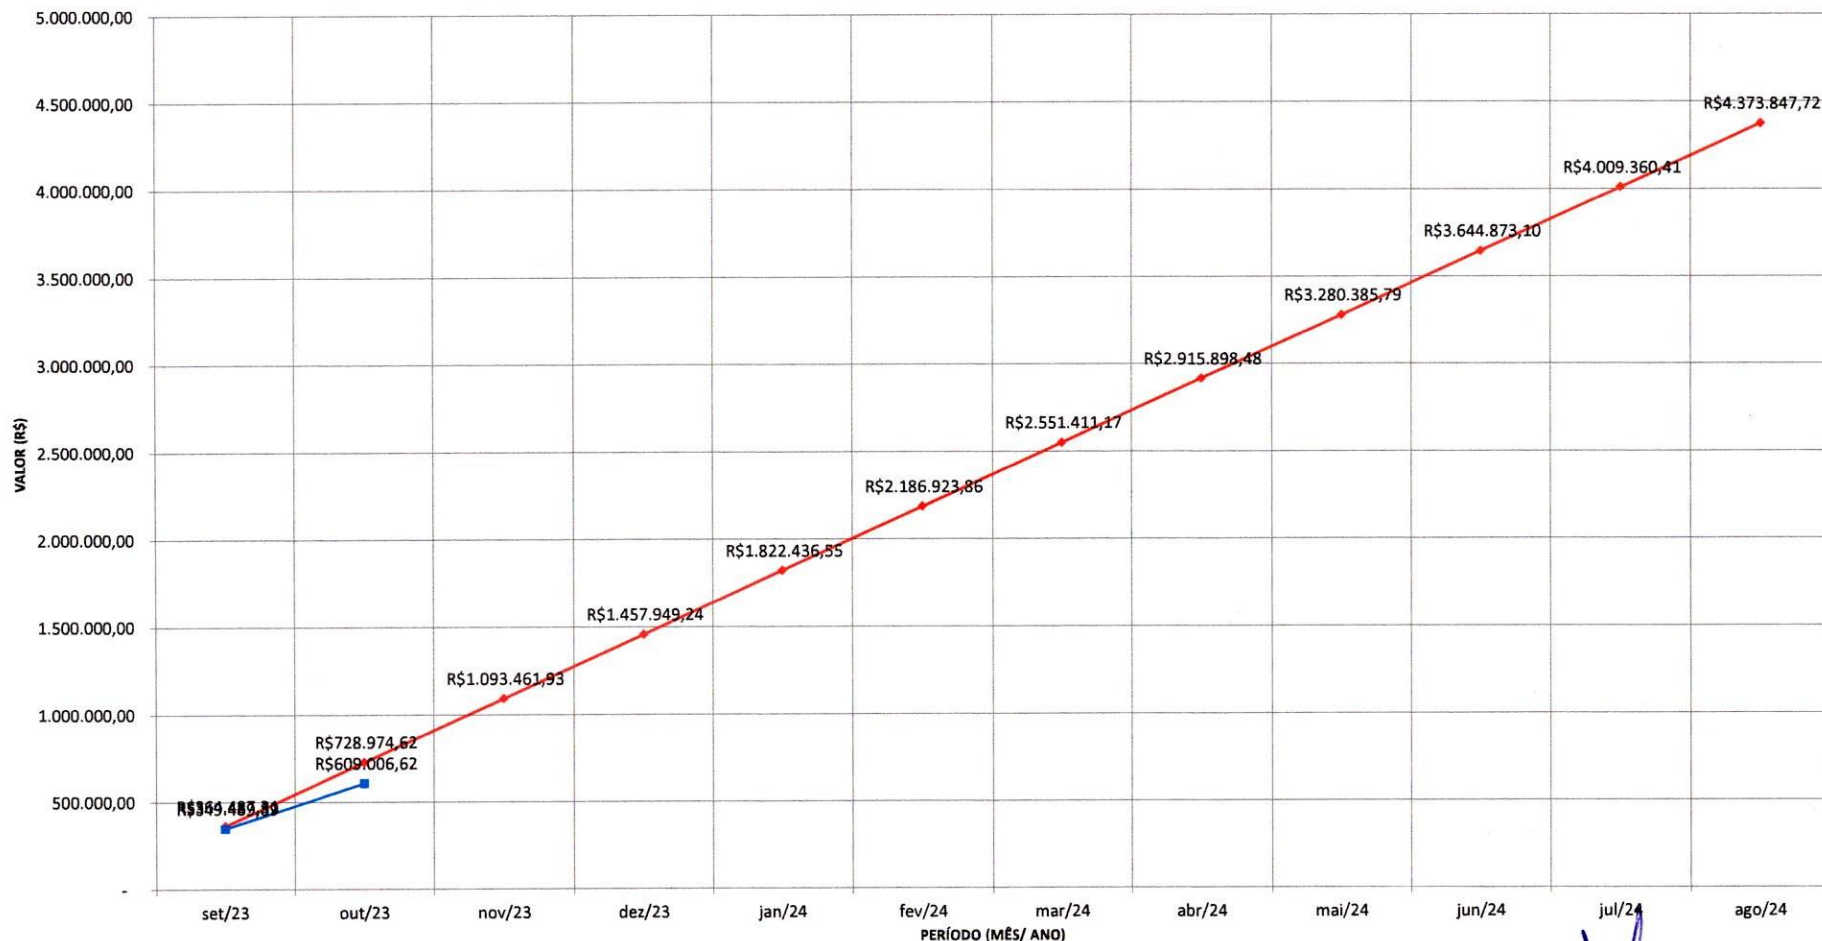

ATECEL - Associação Técnico Científica
 Ernesto Luiz de Oliveira Júnior

LEGENDA:

- PREVISTO
- REALIZADO

FRANCISCO BARBOZA DE LUCENA
 Eng. Responsável - ATECEL
 ENGENHEIRO - OBRAS - 603211195

Marilana Damasceno Delfino
 SECOB / PMCG
 Matrícula 29289

Antonio S. Carvalho
 RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
 Coordenador de Obras - SECOB
 Coordenador de Obras - SECOB/PMCG
