

Nº: CE/006/2026

Campina Grande, 26 de Janeiro de 2026.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB
Secretaria Municipal de Obras

Att.: Dr. JOAB KLEBER LUCENA MACHADO
Secretário Municipal de Obras

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 9.08.02/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CANALIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL DO PRADO E ÁREAS CIRCUNVIZINHAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.

Assunto: ENCAMINHAMENTO – 03ª MEDIÇÃO

Prezado Secretário;

A CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE Ltda, sediada na Rua Álvaro de Araújo Pereira, 255, Jardim Tavares, 58.402-300, vem a solicitar o pagamento da **medição nº 03**, referente ao **período de 01/12/2025 a 31/12/2025**, no valor de **R\$ 681.129,68 (Seiscentos e oitenta e um mil, cento e vinte o nove reais e sessenta e oito centavos)**, objeto do contrato nº 2.08.018/2025, firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, para a EXECUÇÃO DE OBRA DE CANALIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL DO PRADO E ÁREAS CIRCUNVIZINHAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.

Confiando na providência de V.Sa., renovamos nossos votos de elevada estima e consideração e subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Arthur Pereira de Almeida
Adm. Contratual

Obra: Canal do Prado																			
Cronograma Físico e Financeiro																			
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.250.014,56	1,42%	1,83%	4,03%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%
			R\$ 17.763,78	R\$ 22.928,62	R\$ 50.412,02	R\$ 105.355,47	R\$ 105.355,47	R\$ 105.355,47	R\$ 105.355,47	R\$ 105.355,47	R\$ 105.355,47	R\$ 105.355,47	R\$ 105.355,47	R\$ 105.355,47	R\$ 105.355,47	R\$ 105.355,47	R\$ 105.355,47	R\$ 105.355,47	R\$ 105.355,47
2	INSTALAÇÕES E CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 192.835,68		1,46%	71,44%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%
			R\$ 2.815,59	R\$ 137.758,89	R\$ 4.751,02	R\$ 4.751,02	R\$ 4.751,02	R\$ 4.751,02	R\$ 4.751,02	R\$ 4.751,02	R\$ 4.751,02	R\$ 4.751,02	R\$ 4.751,02	R\$ 4.751,02	R\$ 4.751,02	R\$ 4.751,02	R\$ 4.751,02	R\$ 4.751,02	R\$ 4.751,02
3	LIMPEZA E DEMOLIÇÕES	R\$ 1.543.155,60	36,90%	46,47%		22,64%													
			R\$ 476.774,71	R\$ 717.040,50		R\$ 349.340,39													
4	CANAL PRINCIPAL	R\$ 15.669.078,82			1,10%	10,00%	10,00%	15,00%	10,00%	15,00%	15,00%	23,90%							
					R\$ 172.874,01	R\$ 1.566.907,88	R\$ 1.566.907,88	R\$ 2.350.361,82	R\$ 1.566.907,88	R\$ 2.350.361,82	R\$ 2.350.361,82	R\$ 3.744.395,70							
5	VIAS PROJETADAS	R\$ 10.859.875,41			2,95%			10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	7,05%			
					R\$ 320.085,06			R\$ 1.085.987,54	R\$ 1.085.987,54	R\$ 1.085.987,54	R\$ 1.628.981,31	R\$ 1.628.981,31	R\$ 1.628.981,31	R\$ 1.628.981,31	R\$ 1.628.981,31	R\$ 765.902,48			
6	DRENAGEM	R\$ 740.086,88						15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%					
								R\$ 111.013,03	R\$ 111.013,03	R\$ 111.013,03	R\$ 111.013,03	R\$ 148.017,38	R\$ 148.017,38	R\$ 148.017,38					
7	PONTE E PASSARELAS	R\$ 513.615,08								40,00%	40,00%	20,00%							
										R\$ 205.446,03	R\$ 205.446,03	R\$ 102.723,02							
8	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 4.423.261,92										20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
											R\$ 894.652,38	R\$ 894.652,38	R\$ 894.652,38	R\$ 894.652,38	R\$ 894.652,38	R\$ 894.652,38			
9	CALÇADAS, CICLOVIAS E ÁREAS VERDES	R\$ 2.343.448,54								15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%				
										R\$ 351.517,28	R\$ 351.517,28	R\$ 351.517,28	R\$ 468.689,71	R\$ 468.689,71	R\$ 468.689,71				
10	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 1.019.169,82										10,00%	15,00%	20,00%	45,00%	10,00%			
												R\$ 101.916,98	R\$ 152.875,47	R\$ 203.633,96	R\$ 458.626,42	R\$ 101.916,98			
Porcentagem			1,28%	1,93%	1,77%	5,26%	4,35%	9,49%	7,45%	10,93%	14,63%	18,34%	6,50%	8,55%	6,97%	0,55%			
Custo			R\$ 494.538,49	R\$ 742.784,72	R\$ 681.129,98	R\$ 2.026.354,76	R\$ 1.677.014,37	R\$ 3.657.468,88	R\$ 2.874.014,94	R\$ 4.214.432,19	R\$ 5.642.078,35	R\$ 7.072.310,53	R\$ 3.276.150,31	R\$ 3.296.263,85	R\$ 2.687.977,48	R\$ 212.023,47			
Porcentagem Acumulado			1,28%	3,21%	4,98%	10,23%	14,58%	24,07%	31,52%	42,45%	57,09%	75,43%	83,93%	92,48%	99,45%	100,00%			
Custo Acumulado			R\$ 494.538,49	R\$ 1.237.323,20	R\$ 1.918.453,18	R\$ 3.944.807,94	R\$ 5.621.822,31	R\$ 9.279.291,19	R\$ 12.153.306,13	R\$ 16.367.738,32	R\$ 22.009.816,67	R\$ 29.082.127,20	R\$ 32.358.277,51	R\$ 35.654.541,37	R\$ 38.342.518,84	R\$ 38.554.542,31			

 GRUPO ROCHA CAVALCANTE					
Relatório Diário de Obra (RDO)					
Relatório nº	45	Data do relatório	01/12/2025	Dia da semana	Segunda-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (19)						
Auxiliar de Topografia 1	Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 1	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Mão de Obra Própria (19)
Servente 7	Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 2	Auxiliar de Engenharia 1		

Equipamentos (2)					
Escavadeira 1	Caminhão Basculante 1				

Atividades (3)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Execução de limpeza de camada vegetal e pequenas árvores.	Em Andamento
Execução do Canteiro de Obras	Em Andamento



Assinatura

Assinatura



GRUPO
ROCHA
CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	46	Data do relatório	02/12/2025	Dia da semana	Terça-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (19)						
Auxiliar de Topografia 1	Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 1	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Mão de Obra Própria (19)
Servente 7	Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 2	Auxiliar de Engenharia 1		

Equipamentos (2)					
Escavadeira 1	Caminhão Basculante 1				

Atividades (3)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Execução de limpeza de camada vegetal e pequenas árvores.	Em Andamento
Execução do Canteiro de Obras	Em Andamento

Fotos (3)



2 de dez. de 2025 09:56:34
7.250493333333333S 35.89062166666667W
281° W
2276 Rua Espírito Santo
Jardim Paulistano
Campina Grande
Paraíba
Altitude: 474.4msnm
Velocidade: 0.1km/h
#CONSTRUTORA ROCHA
Número de índice: 2630



2 de dez. de 2025 11:04:26
7.250514999999999S 35.890636666666666W
283° W
2324 Rua Espírito Santo
Jardim Paulistano
Campina Grande
Paraíba
Altitude: 498.0msnm
Velocidade: 0.1km/h
#CONSTRUTORA ROCHA
Número de índice: 2631

Instalação do contêiner

 2 de dez. de 2025 13:18:35 37° NE Número de índice: 3540	
---	--



Assinatura

Assinatura



GRUPO
ROCHA
CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	47	Data do relatório	03/12/2025	Dia da semana	Quarta-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (19)						
Auxiliar de Topografia 1	Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 1	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Mão de Obra Própria (19)
Servente 7	Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 2	Auxiliar de Engenharia 1		

Equipamentos (2)					
Escavadeira 1	Caminhão Basculante 1				

Atividades (3)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Execução de limpeza de camada vegetal e pequenas árvores.	Em Andamento
Execução do Canteiro de Obras	Em Andamento

Fotos (2)



3 de dez. de 2025 15:58:13
7.250486666666666S 35.89077833333333W
43° NE
2292 Rua Espírito Santo
Jardim Paulistano
Campina Grande
Paraíba
Altitude: 464.2msnm
Velocidade: 2.7km/h
#CONSTRUTORA ROCHA
Número de índice: 2640

Fechamento do canteiro de obra



3 de dez. de 2025 15:38:00
7.250748333333333S 35.890715W
347° N
2300 Rua Espírito Santo
Jardim Paulistano
Campina Grande
Paraíba
Altitude: 483.6msnm
Velocidade: 0.2km/h
#CONSTRUTORA ROCHA
Número de índice: 2639



GRUPO
ROCHA
CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	48	Data do relatório	04/12/2025	Dia da semana	Quinta-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (20)						
Auxiliar de Topografia 1	Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 1	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Mão de Obra Própria (20)
Servente 7	Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 2	Auxiliar de Engenharia 1	Carpinteiro 1	

Equipamentos (3)					
Escavadeira 1	Caminhão Basculante 2				


Atividades (3)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Execução de limpeza de camada vegetal e pequenas árvores.	Em Andamento
Execução do Canteiro de Obras	Em Andamento

Fotos (2)





4 de dez. de 2025 07:24:05
212° SW
85 Rua Professor Ariel de Oliveira
Jardim Paulistano
Campina Grande
Paraíba
Altitude: 489.0msnm
Velocidade: 0.0km/h
Número de índice: 3560





Assinatura

Assinatura

 GRUPO ROCHA CAVALCANTE					
Relatório Diário de Obra (RDO)					
Relatório nº	49	Data do relatório	05/12/2025	Dia da semana	Sexta-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (20)						
Auxiliar de Topografia 1	Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 1	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Mão de Obra Própria (20)
Servente 7	Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 2	Auxiliar de Engenharia 1	Carpinteiro 1	

Equipamentos (3)					
Escavadeira 1	Caminhão Basculante 2				

Atividades (3)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Execução de limpeza de camada vegetal e pequenas árvores.	Em Andamento
Execução do Canteiro de Obras	Em Andamento



Assinatura

Assinatura

GRUPO ROCHA CAVALCANTE					
Relatório Diário de Obra (RDO)					
Relatório nº	44	Data do relatório	08/12/2025	Dia da semana	Segunda-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (19)						
Auxiliar de Topografia 1	Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 1	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Mão de Obra Própria (19)
Servente 7	Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 2	Auxiliar de Engenharia 1		

Equipamentos (3)					
Escavadeira 1	Caminhão Basculante 2				

Atividades (3)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Execução de limpeza de camada vegetal e pequenas árvores.	Em Andamento
Execução do Canteiro de Obras	Em Andamento

Fotos (5)

Timemark

Foto 100% Real

Mapas

11:30

08/12/2025

Seg

Rua Maurício Travassos Moura, 261, Jardim Paulistano, Campina Grande - PB, 58415-262

Lat/Long: 7°15'0"S, 35°53'26"W

Tempo: Nuvens 27°C

Altitude: 493.5m

Bússola: 278° W

Timemark

Foto 100% Real

Mapas

10:17

08/12/2025

Seg


Rua Maurício Travassos de Moura, 243, Tambor, Campina Grande - PB, 58414-495

Lat/Long: 7°15'1"S, 35°53'26"W

Tempo: Nuvens 27°C

Altitude: 492.9m

Bússola: 258° W

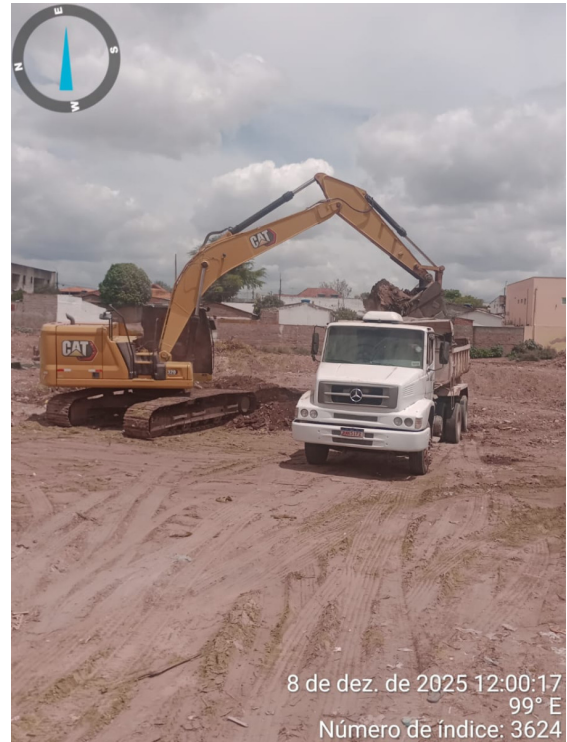

Assinatura

Assinatura



GRUPO
ROCHA
CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	50	Data do relatório	09/12/2025	Dia da semana	Terça-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (23)						
Auxiliar de Topografia 1	Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 1	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Mão de Obra Própria (21)
Servente 7	Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Motorista de Veículo Pesado 1	Auxiliar de Engenharia 1	
Carpinteiro 1	Eletricista 1					
Motorista 2						Terceiros (2)

Equipamentos (3)						
Escavadeira 1	Caminhão Basculante 2					

Atividades (3)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Execução de limpeza de camada vegetal e pequenas árvores.	Em Andamento
Execução do Canteiro de Obras	Em Andamento

Fotos (5)



9 de dez. de 2025 13:43:46
95° E
Número de índice: 3651



9 de dez. de 2025 08:03:16
-7-251074999999999S 35-8907566666667W
52° NE
2332 Rua Espírito Santo
Jardim Paulistano
Campina Grande
Paraíba
Altitude: 486.6msnm
Velocidade: 2.5km/h
#CONSTRUTORA ROCHA
Número de índice: 2658



Assinatura

Assinatura



GRUPO
ROCHA
CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	51	Data do relatório	10/12/2025	Dia da semana	Quarta-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (20)						
Auxiliar de Topografia 1	Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 1	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Mão de Obra Própria (18)
Servente 6	Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Carpinteiro 1	
Motorista 2						Terceiros (2)

Equipamentos (3)						
Escavadeira 1	Caminhão Basculante 2					

Atividades (3)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Execução de limpeza de camada vegetal e pequenas árvores.	Em Andamento
Execução do Canteiro de Obras	Em Andamento

Fotos (2)

10 de dez. de 2025 08:34:42
274° W
Número de índice: 3665

15:43

10/12/2025

Qua

Lat/Long: 7°15'2"S, 35°53'25"W

Tempo: --

Altitude: 510.4m

Bússola: 202° SW



Assinatura

Assinatura

1 / 1

Criado por: José Giovanni (29/12/2025 13:34)
Última modificação: Luiz Henrique (19/01/2026 07:34)



GRUPO
ROCHA
CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	52	Data do relatório	11/12/2025	Dia da semana	Quinta-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (21)

Auxiliar de Topografia 1	Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 1	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Mão de Obra Própria (19)
Servente 7	Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Carpinteiro 1	
Motorista 2						Terceiros (2)

Equipamentos (3)

Escavadeira 1	Caminhão Basculante 2				
------------------	--------------------------	--	--	--	--

Atividades (3)

Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Execução de limpeza de camada vegetal e pequenas árvores.	Em Andamento
Execução do Canteiro de Obras	Em Andamento

Fotos (3)




11 de dez. de 2025 10:00:50
320° NW
Altitude: 487.1msnm
Velocidade: 0.8km/h
Número de índice: 3670



14:11 11/12/2025
Qui
Lat/Long: 7°15'2"S, 35°53'26"W
Tempo: Nuvens 23°C
Altitude: 517.5m
Bússola: 110° E

1 / 2

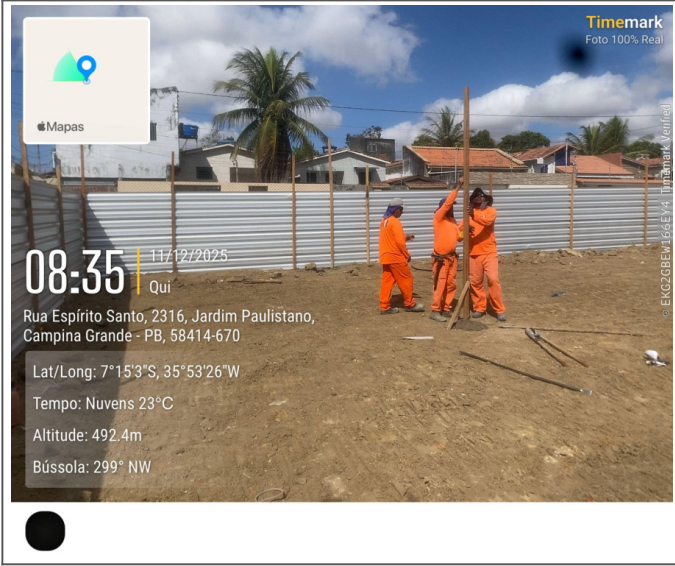

Assinatura

Assinatura



GRUPO
ROCHA
CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	53	Data do relatório	12/12/2025	Dia da semana	Sexta-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (21)						
Auxiliar de Topografia 1	Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 1	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Mão de Obra Própria (19)
Servente 7	Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Carpinteiro 1	
Motorista 2						Terceiros (2)

Equipamentos (3)						
Escavadeira 1	Caminhão Basculante 2					

Atividades (3)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Execução de limpeza de camada vegetal e pequenas árvores.	Em Andamento
Execução do Canteiro de Obras	Em Andamento

Fotos (4)



12 de dez. de 2025 07:27:05

0° N
1890 BR-104
Tambor
Campina Grande
Paraíba
Altitude: 494.7msnm
Velocidade: 0.1km/h
Número de índice: 3674



13:30 | 12/12/2025

Sex

Rua Santa Catarina, 1766, Jardim Paulistano,
Campina Grande - PB, 58414-670

Lat/Long: 7°15'2"S, 35°53'26"W

Tempo: Nuvens 31°C

Altitude: 492.6m

Bússola: 44° NE

1 / 2





Assinatura

Assinatura



Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	54	Data do relatório	15/12/2025	Dia da semana	Segunda-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (21)

Auxiliar de Topografia 1	Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 1	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Mão de Obra Própria (19)
Servente 7	Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Carpinteiro 1	
Motorista 2						Terceiros (2)


Equipamentos (3)

Equipamento (1)					
Escavadeira 1	Caminhão Basculante 2				

Atividades (3)

Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Execução de limpeza de camada vegetal e pequenas árvores.	Em Andamento
Execução do Canteiro de Obras	Em Andamento

Fotos (2)

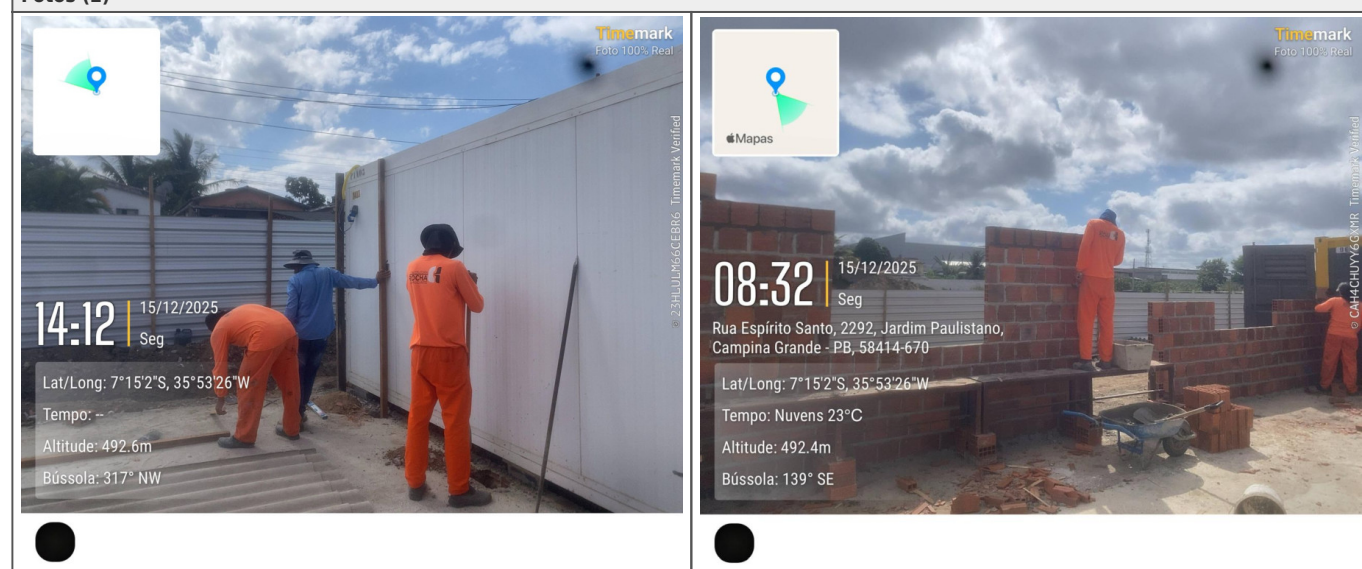

Assinatura

Assinatura



Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	55	Data do relatório	16/12/2025	Dia da semana	Terça-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (21)

Auxiliar de Topografia 1	Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 1	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Mão de Obra Própria (19)
Servente 7	Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Carpinteiro 1	
Motorista 2						Terceiros (2)

Equipamentos (3)

Escavadeira 1	Caminhão Basculante 2				
-------------------------	---------------------------------	--	--	--	--

Atividades (3)

Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Execução de limpeza de camada vegetal e pequenas árvores.	Em Andamento
Execução do Canteiro de Obras	Em Andamento

Fotos (4)



Desvio do canal



Assinatura

Assinatura



Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	56	Data do relatório	17/12/2025	Dia da semana	Quarta-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (22)						
Auxiliar de Topografia 1	Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 1	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Mão de Obra Própria (20)
Servente 7	Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Motorista de Veículo Pesado 1	
Carpinteiro 1						
Motorista 2						Terceiros (2)

Equipamentos (4)					
Escavadeira 1	Caminhão Basculante 3				

Atividades (3)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Execução de limpeza de camada vegetal e pequenas árvores.	Em Andamento
Execução do Canteiro de Obras	Em Andamento

Fotos (2)


Assinatura

Assinatura



Relatório Diário de Obra (RDO)					
Relatório nº	57	Data do relatório	18/12/2025	Dia da semana	Quinta-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (22)						
Auxiliar de Topografia 1	Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 1	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Mão de Obra Própria (20)
Servente 7	Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Motorista de Veículo Pesado 1	
Carpinteiro 1						
Motorista 2						Terceiros (2)

Equipamentos (4)					
Escavadeira 1	Caminhão Basculante 3				

Atividades (3)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Execução de escavação horizontal de material de primeira categoria.	Em Andamento
Execução do Canteiro de Obras	Em Andamento

Fotos (2)	
 18 de dez. de 2025 08:39:18 7.250645S 35.890660000000004W 176° S 1870 Rua Santa Catarina Liberdade Campina Grande Paraíba Altitude: 492.9msnm Velocidade: 0.4km/h #CONSTRUTORA ROCHA Número de índice: 2705	 18 de dez. de 2025 14:52:33 7.251040000000001S 35.890475W 27° NE 201 Rua Maria Gomes Carneiro Tambor Campina Grande Paraíba Altitude: 498.8msnm Velocidade: 0.3km/h #CONSTRUTORA ROCHA Número de índice: 2708

Assinatura

Assinatura

GRUPO
ROCHA
CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	58	Data do relatório	19/12/2025	Dia da semana	Sexta-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (22)

Auxiliar de Topografia 1	Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 1	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Mão de Obra Própria (20)
Servente 7	Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Motorista de Veículo Pesado 1	
Carpinteiro 1						
Motorista 2						Terceiros (2)

Equipamentos (4)

Escavadeira 1	Caminhão Basculante 3				
------------------	--------------------------	--	--	--	--

Atividades (3)


Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Execução de escavação horizontal de material de primeira categoria.	Em Andamento
Execução do Canteiro de Obras	Em Andamento

Fotos (3)

19 de dez. de 2025 09:07:04
7.250689S 35.8896874W
157° SE
2041 Rua Santa Catarina
Liberdade
Campina Grande
Paraíba
Altitude: 491.8msnm
#CONSTRUTORA ROCHA
Número de índice: 2709

13:15 19/12/2025
Sex
Rua Maria Gomes Carneiro, 201, Jardim Paulistano, Campina Grande - PB, 58415-255
Lat/Long: 7°15'3"S, 35°53'26"W
Tempo: Nuvens 31°C
Altitude: 492.7m
Bússola: 65° NE

1 / 2



08:39

19/12/2025

Sex

Rua Espírito Santo, 2300, Jardim Paulistano,
Campina Grande - PB, 58414-670

Lat/Long: 7°15'2"S, 35°53'26"W

Tempo: Nuvens 24°C

Altitude: 493.0m

Bússola: 198° S



100% Real

XCL 1 100% REAL





Assinatura

Assinatura

GRUPO
ROCHA
CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	60	Data do relatório	20/12/2025	Dia da semana	Sábado
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (17)

Auxiliar de Topografia 1	Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 1	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Mão de Obra Própria (16)
Servente 3	Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Motorista de Veículo Pesado 1	
Carpinteiro 1						
Motorista 1						Terceiros (1)

Equipamentos (4)

Escavadeira 1	Caminhão Basculante 3				
------------------	--------------------------	--	--	--	--

Atividades (3)

Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Execução de escavação horizontal de material de primeira categoria.	Em Andamento
Execução do Canteiro de Obras	Em Andamento

Fotos (3)

08:35

20/12/2025

Sáb

Lat/Long: 7°15'1"S, 35°53'25"W

Tempo: --

Altitude: 492.4m

Bússola: 178° S

Timemark Camera

08:23

20/12/2025

Sáb

Lat/Long: 7°15'1"S, 35°53'25"W

Tempo: --

Altitude: 492.4m

Bússola: 42° NE

Timemark Camera

1 / 2



Assinatura

Assinatura

 GRUPO ROCHA CAVALCANTE					
Relatório Diário de Obra (RDO)					
Relatório nº	59	Data do relatório	22/12/2025	Dia da semana	Segunda-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (22)						
Auxiliar de Topografia 1	Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 1	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Mão de Obra Própria (20)
Servente 7	Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Motorista de Veículo Pesado 1	
Carpinteiro 1						
Motorista 2						Terceiros (2)

Equipamentos (4)					
Escavadeira 1	Caminhão Basculante 3				

Atividades (3)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Execução de escavação horizontal de material de primeira categoria.	Em Andamento
Execução do Canteiro de Obras	Em Andamento



Assinatura

Assinatura

 GRUPO ROCHA CAVALCANTE					
Relatório Diário de Obra (RDO)					
Relatório nº	61	Data do relatório	23/12/2025	Dia da semana	Terça-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☁ Nublado	Praticável

Mão de obra (21)						
Auxiliar de Topografia 1	Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 1	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Mão de Obra Própria (20)
Servente 7	Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Motorista de Veículo Pesado 1	
Carpinteiro 1						
Motorista 1						Terceiros (1)

Equipamentos (4)					
Escavadeira 1	Caminhão Basculante 3				

Atividades (3)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Execução de escavação horizontal de material de primeira categoria.	Em Andamento
Execução do Canteiro de Obras	Em Andamento



Assinatura

Assinatura

 GRUPO ROCHA CAVALCANTE						
Relatório Diário de Obra (RDO)						
Relatório nº	62	Data do relatório	24/12/2025	Dia da semana	Quarta-Feira	
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025					
Condição climática		Tempo		Condição		
Manhã		☀️ Claro		Praticável		
Tarde		☀️ Claro		Praticável		
Mão de obra (21)						
Auxiliar de Topografia 1	Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 1	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Mão de Obra Própria (20)
Servente 7	Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Motorista de Veículo Pesado 1	
Carpinteiro 1						
Motorista 1						Terceiros (1)
Equipamentos (4)						
Escavadeira 1	Caminhão Basculante 3					
Atividades (3)						
Execução de serviços de locação topográfica.					Em Andamento	
Execução de escavação horizontal de material de primeira categoria.					Em Andamento	
Execução do Canteiro de Obras					Em Andamento	
Comentários (1)						
José Giovanni 29/12/2025 14:30 Devido ao dia 24/12 trabalhamos até 12:00.						



Assinatura

Assinatura

 GRUPO ROCHA CAVALCANTE						
Relatório Diário de Obra (RDO)						
Relatório nº	63	Data do relatório	25/12/2025	Dia da semana	Quinta-Feira	
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025					
Condição climática		Tempo		Condição		
Manhã		☀️ Claro		Praticável		
Tarde		☀️ Claro		Praticável		
Mão de obra (20)						
Auxiliar de Topografia 1	Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 1	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Mão de Obra Própria (19)
Servente 7	Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Motorista de Veículo Pesado 1	
Motorista 1						Terceiros (1)
Equipamentos (4)						
Escavadeira 1	Caminhão Basculante 3					
Atividades (1)						
Sem atividades. 25/12 , feriado Natal					Em Andamento	



Assinatura

Assinatura

 GRUPO ROCHA CAVALCANTE						
Relatório Diário de Obra (RDO)						
Relatório nº	64	Data do relatório	26/12/2025	Dia da semana	Sexta-Feira	
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025					
Condição climática		Tempo		Condição		
Manhã		☀️ Claro		Praticável		
Tarde		☀️ Claro		Praticável		
Mão de obra (20)						
Auxiliar de Topografia 1	Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 1	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Mão de Obra Própria (19)
Servente 7	Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Motorista de Veículo Pesado 1	
Motorista 1						Terceiros (1)
Equipamentos (4)						
Escavadeira 1	Caminhão Basculante 3					
Atividades (1)						
Sem atividades. 26/12 , folga devido ao acordo.					Em Andamento	



Assinatura

Assinatura

 GRUPO ROCHA CAVALCANTE						
Relatório Diário de Obra (RDO)						
Relatório nº	65	Data do relatório	27/12/2025	Dia da semana	Sábado	
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025					
Condição climática		Tempo		Condição		
Manhã		☀️ Claro		Praticável		
Tarde		☀️ Claro		Praticável		
Mão de obra (20)						
Auxiliar de Topografia 1	Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 1	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Mão de Obra Própria (19)
Servente 7	Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Motorista de Veículo Pesado 1	
Motorista 1						Terceiros (1)
Equipamentos (4)						
Escavadeira 1	Caminhão Basculante 3					
Atividades (1)						
Sem atividades. Sábado.					Em Andamento	



Assinatura

Assinatura

 GRUPO ROCHA CAVALCANTE					
Relatório Diário de Obra (RDO)					
Relatório nº	66	Data do relatório	28/12/2025	Dia da semana	Domingo
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☒ Claro	Praticável
Tarde	☒ Claro	Praticável

Mão de obra (20)						
Auxiliar de Topografia 1	Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 1	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Mão de Obra Própria (19)
Servente 7	Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Motorista de Veículo Pesado 1	
Motorista 1						Terceiros (1)

Equipamentos (4)					
Escavadeira 1	Caminhão Basculante 3				

Atividades (1)	
Sem atividades. Domingo.	Em Andamento



Assinatura

Assinatura

 GRUPO ROCHA CAVALCANTE					
Relatório Diário de Obra (RDO)					
Relatório nº	67	Data do relatório	29/12/2025	Dia da semana	Segunda-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (22)						
Auxiliar de Topografia 1	Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 1	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Mão de Obra Própria (21)
Servente 7	Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Motorista de Veículo Pesado 1	
Carpinteiro 2						
Motorista 1						Terceiros (1)

Equipamentos (4)					
Escavadeira 1	Caminhão Basculante 3				



Assinatura

Assinatura



Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	68	Data do relatório	29/12/2025	Dia da semana	Segunda-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (21)						
Auxiliar de Topografia 1	Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 1	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Mão de Obra Própria (20)
Servente 7	Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Motorista de Veículo Pesado 1	
Carpinteiro 1						
Motorista 1						Terceiros (1)

Equipamentos (4)					
Escavadeira 1	Caminhão Basculante 3				

Atividades (3)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Execução de escavação horizontal de material de primeira categoria.	Em Andamento
Execução do Canteiro de Obras	Em Andamento

Fotos (2)



29 de dez. de 2025 10:11:50
7.250199999999999S 35.89062833333333W
161° S
Altitude: 487.6msnm
Velocidade: 0.3km/h
#CONSTRUTORA ROCHA
Número de índice: 2720



29 de dez. de 2025 10:11:56
7.250246666666667S 35.89061333333333W
75° E
Altitude: 497.2msnm
Velocidade: 0.2km/h
#CONSTRUTORA ROCHA
Número de índice: 2721



Assinatura

Assinatura

 GRUPO ROCHA CAVALCANTE					
Relatório Diário de Obra (RDO)					
Relatório nº	69	Data do relatório	30/12/2025	Dia da semana	Terça-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (22)						
Auxiliar de Topografia 1	Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 1	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Mão de Obra Própria (21)
Servente 7	Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Motorista de Veículo Pesado 1	
Carpinteiro 2						
Motorista 1						Terceiros (1)

Equipamentos (4)					
Escavadeira 1	Caminhão Basculante 3				

Atividades (3)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Execução de escavação horizontal de material de primeira categoria.	Em Andamento
Execução do Canteiro de Obras	Em Andamento



Assinatura

Assinatura

 GRUPO ROCHA CAVALCANTE						
Relatório Diário de Obra (RDO)						
Relatório nº	70	Data do relatório	31/12/2025	Dia da semana	Quarta-Feira	
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025					
Condição climática		Tempo		Condição		
Manhã		☀️ Claro		Praticável		
Tarde		☀️ Claro		Praticável		
Mão de obra (23)						
Auxiliar de Topografia 1	Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 1	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Mão de Obra Própria (21)
Servente 7	Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Motorista de Veículo Pesado 1	
Carpinteiro 2						
Motorista 2						Terceiros (2)
Equipamentos (4)						
Escavadeira 1	Caminhão Basculante 3					
Atividades (3)						
Execução de serviços de locação topográfica.					Em Andamento	
Execução de escavação horizontal de material de primeira categoria.					Em Andamento	
Execução do Canteiro de Obras					Em Andamento	
Comentários (1)						
José Giovanni 31/12/2025 11:50 Trabalhamos até meio dia.						



Assinatura

Assinatura

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS



EMPRESA: **CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA**

CONTRATO: **N.º: 2.08.018/2025**

MEDIÇÃO: **3ª**

PERÍODO LÍQUIDO: **01/12/2025 A 31/12/2025**

FOTO 01



TRECHO

CANAL DO PRADO

FOTO 02



TRECHO

CANAL DO PRADO

FOTO 03



TRECHO

CANAL DO PRADO

FOTO 04



TRECHO

CANAL DO PRADO


FOTO 05



TRECHO

CANAL DO PRADO

FOTO 06

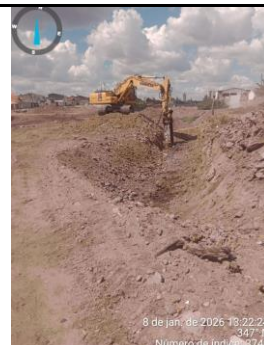

TRECHO

CANAL DO PRADO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS



EMPRESA: **CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA**
 CONTRATO: **N.º: 2.08.018/2025**
 PERÍODO LÍQUIDO: **01/12/2025 A 31/12/2025**

MEDIÇÃO: **3ª**

FOTO 07



8 de jan. de 2026 13:22:14
 274° W
 Número de índice: 3738

TRECHO **CANAL DO PRADO**

FOTO 08



8 de jan. de 2026 13:21:25
 346° N
 Número de índice: 3734

TRECHO **CANAL DO PRADO**

FOTO 09



9 de dez. de 2025 08:32:25
 7.250473333333334S 35.89066666666666W
 208° S
 2276 Rua Espírito Santo
 Jardim Paulistano
 Campina Grande
 Paraíba
 Altitude: 498.0msnm
 Velocidade: 1.6km/h
 #CONSTRUTORA ROCHA
 Número de índice: 2657

TRECHO **CANAL DO PRADO**


FOTO 10



2 de dez. de 2025 11:04:26
 7.250514999999999S 35.89063666666666W
 283° W
 2324 Rua Espírito Santo
 Jardim Paulistano
 Campina Grande
 Paraíba
 Altitude: 498.0msnm
 Velocidade: 0.1km/h
 #CONSTRUTORA ROCHA
 Número de índice: 2633

TRECHO **CANAL DO PRADO**

FOTO 11

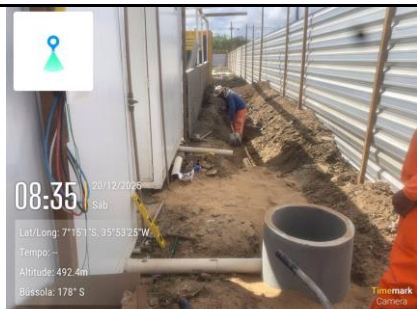

08:35 20/12/2025
 Sab
 Lat/Long: 7°15'17"S, 35°53'23"W
 Tempo: --
 Altitude: 492.4m
 Bussola: 178° S
 Timemark Camera

TRECHO **CANAL DO PRADO**

FOTO 12



08:23 20/12/2025
 Sab
 Lat/Long: 7°15'17"S, 35°53'23"W
 Tempo: --
 Altitude: 492.4m
 Bussola: 42° NE
 Timemark Camera

TRECHO **CANAL DO PRADO**
