

GRUPO ROCHA CAVALCANTE					
Relatório Diário de Obra (RDO)					
Relatório nº	170	Data do relatório	04/05/2026	Dia da semana	Segunda-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☁️ Nublado	Praticável

Mão de obra (34)						
Auxiliar de Topografia 2	Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 4	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Mão de Obra Própria (31)
Servente 8	Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	
Carpinteiro 3	Motorista de Veículo Pesado 4					
Motorista 1	Encanador 1	Jovem aprendiz adm 1				Terceiros (3)

Equipamentos (8)					
Escavadeira 3	Caminhão Basculante 4	Retro Escavadeira 1			

Atividades (5)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Rompimento de pedras.	Em Andamento
Transporte de pedras.	Em Andamento
Remoção d'água no desvio. Est-18	Em Andamento
Desmontagem e montagem da fôrma das paredes.	Em Andamento

Fotos (3)	
07:36 04/05/2026 Seg 2159 Rua Espírito Santo, Jardim Paulistano, Campina Grande PB, 58415-265 Lat/Long: 7°15'0"S, 35°53'25"W Tempo: Nuvens 22°C Altitude: 493.3m Bússola: 212° SW TimeMark Foto 100% Real © 2024 TimeMark. All Rights Reserved.	4 de mai de 2026 10:00:14 7 24740166666667S 35.889660000000006W 711f Rua Claudino Gabino de Oliveira Sandra Cavalcante Campina Grande Paraíba #CONSTRUTORA ROCHA

 4 de mai. de 2026 13:47:31 7.247411666666666S 35.88959333333333W 1692 Rua Sergipe Jardim Paulistano Campina Grande Paralba #CONSTRUTORA ROCHA	
--	--


CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899315
Assinatura


Felipe Roberto Teixeira de Melo
Eng. Civil - CREA 188422444
Assinatura


Luiz Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - SEC08 IPMCO
Assinatura



GRUPO
ROCHA
CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	171	Data do relatório	05/05/2026	Dia da semana	Terça-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☁️ Nublado	Praticável

Mão de obra (34)						
Auxiliar de Topografia 2	Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 4	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Mão de Obra Própria (32)
Servente 8	Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	
Carpinteiro 3	Motorista de Veículo Pesado 4	Jovem aprendiz adm 1				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (8)					
Escavadeira 3	Caminhão Basculante 4	Retro Escavadeira 1			

Atividades (7)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Rompimento de pedras.	Em Andamento
Transporte de pedras.	Em Andamento
Remoção de lama no desvio. Est-18	Em Andamento
Desmontagem e montagem da fôrma das paredes.	Em Andamento
Concretagem da parede do canal principal. Lado D a Est-41+11 A 42+10 (Primeira etapa), Lado E a Est-42+4 a Est-42+18 (Segunda etapa).	Em Andamento
Concretagem de tampas de BL	Em Andamento

Fotos (7)



Mapas

07:16

05/05/2026

Ter

2159 Rua Espírito Santo, Jardim Paulistano, Campina Grande PB, 58415-265

Lat/Long: 7°15'2"S, 35°53'25"W

Tempo: Chuva 21°C

Altitude: 492.1m

Bússola: 47° NE



Mapas

10:35

05/05/2026

Ter

201 Rua Maria Gomes Carneiro, Jardim Paulistano, Campina Grande PB, 58415-255

Lat/Long: 7°15'2"S, 35°53'25"W


Tempo: Nuvens 25°C

Altitude: 492.2m

Bússola: 67° E



5 de mai. de 2026 10:01:36
7.250749999999999S 35.890465W
2335 Rua Espírito Santo
Jardim Paulistano
Campina Grande
Paraíba
#CONSTRUTORA ROCHA

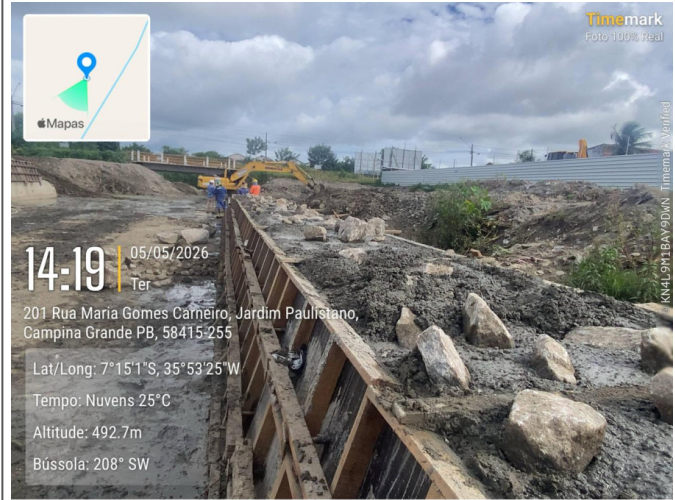

14:19 | 05/05/2026
Ter
201 Rua Maria Gomes Carneiro, Jardim Paulistano,
Campina Grande PB, 58415-255
Lat/Long: 7°15'1"S, 35°53'25"W
Tempo: Nuvens 25°C
Altitude: 492.7m
Bússola: 208° SW




14:19 | 05/05/2026
Ter
201 Rua Maria Gomes Carneiro, Jardim Paulistano,
Campina Grande PB, 58415-255
Lat/Long: 7°15'1"S, 35°53'25"W
Tempo: Nuvens 25°C
Altitude: 493.0m
Bússola: 114° SE



15:34 | 05/05/2026
Ter
684 Rua Claudino Gomes de Oliveira, Tambor,
Campina Grande PB, 58414-452
Lat/Long: 7°14'48"S, 35°53'22"W
Tempo: Nuvens 25°C
Altitude: 495.2m
Bússola: 169° S

Vídeos (1)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:12


CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899315
Assinatura


FELIPE ROBERTO TORRES DE MELO
Eng. CIVIL - CREA 188422445
Assinatura


Luis Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - SEC08 IPMCO
Assinatura



GRUPO
ROCHA
CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	172	Data do relatório	06/05/2026	Dia da semana	Quarta-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				


Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☁️ Nublado	Praticável

Mão de obra (34)						
Auxiliar de Topografia 2	Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 4	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Mão de Obra Própria (32)
Servente 8	Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	
Carpinteiro 3	Motorista de Veículo Pesado 4	Jovem aprendiz adm 1				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (8)					
Escavadeira 3	Caminhão Basculante 4	Retro Escavadeira 1			

Atividades (4)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Rompimento de pedras.	Em Andamento
Remoção de lama no desvio. Est-18	Em Andamento
Desmontagem e montagem da fôrma das paredes.	Em Andamento

Fotos (5)



Timemark
Foto 100% Real

08:15

06/05/2026

Qua

1890 Rua Santa Catarina, Jardim Paulistano, Campina Grande PB, 58415-260

Lat/Long: 7°15'2"S, 35°53'25" W

Tempo: Nuvens 21°C

Altitude: 492.4m

Bússola: 147° SE



6 de mai. de 2026 08:46:51

7 25094166666666667S 35.890346666666666W

2335 Rua Espírito Santo

Jardim Paulistano


Campina Grande

Paraíba

#CONSTRUTORA-ROCHA



1 / 2

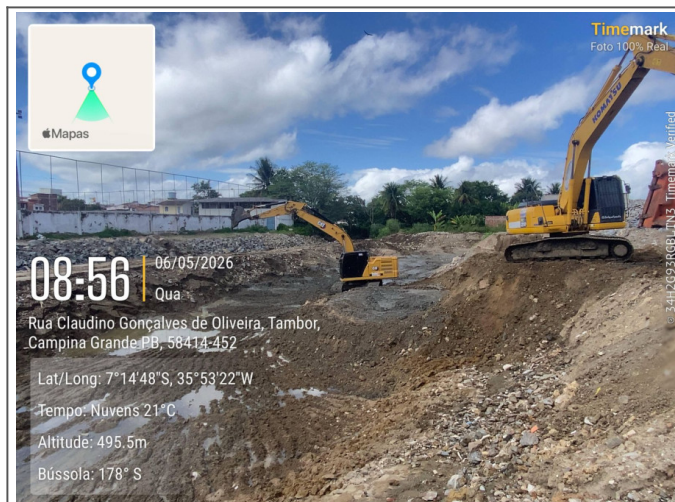

Vídeos (1)

[Vídeo 1 \(visualizar\).mp4](#)

00:11

Pedro Saulo
CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621699315


Felipe Gustavo Tomaz de Mello
ENG. CIVIL - CREA 18840284/6


Luis Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - SECOB IPMCG

GRUPO
ROCHA
CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	173	Data do relatório	07/05/2026	Dia da semana	Quinta-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☁ Nublado	Praticável

Mão de obra (32)						
Auxiliar de Topografia 2	Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Mão de Obra Própria (30)
Servente 8	Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	
Carpinteiro 3	Motorista de Veículo Pesado 3	Jovem aprendiz adm 1				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (6)					
Escavadeira 2	Caminhão Basculante 3	Retro Escavadeira 1			

Atividades (5)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Rompimento de pedras.	Em Andamento
Remoção de lama no desvio. Est-18	Em Andamento
Desmontagem e montagem da fôrma das paredes.	Em Andamento
Concretagem da parede do canal principal. Lado D a Est-42+10 a Est-43 (Primeira etapa), Lado E a Est-40+8 a Est-42+18 (Terceiro etapa).	Em Andamento

Fotos (5)

Time mark
Foto 100% Real

09:27

07/05/2026
Qui

684 Rua Claudino Gomes de Oliveira, Tambor, Campina Grande PB, 58414-452

Lat/Long: 7°14'47"S, 35°53'22"W

Tempo: Nuvens 23°C

Altitude: 495.7m

Bússola: 188° S

Time mark
Foto 100% Real

14:36

07/05/2026
Qui


201 Rua Maria Gomes Carneiro, Jardim Paulistano, Campina Grande PB, 58415-255


Lat/Long: 7°15'2"S, 35°53'25"W

Tempo: Nuvens 20°C

Altitude: 492.1m

Bússola: 185° S

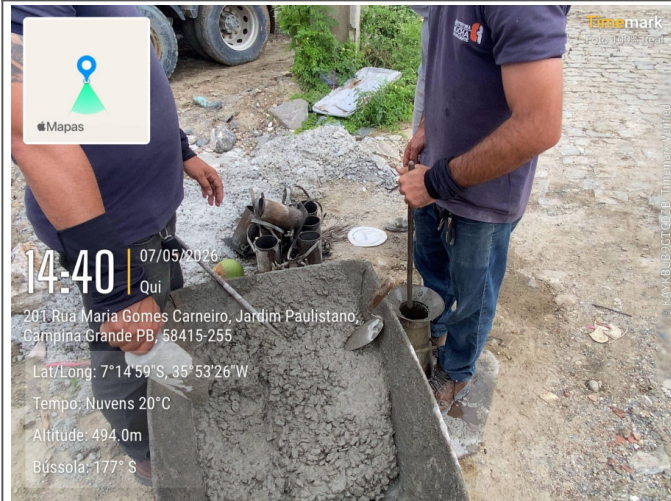


CONSTRUTORA RODRIGUES CAVALCANTE
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899315
Assinatura


Felipe Roberto Vasconcelos de Melo
Eng. CIVIL - CREA 188422442
Assinatura


Luis Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - SEC08 IPMCO
Assinatura

GRUPO
ROCHA
CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	174	Data do relatório	08/05/2026	Dia da semana	Sexta-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição	Índice pluviométrico
Manhã	☀ Claro	Praticável	4 mm
Tarde	☁ Chuvoso	Praticável	

Mão de obra (33)						
Auxiliar de Topografia 2	Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 4	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Mão de Obra Própria (31)
Servente 8	Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	
Carpinteiro 3	Motorista de Veículo Pesado 3	Jovem aprendiz adm 1				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (7)					
Escavadeira 3	Caminhão Basculante 3	Retro Escavadeira 1			

Atividades (4)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Rompimento de pedras.	Em Andamento
Transporte de pedras.	Em Andamento
Desmontagem e montagem da fôrma das paredes.	Em Andamento

Fotos (3)

Time mark
Foto 100% Real

Apple Maps

14:31 | 08/05/2026
Sex

2292 Avenida do Canal, Jardim Paulistano, Campina Grande PB, 58415-265

Lat/Long: 7°15'1"S, 35°53'26"W

Tempo: Chuva 24°C

Altitude: 492.9m

Bússola: 280° W

Time mark
Foto 100% Real

Apple Maps

10:31 | 08/05/2026
Sex

2292 Avenida do Canal, Jardim Paulistano, Campina Grande PB, 58415-265

Lat/Long: 7°15'2"S, 35°53'25"W

Tempo: Nuvens 22°C

Altitude: 492.1m

Bússola: 152° SE

1 / 2




CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621699315
Assinatura


Felipe Roberto Teixeira de Melo
ENG. CIVIL - CREA 188422442
Assinatura


Luis Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - SECOP IPMCO
Assinatura

 GRUPO ROCHA CAVALCANTE					
Relatório Diário de Obra (RDO)					
Relatório nº	175	Data do relatório	09/05/2026	Dia da semana	Sábado
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☁️ Nublado	Praticável

Mão de obra (17)						
Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 4	Topógrafo 1	Encarregado Geral 1	Servente 3	Pedreiro 1	Mão de Obra Própria (16)
Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	Carpinteiro 2	Jovem aprendiz adm 1			
Motorista 1						Terceiros (1)

Equipamentos (2)					
Escavadeira 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (2)	
Rompimento de pedras.	Em Andamento
Concretagem da parede do canal principal. Lado D a Est-43 a Est-44+4 (Primeira etapa)	Em Andamento

Ocorrências (1)
A Equipe trabalhou até 13h.

Fotos (3)	
 9 de mai. de 2026 09:37:19 19° S 1870 Rua Santa Catarina Liberdade Campina Grande Paraíba Altitude: 491.2msnm Velocidade: 0.0km/h Número de índice: 112	 9 de mai. de 2026 12:18:55 8° N 2335 Rua Espírito Santo Jardim Paulistano Campina Grande Paraíba Altitude: 490.9msnm Velocidade: 0.0km/h Número de índice: 118




CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899315
Assinatura


Felipe Roberto Fernandes de Melo
Eng. Civil - CREA 188422442
Assinatura


Luiz Henrique Soares Pinto
CREA - PB 1621394360
Eng. Civil - SEC08 IPMCO
Assinatura



GRUPO
ROCHA
CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	176	Data do relatório	11/05/2026	Dia da semana	Segunda-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				


Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☁️ Nublado	Praticável

Mão de obra (30)						
Auxiliar de Topografia 2	Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Mão de Obra Própria (28)
Servente 7	Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	
Carpinteiro 2	Motorista de Veículo Pesado 3	Auxiliar de Serviços Gerais 1				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (6)					
Escavadeira 2	Caminhão Basculante 3	Retro Escavadeira 1			

Atividades (4)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Rompimento de pedras.	Em Andamento
Transporte de pedras.	Em Andamento
Desmontagem e montagem da fôrma das paredes.	Em Andamento

Fotos (3)



Timemark
Foto 100% Real

06:53

11/05/2026
Seg


2159 Rua Espírito Santo, Jardim Paulistano, Campina Grande PB, 58415-265

Lat/Long: 7°15'1"S, 35°53'26"W


Tempo: Nuvens 20°C

Altitude: 492.9m

Bússola: 286° W

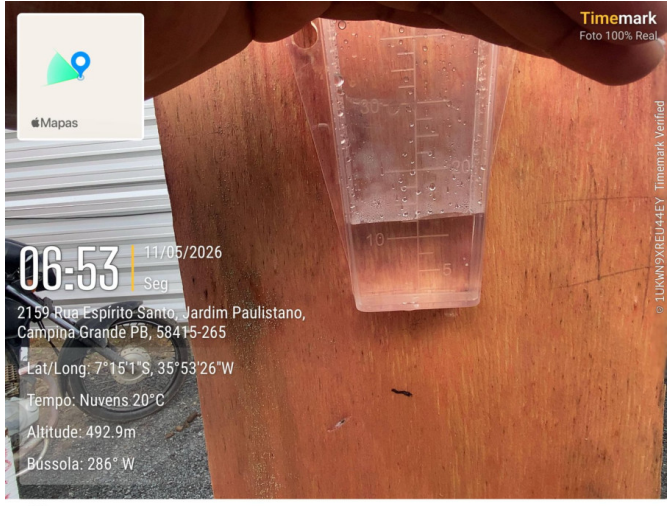

Chuva final de semana.



Timemark
Foto 100% Real

09:51

11/05/2026
Seg

2159 Rua Espírito Santo, Jardim Paulistano, Campina Grande PB, 58415-265

Lat/Long: 7°15'2"S, 35°53'25"W


Tempo: Nuvens 20°C


Altitude: 492.1m

Bússola: 141° SE



1 / 2

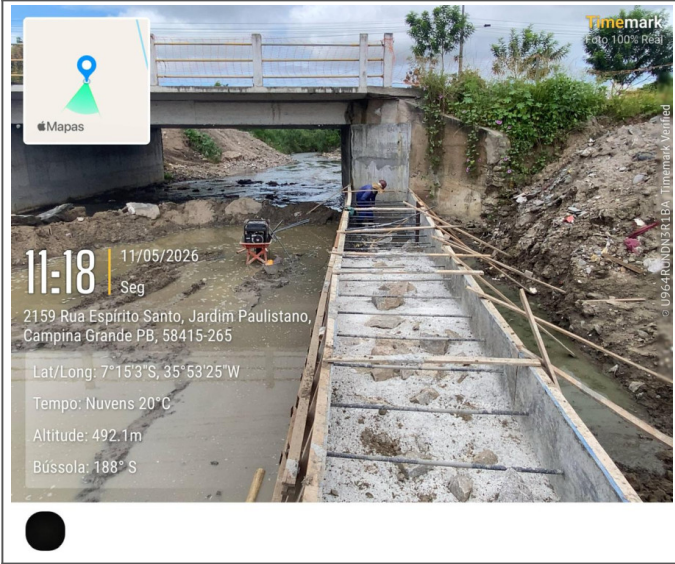


CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899315
Assinatura


Felipe Roberto Teixeira de Melo
Eng. CIVIL - CREA 188422442
Assinatura


Luis Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - SEC08 IPMCO
Assinatura



Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	177	Data do relatório	12/05/2026	Dia da semana	Terça-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☁ Chuvoso	Praticável

Mão de obra (34)						
Auxiliar de Topografia 2	Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 4	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Mão de Obra Própria (32)
Servente 7	Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	
Carpinteiro 3	Motorista de Veículo Pesado 4	Auxiliar de Serviços Gerais 1	Jovem aprendiz adm 1			
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)


Equipamentos (8)					
Escavadeira 3	Caminhão Basculante 4	Retro Escavadeira 1			

Atividades (5)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Rompimento de pedras. Est-18 a Est-22	Em Andamento
Transporte de pedras.	Em Andamento
Desmontagem e montagem da fôrma das paredes.	Em Andamento
Concretagem da parede do canal principal. Lado D a Est-44+4 a Est-44+10 (Primeira etapa)	Em Andamento

Ocorrências (1)
Devido à chuva a tarde não foi possível concluir a execução da concretagem prevista.

Comentários (1)
Felipe Melo 08/06/2026 11:41 Chuva forte e volumosa que paralisou os serviços de concretagem na parte da tarde. Neste dia aconteceu uma reunião na URBEMA, sede provisória da SECOB, com o Secretário de Obras do Município juntamente com a Diretoria da SECOB e a Equipe da Engeconsult.

Fotos (6)

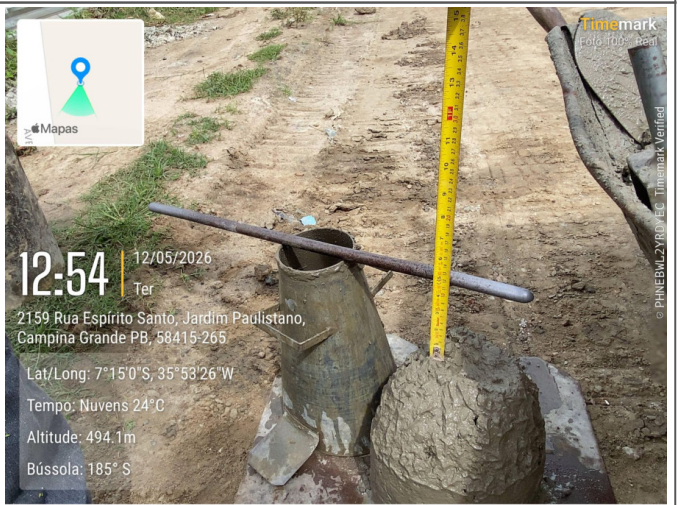

Pedro Saulo do N. Pereira
CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899315
Assinatura

Felipe Roberto Teixeira de Melo
FELIPE ROBERTO TEIXEIRA DE MELO
Eng. CIVIL - CREA 188422445
Assinatura

Luiz Henrique Soares Pinto
Luiz Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621384360
Eng. Civil - SEC08 IPMCO
Assinatura

GRUPO ROCHA CAVALCANTE					
Relatório Diário de Obra (RDO)					
Relatório nº	178	Data do relatório	13/05/2026	Dia da semana	Quarta-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				




Condição climática	Tempo	Condição	Índice pluviométrico
Manhã	☁ Chuvoso	Praticável	20 mm
Tarde	☀ Claro	Praticável	

Mão de obra (31)						
Auxiliar de Topografia 1	Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Mão de Obra Própria (30)
Servente 7	Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	
Carpinteiro 3	Motorista de Veículo Pesado 4	Auxiliar de Serviços Gerais 1	Jovem aprendiz adm 1			
Motorista 1						Terceiros (1)


Equipamentos (7)					
Escavadeira 2	Caminhão Basculante 4	Retro Escavadeira 1			

Atividades (6)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Rompimento de pedras. Est-18 a Est-22	Em Andamento
Transporte de pedras.	Em Andamento
Desmontagem e montagem da fôrma das paredes.	Em Andamento
Concretagem da parede do canal principal. Lado D Est-44+4 a Est-44+10 (Primeira etapa) , Lado Est-38+6 a Est-42+15 (Terceira etapa)	Em Andamento
Esgotamento d´água na Est-18 com bomba d´água.	Em Andamento

Fotos (8)	
Time mark Foto 100% Real Mapas 07:29 13/05/2026 Qua 741 Rua Prefeito Antônio Luís Coutinho, Tambor, Campina Grande PB, 58414-493 Lat/Long: 7° 14'48" S, 35° 53'22" W Tempo: Nuvens 21 °C Altitude: 495.5m Bússola: 139° SE	13 de mai. de 2026 09:28:45 36° NE 1997 Rua Espírito Santo, Jardim Paulistano, Campina Grande, Paraíba Altitude: 505.1msnm Velocidade: 2.2km/h Número de índice: 123 Google

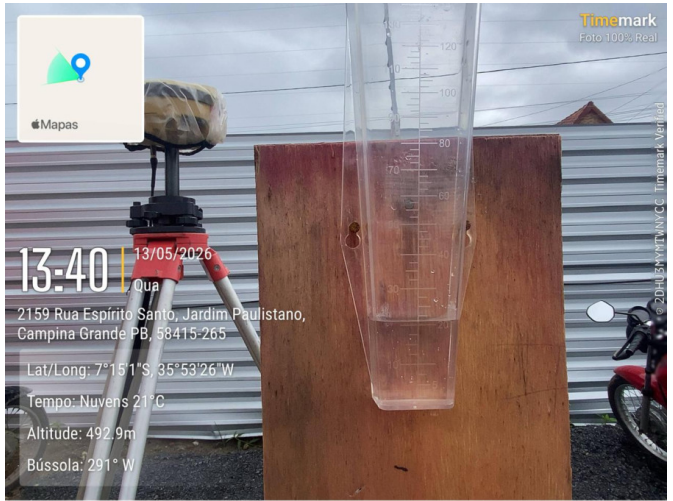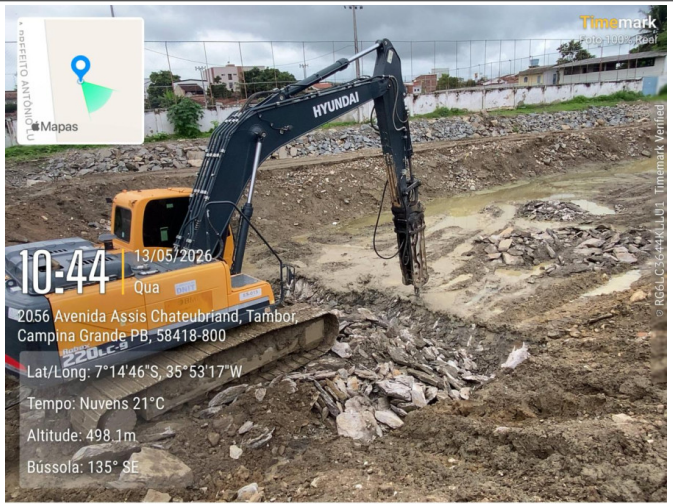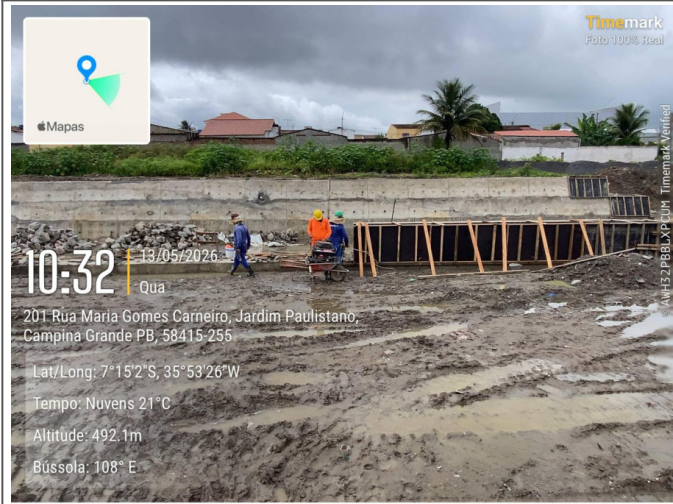

Chuva registrada da tarde do dia 12/05 até 13/05 de tarde.

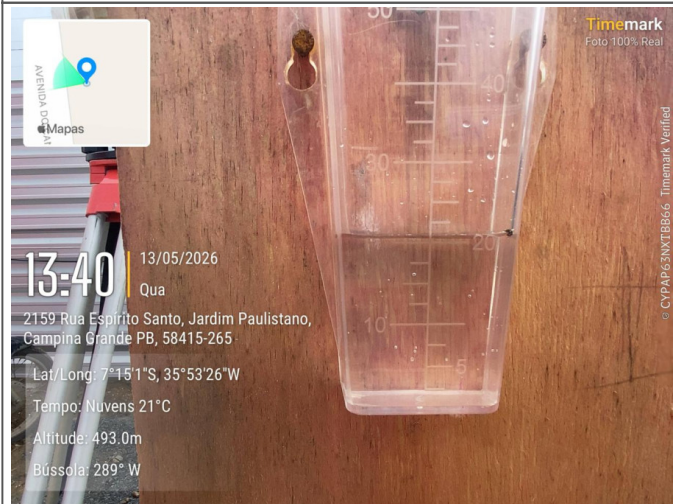

CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899315
Assinatura

Felipe Ribeiro Torres de Melo
Eng. Civil - CREA 188422446
Assinatura

Luis Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621384360
Eng. Civil - SEC08 IPMCO
Assinatura



Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	179	Data do relatório	14/05/2026	Dia da semana	Quinta-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (33)

Auxiliar de Topografia 1	Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	<i>Mão de Obra Própria (31)</i>
Servente 8	Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	
Carpinteiro 3	Motorista de Veículo Pesado 4	Auxiliar de Serviços Gerais 1	Jovem aprendiz adm 1			
Motorista 1	Encanador 1					<i>Terceiros (2)</i>

Equipamentos (7)

Escavadeira 2	Caminhão Basculante 4	Retro Escavadeira 1			
------------------	--------------------------	------------------------	--	--	--

Atividades (6)


Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Rompimento de pedras. Est-18 a Est-22	Em Andamento
Transporte de pedras.	Em Andamento
Desmontagem e montagem da fôrma das paredes.	Em Andamento
Concretagem da parede do canal principal. Lado D Est-42+2 a Est- 43+13 (Segunda Etapa)	Em Andamento
Esgotamento d'água na Est-18 com bomba d'água.	Em Andamento

Fotos (4)





Vídeos (2)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:14
Vídeo 2 (visualizar).mp4 Esgotamento d'água	00:08


CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899315
Assinatura


Felipe Roberto de Almeida
Eng. Civil - CREA 188422442
Assinatura


Luiz Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - SEC08 IPMCO
Assinatura



Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	180	Data do relatório	15/05/2026	Dia da semana	Sexta-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (33)

Auxiliar de Topografia 1	Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Mão de Obra Própria (31)
Servente 8	Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	
Carpinteiro 3	Motorista de Veículo Pesado 4	Auxiliar de Serviços Gerais 1	Jovem aprendiz adm 1			
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (7)

Escavadeira 2	Caminhão Basculante 4	Retro Escavadeira 1			
------------------	--------------------------	------------------------	--	--	--


Atividades (4)

Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Rompimento de pedras. Est-18 a Est-22	Em Andamento
Desmontagem e montagem da fôrma das paredes.	Em Andamento
Esgotamento d'água na Est-18 com bomba d'água.	Em Andamento

Fotos (7)

15 de mai. de 2026 07:35:16 201° S 1766 Rua Santa Catarina Jardim Paulistano Campina Grande Paraíba Altitude: 487.3msnm Velocidade: 1.7km/h Número de índice: 6018	15 de mai. de 2026 07:44:00 18° N 2215 Rua Espírito Santo Jardim Paulistano Campina Grande Paraíba Altitude: 490.5msnm Velocidade: 0.4km/h Número de índice: 6027
---	--




CONSTRUTORA RODRIGUES CAVALCANTE
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA-PB 1621899315
Assinatura


BNG CIVIL - CREA 188422442
Assinatura


Luiz Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - SEC08 IPMCO
Assinatura

 GRUPO ROCHA CAVALCANTE					
Relatório Diário de Obra (RDO)					
Relatório nº	181	Data do relatório	16/05/2026	Dia da semana	Sábado
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☁️ Nublado	Praticável

Mão de obra (21)						
Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 2	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Servente 7	Pedreiro 2	Mão de Obra Própria (19)
Técnico de Segurança do Trabalho 1	Almoxarife 1	Carpinteiro 3				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (2)					
Escavadeira 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (2)	
Desmontagem e montagem da fôrma das paredes.	Em Andamento
Concretagem da parede do canal principal. Lado D Est-43+13 a Est-44+10 (Segunda etapa) e Lado E Est-36+6 a Est-38+6 (Terceira etapa).	Em Andamento

Fotos (1)



16 de maio de 2026 13:53:03

108° E

Altitude: 472,6msnm

Velocidade: 9.7km/h

Número de índice: 124



CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899315

Assinatura



Felipe Roberto Teixeira de Melo
Eng. Civil - CREA 188422444

Assinatura



Luiz Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621384360
Eng. Civil - SEC08 IPMCO

Assinatura



GRUPO
ROCHA
CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	182	Data do relatório	18/05/2026	Dia da semana	Segunda-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição	Índice pluviométrico
Manhã	☀️ Claro	Praticável	4 mm
Tarde	☀️ Claro	Praticável	

Mão de obra (33)						
Auxiliar de Topografia 1	Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Mão de Obra Própria (31)
Servente 8	Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	
Carpinteiro 3	Motorista de Veículo Pesado 4	Auxiliar de Serviços Gerais 1	Jovem aprendiz adm 1			
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (7)					
Escavadeira 2	Caminhão Basculante 4	Retro Escavadeira 1			

Atividades (4)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Rompimento de pedras. Est-18 a Est-22	Em Andamento
Desmontagem e montagem da fôrma das paredes.	Em Andamento
Esgotamento d´água na Est-18 com bomba d´agua.	Em Andamento

Fotos (8)



Chuva Domingo





Vídeos (1)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:16


CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899315
Assinatura


Felipe Ribeiro
Eng. CIVIL - CREA 184422446
Assinatura


Luiz Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621384360
Eng. Civil - SEC08 IPMCO
Assinatura



GRUPO
ROCHA
CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	183	Data do relatório	19/05/2026	Dia da semana	Terça-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (32)						
Auxiliar de Topografia 1	Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Mão de Obra Própria (30)
Servente 8	Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	
Carpinteiro 3	Motorista de Veículo Pesado 4	Auxiliar de Serviços Gerais 1				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (7)					
Escavadeira 2	Caminhão Basculante 4	Retro Escavadeira 1			

Atividades (4)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Rompimento de pedras. Est-18 a Est-22	Em Andamento
Desmontagem e montagem da fôrma das paredes.	Em Andamento
Concretagem da parede do canal principal. Lado D Est-40+6 a Est-42+2 (Segunda Etapa).	Em Andamento

Fotos (7)



19 de mai. de 2026 08:04:19

178° S

Número de índice: 6123



09:53

19/05/2026

Ter

2159 Rua Espírito Santo, Jardim Paulistano, Campina Grande PB, 58415-265


Lat/Long: 7°14'59"S, 35°53'26"W

Tempo: Nuvens 22°C


Altitude: 494.1m

Bússola: 199° S

1 / 2

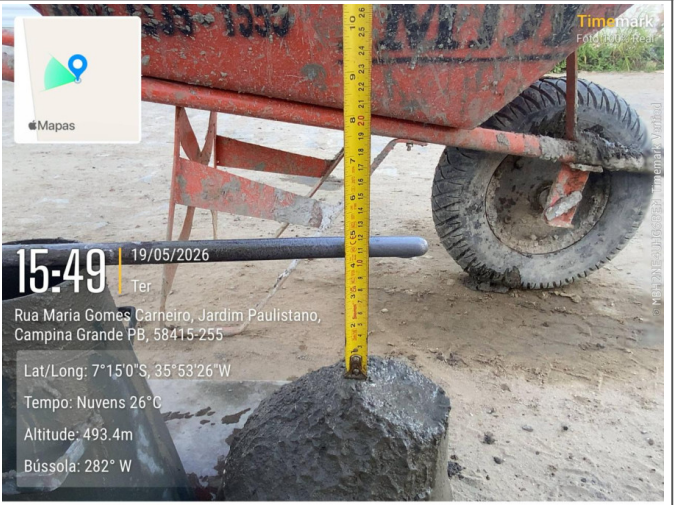

Vídeos (1)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:11


CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899315
Assinatura


FELIPE RIBEIRO TORRES DE MELO
Eng. Civil - CREA 188422446
Assinatura


Luis Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621384360
Eng. Civil - SECOP IPMCO
Assinatura



GRUPO
ROCHA
CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	184	Data do relatório	20/05/2026	Dia da semana	Quarta-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (30)						
Auxiliar de Topografia 1	Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Mão de Obra Própria (28)
Servente 8	Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	
Carpinteiro 3	Motorista de Veículo Pesado 2	Auxiliar de Serviços Gerais 1				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (5)					
Escavadeira 2	Caminhão Basculante 2	Retro Escavadeira 1			

Atividades (4)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Rompimento de pedras. Est-18 a Est-22	Em Andamento
Desmontagem e montagem da fôrma das paredes.	Em Andamento
Esgotamento d´água na Est-18 com bomba d´agua.	Em Andamento

Fotos (7)



Foto 100% Real



07:53

20/05/2026

Qua

2159 Rua Espírito Santo, Jardim Paulistano, Campina Grande PB, 58415-265

Lat/Long: 7°15'0"S, 35°53'25"W

Tempo: Nuvens 22°C


Altitude: 493.4m

Bússola: 173° S





Foto 100% Real



08:12

20/05/2026

Qua

2095 Avenida do Canal, Jardim Paulistano, Campina Grande PB, 58415-265

Lat/Long: 7°14'55"S, 35°53'26"W


Tempo: Nuvens 22°C

Altitude: 494.7m

Bússola: 177° S






CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899315
Assinatura


Felipe Roberto Fernandes de Melo
Eng. CIVIL - CREA 1884022462
Assinatura


Luiz Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - SEC08 IPMCO
Assinatura



GRUPO
ROCHA
CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	185	Data do relatório	21/05/2026	Dia da semana	Quinta-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (30)						
Auxiliar de Topografia 1	Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Mão de Obra Própria (28)
Servente 8	Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	
Carpinteiro 3	Motorista de Veículo Pesado 2	Auxiliar de Serviços Gerais 1				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (5)					
Escavadeira 2	Caminhão Basculante 2	Retro Escavadeira 1			

Atividades (4)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Rompimento de pedras. Est-18 a Est-22	Em Andamento
Desmontagem e montagem da fôrma das paredes.	Em Andamento
Concretagem da parede do canal principal. Lado D Est-39 a Est-40+6 (Segunda Etapa) e lado E Est-33+18 a Est-36+6 (Terceira Etapa)	Em Andamento



Fotos (4)




21 de mai. de 2026 13:39:12
196° S
Número de índice: 6204



13:42 | 21/05/2026
Quinta-Feira
2159 Rua Espírito Santo, Jardim Paulistano,
Campina Grande PB, 58415-265
Lat/Long: 7°14'58"S, 35°53'25"W
Tempo: Nuvens 26°C
Altitude: 493.3m
Bússola: 52° NE

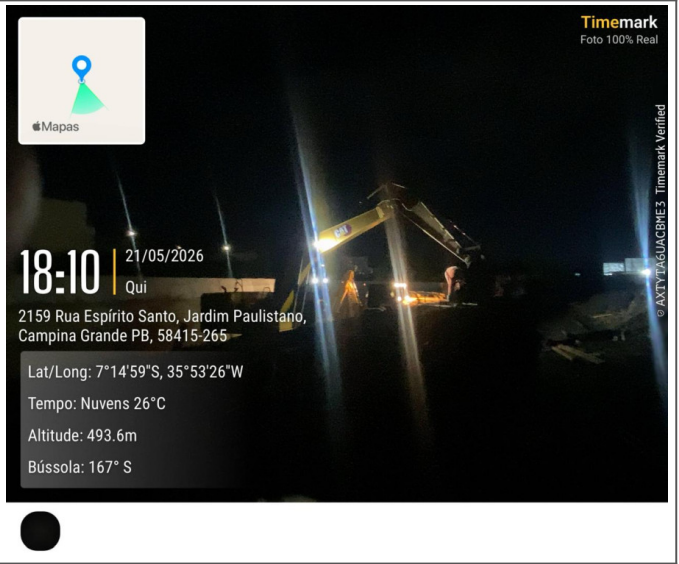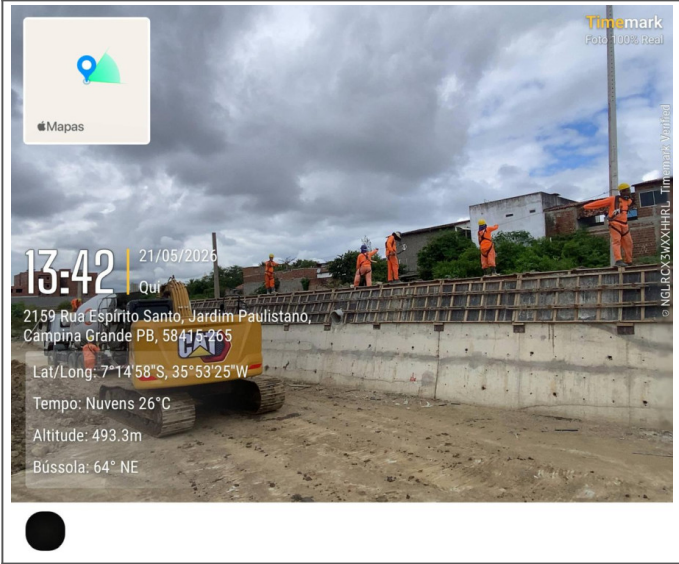


CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899315

Assinatura


Felipe Roberto Vasconcelos de Melo
Eng. Civil - CREA 188422442

Assinatura


Luis Henrique Soares Pinto
CREA - PB 1621394360
Eng. Civil - SEC08 IPMCO

Assinatura



Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório n°	186	Data do relatório	22/05/2026	Dia da semana	Sexta-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (30)

Auxiliar de Topografia 1	Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Mão de Obra Própria (28)
Servente 8	Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	
Carpinteiro 3	Motorista de Veículo Pesado 2	Auxiliar de Serviços Gerais 1				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (5)


Escavadeira 2	Caminhão Basculante 2	Retro Escavadeira 1			
------------------	--------------------------	------------------------	--	--	--

Atividades (4)

Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Rompimento de pedras. Est-18 a Est-22	Em Andamento
Limpeza de material de 3 categoria.	Em Andamento
Desmontagem e montagem da fôrma das paredes.	Em Andamento

Fotos (5)



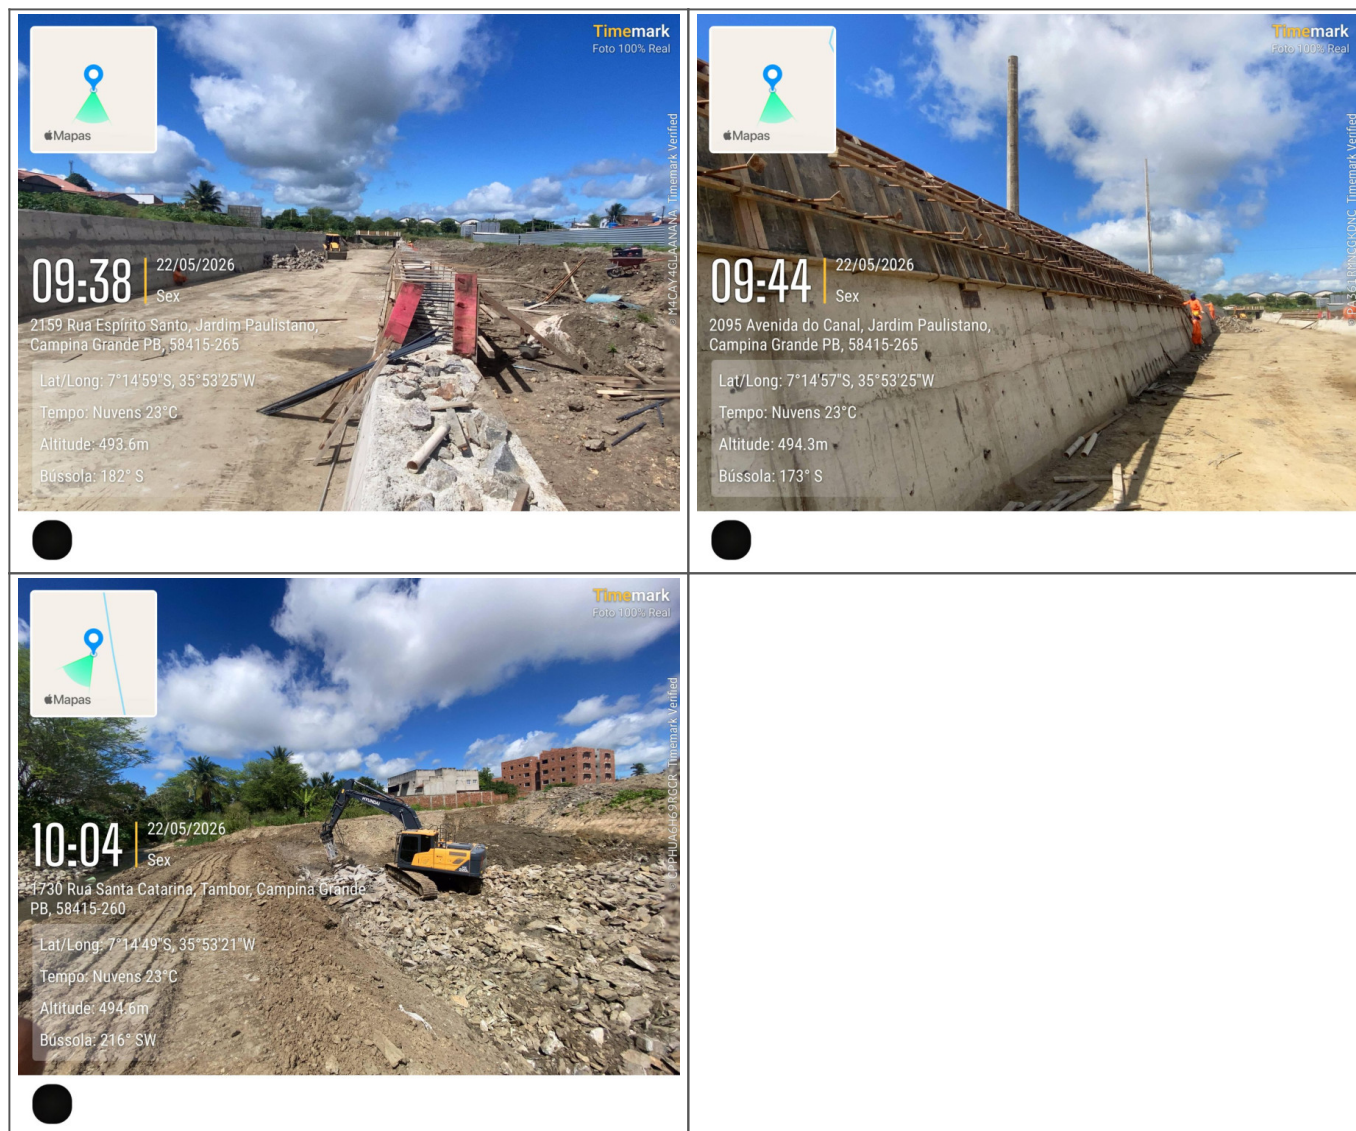

Vídeos (1)

[Vídeo 1 \(visualizar\).mp4](#)

00:31

Pedro Paulo
CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA-PR 1621699315

Assinatura


Felipe Gustavo Tomaz de Melo

Assinatura


Luis Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - SECOP IPMCG

Assinatura

 GRUPO ROCHA CAVALCANTE						
Relatório Diário de Obra (RDO)						
Relatório nº	187	Data do relatório	23/05/2026	Dia da semana	Sábado	
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025					
Condição climática		Tempo		Condição		
Manhã		☀️ Claro		Praticável		
Tarde		☀️ Claro		Praticável		
Mão de obra (20)						
Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 2	Encarregado Geral 1	Servente 7	Pedreiro 2	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Mão de Obra Própria (18)
Almoxarife 1	Carpinteiro 3					
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)
Equipamentos (2)						
Escavadeira 1	Retro Escavadeira 1					
Atividades (1)						
Concretagem da parede do canal principal. Lado D Est-37+12 a Est-39 (Segunda Etapa)						Em Andamento


CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899315
Assinatura


Felipe Roberto Teixeira de Melo
Eng. Civil - CREA 188422442
Assinatura


Luiz Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - SEC08 IPMCO
Assinatura



GRUPO
ROCHA
CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	188	Data do relatório	25/05/2026	Dia da semana	Segunda-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição	Índice pluviométrico
Manhã	☀️ Claro	Praticável	6 mm
Tarde	☀️ Claro	Praticável	

Mão de obra (30)						
Auxiliar de Topografia 1	Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Mão de Obra Própria (28)
Servente 8	Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	
Carpinteiro 3	Motorista de Veículo Pesado 2	Auxiliar de Serviços Gerais 1				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (5)					
Escavadeira 2	Caminhão Basculante 2	Retro Escavadeira 1			

Atividades (5)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Rompimento de pedras. Est-18 a Est-22	Em Andamento
Limpeza de material de 3 categoria.	Em Andamento
Esgotamento d´água.	Em Andamento
Desmontagem e montagem da fôrma das paredes.	Em Andamento

Fotos (10)



Timemark
Foto 100% Real

06:51 | 25/05/2026
Seg

2159 Rua Espírito Santo, Jardim Paullistano, Campina Grande PB, 58415-265

Lat/Long: 7°15'1"S, 35°53'26"W

Tempo: Nuvens 20°C

Altitude: 493.0m

Bússola: 287° W





Timemark
Foto 100% Real

06:51 | 25/05/2026
Seg

2159 Rua Espírito Santo, Jardim Paullistano, Campina Grande PB, 58415-265

Lat/Long: 7°15'1"S, 35°53'26"W

Tempo: Nuvens 20°C


Altitude: 493.1m

Bússola: 288° W








CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899315
Assinatura


Felipe Roberto Fernandes de Melo
Eng. CIVIL - CREA 188422442
Assinatura


Luis Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621384360
Eng. Civil - SEC08 IPMCO
Assinatura



GRUPO
ROCHA
CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	189	Data do relatório	26/05/2026	Dia da semana	Terça-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				


Condição climática	Tempo	Condição	Índice pluviométrico
Manhã	☀️ Claro	Praticável	2.5 mm
Tarde	☀️ Claro	Praticável	


Mão de obra (30)						
Auxiliar de Topografia 1	Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Mão de Obra Própria (28)
Servente 8	Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	
Carpinteiro 3	Motorista de Veículo Pesado 2	Auxiliar de Serviços Gerais 1				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (5)					
Escavadeira 2	Caminhão Basculante 2	Retro Escavadeira 1			


Atividades (5)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Rompimento de pedras. Est-18 a Est-22	Em Andamento
Limpeza de material de 3 categoria.	Em Andamento
Desmontagem e montagem da fôrma das paredes.	Em Andamento
Concretagem da parede do canal principal. Lado D Est-36+4 a Est-37+12 (Segunda Etapa)	Em Andamento

Fotos (10)

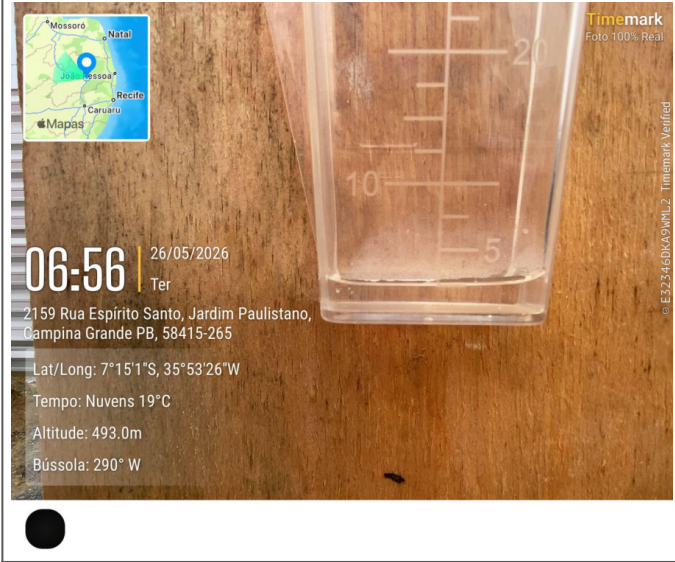


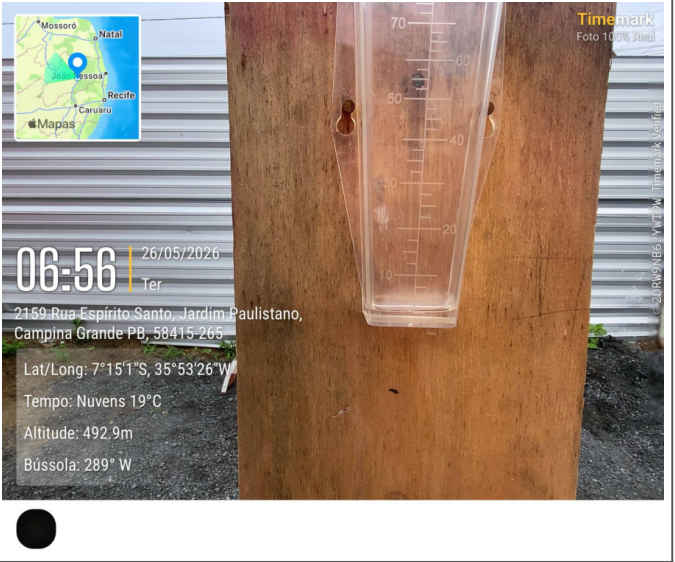

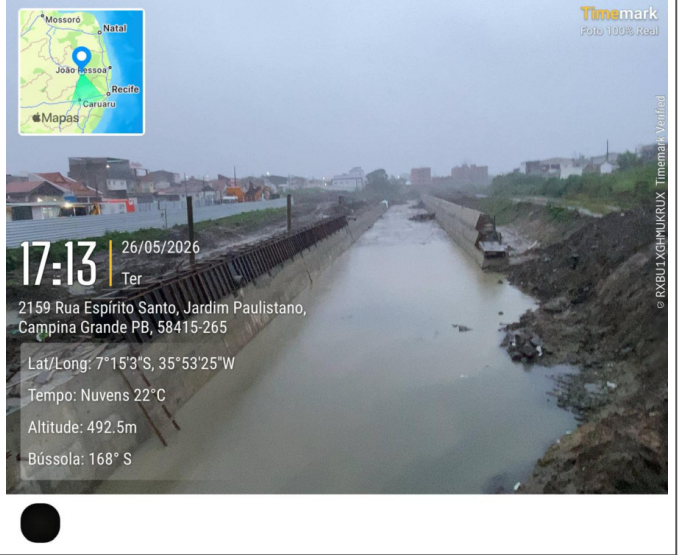

 26 de mai. de 2026 13:10:49 202° S Número de índice: 6278	 Canal do prado 14:24 26 mai. 2026 Ter Rua Espírito Santo 2159, Jardim Paulistano, Campina Grande - PB, 58415-265 Empresa: controle tecnológico Rocha Cavalcante Nome: auxiliar adolfo Lat/Long: 7.250208°S, 35.890792°W Tempo: Nuvens 22°C Altitude: 492.3 m Bússola: 21° N Canal: concretagem controle tecnológico Rocha Cavalcante canal do Prado
 26 de mai. de 2026 17:08:36 47° NE 2159 Rua Espírito Santo Jardim Paulistano Campina Grande Paraíba Altitude: 493.5msnm Número de índice: 125	 17:13 26/05/2026 Ter 2159 Rua Espírito Santo, Jardim Paulistano, Campina Grande PB, 58415-265 Lat/Long: 7°15'3"S, 35°53'25"W Tempo: Nuvens 22°C Altitude: 492.5m Bússola: 168° S

Vídeos (3)		
Vídeo 1 (visualizar).mp4		00:07
Vídeo 2 (visualizar).mp4		00:19
Vídeo 3 (visualizar).mp4		00:25


CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899315
Assinatura


Felipe Roberto Vasconcelos Neto
Eng. Civil - CREA 188422442
Assinatura


Luiz Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621384360
Eng. Civil - SEC08 IPMCO
Assinatura



Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	190	Data do relatório	27/05/2026	Dia da semana	Quarta-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição	Índice pluviométrico
Manhã	☀️ Claro	Praticável	7 mm
Tarde	☀️ Claro	Praticável	

Mão de obra (30)						
Auxiliar de Topografia 1	Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Mão de Obra Própria (28)
Servente 8	Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	
Carpinteiro 3	Motorista de Veículo Pesado 2	Auxiliar de Serviços Gerais 1				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (5)					
Escavadeira 2	Caminhão Basculante 2	Retro Escavadeira 1			

Atividades (5)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Limpeza de camada vegetal, pequenas árvores e demolição de invasão (lado do campo de futebol). Lado E , Est-14 a Est-18	Em Andamento
Limpeza de material de 3 categoria.	Em Andamento
Esgotamento d´água.	Em Andamento
Desmontagem e montagem da fôrma das paredes.	Em Andamento

Fotos (8)



Precipitação durante o expediente

Vídeos (2)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:17
Vídeo 2 (visualizar).mp4	00:10

CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899315
Assinatura

Felipe Henrique Soares Pinto
Eng. Civil - CREA 184422446
Assinatura

Luiz Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621384360
Eng. Civil - SEC08 IPMCO
Assinatura

GRUPO
ROCHA
CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	191	Data do relatório	28/05/2026	Dia da semana	Quinta-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (30)

Auxiliar de Topografia 1	Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Mão de Obra Própria (28)
Servente 8	Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	
Carpinteiro 3	Motorista de Veículo Pesado 2	Auxiliar de Serviços Gerais 1				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (5)

Escavadeira 2	Caminhão Basculante 2	Retro Escavadeira 1			
------------------	--------------------------	------------------------	--	--	--

Atividades (5)

Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Limpeza de camada vegetal, pequenas árvores e material de 1 categoria. Lado E , Est-14 a Est-18	Em Andamento
Limpeza e escavação de material 1 e 2 material.Est-32 e Est-33	Em Andamento
Desmontagem e montagem da fôrma das paredes.	Em Andamento
Concretagem da parede do canal principal. Lado D Est-36 a Est-36+4 (Segunda Etapa) e , Lado D Est-42 a Est-44 (Terceira etapa)	Em Andamento

Fotos (4)



28 de mai. de 2026 07:51:13
195° S



TimeMark
Foto 100% Real

09:53 28/05/2026
Qui

2252-2332 Avenida do Canal, Jardim Paulistano,
Campina Grande PB, 58415-265

Lat/Long: 7°15'2"S, 35°53'26"W

Tempo: Nuvens 22° C

Altitude: 492.3m

Bússola: 126° SE

1 / 2



Vídeos (2)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:07
Vídeo 2 (visualizar).mp4	00:10


 CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE
 Pedro Saulo do N. Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA - PB 1621699315
 Assinatura


 Felipe Roberto Fernandes de Melo
 Eng. CIVIL - CREA 188422444
 Assinatura


 Luis Henrique Soares Pinto
 CREA-PB 1621394360
 Eng. Civil - SEC08 IPMCO
 Assinatura



GRUPO
ROCHA
CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	192	Data do relatório	29/05/2026	Dia da semana	Sexta-Feira
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (30)						
Auxiliar de Topografia 1	Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Topógrafo 1	Assistente Financeiro 1	Encarregado Geral 1	Mão de Obra Própria (28)
Servente 8	Pedreiro 2	Apropriador 1	Técnico de Segurança do Trabalho 1	Auxiliar de Engenharia 1	Almoxarife 1	
Carpinteiro 3	Motorista de Veículo Pesado 2	Auxiliar de Serviços Gerais 1				
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (5)					
Escavadeira 2	Caminhão Basculante 2	Retro Escavadeira 1			

Atividades (5)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Limpeza de material de 1 categoria e 2 categoria. Lado E , Est-14 a Est-18	Em Andamento
Limpeza e escavação de material 1 e 2 material.Est-32 e Est-33	Em Andamento
Esgotamento d´água.	Em Andamento
Desmontagem e montagem da fôrma das paredes.	Em Andamento


Fotos (5)




sex., 29 mai. 2026 08:06:47
N 9198020 E 180891
Rua Francisco Ernesto do Rego, 10
Tambor
Campina Grande PB
58415-620
Brasil
ENGECONSULT
#OBRA CANAL DO PRADO



29 de mai. de 2026 13:19:50
193° S

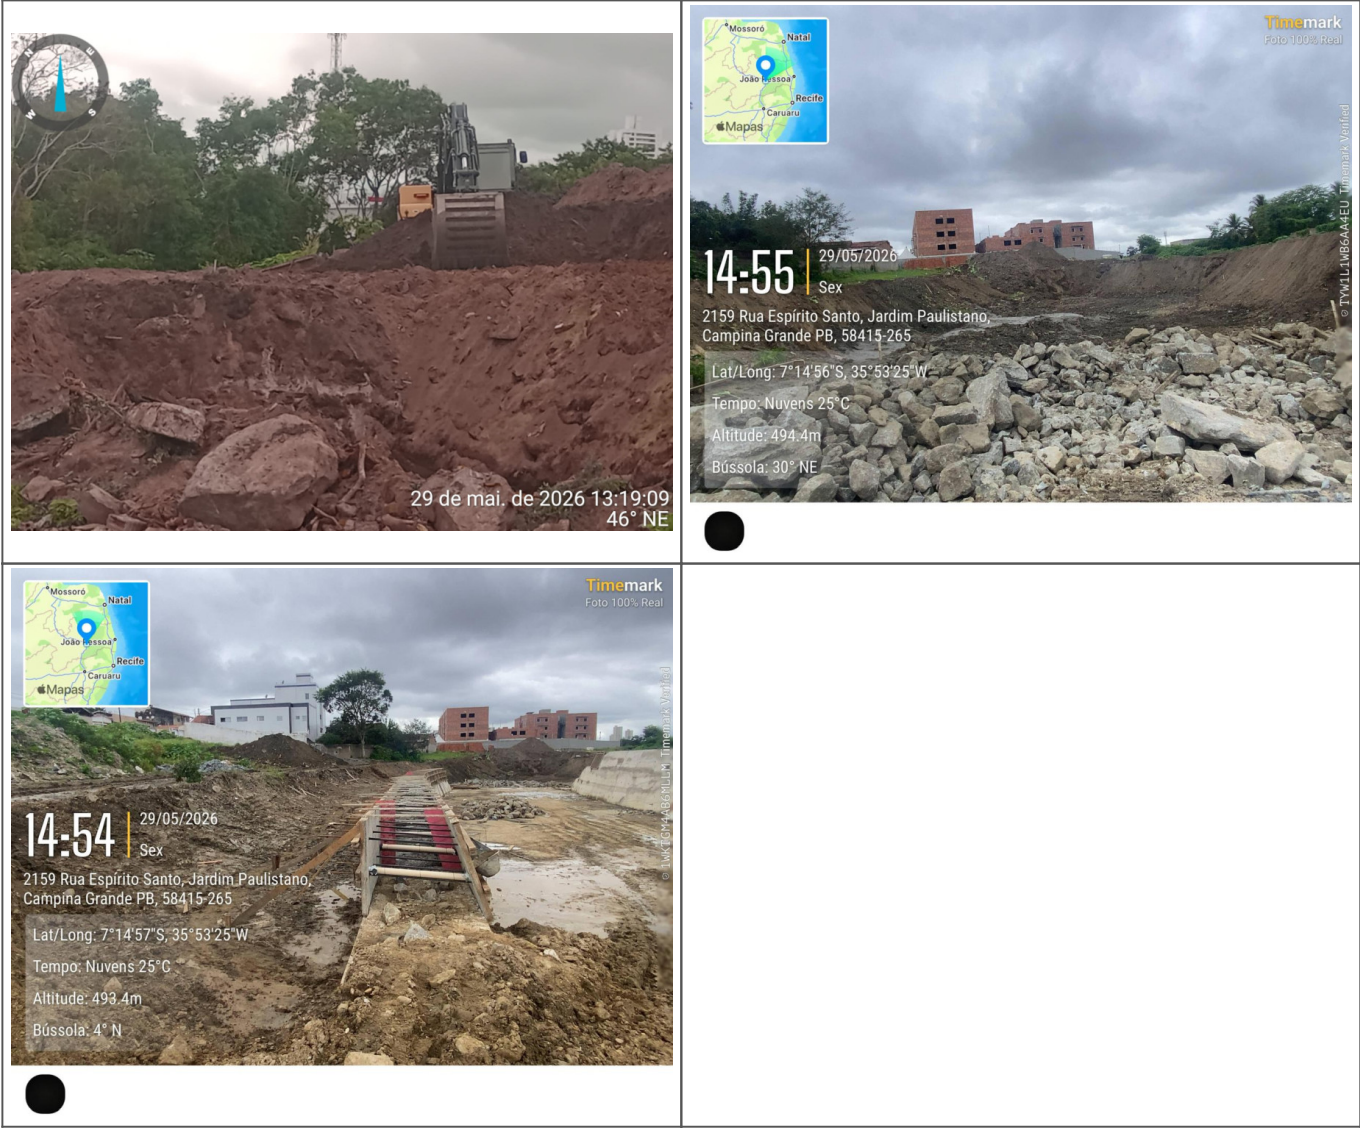


CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899315
Assinatura


Felipe Ribeiro
Eng. Civil - CREA 188422442
Assinatura


Luis Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621384360
Eng. Civil - SEC08 IPMCO
Assinatura



GRUPO
ROCHA
CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório nº	193	Data do relatório	30/05/2026	Dia da semana	Sábado
Obra	CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025				

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Nublado	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (25)						
Engenheiro 1	Operador de Equipamentos 3	Encarregado Geral 1	Servente 7	Pedreiro 2	Apropriador 1	Mão de Obra Própria (23)
Técnico de Segurança do Trabalho 1	Almoxarife 1	Carpinteiro 3	Motorista de Veículo Pesado 3			
Motorista 1	Encanador 1					Terceiros (2)

Equipamentos (6)					
Escavadeira 2	Caminhão Basculante 3	Retro Escavadeira 1			

Atividades (4)	
Limpeza de material de 1 categoria e 2 categoria. Lado E , Est-14 a Est-18	Em Andamento
Limpeza e escavação de material de 1 e 2 categoria.Est-32 e Est-33	Em Andamento
Desmontagem e montagem da fôrma das paredes.	Em Andamento
Concretagem da parede do canal principal. Lado D Est-33+10 a Est-35+5 (Segunda Etapa) e , Lado D a Est-44 a Est-44+10 (Terceira etapa)	Em Andamento


Fotos (2)



30 de mai. de 2026 10:36:36
5° N
2159 Rua Espírito Santo
Jardim Paulistano
Campina Grande
Paraíba
Altitude:490.4msnm
Velocidade:0.0km/h
Número de índice: 126



30 de mai. de 2026 12:14:29
7.249536666666668S-35.89071333333333W
1991 Rua Espírito Santo
Jardim Paulistano
Campina Grande
Paraíba
#CONSTRUTORA ROCHA



CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - PB 1621899315

Assinatura



CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE
Felipe Roberto Teixeira de Melo
Eng. Civil - CREA 188422446

Assinatura



CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE
Luiz Henrique Soares Pinto
CREA - PB 1621384360
Eng. Civil - SECOP IPMCO

Assinatura
