

									Grau de Sigilo					
Nº do CTEF(Contrato Execução/Fornecimento)		BM - Número - 14				BM - Data emissão:	10/08/2026	BM - Período de referência da medição	01/07/2026 a 31/07/2026	Nº do CT	2.08.018/2023	Data do CT	07/02/19	
Início da obra 30/10/2023 Término da obra 18/06/2026		Empresa Contratada SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA							CNPJ	01.514.128/0001-36	Tomador/Ag.Promotor ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE			
CTEF- Valor total inicial (R\$)		Objeto do CTEF(resumido) Urbanização da Av. Plínio Lemos											Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
		Local da obra (Bairro/Município/UF)											Fonte de Recursos outra (descrever)	
CTEF- Valor atual (R\$)		AVENIDA PLÍNIO LEMOS, MALVINAS, CAMPINA GRANDE-PB												
		18.941.944,10											21.964.625,38	

FISICO FINANCEIRO												
ITEM	CÓDIGO SINAPI PARA	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL	EXECUTADO FISICO(QUANTITATIVOS)			EXECUTADO FINANCEIRO(R\$)		
							ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACMULADO INCLUINDO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACMULADO INCLUINDO PERÍODO
1		DRENAGEM PLUVIAL										
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				31.213,63				31.213,63	-	31.213,63
1.1	ORSE-2663	Locação rede de drenagem	M	1.663,59	2,07	3.443,63	1.663,59		1.663,59	3.443,63	-	3.443,63
1.2	10193 - SINAPI PB (MAR 2023)	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO RETO, H = 2,30 m, ESPAÇAMENTO 2,5 m, CRAVADOS A 0,5 m, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	500,00	55,54	27.770,00	500,00		500,00	27.770,00	-	27.770,00
2		REDE COLETORA		-		1.890.251,31				1.890.251,33	-	1.890.251,33
2.1	92210-SINAPI	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferência - fornecimento e assentamento. af_12/2015	M	248,94	198,77	49.481,80	248,94		248,94	49.481,80	-	49.481,80
2.2	92212-SINAPI	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferência - fornecimento e assentamento. af_12/2015	M	1.204,65	300,00	361.395,00	1.204,65		1.204,65	361.395,00	-	361.395,00
2.3	037449-SINAPI	Tubo de concreto simples para águas pluviais, classe ps1, com encaixe macho e fêmea, diâmetro nominal de 200 mm	M	-	44,96	-	-		-	-	-	-
2.4	038054-SINAPI	Tubo dreno, corrugado, espiralado, flexível, perfurado, em polietileno de alta densidade (pead), dn "200" mm, (8") para drenagem - em barra (norma dnit 093/2006 - em)	M	216,00	50,66	10.942,56	216,00		216,00	10.942,56	-	10.942,56
2.5	COMPOSIÇÃO A	Poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1,0x1,0 m, externa de 1,40 x1,40 profundidade = 2,00 m, excluindo tampão. af_12/2020_pa	UNIDADE	34,00	4.000,01	136.000,34	34,00		34,00	136.000,34	-	136.000,34
2.6	97947-SINAPI	Caixa com grelha simples retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,5x1x1 m. af_12/2020 (boca de lobo)	UNIDADE	42,00	2.020,84	84.875,28	42,00		42,00	84.875,28	-	84.875,28
2.7	09141-ORSE	Tampão de ferro fundido articulado toda 600 mm, 300 kg/cm², para poço de visitas e caixas. inscrição águas pluviais.	UNIDADE	16,00	962,10	15.393,60	16,00		16,00	15.393,60	-	15.393,60
2.8	90107-SINAPI	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,00m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m3/111 hp), larg. menor que 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021	M³	857,31	8,23	7.055,66	857,31		857,31	7.055,67	-	7.055,67
2.9	102311-SINAPI	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,50 até 3,00 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (1,2 m3,larg. de 1,5 m até 2,5 m, em solo de 2a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021	M³	208,41	14,04	2.926,08	208,41		208,41	2.926,08	-	2.926,08
2.10	4503-ORSE	Escavação em valas, a fogo controlado, em material de 3ª categoria (rocha dura), com uso de compressor, perfuratriz pneumática e explosivos (aprovado pela gigogjp em nt.002 - cagepa c049050-1	M³	94,73	200,00	18.946,00	94,73		94,73	18.946,00	-	18.946,00
2.10.1	Comp. 01	Escavação em vala de material de 3ª categoria (rocha), com rompedor acoplado em escavadeira hidráulica, inclusive remoção de material de vala com escavadeira hidráulica	M³	2.664,14	199,45	531.362,72	2.664,14		2.664,14	531.362,72	-	531.362,72
2.11	94329-SINAPI	Envolvimento e colchão de areia: aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com areia para aterro. af_05/2016	M³	1.595,49	104,66	166.983,98	1.595,49		1.595,49	166.983,96	-	166.983,96
2.12	93362-SINAPI	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade daçacamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016 (material reaproveitado)	M³	-	15,78	-	-		-	-	-	-

FÍSICO FINANCEIRO												
ITEM	CÓDIGO SINAPI PARA	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL	EXECUTADO FÍSICO(QUANTITATIVOS)			EXECUTADO FINANCEIRO(R\$)		
							ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACMULADO INCLUINDO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACMULADO INCLUINDO PERÍODO
2.13	93362 + 0368 - SINAPI	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade dacaçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016 (material de empréstimo) + areia para aterro	M³	1.317,06	88,25	116.230,55	1.317,06		1.317,06	116.230,55	-	116.230,55
2.14	100982-SINAPI	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 (bota fora)	M³	3.894,40	6,72	26.170,37	3.894,40		3.894,40	26.170,37	-	26.170,37
2.14.1	100982-SINAPI	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 (jazida)	M³	4.176,93	6,72	28.068,97	4.176,93		4.176,93	28.068,98	-	28.068,98
2.15	95875-SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade m³xkm). af_09/2016.(momento extraordinário transporte de jazida)	M³XKM	60.960,42	1,51	92.050,23	60.960,42		60.960,42	92.050,24	-	92.050,24
2.15.1	95875-SINAPI	Bota-fora com caminhão basculante via urbana pavimentada m³ x km, DMT até 30km (unidade: m³ x km).	M³XKM	70.429,50	1,51	106.348,55	70.429,50		70.429,50	106.348,56	-	106.348,56
2.16	004721-SINAPI	Pedra britada n.1 (9,5 a 19 mm) - posto pedra/fornecedor sem frete	M³	280,80	162,99	45.767,59	280,80		280,80	45.767,60	-	45.767,60
2.17	006081-SINAPI	Argila ou barro para aterro ou reaterro (com transporte até 10 km	M³	-	64,43	-	-		-	-	-	-
2.18	102715-SINAPI	Geotêxtil não tecido 100% poliéster, resistência a tração de 26kn/m(t-26), instalado em dreno - fornecimento e instalação. af_07/2021	M²	739,60	32,67	24.162,73	739,60		739,60	24.162,73	-	24.162,73
2.19	ORSE-05156	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico, fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes	M	-	3,78	-	-		-	-	-	-
2.2	ORSE-05158	Sinalização com telas portáteis para isolamento	M	2.246,13	5,81	13.050,02	2.246,13		2.246,13	13.050,01	-	13.050,01
2.21	ORSE-03090	Bombeamento para esgotamento de valas com duração de 8 horas/dia	H	193,00	7,61	1.468,73	193,00		193,00	1.468,73	-	1.468,73
2.22	ORSE-05153	Passadiços com tábuas de madeira para pedestres	M²	16,00	105,02	1.680,32	16,00		16,00	1.680,32	-	1.680,32
2.23	101819-SINAPI	Recomposição de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa, com reaproveitamento dos paralelepípedos, para o fechamento de valas - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020	M²	290,00	72,06	20.897,40	290,00		290,00	20.897,40	-	20.897,40
2.24	COMPOSIÇÃO B	Retirada e reposição de rede de água	M	144,30	74,24	10.712,83	144,30		144,30	10.712,83	-	10.712,83
2.25	COMPOSIÇÃO C	Retirada e reposição de ligação domiciliar de água	UNIDADE	6,00	53,89	323,34	6,00		6,00	323,34	-	323,34
2.26	COMPOSIÇÃO D	Retirada e reposição de rede de esgotos	M	144,30	121,72	17.564,20	144,30		144,30	17.564,20	-	17.564,20
2.27	COMPOSIÇÃO E	Retirada e reposição de ligação domiciliar de esgoto	UNIDADE	6,00	65,41	392,46	6,00		6,00	392,46	-	392,46
2.28	ORSE-11675	Cadastro técnico de rede de drenagem	M	-	1,78	-	-		-	-	-	-
2.29	ORSE-02830	Limpeza e teste de estanqueidade	M	-	2,85	-	-		-	-	-	-
3.0		PONTA DE ALA		-		41.563,57				41.563,57	-	41.563,57
3.1	102740-SINAPI	Boca para bueiro simples tubular d = 100 cm em concreto, alas com esconsidade de 0º, incluindo formas e materiais. af_07/2021	UNIDADE	6,00	6.520,34	39.122,04	6,00		6,00	39.122,04	-	39.122,04
3.2	93358-SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade maior ou igual a 1,30 m	M³	3,60	86,11	310,00	3,60		3,60	310,00	-	310,00
3.3	ORSE-02499	Escavação manual de vala em material de 2ª categoria até 2,00m	M³	5,40	102,97	556,04	5,40		5,40	556,04	-	556,04
3.4	ORSE-04502	Escavação manual de vala ou cava em material de 3a categoria, profundidade até 2,00 m, com uso de explosivos e perfuração manual	M³	6,60	187,89	1.240,07	6,60		6,60	1.240,07	-	1.240,07
3.5	93362-SINAPI	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade dacaçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016 (material reaproveitado)	M³	6,60	15,78	104,15	6,60		6,60	104,15	-	104,15
3.6	93362 + 0368 - SINAPI	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade dacaçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016 (material de empréstimo) + areia para aterro	M³	1,56	88,25	137,67	1,56		1,56	137,67	-	137,67

FÍSICO FINANCEIRO												
ITEM	CÓDIGO SINAPI PARA	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL	EXECUTADO FÍSICO(QUANTITATIVOS)			EXECUTADO FINANCEIRO(R\$)		
							ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACMULADO INCLUINDO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACMULADO INCLUINDO PERÍODO
3.7	100982-SINAPI	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 (bota fora)	M³	9,92	6,72	66,66	9,92		9,92	66,66	-	66,66
3.8	95875-SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade m³xkm). af_09/2016.(momento extraordinário transporte de bota fora)	M³ X KM	17,84	1,51	26,94	17,84		17,84	26,94	-	26,94
SUB-TOTAL						1.963.028,51				1.963.028,53	-	1.963.028,53
II RECAPEAMENTO ASFÁLTICO												
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				311.096,43				258.862,60	-	258.862,60
1.1	99064-SINAPI	Locação de pavimentação. AF_10/2018	M	4.596,91	0,67	3.079,93	4.135,43		4.135,43	2.770,74	-	2.770,74
1.2	98524-SINAPI	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.AF_05/2018	m²	514,80	3,02	1.554,70	514,80		514,80	1.554,70	-	1.554,70
1.3	101819-SINAPI	Recomposição de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa, com aproveitamento dos paralelepípedos, incluso retirada e colocação do material	m²	2.871,40	70,95	203.725,83	2.871,40		2.871,40	203.725,84	-	203.725,84
1.4	96001-SINAPI	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - Exclusive transporte	m²	10.756,17	9,22	99.171,89	5.320,00		5.320,00	49.050,40	-	49.050,40
1.5	100982-SINAPI	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³. Carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³/111HP e decarga livre (unidade: m³) AF_07/2020	m³	538,38	6,62	3.564,08	266,00		266,00	1.760,92	-	1.760,92
2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				3.488.254,20				3.044.851,92	-	3.044.851,92
2.1	COMPOSIÇÃO	Execução de pintura de lição com emulsão asfáltica RR-2C. AF_11/2019	m²	56.865,59	4,05	230.305,64	53.036,27		53.036,27	214.796,89	-	214.796,89
3		CBUQ									-	
3.1	95995-SINAPI	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - Exclusive carga e transporte. AF_11/2019	m³	1.413,68	1.500,01	2.120.534,14	1.183,92		1.183,92	1.775.891,84	-	1.775.891,84
3.2	95996-SINAPI	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de Binder - Exclusive carga e transporte. AF_11/2019	m³	741,16	1.400,00	1.037.624,00	717,70		717,70	1.004.780,00	-	1.004.780,00
3.3	101002-SINAPI	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	2.212,11	3,54	7.830,87	1.901,62		1.901,62	6.731,73	-	6.731,73
3.4	100986-SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	17.319,41	5,31	91.966,07	8.032,29		8.032,29	42.651,46	-	42.651,46
4		OUTROS SERVIÇOS				16.240,32				16.240,32	-	16.240,32
4.1	06382-ORSE	Conserto de poço de visita - Nivelamento de tampão	unidade	36,00	451,12	16.240,32	36,00		36,00	16.240,32	-	16.240,32
SUB-TOTAL						3.815.590,95				3.319.954,84	-	3.319.954,84
III CALÇADAS E CICLOVIAS												
1		SERVIÇOS INICIAIS				247.026,85				177.762,14	-	177.762,14
1.1	98525-SINAPI	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas arvores (diâmetro menor que 0,20 m), com trator de esteiras.	m²	79.245,20	0,42	33.282,98	74.021,12		74.021,12	31.088,87	-	31.088,87
1.2	020404-EMBASA	Corte de árvore com destocamento manual, c/ diâmetro entre 15 e 30cm	unid.	210,00	85,21	17.894,10	210,00		210,00	17.894,10	-	17.894,10
1.3	03240-ORSE	Demolição de piso de alta resistência	m²	1.230,00	22,79	28.031,70	1.230,00		1.230,00	28.031,70	-	28.031,70
1.4	00021-ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pré moldado	m	1.033,00	11,41	11.786,53	-		-	-	-	-
1.5	22911-SBC	Remoção e bota-fora de entulho em caminhão 12m³ - Percurso 12km.	m³	72,00	56,33	4.055,76	72,00		72,00	4.055,76	-	4.055,76
1.6	100577-SINAPI	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso.	m²	73.859,81	1,34	98.972,15	51.463,53		51.463,53	68.961,13	-	68.961,13
1.7	C3104-SEINFRA CE	Remoção de cercas	m	2.400,00	0,53	1.272,00	2.400,00		2.400,00	1.272,00	-	1.272,00
1.8	C3373-SEINFRA CE	Retirada de meio fio em pedra granítica	m	4.282,42	12,08	51.731,63	2.190,28		2.190,28	26.458,58	-	26.458,58
2		CALÇADAS				1.716.426,98				761.604,83	-	761.604,83
2.1		CALÇADAS CANTEIRO CENTRAL				1.113.107,61				428.519,43	-	428.519,43
2.1.1	94995-SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022	m²	8.380,97	72,00	603.429,84	4.850,05		4.850,05	349.203,60	-	349.203,60
2.1.2	CPOS 11.20.050	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos.	m	10.132,07	12,94	131.108,98	968,08		968,08	12.526,96	-	12.526,96
2.1.3	COMPOSIÇÃO 1	Rampa de acesso para calçada em concreto, incluso piso tátil. (rampa com abas laterais.)	unid.	63,00	1.858,51	117.086,13	5,00		5,00	9.292,55	-	9.292,55
2.1.4	COMPOSIÇÃO 2	Rampa de acesso para cicloviias em concreto, incluso piso tátil. (rampa com abas laterais.)	unid.	61,00	2.395,68	146.136,48	24,00		24,00	57.496,32	-	57.496,32
2.1.5	09418/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/ deficientes visuais, dimensões 25x25 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado.	m²	1.019,77	113,11	115.346,18	-		-	-	-	-
2.2		CALÇADAS DAS QUADRAS EXISTENTES				603.319,37				333.085,40	-	333.085,40

FÍSICO FINANCEIRO												
ITEM	CÓDIGO SINAPI PARA	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL	EXECUTADO FÍSICO(QUANTITATIVOS)			EXECUTADO FINANCEIRO(R\$)		
							ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO PERÍODO
2.2.1	101620-SINAPI	Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, com camada de areia, lançamento manual. af_08/2020	m²	435,00	256,20	111.447,00	398,68		398,68	102.141,82	-	102.141,82
2.2.2	94995-SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022	m²	2.900,00	72,00	208.800,00	2.900,00		2.900,00	208.800,00	-	208.800,00
2.2.3	CPOS 11.20.050	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos.	m	1.424,00	12,94	18.426,56	1.424,00		1.424,00	18.426,56	-	18.426,56
2.2.4	COMPOSIÇÃO 1	Rampa de acesso para calçada em concreto, incluso piso tátil. (rampa com abas laterais.)	unid.	50,00	1.858,51	92.925,50	2,00		2,00	3.717,02	-	3.717,02
2.2.5	94273-SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionado em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 CM (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário).	m	2.374,00	50,00	118.700,00	-		-	-	-	-
2.2.6	09418/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/ deficientes visuais, dimensões 25x25 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado.	m²	468,75	113,11	53.020,31	-		-	-	-	-
3		MEIO-FIO				606.692,00				563.142,00	-	563.142,00
3.1	94273-SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionado em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 CM (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário).	m	12.133,84	50,00	606.692,00	11.262,84		11.262,84	563.142,00	-	563.142,00
4		CICLOVIAS				940.491,18				794.430,54	-	794.430,54
4.1	92.396,00	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022	m²	-	65,00	-	-		-	-	-	-
4.2	09164/ORSE	Locação topográfica com nivelamento de seções transversais de serviços de terraplenagem, inclusive conferências	m²	51.463,53	5,78	297.459,20	51.463,53		51.463,53	297.459,20	-	297.459,20
4.3	02592/ORSE	Imprimação - execução e fornecimento de material	m²	7.938,00	13,57	107.718,66	6.129,00		6.129,00	83.170,53	-	83.170,53
4.4	COMPOSIÇÃO	Execução de pintura de ligação com emulsão RR-2C - AF 11/2019	m²	7.938,00	4,05	32.148,90	6.129,00		6.129,00	24.822,45	-	24.822,45
4.5	95995-SINAPI	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento. Exclusive carga e transporte. AF 11/2019	m³	238,14	1.500,01	357.212,38	183,87		183,87	275.806,84	-	275.806,84
4.6	101002-SINAPI	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³ x km	238,14	3,54	843,02	183,87		183,87	650,90	-	650,90
4.7	100986-SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³	714,42	5,31	3.793,57	551,61		551,61	2.929,05	-	2.929,05
4.8	96396-SINAPI	Execução e compactação de base ou de sub-base para pavimentação de brita graduada simples - Exclusive carga e transporte. AF 11/2019	m³	793,80	169,99	134.938,06	615,60		615,60	104.645,84	-	104.645,84
4.9	100974-SINAPI	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante de 10m³ - Carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 HP) e descarga livre.	m³	1.031,94	6,18	6.377,39	800,28		800,28	4.945,73	-	4.945,73
5		TERRAPLENAGEM				2.843.571,98				2.841.492,89	-	2.841.492,89
5.1	101137-SINAPI	Escavação horizontal, incluindo carga, descarga de solo de 1ª categoria com trator de esteiras (347HP/lâmina:8,70m²) e caminhão basculante de 10 m³ DMT até 200 m - AF_07/2020	m³	4.079,45	16,35	66.699,01	4.073,40		4.073,40	66.600,09	-	66.600,09
5.2	101139-SINAPI	Escavação horizontal, incluindo, escarificação, carga, descarga de solo de 2ª categoria com trator de esteiras (100HP/lâmina:2,19m²) e caminhão basculante de 10 m³ DMT até 200 m - AF_07/2020	m³	1.648,25	22,04	36.327,43	1.647,70		1.647,70	36.315,32	-	36.315,32
5.3	012519/ORSE	Escavação em material de 3ª categoria com escavadeira hidráulica e rompedor hidráulico	m³	357,65	49,27	17.621,42	356,80		356,80	17.579,53	-	17.579,53
5.4	COMPOSIÇÃO G - P	Escavação em área, a fogo controlado em material de 3ª categoria (rocha dura)com uso de compressor, perfuratriz pneumática e explosivos. Aprovado pela GIGOV para a CAGEPA através da NT.002	m³	1.538,72	115,74	178.091,45	1.538,72		1.538,72	178.091,45	-	178.091,45
5.5	95875-SINAPI	Bota-fora com caminhão basculante via urbana pavimentada m³ x km, DMT até 30km (unidade: m³ x km).	m³xkm	143.493,10	1,49	213.804,71	143.493,10		143.493,10	213.804,71	-	213.804,71
5.6	101137-SINAPI + 03	Escavação horizontal, incluindo carga, descarga de solo de 1ª categoria (Jazida)com trator de esteiras (34HP/lâmina:8,70m²) e caminhão basculante de 10 m³ DMT até 200 m - AF_07/2021. = Areia para aterro	m³	20.393,15	87,71	1.788.683,18	20.393,15		20.393,15	1.788.683,18	-	1.788.683,18
5.7	96386-SINAPI	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente arenoso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019	m³	17.440,82	9,47	165.164,57	17.433,29		17.433,29	165.093,26	-	165.093,26
5.8	95875-SINAPI	Momento extraordinário de transporte - Jazida - Transporte com caminhão basculante em via urbana pavimentada m³ x km, DMT até 30 km.	m³xkm	253.141,08	1,49	377.180,21	251.896,20		251.896,20	375.325,35	-	375.325,35
SUB-TOTAL						6.354.208,99				5.138.432,40	-	5.138.432,40

FÍSICO FINANCEIRO												
ITEM	CÓDIGO SINAPI PARA	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL	EXECUTADO FÍSICO(QUANTITATIVOS)			EXECUTADO FINANCEIRO(R\$)		
							ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO PERÍODO
IV												
1		ESCAVAÇÃO				-				-	-	-
1.1	3658/ORSE	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria em meio alagado.	m³		4,18	-			-	-	-	-
1.2	100974-SINAPI	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante de 10m³ - Carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 HP) e descarga livre.	m³	-	6,18	-			-	-	-	-
2		MURO DE APOIO		-		-				-	-	-
2.1	021180/SBC	Forma em madeira para muro de arrimo	m²		152,23	-			-	-	-	-
2.2	102487-SINAPI	Concreto ciclópico Fck= 15Mpa, 30% pedra de mão em volume real , inclusive lançamento.	m³	-	679,34	-			-	-	-	-
2.3	102723-SINAPI	Orçamento em muro de contenção, executado no pé do muro , com tubo PVC corrugado flexível perfurado, enchimento com brita , envolvido com manta impermeável.	m	-	69,23	-			-	-	-	-
3		LAJES SOBRE MURO		-		-				-	-	-
3.1	92267-SINAPI	Fabricação de forma para laje, em chapa de madeira compensada resinada, E=17mm.	m²		36,77	-			-	-	-	-
3.2	101792-SINAPI	escoramento de fôrmas de laje em madeira não aparelhada, pé-direito simples, incluso travamento, 4 utilizações. af_09/2020	m³	-	23,31	-			-	-	-	-
3.3	92801-SINAPI	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea utilizando aço CA-50 de 6.3mm	Kg	-	13,71	-			-	-	-	-
3.4	92803-SINAPI	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea utilizando aço CA-50 de 10.0mm	Kg	-	12,83	-			-	-	-	-
3.5	92804-SINAPI	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea utilizando aço CA-50 de 12.5mm	Kg	-	11,03	-			-	-	-	-
3.6	103675-SINAPI	Concretagem de vigas e lajes, FCK=25Mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - Lançamento, adensamento e acabamento.	m³	-	705,12	-			-	-	-	-
				-		-				-	-	-
					SUB-TOTAL	-				-	-	-
V												
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				229.963,44				222.536,09	4.746,94	227.283,03
1.1	00051/ORSE	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, instalada - Ver. 02-01/2022	m²	4,50	448,51	2.018,30	4,50		4,50	2.018,30	-	2.018,30
1.2	09164/ORSE	Locação topográfica com nivelamento de seções transversais de serviços de terraplenagem, inclusive conferências	m²	25.079,52	5,78	144.959,63	24.277,06	802,46	25.079,52	140.321,41	4.638,22	144.959,63
1.3	C2207-SINFRA/CE	Reirada de guia pré-fabricada de concreto	m	249,00	12,08	3.007,92	240,00	9,00	249,00	2.899,20	108,72	3.007,92
1.4	97636-SINAPI	Demolição de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. AF_12/2017	m²	1.327,50	20,80	27.612,00	1.200,00		1.200,00	24.960,00	-	24.960,00
1.5	03053/ORSE	Deslocamento de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12 m	unidade	3,00	601,29	1.803,87	3,00		3,00	1.803,87	-	1.803,87
1.6	07989/ORSE	Demolição de pavimentação em paralelepípedos sem reaproveitamento	m²	3.401,37	13,66	46.462,71	3.399,29		3.399,29	46.434,31	-	46.434,31
1.7	100974-SINAPI	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão de 10 m³- carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,0 m³/128 HP) e descarga livre. AF_07/2020	m³	663,27	6,18	4.099,01	663,27		663,27	4.099,00	-	4.099,00
2		SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM				4.736.624,19				4.214.923,65	375.642,86	4.590.566,51
2.1	101137-SINAPI	Escavação horizontal, incluindo carga, descarga de solo de 1ª categoria com trator de esteiras (347HP/lâmina:8,70m³) e caminhão basculante de 10 m³ DMT até 200 m - AF_07/2020	m³	5.892,44	16,35	96.341,39	5.463,41	82,05	5.545,46	89.326,76	1.341,52	90.668,28
2.2	101139-SINAPI	Escavação horizontal, incluindo, escarificação, carga, descarga de solo de 2ª categoria com trator de esteiras (100HP/lâmina:2,19m³) e caminhão basculante de 10 m³ DMT até 200 m - AF_07/2020	m³	2.386,32	22,04	52.594,49	2.339,67	35,17	2.374,84	51.566,33	775,15	52.341,48
2.3	COMPOSIÇÃO G	Escavação em área, a fogo controlado em material de 3ª categoria (rocha dura) com uso de compressor, perfuratriz pneumática e explosivos. Aprovado pela GIGOVJP para a CAGEPA através da NT.002.	m³	7.225,54	115,74	836.284,00	6.607,00	554,79	7.161,79	764.694,18	64.211,39	828.905,57
2.4	101137-SINAPI + 03	Escavação horizontal, incluindo carga, descarga de solo de 1ª categoria (Jazida)com trator de esteiras (34HP/lâmina:8,70m³) e caminhão basculante de 10 m³ DMT até 200 m - AF_07/2021. + material para aterro	m³	7.006,89	87,71	614.574,32	5.387,87	1.536,14	6.924,01	472.570,07	134.734,84	607.304,91
2.5	95875-SINAPI	Momento Extraordinário de Transporte - Jazida - Transporte com caminhão basculante em via urbana pavimentada m³ x km, DMT até 30 km (unidade: m³ x km). AF_07/2020	m³xkm	84.082,80	1,49	125.283,37	64.654,44	18.433,80	83.088,24	96.335,12	27.466,36	123.801,48
2.6	95875-SINAPI	Bota-fora com caminhão basculante em via urbana pavimentada m³ x km, DMT até 30 km (unidade: m³ x km). AF_07/2020	m³xkm	259.999,08	1,49	387.398,63	238.327,92	16.860,60	255.188,52	355.108,60	25.122,29	380.230,89
2.7	96386-SINAPI	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente arenoso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019	m³	5.823,98	9,47	55.153,09	4.578,58	1.181,65	5.760,23	43.359,15	11.190,23	54.549,38

FÍSICO FINANCEIRO												
ITEM	CÓDIGO SINAPI PARA	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL	EXECUTADO FÍSICO(QUANTITATIVOS)			EXECUTADO FINANCEIRO(R\$)		
							ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO PERÍODO
2.8	100577-SINAPI	Regularização e compactação de sub-leito de solo predominantemente arenoso. AF_11/2019	m²	26.231,00	1,34	35.149,54	17.280,00	1.588,46	18.868,46	23.155,20	2.128,54	25.283,74
2.9	100974-SINAPI	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão de 10 m³. carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,0 m³/128 HP) e descarga livre. AF_07/2020	m³	10.997,02	6,18	67.961,58	9.648,73	1.252,66	10.901,39	59.629,14	7.741,44	67.370,58
2.10	96388-SINAPI + 036	Execução e compactação de sub-base para pavimentação de solo de comportamento laterítico (arenoso) - Exclusive solo, escavação, carga e transporte.AF_11/2019 + AREIA PARA ATERRO	m³	-	84,73	-	-	-	-	-	-	-
2.11	96396-SINAPI	Execução e compactação de base ou de sub-base para pavimentação de brita graduada simples - Exclusive carga e transporte.AF_11/2019	m³	9.536,99	169,99	1.621.192,93	8.515,77	500,70	9.016,47	1.447.595,74	85.113,99	1.532.709,73
		CAMADA DRENATE										
2.12	96400 - SINAPI PB (MAR 2023)	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE EOU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	2.232,00	198,44	442.918,08	2.232,00		2.232,00	442.918,08	-	442.918,08
2.13	100974-SINAPI	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante de 10m³ - Carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 HP) e descarga livre.	m³	14.856,30	6,18	91.811,93	13.972,11	650,91	14.623,02	86.347,65	4.022,62	90.370,27
2.14	95875-SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade m³xkm). af_09/2016.(momento extraordinário transporte de jazida)	M³XKM	205.272,08	1,51	309.960,84	186.965,32	7.810,92	194.776,24	282.317,63	11.794,49	294.112,12
3		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				3.552.950,32				2.566.995,57	31.249,44	2.598.245,01
3.1	02592/ORSE	Impressão - execução e fornecimento de material	m²	32.898,06	13,57	446.426,67	23.191,65		23.191,65	314.710,69	-	314.710,69
3.2	COMPOSIÇÃO	Execução de pintura de ligação com emulsão RR-2C - AF_11/2019	m²	32.898,06	4,05	133.237,14	23.191,65		23.191,65	93.926,19	-	93.926,19
3.3	95995-SINAPI	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento. Exclusive carga e transporte. AF_11/2019	m³	1.752,81	1.500,01	2.629.232,52	1.301,40		1.301,40	1.952.113,01	-	1.952.113,01
3.4	101002-SINAPI	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³ x km	2.673,57	3,54	9.464,44	1.391,50		1.391,50	4.925,92	-	4.925,92
3.5	100986-SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³	10.804,90	5,31	57.374,01	1.217,40		1.217,40	6.464,39	-	6.464,39
3.6	102498-SINAPI	Pintura de meio fio com tinta branca a base de cal (calção). AF_05/2020	m	5.800,62	1,56	9.048,97	5.777,54		5.777,54	9.012,96	-	9.012,96
3.7	94273-SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100 x 15 x 13 x 30 (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016.	m	684,60	50,00	34.230,00	-	607,60	607,60	-	30.380,00	30.380,00
3.8	94274-SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100 x 15 x 13 x 30 (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016.	m	885,06	54,34	48.094,16	-	16,00	16,00	-	869,44	869,44
3.9	903810 - SICRO PB (JAN 2023)	INSTALAÇÃO DE USINA DE ASFALTO A QUENTE CAPACIDADE 120 t/h	UNID.	1,00	185.842,41	185.842,41	1,00		1,00	185.842,41	-	185.842,41
		SUB-TOTAL				8.519.537,95				7.004.455,31	411.639,24	7.416.094,55
VI		ROTATÓRIA AVENIDA FLORIANO PEIXOTO										
1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	11472-ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m²	-	8,69	-	-		-	-	-	-
2		ROTATÓRIA										
2.1	101090-SINAPI	Piso em pedra portuguesa assentado sobre argamassa seca de cimento e areia, traço 1:3, rejuntado com cimento comum.	m²	-	268,24	-	-		-	-	-	-
2.2	103946-SINAPI	Plantio de grama esmeralda ou São Carlos ou Curitibaana, em placas. AF_05/2022	m²	-	25,26	-	-		-	-	-	-
3		MEIO-FIO										
3.1	94274-SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionado em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 CM (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016	m	-	61,86	-	-		-	-	-	-
3.2	94273-SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionado em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 CM (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016	m	-	50,00	-	-		-	-	-	-
4		MONUMENTO CENTRAL										
4.1	93358-SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m	M³	-	84,79	-	-		-	-	-	-

[illegible]

MEMÓRIAL FOTOGRÁFICO

Medição Nº: 14

Data: 10/08/2026

Contratada: SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ: 01.514.128/0001-36

Prazo de Execução: 30/10/2023 15/12/2026

Valor Contratado: 18.941.944,10

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

Objeto: Urbanização da Av. Plínio Lemos

Número do Contrato: 2.08.018/2023

Agente Financeiro: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Foto 01: Serviços topográfico Rua Olinda .



Foto 02: Regularização de aterro Rua Olinda .



Foto 03: Aterro com material de jazida Rua Olinda .



Foto 04: Compactação de aterro de jazida Rua Olinda .



MEMORIAL FOTOGRÁFICO

Medição Nº: 14

Data: 07/08/2026

Contratada: SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ: 01.514.128/0001-36

Prazo de Execução: 30/10/2023 15/12/2026

Valor Contratado: 18.941.944,10

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

Objeto: Urbanização da Av. Plínio Lemos

Número do Contrato: 2.08.018/2023

Agente Financeiro: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Foto 05: Lançamento de brita graduada Rua Olinda .



Foto 06: Regularização de base e sub base em brita graduada Rua Olinda .



Foto 07: Compactação de base e sub base rua Olinda.



Foto 08: Escavação E 0 a 5 Av. Plínio Lemos lado direito .



MEMORIAL FOTOGRÁFICO

Medição Nº: 14

Data: 07/08/2026

Contratada: SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ: 01.514.128/0001-36

Prazo de Execução: 30/10/2023 15/12/2026

Valor Contratado: 18.941.944,10

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

Objeto: Urbanização da Av. Plínio Lemos

Número do Contrato: 2.08.018/2023

Agente Financeiro: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Foto 09: Compactação do sub leito E0 a 5 Av.Plínio Lemos lado direito .




Foto 10 Execução do sub leito com material de jazida E0 a 5 lado direito:.



Foto 11: Lançamento de brita graduada E0 a 5 lado direito. .



Foto 12: Execução de base e sub base em brita graduada E0 a 5 lado direito. .

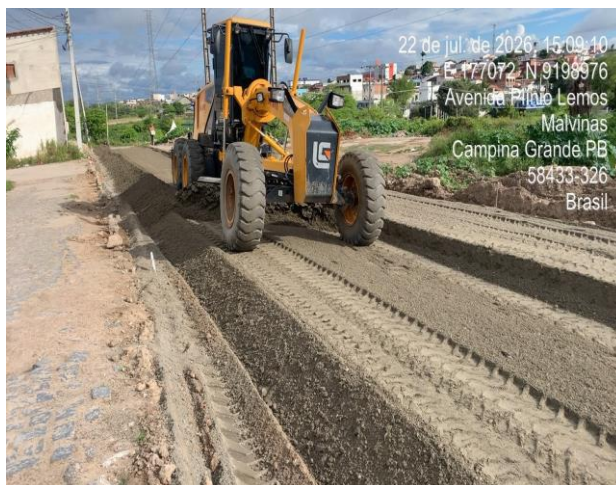

MEMORIAL FOTOGRÁFICO

Medição Nº: 14

Data: 07/08/2026

Contratada: SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ: 01.514.128/0001-36

Prazo de Execução: 30/10/2023 15/12/2026

Valor Contratado: 18.941.944,10

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

Objeto: Urbanização da Av. Plínio Lemos

Número do Contrato: 2.08.018/2023

Agente Financeiro: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Foto 13: Ensaio de compactação Rua Olinda



Foto 14: Ensaio de compactação E0 a 5 lado direito



Foto 15: Assentamento de meio fio Rua Olinda .



Foto 16: Assentamento de meio fio E0 a 5 lado direito .

