

SOLICITAÇÃO 1º - BOLETIM DE MEDIÇÃO

A empresa **R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI**, CNPJ: 30.836.850/0001-95, sediada na Rua Euclides Magno Bacalhau, n° 195, Centro, Ingá – PB, Cep: 58.380-000, por intermédio do seu representante legal, **RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES**, CPF N° 088.552.674-00, RG N° 8.277.917, residente domiciliado na Rua Euclides Magno Bacalhau, n° 195, Centro, Ingá – PB, Cep: 58380-000, infra-assinado, e para fins de requerer o que segue:

• Solicita de Vossa Senhoria 1º **BOLETIM DE MEDIÇÃO**, que tem por objeto os serviços referentes a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DAS VIAS E PASSEIOS NO ENTORNO DA PRAÇA CORONEL ANTÔNIO PESSOA, BEM COMO MELHORIAS NA ÁREA INTERNA DA PRAÇA, PRESERVANDO SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS, DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA**, CONTRATO N° 2.08.001/2025/SECOB/PMCG.

Sem mais para o momento, e aguardando o pronto atendimento da solicitação efetuada e o envio das informações respectivas, aproveito o ensejo para renovar protestos de consideração e apreço.



Campina Grande – PB, 06 de novembro de 2025

RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES

RESPONSÁVEL TÉCNICO E ADMINISTRADOR

CPF: 088.552.674/00; RG: 8.277.917/CREA – PB:161821195-1


CNPJ: 30.836.850/0001-95



Telefone: (83) 9 9806-7435

E-MAIL: resengenhariaeconsultoria@outlook.com



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Engenharia e Consultoria

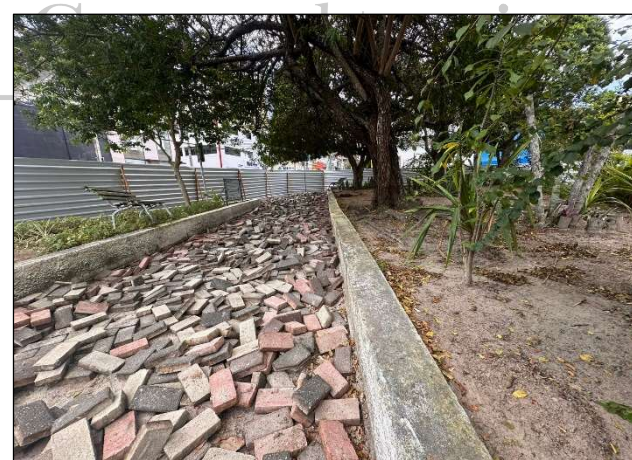

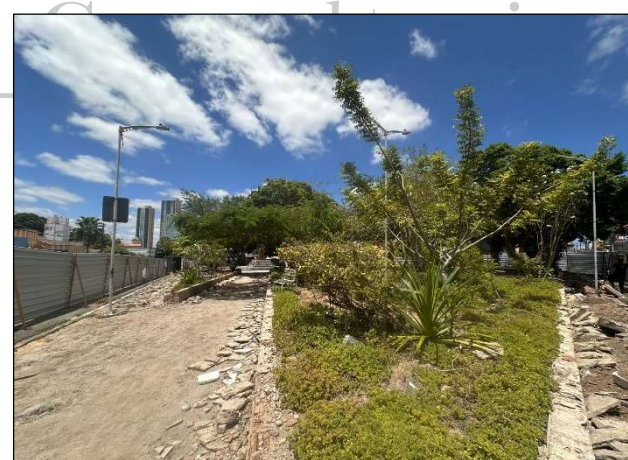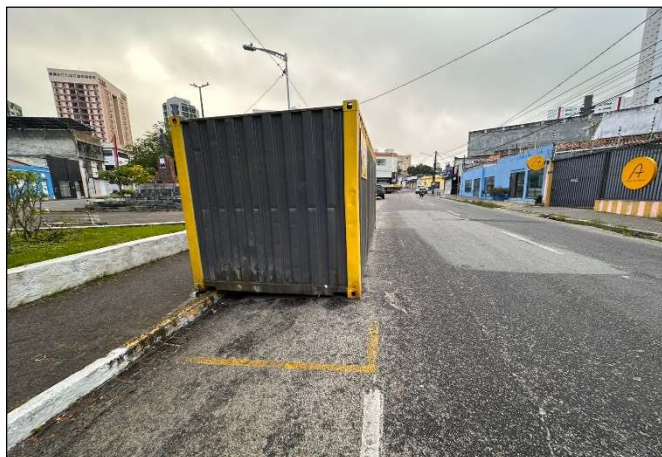



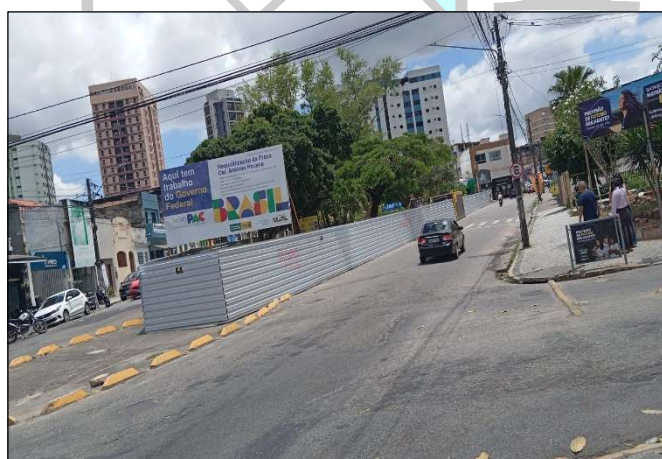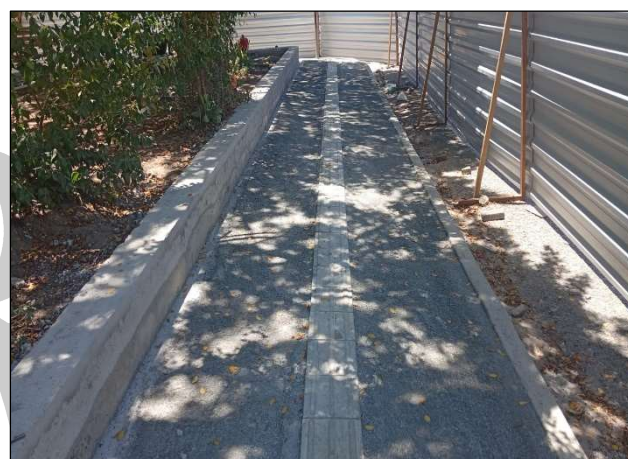

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1081110-73/2021	923514	JOÃO PESSOA	MDR	DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL	DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO	
PROponente / Tomador			Município / UF	Localidade / Endereço	Objeto	
Município de Campina Grande			CAMPINA GRANDE/PB	CAMPINA GRANDE/PB	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA	
Nº CTEF	Empresa Executora	CNPJ	Objeto do CTEF			Início da Obra
	R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	30.836.850/0001-95	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA			22/09/2025

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 778.679,49

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
1	Evento	Administração Local	R\$	47.398,86
1	1.3	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	240,00
1	1.4	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	3,00
2	Evento	CANTEIRO DE OBRA	R\$	4.983,78
2	1.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	mês	3,00
2	1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	mês	3,00
3	Evento	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	56.742,51
3	2.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	487,74
3	2.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	18,00
3	2.3	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM - REV 03_10/2022	und.	1,00
3	2.4	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR	und.	1,00
3	2.5	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	703,00
3	2.6	LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA	m²	1.850,29
4	Evento	DEMOLIÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHO	R\$	85.539,26
4	3.1	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	m²	283,87
4	3.2	RETIRADA PISO PEDRAS IRREGULARES SEM REAPROVEITAMENTO	m²	425,85
4	3.3	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	m²	425,85
4	3.4	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	m²	283,87
4	3.5	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	482,28
4	3.6	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	703,00
4	3.7	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	m²	1.280,79
4	3.8	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	m	797,76

CANTEIRO DE OBRA	FECHEAMENTO DE OBRA	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS	DEMOLIÇÃO PARA EXECUTAR CALÇADAS	DEMOLIÇÃO PARA EXECUTAR PAVIMENTO ELEVADO
52.382,64	52.544,71	2.119,35	2.078,45	30.926,33	14.242,78
1	2	3	4	5	6
47.398,86	-	-	-	-	-
240,00	-	-	-	-	-
3,00	-	-	-	-	-
4.983,78	-	-	-	-	-
3,00	-	-	-	-	-
3,00	-	-	-	-	-
-	52.544,71	2.119,35	2.078,45	-	-
-	487,74	-	-	-	-
-	18,00	-	-	-	-
-	-	1,00	-	-	-
-	-	1,00	-	-	-
-	-	-	703,00	-	-
-	-	-	1.850,29	-	-
-	-	-	-	30.926,33	14.242,78
-	-	-	-	283,87	-
-	-	-	-	425,85	-
-	-	-	-	425,85	-
-	-	-	-	283,87	-
-	-	-	-	482,28	-
-	-	-	-	-	703,00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1081110-73/2021	923514	JOÃO PESSOA	MDR	DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL	DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO	
PROponente / Tomador			Município / UF	Localidade / Endereço	Objeto	
MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE			CAMPINA GRANDE/PB	CAMPINA GRANDE/PE	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA	
Nº CTEF	Empresa Executora		CNPJ	Objeto do CTEF		Início da Obra
Modelo 1 - Eventos	R. & S. ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		30.836.850/0001-95	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA		22/09/2025

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 778.679,49

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
1	Evento	Administração Local	R\$	47.398,86
1	1.3	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	240,00
1	1.4	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	3,00
2	Evento	CANTEIRO DE OBRA	R\$	4.983,78
2	1.1	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	mês	3,00
2	1.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	mês	3,00
3	Evento	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	56.742,51
3	2.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	487,74
3	2.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	18,00
3	2.3	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM - REV 03_10/2022	und.	1,00
3	2.4	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR	und.	1,00
3	2.5	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	703,00
3	2.6	LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA	m²	1.850,29
4	Evento	DEMOLIÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHO	R\$	85.539,26
4	3.1	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	m²	283,87
4	3.2	RETIRADA PISO PEDRAS IRREGULARES SEM REAPROVEITAMENTO	m²	425,85
4	3.3	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	m²	425,85
4	3.4	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	m²	283,87
4	3.5	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	482,28
4	3.6	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	703,00
4	3.7	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	m²	1.280,79
4	3.8	DEMOLICÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	m	797,76

[illegible]

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1081110-73/2021	923514	JOÃO PESSOA	MDR	DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL	DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO	
PROponente / Tomador			Município / UF	Localidade / Endereço	Objeto	
MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE			CAMPINA GRANDE/PB	CAMPINA GRANDE/PE	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA	
Nº CTEF	Empresa Executora	CNPJ	Objeto do CTEF			Início da Obra
1081110-73/2021	R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	30.836.850/0001-95	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA			22/09/2025

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 778.679,49 Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
1	Evento	Administração Local	R\$	47.398,86
1	1.3	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	240,00
1	1.4	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	3,00
2	Evento	CANTEIRO DE OBRA	R\$	4.983,78
2	1.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	mês	3,00
2	1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	mês	3,00
3	Evento	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	56.742,51
3	2.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	487,74
3	2.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	18,00
3	2.3	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM - REV 03_10/2022	und.	1,00
3	2.4	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFÁSICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR	und.	1,00
3	2.5	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	703,00
3	2.6	LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA	m²	1.850,29
4	Evento	DEMOLIÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHO	R\$	85.539,26
4	3.1	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	m²	283,87
4	3.2	RETIRADA PISO PEDRAS IRREGULARES SEM REAPROVEITAMENTO	m²	425,85
4	3.3	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	m²	425,85
4	3.4	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	m²	283,87
4	3.5	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	482,28
4	3.6	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	703,00
4	3.7	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	m²	1.280,79
4	3.8	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	m	797,76

[illegible]

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 778.679,49

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
4	3.9	REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO SIMPLES (6.00 A 10.00 M) SEM REAPROVEITAMENTO	und.	13,00
4	3.10	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	m³	373,21
4	3.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	m³xkm	3.732,10
5	Evento	CONSTRUÇÃO	R\$	500.928,38
5	4.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES	m³	37,74
5	4.2	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO	m²	1.790,32
5	4.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.	m²	1.790,32
5	4.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES	m³	38,42
5	4.5	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO.	m²	1.280,79
5	4.6	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	m²	51,23
5	4.7	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, ACABAMENTO LAVADO TIPO FULGET, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS E APLICAÇÃO DO PISO.	m²	450,00
5	4.8	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, ACABAMENTO LAVADO TIPO FULGET, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS E APLICAÇÃO DO PISO.	m²	690,00
5	4.9	COLCHÃO DE AREIA	m³	71,25
5	4.10	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).	m	130,07
5	4.11	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.	m²	703,00
5	4.12	CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA ITERNAMENTE, COM GRELHA DE CONCRETO PRÉ MOLDADA	m	92,94
5	4.13	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).	m	910,57
5	4.14	RESTAURO - EMBOÇO ESPECIAL DE PAREDE, SPESSURA 3CM, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,24:0,74 (CAL, ARENOSO E AREIA MÉDIA)	m²	46,19
5	4.15	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	m²	184,77
5	4.16	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES	m²	184,77

CANTEIRO DE OBRA	FECHAMENTO DE OBRA	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS	DEMOLIÇÃO PARA EXECUTAR CALÇADAS	DEMOLIÇÃO PARA EXECUTAR PAVIMENTO ELEVADO
52.382,64	52.544,71	2.119,35	2.078,45	30.926,33	14.242,78
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 778.679,49

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
4	3.9	REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO SIMPLES (6.00 A 10.00 M) SEM REAPROVEITAMENTO	und.	13,00
4	3.10	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	m³	373,21
4	3.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	m³xkm	3.732,10
5	Evento	CONSTRUÇÃO	R\$	500.928,38
5	4.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER	m³	37,74
5	4.2	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO	m²	1.790,32
5	4.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.	m²	1.790,32
5	4.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER	m³	38,42
5	4.5	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO.	m²	1.280,79
5	4.6	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	m²	51,23
5	4.7	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, ACABAMENTO LAVADO TIPO FULGET, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS E APLICAÇÃO DO PISO.	m²	450,00
5	4.8	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, ACABAMENTO LAVADO TIPO FULGET, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS E APLICAÇÃO DO PISO.	m²	690,00
5	4.9	COLCHÃO DE AREIA	m³	71,25
5	4.10	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).	m	130,07
5	4.11	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.	m²	703,00
5	4.12	CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA ITERNAMENTE, COM GRELHA DE CONCRETO PRÉ MOLDADA	m	92,94
5	4.13	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).	m	910,57
5	4.14	RESTAURO - EMBOÇO ESPECIAL DE PAREDE, SPESSURA 3CM, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,24:0,74 (CAL, ARENOSO E AREIA MÉDIA)	m²	46,19
5	4.15	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	m²	184,77
5	4.16	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES	m²	184,77

DEMOLIÇÃO DE PISO DA PRAÇA E MEIO FIO	CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO	PISO DAS CALÇADAS	PISO DA PRAÇA	PAVIMENTO ELEVADO	CANTEIROS
28.337,87	12.032,28	184.144,62	148.323,18	113.739,71	31.874,26
7	8	9	10	11	12
13,00	-	-	-	-	-
-	373,21	-	-	-	-
-	3.732,10	-	-	-	-
-	-	184.144,62	148.323,18	113.739,71	31.874,26
-	-	37,74	-	-	-
-	-	1.790,32	-	-	-
-	-	1.790,32	-	-	-
-	-	-	38,42	-	-
-	-	-	1.280,79	-	-
-	-	-	51,23	-	-
-	-	-	450,00	-	-
-	-	-	690,00	-	-
-	-	-	-	71,25	-
-	-	-	-	130,07	-
-	-	-	-	703,00	-
-	-	-	-	92,94	-
-	-	-	-	910,57	-
-	-	-	-	-	46,19
-	-	-	-	-	184,77
-	-	-	-	-	184,77

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 778.679,49

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
4	3.9	REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO SIMPLES (6.00 A 10.00 M) SEM REAPROVEITAMENTO	und.	13,00
4	3.10	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	m³	373,21
4	3.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	m³xkm	3.732,10
5	Evento	CONSTRUÇÃO	R\$	500.928,38
5	4.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES	m³	37,74
5	4.2	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO	m²	1.790,32
5	4.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.	m²	1.790,32
5	4.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES	m³	38,42
5	4.5	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO.	m²	1.280,79
5	4.6	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	m²	51,23
5	4.7	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, ACABAMENTO LAVADO TIPO FULGET, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS E APLICAÇÃO DO PISO.	m²	450,00
5	4.8	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, ACABAMENTO LAVADO TIPO FULGET, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS E APLICAÇÃO DO PISO.	m²	690,00
5	4.9	COLCHÃO DE AREIA	m³	71,25
5	4.10	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).	m	130,07
5	4.11	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.	m²	703,00
5	4.12	CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA ITERNAMENTE, COM GRELHA DE CONCRETO PRÉ MOLDADA	m	92,94
5	4.13	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).	m	910,57
5	4.14	RESTAURO - EMBOÇO ESPECIAL DE PAREDE, SPESSURA 3CM, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,24:0,74 (CAL, ARENOSO E AREIA MÉDIA)	m²	46,19
5	4.15	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	m²	184,77
5	4.16	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES	m²	184,77

ÁREAS PERMEÁVEL	ACESSIBILIDADE	EQUIPAMENTOS	ILUMINAÇÃO	LIMPEZA FINAL DA OBRA	
6.587,58	16.259,03	24.680,60	49.791,23	8.614,87	-
13	14	15	16	17	18
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
6.587,58	16.259,03	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 778.679,49

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
		APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA RISCADA EM CORES DIVERSAS		
5	4.17		m²	184,77
5	4.18	GRANITO VERDE UBATUBA EM PISO	m²	60,51
5	4.19	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS	m²	137,91
		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).		
5	4.20		m	56,66
		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS.		
5	4.21		m	7,88
5	4.22	ÁRVORE PORTE PEQUENO (MULUNGÚ) - PLANTADA	und.	8,00
		PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M.		
5	4.23		und	2,00
		PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M.		
5	4.24		und	10,00
		PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE		
5	4.25		m²	107,69
6	Evento	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$	83.086,70
		FRADE ESFERA EM CONCRETO, 30CM DE DIÂMETRO, COM FCK=25 MPA, PARA PROTEÇÃO DE CALÇADAS, INCLUSIVE FURACÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO		
6	5.1		und	84,00
		PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.		
6	5.2		m²	19,20
		INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE		
6	5.3		und	3,00
6	5.4	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 M	und	1,00
		TUBO AÇO GALVANIZADO D=3" P/BICICLETÁRIO, DIMENSÃO: H=75CM, L=75CM, FIXADO EMBASE DE CONCRETO, PINTADO C/ESMALTE SINTETICO, EXCETO BASE DE CONCRETO E PINTURA DE ACABAMENTO		
6	5.5		und	6,00
		POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO		
6	5.6		und	4,00
		LUMINÁRIA EM LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED SMD AUTOVOLT 75 W, 5.000 K, IP-66,IRC 70, FP>0,95, 170LM/W,12.750 LM E 54.000H, COM BASE PARA RELÉ 3 PINOS, MODELO GL421 G-LIGHT OU SIMILAR		
6	5.7		und	8,00
		POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO		
6	5.8		und	9,00
		LUMINÁRIA EM LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED SMD AUTOVOLT 75 W, 5.000 K, IP- 66,IRC 70, FP>0,95, 170LM/W,12.750 LM E 54.000H, COM BASE PARA RELÉ 3 PINOS, MODELO GL421 G-LIGHT OU SIMILAR		
6	5.9		und	9,00

[illegible]

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 778.679,49

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
5	4.17	APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA RISCADA EM CORES DIVERSAS	m²	184,77
5	4.18	GRANITO VERDE UBATUBA EM PISO	m²	60,51
5	4.19	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS	m²	137,91
5	4.20	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).	m	56,66
5	4.21	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS.	m	7,88
5	4.22	ÁRVORE PORTE PEQUENO (MULUNGÚ) - PLANTADA	und.	8,00
5	4.23	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M.	und	2,00
5	4.24	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M.	und	10,00
5	4.25	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	107,69
6	Evento	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$	83.086,70
6	5.1	FRADE ESFERA EM CONCRETO, 30CM DE DIÂMETRO, COM FCK=25 MPA, PARA PROTEÇÃO DE CALÇADAS, INCLUSIVE FURACÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	und	84,00
6	5.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.	m²	19,20
6	5.3	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE	und	3,00
6	5.4	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 M	und	1,00
6	5.5	TUBO AÇO GALVANIZADO D=3" P/BICICLETÁRIO, DIMENSÃO: H=75CM, L=75CM, FIXADO EMBASE DE CONCRETO, PINTADO C/ESMALTE SINTETICO, EXCETO BASE DE CONCRETO E PINTURA DE ACABAMENTO	und	6,00
6	5.6	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	4,00
6	5.7	LUMINÁRIA EM LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED SMD AUTOVOLT 75 W, 5.000 K, IP-66,IRC 70, FP>0,95, 170LM/W,12.750 LM E 54.000H, COM BASE PARA RELÉ 3 PINOS, MODELO GL421 G-LIGHT OU SIMILAR	und	8,00
6	5.8	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	9,00
6	5.9	LUMINÁRIA EM LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED SMD AUTOVOLT 75 W, 5.000 K, IP- 66,IRC 70, FP>0,95, 170LM/W,12.750 LM E 54.000H, COM BASE PARA RELÉ 3 PINOS, MODELO GL421 G-LIGHT OU SIMILAR	und	9,00

DEMOLIÇÃO DE PISO DA PRAÇA E MEIO FIO	CARGA E TRANSPORTE DE ENUTILIO	PISO DAS CALÇADAS	PISO DA PRAÇA	PAVIMENTO ELEVADO	CANTEIROS
28.337,87	12.032,28	184.144,62	148.323,18	113.739,71	31.874,26
7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	184,77
-	-	-	-	-	60,51
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 778.679,49

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
5	4.17	APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA RISCADA EM CORES DIVERSAS	m²	184,77
5	4.18	GRANITO VERDE UBATUBA EM PISO	m²	60,51
5	4.19	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS	m²	137,91
5	4.20	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).	m	56,66
5	4.21	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS.	m	7,88
5	4.22	ÁRVORE PORTE PEQUENO (MULUNGÚ) - PLANTADA	und.	8,00
5	4.23	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M.	und	2,00
5	4.24	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M.	und	10,00
5	4.25	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	107,69
6	Evento	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$	83.086,70
6	5.1	FRADE ESFERA EM CONCRETO, 30CM DE DIÂMETRO, COM FCK=25 MPA, PARA PROTEÇÃO DE CALÇADAS, INCLUSIVE FURACÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	und	84,00
6	5.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.	m²	19,20
6	5.3	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE	und	3,00
6	5.4	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 M	und	1,00
6	5.5	TUBO AÇO GALVANIZADO D=3" P/BICICLETÁRIO, DIMENSÃO: H=75CM, L=75CM, FIXADO EMBASE DE CONCRETO, PINTADO C/ESMALTE SINTETICO, EXCETO BASE DE CONCRETO E PINTURA DE ACABAMENTO	und	6,00
6	5.6	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	4,00
6	5.7	LUMINÁRIA EM LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED SMD AUTOVOLT 75 W, 5.000 K, IP-66,IRC 70, FP>0,95, 170LM/W, 12.750 LM E 54.000H, COM BASE PARA RELÉ 3 PINOS, MODELO GL421 G-LIGHT OU SIMILAR	und	8,00
6	5.8	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	9,00
6	5.9	LUMINÁRIA EM LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED SMD AUTOVOLT 75 W, 5.000 K, IP- 66,IRC 70, FP>0,95, 170LM/W, 12.750 LM E 54.000H, COM BASE PARA RELÉ 3 PINOS, MODELO GL421 G-LIGHT OU SIMILAR	und	9,00

ÁREAS PERMEÁVEL	ACESSIBILIDADE	EQUIPAMENTOS	ILUMINAÇÃO	LIMPEZA FINAL DA OBRA	
6.587,58	16.259,03	24.680,60	49.791,23	8.614,87	-
13	14	15	16	17	18
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
137,91	-	-	-	-	-
56,66	-	-	-	-	-
7,88	-	-	-	-	-
8,00	-	-	-	-	-
2,00	-	-	-	-	-
10,00	-	-	-	-	-
-	107,69	-	-	-	-
-	-	24.680,60	49.791,23	8.614,87	-
-	-	84,00	-	-	-
-	-	19,20	-	-	-
-	-	3,00	-	-	-
-	-	1,00	-	-	-
-	-	6,00	-	-	-
-	-	-	4,00	-	-
-	-	-	8,00	-	-
-	-	-	9,00	-	-
-	-	-	9,00	-	-

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 778.679,49

Total por Frete (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
6	5.10	LIMPEZA GERAL	m²	3.729,38

CANTEIRO DE OBRA	FECHAMENTO DE OBRA	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS	DEMOLIÇÃO PARA EXECUTAR CALÇADAS	DEMOLIÇÃO PARA EXECUTAR PAVIMENTO ELEVADO
52.382,64	52.544,71	2.119,35	2.078,45	30.926,33	14.242,78
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Serr Redonda - PB, 24 de março de 2022

Local e Data

Frete de Obra:

DEMOLIÇÃO DE PISO DA PRAÇA E MEIO FIO	CARGA E TRANSPORTE DE ENUTILO	PISO DAS CALÇADAS	PISO DA PRAÇA	PAVIMENTO ELEVADO	CANTEIROS
28.337,87	12.032,28	184.144,62	148.323,18	113.739,71	31.874,26
7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-

Valor de Investimento: R\$ 778.679,49

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
6	5.10	LIMPEZA GERAL	m²	3.729,38

Serr Redonda - PB, 24 de março de 2022

Local e Data

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 778.679,49

Total por Frete (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
6	5.10	LIMPEZA GERAL	m²	3.729,38

Serr Redonda - PB, 24 de março de 2022
Local e Data

ÁREAS PERMEÁVEL	ACESSIBILIDADE	EQUIPAMENTOS	ILUMINAÇÃO	LIMPEZA FINAL DA OBRA	
6.587,58	16.259,03	24.680,60	49.791,23	8.614,87	-
13	14	15	16	17	18
-	-	-	-	3.729,38	-

Responsável Técnico: RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES
CREA / CAU: 161821195-1

Ofício nº: 100/2025

Campina Grande-PB, 06 de novembro de 2025

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: Solicitação de autorização de desbloqueio de recursos - Medição nº 1
REF: Contrato de Repasse - Operação nº: 1081110-73/2021 - SICONV nº: 923514

Programa: DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO
Objeto: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA

Proponente /
Tomador: MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 1ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	R\$ 728.679,49	R\$ 149.695,37	R\$ 149.695,37
Contrapartida Financeira:	R\$ 50.000,00	R\$ 10.271,69	R\$ 10.271,69
Outros:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento:	R\$ 778.679,49	R\$ 159.967,06	R\$ 159.967,06
Execução Física:	-	20,54%	20,54%

2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

BRENO WESLEY BARBOSA DE SOUZA
MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Programa: DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO
Objeto: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA

1. Informamos abaixo a relação de fornecedores para a Solicitação de Recursos referenciada:

[illegible]

BRENO WESLEY BARBOSA DE SOUZA
MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE



QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO		
1081110-73/2021	923514	MDR	DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO	DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO	OGU não-PAC		
PROponente / Tomador			Município / UF	Localidade / Endereço	Valores Contratados (R\$)		
Município de Campina Grande			Campina Grande / PB	Campina Grande/PB			
Objeto				Apelido do Empreendimento	Repasse	Contrapartida	Investimento
Requalificação da Praça Cel. Antônio Pessoa				Requalificação da Praça Cel. Antônio Pessoa	960.019,00	50.000,00	1.010.019,00

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
	231.339,51	-

Etapa	Meta / Sub-Meta		Item de Investimento	Sub-Item de Investimento	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
	TOTAL									(93,58%) 728.679,49	(6,42%) 50.000,00	(0,00%) -	(100,00%) 778.679,49
1	Meta	1.	Equipamentos comunitários	Lazer e turismo	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA	Licitado / Em Execução	3.729,38	m²	CONTRATO Nº 2.08.001/2025	728.679,49	50.000,00	-	778.679,49
1	Meta	2.								-	-	-	-
1	Meta	3.								-	-	-	-
1	Meta	4.								-	-	-	-
1	Meta	5.								-	-	-	-
1	Meta	6.								-	-	-	-
1	Meta	7.								-	-	-	-
1	Meta	8.								-	-	-	-
1	Meta	9.								-	-	-	-
1	Meta	10.								-	-	-	-

TOTAL - ETAPA	1	728.679,49	50.000,00	-	778.679,49
	2	-	-	-	-
	3	-	-	-	-

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: BRENO WESLEY BARBOSA DE SOUZA

Cargo: ENGENHEIRO CIVIL - FISCAL DO CONTRATO

Local:

Campina Grande - PB

Data:

06 de novembro de 2025

