R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA
CNPJ: 30.836.850/0001-95
Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, n° 195, Centro, Ingá – PB
Telefone: (83) 9 9806-7435
E-mail: resengenhariaeconsultoria@outlook.com

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA
CNPJ: 30.836.850/0001-95
Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, n° 195, Centro, Ingá – PB
Telefone: (83) 9 9806-7435
E-mail: resengenhariaeconsultoria@outlook.com









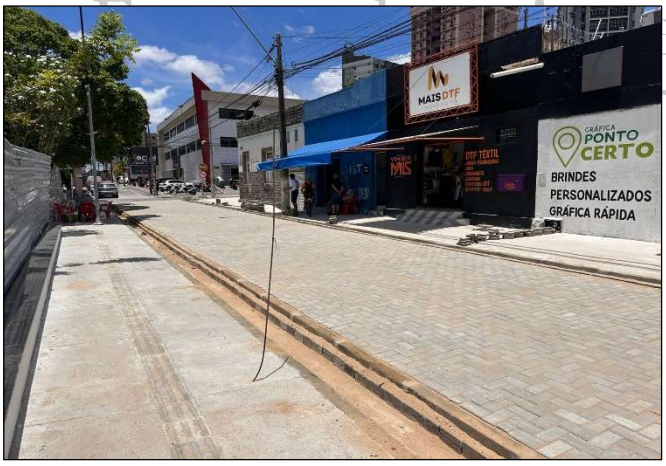



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA
CNPJ: 30.836.850/0001-95
Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, n° 195, Centro, Ingá – PB
Telefone: (83) 9 9806-7435
E-mail: resengenhariaeconsultoria@outlook.com













R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA
CNPJ: 30.836.850/0001-95
Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, n° 195, Centro, Ingá – PB
Telefone: (83) 9 9806-7435
E-mail: resengenhariaeconsultoria@outlook.com














R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA
CNPJ: 30.836.850/0001-95
Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, n° 195, Centro, Ingá – PB
Telefone: (83) 9 9806-7435
E-mail: resengenhariaeconsultoria@outlook.com





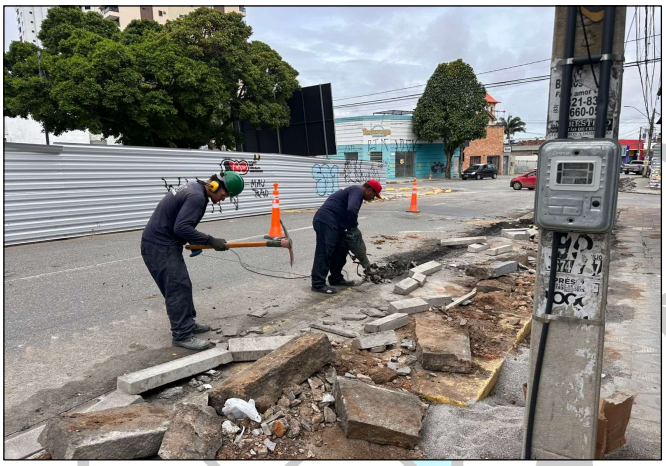







R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA
CNPJ: 30.836.850/0001-95
Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, n° 195, Centro, Ingá – PB
Telefone: (83) 9 9806-7435
E-mail: resengenhariaeconsultoria@outlook.com





RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES:08855267400

Assinado de forma digital por RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES:08855267400
Dados: 2026.05.17 18:45:03 -03'00'

R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.850/0001-95
Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, nº 195, Centro, Ingá – PB
Telefone: (83) 9 9806-7435
E-mail: resengenhariaeconsultoria@outlook.com

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DAS VIAS E PASSEIOS NO ENTORNO DA PRAÇA CORONEL ANTÔNIO PESSOA, BEM COMO MELHORIAS NA ÁREA INTERNA DA PRAÇA, PRESERVANDO SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS, DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE – PB.

LOCALIDADE:	Fonte de Recursos	Contrato:	Concorrência Eletrônica	Valor Contratado	BDI: 22,00	Nº do Boletim	Período de execução	Valor do BM	Valor Acumulado	Percentual Total Executado
PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA, 111 - CENTRO CAMPINA GRANDE - PB, 58400-263	MDR - 1081110-73/2021	2.08.001/2025	9.08.17/2024	R$ 778.679,49		03	19/12/2025 a 11/05/2026	R$ 333.063,90	R$ 719.338,89	92,38%

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL CAMPINA GRANDE - PB
CONTRATADA: R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 30.836.850/0001-95

ART de Execução: PB20250727074 **ART de Fiscalização:** PB20250769528

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PLANILHA CONTRATADA			EVOLUÇÃO FÍSICA			EVOLUÇÃO FINANCEIRA			PERCENTUAL EXECUTADO
				PREÇO UNIT. SEM/BDI	PREÇO UNIT. C/BDI	VALOR TOTAL (R$)	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLU. O PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLU. O PERÍODO	
1	**ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA**					**R$ 52.382,64**				**R$ 14.720,59**	**R$ 20.915,10**	**R$ 46.969,76**	**89,67%**
1.1	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	mês	3,00	R$ 771,00	888,81	R$ 2.666,43	1,49	1,20	2,69	R$ 1.022,13	R$ 1.066,57	R$ 2.390,90	89,67%
1.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,	mês	3,00	R$ 670,06	772,45	R$ 2.317,35	1,49	1,20	2,69	R$ 888,31	R$ 926,94	R$ 2.077,88	89,67%
1.3	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	240,00	R$ 100,32	R$ 122,39	R$ 29.373,60	119,51	95,69	215,20	R$ 5.900,47	R$ 11.711,50	R$ 26.338,33	89,67%
1.4	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	3,00	R$ 4.924,94	R$ 6.008,42	R$ 18.025,26	1,49	1,20	2,69	R$ 6.909,68	R$ 7.210,10	R$ 16.162,65	89,67%
2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 56.742,51**	-		-	**R$ 56.742,51**	**R$ -**	**R$ 56.742,51**	**100,00%**
2.1	**FECHAMENTO DE OBRA**					**R$ 52.544,71**				**R$ 52.544,71**	**R$ -**	**R$ 52.544,71**	**100,00%**
2.1.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	487,74	R$ 78,78	R$ 96,11	R$ 46.876,69	487,74	-	487,74	R$ 46.876,69	R$ -	R$ 46.876,69	100,00%
2.1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	18,00	R$ 258,11	R$ 314,89	R$ 5.668,02	18,00	-	18,00	R$ 5.668,02	R$ -	R$ 5.668,02	100,00%
2.2	**LIGAÇÕES PROVISÓRIAS**					**R$ 2.119,35**				**R$ 2.119,35**	**R$ -**	**R$ 2.119,35**	**100,00%**
2.2.1	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM - REV 03_10/2022	und	1,00	R$ 443,26	R$ 540,77	R$ 540,77	1,00	-	1,00	R$ 540,77	R$ -	R$ 540,77	100,00%
2.2.2	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR	und	1,00	R$ 1.293,92	R$ 1.578,58	R$ 1.578,58	1,00	-	1,00	R$ 1.578,58	R$ -	R$ 1.578,58	100,00%
2.3	**LOCAÇÃO DE SERVIÇOS**					**R$ 2.078,45**				**R$ 2.078,45**	**R$ -**	**R$ 2.078,45**	**100,00%**
2.3.1	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	703,00	R$ 1,18	R$ 1,43	R$ 1.005,29	703,00	-	703,00	R$ 1.005,29	R$ -	R$ 1.005,29	100,00%
2.3.2	LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA	m²	1850,29	R$ 0,48	R$ 0,58	R$ 1.073,16	1.850,29	-	1.850,29	R$ 1.073,16	R$ -	R$ 1.073,16	100,00%
3	**DEMOLIÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHO**					**R$ 85.539,26**				**R$ 43.247,07**	**R$ 42.292,19**	**R$ 85.539,26**	**100,00%**
3.1	**DEMOLIÇÃO PARA EXECUTAR CALÇADAS**					**R$ 30.926,33**				**R$ -**	**R$ 30.926,33**	**R$ 30.926,33**	**100,00%**
3.1.1	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	283,87	R$ 12,91	R$ 15,75	R$ 4.470,95		283,87	283,87	R$ -	R$ 4.470,95	R$ 4.470,95	100,00%
3.1.2	RETIRADA PISO PEDRAS IRREGULARES SEM REAPROVEITAMENTO	m²	425,85	R$ 3,94	R$ 4,80	R$ 2.044,08		425,85	425,85	R$ -	R$ 2.044,08	R$ 2.044,08	100,00%
3.1.3	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	m²	425,85	R$ 20,76	R$ 25,32	R$ 10.782,52		425,85	425,85	R$ -	R$ 10.782,52	R$ 10.782,52	100,00%
3.1.4	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	m²	283,87	R$ 11,14	R$ 13,59	R$ 3.857,79		283,87	283,87	R$ -	R$ 3.857,79	R$ 3.857,79	100,00%
3.1.5	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	482,28	R$ 16,61	R$ 20,26	R$ 9.770,99		482,28	482,28	R$ -	R$ 9.770,99	R$ 9.770,99	100,00%
3.2	**DEMOLIÇÃO PARA EXECUTAR PAVIMENTO ELEVADO**					**R$ 14.242,78**				**R$ 2.876,92**	**R$ 11.365,86**	**R$ 14.242,78**	**100,00%**
3.2.1	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	703,00	R$ 16,61	R$ 20,26	R$ 14.242,78	142,00	561,00	703,00	R$ 2.876,92	R$ 11.365,86	R$ 14.242,78	100,00%
3.3	**DEMOLIÇÃO DE PISO DA PRAÇA E MEIO FIO**					**R$ 28.337,87**				**R$ 28.337,87**	**R$ -**	**R$ 28.337,87**	**100,00%**
3.3.1	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1280,79	R$ 12,91	R$ 15,75	R$ 20.172,44	1.280,79	-	1.280,79	R$ 20.172,44	R$ -	R$ 20.172,44	100,00%
3.3.2	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	m	797,76	R$ 7,93	R$ 9,67	R$ 7.714,33	797,76	-	797,76	R$ 7.714,33	R$ -	R$ 7.714,33	100,00%
3.3.3	REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO SIMPLES (6.00 A 10.00 M) SEM REAPROVEITAMENTO	un	13,00	R$ 28,45	R$ 34,70	R$ 451,10	13,00	-	13,00	R$ 451,10	R$ -	R$ 451,10	100,00%
3.4	**CARGA E TRANSPORTE DE ENUTILO**					**R$ 12.032,28**				**R$ 12.032,28**	**R$ -**	**R$ 12.032,28**	**100,00%**
3.4.1	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	373,21	R$ 7,00	R$ 8,54	R$ 3.187,21	373,21	-	373,21	R$ 3.187,21	R$ -	R$ 3.187,21	100,00%
3.4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³xkm	3732,10	R$ 1,95	R$ 2,37	R$ 8.845,07	3.732,10	-	3.732,10	R$ 8.845,07	R$ -	R$ 8.845,07	100,00%
4	**CONSTRUÇÃO**					**R$ 500.928,38**				**R$ 210.476,20**	**R$ 269.856,60**	**R$ 480.332,80**	**95,89%**
4.1	**PISO DAS CALÇADAS**					**R$ 184.144,62**				**R$ -**	**R$ 184.144,62**	**R$ 184.144,62**	**100,00%**
4.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	m³	37,74	R$ 548,48	R$ 669,15	R$ 25.253,72		37,74	37,74	R$ -	R$ 25.253,72	R$ 25.253,72	100,00%
4.1.2	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	1790,32	R$ 2,41	R$ 2,94	R$ 5.263,54		1.790,32	1.790,32	R$ -	R$ 5.263,54	R$ 5.263,54	100,00%
4.1.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	1790,32	R$ 70,34	R$ 85,81	R$ 153.627,36		1.790,32	1.790,32	R$ -	R$ 153.627,36	R$ 153.627,36	100,00%
4.2	**PISO DA PRAÇA**					**R$ 148.323,18**				**R$ 148.323,18**	**R$ -**	**R$ 148.323,18**	**100,00%**
4.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	m³	38,42	R$ 548,48	R$ 669,15	R$ 25.708,74	38,42	-	38,42	R$ 25.708,74	R$ -	R$ 25.708,74	100,00%
4.2.2	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	1280,79	R$ 2,41	R$ 2,94	R$ 3.765,52	1.280,79	-	1.280,79	R$ 3.765,52	R$ -	R$ 3.765,52	100,00%
4.2.3	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	m³	51,23	R$ 342,61	R$ 417,98	R$ 21.413,12	51,23	-	51,23	R$ 21.413,12	R$ -	R$ 21.413,12	100,00%

R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.850/0001-95
Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, nº 195, Centro, Ingá – PB
Telefone: (83) 9 9806-7435
E-mail: resengenhariaeconsultoria@outlook.com

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DAS VIAS E PASSEIOS NO ENTORNO DA PRAÇA CORONEL ANTÔNIO PESSOA, BEM COMO MELHORIAS NA ÁREA INTERNA DA PRAÇA, PRESERVANDO SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS, DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE – PB.

LOCALIDADE: PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA, 111 - CENTRO CAMPINA GRANDE - PB, 58400-263	**Fonte de Recursos**	**Contrato:**	**Concorrência Eletrônica**	**Valor Contratado**	**BDI: 22,00**	**Nº do Boletim**	**Período de execução**	**Valor do BM**	**Valor Acumulado**	**Percentual Total Executado**
	MDR - 1081110-73/2021	2.08.001/2025	9.08.17/2024	R$ 778.679,49		03	19/12/2025 a 11/05/2026	R$ 333.063,90	R$ 719.338,89	92,38%

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL CAMPINA GRANDE - PB

CONTRATADA: R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 30.836.850/0001-95 — **ART de Execução:** PB20250727074 — **ART de Fiscalização:** PB20250769528

4.2.4	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, ACAMABENTO LAVADO TIPO FULGET, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS E APLICAÇÃO DO PISO.	m²	450,00	R$ 70,06	R$ 85,47	R$ 38.461,50	450,00	-	450,00	R$ 38.461,50	R$ -	R$ 38.461,50	100,00%
4.2.5	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, ACAMABENTO LAVADO TIPO FULGET, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS E APLICAÇÃO DO PISO	m²	690,00	R$ 70,06	R$ 85,47	R$ 58.974,30	690,00	-	690,00	R$ 58.974,30	R$ -	R$ 58.974,30	100,00%
4.3	**PAVIMENTO ELEVADO**					**R$ 66.355,06**				**R$ -**	**R$ 49.880,32**	**R$ 49.880,32**	**75,17%**
4.3.1	COLCHÃO DE AREIA	m³	71,25	R$ 121,34	R$ 148,03	R$ 10.547,13		67,50	67,50	R$ -	R$ 9.992,03	R$ 9.992,03	94,74%
4.3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	m	130,07	R$ 32,32	R$ 39,43	R$ 5.128,66		130,07	130,07	R$ -	R$ 5.128,66	R$ 5.128,66	100,00%
4.3.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.	m²	703,00	R$ 59,09	R$ 72,09	R$ 50.679,27		482,17	482,17	R$ -	R$ 34.759,64	R$ 34.759,64	68,59%
4.4	**MEIO FIO E CALHAS**					**R$ 47.384,65**				**R$ 11.552,99**	**R$ 35.831,66**	**R$ 47.384,65**	**100,00%**
4.4.1	CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE CONCRETO PRÉ MOLDADA.	m	92,94	R$ 101,25	R$ 123,53	R$ 11.480,88		92,94	92,94	R$ -	R$ 11.480,88	R$ 11.480,88	100,00%
4.4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO	m	910,57	R$ 32,32	R$ 39,43	R$ 35.903,77	293,00	617,57	910,57	R$ 11.552,99	R$ 24.350,79	R$ 35.903,77	100,00%
4.5	**CANTEIROS**					**R$ 31.874,26**				**R$ 31.874,26**	**R$ -**	**R$ 31.874,26**	**100,00%**
4.5.1	RESTAURO - EMBOÇO ESPECIAL DE PAREDE, SPESSURA 3CM, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,24:0,74 (CAL, ARENOSO E AREIA MÉDIA)	m²	46,19	R$ 36,77	R$ 44,86	R$ 2.072,08	46,19	-	46,19	R$ 2.072,08	R$ -	R$ 2.072,08	100,00%
4.5.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	184,77	R$ 3,10	R$ 3,78	R$ 698,43	184,77	-	184,77	R$ 698,43	R$ -	R$ 698,43	100,00%
4.5.3	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01	m²	184,77	R$ 16,17	R$ 19,72	R$ 3.643,66	184,77	-	184,77	R$ 3.643,66	R$ -	R$ 3.643,66	100,00%
4.5.4	APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA RISCADA EM CORES DIVERSAS	m²	184,77	R$ 40,70	R$ 49,65	R$ 9.173,83	184,77	-	184,77	R$ 9.173,83	R$ -	R$ 9.173,83	100,00%
4.5.5	GRANITO VERDE UBATUBA EM PISO	m²	60,51	R$ 220,62	R$ 269,15	R$ 16.286,26	60,51	-	60,51	R$ 16.286,26	R$ -	R$ 16.286,26	100,00%
4.6	**ÁREAS PERMEÁVEL**					**R$ 6.587,58**				**R$ 2.466,73**	**R$ -**	**R$ 2.466,73**	**37,45%**
4.6.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m²	137,91	R$ 16,98	R$ 20,71	R$ 2.856,11		-	-	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
4.6.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	m	56,66	R$ 31,09	R$ 37,92	R$ 2.148,54	56,66	-	56,66	R$ 2.148,54	R$ -	R$ 2.148,54	100,00%
4.6.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	m	7,88	R$ 33,10	R$ 40,38	R$ 318,19	7,88	-	7,88	R$ 318,19	R$ -	R$ 318,19	100,00%
4.6.4	ÁRVORE PORTE PEQUENO (MULUNGÚ) - PLANTADA	und	8,00	R$ 35,05	R$ 42,76	R$ 342,08		-	-	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
4.6.5	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	und	2,00	R$ 103,76	R$ 126,58	R$ 253,16		-	-	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
4.6.6	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	und	10,00	R$ 54,88	R$ 66,95	R$ 669,50		-	-	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
4.7	**ACESSIBILIDADE**					**R$ 16.259,03**				**R$ 16.259,03**	**R$ -**	**R$ 16.259,03**	**100,00%**
4.7.1	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	107,69	R$ 123,76	R$ 150,98	R$ 16.259,03	107,69	-	107,69	R$ 16.259,03	R$ -	R$ 16.259,03	100,00%
5	**SERVIÇOS DIVERSOS**					**R$ 83.086,70**				**R$ 49.791,23**	**R$ -**	**R$ 49.791,23**	**59,93%**
5.1	**EQUIPAMENTOS**					**R$ 24.680,60**				**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**0,00%**
5.1.1	FRADE ESFERA EM CONCRETO, 30CM DE DIÂMETRO, COM FCK=25 MPA, PARA PROTEÇÃO DE CALCADAS, INCLUSIVE FURACÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	und	84,00	R$ 162,45	R$ 198,18	R$ 16.647,12		-	-	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
5.1.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	19,20	R$ 11,50	R$ 14,03	R$ 269,37		-	-	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
5.1.3	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	und	3,00	R$ 1.082,74	R$ 1.320,94	R$ 3.962,82		-	-	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
5.1.4	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 M	und	1,00	R$ 1.620,34	R$ 1.976,81	R$ 1.976,81		-	-	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
5.1.5	TUBO AÇO GALVANIZADO D=3" P/BICICLETÁRIO, DIMENSÃO: H=75CM, L=75CM, FIXADO EMBASE DE CONCRETO, PINTADO C/ESMALTE SINTETICO, EXCETO BASE DE CONCRETO E PINTURA DE ACABAMENTO	und	6,00	R$ 249,25	R$ 304,08	R$ 1.824,48		-	-	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
5.2	**ILUMINAÇÃO**					**R$ 49.791,23**				**R$ 49.791,23**	**R$ -**	**R$ 49.791,23**	**100,00%**
5.2.1	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	und	4,00	R$ 2.363,90	R$ 2.883,95	R$ 11.535,80	4,00	-	4,00	R$ 11.535,80	R$ -	R$ 11.535,80	100,00%
5.2.2	LUMINÁRIA EM LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED SMD AUTOVOLT 75 W, 5.000 K, IP-66,IRC 70, FP>0,95, 170LM/W,12.750 LM E 54.000H, COM BASE PARA RELÉ 3 PINOS, MODELO GL421 G-LIGHT OU SIMILAR	und	8,00	R$ 767,12	R$ 935,88	R$ 7.487,04	8,00	-	8,00	R$ 7.487,04	R$ -	R$ 7.487,04	100,00%
5.2.3	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	und	9,00	R$ 2.035,11	R$ 2.482,83	R$ 22.345,47	9,00	-	9,00	R$ 22.345,47	R$ -	R$ 22.345,47	100,00%

R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.850/0001-95
Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, nº 195, Centro, Ingá – PB
Telefone: (83) 9 9806-7435
E-mail: resengenhariaeconsultoria@outlook.com

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DAS VIAS E PASSEIOS NO ENTORNO DA PRAÇA CORONEL ANTÔNIO PESSOA, BEM COMO MELHORIAS NA ÁREA INTERNA DA PRAÇA, PRESERVANDO SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS, DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE – PB.

LOCALIDADE: PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA, 111 - CENTRO CAMPINA GRANDE - PB, 58400-263	**Fonte de Recursos**	**Contrato:**	**Concorrência Eletrônica**	**Valor Contratado**	**BDI: 22,00**	**Nº do Boletim**	**Período de execução**	**Valor do BM**	**Valor Acumulado**	**Percentual Total Executado**
	MDR - 1081110-73/2021	2.08.001/2025	9.08.17/2024	R$ 778.679,49		03	19/12/2025 a 11/05/2026	R$ 333.063,90	R$ 719.338,89	92,38%

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL CAMPINA GRANDE - PB
CONTRATADA: R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 30.836.850/0001-95

ART de Execução: PB20250727074 **ART de Fiscalização:** PB20250769528

5.2.4	LUMINÁRIA EM LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED SMD AUTOVOLT 75 W, 5.000 K, IP-66,IRC 70, FP>0,95, 170LM/W,12.750 LM E 54.000H, COM BASE PARA RELÉ 3 PINOS, MODELO GL421 G-LIGHT OU SIMILAR	und	9,00	R$ 767,12	R$ 935,88	R$ 8.422,92	9,00	-	9,00	R$ 8.422,92	R$ -	R$ 8.422,92	100,00%
5.3	**LIMPEZA FINAL DA OBRA**					**R$ 8.614,87**				**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**0,00%**
5.3.1	LIMPEZA GERAL	m²	3729,38	R$ 1,89	R$ 2,31	R$ 8.614,87		-	-	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%

TOTAL CONTRATADO	**R$ 778.679,49**	**EVOLUÇAO FINANCEIRA DO BM 03**	**R$ 386.274,99**	**R$ 333.063,90**	**R$ 719.338,89**	**92,38%**

BM 01	**R$ 159.966,55**	**CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS**
BM 02	**R$ 226.308,44**	**DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS**
BM 03	**R$ 333.063,90**	**TREZENTOS E TRINTA E TRES MIL SESSENTA E TRES REAIS E NOVENTA CENTAVOS**

RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES:08855267400

Assinado de forma digital por RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES:08855267400
Dados: 2026.05.11 19:19:14 -03'00'

R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.850/0001-95
Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, nº 195, Centro, Ingá – PB
Telefone: (83) 9 9806-7435
E-mail: resengenhariaeconsultoria@outlook.com

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DAS VIAS E PASSEIOS NO ENTORNO DA PRAÇA CORONEL ANTÔNIO PESSOA, BEM COMO MELHORIAS NA ÁREA INTERNA DA PRAÇA, PRESERVANDO SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS, DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE – PB.

LOCALIDADE:	Fonte de Recursos	Contrato:	Concorrência Eletrônica	Valor Contratado	BDI: 22,00	Nº do Boletim	Período de execução	Valor do BM	Valor Acumulado	Percentual Total Executado
PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA, 111 - CENTRO CAMPINA GRANDE - PB, 58400-263	MDR - 1081110-73/2021	2.08.001/2025	9.08.17/2024	R$ 778.679,49		03	19/12/2025 a 11/05/2026	R$ 333.063,90	R$ 719.338,89	92,38%

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL CAMPINA GRANDE - PB
CONTRATADA: R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 30.836.850/0001-95

ART de Execução: PB20250727074 **ART de Fiscalização:** PB20250769528

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PLANILHA CONTRATADA			EVOLUÇÃO FÍSICA			EVOLUÇÃO FINANCEIRA			PERCENTUAL EXECUTADO
				PREÇO UNIT. SEM/BDI	PREÇO UNIT. C/BDI	VALOR TOTAL (R$)	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLU. O PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLU. O PERÍODO	
1	**ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA**					**R$ 52.382,64**				**R$ 14.720,59**	**R$ 20.915,10**	**R$ 46.969,76**	**89,67%**
1.1	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	mês	3,00	R$ 771,00	888,81	R$ 2.666,43	1,49	1,20	2,69	R$ 1.022,13	R$ 1.066,57	R$ 2.390,90	89,67%
1.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,	mês	3,00	R$ 670,06	772,45	R$ 2.317,35	1,49	1,20	2,69	R$ 888,31	R$ 926,94	R$ 2.077,88	89,67%
1.3	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	240,00	R$ 100,32	R$ 122,39	R$ 29.373,60	119,51	95,69	215,20	R$ 5.900,47	R$ 11.711,50	R$ 26.338,33	89,67%
1.4	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	3,00	R$ 4.924,94	R$ 6.008,42	R$ 18.025,26	1,49	1,20	2,69	R$ 6.909,68	R$ 7.210,10	R$ 16.162,65	89,67%
2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 56.742,51**	-		-	**R$ 56.742,51**	**R$ -**	**R$ 56.742,51**	**100,00%**
2.1	**FECHAMENTO DE OBRA**					**R$ 52.544,71**				**R$ 52.544,71**	**R$ -**	**R$ 52.544,71**	**100,00%**
2.1.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	487,74	R$ 78,78	R$ 96,11	R$ 46.876,69	487,74	-	487,74	R$ 46.876,69	R$ -	R$ 46.876,69	100,00%
2.1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	18,00	R$ 258,11	R$ 314,89	R$ 5.668,02	18,00	-	18,00	R$ 5.668,02	R$ -	R$ 5.668,02	100,00%
2.2	**LIGAÇÕES PROVISÓRIAS**					**R$ 2.119,35**				**R$ 2.119,35**	**R$ -**	**R$ 2.119,35**	**100,00%**
2.2.1	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM - REV 03_10/2022	und	1,00	R$ 443,26	R$ 540,77	R$ 540,77	1,00	-	1,00	R$ 540,77	R$ -	R$ 540,77	100,00%
2.2.2	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR	und	1,00	R$ 1.293,92	R$ 1.578,58	R$ 1.578,58	1,00	-	1,00	R$ 1.578,58	R$ -	R$ 1.578,58	100,00%
2.3	**LOCAÇÃO DE SERVIÇOS**					**R$ 2.078,45**				**R$ 2.078,45**	**R$ -**	**R$ 2.078,45**	**100,00%**
2.3.1	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	703,00	R$ 1,18	R$ 1,43	R$ 1.005,29	703,00	-	703,00	R$ 1.005,29	R$ -	R$ 1.005,29	100,00%
2.3.2	LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA	m²	1850,29	R$ 0,48	R$ 0,58	R$ 1.073,16	1.850,29	-	1.850,29	R$ 1.073,16	R$ -	R$ 1.073,16	100,00%
3	**DEMOLIÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHO**					**R$ 85.539,26**				**R$ 43.247,07**	**R$ 42.292,19**	**R$ 85.539,26**	**100,00%**
3.1	**DEMOLIÇÃO PARA EXECUTAR CALÇADAS**					**R$ 30.926,33**				**R$ -**	**R$ 30.926,33**	**R$ 30.926,33**	**100,00%**
3.1.1	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	283,87	R$ 12,91	R$ 15,75	R$ 4.470,95		283,87	283,87	R$ -	R$ 4.470,95	R$ 4.470,95	100,00%
3.1.2	RETIRADA PISO PEDRAS IRREGULARES SEM REAPROVEITAMENTO	m²	425,85	R$ 3,94	R$ 4,80	R$ 2.044,08		425,85	425,85	R$ -	R$ 2.044,08	R$ 2.044,08	100,00%
3.1.3	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	m²	425,85	R$ 20,76	R$ 25,32	R$ 10.782,52		425,85	425,85	R$ -	R$ 10.782,52	R$ 10.782,52	100,00%
3.1.4	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	m²	283,87	R$ 11,14	R$ 13,59	R$ 3.857,79		283,87	283,87	R$ -	R$ 3.857,79	R$ 3.857,79	100,00%
3.1.5	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	482,28	R$ 16,61	R$ 20,26	R$ 9.770,99		482,28	482,28	R$ -	R$ 9.770,99	R$ 9.770,99	100,00%
3.2	**DEMOLIÇÃO PARA EXECUTAR PAVIMENTO ELEVADO**					**R$ 14.242,78**				**R$ 2.876,92**	**R$ 11.365,86**	**R$ 14.242,78**	**100,00%**
3.2.1	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	703,00	R$ 16,61	R$ 20,26	R$ 14.242,78	142,00	561,00	703,00	R$ 2.876,92	R$ 11.365,86	R$ 14.242,78	100,00%
3.3	**DEMOLIÇÃO DE PISO DA PRAÇA E MEIO FIO**					**R$ 28.337,87**				**R$ 28.337,87**	**R$ -**	**R$ 28.337,87**	**100,00%**
3.3.1	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1280,79	R$ 12,91	R$ 15,75	R$ 20.172,44	1.280,79	-	1.280,79	R$ 20.172,44	R$ -	R$ 20.172,44	100,00%
3.3.2	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	m	797,76	R$ 7,93	R$ 9,67	R$ 7.714,33	797,76	-	797,76	R$ 7.714,33	R$ -	R$ 7.714,33	100,00%
3.3.3	REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO SIMPLES (6.00 A 10.00 M) SEM REAPROVEITAMENTO	un	13,00	R$ 28,45	R$ 34,70	R$ 451,10	13,00	-	13,00	R$ 451,10	R$ -	R$ 451,10	100,00%
3.4	**CARGA E TRANSPORTE DE ENUTILO**					**R$ 12.032,28**				**R$ 12.032,28**	**R$ -**	**R$ 12.032,28**	**100,00%**
3.4.1	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	373,21	R$ 7,00	R$ 8,54	R$ 3.187,21	373,21	-	373,21	R$ 3.187,21	R$ -	R$ 3.187,21	100,00%
3.4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³xkm	3732,10	R$ 1,95	R$ 2,37	R$ 8.845,07	3.732,10	-	3.732,10	R$ 8.845,07	R$ -	R$ 8.845,07	100,00%
4	**CONSTRUÇÃO**					**R$ 500.928,38**				**R$ 210.476,20**	**R$ 269.856,60**	**R$ 480.332,80**	**95,89%**
4.1	**PISO DAS CALÇADAS**					**R$ 184.144,62**				**R$ -**	**R$ 184.144,62**	**R$ 184.144,62**	**100,00%**
4.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	m³	37,74	R$ 548,48	R$ 669,15	R$ 25.253,72		37,74	37,74	R$ -	R$ 25.253,72	R$ 25.253,72	100,00%
4.1.2	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	1790,32	R$ 2,41	R$ 2,94	R$ 5.263,54		1.790,32	1.790,32	R$ -	R$ 5.263,54	R$ 5.263,54	100,00%
4.1.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	1790,32	R$ 70,34	R$ 85,81	R$ 153.627,36		1.790,32	1.790,32	R$ -	R$ 153.627,36	R$ 153.627,36	100,00%
4.2	**PISO DA PRAÇA**					**R$ 148.323,18**				**R$ 148.323,18**	**R$ -**	**R$ 148.323,18**	**100,00%**
4.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	m³	38,42	R$ 548,48	R$ 669,15	R$ 25.708,74	38,42	-	38,42	R$ 25.708,74	R$ -	R$ 25.708,74	100,00%
4.2.2	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	1280,79	R$ 2,41	R$ 2,94	R$ 3.765,52	1.280,79	-	1.280,79	R$ 3.765,52	R$ -	R$ 3.765,52	100,00%
4.2.3	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	m³	51,23	R$ 342,61	R$ 417,98	R$ 21.413,12	51,23	-	51,23	R$ 21.413,12	R$ -	R$ 21.413,12	100,00%

R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.850/0001-95
Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, nº 195, Centro, Ingá – PB
Telefone: (83) 9 9806-7435
E-mail: resengenhariaeconsultoria@outlook.com

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DAS VIAS E PASSEIOS NO ENTORNO DA PRAÇA CORONEL ANTÔNIO PESSOA, BEM COMO MELHORIAS NA ÁREA INTERNA DA PRAÇA, PRESERVANDO SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS, DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE – PB.

LOCALIDADE: PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA, 111 - CENTRO CAMPINA GRANDE - PB, 58400-263	**Fonte de Recursos**	**Contrato:**	**Concorrência Eletrônica**	**Valor Contratado**	**BDI: 22,00**	**Nº do Boletim**	**Período de execução**	**Valor do BM**	**Valor Acumulado**	**Percentual Total Executado**
	MDR - 1081110-73/2021	2.08.001/2025	9.08.17/2024	R$ 778.679,49		03	19/12/2025 a 11/05/2026	R$ 333.063,90	R$ 719.338,89	92,38%

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL CAMPINA GRANDE - PB
CONTRATADA: R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 30.836.850/0001-95
ART de Execução: PB20250727074 **ART de Fiscalização:** PB20250769528

4.2.4	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, ACAMABENTO LAVADO TIPO FULGET, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS E APLICAÇÃO DO PISO.	m²	450,00	R$ 70,06	R$ 85,47	R$ 38.461,50	450,00	-	450,00	R$ 38.461,50	R$ -	R$ 38.461,50	100,00%
4.2.5	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, ACAMABENTO LAVADO TIPO FULGET, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS E APLICAÇÃO DO PISO	m²	690,00	R$ 70,06	R$ 85,47	R$ 58.974,30	690,00	-	690,00	R$ 58.974,30	R$ -	R$ 58.974,30	100,00%
4.3	**PAVIMENTO ELEVADO**					**R$ 66.355,06**				**R$ -**	**R$ 49.880,32**	**R$ 49.880,32**	**75,17%**
4.3.1	COLCHÃO DE AREIA	m³	71,25	R$ 121,34	R$ 148,03	R$ 10.547,13		67,50	67,50	R$ -	R$ 9.992,03	R$ 9.992,03	94,74%
4.3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	m	130,07	R$ 32,32	R$ 39,43	R$ 5.128,66		130,07	130,07	R$ -	R$ 5.128,66	R$ 5.128,66	100,00%
4.3.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.	m²	703,00	R$ 59,09	R$ 72,09	R$ 50.679,27		482,17	482,17	R$ -	R$ 34.759,64	R$ 34.759,64	68,59%
4.4	**MEIO FIO E CALHAS**					**R$ 47.384,65**				**R$ 11.552,99**	**R$ 35.831,66**	**R$ 47.384,65**	**100,00%**
4.4.1	CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE CONCRETO PRÉ MOLDADA.	m	92,94	R$ 101,25	R$ 123,53	R$ 11.480,88		92,94	92,94	R$ -	R$ 11.480,88	R$ 11.480,88	100,00%
4.4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO	m	910,57	R$ 32,32	R$ 39,43	R$ 35.903,77	293,00	617,57	910,57	R$ 11.552,99	R$ 24.350,79	R$ 35.903,77	100,00%
4.5	**CANTEIROS**					**R$ 31.874,26**				**R$ 31.874,26**	**R$ -**	**R$ 31.874,26**	**100,00%**
4.5.1	RESTAURO - EMBOÇO ESPECIAL DE PAREDE, SPESSURA 3CM, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,24:0,74 (CAL, ARENOSO E AREIA MÉDIA)	m²	46,19	R$ 36,77	R$ 44,86	R$ 2.072,08	46,19	-	46,19	R$ 2.072,08	R$ -	R$ 2.072,08	100,00%
4.5.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	184,77	R$ 3,10	R$ 3,78	R$ 698,43	184,77	-	184,77	R$ 698,43	R$ -	R$ 698,43	100,00%
4.5.3	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01	m²	184,77	R$ 16,17	R$ 19,72	R$ 3.643,66	184,77	-	184,77	R$ 3.643,66	R$ -	R$ 3.643,66	100,00%
4.5.4	APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA RISCADA EM CORES DIVERSAS	m²	184,77	R$ 40,70	R$ 49,65	R$ 9.173,83	184,77	-	184,77	R$ 9.173,83	R$ -	R$ 9.173,83	100,00%
4.5.5	GRANITO VERDE UBATUBA EM PISO	m²	60,51	R$ 220,62	R$ 269,15	R$ 16.286,26	60,51	-	60,51	R$ 16.286,26	R$ -	R$ 16.286,26	100,00%
4.6	**ÁREAS PERMEÁVEL**					**R$ 6.587,58**				**R$ 2.466,73**	**R$ -**	**R$ 2.466,73**	**37,45%**
4.6.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m²	137,91	R$ 16,98	R$ 20,71	R$ 2.856,11		-	-	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
4.6.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	m	56,66	R$ 31,09	R$ 37,92	R$ 2.148,54	56,66	-	56,66	R$ 2.148,54	R$ -	R$ 2.148,54	100,00%
4.6.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	m	7,88	R$ 33,10	R$ 40,38	R$ 318,19	7,88	-	7,88	R$ 318,19	R$ -	R$ 318,19	100,00%
4.6.4	ÁRVORE PORTE PEQUENO (MULUNGÚ) - PLANTADA	und	8,00	R$ 35,05	R$ 42,76	R$ 342,08		-	-	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
4.6.5	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	und	2,00	R$ 103,76	R$ 126,58	R$ 253,16		-	-	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
4.6.6	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	und	10,00	R$ 54,88	R$ 66,95	R$ 669,50		-	-	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
4.7	**ACESSIBILIDADE**					**R$ 16.259,03**				**R$ 16.259,03**	**R$ -**	**R$ 16.259,03**	**100,00%**
4.7.1	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	107,69	R$ 123,76	R$ 150,98	R$ 16.259,03	107,69	-	107,69	R$ 16.259,03	R$ -	R$ 16.259,03	100,00%
5	**SERVIÇOS DIVERSOS**					**R$ 83.086,70**				**R$ 49.791,23**	**R$ -**	**R$ 49.791,23**	**59,93%**
5.1	**EQUIPAMENTOS**					**R$ 24.680,60**				**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**0,00%**
5.1.1	FRADE ESFERA EM CONCRETO, 30CM DE DIÂMETRO, COM FCK=25 MPA, PARA PROTEÇÃO DE CALCADAS, INCLUSIVE FURACÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	und	84,00	R$ 162,45	R$ 198,18	R$ 16.647,12		-	-	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
5.1.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	19,20	R$ 11,50	R$ 14,03	R$ 269,37		-	-	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
5.1.3	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	und	3,00	R$ 1.082,74	R$ 1.320,94	R$ 3.962,82		-	-	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
5.1.4	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 M	und	1,00	R$ 1.620,34	R$ 1.976,81	R$ 1.976,81		-	-	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
5.1.5	TUBO AÇO GALVANIZADO D=3" P/BICICLETÁRIO, DIMENSÃO: H=75CM, L=75CM, FIXADO EMBASE DE CONCRETO, PINTADO C/ESMALTE SINTETICO, EXCETO BASE DE CONCRETO E PINTURA DE ACABAMENTO	und	6,00	R$ 249,25	R$ 304,08	R$ 1.824,48		-	-	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
5.2	**ILUMINAÇÃO**					**R$ 49.791,23**				**R$ 49.791,23**	**R$ -**	**R$ 49.791,23**	**100,00%**
5.2.1	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	und	4,00	R$ 2.363,90	R$ 2.883,95	R$ 11.535,80	4,00	-	4,00	R$ 11.535,80	R$ -	R$ 11.535,80	100,00%
5.2.2	LUMINÁRIA EM LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED SMD AUTOVOLT 75 W, 5.000 K, IP-66,IRC 70, FP>0,95, 170LM/W,12.750 LM E 54.000H, COM BASE PARA RELÉ 3 PINOS, MODELO GL421 G-LIGHT OU SIMILAR	und	8,00	R$ 767,12	R$ 935,88	R$ 7.487,04	8,00	-	8,00	R$ 7.487,04	R$ -	R$ 7.487,04	100,00%
5.2.3	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	und	9,00	R$ 2.035,11	R$ 2.482,83	R$ 22.345,47	9,00	-	9,00	R$ 22.345,47	R$ -	R$ 22.345,47	100,00%

R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.850/0001-95
Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, nº 195, Centro, Ingá – PB
Telefone: (83) 9 9806-7435
E-mail: resengenhariaeconsultoria@outlook.com

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DAS VIAS E PASSEIOS NO ENTORNO DA PRAÇA CORONEL ANTÔNIO PESSOA, BEM COMO MELHORIAS NA ÁREA INTERNA DA PRAÇA, PRESERVANDO SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS, DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE – PB.

LOCALIDADE: PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA, 111 - CENTRO CAMPINA GRANDE - PB, 58400-263	**Fonte de Recursos**	**Contrato:**	**Concorrência Eletrônica**	**Valor Contratado**	**BDI: 22,00**	**Nº do Boletim**	**Período de execução**	**Valor do BM**	**Valor Acumulado**	**Percentual Total Executado**
	MDR - 1081110-73/2021	2.08.001/2025	9.08.17/2024	R$ 778.679,49		03	19/12/2025 a 11/05/2026	R$ 333.063,90	R$ 719.338,89	92,38%

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL CAMPINA GRANDE - PB
CONTRATADA: R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 30.836.850/0001-95

ART de Execução: PB20250727074 **ART de Fiscalização:** PB20250769528

5.2.4	LUMINÁRIA EM LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED SMD AUTOVOLT 75 W, 5.000 K, IP-66,IRC 70, FP>0,95, 170LM/W,12.750 LM E 54.000H, COM BASE PARA RELÉ 3 PINOS, MODELO GL421 G-LIGHT OU SIMILAR	und	9,00	R$ 767,12	R$ 935,88	R$ 8.422,92	9,00	-	9,00	R$ 8.422,92	R$ -	R$ 8.422,92	100,00%
5.3	**LIMPEZA FINAL DA OBRA**					**R$ 8.614,87**				**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**0,00%**
5.3.1	LIMPEZA GERAL	m²	3729,38	R$ 1,89	R$ 2,31	R$ 8.614,87		-	-	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%

TOTAL CONTRATADO	**R$ 778.679,49**	**EVOLUÇAO FINANCEIRA DO BM 03**	**R$ 386.274,99**	**R$ 333.063,90**	**R$ 719.338,89**	**92,38%**

BM 01	**R$ 159.966,55**	**CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS**
BM 02	**R$ 226.308,44**	**DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS**
BM 03	**R$ 333.063,90**	**TREZENTOS E TRINTA E TRES MIL SESSENTA E TRES REAIS E NOVENTA CENTAVOS**

RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES:08855267400

Assinado de forma digital por RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES:08855267400
Dados: 2026.05.11 19:19:14 -03'00'

R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.850/0001-95
Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, n° 195, Centro, Ingá – PB
Telefone: (83) 9 9806-7435
E-mail: resengenhariaeconsultoria@outlook.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DAS VIAS E PASSEIOS NO ENTORNO DA PRAÇA CORONEL ANTÔNIO PESSOA, BEM COMO MELHORIAS NA ÁREA INTERNA DA PRAÇA, PRESERVANDO SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS, DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE – PB.
LOCALIDADE: PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA, 111 - CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB, 58400-263
PERIODO DA MEDIÇÃO: 19/12/2025 a 11/05/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL CAMPINA GRANDE - PB
CONTRATADA: R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 30.836.850/0001-95

CONTRATO : 2.08.001/2025
Concorrência Eletrônica : 9.08.17/2024
MDR - 1081110-73/2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO 3ª MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	Unid	Quant	Memória de Cálculo
1	**ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA**			
1.1	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	mês	1,20	Proporcional a Medição
1.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	mês	1,20	Proporcional a Medição
1.3	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	95,69	Proporcional a Medição
1.4	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	1,49	Proporcional a Medição
2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
2.1	**FECHAMENTO DE OBRA**			
2.2	**LIGAÇÕES PROVISÓRIAS**			
2.3	**LOCAÇÃO DE SERVIÇOS**			
3	**DEMOLIÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHO**			
3.1	**DEMOLIÇÃO PARA EXECUTAR CALÇADAS**			
3.1.1	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	283,87	101,38 m x 2,80 m (Areas de Piso Intertravado Retirados) = **283,87 m²**
3.1.2	RETIRADA PISO PEDRAS IRREGULARES SEM REAPROVEITAMENTO	m²	425,85	141,95 x 3,00 m (Areas de Piso Pedra Retirados) = **425,85 m²**
3.1.3	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	m²	425,85	141,95 x 3,00 m (Areas de Piso Pedra Retirados) = **425,85 m²**
3.1.4	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	m²	283,87	113,54 x 2,50 m (Areas de Piso Cerâmico Retirados) = **283,87 m²**
3.1.5	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	482,28	78,53 x 6,14 m (Areas de Piso Asfaltico Parcialmente Retirados) = **482,28 m²**
3.2	**DEMOLIÇÃO PARA EXECUTAR PAVIMENTO ELEVADO**			
3.2.1	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	561,00	Demolição do Pavimento = 175,00 x 3,20 m = **561,00 m²**
3.3	**DEMOLIÇÃO DE PISO DA PRAÇA E MEIO FIO**			
3.4	**CARGA E TRANSPORTE DE ENUTILO**			
4	**CONSTRUÇÃO**			
4.1	**PISO DAS CALÇADAS**			
4.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	m³	37,74	Área da Calçada x Espessura do Concreto = (1790,32 m² x 0,02 m) = **37,74 m³**
4.1.2	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	1790,32	Área de Calçada = **1790,32 m²**
4.1.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	1790,32	Área de Calçada = **1790,32 m²**
4.2	**PISO DA PRAÇA**			
4.3	**PAVIMENTO ELEVADO**			
4.3.1	COLCHÃO DE AREIA	m³	71,25	337,50 x 0,20 m = **67,50 m²**
4.3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	m	130,07	Ruas Entorno da Praça Elevadas: 65,03 m x 2,00 lados = **130,07 m**
4.3.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.	m²	703,00	78,53 x 6,14 m = **482,17 m²**
4.4	**MEIO FIO E CALHAS**			
4.4.1	CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE CONCRETO PRÉ MOLDADA.	m	92,94	Calhas do Pavimento Elevado: **92,94 m**
4.4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO	m	617,57	Soma das Quantidades Executadas: Ruas ao Entorno da Praça = **617,57 m**
4.5	**CANTEIROS**			
4.6	**ÁREAS PERMEÁVEL**			
4.7	**ACESSIBILIDADE**			
5	**SERVIÇOS DIVERSOS**			
5.1	**EQUIPAMENTOS**			
5.2	**ILUMINAÇÃO**			
5.3	**LIMPEZA FINAL DA OBRA**			

RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES:08855267400

Assinado de forma digital por RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES:08855267400
Dados: 2026.05.11 19:19:28 -03'00'

Grau de Sigilo
PÚBLICO

Ofício n°: 100/2025

Campina Grande-PB, 11 de maio de 2026

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: Solicitação de autorização de desbloqueio de recursos - Medição n° 3
REF: Contrato de Repasse - Operação nº: 1081110-73/2021 - SICONV nº: 923514

Programa: DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO
Objeto: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA

Proponente /
Tomador: MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 3ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	**R$ 728.679,49**	**R$ 311.677,45**	**R$ 673.149,23**
Contrapartida Financeira:	**R$ 50.000,00**	**R$ 21.386,45**	**R$ 46.189,66**
Outros:	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Investimento:	**R$ 778.679,49**	**R$ 333.063,90**	**R$ 719.338,89**
Execução Física:	**-**	**42,77%**	**92,38%**

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.

3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada no SICONV.

4. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

JOAB KLEBER LUCENA MACHADO
MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

Campina Grande-PB, 11 de maio de 2026

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: Relação de Fornecedores - Medição n° 3
REF: Contrato de Repasse - Operação nº: 1081110-73/2021 - SICONV nº: 923514

Programa: DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO
Objeto: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA

Proponente /
Tomador: MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

1. Informamos abaixo a relação de fornecedores para a Solicitação de Recursos referenciada:

CTEF:	**Nome do Fornecedor:**	**CNPJ / CPF:**	**Valor (R$):**
CONTRATO N° 2.08.001/2025	*R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA*	*30.836.850/0001-95*	333.063,90

Atenciosamente,

JOAB KLEBER LUCENA MACHADO
MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA
CNPJ: 30.836.850/0001-95
Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, n° 195, Centro, Ingá – PB
Telefone: (83) 9 9806-7435
E-mail: resengenhariaeconsultoria@outlook.com

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA
CNPJ: 30.836.850/0001-95
Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, n° 195, Centro, Ingá – PB
Telefone: (83) 9 9806-7435
E-mail: resengenhariaeconsultoria@outlook.com









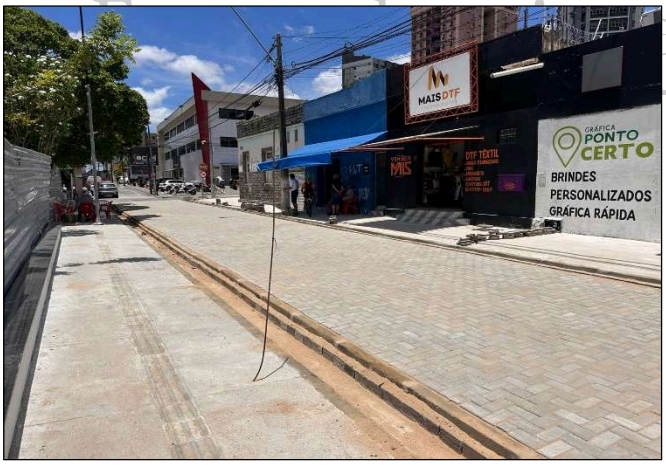



R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA
CNPJ: 30.836.850/0001-95
Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, n° 195, Centro, Ingá – PB
Telefone: (83) 9 9806-7435
E-mail: resengenhariaeconsultoria@outlook.com













R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA
CNPJ: 30.836.850/0001-95
Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, n° 195, Centro, Ingá – PB
Telefone: (83) 9 9806-7435
E-mail: resengenhariaeconsultoria@outlook.com














R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA
CNPJ: 30.836.850/0001-95
Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, n° 195, Centro, Ingá – PB
Telefone: (83) 9 9806-7435
E-mail: resengenhariaeconsultoria@outlook.com





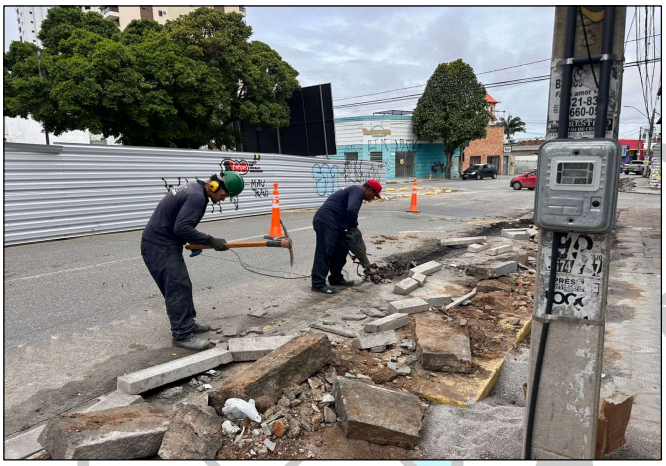







R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA
CNPJ: 30.836.850/0001-95
Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, n° 195, Centro, Ingá – PB
Telefone: (83) 9 9806-7435
E-mail: resengenhariaeconsultoria@outlook.com





RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES:08855267400

Assinado de forma digital por RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES:08855267400
Dados: 2026.05.17 18:45:03 -03'00'

CAIXA

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO
1081110-73/2021	923514	MDR	DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO	DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO	OGU não-PAC

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	VALORES CONTRATADOS (R$)		
MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE	CAMPINA GRANDE / PB	CAMPINA GRANDE/PB			
OBJETO		**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**	**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**
REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA		REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA	960.019,00	50.000,00	1.010.019,00

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:		Medição nº:	3	*Saldo a Reprogramar:*	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
Adiantada	mai-26	25,16%				231.339,51	0,00

Acumulado Anterior: 49,61%

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R$)	Valores Medidos (R$) Acum. Período Anterior	Valores Medidos (R$) No Período	Valores Medidos (R$) Acum. incluindo o Período	Execução Física Acum.
	TOTAL						**Repasse**	**728.679,49**	**361.471,78**	**311.677,45**	**673.149,23**	**92,38%**
							CP. Financ.	**50.000,00**	**24.803,21**	**21.386,45**	**46.189,66**	
							Outros	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							Investimento	**778.679,49**	**386.274,99**	**333.063,90**	**719.338,89**	
1	Meta 1.	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA	Licitado / Em Execução	3.729,38	m²	CONTRATO N° 2.08.001/2025	3	778.679,49	386.274,99	333.063,90	719.338,89	92,38%
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-

Local: Campina Grande-PB

Data: 11 de maio de 2026

Responsável Técnico
Nome: BRENO WESLEY BARBOSA DE SOUZA
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL - FISCAL DO CONTRATO
ART/RRT Fiscal.: PB20210383709

Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: JOAB KLEBER LUCENA MACHADO
Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA
CNPJ: 30.836.850/0001-95
Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, n° 195, Centro, Ingá – PB
Telefone: (83) 9 9806-7435
E-mail: resengenhariaeconsultoria@outlook.com

SOLICITAÇÃO 3° - BOLETIM DE MEDIÇÃO

A empresa **R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI**, CNPJ: 30.836.850/0001-95, sediada na Rua Euclides Magno Bacalhau, n° 195, Centro, Ingá – PB, Cep: 58.380-000, por intermédio do seu representante legal, **RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES**, CPF N° 088.552.674-00, RG N° 8.277.917, residente domiciliado na Rua Euclides Magno Bacalhau, n°195, Centro, Ingá – PB, Cep: 58380-000, infra-assinado, e para fins de requerer o que segue:

• Solicita de Vossa Senhoria **3° BOLETIM DE MEDIÇÃO**, que tem por objeto os serviços referentes a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DAS VIAS E PASSEIOS NO ENTORNO DA PRAÇA CORONEL ANTÔNIO PESSOA, BEM COMO MELHORIAS NA ÁREA INTERNA DA PRAÇA, PRESERVANDO SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS, DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA**, CONTRATO N° 2.08.001/2025/SECOB/PMCG.

Sem mais para o momento, e aguardando o pronto atendimento da solicitação efetuada e o envio das informações respectivas, aproveito o ensejo para renovar protestos de consideração e apreço.

Campina Grande – PB, 18 de maio de 2026

RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES:08855267400

Assinado de forma digital por RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES:08855267400
Dados: 2026.05.17 18:44:31 -03'00'

RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES
RESPONSÁVEL TÉCNICO E ADMINISTRADOR
CPF: 088.552.674/00; RG: 8.277.917/CREA – PB:161821195-1
CNPJ: 30.836.850/0001-95
Telefone: (83) 9 9806-7435
E-MAIL: resengenhariaeconsultoria@outlook.com

Assinado digitalmente por CARLOS NEWTON BELO DE FRANCA COSTA
Papel: Parte
(CPF 133.066.344-68)
Data: 02/07/2026 16:20:08 -03:00

R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA
CNPJ: 30.836.850/0001-95
Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, n° 195, Centro, Ingá – PB
Telefone: (83) 9 9806-7435
E-mail: resengenhariaeconsultoria@outlook.com

SOLICITAÇÃO 3° - BOLETIM DE MEDIÇÃO

A empresa **R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI**, CNPJ: 30.836.850/0001-95, sediada na Rua Euclides Magno Bacalhau, n° 195, Centro, Ingá – PB, Cep: 58.380-000, por intermédio do seu representante legal, **RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES**, CPF N° 088.552.674-00, RG N° 8.277.917, residente domiciliado na Rua Euclides Magno Bacalhau, n°195, Centro, Ingá – PB, Cep: 58380-000, infra-assinado, e para fins de requerer o que segue:

• Solicita de Vossa Senhoria **3° BOLETIM DE MEDIÇÃO**, que tem por objeto os serviços referentes a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DAS VIAS E PASSEIOS NO ENTORNO DA PRAÇA CORONEL ANTÔNIO PESSOA, BEM COMO MELHORIAS NA ÁREA INTERNA DA PRAÇA, PRESERVANDO SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS, DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA**, CONTRATO N° 2.08.001/2025/SECOB/PMCG.

Sem mais para o momento, e aguardando o pronto atendimento da solicitação efetuada e o envio das informações respectivas, aproveito o ensejo para renovar protestos de consideração e apreço.

Campina Grande – PB, 18 de maio de 2026

RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES:08855267400

Assinado de forma digital por RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES:08855267400
Dados: 2026.05.17 18:44:31 -03'00'

RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES
RESPONSÁVEL TÉCNICO E ADMINISTRADOR
CPF: 088.552.674/00; RG: 8.277.917/CREA – PB:161821195-1
CNPJ: 30.836.850/0001-95
Telefone: (83) 9 9806-7435
E-MAIL: resengenhariaeconsultoria@outlook.com

R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.850/0001-95
Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, n° 195, Centro, Ingá – PB
Telefone: (83) 9 9806-7435
E-mail: resengenhariaeconsultoria@outlook.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DAS VIAS E PASSEIOS NO ENTORNO DA PRAÇA CORONEL ANTÔNIO PESSOA, BEM COMO MELHORIAS NA ÁREA INTERNA DA PRAÇA, PRESERVANDO SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS, DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE – PB.
LOCALIDADE: PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA, 111 - CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB, 58400-263
PERIODO DA MEDIÇÃO: 19/12/2025 a 11/05/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL CAMPINA GRANDE - PB
CONTRATADA: R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 30.836.850/0001-95

CONTRATO : 2.08.001/2025
Concorrência Eletrônica : 9.08.17/2024
MDR - 1081110-73/2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO 3ª MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	Unid	Quant	Memória de Cálculo
1	**ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA**			
1.1	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	mês	1,20	Proporcional a Medição
1.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	mês	1,20	Proporcional a Medição
1.3	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	95,69	Proporcional a Medição
1.4	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	1,49	Proporcional a Medição
2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
2.1	**FECHAMENTO DE OBRA**			
2.2	**LIGAÇÕES PROVISÓRIAS**			
2.3	**LOCAÇÃO DE SERVIÇOS**			
3	**DEMOLIÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHO**			
3.1	**DEMOLIÇÃO PARA EXECUTAR CALÇADAS**			
3.1.1	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	283,87	101,38 m x 2,80 m (Areas de Piso Intertravado Retirados) = **283,87 m²**
3.1.2	RETIRADA PISO PEDRAS IRREGULARES SEM REAPROVEITAMENTO	m²	425,85	141,95 x 3,00 m (Areas de Piso Pedra Retirados) = **425,85 m²**
3.1.3	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	m²	425,85	141,95 x 3,00 m (Areas de Piso Pedra Retirados) = **425,85 m²**
3.1.4	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	m²	283,87	113,54 x 2,50 m (Areas de Piso Cerâmico Retirados) = **283,87 m²**
3.1.5	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	482,28	78,53 x 6,14 m (Areas de Piso Asfaltico Parcialmente Retirados) = **482,28 m²**
3.2	**DEMOLIÇÃO PARA EXECUTAR PAVIMENTO ELEVADO**			
3.2.1	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	561,00	Demolição do Pavimento = 175,00 x 3,20 m = **561,00 m²**
3.3	**DEMOLIÇÃO DE PISO DA PRAÇA E MEIO FIO**			
3.4	**CARGA E TRANSPORTE DE ENUTILO**			
4	**CONSTRUÇÃO**			
4.1	**PISO DAS CALÇADAS**			
4.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	m³	37,74	Área da Calçada x Espessura do Concreto = (1790,32 m² x 0,02 m) = **37,74 m³**
4.1.2	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	1790,32	Área de Calçada = **1790,32 m²**
4.1.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	1790,32	Área de Calçada = **1790,32 m²**
4.2	**PISO DA PRAÇA**			
4.3	**PAVIMENTO ELEVADO**			
4.3.1	COLCHÃO DE AREIA	m³	71,25	337,50 x 0,20 m = **67,50 m²**
4.3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	m	130,07	Ruas Entorno da Praça Elevadas: 65,03 m x 2,00 lados = **130,07 m**
4.3.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.	m²	703,00	78,53 x 6,14 m = **482,17 m²**
4.4	**MEIO FIO E CALHAS**			
4.4.1	CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE CONCRETO PRÉ MOLDADA.	m	92,94	Calhas do Pavimento Elevado: **92,94 m**
4.4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO	m	617,57	Soma das Quantidades Executadas: Ruas ao Entorno da Praça = **617,57 m**
4.5	**CANTEIROS**			
4.6	**ÁREAS PERMEÁVEL**			
4.7	**ACESSIBILIDADE**			
5	**SERVIÇOS DIVERSOS**			
5.1	**EQUIPAMENTOS**			
5.2	**ILUMINAÇÃO**			
5.3	**LIMPEZA FINAL DA OBRA**			

RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES:08855267400

Assinado de forma digital por RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES:08855267400
Dados: 2026.05.11 19:19:28 -03'00'

R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.850/0001-95
Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, nº 195, Centro, Ingá - PB
Telefone: (83) 9 9806-7435
E-mail: resengenhariaeconsultoria@outlook.com

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DAS VIAS E PASSEIOS NO ENTORNO DA PRAÇA CORONEL ANTÔNIO PESSOA, BEM COMO MELHORIAS NA ÁREA INTERNA DA PRAÇA, PRESERVANDO SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS, DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE – PB.

LOCALIDADE:	Fonte de Recursos	Contrato:	Concorrência Eletrônica	Valor Contratado	BDI: 22,00	Nº do Boletim	Período de execução	Valor do BM	Valor Acumulado	Percentual Total Executado
PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA, 111 - CENTRO CAMPINA GRANDE - PB, 58400-263	MDR - 1081110-73/2021	2.08.001/2025	9.08.17/2024	R$ 778.679,49		03	19/12/2025 a 11/05/2026	R$ 333.063,90	R$ 719.338,89	92,38%

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL CAMPINA GRANDE - PB
CONTRATADA: R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 30.836.850/0001-95

ART de Execução: PB20250727074 **ART de Fiscalização:** PB20250769528

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PLANILHA CONTRATADA			EVOLUÇÃO FÍSICA			EVOLUÇÃO FINANCEIRA			PERCENTUAL EXECUTADO
				PREÇO UNIT. SEM/BDI	PREÇO UNIT. C/BDI	VALOR TOTAL (R$)	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLU. O PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLU. O PERÍODO	
1	**ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA**					**R$ 52.382,64**				**R$ 14.720,59**	**R$ 20.915,10**	**R$ 46.969,76**	**89,67%**
1.1	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	mês	3,00	R$ 771,00	888,81	R$ 2.666,43	1,49	1,20	2,69	R$ 1.022,13	R$ 1.066,57	R$ 2.390,90	89,67%
1.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,	mês	3,00	R$ 670,06	772,45	R$ 2.317,35	1,49	1,20	2,69	R$ 888,31	R$ 926,94	R$ 2.077,88	89,67%
1.3	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	240,00	R$ 100,32	R$ 122,39	R$ 29.373,60	119,51	95,69	215,20	R$ 5.900,47	R$ 11.711,50	R$ 26.338,33	89,67%
1.4	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	3,00	R$ 4.924,94	R$ 6.008,42	R$ 18.025,26	1,49	1,20	2,69	R$ 6.909,68	R$ 7.210,10	R$ 16.162,65	89,67%
2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 56.742,51**	-		-	**R$ 56.742,51**	**R$ -**	**R$ 56.742,51**	**100,00%**
2.1	**FECHAMENTO DE OBRA**					**R$ 52.544,71**				**R$ 52.544,71**	**R$ -**	**R$ 52.544,71**	**100,00%**
2.1.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	487,74	R$ 78,78	R$ 96,11	R$ 46.876,69	487,74	-	487,74	R$ 46.876,69	R$ -	R$ 46.876,69	100,00%
2.1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	18,00	R$ 258,11	R$ 314,89	R$ 5.668,02	18,00	-	18,00	R$ 5.668,02	R$ -	R$ 5.668,02	100,00%
2.2	**LIGAÇÕES PROVISÓRIAS**					**R$ 2.119,35**				**R$ 2.119,35**	**R$ -**	**R$ 2.119,35**	**100,00%**
2.2.1	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM - REV 03_10/2022	und	1,00	R$ 443,26	R$ 540,77	R$ 540,77	1,00	-	1,00	R$ 540,77	R$ -	R$ 540,77	100,00%
2.2.2	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR	und	1,00	R$ 1.293,92	R$ 1.578,58	R$ 1.578,58	1,00	-	1,00	R$ 1.578,58	R$ -	R$ 1.578,58	100,00%
2.3	**LOCAÇÃO DE SERVIÇOS**					**R$ 2.078,45**				**R$ 2.078,45**	**R$ -**	**R$ 2.078,45**	**100,00%**
2.3.1	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	703,00	R$ 1,18	R$ 1,43	R$ 1.005,29	703,00	-	703,00	R$ 1.005,29	R$ -	R$ 1.005,29	100,00%
2.3.2	LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA	m²	1850,29	R$ 0,48	R$ 0,58	R$ 1.073,16	1.850,29	-	1.850,29	R$ 1.073,16	R$ -	R$ 1.073,16	100,00%
3	**DEMOLIÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHO**					**R$ 85.539,26**				**R$ 43.247,07**	**R$ 42.292,19**	**R$ 85.539,26**	**100,00%**
3.1	**DEMOLIÇÃO PARA EXECUTAR CALÇADAS**					**R$ 30.926,33**				**R$ -**	**R$ 30.926,33**	**R$ 30.926,33**	**100,00%**
3.1.1	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	283,87	R$ 12,91	R$ 15,75	R$ 4.470,95		283,87	283,87	R$ -	R$ 4.470,95	R$ 4.470,95	100,00%
3.1.2	RETIRADA PISO PEDRAS IRREGULARES SEM REAPROVEITAMENTO	m²	425,85	R$ 3,94	R$ 4,80	R$ 2.044,08		425,85	425,85	R$ -	R$ 2.044,08	R$ 2.044,08	100,00%
3.1.3	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	m²	425,85	R$ 20,76	R$ 25,32	R$ 10.782,52		425,85	425,85	R$ -	R$ 10.782,52	R$ 10.782,52	100,00%
3.1.4	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	m²	283,87	R$ 11,14	R$ 13,59	R$ 3.857,79		283,87	283,87	R$ -	R$ 3.857,79	R$ 3.857,79	100,00%
3.1.5	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	482,28	R$ 16,61	R$ 20,26	R$ 9.770,99		482,28	482,28	R$ -	R$ 9.770,99	R$ 9.770,99	100,00%
3.2	**DEMOLIÇÃO PARA EXECUTAR PAVIMENTO ELEVADO**					**R$ 14.242,78**				**R$ 2.876,92**	**R$ 11.365,86**	**R$ 14.242,78**	**100,00%**
3.2.1	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	703,00	R$ 16,61	R$ 20,26	R$ 14.242,78	142,00	561,00	703,00	R$ 2.876,92	R$ 11.365,86	R$ 14.242,78	100,00%
3.3	**DEMOLIÇÃO DE PISO DA PRAÇA E MEIO FIO**					**R$ 28.337,87**				**R$ 28.337,87**	**R$ -**	**R$ 28.337,87**	**100,00%**
3.3.1	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1280,79	R$ 12,91	R$ 15,75	R$ 20.172,44	1.280,79	-	1.280,79	R$ 20.172,44	R$ -	R$ 20.172,44	100,00%
3.3.2	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	m	797,76	R$ 7,93	R$ 9,67	R$ 7.714,33	797,76	-	797,76	R$ 7.714,33	R$ -	R$ 7.714,33	100,00%
3.3.3	REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO SIMPLES (6.00 A 10.00 M) SEM REAPROVEITAMENTO	un	13,00	R$ 28,45	R$ 34,70	R$ 451,10	13,00	-	13,00	R$ 451,10	R$ -	R$ 451,10	100,00%
3.4	**CARGA E TRANSPORTE DE ENUTILO**					**R$ 12.032,28**				**R$ 12.032,28**	**R$ -**	**R$ 12.032,28**	**100,00%**
3.4.1	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	373,21	R$ 7,00	R$ 8,54	R$ 3.187,21	373,21	-	373,21	R$ 3.187,21	R$ -	R$ 3.187,21	100,00%
3.4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³xkm	3732,10	R$ 1,95	R$ 2,37	R$ 8.845,07	3.732,10	-	3.732,10	R$ 8.845,07	R$ -	R$ 8.845,07	100,00%
4	**CONSTRUÇÃO**					**R$ 500.928,38**				**R$ 210.476,20**	**R$ 269.856,60**	**R$ 480.332,80**	**95,90%**
4.1	**PISO DAS CALÇADAS**					**R$ 184.144,62**				**R$ -**	**R$ 184.144,62**	**R$ 184.144,62**	**100,00%**
4.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	m³	37,74	R$ 548,48	R$ 669,15	R$ 25.253,72		37,74	37,74	R$ -	R$ 25.253,72	R$ 25.253,72	100,00%
4.1.2	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	1790,32	R$ 2,41	R$ 2,94	R$ 5.263,54		1.790,32	1.790,32	R$ -	R$ 5.263,54	R$ 5.263,54	100,00%
4.1.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	1790,32	R$ 70,34	R$ 85,81	R$ 153.627,36		1.790,32	1.790,32	R$ -	R$ 153.627,36	R$ 153.627,36	100,00%
4.2	**PISO DA PRAÇA**					**R$ 148.323,18**				**R$ 148.323,18**	**R$ -**	**R$ 148.323,18**	**100,00%**
4.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	m³	38,42	R$ 548,48	R$ 669,15	R$ 25.708,74	38,42	-	38,42	R$ 25.708,74	R$ -	R$ 25.708,74	100,00%
4.2.2	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	1280,79	R$ 2,41	R$ 2,94	R$ 3.765,52	1.280,79	-	1.280,79	R$ 3.765,52	R$ -	R$ 3.765,52	100,00%
4.2.3	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	m³	51,23	R$ 342,61	R$ 417,98	R$ 21.413,12	51,23	-	51,23	R$ 21.413,12	R$ -	R$ 21.413,12	

Assinado por 1 pessoa: CARLOS NEWTON BELO DE FRANCA COSTA
Para verificar as validades das assinaturas, acesse https://validar.iti.gov.br e utilize o código EF04-411F-3599-5550 e informe o código EF04-411F-3599-5550

R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.850/0001-95
Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, nº 195, Centro, Ingá - PB
Telefone: (83) 9 9806-7435
E-mail: resengenhariaeconsultoria@outlook.com

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DAS VIAS E PASSEIOS NO ENTORNO DA PRAÇA CORONEL ANTÔNIO PESSOA, BEM COMO MELHORIAS NA ÁREA INTERNA DA PRAÇA, PRESERVANDO SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS, DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE – PB.

LOCALIDADE: PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA, 111 - CENTRO CAMPINA GRANDE - PB, 58400-263	**Fonte de Recursos**	**Contrato:**	**Concorrência Eletrônica**	**Valor Contratado**	**BDI: 22,00**	**Nº do Boletim**	**Período de execução**	**Valor do BM**	**Valor Acumulado**	**Percentual Total Executado**
	MDR - 1081110-73/2021	2.08.001/2025	9.08.17/2024	R$ 778.679,49		03	19/12/2025 a 11/05/2026	R$ 333.063,90	R$ 719.338,89	92,38%

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL CAMPINA GRANDE - PB
CONTRATADA: R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 30.836.850/0001-95
ART de Execução: PB20250727074 **ART de Fiscalização:** PB20250769528

4.2.4	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, ACAMABENTO LAVADO TIPO FULGET, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS E APLICAÇÃO DO PISO.	m²	450,00	R$	70,06	R$	85,47	R$	38.461,50	450,00	-	450,00	R$	38.461,50	R$	-	R$	38.461,50	100,00%
4.2.5	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, ACAMABENTO LAVADO TIPO FULGET, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS E APLICAÇÃO DO PISO	m²	690,00	R$	70,06	R$	85,47	R$	58.974,30	690,00	-	690,00	R$	58.974,30	R$	-	R$	58.974,30	100,00%
4.3	**PAVIMENTO ELEVADO**							**R$**	**66.355,06**				**R$**	**-**	**R$**	**49.880,32**	**R$**	**49.880,32**	**75,17%**
4.3.1	COLCHÃO DE AREIA	m³	71,25	R$	121,34	R$	148,03	R$	10.547,13		67,50	67,50	R$	-	R$	9.992,03	R$	9.992,03	94,73%
4.3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	m	130,07	R$	32,32	R$	39,43	R$	5.128,66		130,07	130,07	R$	-	R$	5.128,66	R$	5.128,66	100,00%
4.3.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.	m²	703,00	R$	59,09	R$	72,09	R$	50.679,27		482,17	482,17	R$	-	R$	34.759,64	R$	34.759,64	68,60%
4.4	**MEIO FIO E CALHAS**							**R$**	**47.384,65**				**R$**	**11.552,99**	**R$**	**35.831,66**	**R$**	**47.384,65**	**100,00%**
4.4.1	CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE CONCRETO PRÉ MOLDADA.	m	92,94	R$	101,25	R$	123,53	R$	11.480,88		92,94	92,94	R$	-	R$	11.480,88	R$	11.480,88	100,00%
4.4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO	m	910,57	R$	32,32	R$	39,43	R$	35.903,77	293,00	617,57	910,57	R$	11.552,99	R$	24.350,79	R$	35.903,77	100,00%
4.5	**CANTEIROS**							**R$**	**31.874,26**				**R$**	**31.874,26**	**R$**	**-**	**R$**	**31.874,26**	**100,00%**
4.5.1	RESTAURO - EMBOÇO ESPECIAL DE PAREDE, SPESSURA 3CM, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,24:0,74 (CAL, ARENOSO E AREIA MÉDIA)	m²	46,19	R$	36,77	R$	44,86	R$	2.072,08	46,19	-	46,19	R$	2.072,08	R$	-	R$	2.072,08	100,00%
4.5.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	184,77	R$	3,10	R$	3,78	R$	698,43	184,77	-	184,77	R$	698,43	R$	-	R$	698,43	100,00%
4.5.3	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01	m²	184,77	R$	16,17	R$	19,72	R$	3.643,66	184,77	-	184,77	R$	3.643,66	R$	-	R$	3.643,66	100,00%
4.5.4	APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA RISCADA EM CORES DIVERSAS	m²	184,77	R$	40,70	R$	49,65	R$	9.173,83	184,77	-	184,77	R$	9.173,83	R$	-	R$	9.173,83	100,00%
4.5.5	GRANITO VERDE UBATUBA EM PISO	m²	60,51	R$	220,62	R$	269,15	R$	16.286,26	60,51	-	60,51	R$	16.286,26	R$	-	R$	16.286,26	100,00%
4.6	**ÁREAS PERMEÁVEL**							**R$**	**6.587,58**				**R$**	**2.466,73**	**R$**	**-**	**R$**	**2.466,73**	**37,45%**
4.6.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m²	137,91	R$	16,98	R$	20,71	R$	2.856,11		-	-	R$	-	R$	-	R$	-	0,00%
4.6.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	m	56,66	R$	31,09	R$	37,92	R$	2.148,54	56,66	-	56,66	R$	2.148,54	R$	-	R$	2.148,54	100,00%
4.6.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	m	7,88	R$	33,10	R$	40,38	R$	318,19	7,88	-	7,88	R$	318,19	R$	-	R$	318,19	100,00%
4.6.4	ÁRVORE PORTE PEQUENO (MULUNGÚ) - PLANTADA	und	8,00	R$	35,05	R$	42,76	R$	342,08		-	-	R$	-	R$	-	R$	-	0,00%
4.6.5	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	und	2,00	R$	103,76	R$	126,58	R$	253,16		-	-	R$	-	R$	-	R$	-	0,00%
4.6.6	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	und	10,00	R$	54,88	R$	66,95	R$	669,50		-	-	R$	-	R$	-	R$	-	0,00%
4.7	**ACESSIBILIDADE**							**R$**	**16.259,03**				**R$**	**16.259,03**	**R$**	**-**	**R$**	**16.259,03**	**100,00%**
4.7.1	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	107,69	R$	123,76	R$	150,98	R$	16.259,03	107,69	-	107,69	R$	16.259,03	R$	-	R$	16.259,03	100,00%
5	**SERVIÇOS DIVERSOS**							**R$**	**83.086,70**				**R$**	**49.791,23**	**R$**	**-**	**R$**	**49.791,23**	**59,93%**
5.1	**EQUIPAMENTOS**							**R$**	**24.680,60**				**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**0,00%**
5.1.1	FRADE ESFERA EM CONCRETO, 30CM DE DIÂMETRO, COM FCK=25 MPA, PARA PROTEÇÃO DE CALCADAS, INCLUSIVE FURACÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	und	84,00	R$	162,45	R$	198,18	R$	16.647,12		-	-	R$	-	R$	-	R$	-	0,00%
5.1.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	19,20	R$	11,50	R$	14,03	R$	269,37		-	-	R$	-	R$	-	R$	-	0,00%
5.1.3	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	und	3,00	R$	1.082,74	R$	1.320,94	R$	3.962,82		-	-	R$	-	R$	-	R$	-	0,00%
5.1.4	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 M	und	1,00	R$	1.620,34	R$	1.976,81	R$	1.976,81		-	-	R$	-	R$	-	R$	-	0,00%
5.1.5	TUBO AÇO GALVANIZADO D=3" P/BICICLETÁRIO, DIMENSÃO: H=75CM, L=75CM, FIXADO EMBASE DE CONCRETO, PINTADO C/ESMALTE SINTETICO, EXCETO BASE DE CONCRETO E PINTURA DE ACABAMENTO	und	6,00	R$	249,25	R$	304,08	R$	1.824,48		-	-	R$	-	R$	-	R$	-	0,00%
5.2	**ILUMINAÇÃO**							**R$**	**49.791,23**				**R$**	**49.791,23**	**R$**	**-**	**R$**	**49.791,23**	**100,00%**
5.2.1	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	und	4,00	R$	2.363,90	R$	2.883,95	R$	11.535,80	4,00	-	4,00	R$	11.535,80	R$	-	R$	11.535,80	100,00%
5.2.2	LUMINÁRIA EM LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED SMD AUTOVOLT 75 W, 5.000 K, IP-66,IRC 70, FP>0,95, 170LM/W,12.750 LM E 54.000H, COM BASE PARA RELÉ 3 PINOS, MODELO GL421 G-LIGHT OU SIMILAR	und	8,00	R$	767,12	R$	935,88	R$	7.487,04	8,00	-	8,00	R$	7.487,04	R$	-	R$	7.487,04	100,00%
5.2.3	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	und	9,00	R$	2.035,11	R$	2.482,83	R$	22.345,47	9,00	-	9,00	R$	22.345,47	R$	-	R$	22.345,47	100,00%

Assinado por 1 pessoa: CARLOS NEWTON BELO DE FRANCA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/EF04-411F-3599-5550 e informe o código EF04-411F-3599-5550

R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.850/0001-95
Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, nº 195, Centro, Ingá - PB
Telefone: (83) 9 9806-7435
E-mail: resengenhariaeconsultoria@outlook.com

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DAS VIAS E PASSEIOS NO ENTORNO DA PRAÇA CORONEL ANTÔNIO PESSOA, BEM COMO MELHORIAS NA ÁREA INTERNA DA PRAÇA, PRESERVANDO SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS, DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE – PB.

LOCALIDADE: PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA, 111 - CENTRO CAMPINA GRANDE - PB, 58400-263	**Fonte de Recursos**	**Contrato:**	**Concorrência Eletrônica**	**Valor Contratado**	**BDI: 22,00**	**Nº do Boletim**	**Período de execução**	**Valor do BM**	**Valor Acumulado**	**Percentual Total Executado**
	MDR - 1081110-73/2021	2.08.001/2025	9.08.17/2024	R$ 778.679,49		03	19/12/2025 a 11/05/2026	R$ 333.063,90	R$ 719.338,89	92,38%

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL CAMPINA GRANDE - PB
CONTRATADA: R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 30.836.850/0001-95

ART de Execução: PB20250727074 **ART de Fiscalização:** PB20250769528

5.2.4	LUMINÁRIA EM LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED SMD AUTOVOLT 75 W, 5.000 K, IP-66,IRC 70, FP>0,95, 170LM/W,12.750 LM E 54.000H, COM BASE PARA RELÉ 3 PINOS, MODELO GL421 G-LIGHT OU SIMILAR	und	9,00	R$ 767,12	R$ 935,88	R$ 8.422,92	9,00	-	9,00	R$ 8.422,92	R$ -	R$ 8.422,92	100,00%
5.3	**LIMPEZA FINAL DA OBRA**					**R$ 8.614,87**				**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**0,00%**
5.3.1	LIMPEZA GERAL	m²	3729,38	R$ 1,89	R$ 2,31	R$ 8.614,87		-	-	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%

TOTAL CONTRATADO	**R$ 778.679,49**	**EVOLUÇAO FINANCEIRA DO BM 03**	**R$ 386.274,99**	**R$ 333.063,90**	**R$ 719.338,89**	**92,38%**

BM 01	**R$ 159.966,55**	**CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS**
BM 02	**R$ 226.308,44**	**DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS**
BM 03	**R$ 333.063,90**	**TREZENTOS E TRINTA E TRES MIL SESSENTA E TRES REAIS E NOVENTA CENTAVOS**

RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES:08855267400

Assinado de forma digital por RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES:08855267400
Dados: 2026.05.11 19:19:14 -03'00'

Assinado por 1 pessoa: CARLOS NEWTON BELO DE FRANCA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/EF04-41F-3599-5550 e informe o código EF04-41F-3599-5550

R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ: 30.836.850/0001-95
Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, n° 195, Centro, Ingá – PB
Telefone: (83) 9 9806-7435
E-mail: resengenhariaeconsultoria@outlook.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DAS VIAS E PASSEIOS NO ENTORNO DA PRAÇA CORONEL ANTÔNIO PESSOA, BEM COMO MELHORIAS NA ÁREA INTERNA DA PRAÇA, PRESERVANDO SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS, DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE – PB.
LOCALIDADE: PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA, 111 - CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB, 58400-263
PERIODO DA MEDIÇÃO: 19/12/2025 a 11/05/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL CAMPINA GRANDE - PB
CONTRATADA: R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 30.836.850/0001-95

CONTRATO : 2.08.001/2025
Concorrência Eletrônica : 9.08.17/2024
MDR - 1081110-73/2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO 3ª MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	Unid	Quant	Memória de Cálculo
1	**ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA**			
1.1	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	mês	1,20	Proporcional a Medição
1.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	mês	1,20	Proporcional a Medição
1.3	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	95,69	Proporcional a Medição
1.4	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	1,49	Proporcional a Medição
2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
2.1	**FECHAMENTO DE OBRA**			
2.2	**LIGAÇÕES PROVISÓRIAS**			
2.3	**LOCAÇÃO DE SERVIÇOS**			
3	**DEMOLIÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHO**			
3.1	**DEMOLIÇÃO PARA EXECUTAR CALÇADAS**			
3.1.1	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	283,87	101,38 m x 2,80 m (Areas de Piso Intertravado Retirados) = **283,87 m²**
3.1.2	RETIRADA PISO PEDRAS IRREGULARES SEM REAPROVEITAMENTO	m²	425,85	141,95 x 3,00 m (Areas de Piso Pedra Retirados) = **425,85 m²**
3.1.3	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	m²	425,85	141,95 x 3,00 m (Areas de Piso Pedra Retirados) = **425,85 m²**
3.1.4	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	m²	283,87	113,54 x 2,50 m (Areas de Piso Cerâmico Retirados) = **283,87 m²**
3.1.5	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	482,28	78,53 x 6,14 m (Areas de Piso Asfaltico Parcialmente Retirados) = **482,28 m²**
3.2	**DEMOLIÇÃO PARA EXECUTAR PAVIMENTO ELEVADO**			
3.2.1	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	561,00	Demolição do Pavimento = 175,00 x 3,20 m = **561,00 m²**
3.3	**DEMOLIÇÃO DE PISO DA PRAÇA E MEIO FIO**			
3.4	**CARGA E TRANSPORTE DE ENUTILO**			
4	**CONSTRUÇÃO**			
4.1	**PISO DAS CALÇADAS**			
4.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	m³	37,74	Área da Calçada x Espessura do Concreto = (1790,32 m² x 0,02 m) = **37,74 m³**
4.1.2	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	1790,32	Área de Calçada = **1790,32 m²**
4.1.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	1790,32	Área de Calçada = **1790,32 m²**
4.2	**PISO DA PRAÇA**			
4.3	**PAVIMENTO ELEVADO**			
4.3.1	COLCHÃO DE AREIA	m³	71,25	337,50 x 0,20 m = **67,50 m²**
4.3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	m	130,07	Ruas Entorno da Praça Elevadas: 65,03 m x 2,00 lados = **130,07 m**
4.3.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.	m²	703,00	78,53 x 6,14 m = **482,17 m²**
4.4	**MEIO FIO E CALHAS**			
4.4.1	CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE CONCRETO PRÉ MOLDADA.	m	92,94	Calhas do Pavimento Elevado: **92,94 m**
4.4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO	m	617,57	Soma das Quantidades Executadas: Ruas ao Entorno da Praça = **617,57 m**
4.5	**CANTEIROS**			
4.6	**ÁREAS PERMEÁVEL**			
4.7	**ACESSIBILIDADE**			
5	**SERVIÇOS DIVERSOS**			
5.1	**EQUIPAMENTOS**			
5.2	**ILUMINAÇÃO**			
5.3	**LIMPEZA FINAL DA OBRA**			

RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES:08855267400

Assinado de forma digital por RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES:08855267400
Dados: 2026.05.11 19:19:28 -03'00'

Assinado por 1 pessoa: CARLOS NEWTON BELO DE FRANCA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/EF04-411F-3599-5550 e informe o código EF04-411F-3599-5550

Grau de Sigilo
PÚBLICO

Ofício n°: 100/2025

Campina Grande-PB, 11 de maio de 2026

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: Solicitação de autorização de desbloqueio de recursos - Medição n° 3
REF: Contrato de Repasse - Operação nº: 1081110-73/2021 - SICONV nº: 923514

Programa: DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO
Objeto: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA

Proponente / Tomador: MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 3ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	**R$ 728.679,49**	**R$ 311.677,45**	**R$ 673.149,23**
Contrapartida Financeira:	**R$ 50.000,00**	**R$ 21.386,45**	**R$ 46.189,66**
Outros:	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Investimento:	**R$ 778.679,49**	**R$ 333.063,90**	**R$ 719.338,89**
Execução Física:	**-**	**42,77%**	**92,38%**

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.

3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada no SICONV.

4. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

JOAB KLEBER LUCENA MACHADO
MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

Assinado por 1 pessoa: CARLOS NEWTON BELO DE FRANCA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/EF04-411F-3599-5550 e informe o código EF04-411F-3599-5550

Campina Grande-PB, 11 de maio de 2026

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: Relação de Fornecedores - Medição n° 3
REF: Contrato de Repasse - Operação nº: 1081110-73/2021 - SICONV nº: 923514

Programa: DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO
Objeto: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA

Proponente / Tomador: MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

1. Informamos abaixo a relação de fornecedores para a Solicitação de Recursos referenciada:

CTEF:	Nome do Fornecedor:	CNPJ / CPF:	Valor (R$):
CONTRATO N° 2.08.001/2025	*R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA*	*30.836.850/0001-95*	333.063,90

Atenciosamente,

JOAB KLEBER LUCENA MACHADO
MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

Assinado por 1 pessoa: CARLOS NEWTON BELO DE FRANCA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/EF04-411F-3599-5550 e informe o código EF04-411F-3599-5550

R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA
CNPJ: 30.836.850/0001-95
Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, n° 195, Centro, Ingá – PB
Telefone: (83) 9 9806-7435
E-mail: resengenhariaeconsultoria@outlook.com

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Assinado por 1 pessoa: CARLOS NEWTON BELO DE FRANCA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/EF04-411F-3599-5550 e informe o código EF04-411F-3599-5550


R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA
CNPJ: 30.836.850/0001-95
Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, n° 195, Centro, Ingá – PB
Telefone: (83) 9 9806-7435
E-mail: resengenhariaeconsultoria@outlook.com









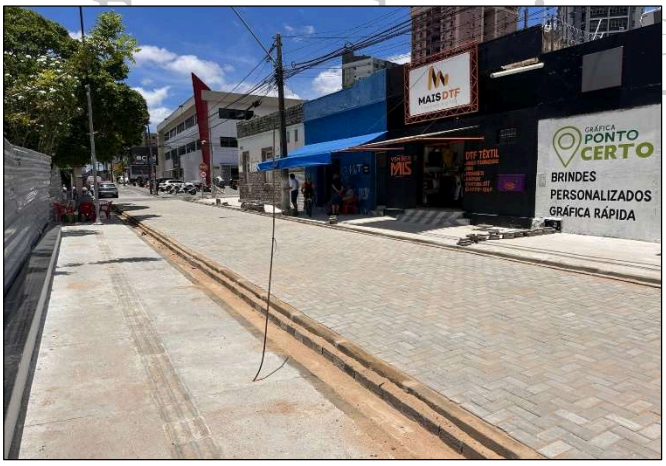



Assinado por 1 pessoa: CARLOS NEWTON BELO DE FRANCA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/EF04-411F-3599-5550 e informe o código EF04-411F-3599-5550

R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA
CNPJ: 30.836.850/0001-95
Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, n° 195, Centro, Ingá – PB
Telefone: (83) 9 9806-7435
E-mail: resengenhariaeconsultoria@outlook.com













Assinado por 1 pessoa: CARLOS NEWTON BELO DE FRANCA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/EF04-411F-3599-5550 e informe o código EF04-411F-3599-5550

R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA
CNPJ: 30.836.850/0001-95
Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, n° 195, Centro, Ingá – PB
Telefone: (83) 9 9806-7435
E-mail: resengenhariaeconsultoria@outlook.com














Assinado por 1 pessoa: CARLOS NEWTON BELO DE FRANCA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/EF04-411F-3599-5550 e informe o código EF04-411F-3599-5550

R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA
CNPJ: 30.836.850/0001-95
Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, n° 195, Centro, Ingá – PB
Telefone: (83) 9 9806-7435
E-mail: resengenhariaeconsultoria@outlook.com



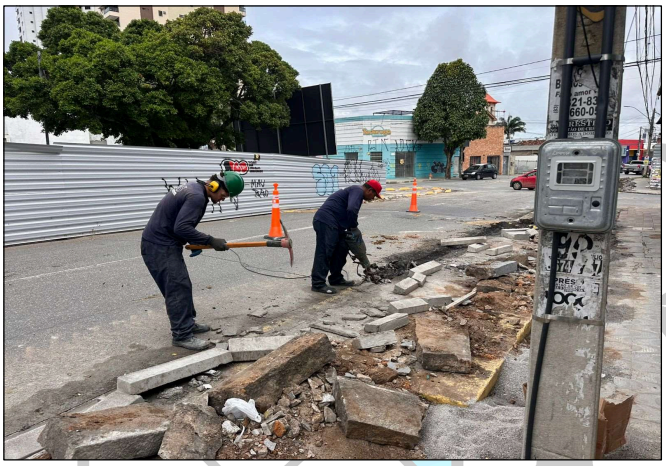




Assinado por 1 pessoa: CARLOS NEWTON BELO DE FRANCA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/EF04-411F-3599-5550 e informe o código EF04-411F-3599-5550

R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA
CNPJ: 30.836.850/0001-95
Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, n° 195, Centro, Ingá – PB
Telefone: (83) 9 9806-7435
E-mail: resengenhariaeconsultoria@outlook.com





RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES:08855267400

Assinado de forma digital por RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES:08855267400
Dados: 2026.05.17 18:45:03 -03'00'

Assinado por 1 pessoa: CARLOS NEWTON BELO DE FRANCA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/EF04-411F-3599-5550 e informe o código EF04-411F-3599-5550

CAIXA

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO
1081110-73/2021	923514	MDR	DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO	DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO	OGU não-PAC

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	VALORES CONTRATADOS (R$)		
MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE	CAMPINA GRANDE / PB	CAMPINA GRANDE/PB	REPASSE	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO
OBJETO		**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**			
REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA		REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA	960.019,00	50.000,00	1.010.019,00

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:		Medição nº:	3	*Saldo a Reprogramar:*	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
Adiantada	mai-26	25,16%				231.339,51	0,00

Acumulado Anterior: 49,61%

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R$)	Valores Medidos (R$) Acum. Período Anterior	Valores Medidos (R$) No Período	Valores Medidos (R$) Acum. incluindo o Período	Execução Física Acum.
	TOTAL						Repasse	728.679,49	361.471,78	311.677,45	673.149,23	**92,38%**
							CP. Financ.	50.000,00	24.803,21	21.386,45	46.189,66	
							Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Investimento	778.679,49	386.274,99	333.063,90	719.338,89	
1	Meta 1.	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA	Licitado / Em Execução	3.729,38	m²	CONTRATO N° 2.08.001/2025	3	778.679,49	386.274,99	333.063,90	719.338,89	92,38%
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-

Local: Campina Grande-PB

Data: 11 de maio de 2026

Responsável Técnico
Nome: BRENO WESLEY BARBOSA DE SOUZA
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL - FISCAL DO CONTRATO
ART/RRT Fiscal.: PB20210383709

Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: JOAB KLEBER LUCENA MACHADO
Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

Assinado por 1 pessoa: CARLOS NEWTON BELO DE FRANCA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/EF04-411F-3599-5550 e informe o código EF04-411F-3599-5550

R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA
CNPJ: 30.836.850/0001-95
Endereço: Rua Euclides Magno Bacalhau, n° 195, Centro, Ingá – PB
Telefone: (83) 9 9806-7435
E-mail: resengenhariaeconsultoria@outlook.com

SOLICITAÇÃO 3° - BOLETIM DE MEDIÇÃO

A empresa **R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI**, CNPJ: 30.836.850/0001-95, sediada na Rua Euclides Magno Bacalhau, n° 195, Centro, Ingá – PB, Cep: 58.380-000, por intermédio do seu representante legal, **RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES**, CPF N° 088.552.674-00, RG N° 8.277.917, residente domiciliado na Rua Euclides Magno Bacalhau, n°195, Centro, Ingá – PB, Cep: 58380-000, infra-assinado, e para fins de requerer o que segue:

• Solicita de Vossa Senhoria **3° BOLETIM DE MEDIÇÃO**, que tem por objeto os serviços referentes a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DAS VIAS E PASSEIOS NO ENTORNO DA PRAÇA CORONEL ANTÔNIO PESSOA, BEM COMO MELHORIAS NA ÁREA INTERNA DA PRAÇA, PRESERVANDO SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS, DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA**, CONTRATO N° 2.08.001/2025/SECOB/PMCG.

Sem mais para o momento, e aguardando o pronto atendimento da solicitação efetuada e o envio das informações respectivas, aproveito o ensejo para renovar protestos de consideração e apreço.

Campina Grande – PB, 18 de maio de 2026

RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES:08855267400

Assinado de forma digital por RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES:08855267400
Dados: 2026.05.17 18:44:31 -03'00'

RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES
RESPONSÁVEL TÉCNICO E ADMINISTRADOR
CPF: 088.552.674/00; RG: 8.277.917/CREA – PB:161821195-1
CNPJ: 30.836.850/0001-95
Telefone: (83) 9 9806-7435
E-MAIL: resengenhariaeconsultoria@outlook.com

Assinado por 1 pessoa: CARLOS NEWTON BELO DE FRANCA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/EF04-411F-3599-5550 e informe o código EF04-411F-3599-5550

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: EF04-411F-3599-5550

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

CARLOS NEWTON BELO DE FRANCA COSTA (CPF 133.XXX.XXX-68) em 02/07/2026 16:20:08 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/EF04-411F-3599-5550

Grau de Sigilo
PÚBLICO

Ofício n°: 100/2025

Campina Grande-PB, 11 de maio de 2026

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: Solicitação de autorização de desbloqueio de recursos - Medição n° 3
REF: Contrato de Repasse - Operação nº: 1081110-73/2021 - SICONV nº: 923514

Programa: DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO
Objeto: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA

Proponente /
Tomador: MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 3ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	**R$ 728.679,49**	**R$ 311.677,45**	**R$ 673.149,23**
Contrapartida Financeira:	**R$ 50.000,00**	**R$ 21.386,45**	**R$ 46.189,66**
Outros:	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Investimento:	**R$ 778.679,49**	**R$ 333.063,90**	**R$ 719.338,89**
Execução Física:	**-**	**42,77%**	**92,38%**

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.

3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada no SICONV.

4. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

JOAB KLEBER LUCENA MACHADO
MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

Campina Grande-PB, 11 de maio de 2026

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: Relação de Fornecedores - Medição n° 3
REF: Contrato de Repasse - Operação nº: 1081110-73/2021 - SICONV nº: 923514

Programa: DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO
Objeto: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA

Proponente /
Tomador: MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

1. Informamos abaixo a relação de fornecedores para a Solicitação de Recursos referenciada:

CTEF:	**Nome do Fornecedor:**	**CNPJ / CPF:**	**Valor (R$):**
CONTRATO N° 2.08.001/2025	*R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA*	*30.836.850/0001-95*	333.063,90

Atenciosamente,

JOAB KLEBER LUCENA MACHADO
MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

CAIXA

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO
1081110-73/2021	923514	MDR	DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO	DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO	OGU não-PAC

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	VALORES CONTRATADOS (R$)		
MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE	CAMPINA GRANDE / PB	CAMPINA GRANDE/PB			
OBJETO		**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**	**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**
REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA		REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA	960.019,00	50.000,00	1.010.019,00

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:		Medição nº:	3	*Saldo a Reprogramar:*	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
Adiantada	mai-26	25,16%				231.339,51	0,00

Acumulado Anterior: 49,61%

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R$)	Valores Medidos (R$) Acum. Período Anterior	Valores Medidos (R$) No Período	Valores Medidos (R$) Acum. incluindo o Período	Execução Física Acum.
	TOTAL						**Repasse**	**728.679,49**	**361.471,78**	**311.677,45**	**673.149,23**	**92,38%**
							CP. Financ.	**50.000,00**	**24.803,21**	**21.386,45**	**46.189,66**	
							Outros	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							Investimento	**778.679,49**	**386.274,99**	**333.063,90**	**719.338,89**	
1	Meta 1.	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CEL. ANTÔNIO PESSOA	Licitado / Em Execução	3.729,38	m²	CONTRATO N° 2.08.001/2025	3	778.679,49	386.274,99	333.063,90	719.338,89	92,38%
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-

Local: Campina Grande-PB

Data: 11 de maio de 2026

Responsável Técnico
Nome: BRENO WESLEY BARBOSA DE SOUZA
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL - FISCAL DO CONTRATO
ART/RRT Fiscal.: PB20210383709

Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: JOAB KLEBER LUCENA MACHADO
Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

CE GIGOV/JP 6189/2026 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB - CR MCIDADES 923514 - Operação 1081110-73 - Pendências para Desbloqueio

De GIGOVJP12 - Protocolo e Comunicações <gigovjp12@caixa.gov.br>
Para Geraldo Ismael Lacerda <geraldo.i.lacerda@caixa.gov.br>, brunoclimab@gmail.com <brunoclimab@gmail.com>, felipemottagadelha@gmail.com <felipemottagadelha@gmail.com>, joabmachado@gmail.com <joabmachado@gmail.com>, jbstiago2@gmail.com <jbstiago2@gmail.com>, joaobatistasantiago@hotmail.com <joaobatistasantiago@hotmail.com>, coordgestaopmcg@gmail.com <coordgestaopmcg@gmail.com>, marianadamascenoarq@gmail.com <marianadamascenoarq@gmail.com>, contato@consultoriaum.com.br <contato@consultoriaum.com.br>, mohana.seplancg@gmail.com <mohana.seplancg@gmail.com>, 9 mais...
Cópia GIGOVJP10 - Região Cariri <gigovjp10@caixa.gov.br>
Data 10/07/2026 13:18

E-mail classificado como #PUBLICO

A(Ao)
MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB

Assunto: **Pendências para Desbloqueio**
Ref.: **CR MCIDADES 923514 - Operação 1081110-73**

Sr.(a) Convenente,

1. Informamos resultado da análise da medição do contrato em referência, no valor de R$ 333.063,92, na seguinte composição:

Valor total: R$ 333.063,92

Repasse: R$ 316.575,92

Contrapartida: R$ 16.488,00

1.1 Dados do desbloqueio.

Beneficiário(s): - R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 30.836.850/0001-95 - Valor: R$ 333.063,92

Ordem desbloq.: Intermediário - Parcela nº 3

Instrum. desbloq.: RRE 3

Evolução: 71.22%

2. Para que possamos autorizar o saque dos valores informados é necessário o cumprimento das(os) seguintes pendências/apontamentos:
- Gerar o Relatório de Execução "Documentos de Liquidação incluídos".
- Depositar a contrapartida referente a parcela a ser desbloqueada, realizando a respectiva classificação no TransfereGov.
- Inserir documentação fiscal e tributária, se for o caso, referente a presente medição na aba Documentos de Liquidação, gerando respectivo Relatório de Execução.

3. Ficamos no aguardo para prosseguimento do processo, ficando à disposição para eventuais esclarecimentos, se necessários.

Atenciosamente,

GIRLENE DA SILVA GOMES
Assistente Júnior
Gerência Executiva de Governo João Pessoa/PB

ANA CRISTINA PINHO TROCOLI
Coordenadora de Filial
Gerência Executiva de Governo João Pessoa/PB

RONILSON BARBOSA DIAS
Gerente de Filial
Gerência Executiva de Governo João Pessoa/PB
