PREFEITURA CAMPINA GRANDE

Protocolo Secretaria de Obras 14.025/2026

De: ARTHUR PEREIRA DE ALMEIDA

Para: SECOB - MC

Data: 12/02/2026 às 10:35:47

Setores (CC):

SECOB - PROTOCOLO, SECOB - MC

Setores envolvidos:

SECOB - PROTOCOLO, SECOB - MC

Medição de Contratos sem Convênio

Nome da Empresa*:
CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE

CNPJ*:
09323098000192

Número do contrato*:
2.08.018/2025

Número da Medição*:
4

Valor da Medição*:
R$ 546.379,42

Período da Medição*:
01/01/2026 A 31/01/2026

Prezados, boa tarde,

Segue 4ª medição do Canal do Prado, para assinatura.

Atenciosamente,

Arthur Pereira de Almeida

Anexos:

Assinado por 5 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE SOARES PINTO, GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, RUI BARBOSA e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/E19D-FE7F-6DA6-DC6D e informe o código E19D-FE7F-6DA6-DC6D

CE_009_2026_4_MED_CONTRATO_2_08_018_2025.pdf
REV00_EDI_CRONOGRAMA_CANAL_DO_PRADO_MED4_.pdf
REV00_EDI_RELATORIO_FOTO_MED4_.pdf
REV01_DOC_DIARIO_DE_OBRAS_MED4_.pdf
REV04_EDI_CANAL_DO_PRADO_MED4__APROVADA_.pdf
REV04_EDI_CANAL_DO_PRADO_MED4__APROVADA_.xlsx
REV04_EDI_CANAL_DO_PRADO_MED4__APROVADA_MEMORIA.pdf

Assinado por 5 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE SOARES PINTO, GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, RUI BARBOSA e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/E19D-FE7F-6DA6-DC6D e informe o código E19D-FE7F-6DA6-DC6D

Nº: CE/009/2026

Campina Grande, 12 de fevereiro de 2026.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB
Secretaria Municipal de Obras

Att.: **Dr. JOAB KLEBER LUCENA MACHADO**
Secretário Municipal de Obras

Ref.: CONCORRÊNCIA N° 9.08.02/2025

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CANALIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL DO PRADO E ÁREAS CIRCUNVIZINHAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB**.

Assunto: ENCAMINHAMENTO – 04ª MEDIÇÃO

Prezado Secretário;

A CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE Ltda, sediada na Rua Álvaro de Araújo Pereira, 255, Jardim Tavares, 58.402-300, vem a solicitar o pagamento da **medição nº 04**, referente ao ***período de 01/01/2026 a 31/01/2026***, no valor de ***R$ 546.379,42 (Quinhentos e quarenta e seis mil, trezentos e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos),*** objeto do contrato nº 2.08.018/2025, firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, para a EXECUÇÃO DE OBRA DE CANALIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL DO PRADO E ÁREAS CIRCUNVIZINHAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.

Confiando na providência de V.Sa., renovamos nossos votos de elevada estima e consideração e subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Arthur Pereira de Almeida
Adm. Contratual

Documento de propriedade da Construtora Rocha Cavalcante LTDA., sendo proibida a reprodução parcial ou total sem autorização prévia, sob penalidades legais.

Assinado por 5 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE SOARES PINTO, GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, RUI BARBOSA e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/E19D-FE7F-6DA6-DC6D e informe o código E19D-FE7F-6DA6-DC6D

Obra: Canal do Prado
Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO	R$ 1.250.014,56	1,42%	1,83%	4,03%	1,50%	9,12%	9,12%	9,12%	9,12%	9,12%	9,12%	9,12%	9,12%	9,12%	9,12%
			R$ 17.763,78	R$ 22.928,62	R$ 50.412,02	R$ 18.745,55	R$ 114.016,46	R$ 114.016,46	R$ 114.016,46	R$ 114.016,46	R$ 114.016,46	R$ 114.016,46	R$ 114.016,46	R$ 114.016,46	R$ 114.016,46	R$ 114.016,46
2	INSTALAÇÕES E CANTEIRO DE OBRAS	R$ 192.835,68		1,46%	71,44%	1,46%	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%
				R$ 2.815,59	R$ 137.758,89	R$ 2.815,59	R$ 4.944,56	R$ 4.944,56	R$ 4.944,56	R$ 4.944,56	R$ 4.944,56	R$ 4.944,56	R$ 4.944,56	R$ 4.944,56	R$ 4.944,56	R$ 4.944,56
3	LIMPEZA E DEMOLIÇÕES	R$ 1.543.155,60	30,90%	46,47%			22,64%									
			R$ 476.774,71	R$ 717.040,50			R$ 349.340,39									
4	CANAL PRINCIPAL	R$ 15.669.078,82			1,10%	3,35%	15,92%	15,92%	15,92%	15,92%	15,92%	15,92%				
					R$ 172.874,01	R$ 524.818,28	R$ 2.495.231,09	R$ 2.495.231,09	R$ 2.495.231,09	R$ 2.495.231,09	R$ 2.495.231,09	R$ 2.495.231,09				
5	VIAS PROJETADAS	R$ 10.859.875,41			2,95%			10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	7,05%	
					R$ 320.085,06			R$ 1.085.987,54	R$ 1.085.987,54	R$ 1.085.987,54	R$ 1.628.981,31	R$ 1.628.981,31	R$ 1.628.981,31	R$ 1.628.981,31	R$ 765.902,48	
6	DRENAGEM	R$ 740.086,88						15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%			
								R$ 111.013,03	R$ 111.013,03	R$ 111.013,03	R$ 111.013,03	R$ 148.017,38	R$ 148.017,38			
7	PONTE E PASSARELAS	R$ 513.615,08								40,00%	40,00%	20,00%				
										R$ 205.446,03	R$ 205.446,03	R$ 102.723,02				
8	PAVIMENTAÇÃO	R$ 4.423.261,92									20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
											R$ 884.652,38	R$ 884.652,38	R$ 884.652,38	R$ 884.652,38	R$ 884.652,38	
9	CALÇADAS, CICLOVIAS E ÁREAS VERDES	R$ 2.343.448,54								15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	
										R$ 351.517,28	R$ 351.517,28	R$ 351.517,28	R$ 351.517,28	R$ 468.689,71	R$ 468.689,71	
10	ILUMINAÇÃO PUBLICA	R$ 1.019.169,82										10,00%	15,00%	20,00%	45,00%	10,00%
												R$ 101.916,98	R$ 152.875,47	R$ 203.833,96	R$ 458.626,42	R$ 101.916,98
	Porcentagem		1,28%	1,93%	1,77%	1,42%	7,69%	9,89%	9,89%	11,33%	15,03%	15,13%	8,52%	8,57%	6,99%	0,57%
	Custo		R$ 494.538,49	R$ 742.784,72	R$ 681.129,98	R$ 546.379,42	R$ 2.963.532,50	R$ 3.811.192,68	R$ 3.811.192,68	R$ 4.368.155,99	R$ 5.795.802,15	R$ 5.832.000,46	R$ 3.285.004,85	R$ 3.305.118,39	R$ 2.696.832,01	R$ 220.878,00
	Porcentagem Acumulado		1,28%	3,21%	4,98%	6,39%	14,08%	23,96%	33,85%	45,18%	60,21%	75,34%	83,86%	92,43%	99,43%	100,00%
	Custo Acumulado		R$ 494.538,49	R$ 1.237.323,20	R$ 1.918.453,18	R$ 2.464.832,60	R$ 5.428.365,10	R$ 9.239.557,78	R$ 13.050.750,46	R$ 17.418.906,46	R$ 23.214.708,61	R$ 29.046.709,06	R$ 32.331.713,91	R$ 35.636.832,30	R$ 38.333.664,31	R$ 38.554.542,31

Assinado por 5 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE SOARES PINTO, GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, RUI BARBOSA e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/E19D-FE7F-6DA6-DC6D e informe o código E19D-FE7F-6DA6-DC6D

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: **CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA**

CONTRATO: **N.º: 2.08.018/2025** MEDIÇÃO: **4ª**

PERÍODO LÍQUIDO: **01/01/2026 A 31/01/2026**

FOTO 01	
	
TRECHO	**CANAL DO PRADO**

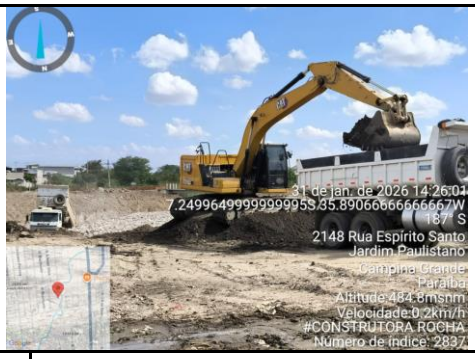
FOTO 02	
	
TRECHO	**CANAL DO PRADO**

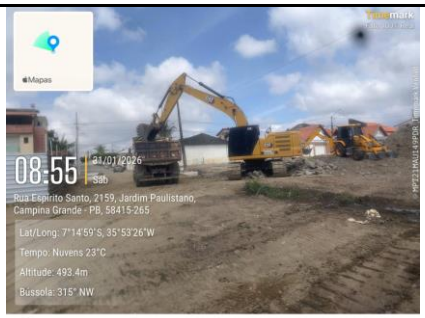
FOTO 03	
	
TRECHO	**CANAL DO PRADO**

FOTO 04	
	
TRECHO	**CANAL DO PRADO**

FOTO 05	
	
TRECHO	**CANAL DO PRADO**

FOTO 06	
	
TRECHO	**CANAL DO PRADO**

Assinado por 5 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE SOARES PINTO, GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, RUI BARBOSA e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/E19D-FE7F-6DA6-DC6D e informe o código E19D-FE7F-6DA6-DC6D

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: **CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA**

CONTRATO: **N.º: 2.08.018/2025** MEDIÇÃO: **4ª**

PERÍODO LÍQUIDO: **01/12/2025 A 31/12/2025**

FOTO 07	
	
TRECHO	**CANAL DO PRADO**

FOTO 08	
	
TRECHO	**CANAL DO PRADO**

FOTO 09	
	
TRECHO	**CANAL DO PRADO**

FOTO 10	
	
TRECHO	**CANAL DO PRADO**

FOTO 11	
	
TRECHO	**CANAL DO PRADO**

FOTO 12	
	
TRECHO	**CANAL DO PRADO**

Assinado por 5 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE SOARES PINTO, GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, RUI BARBOSA e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/E19D-FE7F-6DA6-DC6D e informe o código E19D-FE7F-6DA6-DC6D

GRUPO ROCHA CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório n°	**71**	**Data do relatório**	**05/01/2026**	**Dia da semana**	Segunda-Feira
Obra	**CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025**				

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (23)

Auxiliar de Topografia **1**	Engenheiro **1**	Operador de Equipamentos **1**	Topógrafo **1**	Assistente Financeiro **1**	Encarregado Geral **1**	*Mão de Obra Própria* ***(22)***
Servente **7**	Pedreiro **2**	Apropriador **1**	Técnico de Segurança do Trabalho **1**	Auxiliar de Engenharia **1**	Motorista de Veículo Pesado **1**	
Almoxarife **1**	Carpinteiro **2**					
Motorista **1**						*Terceiros* ***(1)***


Equipamentos (4)

Escavadeira **1**	Caminhão Basculante **3**				

Atividades (3)

Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Execução de escavação horizontal de material de primeira categoria.	Em Andamento
Execução do Canteiro de Obras	Em Andamento

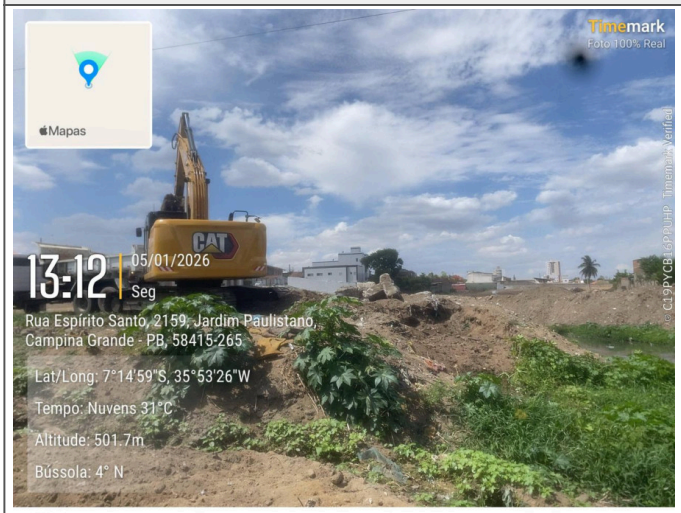Fotos (3)





Assinado por 5 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE SOARES PINTO, GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, RUI BARBOSA e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/E19D-FE7F-6DA6-DC6D e informe o código E19D-FE7F-6DA6-DC6D



Assinatura

PEDRO SAULO DO NASCIMENTO PEREIRA:09677262475

Assinado de forma digital por PEDRO SAULO DO NASCIMENTO PEREIRA:09677262475
Dados: 2026.02.12 09:46:56 -03'00'

Assinatura

Assinado por 5 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE SOARES PINTO, GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, RUI BARBOSA e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/E19D-FE7F-6DA6-DC6D e informe o código E19D-FE7F-6DA6-DC6D

Aprovado

GRUPO ROCHA CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório n°	**72**	**Data do relatório**	**06/01/2026**	**Dia da semana**	Terça-Feira
Obra	**CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025**				

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (23)

Auxiliar de Topografia **1**	Engenheiro **1**	Operador de Equipamentos **1**	Topógrafo **1**	Assistente Financeiro **1**	Encarregado Geral **1**	*Mão de Obra Própria* ***(22)***
Servente **7**	Pedreiro **2**	Apropriador **1**	Técnico de Segurança do Trabalho **1**	Auxiliar de Engenharia **1**	Motorista de Veículo Pesado **1**	
Almoxarife **1**	Carpinteiro **2**					
Motorista **1**						*Terceiros* ***(1)***

Equipamentos (4)

Escavadeira **1**	Caminhão Basculante **3**				

Atividades (3)

Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Execução de escavação horizontal de material de primeira categoria.	Em Andamento
Execução do Canteiro de Obras	Em Andamento

Fotos (2)





Assinatura

PEDRO SAULO DO NASCIMENTO PEREIRA:09677262475

Assinado de forma digital por PEDRO SAULO DO NASCIMENTO PEREIRA:09677262475
Dados: 2026.02.12 09:47:20 -03'00'

Assinatura

Criado por: José Giovanni (12/01/2026 10:49)
Última modificação: Luiz Henrique (19/01/2026 07:41)

Assinado por 5 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE SOARES PINTO, GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, RUI BARBOSA e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/E19D-FE7F-6DA6-DC6D e informe o código E19D-FE7F-6DA6-DC6D

Aprovado

GRUPO ROCHA CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório n°	**73**	**Data do relatório**	**07/01/2026**	**Dia da semana**	Quarta-Feira
Obra	**CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025**				

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (23)

Auxiliar de Topografia **1**	Engenheiro **1**	Operador de Equipamentos **1**	Topógrafo **1**	Assistente Financeiro **1**	Encarregado Geral **1**	*Mão de Obra Própria* ***(22)***
Servente **7**	Pedreiro **2**	Apropriador **1**	Técnico de Segurança do Trabalho **1**	Auxiliar de Engenharia **1**	Motorista de Veículo Pesado **1**	
Almoxarife **1**	Carpinteiro **2**					
Motorista **1**						*Terceiros* ***(1)***

Equipamentos (4)

Escavadeira **1**	Caminhão Basculante **3**				

Atividades (3)

Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Execução de escavação horizontal de material de primeira categoria.	Em Andamento
Execução do Canteiro de Obras	Em Andamento

Fotos (1)



Assinatura

PEDRO SAULO DO NASCIMENTO PEREIRA:09677262475

Assinado de forma digital por PEDRO SAULO DO NASCIMENTO PEREIRA:09677262475
Dados: 2026.02.12 09:47:48 -03'00'

Assinatura

Criado por: José Giovanni (12/01/2026 10:51)
Última modificação: Luiz Henrique (19/01/2026 07:42)

Assinado por 5 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE SOARES PINTO, GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, RUI BARBOSA e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/E19D-FE7F-6DA6-DC6D e informe o código E19D-FE7F-6DA6-DC6D

Aprovado

GRUPO ROCHA CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório n°	**74**	**Data do relatório**	**08/01/2026**	**Dia da semana**	Quinta-Feira
Obra	**CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025**				

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (23)

Auxiliar de Topografia **1**	Engenheiro **1**	Operador de Equipamentos **1**	Topógrafo **1**	Assistente Financeiro **1**	Encarregado Geral **1**	*Mão de Obra Própria* ***(22)***
Servente **7**	Pedreiro **2**	Apropriador **1**	Técnico de Segurança do Trabalho **1**	Auxiliar de Engenharia **1**	Motorista de Veículo Pesado **1**	
Almoxarife **1**	Carpinteiro **2**					
Motorista **1**						*Terceiros* ***(1)***

Equipamentos (4)


Escavadeira **1**	Caminhão Basculante **3**				

Atividades (4)

Execução de serviços de locação topográfica.		Em Andamento
Execução de escavação horizontal de material de primeira categoria.		Em Andamento
Execução do Canteiro de Obras		Em Andamento
Execução do desvio do Riacho.		Em Andamento

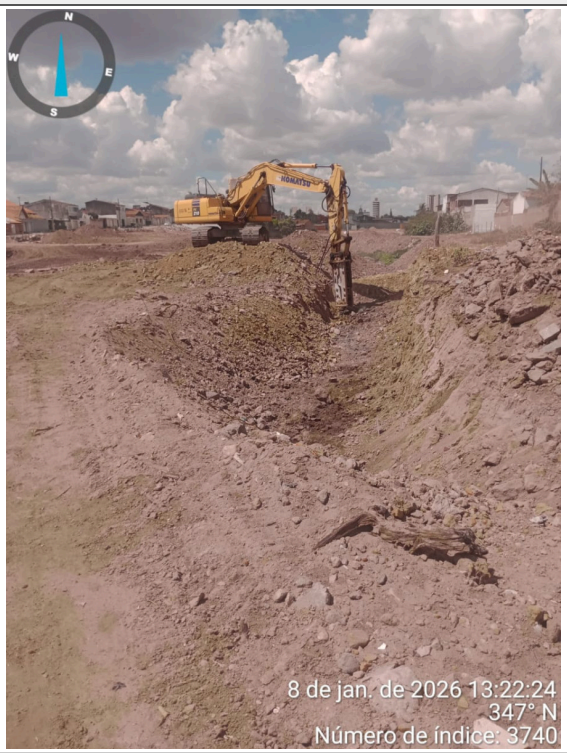Fotos (7)





Assinado por 5 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE SOARES PINTO, GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, RUI BARBOSA e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/E19D-FE7F-6DA6-DC6D e informe o código E19D-FE7F-6DA6-DC6D











Vídeos (1)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:34

PEDRO SAULO DO NASCIMENTO PEREIRA:09677262475

Assinado de forma digital por PEDRO SAULO DO NASCIMENTO PEREIRA:09677262475
Dados: 2026.02.12 09:48:37 -03'00'

Assinatura

Assinatura

Assinado por 5 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE SOARES PINTO, GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, RUI BARBOSA e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/E19D-FE7F-6DA6-DC6D e informe o código E19D-FE7F-6DA6-DC6D

Criado por: José Giovanni (12/01/2026 10:55)
Última modificação: Luiz Henrique (19/01/2026 07:42)

Aprovado

GRUPO ROCHA CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório n°	**75**	**Data do relatório**	**09/01/2026**	**Dia da semana**	Sexta-Feira
Obra	**CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025**				

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (23)

Auxiliar de Topografia **1**	Engenheiro **1**	Operador de Equipamentos **1**	Topógrafo **1**	Assistente Financeiro **1**	Encarregado Geral **1**	*Mão de Obra Própria* ***(22)***
Servente **7**	Pedreiro **2**	Apropriador **1**	Técnico de Segurança do Trabalho **1**	Auxiliar de Engenharia **1**	Motorista de Veículo Pesado **1**	
Almoxarife **1**	Carpinteiro **2**					
Motorista **1**						*Terceiros* ***(1)***

Equipamentos (4)

Escavadeira **1**	Caminhão Basculante **3**				

Atividades (4)

Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Execução de escavação horizontal de material de primeira categoria.	Em Andamento
Execução do Canteiro de Obras	Em Andamento
Execução do desvio do Riacho.	Em Andamento

Fotos (1)



Assinado por 5 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE SOARES PINTO, GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, RUI BARBOSA e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/E19D-FE7F-6DA6-DC6D e informe o código E19D-FE7F-6DA6-DC6D

Vídeos (1)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:24

Assinatura

PEDRO SAULO DO NASCIMENTO PEREIRA:09677262475

Assinado de forma digital por PEDRO SAULO DO NASCIMENTO PEREIRA:09677262475
Dados: 2026.02.12 09:48:51 -03'00'

Assinatura

Criado por: José Giovanni (12/01/2026 11:55)
Última modificação: Luiz Henrique (19/01/2026 07:42)

Assinado por 5 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE SOARES PINTO, GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, RUI BARBOSA e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/E19D-FE7F-6DA6-DC6D e informe o código E19D-FE7F-6DA6-DC6D

Aprovado

GRUPO ROCHA CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório n°	**76**	**Data do relatório**	**10/01/2026**	**Dia da semana**	Sábado
Obra	**CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025**				

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (11)

Auxiliar de Topografia **1**	Engenheiro **1**	Operador de Equipamentos **2**	Topógrafo **1**	Encarregado Geral **1**	Servente **1**	*Mão de Obra Própria* ***(10)***
Almoxarife **1**	Carpinteiro **2**					
Motorista **1**						*Terceiros* ***(1)***

Equipamentos (4)

Escavadeira **1**	Caminhão Basculante **3**				

Atividades (3)

Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Execução de escavação horizontal de material de primeira categoria.	Em Andamento
Execução do desvio do Riacho.	Em Andamento

Comentários (1)

José Giovanni *12/01/2026 16:51*
Sábado

Fotos (2)





Vídeos (1)

Assinado por 5 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE SOARES PINTO, GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, RUI BARBOSA e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/E19D-FE7F-6DA6-DC6D e informe o código E19D-FE7F-6DA6-DC6D

Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:14

Assinatura

PEDRO SAULO DO NASCIMENTO PEREIRA:09677262475

Assinado de forma digital por PEDRO SAULO DO NASCIMENTO PEREIRA:09677262475
Dados: 2026.02.12 09:49:08 -03'00'

Assinatura

Assinado por 5 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE SOARES PINTO, GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, RUI BARBOSA e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/E19D-FE7F-6DA6-DC6D e informe o código E19D-FE7F-6DA6-DC6D

Aprovado

GRUPO ROCHA CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório n°	**77**	**Data do relatório**	**12/01/2026**	**Dia da semana**	Segunda-Feira
Obra	**CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025**				

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (11)

Auxiliar de Topografia **1**	Engenheiro **1**	Operador de Equipamentos **2**	Topógrafo **1**	Encarregado Geral **1**	Servente **1**	*Mão de Obra Própria* ***(10)***
Almoxarife **1**	Carpinteiro **2**					
Motorista **1**						*Terceiros* ***(1)***

Equipamentos (4)

Escavadeira **1**	Caminhão Basculante **3**				

Atividades (3)

Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Execução de escavação horizontal de material de primeira categoria.	Em Andamento
Execução do desvio do Riacho.	Em Andamento

Assinatura

PEDRO SAULO DO NASCIMENTO PEREIRA:09677262475

Assinado de forma digital por PEDRO SAULO DO NASCIMENTO PEREIRA:09677262475
Dados: 2026.02.12 09:49:20 -03'00'

Assinatura

Criado por: Bertini Antoine (15/01/2026 11:07)
Última modificação: Luiz Henrique (19/01/2026 07:43)

Assinado por 5 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE SOARES PINTO, GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, RUI BARBOSA e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/E19D-FE7F-6DA6-DC6D e informe o código E19D-FE7F-6DA6-DC6D

Aprovado

GRUPO ROCHA CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório n°	**78**	**Data do relatório**	**12/01/2026**	**Dia da semana**	Segunda-Feira
Obra	**CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025**				

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (23)

Auxiliar de Topografia **1**	Engenheiro **1**	Operador de Equipamentos **1**	Topógrafo **1**	Assistente Financeiro **1**	Encarregado Geral **1**	*Mão de Obra Própria* ***(22)***
Servente **7**	Pedreiro **2**	Apropriador **1**	Técnico de Segurança do Trabalho **1**	Auxiliar de Engenharia **1**	Motorista de Veículo Pesado **1**	
Almoxarife **1**	Carpinteiro **2**					
Motorista **1**						*Terceiros* ***(1)***

Equipamentos (5)

Escavadeira **1**	Caminhão Basculante **4**				

Atividades (4)

Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Execução de escavação horizontal de material de primeira categoria.	Em Andamento
Execução do Canteiro de Obras	Em Andamento
Execução do desvio do Riacho.	Em Andamento

Fotos (1)



Assinado por 5 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE SOARES PINTO, GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, RUI BARBOSA e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/E19D-FE7F-6DA6-DC6D e informe o código E19D-FE7F-6DA6-DC6D

Vídeos (2)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:13
Vídeo 2 (visualizar).mp4	00:08



Assinatura

PEDRO SAULO DO NASCIMENTO PEREIRA:09677262475

Assinado de forma digital por PEDRO SAULO DO NASCIMENTO PEREIRA:09677262475
Dados: 2026.02.12 09:49:35 -03'00'

Assinatura

Assinado por 5 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE SOARES PINTO, GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, RUI BARBOSA e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/E19D-FE7F-6DA6-DC6D e informe o código E19D-FE7F-6DA6-DC6D

Aprovado

GRUPO ROCHA CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório n°	**79**	**Data do relatório**	**13/01/2026**	**Dia da semana**	Terça-Feira
Obra	**CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025**				

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (23)

Auxiliar de Topografia **1**	Engenheiro **1**	Operador de Equipamentos **1**	Topógrafo **1**	Assistente Financeiro **1**	Encarregado Geral **1**	*Mão de Obra Própria* ***(22)***
Servente **7**	Pedreiro **2**	Apropriador **1**	Técnico de Segurança do Trabalho **1**	Auxiliar de Engenharia **1**	Motorista de Veículo Pesado **1**	
Almoxarife **1**	Carpinteiro **2**					
Motorista **1**						*Terceiros* ***(1)***

Equipamentos (5)

Escavadeira **1**	Caminhão Basculante **4**				

Atividades (4)


Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Execução de escavação horizontal de material de primeira categoria.	Em Andamento
Execução do Canteiro de Obras	Em Andamento
Execução do desvio do Riacho.	Em Andamento

Fotos (5)





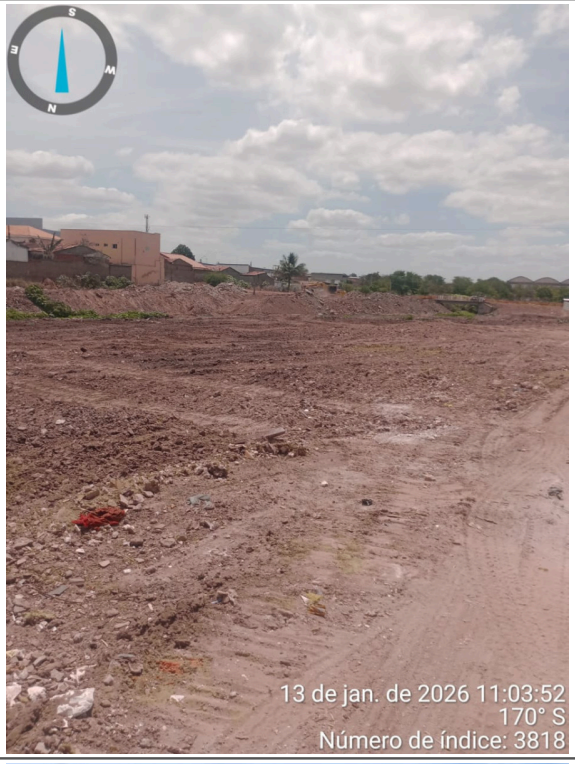Assinado por 5 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE SOARES PINTO, GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, RUI BARBOSA e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/E19D-FE7F-6DA6-DC6D e informe o código E19D-FE7F-6DA6-DC6D







Vídeos (3)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:07
Vídeo 2 (visualizar).mp4	00:12
Vídeo 3 (visualizar).mp4	00:16

Assinatura

PEDRO SAULO DO NASCIMENTO PEREIRA:09677262475

Assinado de forma digital por PEDRO SAULO DO NASCIMENTO PEREIRA:09677262475
Dados: 2026.02.12 09:49:48 -03'00'

Assinatura

Criado por: Bertini Antoine (15/01/2026 11:18)
Última modificação: Luiz Henrique (19/01/2026 07:44)

Assinado por 5 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE SOARES PINTO, GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, RUI BARBOSA e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/E19D-FE7F-6DA6-DC6D e informe o código E19D-FE7F-6DA6-DC6D

GRUPO ROCHA CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório n°	**80**	**Data do relatório**	**14/01/2026**	**Dia da semana**	Quarta-Feira
Obra	**CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025**				

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (23)

Auxiliar de Topografia **1**	Engenheiro **1**	Operador de Equipamentos **1**	Topógrafo **1**	Assistente Financeiro **1**	Encarregado Geral **1**	*Mão de Obra Própria* ***(22)***
Servente **7**	Pedreiro **2**	Apropriador **1**	Técnico de Segurança do Trabalho **1**	Auxiliar de Engenharia **1**	Motorista de Veículo Pesado **1**	
Almoxarife **1**	Carpinteiro **2**					
Motorista **1**						*Terceiros* ***(1)***

Equipamentos (5)


Escavadeira **1**	Caminhão Basculante **4**				

Atividades (4)

Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Execução de escavação horizontal de material de primeira categoria.	Em Andamento
Execução do Canteiro de Obras	Em Andamento
Execução do desvio do Riacho.	Em Andamento

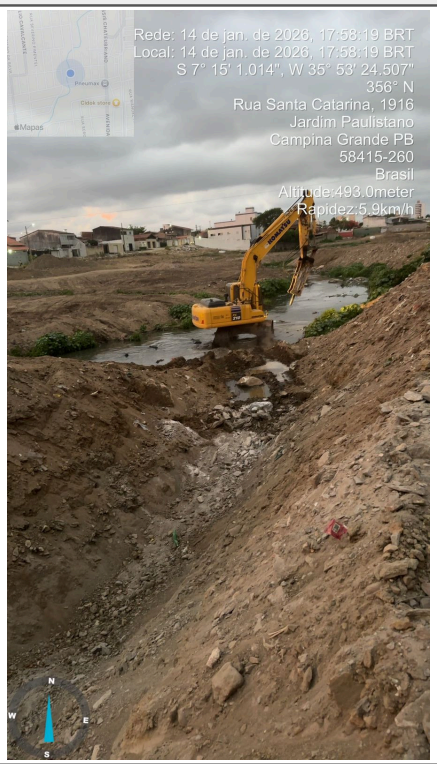Fotos (4)





Assinado por 5 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE SOARES PINTO, GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, RUI BARBOSA e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/E19D-FE7F-6DA6-DC6D e informe o código E19D-FE7F-6DA6-DC6D





Vídeos (1)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:18

Assinatura

PEDRO SAULO DO NASCIMENTO PEREIRA:09677262475

Assinado de forma digital por PEDRO SAULO DO NASCIMENTO PEREIRA:09677262475
Dados: 2026.02.12 09:50:07 -03'00'

Assinatura

Criado por: Bertini Antoine (15/01/2026 11:27)
Última modificação: Luiz Henrique (19/01/2026 07:44)

Assinado por 5 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE SOARES PINTO, GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, RUI BARBOSA e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/E19D-FE7F-6DA6-DC6D e informe o código E19D-FE7F-6DA6-DC6D

Aprovado

GRUPO ROCHA CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório n°	**81**	**Data do relatório**	**15/01/2026**	**Dia da semana**	Quinta-Feira
Obra	**CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025**				

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (23)


Auxiliar de Topografia **1**	Engenheiro **1**	Operador de Equipamentos **2**	Topógrafo **1**	Assistente Financeiro **1**	Encarregado Geral **1**	*Mão de Obra Própria* ***(21)***
Servente **5**	Pedreiro **1**	Apropriador **1**	Técnico de Segurança do Trabalho **1**	Auxiliar de Engenharia **1**	Motorista de Veículo Pesado **2**	
Almoxarife **1**	Carpinteiro **2**					
Motorista **1**	Encanador **1**					*Terceiros* ***(2)***

Equipamentos (4)

Escavadeira **2**	Caminhão Basculante **2**				

Atividades (4)	
Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Execução de escavação horizontal de material de primeira categoria.	Em Andamento
Execução do Canteiro de Obras	Em Andamento
Execução do desvio do Riacho.	Em Andamento

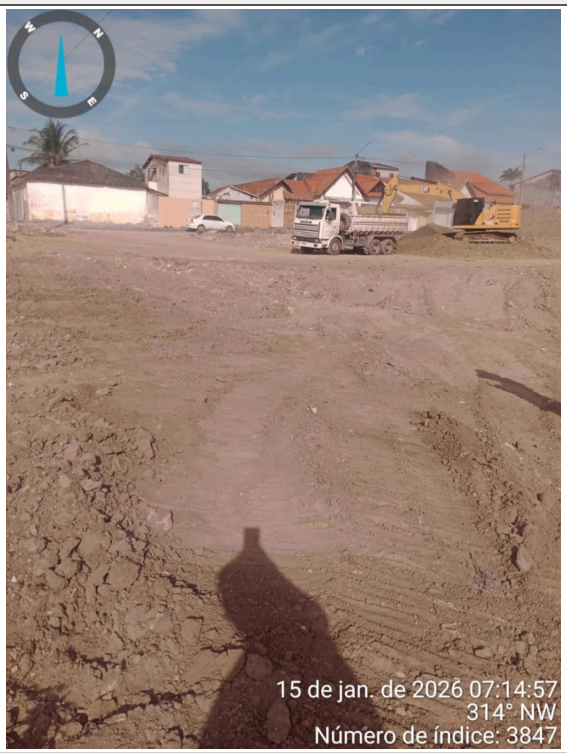Fotos (3)





Assinado por 5 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE SOARES PINTO, GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, RUI BARBOSA e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/E19D-FE7F-6DA6-DC6D e informe o código E19D-FE7F-6DA6-DC6D



Vídeos (1)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4 Ativação do Desvio Est-39 LE	00:05

CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA-PB 1621699315
Assinatura

Assinatura

Assinado por 5 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE SOARES PINTO, GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, RUI BARBOSA e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/E19D-FE7F-6DA6-DC6D e informe o código E19D-FE7F-6DA6-DC6D

Aprovado

GRUPO ROCHA CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório n°	**82**	**Data do relatório**	**16/01/2026**	**Dia da semana**	Sexta-Feira
Obra	**CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025**				

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	Nublado	Praticável
Tarde	Nublado	Praticável

Mão de obra (23)

Auxiliar de Topografia **1**	Engenheiro **1**	Operador de Equipamentos **2**	Topógrafo **1**	Assistente Financeiro **1**	Encarregado Geral **1**	*Mão de Obra Própria* ***(21)***
Servente **5**	Pedreiro **1**	Apropriador **1**	Técnico de Segurança do Trabalho **1**	Auxiliar de Engenharia **1**	Motorista de Veículo Pesado **2**	
Almoxarife **1**	Carpinteiro **2**					
Motorista **1**	Encanador **1**					*Terceiros* ***(2)***

Equipamentos (4)

Escavadeira **2**	Caminhão Basculante **2**				

Atividades (4)

Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Execução de escavação horizontal de material de primeira categoria e material de terceira categoria proveniente do rompimento de pedras.	Em Andamento
Execução do Canteiro de Obras	Em Andamento
Execução do desvio do Riacho.	Em Andamento

Fotos (4)





Assinado por 5 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE SOARES PINTO, GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, RUI BARBOSA e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/E19D-FE7F-6DA6-DC6D e informe o código E19D-FE7F-6DA6-DC6D





CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA-PB 1621699315

Assinatura

Assinatura

Assinado por 5 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE SOARES PINTO, GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, RUI BARBOSA e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/E19D-FE7F-6DA6-DC6D e informe o código E19D-FE7F-6DA6-DC6D

Criado por: Bertini Antoine (22/01/2026 15:47)
Última modificação: Luiz Henrique (03/02/2026 16:43)

Aprovado

GRUPO ROCHA CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório n°	**83**	**Data do relatório**	**17/01/2026**	**Dia da semana**	Sábado
Obra	**CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025**				

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	Nublado	Praticável
Tarde	Nublado	Praticável

Mão de obra (10)

Auxiliar de Topografia **1**	Engenheiro **1**	Operador de Equipamentos **2**	Topógrafo **1**	Encarregado Geral **1**	Apropriador **1**	*Mão de Obra Própria* ***(9)***
Motorista de Veículo Pesado **2**						
Motorista **1**						*Terceiros* ***(1)***

Equipamentos (4)

Escavadeira **2**	Caminhão Basculante **2**				

Atividades (4)

Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Execução de escavação horizontal de material de primeira categoria e material de terceira categoria proveniente do rompimento de pedras.	Em Andamento
Execução do Canteiro de Obras	Em Andamento
Execução de desvio do Riacho.	Em Andamento

Fotos (4)





Assinado por 5 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE SOARES PINTO, GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, RUI BARBOSA e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/E19D-FE7F-6DA6-DC6D e informe o código E19D-FE7F-6DA6-DC6D





Vídeos (2)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:25
Vídeo 2 (visualizar).mp4	00:14

CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA-PB 1621699315
Assinatura

Assinatura

Assinado por 5 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE SOARES PINTO, GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, RUI BARBOSA e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/E19D-FE7F-6DA6-DC6D e informe o código E19D-FE7F-6DA6-DC6D

Criado por: Bertini Antoine (22/01/2026 16:15)
Última modificação: Luiz Henrique (03/02/2026 16:44)

GRUPO ROCHA CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório n°	**84**	**Data do relatório**	**19/01/2026**	**Dia da semana**	Segunda-Feira
Obra	**CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025**				

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	Nublado	Praticável
Tarde	Nublado	Praticável

Mão de obra (23)

Auxiliar de Topografia **1**	Engenheiro **1**	Operador de Equipamentos **2**	Topógrafo **1**	Assistente Financeiro **1**	Encarregado Geral **1**	*Mão de Obra Própria* ***(21)***
Servente **5**	Pedreiro **1**	Apropriador **1**	Técnico de Segurança do Trabalho **1**	Auxiliar de Engenharia **1**	Motorista de Veículo Pesado **2**	
Almoxarife **1**	Carpinteiro **2**					
Motorista **1**	Encanador **1**					*Terceiros* ***(2)***

Equipamentos (4)

Escavadeira **2**	Caminhão Basculante **2**				

Atividades (4)

Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Execução de escavação horizontal de material de primeira categoria e material de terceira categoria proveniente do rompimento de pedras.	Em Andamento
Execução do Canteiro de Obras	Em Andamento
Execução do desvio do Riacho.	Em Andamento

Fotos (4)





Assinado por 5 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE SOARES PINTO, GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, RUI BARBOSA e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/E19D-FE7F-6DA6-DC6D e informe o código E19D-FE7F-6DA6-DC6D





Vídeos (2)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:42
Vídeo 2 (visualizar).mp4	00:25

CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA-PB 1621699315
Assinatura

Assinatura

Assinado por 5 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE SOARES PINTO, GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, RUI BARBOSA e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/E19D-FE7F-6DA6-DC6D e informe o código E19D-FE7F-6DA6-DC6D

Aprovado

GRUPO ROCHA CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório n°	**85**	**Data do relatório**	**20/01/2026**	**Dia da semana**	Terça-Feira
Obra	**CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025**				

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	Nublado	Praticável
Tarde	Nublado	Praticável

Mão de obra (23)

Auxiliar de Topografia **1**	Engenheiro **1**	Operador de Equipamentos **2**	Topógrafo **1**	Assistente Financeiro **1**	Encarregado Geral **1**	*Mão de Obra Própria* ***(21)***
Servente **5**	Pedreiro **1**	Apropriador **1**	Técnico de Segurança do Trabalho **1**	Auxiliar de Engenharia **1**	Motorista de Veículo Pesado **2**	
Almoxarife **1**	Carpinteiro **2**					
Motorista **1**	Encanador **1**					*Terceiros* ***(2)***

Equipamentos (4)

Escavadeira **2**	Caminhão Basculante **2**				

Atividades (4)

Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Execução de escavação horizontal de material de primeira categoria e material de terceira categoria proveniente do rompimento de pedras.	Em Andamento
Execução do Canteiro de Obras	Em Andamento
Execução do desvio do Riacho.	Em Andamento

Fotos (4)





Assinado por 5 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE SOARES PINTO, GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, RUI BARBOSA e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/E19D-FE7F-6DA6-DC6D e informe o código E19D-FE7F-6DA6-DC6D





Vídeos (3)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:07
Vídeo 2 (visualizar).mp4	00:07
Vídeo 3 (visualizar).mp4	00:09

CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA-PB 1621699315

Assinatura

Assinatura

Assinado por 5 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE SOARES PINTO, GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, RUI BARBOSA e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/E19D-FE7F-6DA6-DC6D e informe o código E19D-FE7F-6DA6-DC6D

Criado por: Bertini Antoine (22/01/2026 16:35)
Última modificação: Luiz Henrique (03/02/2026 16:52)

GRUPO ROCHA CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório n°	**86**	**Data do relatório**	**21/01/2026**	**Dia da semana**	Quarta-Feira
Obra	**CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025**				

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	Nublado	Praticável
Tarde	Nublado	Praticável

Mão de obra (23)

Auxiliar de Topografia **1**	Engenheiro **1**	Operador de Equipamentos **2**	Topógrafo **1**	Assistente Financeiro **1**	Encarregado Geral **1**	*Mão de Obra Própria* ***(21)***
Servente **5**	Pedreiro **1**	Apropriador **1**	Técnico de Segurança do Trabalho **1**	Auxiliar de Engenharia **1**	Motorista de Veículo Pesado **2**	
Almoxarife **1**	Carpinteiro **2**					
Motorista **1**	Encanador **1**					*Terceiros* ***(2)***


Equipamentos (4)

Escavadeira **2**	Caminhão Basculante **2**				

Atividades (4)

Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Execução de escavação horizontal de material de primeira categoria e material de terceira categoria proveniente do rompimento de pedras.	Em Andamento
Execução do Canteiro de Obras	Em Andamento
Execução do desvio do Riacho.	Em Andamento

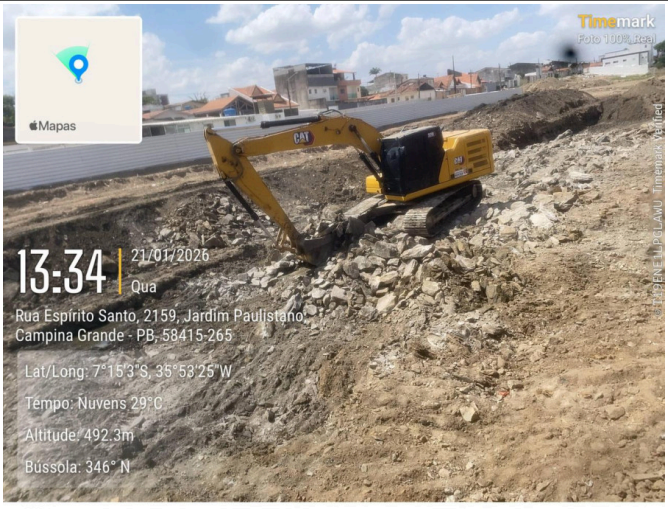Fotos (2)





Vídeos (2)

Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:12
Vídeo 2 (visualizar).mp4	00:11

CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA-PB 1621699315

Assinatura

Luis Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - SECOB IPMCO

Assinatura

Assinado por 5 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE SOARES PINTO, GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, RUI BARBOSA e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/E19D-FE7F-6DA6-DC6D e informe o código E19D-FE7F-6DA6-DC6D

Criado por: Bertini Antoine (22/01/2026 16:43)
Última modificação: Luiz Henrique (03/02/2026 16:51)

Aprovado

GRUPO ROCHA CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório n°	**87**	**Data do relatório**	**22/01/2026**	**Dia da semana**	Quinta-Feira
Obra	**CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025**				

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	Nublado	Praticável
Tarde	Nublado	Praticável

Mão de obra (23)

Auxiliar de Topografia **1**	Engenheiro **1**	Operador de Equipamentos **2**	Topógrafo **1**	Assistente Financeiro **1**	Encarregado Geral **1**	*Mão de Obra Própria* ***(21)***
Servente **5**	Pedreiro **1**	Apropriador **1**	Técnico de Segurança do Trabalho **1**	Auxiliar de Engenharia **1**	Motorista de Veículo Pesado **2**	
Almoxarife **1**	Carpinteiro **2**					
Motorista **1**	Encanador **1**					*Terceiros* ***(2)***

Equipamentos (4)

Escavadeira **2**	Caminhão Basculante **2**				

Atividades (4)

Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Execução de escavação horizontal de material de primeira categoria e material de terceira categoria proveniente do rompimento de pedras.	Em Andamento
Execução do Canteiro de Obras	Em Andamento
Execução do desvio do Riacho.	Em Andamento

Fotos (5)





Assinado por 5 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE SOARES PINTO, GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, RUI BARBOSA e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/E19D-FE7F-6DA6-DC6D e informe o código E19D-FE7F-6DA6-DC6D







Vídeos (2)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:35
Vídeo 2 (visualizar).mp4	00:37

CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA-PB 1621699315

Assinatura

Luis Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - SECOB IPMCG

Assinatura

Assinado por 5 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE SOARES PINTO, GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, RUI BARBOSA e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/E19D-FE7F-6DA6-DC6D e informe o código E19D-FE7F-6DA6-DC6D

Criado por: Bertini Antoine (26/01/2026 15:50)
Última modificação: Luiz Henrique (03/02/2026 16:52)

GRUPO ROCHA CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório n°	**88**	**Data do relatório**	**23/01/2026**	**Dia da semana**	Sexta-Feira
Obra	**CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025**				

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	Nublado	Praticável
Tarde	Nublado	Praticável

Mão de obra (23)

Auxiliar de Topografia **1**	Engenheiro **1**	Operador de Equipamentos **2**	Topógrafo **1**	Assistente Financeiro **1**	Encarregado Geral **1**	*Mão de Obra Própria* ***(21)***
Servente **5**	Pedreiro **1**	Apropriador **1**	Técnico de Segurança do Trabalho **1**	Auxiliar de Engenharia **1**	Motorista de Veículo Pesado **2**	
Almoxarife **1**	Carpinteiro **2**					
Motorista **1**	Encanador **1**					*Terceiros* ***(2)***

Equipamentos (4)

Escavadeira **2**	Caminhão Basculante **2**				

Atividades (4)

Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Execução de escavação horizontal de material de primeira categoria e material de terceira categoria proveniente do rompimento de pedras.	Em Andamento
Execução do Canteiro de Obras	Em Andamento
Execução do desvio do Riacho.	Em Andamento

Fotos (4)





Assinado por 5 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE SOARES PINTO, GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, RUI BARBOSA e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/E19D-FE7F-6DA6-DC6D e informe o código E19D-FE7F-6DA6-DC6D





CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA-PB 1621699315

Assinatura

Luis Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - SECOB IPMCG

Assinatura

Assinado por 5 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE SOARES PINTO, GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, RUI BARBOSA e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/E19D-FE7F-6DA6-DC6D e informe o código E19D-FE7F-6DA6-DC6D

Criado por: Bertini Antoine (26/01/2026 15:55)
Última modificação: Luiz Henrique (03/02/2026 16:53)

Aprovado

GRUPO ROCHA CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório n°	**89**	**Data do relatório**	**24/01/2026**	**Dia da semana**	Sábado
Obra	**CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025**				

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	Nublado	Praticável
Tarde	Nublado	Praticável

Mão de obra (4)

Operador de Equipamentos **2**	Encarregado Geral **1**	Engenheiro **1**				*Mão de Obra Própria* ***(4)***

Equipamentos (2)


Escavadeira **2**					

Atividades (2)

Execução de escavação horizontal de material de primeira categoria e material de terceira categoria proveniente do rompimento de pedras.	Em Andamento
Execução do desvio do Riacho.	Em Andamento

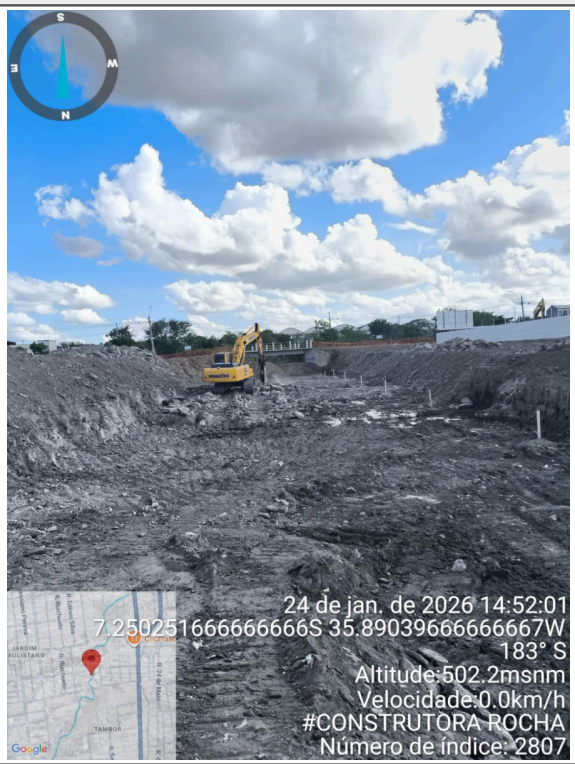Fotos (2)





Vídeos (3)

Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:09
Vídeo 2 (visualizar).mp4	00:24
Vídeo 3 (visualizar).mp4	00:31

CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA-PB 162169931S

Assinatura

Luis Henrique Soares Pinto
CREA-PB 162139436D
Eng. Civil - SECOB IPMCG

Assinatura

Criado por: Bertini Antoine (26/01/2026 16:01)
Última modificação: Luiz Henrique (03/02/2026 16:53)

Assinado por 5 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE SOARES PINTO, GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, RUI BARBOSA e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/E19D-FE7F-6DA6-DC6D e informe o código E19D-FE7F-6DA6-DC6D

Aprovado

GRUPO ROCHA CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório n°	**90**	**Data do relatório**	**26/01/2026**	**Dia da semana**	Segunda-Feira
Obra	**CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025**				

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	Nublado	Praticável
Tarde	Nublado	Praticável

Mão de obra (24)

Auxiliar de Topografia **1**	Engenheiro **1**	Operador de Equipamentos **3**	Topógrafo **1**	Assistente Financeiro **1**	Encarregado Geral **1**	*Mão de Obra Própria* ***(22)***
Servente **6**	Pedreiro **1**	Apropriador **1**	Técnico de Segurança do Trabalho **1**	Auxiliar de Engenharia **1**	Motorista de Veículo Pesado **1**	
Almoxarife **1**	Carpinteiro **2**					
Motorista **1**	Encanador **1**					*Terceiros* ***(2)***

Equipamentos (4)

Escavadeira **3**	Caminhão Basculante **1**				

Atividades (4)

Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Execução de escavação horizontal de material de primeira categoria e material de terceira categoria proveniente do rompimento de pedras.	Em Andamento
Execução do Canteiro de Obras	Em Andamento
Execução do desvio do Riacho.	Em Andamento

Fotos (5)





Assinado por 5 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE SOARES PINTO, GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, RUI BARBOSA e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/E19D-FE7F-6DA6-DC6D e informe o código E19D-FE7F-6DA6-DC6D







Vídeos (2)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:11
Vídeo 2 (visualizar).mp4	00:07

CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA-PB 1621699315

Assinatura

Luis Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - SECOB IPMCG

Assinatura

Assinado por 5 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE SOARES PINTO, GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, RUI BARBOSA e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/E19D-FE7F-6DA6-DC6D e informe o código E19D-FE7F-6DA6-DC6D

Criado por: Bertini Antoine (26/01/2026 16:05)
Última modificação: Luiz Henrique (03/02/2026 16:53)

GRUPO ROCHA CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório n°	**91**	**Data do relatório**	**27/01/2026**	**Dia da semana**	Terça-Feira
Obra	**CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025**				

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	Nublado	Praticável
Tarde	Nublado	Praticável

Mão de obra (24)

Auxiliar de Topografia **1**	Engenheiro **1**	Operador de Equipamentos **3**	Topógrafo **1**	Assistente Financeiro **1**	Encarregado Geral **1**	*Mão de Obra Própria* ***(22)***
Servente **6**	Pedreiro **1**	Apropriador **1**	Técnico de Segurança do Trabalho **1**	Auxiliar de Engenharia **1**	Motorista de Veículo Pesado **1**	
Almoxarife **1**	Carpinteiro **2**					
Motorista **1**	Encanador **1**					*Terceiros* ***(2)***

Equipamentos (4)

Escavadeira **3**	Caminhão Basculante **1**				

Atividades (4)

Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Execução de escavação horizontal de material de primeira categoria e material de terceira categoria proveniente do rompimento de pedras.	Em Andamento
Execução do Canteiro de Obras	Em Andamento
Ativação do desvio do Riacho. Est-29 Lado E	Em Andamento

Fotos (3)





Assinado por 5 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE SOARES PINTO, GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, RUI BARBOSA e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/E19D-FE7F-6DA6-DC6D e informe o código E19D-FE7F-6DA6-DC6D



Vídeos (3)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:31
Vídeo 2 (visualizar).mp4	00:23
Vídeo 3 (visualizar).mp4 Ativação do Desvio Est-29 Lado E.	00:08

CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA-PB 1621699315
Assinatura

Luis Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - SECOB IPMCG
Assinatura

Assinado por 5 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE SOARES PINTO, GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, RUI BARBOSA e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/E19D-FE7F-6DA6-DC6D e informe o código E19D-FE7F-6DA6-DC6D

Aprovado

GRUPO ROCHA CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório n°	**92**	**Data do relatório**	**28/01/2026**	**Dia da semana**	Quarta-Feira
Obra	**CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025**				

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	Nublado	Praticável
Tarde	Nublado	Praticável

Mão de obra (24)

Auxiliar de Topografia **1**	Engenheiro **1**	Operador de Equipamentos **3**	Topógrafo **1**	Assistente Financeiro **1**	Encarregado Geral **1**	*Mão de Obra Própria* ***(22)***
Servente **6**	Pedreiro **1**	Apropriador **1**	Técnico de Segurança do Trabalho **1**	Auxiliar de Engenharia **1**	Motorista de Veículo Pesado **1**	
Almoxarife **1**	Carpinteiro **2**					
Motorista **1**	Encanador **1**					*Terceiros* ***(2)***


Equipamentos (4)

Escavadeira **3**	Caminhão Basculante **1**				

Atividades (3)


Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Execução de escavação horizontal de material de primeira categoria e material de terceira categoria proveniente do rompimento de pedras.	Em Andamento
Execução do Canteiro de Obras	Em Andamento

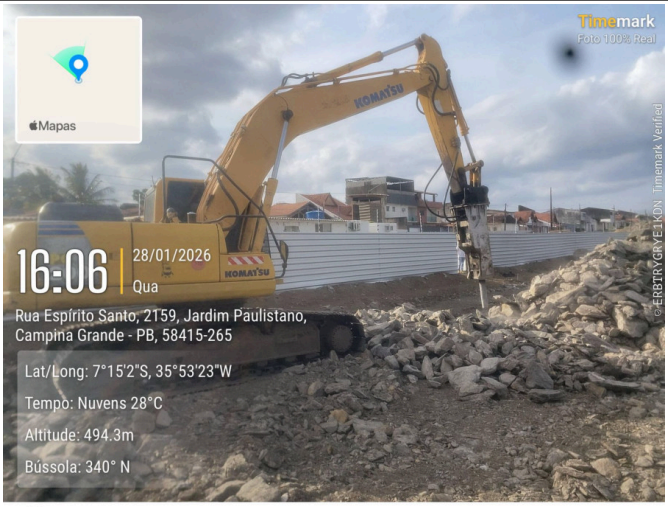Fotos (3)





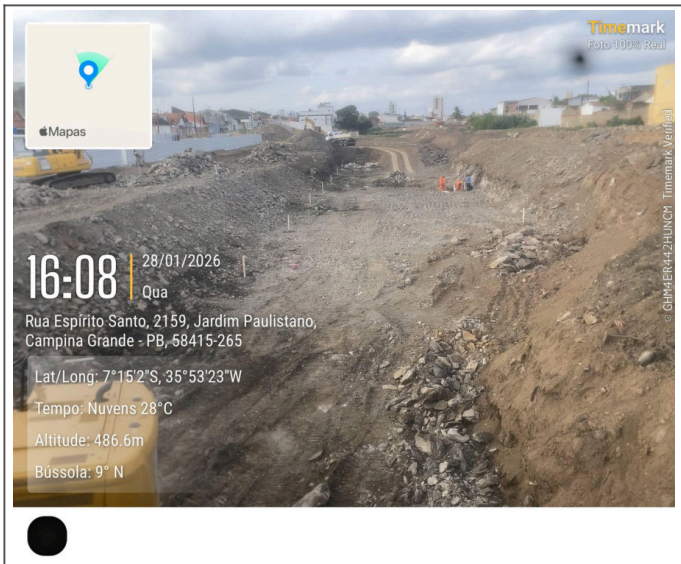Assinado por 5 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE SOARES PINTO, GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, RUI BARBOSA e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/E19D-FE7F-6DA6-DC6D e informe o código E19D-FE7F-6DA6-DC6D



Vídeos (3)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:16
Vídeo 2 (visualizar).mp4	00:07
Vídeo 3 (visualizar).mp4	00:10

CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA-PB 1621699315

Assinatura

Luis Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - SECOB IPMCG

Assinatura

Assinado por 5 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE SOARES PINTO, GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, RUI BARBOSA e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/E19D-FE7F-6DA6-DC6D e informe o código E19D-FE7F-6DA6-DC6D

Aprovado

GRUPO ROCHA CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório n°	**93**	**Data do relatório**	**29/01/2026**	**Dia da semana**	Quinta-Feira
Obra	**CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025**				

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	Nublado	Praticável
Tarde	Nublado	Praticável

Mão de obra (25)

Auxiliar de Topografia **1**	Engenheiro **1**	Operador de Equipamentos **3**	Topógrafo **1**	Assistente Financeiro **1**	Encarregado Geral **1**	*Mão de Obra Própria* ***(23)***
Servente **6**	Pedreiro **1**	Apropriador **1**	Técnico de Segurança do Trabalho **1**	Auxiliar de Engenharia **1**	Motorista de Veículo Pesado **2**	
Almoxarife **1**	Carpinteiro **2**					
Motorista **1**	Encanador **1**					*Terceiros* ***(2)***

Equipamentos (5)

Escavadeira **3**	Caminhão Basculante **2**				

Atividades (4)

Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Execução de escavação horizontal de material de primeira categoria e material de terceira categoria proveniente do rompimento de pedras.	Em Andamento
Execução do Canteiro de Obras	Em Andamento
Execução do colchão de areia e de pedra da fundação do canal.	Em Andamento

Fotos (4)





Assinado por 5 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE SOARES PINTO, GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, RUI BARBOSA e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/E19D-FE7F-6DA6-DC6D e informe o código E19D-FE7F-6DA6-DC6D





Vídeos (1)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:04

Assinatura

Assinatura

Criado por: Bertini Antoine (30/01/2026 15:36)
Última modificação: Luiz Henrique (03/02/2026 16:54)

Assinado por 5 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE SOARES PINTO, GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, RUI BARBOSA e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/E19D-FE7F-6DA6-DC6D e informe o código E19D-FE7F-6DA6-DC6D

Aprovado

GRUPO ROCHA CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório n°	**94**	**Data do relatório**	**30/01/2026**	**Dia da semana**	Sexta-Feira
Obra	**CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025**				

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	Nublado	Praticável
Tarde	Nublado	Praticável

Mão de obra (26)

Auxiliar de Topografia **1**	Engenheiro **1**	Operador de Equipamentos **4**	Topógrafo **1**	Assistente Financeiro **1**	Encarregado Geral **1**	*Mão de Obra Própria* ***(24)***
Servente **6**	Pedreiro **1**	Apropriador **1**	Técnico de Segurança do Trabalho **1**	Auxiliar de Engenharia **1**	Motorista de Veículo Pesado **2**	
Almoxarife **1**	Carpinteiro **2**					
Motorista **1**	Encanador **1**					*Terceiros* ***(2)***

Equipamentos (6)

Escavadeira **3**	Caminhão Basculante **2**	Retro Escavadeira **1**			

Atividades (4)

Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Execução do Canteiro de Obras	Em Andamento
Execução do colchão de areia e de pedra da fundação do canal.	Em Andamento
Execução de barbacãs.	Em Andamento

Fotos (5)





Assinado por 5 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE SOARES PINTO, GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, RUI BARBOSA e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/E19D-FE7F-6DA6-DC6D e informe o código E19D-FE7F-6DA6-DC6D







Vídeos (2)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:13
Vídeo 2 (visualizar).mp4 Execução do enrocamento da laje do fundo	00:06

CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA-PB 1621699315

Assinatura

Luis Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - SECOB IPMCG

Assinatura

Assinado por 5 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE SOARES PINTO, GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, RUI BARBOSA e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/E19D-FE7F-6DA6-DC6D e informe o código E19D-FE7F-6DA6-DC6D

GRUPO ROCHA CAVALCANTE

Relatório Diário de Obra (RDO)

Relatório n°	**95**	**Data do relatório**	**31/01/2026**	**Dia da semana**	Sábado
Obra	**CANAL DO PRADO CONTRATO Nº 2.08.018/2025**				

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	Nublado	Praticável
Tarde	Nublado	Praticável

Mão de obra (9)

Engenheiro	Operador de Equipamentos	Encarregado Geral	Apropriador	Auxiliar de Engenharia	Motorista de Veículo Pesado	*Mão de Obra Própria*
1	**3**	**1**	**1**	**1**	**2**	***(9)***


Equipamentos (5)

Escavadeira	Caminhão Basculante	Retro Escavadeira			
2	**2**	**1**			


Atividades (2)

Execução de serviços de locação topográfica.	Em Andamento
Execução do colchão de areia e de pedra da fundação do canal.	Em Andamento

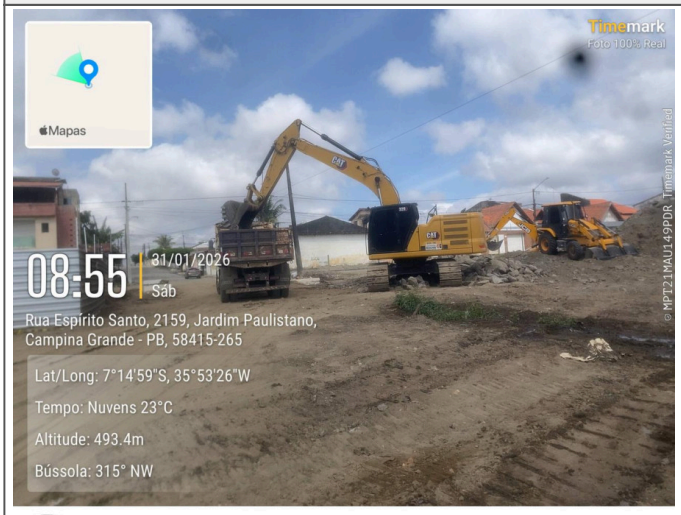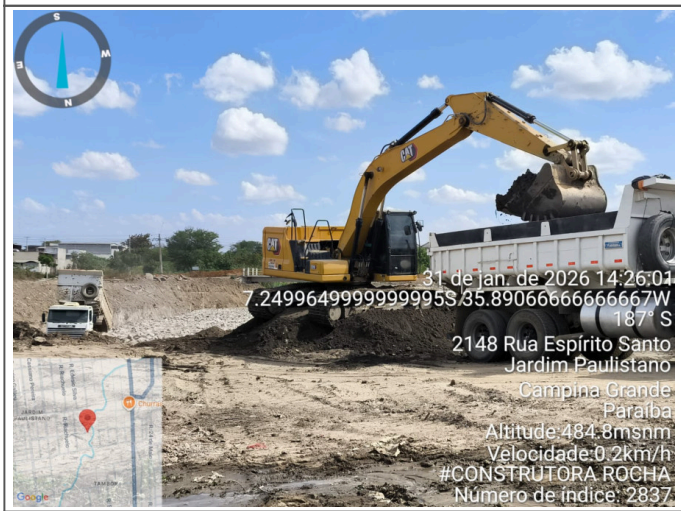Fotos (4)









Assinado por 5 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE SOARES PINTO, GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, RUI BARBOSA e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/E19D-FE7F-6DA6-DC6D e informe o código E19D-FE7F-6DA6-DC6D

Vídeos (2)	
Vídeo 1 (visualizar).mp4	00:18
Vídeo 2 (visualizar).mp4	00:13

CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE
Pedro Saulo do N. Pereira
Engenheiro Civil
CREA-PB 1621699315

Assinatura

Luis Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - SECOB IPMCG

Assinatura

Assinado por 5 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE SOARES PINTO, GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, RUI BARBOSA e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/E19D-FE7F-6DA6-DC6D e informe o código E19D-FE7F-6DA6-DC6D

CONCORRÊNCIA Nº 9.08.02/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CANALIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL DO PRADO E ÁREAS CIRCUNVIZINHAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB

DATA DA OS: 17/10/2025

MEDIÇÃO: 4

PERÍODO SIMPLES: 01/01/2026 31/01/2026

PERÍODO ACUMULADO: 17/10/2025 31/01/2026

MEDIÇÃO Nº: 4 | DATA DA EMISSÃO: 12/02/2026 | CONTRATO: Nº 2.08.018/2025 | VALOR TOTAL DO CONTRATO= 38.554.542,31

VALOR = R$ 38.554.542,31 | VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R$ 1.918.453,18 | VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R$ 546.379,42 | VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL = R$ 2.464.832,60

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO**				**R$ 1.250.014,56**		**R$ 91.104,42**		**R$ 18.745,55**		**R$ 109.849,97**		**R$ 1.140.164,59**
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022	m²	R$ 461,25	36,00	R$ 16.605,00	36,00	R$ 16.605,00	-	R$ -	36,00	R$ 16.605,00	-	R$ -
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	R$ 85.942,88	14,00	R$ 1.203.200,32	0,71	R$ 60.622,31	0,22	R$ 18.745,55	0,92	R$ 79.367,86	13,08	R$ 1.123.832,46
1.3	SINALIZAÇÃO COM CAVALETE PLÁSTICO DESMONTÁVEL	un	R$ 16,29	50,00	R$ 814,50	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	50,00	R$ 814,50
1.4	SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - 10 USOS	m	R$ 5,58	294,00	R$ 1.640,52	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	294,00	R$ 1.640,52
1.5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	und	R$ 13.877,11	2,00	R$ 27.754,22	1,00	R$ 13.877,11	-	R$ -	1,00	R$ 13.877,11	1,00	R$ 13.877,11
2.0	**INSTALAÇÕES E CANTEIRO DE OBRAS**				**R$ 192.835,68**		**R$ 140.574,48**		**R$ 2.815,59**		**R$ 143.390,07**		**R$ 49.445,61**
2.1	**CANTEIRO DE OBRA**				**R$ 97.618,78**		**R$ 45.357,58**		**R$ 2.815,59**		**R$ 48.173,17**		**R$ 49.445,61**
2.1	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	R$ 1.055,67	14,00	R$ 14.779,38	2,00	R$ 2.111,34	1,00	R$ 1.055,67	3,00	R$ 3.167,01	11,00	R$ 11.612,37
2.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	R$ 824,74	14,00	R$ 11.546,36	2,00	R$ 1.649,48	1,00	R$ 824,74	3,00	R$ 2.474,22	11,00	R$ 9.072,14
2.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	R$ 1.319,58	14,00	R$ 18.474,12	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	14,00	R$ 18.474,12
2.4	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MÊS	R$ 935,18	14,00	R$ 13.092,52	2,00	R$ 1.870,36	1,00	R$ 935,18	3,00	R$ 2.805,54	11,00	R$ 10.286,98
2.5	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	R$ 709,40	56,00	R$ 39.726,40	56,00	R$ 39.726,40	-	R$ -	56,00	R$ 39.726,40	-	R$ -
2.2	**INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (ÁGUA, ESGOTO, LUZ)**				**R$ 41.560,90**		**R$ 41.560,90**		**R$ -**		**R$ 41.560,90**		**R$ -**
2.2.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	R$ 2.270,40	1,00	R$ 2.270,40	1,00	R$ 2.270,40	-	R$ -	1,00	R$ 2.270,40	-	R$ -
2.2.2	POSTE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T 9,00M 200DAN TIPO C14	UN	R$ 2.808,16	1,00	R$ 2.808,16	1,00	R$ 2.808,16	-	R$ -	1,00	R$ 2.808,16	-	R$ -
2.2.3	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	R$ 160,56	1,00	R$ 160,56	1,00	R$ 160,56	-	R$ -	1,00	R$ 160,56	-	R$ -
2.2.4	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	R$ 243,77	1,00	R$ 243,77	1,00	R$ 243,77	-	R$ -	1,00	R$ 243,77	-	R$ -
2.2.5	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	R$ 167,47	1,00	R$ 167,47	1,00	R$ 167,47	-	R$ -	1,00	R$ 167,47	-	R$ -
2.2.6	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA BLOCO DE CIMENTO E CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES INTERNAS 1,80 X 3,60 X 1,60 M	un	R$ 27.054,92	1,00	R$ 27.054,92	1,00	R$ 27.054,92	-	R$ -	1,00	R$ 27.054,92	-	R$ -
2.2.7	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	R$ 8.855,62	1,00	R$ 8.855,62	1,00	R$ 8.855,62	-	R$ -	1,00	R$ 8.855,62	-	R$ -
2.3	**FECHAMENTO DO CANTEIRO**				**R$ 53.656,00**		**R$ 53.656,00**		**R$ -**		**R$ 53.656,00**		**R$ -**
2.3.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	R$ 113,71	400,00	R$ 45.484,00	400,00	R$ 45.484,00	-	R$ -	400,00	R$ 45.484,00	-	R$ -
2.3.2	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	R$ 408,60	20,00	R$ 8.172,00	20,00	R$ 8.172,00	-	R$ -	20,00	R$ 8.172,00	-	R$ -
3.0	**LIMPEZA E DEMOLIÇÕES**				**R$ 1.543.155,60**		**R$ 1.193.815,21**		**R$ -**		**R$ 1.193.815,21**		**R$ 349.340,37**
3.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	R$ 0,73	45.000,00	R$ 32.850,00	35.687,11	R$ 26.051,59	-	R$ -	35.687,11	R$ 26.051,59	9.312,89	R$ 6.798,40
3.2	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30 M	un	R$ 45,52	30,00	R$ 1.365,60	30,00	R$ 1.365,60	-	R$ -	30,00	R$ 1.365,60	-	R$ -
3.3	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m³	R$ 15,18	6.750,00	R$ 102.465,00	5.353,07	R$ 81.259,55	-	R$ -	5.353,07	R$ 81.259,55	1.396,93	R$ 21.205,45
3.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	R$ 10,64	19.687,50	R$ 209.475,00	8.921,78	R$ 94.927,71	-	R$ -	8.921,78	R$ 94.927,71	10.765,72	R$ 114.547,28
3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R$ 3,20	374.062,50	R$ 1.197.000,00	309.440,86	R$ 990.210,76	-	R$ -	309.440,86	R$ 990.210,76	64.621,64	R$ 206.789,24
4.0	**CANAL PRINCIPAL**				**R$ 15.669.078,82**		**R$ 172.874,01**		**R$ 524.818,28**		**R$ 697.692,30**		**R$ 14.971.386,53**
4.1	**ESCAVAÇÃO DA SEÇÃO DO CANAL**				**R$ 6.093.452,44**		**R$ 172.874,01**		**R$ 345.305,93**		**R$ 518.179,94**		**R$ 5.575.272,52**
4.1.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020	m³	R$ 3,90	26.894,66	R$ 104.889,19	775,79	R$ 3.025,57	2.182,91	R$ 8.513,35	2.958,70	R$ 11.538,92	23.935,97	R$ 93.350,27
4.1.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	R$ 13,35	8.964,89	R$ 119.681,25	258,60	R$ 3.452,26	-	R$ -	258,60	R$ 3.452,26	8.706,29	R$ 116.229,00
4.1.3	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	m³	R$ 190,59	8.964,89	R$ 1.708.618,05	258,60	R$ 49.285,81	455,49	R$ 86.811,84	714,09	R$ 136.097,65	8.250,80	R$ 1.572.520,40
4.1.4	RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	m³	R$ 27,98	4.482,44	R$ 125.418,78	25,86	R$ 723,55	455,49	R$ 12.744,61	481,35	R$ 13.468,16	4.001,09	R$ 111.950,62
4.1.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	R$ 10,64	56.478,80	R$ 600.934,38	1.629,15	R$ 17.334,21	3.320,77	R$ 35.333,04	4.949,93	R$ 52.667,25	51.528,87	R$ 548.267,14
4.1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R$ 3,20	1.073.097,12	R$ 3.433.910,79	30.953,94	R$ 99.052,61	63.094,72	R$ 201.903,09	94.048,66	R$ 300.955,70	979.048,47	R$ 3.132.955,09

Assinado por 5 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE SOARES PINTO, GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, RUI BARBOSA e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/E19D-FE7F-6DA6-DC6D e informe o código E19D-FE7F-6DA6-DC6D

CONCORRÊNCIA N° 9.08.02/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CANALIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL DO PRADO E ÁREAS CIRCUNVIZINHAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB

DATA DA OS: 17/10/2025

MEDIÇÃO: 4

PERÍODO SIMPLES: 01/01/2026 31/01/2026

PERÍODO ACUMULADO: 17/10/2025 31/01/2026

MEDIÇÃO Nº: 4 DATA DA EMISSÃO: 12/02/2026 CONTRATO: Nº 2.08.018/2025 VALOR TOTAL DO CONTRATO= 38.554.542,31

VALOR = R$ 38.554.542,31 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R$ 1.918.453,18 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R$ 546.379,42 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL = R$ 2.464.832,60

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
4.2	**ATERRO LATERAL DO CANAL**				**R$ 284.243,72**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 284.243,72**
4.2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m³	R$ 15,18	2.509,75	R$ 38.097,93	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	2.509,75	R$ 38.097,93
4.2.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 Mº - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 Mº / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	R$ 10,64	2.760,72	R$ 29.374,06	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	2.760,72	R$ 29.374,06
4.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 Mº, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R$ 3,20	22.085,76	R$ 70.674,43	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	22.085,76	R$ 70.674,43
4.2.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	m³	R$ 7,65	2.760,72	R$ 21.119,50	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	2.760,72	R$ 21.119,50
4.2.5	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Mº	R$ 45,27	2.760,72	R$ 124.977,80	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	2.760,72	R$ 124.977,80
4.3	**SINALIZAÇÃO**				**R$ 6.567,60**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 6.567,60**
4.3.1	SINALIZACAO ABERTA C ILUMINACAO P/SEGURANCA TRANSITO VEICULOS/PEDESTRES	M	R$ 3,90	1.684,00	R$ 6.567,60	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	1.684,00	R$ 6.567,60
4.4	**ESGOTAMENTO**				**R$ 18.524,00**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 18.524,00**
4.4.1	ESGOTAMENTO D'AGUA C/MOTOBOMBA CAPAC. 1 M3/H (06 MESES)	H	R$ 8,42	2.200,00	R$ 18.524,00	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	2.200,00	R$ 18.524,00
4.5	**FUNDAÇÃO DO CANAL**				**R$ 2.557.498,90**		**R$ -**		**R$ 161.066,88**		**R$ 161.066,88**		**R$ 2.396.432,01**
4.5.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m³	R$ 259,80	3.052,66	R$ 793.080,02	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	3.052,66	R$ 793.080,02
4.5.2	ENROCAMENTO COM PEDRA GRANÍTICA ARRUMADA	m³	R$ 435,26	2.442,12	R$ 1.062.959,24	-	R$ -	353,84	R$ 154.012,20	353,84	R$ 154.012,20	2.088,29	R$ 908.947,03
4.5.3	REGULARIZACAO MANUAL E COMPACTACAO COM PLACA VIBRATÓRIA	Mº	R$ 8,23	8.140,42	R$ 66.995,62	-	R$ -	857,19	R$ 7.054,67	857,19	R$ 7.054,67	7.283,23	R$ 59.940,94
4.5.4	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m³	R$ 259,80	2.442,12	R$ 634.464,02	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	2.442,12	R$ 634.464,02
4.6	**ESTRUTURA DO CANAL**				**R$ 5.266.251,12**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 5.266.251,12**
4.6.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024	m²	R$ 40,62	7.891,94	R$ 320.570,76	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	7.891,94	R$ 320.570,76
4.6.2	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³	R$ 673,72	6.961,95	R$ 4.690.404,14	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	6.961,95	R$ 4.690.404,14
4.6.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m³	R$ 259,80	550,19	R$ 142.938,84	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	550,19	R$ 142.938,84
4.6.4	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m³	R$ 204,18	550,19	R$ 112.337,38	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	550,19	R$ 112.337,38
4.7	**REVESTIMENTO**				**R$ 611.600,57**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 611.600,57**
4.7.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM. PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	R$ 58,94	10.376,66	R$ 611.600,57	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	10.376,66	R$ 611.600,57
4.8	**BARBACÃS**				**R$ 294.624,49**		**R$ -**		**R$ 3.817,32**		**R$ 3.817,32**		**R$ 290.807,17**
4.8.1	DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, SEM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	M	R$ 48,94	5.916,00	R$ 289.529,04	-	R$ -	78,00	R$ 3.817,32	78,00	R$ 3.817,32	5.838,00	R$ 285.711,72
4.8.2	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 09 KN/M	Mº	R$ 9,57	532,44	R$ 5.095,45	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	532,44	R$ 5.095,45
4.9	**ENSECADEIRA**				**R$ 87.768,96**		**R$ -**		**R$ 14.628,16**		**R$ 14.628,16**		**R$ 73.140,80**
4.9.1	ENSECADEIRA C/ SACO DE AREIA C/REMOCAO	m³	R$ 457,13	192,00	R$ 87.768,96	-	R$ -	32,00	R$ 14.628,16	32,00	R$ 14.628,16	160,00	R$ 73.140,80
4.10	**RECUPERAÇÃO DO CANAL EXISTENTE, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO PARCIAL**				**R$ 448.547,02**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 448.547,02**
4.10.1	DEMOLIÇÃO DE PISO E/OU REVESTIMENTO DE PAREDE EM CIMENTADO OU CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE ROMPEDOR ELÉTRICO, SEM REAPROVEITAMENTO.	m³	R$ 187,70	209,92	R$ 39.401,98	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	209,92	R$ 39.401,98
4.10.2	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO CICLÓPICO, COM ROMPEDOR PNEUMATICO , INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m³	R$ 113,13	636,70	R$ 72.029,87	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	636,70	R$ 72.029,87
4.10.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024	m²	R$ 40,62	81,92	R$ 3.327,59	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	81,92	R$ 3.327,59
4.10.4	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³	R$ 673,72	7,66	R$ 5.160,69	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	7,66	R$ 5.160,69
4.10.5	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM. PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	R$ 58,94	3.610,77	R$ 212.818,78	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	3.610,77	R$ 212.818,78
4.10.6	RASPAGEM E EMPILHAMENTO DE MATERIAL ASSORIADO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA.	m³	R$ 198,84	132,42	R$ 26.330,39	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	132,42	R$ 26.330,39
4.10.7	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 Mº - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 Mº / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	R$ 10,64	1.252,49	R$ 13.326,49	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	1.252,49	R$ 13.326,49
4.10.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 Mº, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R$ 3,20	23.797,26	R$ 76.151,23	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	23.797,26	R$ 76.151,23
5.0	**VIAS PROJETADAS**				**R$ 10.859.875,41**		**R$ 320.085,06**		**R$ -**		**R$ 320.085,06**		**R$ 10.539.790,35**
5.1	**TERRAPLENAGEM**				**R$ 10.859.875,41**		**R$ 320.085,06**		**R$ -**		**R$ 320.085,06**		**R$ 10.539.790,35**
5.1.1	**BOTA-FORA**				**R$ 1.144.899,44**		**R$ 320.085,06**		**R$ -**		**R$ 320.085,06**		**R$ 824.814,38**
5.1.1.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	m³	R$ 16,81	2.462,23	R$ 41.390,09	1.615,36	R$ 27.154,24	-	R$ -	1.615,36	R$ 27.154,24	846,87	R$ 14.235,85
5.1.1.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	m³	R$ 22,70	615,56	R$ 13.973,15	538,45	R$ 12.222,91	-	R$ -	538,45	R$ 12.222,91	77,10	R$ 1.750,25

Assinado por 5 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE SOARES PINTO, GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, RUI BARBOSA e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/E19D-FE7F-6DA6-DC6D e informe o código E19D-FE7F-6DA6-DC6D

CONCORRÊNCIA N° 9.08.02/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CANALIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL DO PRADO E ÁREAS CIRCUNVIZINHAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB

DATA DA OS: 17/10/2025

MEDIÇÃO: 4

PERÍODO SIMPLES: 01/01/2026 31/01/2026

PERÍODO ACUMULADO: 17/10/2025 31/01/2026

MEDIÇÃO Nº: 4 DATA DA EMISSÃO: 12/02/2026 CONTRATO: Nº 2.08.018/2025 VALOR TOTAL DO CONTRATO= 38.554.542,31

VALOR = R$ 38.554.542,31 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R$ 1.918.453,18 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R$ 546.379,42 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL = R$ 2.464.832,60

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
5.1.1.3	ESCAVAÇÃO EM 3ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM ROMPEDOR HIDRAÚLICO	m³	R$ 71,25	1.025,93	R$ 73.097,46	538,45	R$ 38.364,85	-	R$ -	538,45	R$ 38.364,85	487,48	R$ 34.732,62
5.1.1.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 Mª - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 Mª / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	R$ 10,64	16.004,50	R$ 170.287,86	3.392,26	R$ 36.093,65	-	R$ -	3.392,26	R$ 36.093,65	12.612,24	R$ 134.194,21
5.1.1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 Mª, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R$ 3,20	264.422,15	R$ 846.150,88	64.452,94	R$ 206.249,42	-	R$ -	64.452,94	R$ 206.249,42	199.969,21	R$ 639.901,45
5.1.2	**ATERRO**				**R$ 9.714.975,97**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 9.714.975,97**
5.1.2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	m³	R$ 17,20	45.363,39	R$ 780.250,34	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	45.363,39	R$ 780.250,34
5.1.2.2	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Mª	R$ 45,27	46.052,12	R$ 2.084.779,55	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	46.052,12	R$ 2.084.779,55
5.1.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 Mª, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R$ 3,20	368.416,97	R$ 1.178.934,31	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	368.416,97	R$ 1.178.934,31
5.1.2.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	R$ 2,34	17.753,53	R$ 41.543,26	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	17.753,53	R$ 41.543,26
5.1.2.5	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	m³	R$ 7,65	57.790,86	R$ 442.100,10	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	57.790,86	R$ 442.100,10
5.1.2.6	ENROCAMENTO COM PEDRA GRANÍTICA ARRUMADA	m³	R$ 443,68	10.652,12	R$ 4.726.131,71	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	10.652,12	R$ 4.726.131,71
5.1.2.7	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m³	R$ 259,80	1.775,35	R$ 461.236,70	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	1.775,35	R$ 461.236,70
6.0	**DRENAGEM**				**R$ 740.086,88**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 740.086,88**
6.1	**ESCAVAÇÕES DAS VALAS**				**R$ 246.061,48**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 246.061,48**
6.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	R$ 10,41	644,00	R$ 6.704,04	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	644,00	R$ 6.704,04
6.1.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	R$ 12,99	515,20	R$ 6.692,44	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	515,20	R$ 6.692,44
6.1.3	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	m³	R$ 190,59	128,80	R$ 24.547,99	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	128,80	R$ 24.547,99
6.1.4	RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	m³	R$ 40,92	128,80	R$ 5.270,49	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	128,80	R$ 5.270,49
6.1.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 Mª - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 Mª / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	R$ 10,64	180,32	R$ 1.918,60	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	180,32	R$ 1.918,60
6.1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 Mª, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R$ 3,20	3.426,08	R$ 10.963,45	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	3.426,08	R$ 10.963,45
6.1.7	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Mª	R$ 45,27	942,60	R$ 42.671,50	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	942,60	R$ 42.671,50
6.1.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 Mª, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R$ 3,20	26.870,57	R$ 85.985,83	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	26.870,57	R$ 85.985,83
6.1.9	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 Mª / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	R$ 16,31	1.131,39	R$ 18.452,97	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	1.131,39	R$ 18.452,97
6.1.10	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	m²	R$ 35,49	1.207,50	R$ 42.854,17	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	1.207,50	R$ 42.854,17
6.2	**TUBULAÇÃO**				**R$ 265.505,54**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 265.505,54**
6.2.1	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	R$ 138,21	700,00	R$ 96.747,00	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	700,00	R$ 96.747,00
6.2.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	R$ 359,67	50,00	R$ 17.983,50	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	50,00	R$ 17.983,50
6.2.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	m³	R$ 289,62	208,00	R$ 60.240,96	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	208,00	R$ 60.240,96
6.2.4	ENROCAMENTO COM PEDRA GRANÍTICA ARRUMADA	m³	R$ 435,26	208,00	R$ 90.534,08	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	208,00	R$ 90.534,08
6.3	**DISPOSITIVOS**				**R$ 228.519,86**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 228.519,86**
6.3.1	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	R$ 1.982,09	100,00	R$ 198.209,00	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	100,00	R$ 198.209,00
6.3.2	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	R$ 3.247,26	7,00	R$ 22.730,82	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	7,00	R$ 22.730,82
6.3.3	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020	M	R$ 2.174,97	1,47	R$ 3.197,20	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	1,47	R$ 3.197,20

Assinado por 5 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE SOARES PINTO, GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, RUI BARBOSA e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/E19D-FE7F-6DA6-DC6D e informe o código E19D-FE7F-6DA6-DC6D

CONCORRÊNCIA Nº 9.08.02/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CANALIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL DO PRADO E ÁREAS CIRCUNVIZINHAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB

DATA DA OS: 17/10/2025

MEDIÇÃO: 4

PERÍODO SIMPLES: 01/01/2026 31/01/2026

PERÍODO ACUMULADO: 17/10/2025 31/01/2026

MEDIÇÃO Nº: 4 | DATA DA EMISSÃO: 12/02/2026 | CONTRATO: Nº 2.08.018/2025 | VALOR TOTAL DO CONTRATO= 38.554.542,31

VALOR = R$ 38.554.542,31 | VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R$ 1.918.453,18 | VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R$ 546.379,42 | VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL = R$ 2.464.832,60

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
6.3.4	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0.6 M. AF 12/2020	UN	R$ 626,12	7,00	R$ 4.382,84	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	7,00	R$ 4.382,84
7.0	**PONTE E PASSARELAS**				**R$ 513.615,08**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 513.615,08**
7.1	**PONTE**				**R$ 305.096,16**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 305.096,16**
7.1.1	ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS, C/ ESCORAS TUBULARES TIPO "B" (H=3,30 A 4,50 M), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	m²	R$ 49,83	157,20	R$ 7.833,27	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	157,20	R$ 7.833,27
7.1.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF 09/2020	m²	R$ 58,25	350,44	R$ 20.413,13	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	350,44	R$ 20.413,13
7.1.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF 06/2022	KG	R$ 11,78	17,20	R$ 202,61	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	17,20	R$ 202,61
7.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	R$ 16,52	17,20	R$ 284,14	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	17,20	R$ 284,14
7.1.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF 06/2022	KG	R$ 11,90	398,20	R$ 4.738,58	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	398,20	R$ 4.738,58
7.1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	R$ 14,76	398,20	R$ 5.877,43	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	398,20	R$ 5.877,43
7.1.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF 06/2022	KG	R$ 10,97	2.643,20	R$ 28.995,90	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	2.643,20	R$ 28.995,90
7.1.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	R$ 13,18	2.643,20	R$ 34.837,37	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	2.643,20	R$ 34.837,37
7.1.9	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF 06/2022	KG	R$ 9,41	265,80	R$ 2.501,17	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	265,80	R$ 2.501,17
7.1.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	R$ 11,09	265,80	R$ 2.947,72	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	265,80	R$ 2.947,72
7.1.11	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF 06/2022	KG	R$ 9,33	2.518,50	R$ 23.497,60	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	2.518,50	R$ 23.497,60
7.1.12	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	R$ 10,76	2.518,50	R$ 27.099,06	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	2.518,50	R$ 27.099,06
7.1.13	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF 06/2022	KG	R$ 10,99	1.509,20	R$ 16.586,10	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	1.509,20	R$ 16.586,10
7.1.14	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	R$ 12,25	1.509,20	R$ 18.487,70	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	1.509,20	R$ 18.487,70
7.1.15	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4", ALT=0,80M, C/1(UM) TUBO HORIZONTAL INTERMEDIÁRIO (4"), E PILARES A CADA 3,00M, EXCLUSIVE OS PILARES	m	R$ 575,66	78,60	R$ 45.246,87	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	78,60	R$ 45.246,87
7.1.16	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA	m³	R$ 691,03	94,85	R$ 65.547,51	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	94,85	R$ 65.547,51
7.2	**PASSARELAS**				**R$ 208.518,92**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 208.518,92**
7.2.1	ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS, C/ ESCORAS TUBULARES TIPO "B" (H=3,30 A 4,50 M), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	m²	R$ 49,83	78,24	R$ 3.898,69	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	78,24	R$ 3.898,69
7.2.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF 09/2020	m²	R$ 58,25	111,10	R$ 6.471,57	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	111,10	R$ 6.471,57
7.2.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF 06/2022	KG	R$ 11,78	28,46	R$ 335,24	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	28,46	R$ 335,24
7.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	R$ 16,52	28,46	R$ 470,14	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	28,46	R$ 470,14
7.2.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF 06/2022	KG	R$ 11,78	68,45	R$ 806,31	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	68,45	R$ 806,31
7.2.6	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	R$ 15,09	68,45	R$ 1.032,88	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	68,45	R$ 1.032,88
7.2.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF 06/2022	KG	R$ 11,90	216,15	R$ 2.572,18	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	216,15	R$ 2.572,18
7.2.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	R$ 14,76	216,15	R$ 3.190,37	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	216,15	R$ 3.190,37
7.2.9	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF 06/2022	KG	R$ 10,97	560,35	R$ 6.147,06	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	560,35	R$ 6.147,06
7.2.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	R$ 13,18	560,35	R$ 7.385,43	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	560,35	R$ 7.385,43
7.2.11	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF 06/2022	KG	R$ 9,41	525,80	R$ 4.947,75	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	525,80	R$ 4.947,75
7.2.12	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	R$ 11,09	525,80	R$ 5.831,09	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	525,80	R$ 5.831,09
7.2.13	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF 06/2022	KG	R$ 11,61	5.325,44	R$ 61.828,35	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	5.325,44	R$ 61.828,35
7.2.14	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	R$ 10,76	5.325,44	R$ 57.301,73	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	5.325,44	R$ 57.301,73
7.2.15	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA	m	R$ 135,35	195,60	R$ 26.474,46	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	195,60	R$ 26.474,46
7.2.16	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=25MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA	m³	R$ 671,82	29,51	R$ 19.825,67	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	29,51	R$ 19.825,67
8.0	**PAVIMENTAÇÃO**				**R$ 4.423.261,92**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 4.423.261,92**
8.1	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2024	m³	R$ 33,70	7.101,41	R$ 239.317,58	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	7.101,41	R$ 239.317,58
8.2	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Mª	R$ 45,27	7.101,41	R$ 321.480,92	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	7.101,41	R$ 321.480,92

Assinado por 5 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE SOARES PINTO, GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, RUI BARBOSA e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/E19D-FE7F-6DA6-DC6D e informe o código E19D-FE7F-6DA6-DC6D

CONCORRÊNCIA N° 9.08.02/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CANALIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL DO PRADO E ÁREAS CIRCUNVIZINHAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB

DATA DA OS: 17/10/2025

MEDIÇÃO: 4

PERÍODO SIMPLES: 01/01/2026 31/01/2026

PERÍODO ACUMULADO: 17/10/2025 31/01/2026

MEDIÇÃO Nº: 4 **DATA DA EMISSÃO:** 12/02/2026 **CONTRATO:** Nº 2.08.018/2025 **VALOR TOTAL DO CONTRATO=** 38.554.542,31

VALOR = R$ 38.554.542,31 **VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR =** R$ 1.918.453,18 **VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL =** R$ 546.379,42 **VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL =** R$ 2.464.832,60

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
8.3	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	m³	R$ 128,07	3.550,71	R$ 454.738,91	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	3.550,71	R$ 454.738,91
8.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	R$ 10,07	8.521,69	R$ 85.813,46	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	8.521,69	R$ 85.813,46
8.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R$ 3,20	68.173,56	R$ 218.155,37	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	68.173,56	R$ 218.155,37
8.6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	m³	R$ 7,65	7.101,41	R$ 54.325,80	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	7.101,41	R$ 54.325,80
8.7	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	m²	R$ 8,30	17.753,53	R$ 147.354,29	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	17.753,53	R$ 147.354,29
8.8	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	R$ 1.703,52	887,68	R$ 1.512.174,67	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	887,68	R$ 1.512.174,67
8.9	DER/PB - 06.000.00 - DEFENSA METALICA REFLETIVA MALEAVEL SIMPLES FORNECIMENTO E APLICACAO	M	R$ 826,24	1.682,20	R$ 1.389.900,92	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	1.682,20	R$ 1.389.900,92
9.0	**CALÇADAS, CICLOVIAS E ÁREAS VERDES**				**R$ 2.343.448,54**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 2.343.448,54**
9.1	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 08 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m	R$ 50,98	3.753,77	R$ 191.367,19	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	3.753,77	R$ 191.367,19
9.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	R$ 44,65	7.212,62	R$ 322.043,48	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	7.212,62	R$ 322.043,48
9.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO, COM A UTILIZAÇÃO DE FIBRA POLIPROPILENO, ACABAMENTO CONVENCIONAL	m³	R$ 1.440,76	968,88	R$ 1.395.923,54	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	968,88	R$ 1.395.923,54
9.4	GRAMA NATIVA CAPIM DE BURRO OU BATATAIS, EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	m²	R$ 23,85	2.912,97	R$ 69.474,33	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	2.912,97	R$ 69.474,33
9.5	CONFECÇÃO DE BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 MM	m	R$ 227,90	1.600,00	R$ 364.640,00	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	1.600,00	R$ 364.640,00
10.0	**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**				**R$ 1.019.169,82**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 1.019.169,82**
10.1	**ILUMINAÇÃO**				**R$ 1.012.304,18**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 1.012.304,18**
10.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	R$ 7,81	366,70	R$ 2.863,92	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	366,70	R$ 2.863,92
10.1.2	CONCRETAGEM COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m³	R$ 677,94	61,10	R$ 41.422,13	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	61,10	R$ 41.422,13
10.1.3	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	R$ 9,77	1.300,00	R$ 12.701,00	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	1.300,00	R$ 12.701,00
10.1.4	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, 0,6/1 KV, 4 CONDUTORES DE 4 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	R$ 214,71	1.900,00	R$ 407.949,00	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	1.900,00	R$ 407.949,00
10.1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	R$ 14,20	40,00	R$ 568,00	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	40,00	R$ 568,00
10.1.6	CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	R$ 16,84	150,00	R$ 2.526,00	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	150,00	R$ 2.526,00
10.1.7	CONEXÃO EM DERIVAÇÃO PARALELA - 6,0-1,5MM² DE EMENDA, PARA CABO MULTIPOLAR 1(4X4,0) MM2. CABO PASSANTE 1,5-6,0MM2 E CABO DERIVADO 1,5-2,5MM2, ACOMPANHADO DE JUNTA COM GEL, CONECTOR DE BORNES PENTA-POLAR ISOLADA E CHAVE SEXTAVADA DE APERTO, GRAU DE PROTEÇÃO IPX8, CONFORME NORMA CEI EN 50393	UN	R$ 22,19	110,00	R$ 2.440,90	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	110,00	R$ 2.440,90
10.1.8	CONEXÃO DE EMENDA - 6,0/1,5MM²: EM DERIVAÇÃO "T" , PARA CABO MULTIPOLAR 1(4X4,0) MM2, DERIVAÇÃO PARA CABO MULTIPOLAR 1(3X1,5)MM2, ACOMPANHADO DE JUNTA COM GEL, SEPARADOR DAS FASES E BRAÇADEIRAS, GRAU DE PROTEÇÃO IPX8, CONFORME NORMA CEI EN 50393	UN	R$ 138,77	110,00	R$ 15.264,70	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	110,00	R$ 15.264,70
10.1.9	BLOQUEADOR DE VAZAMENTO DE CORRENTE: DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE PESSOAS E ANIMAIS CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS EM POSTES METÁLICOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. IP 68;IK 08;CORRENTE DE BLOQUEIO 30MA; MÁXIMA CORRENTE DE CARGA 5A; ALIMENTAÇÃO 220V/60HZ; TEMPO DE ATUAÇÃO < 50MS ; RESET IMÃ; CAIXA COM PROTEÇÃO UV	un	R$ 280,34	104,00	R$ 29.155,36	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	104,00	R$ 29.155,36
10.1.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	R$ 17,09	22,00	R$ 375,98	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	22,00	R$ 375,98
10.1.11	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	R$ 12,19	1.830,00	R$ 22.307,70	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	1.830,00	R$ 22.307,70
10.1.12	DER/PB - 06.000.00 - DEFENSA METALICA REFLETIVA MALEAVEL SIMPLES FORNECIMENTO E APLICACAO	m	R$ 826,24	52,00	R$ 42.964,48	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	52,00	R$ 42.964,48
10.1.13	LUMINÁRIA LED 76W - LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM ALUMÍNIO FUNDIDO LEDHP(LED HIGH POWER), SUPORTE DE MONTAGEM AJUSTÁVEL, FACHO ABERTO, POTÊNCIA 110W, TEMPERATURA DE COR - 4.000K - IRC >70, FLUXO LUMINOSO - 13.600 LUMENS, FATOR DE POTÊNCIA 0,92, TENSÃO 220 V - IP 66, VIDA ÚTIL - 78.000 HORAS, REF:BRP482 LED136 NW 76W DWL P7 0-10 OU SIMILAR	un	R$ 1.495,18	52,00	R$ 77.749,36	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	52,00	R$ 77.749,36

Assinado por 5 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE SOARES PINTO, GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, RUI BARBOSA e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/E19D-FE7F-6DA6-DC6D e informe o código E19D-FE7F-6DA6-DC6D

CONCORRÊNCIA N° 9.08.02/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CANALIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL DO PRADO E ÁREAS CIRCUNVIZINHAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB

DATA DA OS: 17/10/2025

MEDIÇÃO: 4

PERÍODO SIMPLES: 01/01/2026 31/01/2026

PERÍODO ACUMULADO: 17/10/2025 31/01/2026

MEDIÇÃO Nº: 4 | DATA DA EMISSÃO: 12/02/2026 | CONTRATO: Nº 2.08.018/2025 | VALOR TOTAL DO CONTRATO= 38.554.542,31

VALOR = R$ 38.554.542,31 | VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R$ 1.918.453,18 | VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R$ 546.379,42 | VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL = R$ 2.464.832,60

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
10.1.14	POSTE METÁLICO CURVO DUPLO - POSTE METÁLICO DUPLO CURVO COM 12M DE ALTURA ÚTIL, PARA INSTALAÇÃO COM BASE E CHUMBADORES, EM AÇO CARBONO 1010/1020 GALVANIZAÇÃO À FOGO E PINTURA EPOXI, CONFORME NBR 14744 E NBR 6323.	un	R$ 4.695,79	52,00	R$ 244.181,08	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	52,00	R$ 244.181,08
10.1.15	BASE METÁLICA PARA POSTE -BASE METÁLICA PARA POSTE EM CHAPA #3/8" GALVANIZADA A FOGO MEDINDO 0,30X0,30M, CONFORME DETALHE EM ANEXO	UN	R$ 394,58	52,00	R$ 20.518,16	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	52,00	R$ 20.518,16
10.1.16	BASE EM CONCRETO PARA POSTE 0,40X0,40X0,80M	UN	R$ 154,58	52,00	R$ 8.038,16	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	52,00	R$ 8.038,16
10.1.17	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,80X0,80MX0,20M (COM BASE NO ORSE 6415)	UN	R$ 384,09	56,00	R$ 21.509,04	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	56,00	R$ 21.509,04
10.1.18	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,50 X 0,50 X 0,50M	un	R$ 394,21	56,00	R$ 22.075,76	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	56,00	R$ 22.075,76
10.1.19	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	R$ 101,13	52,00	R$ 5.258,76	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	52,00	R$ 5.258,76
10.1.20	GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2	UN	R$ 44,26	52,00	R$ 2.301,52	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	52,00	R$ 2.301,52
10.1.21	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	R$ 41,42	104,00	R$ 4.307,68	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	104,00	R$ 4.307,68
10.1.22	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 31,45	193,50	R$ 6.085,57	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	193,50	R$ 6.085,57
10.1.23	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 26,40	193,50	R$ 5.108,40	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	193,50	R$ 5.108,40
10.1.24	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	R$ 331,03	44,20	R$ 14.631,52	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	44,20	R$ 14.631,52
10.2	**QUADRO DE PROTEÇÃO**				**R$ 1.869,75**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 1.869,75**
10.2.1	CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X40X20 CM	un	R$ 289,69	2,00	R$ 579,38	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	2,00	R$ 579,38
10.2.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	R$ 84,64	2,00	R$ 169,28	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	2,00	R$ 169,28
10.2.3	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	R$ 79,42	2,00	R$ 158,84	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	2,00	R$ 158,84
10.2.4	BARRAMENTO TRIFÁSICO	m	R$ 192,82	2,00	R$ 385,64	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	2,00	R$ 385,64
10.2.5	TRILHO SUPORTE P/ FIXAÇÃO RÁPIDA DIN	M	R$ 13,50	1,00	R$ 13,50	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	1,00	R$ 13,50
10.2.6	POSTE BALIZADOR PARA JARDIM, EM ALUMÍNIO PRETO, + LED 12 W BRANCO FRIO ST1301(STARLUMEN OU SIMILAR)	un	R$ 136,93	2,00	R$ 273,86	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	2,00	R$ 273,86
10.2.7	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 31,45	5,00	R$ 157,25	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	5,00	R$ 157,25
10.2.8	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 26,40	5,00	R$ 132,00	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	5,00	R$ 132,00
10.3	**MEDIÇÃO**				**R$ 4.995,89**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ 4.995,89**
10.3.1	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 40MM, D=1 1/2"	un	R$ 4,63	8,00	R$ 37,04	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	8,00	R$ 37,04
10.3.2	CABEÇOTE DE ALUMÍNIO DE 1 1/2"	un	R$ 19,81	8,00	R$ 158,48	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	8,00	R$ 158,48
10.3.3	CABO DE COBRE NU 16 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (7,04M/KG)	kg	R$ 158,39	5,70	R$ 902,82	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	5,70	R$ 902,82
10.3.4	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO ENERGISA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R$ 345,93	2,00	R$ 691,86	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	2,00	R$ 691,86
10.3.5	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2	UN	R$ 9,12	2,00	R$ 18,24	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	2,00	R$ 18,24
10.3.6	GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2	UN	R$ 44,26	8,00	R$ 354,08	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	8,00	R$ 354,08
10.3.7	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2"	UN	R$ 97,02	2,00	R$ 194,04	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	2,00	R$ 194,04
10.3.8	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	R$ 84,64	2,00	R$ 169,28	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	2,00	R$ 169,28
10.3.9	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM	M	R$ 27,19	12,00	R$ 326,28	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	12,00	R$ 326,28
10.3.10	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	UN	R$ 112,73	1,00	R$ 112,73	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	1,00	R$ 112,73
10.3.11	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	R$ 101,13	6,00	R$ 606,78	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	6,00	R$ 606,78
10.3.12	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2")	UN	R$ 5,35	4,00	R$ 21,40	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	4,00	R$ 21,40
10.3.13	MASSA PARA CALAFETAR JUNTAS	KG	R$ 33,10	2,00	R$ 66,20	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	2,00	R$ 66,20
10.3.14	FILETE DE MÁRMORE BRANCO, 2 CM, PARA ACABAMENTOS	m	R$ 48,15	20,00	R$ 963,00	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	20,00	R$ 963,00
10.3.15	TERMINAL P/ FIO OU CABO, A COMPRESSAO POR INDENTACAO, DE COBREELETROLITICO ESTANHADO. BITOLA 10MM?	Un	R$ 1,66	16,00	R$ 26,56	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	16,00	R$ 26,56
10.3.16	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 31,45	6,00	R$ 188,70	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	6,00	R$ 188,70
10.3.17	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 26,40	6,00	R$ 158,40	-	R$ -	-	R$ -	-	R$ -	6,00	R$ 158,40
				TOTAL =	**R$ 38.554.542,31**		**R$ 1.918.453,18**		**R$ 546.379,42**		**R$ 2.464.832,60**		**R$ 36.089.709,69**

Assinado por 5 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE SOARES PINTO, GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, RUI BARBOSA e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/E19D-FE7F-6DA6-DC6D e informe o código E19D-FE7F-6DA6-DC6D

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CANALIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL DO PRADO E ÁREAS CIRCUNVIZINHAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	SERVIÇOS	ESTACA						QUANTIDADES													OBSERVAÇÃO
		Inicial			Final			COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	ALTURA	VOLUME	EMPOLAMENTO	DENSIDADE	PESO	DMT	MÊS	H	UN	Parciais	Totais	
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO**																				
1.2	ADMINISTRACÃO LOCAL DE OBRA																			**Executado**	**0,91**	
																			0,01	0,01		MEDIÇÃO 01
																			0,27	0,27		MEDIÇÃO 02
																			0,43	0,43		MEDIÇÃO 03
																			0,21	0,21		MEDIÇÃO 04
2.0	**INSTALAÇÕES E CANTEIRO DE OBRAS**																				
2.1	**CANTEIRO DE OBRA**																				
2.1	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)																			**Executado**	**3,00**	
																	1,00			1,00		MEDIÇÃO 02
																	1,00			1,00		MEDIÇÃO 03
																	1,00			1,00		MEDIÇÃO 04
2.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)																			**Executado**	**3,00**	
																	1,00			1,00		MEDIÇÃO 02
																	1,00			1,00		MEDIÇÃO 03
																	1,00			1,00		MEDIÇÃO 04
2.4	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M																			**Executado**	**3,00**	
																	1,00			1,00		MEDIÇÃO 02
																	1,00			1,00		MEDIÇÃO 03
																	1,00			1,00		MEDIÇÃO 04
4.0	**CANAL PRINCIPAL**																				
4.1	**ESCAVAÇÃO DA SEÇÃO DO CANAL**																				
4.1.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020																			**Executado**	**2.958,70**	
												1.292,98			0,60					775,79		MEDIÇÃO 03 (DESVIO E31+0,00 m a 43+8,31 m)
												2.182,91								2.182,91		MEDIÇÃO 04 (SEÇÃO E40+17,83m a 43+19,89 m)
4.1.3	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE RETIRADA. CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021																			**Executado**	**714,09**	
												1.292,98			0,20					258,60		MEDIÇÃO 03 (DESVIO E31+0,00 m a 43+8,31 m)
												455,49								455,49		MEDIÇÃO 04 (SEÇÃO E40+17,83m a 43+19,89 m)
4.1.4	RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021																			**Executado**	**481,35**	
												258,60			0,10					25,86		MEDIÇÃO 03 (DESVIO E31+0,00 m a 43+8,31 m)
												455,49								455,49		MEDIÇÃO 04 (SEÇÃO E40+17,83m a 43+19,89 m)
4.1.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020																			**Executado**	**4.949,93**	
												1.629,15								1.629,15		MEDIÇÃO 03 (DESVIO E31+0,00 m a 43+8,31 m)
												3.320,77								3.320,77		MEDIÇÃO 04 (SEÇÃO E40+17,83m a 43+19,89 m)
4.1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020																			**Executado**	**94.048,66**	
												1.629,15				19,00				30.953,94		MEDIÇÃO 03 (DESVIO E31+0,00 m a 43+8,31 m)
												3.320,77				19,00				63.094,72		MEDIÇÃO 04 (SEÇÃO E40+17,83m a 43+19,89 m)
4.5	**ESCAVAÇÃO DA SEÇÃO DO CANAL**																				
4.5.2	ENROCAMENTO COM PEDRA GRANÍTICA ARRUMADA																			**Executado**	**353,84**	
												353,84								353,84		MEDIÇÃO 04
4.5.3	REGULARIZACAO MANUAL E COMPACTACAO COM PLACA VIBRATÓRIA																			**Executado**	**857,19**	
										857,19										857,19		MEDIÇÃO 04
4.8	**BARBACÃS**																				
4.8.1	DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, SEM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021																			**Executado**	**78,00**	
								0,60											130,00	78,00		MEDIÇÃO 04
4.9	**ENSECADEIRA**																				
4.9.1	ENSECADEIRA C/ SACO DE AREIA C/REMOCAO																			**Executado**	**32,00**	
								40,00	0,40		2,00	32,00								32,00		MEDIÇÃO 04

Assinado por 5 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA, LUIS HENRIQUE SOARES PINTO, GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, RUI BARBOSA e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/E19D-FE7F-6DA6-DC6D e informe o código E19D-FE7F-6DA6-DC6D

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: E19D-FE7F-6DA6-DC6D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- JOAO NETO DE OLIVEIRA (CPF 072.XXX.XXX-04) em 13/02/2026 11:04:32 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- LUIS HENRIQUE SOARES PINTO (CPF 122.XXX.XXX-08) em 13/02/2026 11:16:46 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS (CPF 008.XXX.XXX-35) em 13/02/2026 11:22:28 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- RUI BARBOSA (CPF 113.XXX.XXX-87) em 13/02/2026 11:24:41 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO (CPF 203.XXX.XXX-91) em 13/02/2026 11:32:17 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/E19D-FE7F-6DA6-DC6D
