



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Processo Nº 06280/21

EXERCÍCIO: 2021
SUBCATEGORIA: Termo Aditivo
JURISDICIONADO: Secretaria de Obras e Serviços Urbanos de Campina Grande
DATA DE ENTRADA: 07/04/2021
ASSUNTO: Encaminha Processo de Aditivo para o contrato de Nº 18160/18 do Processo de licitação de número 17330/18 .

INTERESSADOS:
Fernanda Ribeiro Barboza Silva Albuquerque
Helga Valeria Casullo de Araujo
Marco Aurélio de Medeiros Villar



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
COORDENADORIA DE OBRAS

JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE ADITIVO DE VALOR

O Contrato nº 2.08.008/2018, cujo objeto contratual "Recapeamento asfáltico nos Bairros: Alto Branco, Bela Vista, Bodocongó/Ramadinha II, Catolé, Centenário, Centro, Conceição, Cruzeiro, Dinamérica, Distrito Industrial, Estação Velha, Itataré, Jardim Paulistano, Jardim Tavares, José Pinheiro, Liberdade, Malvinas, Monte Santo, Nova Brasília, Novo Bodocongó/Araxá, Palmeira, Prata, Presidente Médici, Quarenta, Ramadinha, Sandra Cavalcante, Santa Cruz, Santa Rosa, Santo Antônio, São José, Serrotão, Tambor, Três Irmãs, Universitário, Velame, Vila Cabral e nos Distritos de Galante e São José da Mata, no município de Campina Grande, Estado da Paraíba", precisará de um aditivo ao Contrato no valor de R\$3.536.449,97 (Três milhões, quinhentos e trinta e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos), para a inclusão de novas ruas, e pagamentos de serviços que foram executados a mais, diferentemente dos que estavam inicialmente previstos no orçamento básico, com estas intervenções estamos melhorando substancialmente a mobilidade urbana da cidade conforme relação das ruas beneficiadas ou corrigidas nos seus valores mostrados logo abaixo:

1.0	RUA ODON BEZERRA	R\$	32.665,92
2.0	ENTRE CANTEIROS DA RUA DAS JUREMAS	R\$	34.461,96
3.0	RUA MANOEL PEREIRA DE ARAÚJO	R\$	1.627,60
4.0	RUA RAFAELA DE SOUZA E SILVA	R\$	314.105,08
5.0	RUA SERGIPE	R\$	34.610,92
6.0	RUA CAPITÃO JOÃO DE SÁ	R\$	1.893,42
7.0	RUAS DOS PAUS D'ARCOS	R\$	148.856,66
8.0	RUA DAS UMBURANAS	R\$	17.400,97
9.0	RUA SANTA FILOMENA	R\$	64.312,87
10.0	AV. FLORIANO PEIXOTO II	R\$	118.986,36
11.0	RUA FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA	R\$	24.670,72
12.0	RUA FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO	R\$	134,04
13.0	RUA ANTONIO GUEDES DE ANDRADE	R\$	3.181,92
14.0	RUA 24 DE MAIO	R\$	3.728,29
15.0	RUA ALAGOAS	R\$	2.904,84
16.0	RUA EDUARDO DE OLIVEIRA LOBO		22.158,45
17.0	RUA GUILHERMINO BARBOSA	R\$	4.698,84
18.0	RUA LUIZ RODRIGUES ALBUGUERQUE	R\$	1.000,26
19.0	RUA MINAS GERAIS	R\$	4.438,03

Adriano Gomes do Nascimento

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
COORDENADORIA DE OBRAS

20.0	RUA OLEGÁRIO AZEVEDO	R\$	3.149,15
21.0	RUA JOÃO MIGUEL LEÃO	R\$	105.050,99
22.0	AV. CONSUL JOSEPH NOUJAIM HABIB NACAD	R\$	2.511.704,73
23.0	RUA ANA DE ALMEIDA CASTRO	R\$	15.279,41
24.0	RUA DA REPÚBLICA	R\$	44.761,58
25.0	RUA ADEMAR DE MAIA PAIVA (DRENAGEM)	R\$	10.757,28
26.0	CONTROLE TECNOLÓGICO	R\$	9.819,68
TOTAL		R\$	3.536.449,97

Importa o presente aditivo em R\$ 3.536.449,97 (Três milhões, quinhentos e trinta e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos), total de aditivos acumulados neste contrato 16,43%.

Campina Grande, 04 de fevereiro de 2021.

Adriano Gomes do Nascimento
PMCG/SECOB - Coordenador
de Planejamento de Obras

ADRIANO GOMES DO NASCIMENTO

Coordenador de Planejamento Obras SECOB/PMCG

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE

Francisco de Jesus D. Xavier
Eng. Civil - CREA-PB Nº 190.283684-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIROS ALTO BRANCO, BELA VISTA, BODOCONGÓ, RAMADINHA II, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CENTRO, CONCEIÇÃO, CRUZEIRO, DINAMÉRICA, DISTRITO INDUSTRIAL, ITARARÉ, JARDIM PAULISTANO, JARDIM TAVARES, JOSÉ PINHEIRO, LIBERDADE, MALVINAS, MONTE SANTO, NOVA BRÁSILIA, NOVO BODOCONGÓ, ARAXÁ, PALMEIRA, PRESIDENTE MÉDICI, QUARENTA, RAMADINHA, SANDRA CAVALCANTE, SANTA CRUZ, SANTA ROSA, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTÃO, TAMBOR, TRÊS IRMÃS, UNIVERSITÁRIO, VELAME, VILA CABRAL E NOS DISTRITOS DE GALENTE E SÃO JOSÉ DA MATA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE NO ESTADO PARAÍBA

**04ª ADEQUAÇÃO AO
PROJETO**
CONTRATO 2.08.008/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIROS ALTO BRANCO, BELA VISTA, BODOCONGÓ, RAMADINHA II, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CENTRO, CONCEIÇÃO, CRUZEIRO, DINAMÉRICA, DISTRITO INDUSTRIAL, ITARARÉ, JARDIM PAULISTANO, JARDIM TAVARES, JOSÉ PINHEIRO, LIBERDADE, MALVINAS, MONTE SANTO, NOVA BRÁSILIA, NOVO BODOCONGÓ, ARAXÁ, PALMEIRA, PRESIDENTE MÉDICI, QUARENTA, RAMADINHA, SANDRA CAVALCANTE, SANTA CRUZ, SANTA ROSA, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTÃO, TAMBOR, TRÊS IRMÃS, UNIVERSITÁRIO, VELAME, VILA CABRAL E NOS DISTRITOS DE GALENTE E SÃO JOSÉ DA MATA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE NO ESTADO PARAÍBA

FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB				DATA BASE: MAR/2018	
SECRETARIA DE OBRAS				BDI = 26,85%	
4º ADEQUAÇÃO AO PROJETO DO CONTRATO 2.08.008/2018					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNIDADE	QUANTIDADES	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1.0	RUA ODON BEZZERA				R\$ 32.656,92
1.1	SERVÇOS PRELIMINARES				13,65
1.1.1	Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	40,17	0,34	13,65
1.2	SERVÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				31.477,87
1.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	1.084,44	1,70	1.843,54
1.2.2	CBUQ				
1.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ , camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF 03/2017. - Capa	m³	16,27	929,37	15.120,84
1.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ , BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF 03/2017.	m³	16,27	869,16	14.141,23
1.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	32,54	4,03	131,13
1.2.4	Transporte com caminhão basculante de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³xkm	211,52	1,14	241,13
1.3	CONTROLE TECNOLÓGICO				1.164,40
1.3.1	Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	3,00	203,77	611,31
1.3.2	Ensaio de granulometria do agregado	ud	2,00	58,22	116,44
1.3.3	Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	3,00	145,55	436,65
2.0	ENTRE CANTEIROS DA RUA DAS JUREMAS				R\$ 34.461,96
2.1	SERVÇOS PRELIMINARES				20,16
2.1.1	Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	59,31	0,34	20,16
2.2	SERVÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				33.277,40
2.2.3	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	1.148,24	1,70	1.952,00
2.2.2	CBUQ				
2.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ , camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF 03/2017. - Capa	m³	17,22	929,37	16.003,75
2.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ , BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF 03/2017.	m³	17,22	869,16	14.966,93
2.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	34,44	4,03	138,79
2.3.4	Transporte com caminhão basculante de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³xkm	189,42	1,14	215,93
2.3	CONTROLE TECNOLÓGICO				1.164,40
2.3.1	Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	3,00	203,77	611,31
2.3.2	Ensaio de granulometria do agregado	ud	2,00	58,22	116,44
2.3.3	Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	3,00	145,55	436,65
3.0	RUA MANOEL PEREIRA ARAUJO				R\$ 1.627,60
3.2	SERVÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				1.627,60
3.2.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	m³	4,87	7,56	36,81
3.2.2	Carga, transporte e descarga mecânica de material (bota-fora)	m³	6,81	5,79	39,42
3.2.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por BGS	m³	6,81	120,83	822,85
3.2.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT	m³ x km	68,81	1,67	114,91
3.2.5	Retirada e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3 (cimento e areia), com aproveitamento do paralelepípedo	m²	12,17	50,42	613,61
4.0	RUA RAFAELA DE SOUZA E SILVA				R\$ 314.106,08
4.1	SERVÇOS PRELIMINARES				162,03
4.1.1	Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	447,16	0,34	152,03
4.2	SERVÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				310.459,85
4.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	10.681,56	1,70	18.158,65
4.2.2	CBUQ				
4.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ , camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF 03/2017. - Capa	m³	160,22	929,37	148.903,66
4.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ , BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF 03/2017.	m³	160,22	869,16	139.256,81
4.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	320,44	4,03	1.291,37
4.2.4	Transporte com caminhão basculante de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³xkm	2.499,44	1,14	2.849,36
4.3	CONTROLE TECNOLÓGICO				3.493,20
4.3.1	Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	9,00	203,77	1.833,93
4.3.2	Ensaio de granulometria do agregado	ud	6,00	58,22	349,32
4.3.3	Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	9,00	145,55	1.309,95
5.0	RUA SERGIPE				R\$ 34.610,92
5.1	SERVÇOS PRELIMINARES				22,10
5.1.1	Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	65,02	0,34	22,10
5.2	SERVÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				33.424,42
5.2.1	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	1.151,98	1,70	1.958,36
5.2.2	CBUQ				
5.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ , camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF 03/2017. - Capa	m³	17,28	929,37	16.059,51
5.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ , BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF 03/2017.	m³	17,28	869,16	15.019,08
5.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	34,56	4,03	139,27
5.2.4	Transporte com caminhão basculante de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³xkm	217,72	1,14	248,20
5.3	CONTROLE TECNOLÓGICO				1.164,40
5.3.1	Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	3,00	203,77	611,31
5.3.2	Ensaio de granulometria do agregado	ud	2,00	58,22	116,44
5.3.3	Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	3,00	145,55	436,65
6.0	RUA CAPITÃO JOÃO DE SÁ				R\$ 1.893,42
6.2	SERVÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				1.893,42
6.2.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	m³	6,48	7,56	48,98
6.2.2	Carga, transporte e descarga mecânica de material (bota-fora)	m³	9,07	5,79	52,51
6.2.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por BGS	m³	9,07	120,83	1.095,92
6.2.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT	m³ x km	90,71	1,67	151,48
6.2.5	Retirada e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia, espessura 10 cm, rejuntado com	m²	10,80	50,42	544,53
7.0	RUA DOS PAUS DARCOS				R\$ 148.866,66
7.1	SERVÇOS PRELIMINARES				164,32

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE

Adriano Gomes do Nascimento



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB

DATA BASE: MAR/2018

SECRETARIA DE OBRAS

BDI = 26,85%

4ª ADEQUAÇÃO AO PROJETO DO CONTRATO 2.08.008/2018

Table with columns: ITEM, DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO, UNIDADE, QUANTIDADES, PREÇO UNIT., and PREÇO TOTAL. It lists various construction services like paving, transport, and site preparation for multiple streets.

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE

Adriano Gomes do Nascimento

PRGCG/SECOPB - Coordenador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB				DATA BASE: MAR/2018	
SECRETARIA DE OBRAS				BDI = 26,85%	
4º ADEQUAÇÃO AO PROJETO DO CONTRATO 2.08.008/2018					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNIDADE	QUANTIDADES	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
16.1.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por BGS	m²	133,64	120,83	16.147,72
16.1.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT	m³ x km	1.162,63	1,67	1.941,59
16.1.5	Retirada e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia, espessura 10 cm, rejuntado com	m²	53,03	50,42	2.673,77
17.0	RUA GUILHERMINO BARBOSA				4.698,84
17.1	SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO				4.698,84
17.1.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	m²	14,40	7,56	108,86
17.1.2	Carga, transporte e descarga mecânica de material (bota-fora)	m³	20,16	5,79	116,72
17.1.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por BGS	m²	20,16	120,83	2.435,93
17.1.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT	m³ x km	133,06	1,67	222,21
17.1.5	Retirada e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia, espessura 10 cm, rejuntado com	m²	36,00	50,42	1.815,12
18.0	RUA LUIZ ROGRIGUES DE ALBUQUERQUE				1.000,26
18.1	SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO				1.000,26
18.1.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	m²	2,95	7,56	22,30
18.1.2	Carga, transporte e descarga mecânica de material (bota-fora)	m³	4,12	5,79	23,85
18.1.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por BGS	m²	4,12	120,83	497,81
18.1.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT	m³ x km	50,73	1,67	84,71
18.1.5	Retirada e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia, espessura 10 cm, rejuntado com	m²	7,37	50,42	371,59
19.0	RUA MINAS GERAIS				4.438,03
19.1	SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO				4.438,03
19.1.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	m²	13,48	7,56	101,90
19.1.2	Carga, transporte e descarga mecânica de material (bota-fora)	m³	18,88	5,79	109,31
19.1.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por BGS	m²	18,88	120,83	2.281,27
19.1.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT	m³ x km	147,25	1,67	245,90
19.1.5	Retirada e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia, espessura 10 cm, rejuntado com	m²	33,71	50,42	1.699,65
20.0	RUA OLEGÁRIO AZEVEDO				3.149,16
20.1	SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO				3.149,16
20.1.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	m²	9,54	7,56	72,12
20.1.2	Carga, transporte e descarga mecânica de material (bota-fora)	m³	13,36	5,79	77,35
20.1.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por BGS	m²	13,36	120,83	1.614,28
20.1.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT	m³ x km	109,52	1,67	182,89
20.1.5	Retirada e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia, espessura 10 cm, rejuntado com	m²	23,85	50,42	1.202,51
21.0	RUA JOÃO MIGUEL LEÃO				R\$ 105.050,99
21.1	SERVICOS PRELIMINARES				86,51
21.1.1	Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	254,45	0,34	86,51
21.2	SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO				103.800,08
21.2.1	Pintura de lição com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	3.539,90	1,70	6.017,83
21.2.2	CBUQ				
21.2.2.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF 03/2017. - Capa	m²	53,10	929,37	49.349,54
21.2.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF 03/2017.	m²	53,10	869,16	46.152,39
21.2.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	106,20	4,03	427,98
21.2.4	Transporte com caminhão basculante de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³xkm	1.624,86	1,14	1.852,34
21.3	CONTROLE TECNOLÓGICO				1.164,40
21.3.1	Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	3,00	203,77	611,31
21.3.2	Ensaio de granulometria do agregado	ud	2,00	58,22	116,44
21.3.3	Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	3,00	145,55	436,65
22.0	AV. CONSUL JOSEPH NOUJAIM HABIB NACAD				R\$ 2.511.704,73
22.1	SERVICOS PRELIMINARES				994,50
22.1.1	Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	2.925,01	0,34	994,50
22.2	SERVICOS DE TERRAPLENAGEM				89.254,29
22.2.1	Escavação, carga e descarga de material de 1ª categoria (remoção de base + capa de CBUQ = 20 + 5 = 25 cm)	m³	739,24	1,67	1.234,53
22.2.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em rodovia pavimentada, DMT 80 a 1000 m + carga, manobras e descarga de solos e agregados, descarga em distribuidor (BOTA FORA)	m³	924,05	7,50	6.930,37
22.2.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 Km (unidade m³ x km). AF 09/2016 (MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE BOTA FORA)	m³ x km	6.375,95	1,25	7.969,93
22.2.4	Regularização do subleito	m²	2.956,96	1,41	4.169,31
22.2.5	Execução de base em brita graduada simples	m²	591,39	112,56	66.566,85
22.2.6	Carga, manobras e descarga de brita, areia, pedra de mão e solos com caminhão basculante de 10 m³.	m³	591,39	4,03	2.383,30
22.3	SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO				2.399.332,34
22.3.1	Fresagem de material betuminoso	m²	43.615,89	5,30	231.164,21
22.3.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ em via urbana pavimentada, DMT até 30 km. AF 09/2016	m³ x km	2.180,79	1,25	2.725,98
22.3.3	Imprimação	m²	2.956,96	3,14	9.284,85
22.3.4	Pintura de lição com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	46.572,85	1,70	79.173,84
22.3.5	CBUQ				
22.3.5.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF 03/2017. - Capa	m²	2.328,65	880,03	2.049.281,85
22.3.6	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	2.328,65	4,03	9.384,45
22.3.7	Transporte com caminhão basculante de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³xkm	16.067,69	1,14	18.317,16
22.4	CONTROLE TECNOLÓGICO				22.123,60
22.4.1	Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	57,00	203,77	11.614,89
22.4.2	Ensaio de granulometria do agregado	ud	38,00	58,22	2.212,36
22.4.3	Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	57,00	145,55	8.296,35
23.0	RUA ANA ALMEIDA DE CASTRO				15.279,41
23.1	SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO				15.279,41
23.1.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	m²	46,30	7,56	350,02
23.1.2	Carga, transporte e descarga mecânica de material (bota-fora)	m³	64,81	5,79	375,24
23.1.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por BGS	m²	64,81	120,83	7.830,99
23.1.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT	m³ x km	531,47	1,67	887,55
23.1.5	Retirada e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia, espessura 10 cm, rejuntado com	m²	115,74	50,42	5.835,61
24.0	RUA DA REPÚBLICA				44.761,58
24.1	SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO				44.761,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB

DATA BASE: MAR/2018

SECRETARIA DE OBRAS

BDI = 26,85%

4ª ADEQUAÇÃO AO PROJETO DO CONTRATO 2.08.008/2018

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNIDADE	QUANTIDADES	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
24.1.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	m³	135,62	7,56	1.025,28
24.1.2	Carga, transporte e descarga mecânica de material (bota-fora)	m³	189,87	5,79	1.099,34
24.1.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por BGS	m²	189,87	120,83	22.941,99
24.1.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT	m³ x km	1.556,93	1,67	2.600,07
24.1.5	Retirada e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia, espessura 10 cm, rejuntado com	m²	339,05	50,42	17.094,90
25.0	RUA ADEMAR DE MAIA PAIVA (DREGANEM)				10.757,28
25.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				10.757,28
25.1.1	Escavação mecânica de vala com retroescavadeira, Profundidade até 1,5m com solo argilo arenoso	m³	90,00	11,29	1.016,10
25.1.2	Carga, manobras e descarga de brita, areia, pedra de mão e solos com caminhão basculante de 10 m³.	m³	126,00	4,03	507,78
25.1.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 Km (unidade m³	m³ x km	1.625,40	1,25	2.031,75
25.1.4	Execução de dreno com tubo de PVC corrugado flexível - DN100	m³	90,00	26,21	2.358,90
25.1.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ em via urbana pavimentada, DMT até 30 km. AF 09/2016	m³ x km	1.625,40	1,25	2.031,75
25.1.6	Reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de pó de pedra, rejunte com pedrisco e betume	m	60,00	46,85	2.811,00
26.0	CONTROLE TECNOLÓGICO				9.819,68
26.0.1	Ensaio de Penetração	ud	16,00	98,95	1.583,20
26.0.2	Ensaio de viscosidade Saybolt - Furol - Material Betuminoso	ud	16,00	128,06	2.048,96
26.0.3	Ensaio ponto de fulgor - material betuminoso	ud	16,00	93,14	1.490,24
26.0.4	Ensaio de susceptibilidade térmica - Índice Pfeiffer - material asfáltico	ud	16,00	145,55	2.328,80
26.0.5	Ensaio de espuma - amterial asfáltico	ud	16,00	104,79	1.676,64
26.0.6	Ensaio de densidade de material betuminoso	ud	16,00	43,24	691,84
VALOR DA 4ª ADEQUAÇÃO DO PROJETO					R\$ 3.536.449,97
VALOR DO CONTRATO					0% R\$ 32.366.497,82
VALOR DA 1ª ADEQUAÇÃO DO PROJETO					4,54% R\$ 1.471.026,66
VALOR DA 2ª ADEQUAÇÃO DO PROJETO					0,62% R\$ 201.141,98
VALOR DA 3ª ADEQUAÇÃO DO PROJETO					0,34% R\$ 109.236,74
VALOR DA 4ª ADEQUAÇÃO DO PROJETO					10,93% R\$ 3.536.449,97
VALOR TOTAL DE ADEQUAÇÕES ACUMULADO					116,43% R\$ 37.684.353,07

Campina Grande, 30 de novembro de 2020

LOCAL E DATA

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
 Engº Civil - CREA-PB Nº 160.263594-2

Adriano Gomes do Nascimento
 PMCG/SECOB - Coordenador
 de Planejamento de Obras



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIROS ALTO BRANCO, BELA VISTA, BODOCONGÓ, RAMADINHA II, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CENTRO, CONCEIÇÃO, CRUZEIRO, DINAMÉRICA, DISTRITO INDUSTRIAL, ITARARÉ, JARDIM PAULISTANO, JARDIM TAVARES, JOSÉ PINHEIRO, LIBERDADE, MALVINAS, MONTE SANTO, NOVA BRASÍLIA, NOVO BODOCONGÓ, ARAXÁ, PALMEIRA, PRESIDENTE MÉDICI, QUARENTA, RAMADINHA, SANDRA CAVALCANTE, SANTA CRUZ, SANTA ROSA, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTÃO, TAMBOR, TRÊS IRMÃS, UNIVERSITÁRIO, VELAME, VILA CABRAL E NOS DISTRITOS DE GALENTE E SÃO JOSÉ DA MATA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE NO ESTADO PARAÍBA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE OBRAS
MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	SERVIÇOS	ESTACA		Comprimento (módulo)	Largura (módulo)	Área (Autocção)	Altura	Volume	N.V	Empo.	DMT	QUANTIDADES		OBSERVAÇÃO
		Inicial	Final									Parciais	Totais	
2.1.1	2.1.1.1 RUA ODON BEZERRA SERVIÇOS PRELIMINARES Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	0,00 + 0,00	2,00 + 0,17	40,17								40,17 Total:	40,17 m²	Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
2.1.1	2.1.1.2 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	0,00 + 0,00	2,00 + 0,17	40,17	13,50	542,22	0,03	16,27	1,00			16,27 Total:	1084,44 m²	Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
2.1.1	2.1.1.3 CBUQ Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF 03/2017 - Capa	0,00 + 0,00	2,00 + 0,17	40,17	13,50	542,22	0,03	16,27	1,00			16,27 Total:	16,27 m³	Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
2.1.2	2.1.2.1 Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF 03/2017.	0,00 + 0,00	2,00 + 0,17	40,17	13,50	542,22	0,03	16,27	1,00			16,27 Total:	16,27 m³	Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
2.1.2	2.1.2.2 Carro, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibrador											16,27 Total:	32,54 m³	[VIDE CBUQ CAPA] [VIDE CBUQ REPERFILAMENTO]
2.1.2	2.1.2.3 Transporte com caminhão basculante de 10m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana											105,76 6,50 Total:	211,92 m³ x km	[VIDE CBUQ CAPA] [VIDE CBUQ REPERFILAMENTO]
2.1.3	2.1.3.1 CONTROLE TECNOLÓGICO Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente									3,00		3,00 Total:	3,00 Unidade	
2.1.3	2.1.3.2 Ensaio de granulometria do agregado									2,00		2,00 Total:	2,00 Unidade	
2.1.3	2.1.3.3 Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas									3,00		3,00 Total:	3,00 Unidade	
2.1.1	2.1.1.1 ENTRE CARTEIROS DA RUA DAS JUREMAS SERVIÇOS PRELIMINARES Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	0,00 + 0,00	0,00 + 11,12	11,12								11,12 11,10 11,30 11,79 14,00 Total:	59,31 m²	Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente) Trecho 02 (Valores Levantados Topograficamente) Trecho 03 (Valores Levantados Topograficamente) Trecho 04 (Valores Levantados Topograficamente) Trecho 05 (Valores Levantados Topograficamente)
2.1.2	2.1.2.1 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	0,00 + 0,00	0,00 + 11,12	11,12	15,33	170,51			2,00			341,02 170,20 176,24 182,92 276,86 Total:	1148,24 m²	Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente) Trecho 02 (Valores Levantados Topograficamente) Trecho 03 (Valores Levantados Topograficamente) Trecho 04 (Valores Levantados Topograficamente) Trecho 05 (Valores Levantados Topograficamente)
2.1.2	2.1.2.2 CBUQ Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF 03/2017 - Capa	0,00 + 0,00	0,00 + 11,12	11,12	15,33	170,51	0,03	5,12	1,00			5,12 2,55 2,64 2,76 4,15 Total:	17,22 m³	Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente) Trecho 02 (Valores Levantados Topograficamente) Trecho 03 (Valores Levantados Topograficamente) Trecho 04 (Valores Levantados Topograficamente) Trecho 05 (Valores Levantados Topograficamente)
2.1.2	2.1.2.3 Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF 03/2017.	0,00 + 0,00	0,00 + 11,12	11,12	15,33	170,51	0,03	5,12	1,00			5,12 2,55 2,64 Total:	17,22 m³	Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente) Trecho 02 (Valores Levantados Topograficamente) Trecho 03 (Valores Levantados Topograficamente)

Adriano Gomes do Nascimento
PMCG/SECOB - Coordenador
de Planejamento de Obras

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xist.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE OBRAS
MEMÓRIA DE CÁLCULO

SERVIÇOS	ESTACA		Comprimento (metros)	Largura (módulo)	Área (módulo)	Altura	Volume	N.V	Empo.	DMT	QUANTIDADES		OBSERVAÇÃO
	Inicial	Final									Parciais	Totais	
Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-escavadora	0,00 + 0,00	0,00 + 11,79	11,79	7,80	91,96	0,03	2,76	1,00			2,76		Trecho 04 (Valores Levantados Topográficamente)
	0,00 + 0,00	0,00 + 14,00	14,00	9,89	136,43	0,03	4,15	1,00			4,15		Trecho 05 (Valores Levantados Topográficamente)
													Total: 17,22 m³
Transporte com caminhão basculante de 10m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana							17,22	1,00			17,22		(VIDE CBUQ CAPA)
							17,22	1,00			17,22		(VIDE CBUQ REPERFILAMENTO)
													Total: 34,44 m³
CONTOLE TECNOLÓGICO													(VIDE CBUQ CAPA)
Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente							17,22	1,00			17,22		(VIDE CBUQ REPERFILAMENTO)
							17,22	1,00			17,22		(VIDE CBUQ REPERFILAMENTO)
													Total: 189,42 m³ x km
Ensaio de granulometria do agregado													
Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas													
													Total: 3,00 Unidade
RUA MANOEL PEREIRA ARAUJO.													
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO													
Retirada de material de baixo suporte "borrachudo" exclusive bota-fora	0,00 + 0,00	6,00 + 1,65	121,65	5,00	608,25	0,40	245,30	0,02			4,87		Trecho 01
													Total: 4,87 m³
Carga, transporte e descarga mecânica de material (bota-fora)	0,00 + 0,00	6,00 + 1,65	121,65	5,00	608,25	0,40	245,30	0,02	1,40		6,81		Trecho 01
													Total: 6,81 m³
Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo, inclusive transporte e compactação	0,00 + 0,00	6,00 + 1,65	121,65	5,00	608,25	0,40	245,30	0,02	1,40		6,81		Trecho 01
													Total: 6,81 m³
Momento Extraordinário de Transporte - DMT	0,00 + 0,00	6,00 + 1,65	121,65	5,00	608,25	0,40	245,30	0,02	1,40	10,10	68,81		Trecho 01
													Total: 68,81 m³ x km
Retirada e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no treço 1:3 (cimento e areia), com aproveitamento do paralelepípedo	0,00 + 0,00	6,00 + 1,65	121,65	5,00	608,25						12,17		Trecho 01
													Total: 12,17 m²
RUA RAFAELA DE SOUZA E SILVA													
SERVIÇOS PRELIMINARES													
Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	0,00 + 0,00	22,00 + 7,16	447,16								447,16		Trecho 01 (Valores Levantados Topográficamente)
													Total: 447,16 m²
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO													
Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte.	0,00 + 0,00	22,00 + 7,16	447,16	11,90	5322,15			2,00			10,644,30		Trecho 01 (Valores Levantados Topográficamente)
													Rua Sem Nome (Valores Levantados Topográficamente)
													Total: 10681,56 m²
CBUQ													
Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	0,00 + 0,00	22,00 + 7,16	447,16	11,90	5322,15	0,03	159,66	1,00			159,66		Trecho 01 (Valores Levantados Topográficamente)
													Rua Sem Nome (Valores Levantados Topográficamente)
													Total: 160,22 m³
Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDEK, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017.	0,00 + 0,00	22,00 + 7,16	447,16	11,90	5322,15	0,03	159,66	1,00			159,66		Trecho 01 (Valores Levantados Topográficamente)
													Rua Sem Nome (Valores Levantados Topográficamente)
													Total: 160,22 m³
Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-escavadora													(VIDE CBUQ CAPA)
													(VIDE CBUQ REPERFILAMENTO)
													Total: 160,22 m³
													Total: 320,44 m³

Adriano Gomes do Nascimento
PMCG/SECOB - Coordenador
de Planejamento de Obras

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
Francisco de Jesus

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE OBRAS
MEMÓRIA DE CÁLCULO

SERVIÇOS	ESTACA		Comprimento (AutoCAD)	Largura (módulo)	Área (AutoCAD)	Altura	Volume	N.V	Empo.	DMT	QUANTIDADES		OBSERVAÇÃO
	Inicial	Final									Parciais	Totais	
Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibrador							15,73	1,00			15,73	15,73	(VIDE CBUQ, CAPA)
Transporte com caminhão basculante de 10m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana							15,73			5,40	84,94	84,94	(VIDE CBUQ, CAPA)
CONTROLE TECNOLÓGICO								3,00			3,00	3,00	Unidade
Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente								2,00			2,00	2,00	Unidade
Ensaio de granulometria do agregado								3,00			3,00	3,00	Unidade
Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas													
AV. FLORIANO PEIMOTO II													
SERVIÇOS PRELIMINARES													
Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	0,00 + 0,00	6,00 + 12,28	132,28	8,21	1085,61	0,03	32,57	1,00			32,57	32,57	Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO													
pintura de lição com emulsão RR-2C- inclusive equalização e transporte	0,00 + 0,00	6,00 + 12,28	132,28	8,21	1085,61			2,00			2,171,22	2171,22	Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
CBUQ													
Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Unificado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	0,00 + 0,00	6,00 + 12,28	132,28	8,21	1085,61		32,57	1,00			32,57	32,57	Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Unificado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017.	0,00 + 0,00	6,00 + 12,28	132,28	8,21	1085,61		32,57	1,00			32,57	32,57	Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibrador							32,57	1,00			32,57	32,57	(VIDE CBUQ, CAPA)
Transporte com caminhão basculante de 10m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana							32,57				32,57	32,57	(VIDE CBUQ, REPERFILAMENTO)
CONTROLE TECNOLÓGICO								3,00			3,00	3,00	Unidade
Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente								2,00			2,00	2,00	Unidade
Ensaio de granulometria do agregado								3,00			3,00	3,00	Unidade
Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas													
AV. FLORIANO PEIMOTO II													
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO													
Fresagem de material betuminoso	0,00 + 0,00	57,00 + 7,28	1147,28	9,93	11398,18		11,398,18	1,00			11,398,18	11,398,18	Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
	0,00 + 0,00	57,00 + 2,39	1142,59	9,45	10790,42		10,790,42	1,00			10,790,42	10,790,42	Trecho 02 (Valores Levantados Topograficamente)
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ em via urbana pavimentada, DMT até 30 km. AF_09/2016 - Momento Extraordinário de obra fora.							22186,60	0,05	1,00		1109,43	1109,43	(VIDE FRESAGEM)
AV. FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA													
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO													
Impressão	26,80 + 5,76	71,00 + 1,19	895,43	8,77	7856,92			1,00			7,856,92	7,856,92	Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)

Adriano Gomes do Nascimento
PMCG/SECOB - Coordenador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE OBRAS
MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	SERVIÇOS	ESTACA		Comprimento (AutoCAD)	Largura (módulo)	Área (AutoCAD)	Altura	Volume	N.V	Empo.	DMT	QUANTIDADES		OBSERVAÇÃO
		Inicial	Final									Parciais	Totais	
15.1.1	RUA FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO Imprimado	0,00 + 0,00	0,00 + 6,00	6,00	7,12	42,69			1,00			42,69 Total:	42,69 m²	Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente)
15.1.1	RUA ANTONIO GUEDES DE ANDRADE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	0,00 + 0,00	12,00 + 0,00	240,00	5,00	1200,00	0,40	480,00	0,02			9,60 Total:	9,60 m³	Trecho 01
15.1.2	Carga, transporte e descarga mecânica de material (bota-fora)	0,00 + 0,00	12,00 + 0,00	240,00	5,00	1200,00	0,40	480,00	0,02	1,40		13,44 Total:	13,44 m³	Trecho 01
15.1.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo, inclusive transporte e compactação	0,00 + 0,00	12,00 + 0,00	240,00	5,00	1200,00	0,40	480,00	0,02	1,40		13,44 Total:	13,44 m³	Trecho 01
15.1.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT	0,00 + 0,00	12,00 + 0,00	240,00	5,00	1200,00	0,40	480,00	0,02	1,40	9,80	118,27 Total:	118,27 m³ x km	Trecho 01
15.1.5	Retirada e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3 (cimento e areia), com aproveitamento do paralelepípedo	0,00 + 0,00	12,00 + 0,00	240,00	5,00	1200,00			0,02			24,00 Total:	24,00 m²	Trecho 01
15.1.1	RUA 24 DE MAIO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	0,00 + 0,00	17,00 + 0,00	340,00	5,00	1700,00	0,30	510,00	0,02			10,20 Total:	10,20 m³	Trecho 01
15.1.2	Carga, transporte e descarga mecânica de material (bota-fora)	0,00 + 0,00	17,00 + 0,00	340,00	5,00	1700,00	0,30	510,00	0,02	1,40		14,28 Total:	14,28 m³	Trecho 01
15.1.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo, inclusive transporte e compactação	0,00 + 0,00	17,00 + 0,00	340,00	5,00	1700,00	0,30	510,00	0,02	1,40		14,28 Total:	14,28 m³	Trecho 01
15.1.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT	0,00 + 0,00	17,00 + 0,00	340,00	5,00	1700,00	0,30	510,00	0,02	1,40	5,40	77,11 Total:	77,11 m³ x km	Trecho 01
15.1.5	Retirada e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3 (cimento e areia), com aproveitamento do paralelepípedo	0,00 + 0,00	17,00 + 0,00	340,00	5,00	1700,00			0,02			34,00 Total:	34,00 m²	Trecho 01
15.1.1	RUA ALAGONS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	0,00 + 0,00	11,00 + 1,15	221,15	5,00	1105,75	0,40	442,30	0,02			8,85 Total:	8,85 m³	Trecho 01
15.1.2	Carga, transporte e descarga mecânica de material (bota-fora)	0,00 + 0,00	11,00 + 1,15	221,15	5,00	1105,75	0,40	442,30	0,02	1,40		12,38 Total:	12,38 m³	Trecho 01
15.1.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo, inclusive transporte e compactação	0,00 + 0,00	11,00 + 1,15	221,15	5,00	1105,75	0,40	442,30	0,02	1,40		12,38 Total:	12,38 m³	Trecho 01
15.1.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT	0,00 + 0,00	11,00 + 1,15	221,15	5,00	1105,75	0,40	442,30	0,02	1,40	7,50	92,88 Total:	92,88 m³ x km	Trecho 01
15.1.5	Retirada e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3 (cimento e areia), com aproveitamento do paralelepípedo	0,00 + 0,00	11,00 + 1,15	221,15	5,00	1105,75			0,02			22,12 Total:	22,12 m²	Trecho 01

Adriano Gomes do Nascimento
PMCG/SECOB - Coordenador

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
Francisco de Assis C. Xavier
Rua Chã, s/n - CEP: 57.000-000 - Campina Grande - PB
Fone: (31) 3361-1000 - Fax: (31) 3361-1001 - E-mail: pmcg@campinagr.pe.gov.br

SECRETARIA DE OBRAS
MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	SERVIÇOS	ESTACA		Comprimento (metros)	Largura (metros)	Área (m²)	Altura	Volume	N.V	Empo.	DMT	QUANTIDADES		OBSERVAÇÃO
		Inicial	Final									Parciais	Totais	
1	RUA EDUARDO DE OLIVEIRA LOBO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	0,00 + 0,00	26,00 + 10,30	530,30	5,00	2651,50	0,40	1.060,60	0,09			95,45 Total:	Trecho 01 95,45 m²	
2	Carga, transporte e descarga mecânica de material (bota-fora)	0,00 + 0,00	26,00 + 10,30	530,30	5,00	2651,50	0,40	1.060,60	0,09	1,40		133,64 Total:	Trecho 01 133,64 m²	
3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo, inclusive transporte e compactação	0,00 + 0,00	26,00 + 10,30	530,30	5,00	2651,50	0,40	1.060,60	0,09	1,40		133,64 Total:	Trecho 01 133,64 m²	
4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT	0,00 + 0,00	26,00 + 10,30	530,30	5,00	2651,50	0,40	1.060,60	0,09	1,40	8,70	1.162,63 Total:	Trecho 01 1.162,63 m² x km	
5	Retirada e resassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3 (cimento e areia), com aproveitamento do paralelepípedo	0,00 + 0,00	26,00 + 10,30	530,30	5,00	2651,50			0,02			53,03 Total:	Trecho 01 53,03 m²	
11.1	RUA GUILHERMINO BARBOSA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	0,00 + 0,00	18,00 + 0,00	360,00	5,00	1800,00	0,40	720,00	0,02			14,40 Total:	Trecho 01 14,40 m²	
12.1	Carga, transporte e descarga mecânica de material (bota-fora)	0,00 + 0,00	18,00 + 0,00	360,00	5,00	1800,00	0,40	720,00	0,02	1,40		20,16 Total:	Trecho 01 20,16 m²	
13.1	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo, inclusive transporte e compactação	0,00 + 0,00	18,00 + 0,00	360,00	5,00	1800,00	0,40	720,00	0,02	1,40		20,16 Total:	Trecho 01 20,16 m²	
14.1	Momento Extraordinário de Transporte - DMT	0,00 + 0,00	18,00 + 0,00	360,00	5,00	1800,00	0,40	720,00	0,02	1,40	6,60	133,06 Total:	Trecho 01 133,06 m² x km	
15.1	Retirada e resassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3 (cimento e areia), com aproveitamento do paralelepípedo	0,00 + 0,00	18,00 + 0,00	360,00	5,00	1800,00			0,02			36,00 Total:	Trecho 01 36,00 m²	
16.1	RUA LUIZ RODRIGUES DE ALBUQUERQUE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	0,00 + 0,00	2,00 + 9,10	49,10	5,00	245,50	0,40	98,20	0,03			2,95 Total:	Trecho 01 2,95 m²	
17.1	Carga, transporte e descarga mecânica de material (bota-fora)	0,00 + 0,00	2,00 + 9,10	49,10	5,00	245,50	0,40	98,20	0,03	1,40		4,12 Total:	Trecho 01 4,12 m²	
18.1	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo, inclusive transporte e compactação	0,00 + 0,00	2,00 + 9,10	49,10	5,00	245,50	0,40	98,20	0,03	1,40		4,12 Total:	Trecho 01 4,12 m²	
19.1	Momento Extraordinário de Transporte - DMT	0,00 + 0,00	2,00 + 9,10	49,10	5,00	245,50	0,40	98,20	0,03	1,40	12,30	50,73 Total:	Trecho 01 50,73 m² x km	
20.1	Retirada e resassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3 (cimento e areia), com aproveitamento do paralelepípedo	0,00 + 0,00	2,00 + 9,10	49,10	5,00	245,50			0,03			7,37 Total:	Trecho 01 7,37 m²	
21.1	RUA MINAS GERAIS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	0,00 + 0,00	16,00 + 17,12	337,12	5,00	1685,60	0,40	674,24	0,02			13,48 Total:	Trecho 01 13,48 m²	
22.1	Carga, transporte e descarga mecânica de material (bota-fora)	0,00 + 0,00	16,00 + 17,12	337,12	5,00	1685,60	0,40	674,24	0,02	1,40		18,88 Total:	Trecho 01 18,88 m²	

Adriano Gomes do Nascimento
PMCG/SECOB - Coordenador
de Planejamento de Obras

PRFE MUNIC. DE S. GRANDE
Francisco de Assis Xavier
RUA MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE OBRAS
MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	SERVIÇOS	ESTACA		Comprimento (AutoCAD)	Largura (média)	Área (AutoCAD)	Altura	Volume	N.V	Empo.	DMT	QUANTIDADES		OBSERVAÇÃO
		Inicial	Final									Parciais	Totais	
21.3.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo, inclusive transporte e compactação	0,00 + 0,00	16,00 + 17,12	337,12	5,00	1685,60	0,40	674,24	0,02	1,40		18,88	Trecho 01 Total: 18,88 m²	
21.3.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT	0,00 + 0,00	15,00 + 17,12	337,12	5,00	1685,60	0,40	674,24	0,02	1,40	7,90	147,25	Trecho 01 Total: 147,25 m² x km	
21.3.5	Retirada e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3 (cimento e areia), com aprofundamento do paralelepípedo	0,00 + 0,00	16,00 + 17,12	337,12	5,00	1685,60			0,02			33,71	Trecho 01 Total: 33,71 m²	
21.1.1	RUA OLEGÁRIO AZEVEDO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive boca-fora	0,00 + 0,00	4,00 + 15,40	95,40	5,00	477,00	0,40	190,80	0,05	1,40		9,54	Trecho 01 Total: 9,54 m²	
21.3.2	Carga, transporte e descarga mecânica de material (boca-fora)	0,00 + 0,00	4,00 + 15,40	95,40	5,00	477,00	0,40	190,80	0,05	1,40		13,36	Trecho 01 Total: 13,36 m²	
21.3.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo, inclusive transporte e compactação	0,00 + 0,00	4,00 + 15,40	95,40	5,00	477,00	0,40	190,80	0,05	1,40		13,36	Trecho 01 Total: 13,36 m²	
21.3.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT	0,00 + 0,00	4,00 + 15,40	95,40	5,00	477,00	0,40	190,80	0,05	1,40	8,20	109,52	Trecho 01 Total: 109,52 m² x km	
21.3.5	Retirada e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3 (cimento e areia), com aprofundamento do paralelepípedo	0,00 + 0,00	4,00 + 15,40	95,40	5,00	477,00			0,05			23,85	Trecho 01 Total: 23,85 m²	
21.1.1	RUA JOÃO MIGUEL LEÃO SERVIÇOS PRELIMINARES Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	0,00 + 0,00	12,00 + 14,45	254,45								254,45	Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente) Total: 254,45 m²	
21.2.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO Pintura de ligação com emulsão BR-2C, inclusive aplicação e transporte	0,00 + 0,00	12,00 + 14,45	254,45	6,96	1769,95			2,00			3.530,90	Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente) Total: 3.530,90 m²	
21.2.2	CBUQ Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Unificado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	0,00 + 0,00	12,00 + 14,45	254,45	6,96	1769,95	0,03	53,10	1,00			53,10	Trecho 01 (Valores Levantados Topograficamente) Total: 53,10 m²	
21.2.2	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017.	0,00 + 0,00	12,00 + 14,45	254,45	6,96	1769,95	0,03	53,10	1,00			53,10	Trecho 1 (Valores Levantados Topograficamente) Total: 53,10 m²	
21.3.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibrador acabadora							53,10	1,00			53,10	(VIDE CBUQ, CAPA) (VIDE CBUQ REPERFILAMENTO) Total: 106,20 m²	
21.3.4	Transporte com caminhão basculante de 10m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana							53,10	1,00		15,30	812,43	(VIDE CBUQ, CAPA) (VIDE CBUQ REPERFILAMENTO) Total: 1.824,86 m² x km	
21.3.1	CONTROLE TECNOLÓGICO Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente								3,00			3,00	Total: 3,00 Unidade	
21.3.2	Ensaio de granulometria do agregado								2,00			2,00	Total: 2,00 Unidade	

Adriano Gomes do Nascimento
PMCG/SECOB - Coordenador
de Planejamento de Obras

CAMPINA GRANDE - PB
16.08.2021
Eng. Civil - CRÉD. Nº 16.283/2014-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE OBRAS
MEMORIA DE CÁLCULO

ITEM	SERVIÇOS	ESTACA		Comprimento (metros)	Largura (metros)	Área (metros²)	Altura	Volume	N.V	Empo.	DMT	QUANTIDADES		OBSERVAÇÃO
		Inicial	Final									Parciais	Total	
22.3.3	Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas								3,00			3,00	3,00	Unidade
22.3.4	AV. CONSUL JOSEPH NOUJAIM HABIB MACAD													
22.3.5	SERVIÇOS PRELIMINARES													
22.3.1.1	Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	0,00	+ 0,00	35,00	+ 5,19	705,19						705,19		Eixo 01 (Valores Levantados Topograficamente)
		0,00	+ 0,00	10,00	+ 16,19	216,19						216,19		Eixo 02 (Valores Levantados Topograficamente)
		0,00	+ 0,00	86,00	+ 4,00	1724,00						1724,00		Eixo 03 (Valores Levantados Topograficamente)
		0,00	+ 0,00	13,00	+ 19,63	279,63						279,63		Eixo 04 (Valores Levantados Topograficamente)
												2925,03		Total
22.3.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM													
22.3.2.1	Escavação, carga e descarga de material de 1ª categoria (remoção de base + capa de CBUQ = 20 + 5 = 25 cm)			2956,96		2956,96	0,25	739,24				739,24		Área de Terraplenagem (Valores Levantados Topograficamente)
22.3.2.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em rodovia pavimentada, DMT 80 a 1000 m + carga, manobras e descarga de solos e agregados, descarga em distribuidor (BOTA FORA)							739,24		1,25		924,05		Área de Terraplenagem (Valores Levantados Topograficamente)
22.3.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade m³ x km), AF_09/2016 (MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE BOTA FORA)							924,05			6,90	6.372,95		Área de Terraplenagem (Valores Levantados Topograficamente)
												2.956,96		Total
22.3.4	Regularização do subleito			2956,96		2956,96						2.956,96		Área de Terraplenagem (Valores Levantados Topograficamente)
22.3.5	Execução de base em brita graduada simples			2956,96		2956,96	0,20	591,39				591,39		Área de Terraplenagem (Valores Levantados Topograficamente)
22.3.6	Carga, manobras e descarga de brita, areia, pedra de mão e solos com caminhão basculante de 10 m³.							591,39				591,39		Área de Terraplenagem (Valores Levantados Topograficamente)
22.3.7	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO													(VIDE EXECUÇÃO DE BASE)
22.3.1	Fresagem de material betuminoso			2645,38	16,76	44323,51						44.323,51		Valores Levantados Topograficamente - Área 01 a ser Asfáltada (VIDE LEVANTAMENTO)
22.3.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ em via urbana pavimentada, DMT até 30 km, AF_09/2016 - Momento Extraordinário de bota fora.			279,63	8,04	2249,34						2.249,34		Valores Levantados Topograficamente - Área 02 a ser Asfáltada (VIDE LEVANTAMENTO)
												(2.956,96)		MENOS ÁREA DE TERRAPLENAGEM (VIDE ESCAVAÇÃO)
												43615,89		Total
22.3.3	Imprimação			2956,96		2956,96						2180,79		(VIDE FRESAGEM)
22.3.4	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte			2645,38	16,76	44323,51						2180,79		Área de Terraplenagem (Valores Levantados Topograficamente) (VIDE REGULATIZAÇÃO)
22.3.5	CBUQ											2.956,96		Total
22.3.5.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte.			0,00	+ 0,00	132,00	+ 5,38	2645,38				44.323,51		Valores Levantados Topograficamente - Área 01 a ser Asfáltada (VIDE LEVANTAMENTO)
				0,00	+ 0,00	13,00	+ 19,63	279,63				2.249,34		Valores Levantados Topograficamente - Área 02 a ser Asfáltada (VIDE LEVANTAMENTO)
												46372,85		Total
22.3.6	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibradora			0,00	+ 0,00	132,00	+ 5,38	2645,38				2216,18		Valores Levantados Topograficamente - Área 01 a ser Asfáltada (VIDE LEVANTAMENTO)
				0,00	+ 0,00	13,00	+ 19,63	279,63				112,47		Valores Levantados Topograficamente - Área 02 a ser Asfáltada (VIDE LEVANTAMENTO)
												2328,65		Total
22.3.7	Transporte com caminhão basculante de 10m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana							2328,65				2328,65		(VIDE CBUQ, CAPA)
												16067,69		(VIDE CBUQ, CAPA)
												6,90		Total

PREF MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Assis Cavieiro
Cadastrado em 28/04/2016 Nº 1504-3

Adriano Gomes do Nascimento
PMCG/SECOB - Coordenador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE OBRAS
MEMÓRIA DE CÁLCULO

DMT	SERVIÇOS	ESTACA		Comprimento (módulo)	Largura (módulo)	Área (módulo)	Altura	Volume	N.V	Empo.	DMT	QUANTIDADES		OBSERVAÇÃO
		Inicial	Final									Parciais	Totais	
1	CONTROLE TECNOLÓGICO													
1.1	Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente								57,00				57,00	Unidade
2	Ensaio de granulometria do agregado								38,00				38,00	Unidade
2.1	Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas								57,00				57,00	Unidade
2.2	Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas								57,00				57,00	Unidade
3	RUA ANA ALMEIDA DE CASTRO													
3.1	SERVICIOS DE PAVIMENTAÇÃO													
3.1.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	0,00	+ 0,00	23,00	+ 2,95	462,95	5,00	2314,75	0,40	925,90	0,05		46,30	Trecho 01
3.1.2	Carga, transporte e descarga mecânica de material (bota-fora)	0,00	+ 0,00	23,00	+ 2,95	462,95	5,00	2314,75	0,40	925,90	0,05	1,40	64,81	Trecho 01
3.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo, inclusive transporte e compactação	0,00	+ 0,00	23,00	+ 2,95	462,95	5,00	2314,75	0,40	925,90	0,05	1,40	64,81	Trecho 01
4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT													
4.1	Retirada e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3 (cimento e areia), com aproveitamento do paralelepípedo	0,00	+ 0,00	23,00	+ 2,95	462,95	5,00	2314,75	0,40	925,90	0,05	8,20	531,47	Trecho 01
5	RUA DA REPÚBLICA													
5.1	SERVICIOS DE PAVIMENTAÇÃO													
5.1.1	Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	0,00	+ 0,00	48,00	+ 8,72	968,72	5,00	4843,60	0,40	1.937,44	0,07		135,62	Trecho 01
5.1.2	Carga, transporte e descarga mecânica de material (bota-fora)	0,00	+ 0,00	48,00	+ 8,72	968,72	5,00	4843,60	0,40	1.937,44	0,07	1,40	189,87	Trecho 01
5.1.3	Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo, inclusive transporte e compactação	0,00	+ 0,00	48,00	+ 8,72	968,72	5,00	4843,60	0,40	1.937,44	0,07	1,40	189,87	Trecho 01
5.1.4	Momento Extraordinário de Transporte - DMT													
5.1.5	Retirada e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3 (cimento e areia), com aproveitamento do paralelepípedo	0,00	+ 0,00	48,00	+ 8,72	968,72	5,00	4843,60	0,40	1.937,44	0,07	8,20	1.556,93	Trecho 01
6	RUA ADEMAR DE MAIA PAIVA (EXECUÇÃO DE DRENO)													
6.1	SERVICIOS DE PAVIMENTAÇÃO													
6.1.1	Execução mecânica de vala com retroescavadeira, Profundidade até 1,5m com solo argilo arenoso	6,00	+ 15,91	10,00	+ 10,91	75,00	0,80	60,00	1,50	90,00			90,00	Trecho 01
6.1.2	Carga, manobras e descarga de brita, areia, pedra de mão e solos com caminhão basculante de 10 m³.	6,00	+ 15,91	10,00	+ 10,91	75,00	0,80	60,00	1,50	90,00	1,40		126,00	Trecho 01
6.1.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 Km (unidade m³ x Km). AF_09/2016 (MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE BOTA FORA)	6,00	+ 15,91	10,00	+ 10,91	75,00	0,80	60,00	1,50	90,00	1,40	12,50	1.625,40	Trecho 01
6.1.4	Execução de dreno com tubo de PVC corrugado flexível - DN100	6,00	+ 15,91	10,00	+ 10,91	75,00	0,80	60,00	1,50	90,00			90,00	Trecho 01
6.1.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ em via urbana pavimentada, DMT até 30 Km. AF_09/2016 - Momento Extraordinário de Transporte (fazida)	6,00	+ 15,91	10,00	+ 10,91	75,00	0,80	60,00	1,50	90,00	1,40	12,50	1.625,40	Trecho 01

Adriano Gomes do Nascimento
PMCG/SECOB - Coordenador
de Planejamento de Obras

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
Eng. Civil - CREA-PB Nº 180.283.994-2




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIROS ALTO BRANCO, BELA VISTA, BODOCONGÓ, RAMADINHA II, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CENTRO, CONCEIÇÃO, CRUZEIRO, DINAMÉRICA, DISTRITO INDUSTRIAL, ITARARÉ, JARDIM PAULISTANO, JARDIM TAVARES, JOSÉ PINHEIRO, LIBERDADE, MALVINAS, MONTE SANTO, NOVA BRÁSILIA, NOVO BODOCONGÓ, ARAXÁ, PALMEIRA, PRESIDENTE MÉDICI, QUARENTA, RAMADINHA, SANDRA CAVALCANTE, SANTA CRUZ, SANTA ROSA, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTÃO, TAMBOR, TRÊS IRMÃS, UNIVERSITÁRIO, VELAME, VILA CABRAL E NOS DISTRITOS DE GALENTE E SÃO JOSÉ DA MATA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE NO ESTADO PARAÍBA

PLANTA (CROQUI)




01 - Planta Baixa Estaqueamento

Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: Odon Bezerra	
Bairro: Liberdade	
Data/Ano: outubro/2020	Prancha: 1/2
RUA ODON BEZERRA	
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²
ÁREA DA RUA	542,22 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	40,17 m
LARGURA DA RUA (média)	13,50 m
	
Francisco de Jesus C. Xavier Eng. Civil - CREA-DF nº 160.700-1	
	
Adriano Gomes do Nascimento PMCG/SECOB - Coordenador de Planejamento de Obras	

03 - Planta de Situação



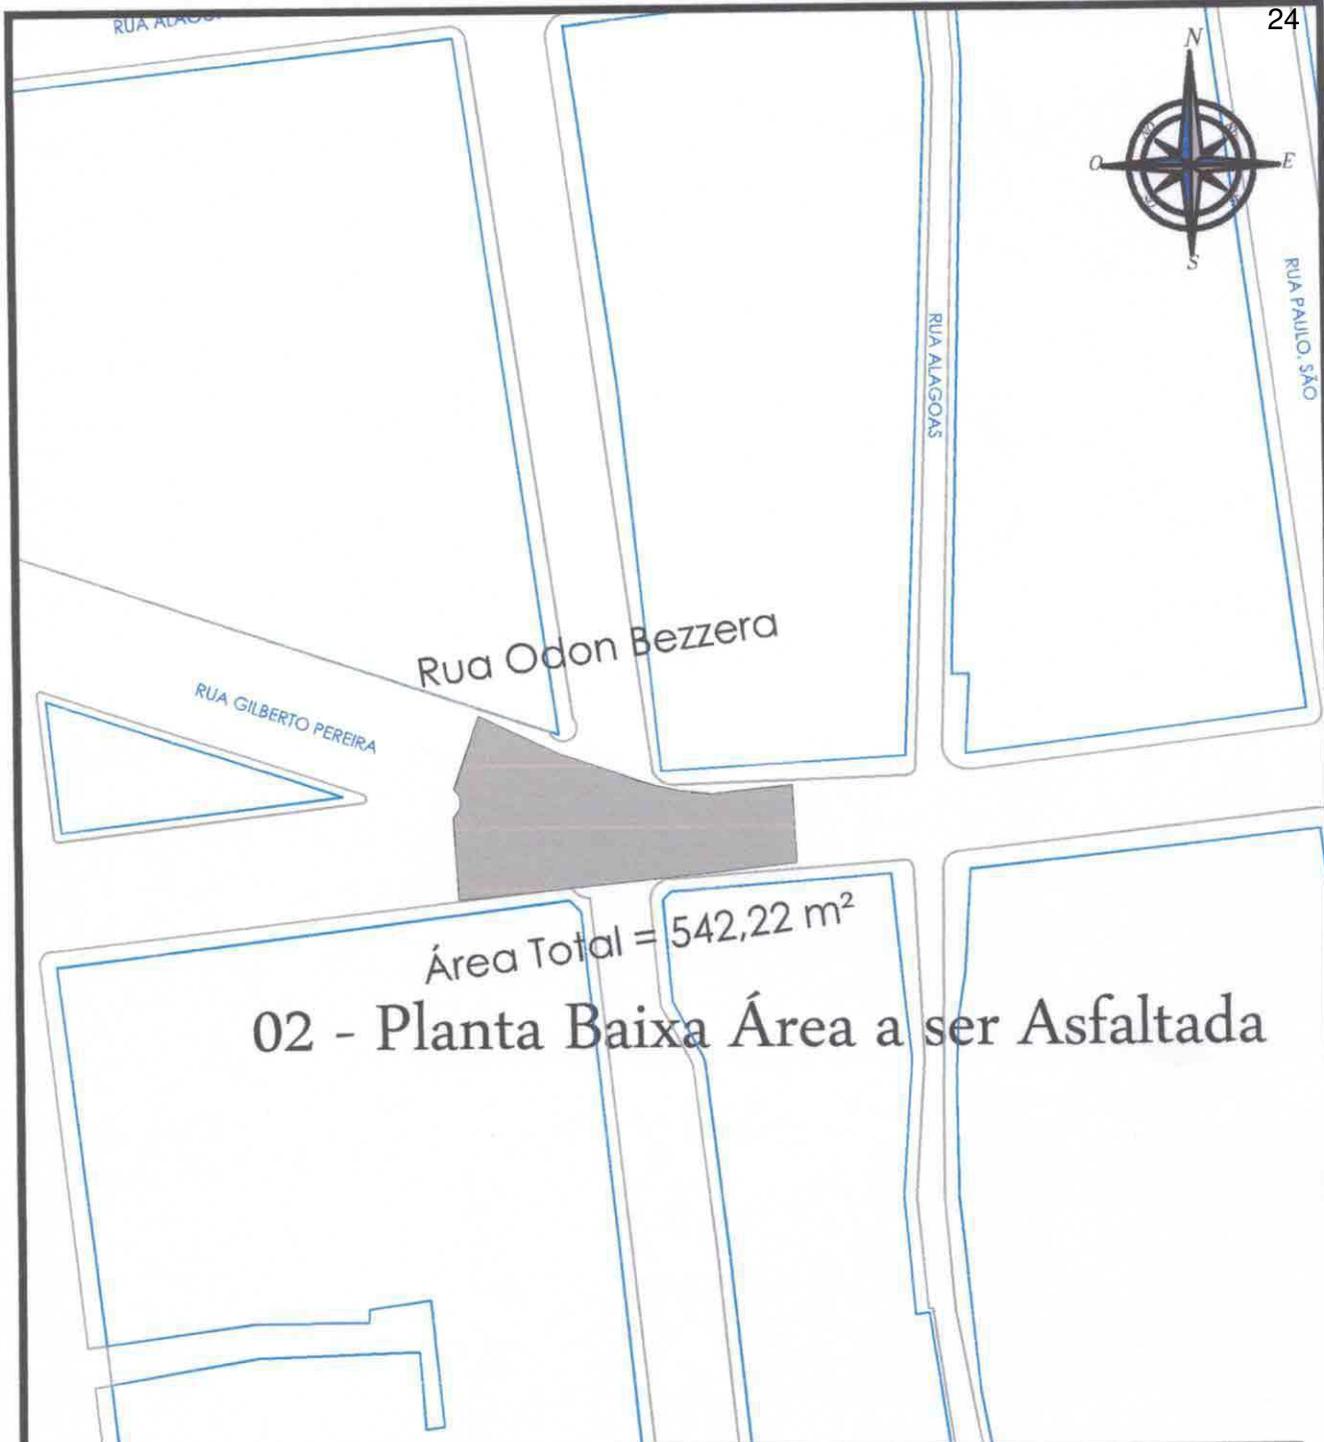

Área Total = 542,22 m²
02 - Planta Baixa Área a ser Asfaltada


Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: Odon Bezerra	
Bairro: Liberdade	
Data/Ano: outubro/2020	Prancha: 2/2
RUA ODON BEZERRA	
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²
ÁREA DA RUA	542,22 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	40,17 m
LARGURA DA RUA (média)	13,50 m

03 - Planta de Situação



PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
 Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng. CIVIL - CREA. 022. Nº 189.272017

Adriano Gomes do Nascimento
 PMCG/SECOB - Coordenador
 de Planejamento de Obras

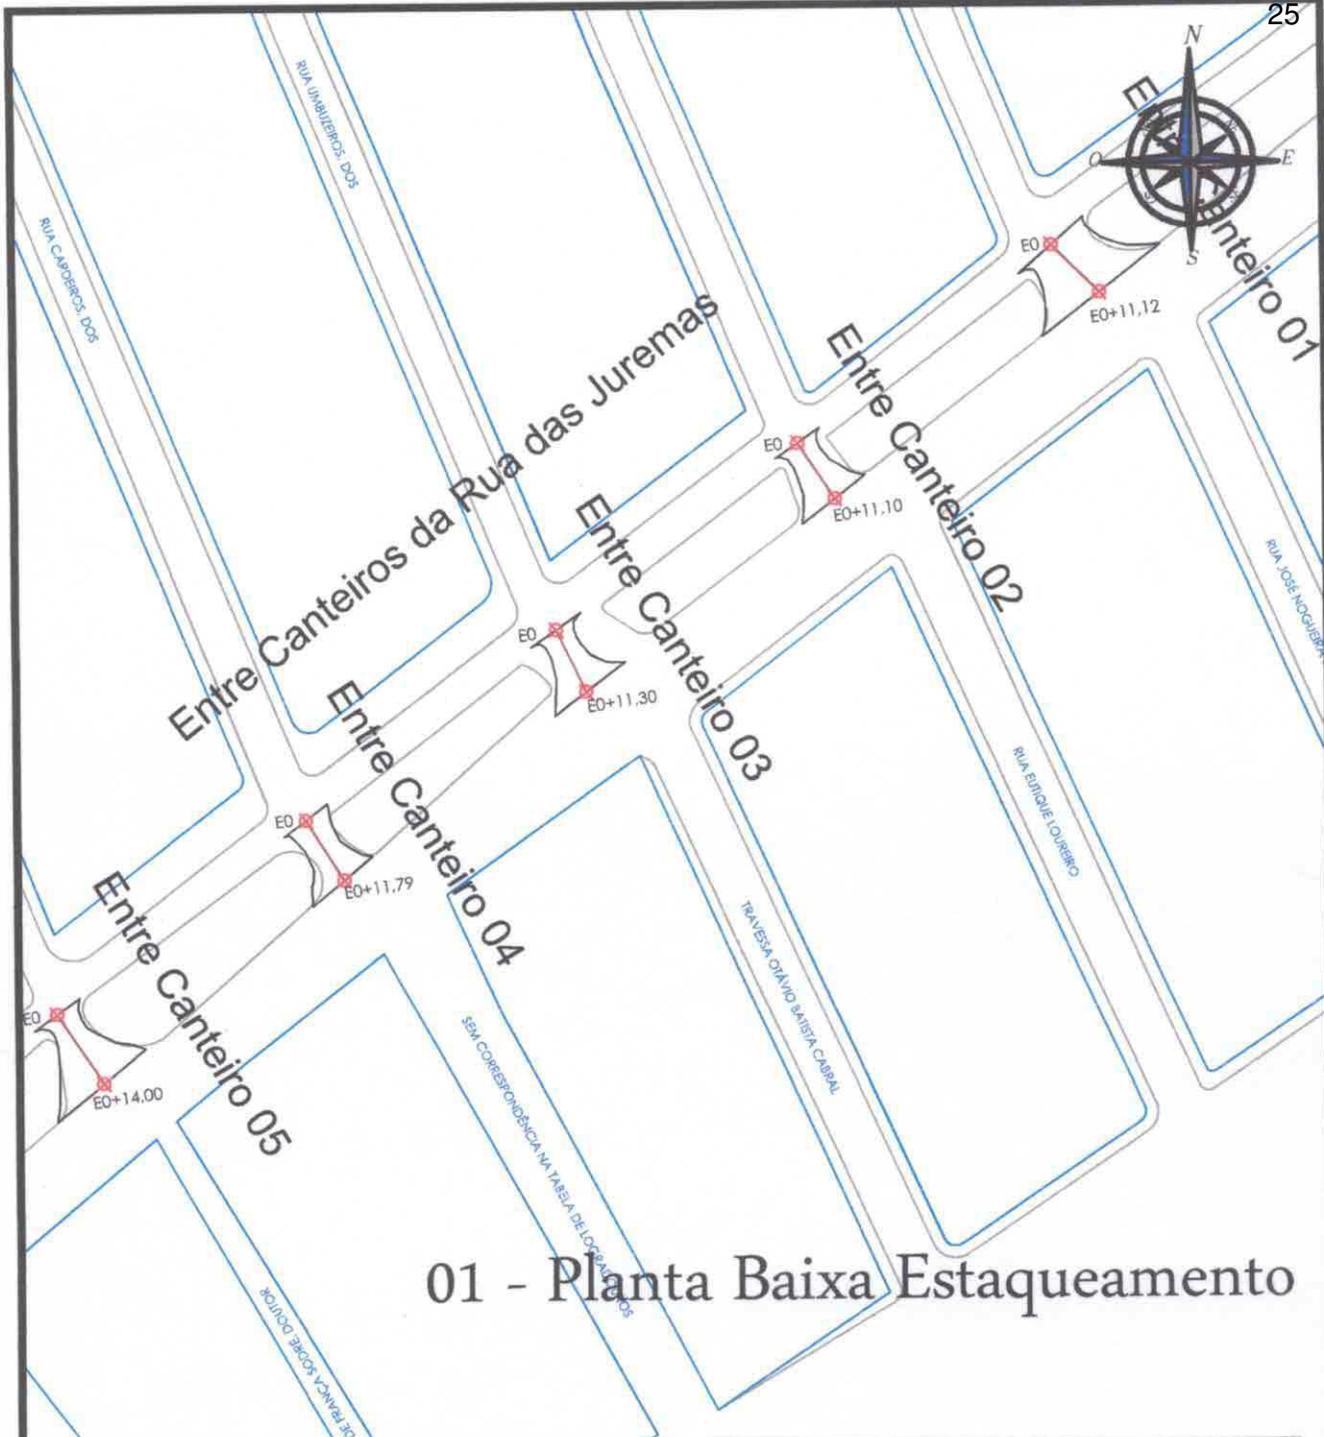

01 - Planta Baixa Estaqueamento


Proprietário:	Construtora Rocha Cavalcante LTDA		
Projeto:	Pavimentação Asfáltica		
Rua:	Entre Canteiros da Rua das Juremas		
Bairro:	Malvinas		
Data/Ano:	novembro/2020	Prancha:	1/2
ENTRE CANTEIROS DA RUA DAS JUREMAS			
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²		
ÁREA DA RUA	574,12 m ²		
COMPRIMENTO DO EIXO	59,31 m		
LARGURA DA RUA (média)	9,68 m		

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
 Francisco de Jesus C. Xavier
 Engº CIVIL - CREA PR Nº 180.28750-1

Adriano Gomes do Nascimento
 PMCG/SECOB - Coordenador
 de Planejamento de Obras

03 - Planta de Situação



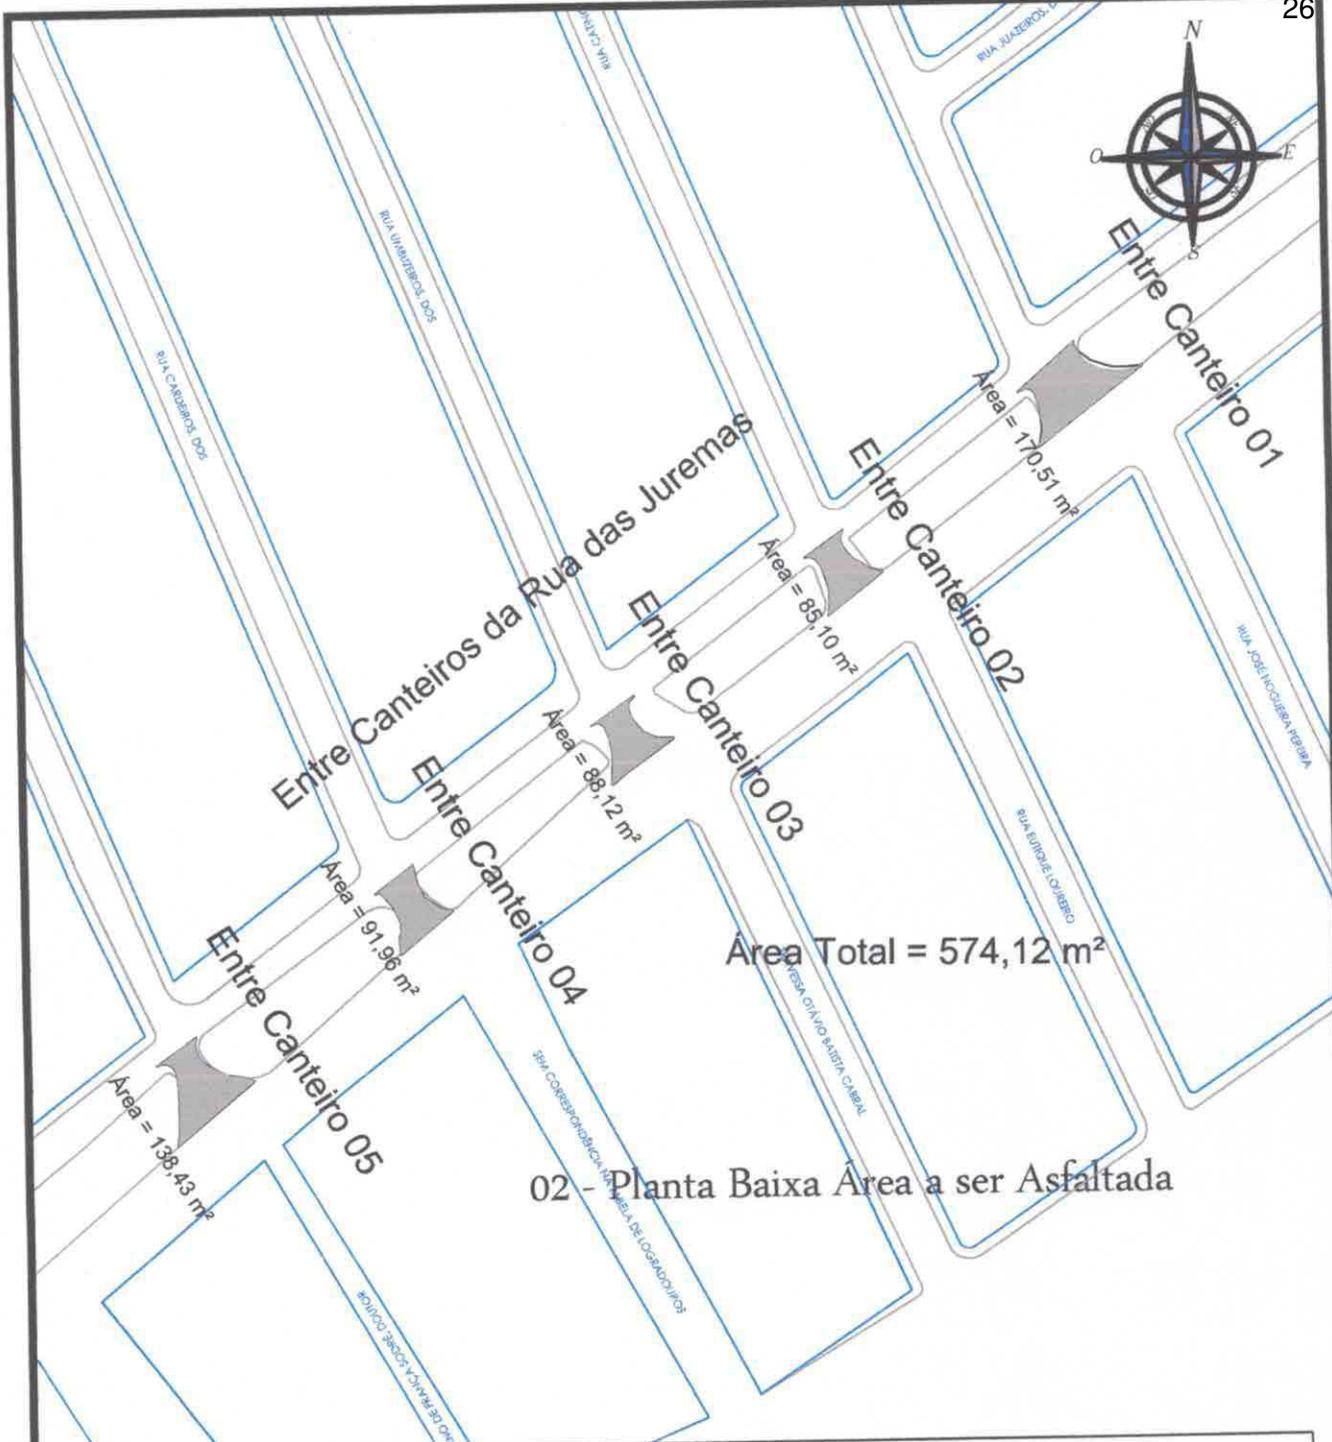


Proprietário:	Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto:	Pavimentação Asfáltica	
Rua:	Entre Canteiros da Rua das Juremas	
Bairro:	Malvinas	
Data/Ano:	novembro/2020	Prancha: 2/2
ENTRE CANTEIROS DA RUA DAS JUREMAS		
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²	
ÁREA DA RUA	574,12 m ²	
COMPRIMENTO DO EIXO	59,31 m	
LARGURA DA RUA (média)	9,68 m	



PREF. MUNIC. DE C. GRANDE

Francisco de Jesus C. Xavier
Eng.º Civil - CRFA-PB Nº 160.2º3584

Adriano Gomes do Nascimento
PMCG/SECOB - Coordenador
de Planejamento de Obras

03 - Planta de Situação

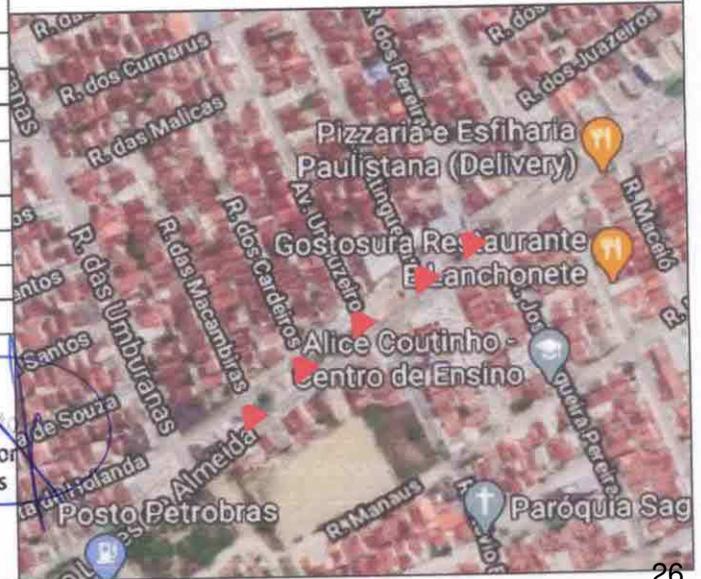


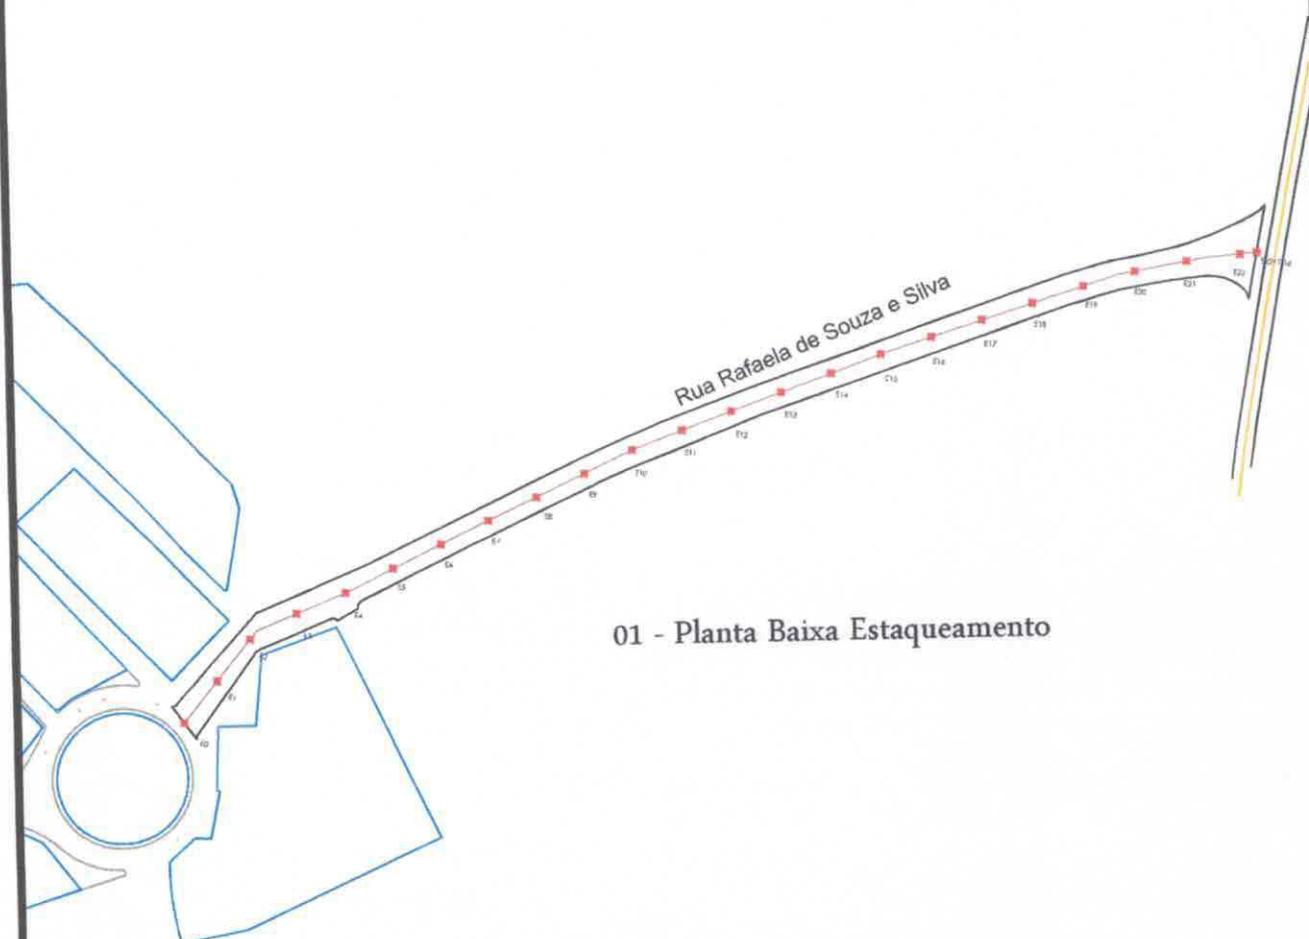

01 - Planta Baixa Estaqueamento


Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: Rafaela de Souza e Silva	
Bairro: Serrotão	
Data/Ano: novembro/2020	Prancha: 1/2
RUA RAFAELA DE SOUZA E SILVA	
ÁREA DA BOCA DE RUA	18,63 m ²
ÁREA DA RUA	5.322,15 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	447,16 m
LARGURA DA RUA (média)	11,90 m

03 - Planta de Situação

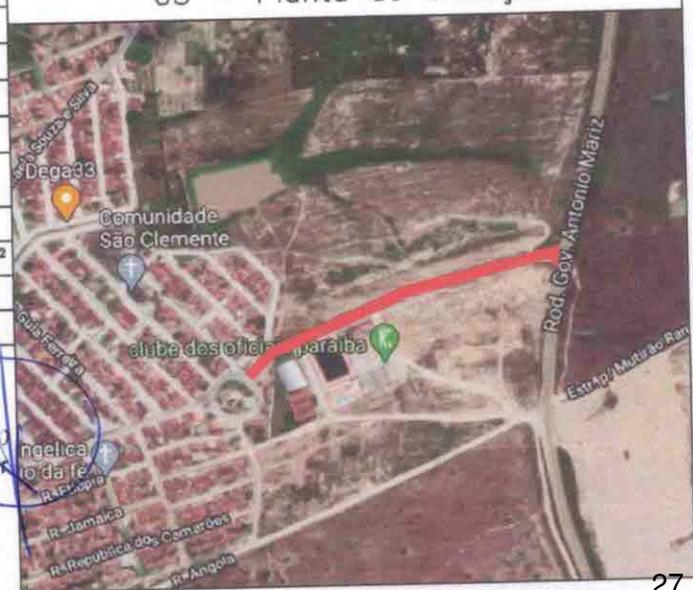

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
 EMP. CIVIL - CREA OR. 01/153.79.100-1


Adriano Gomes do Nascimento
 PMCG/SECOB - Coordenador
 de Planejamento de Obras

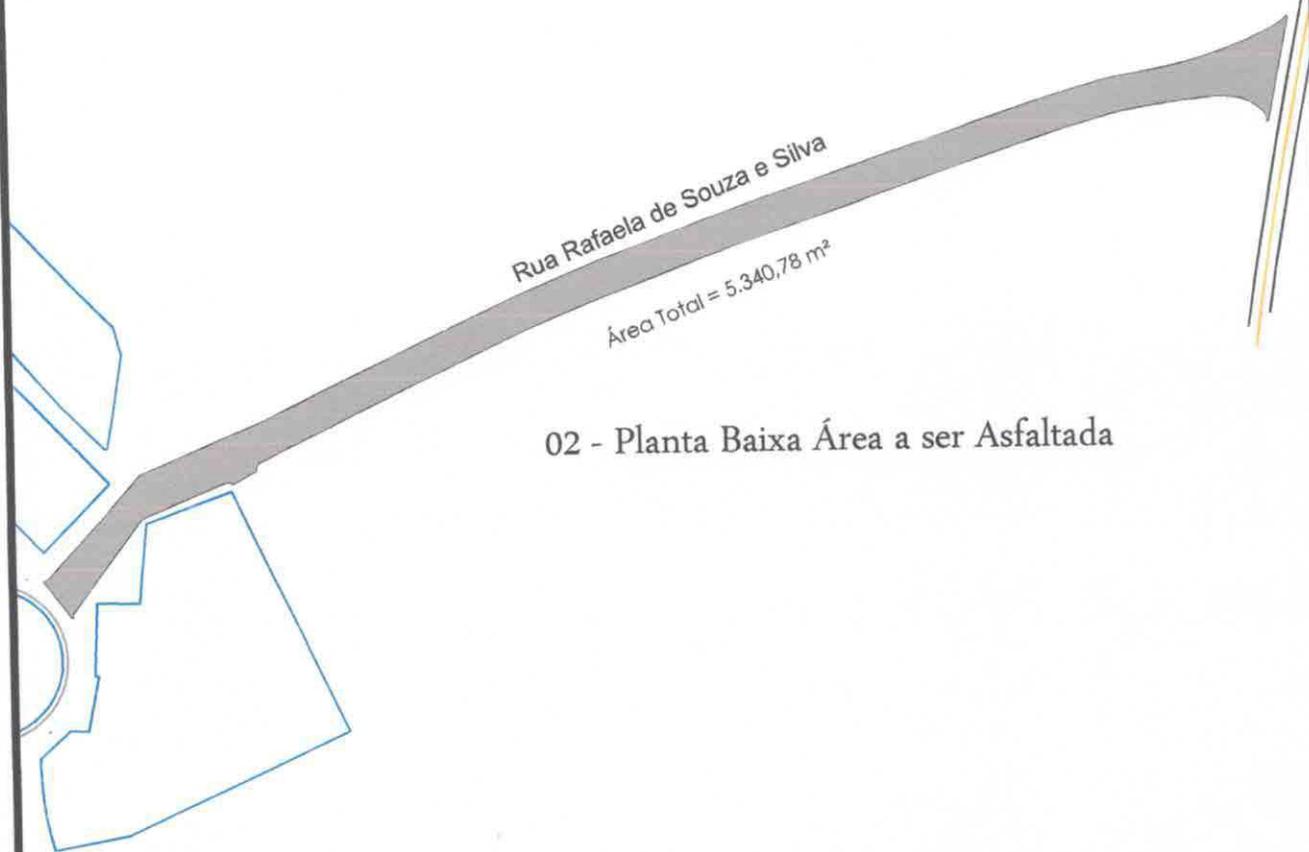

02 - Planta Baixa Área a ser Asfaltada

Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: Rafaela de Souza e Silva	
Bairro: Serrotão	
Data/Ano: novembro/2020	Prancha: 2/2
RUA RAFAELA DE SOUZA E SILVA	
ÁREA DA BOCA DE RUA	18,63 m ²
ÁREA DA RUA	5.322,15 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	447,16 m
LARGURA DA RUA (média)	11,90 m

03 - Planta de Situação

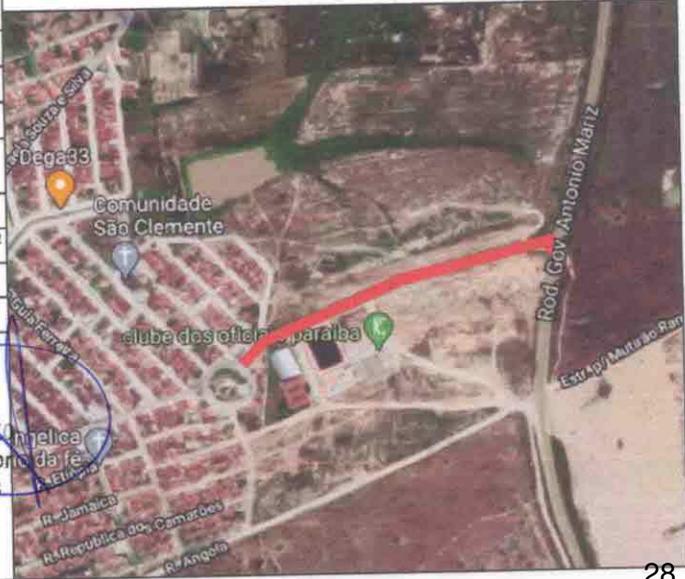

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
 SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS


Adriano Gomes do Nascimento
 PMCG/SECOB - Coordenador
 de Planejamento de Obras





01 - Planta Baixa Estaqueamento

Proprietário:	Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto:	Pavimentação Asfáltica	
Rua:	Sergipe	
Bairro:	Liberdade	
Data/Ano:	outubro/2020	Prancha: 1/2
RUA SERGIPE		
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²	
ÁREA DA RUA	575,99 m ²	
COMPRIMENTO DO EIXO	65,02 m	
LARGURA DA RUA (média)	8,86 m	
 PREF. MUNIC. DE C. GRANDE Francisco de Jesus C. Xavier Eng.º Civil - CREA-PR Nº 150.281/2002		
Adriano Gomes do Nascimento PMCG/SECOB - Coordenador de Planejamento de Obras		

03 - Planta de Situação

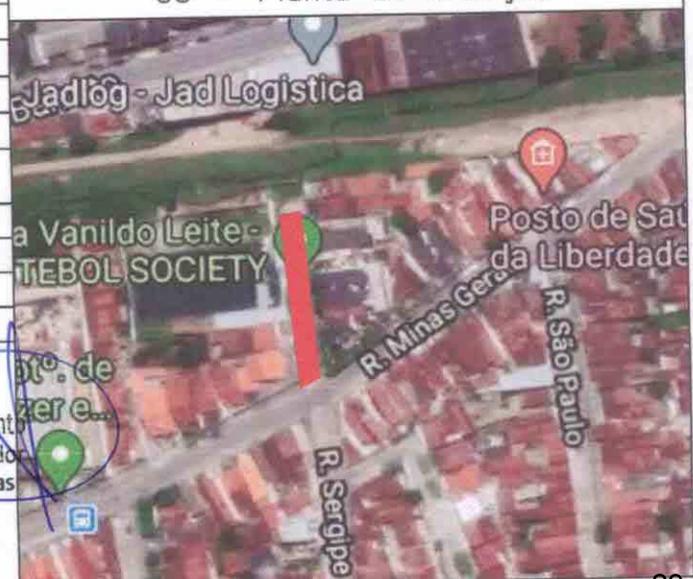

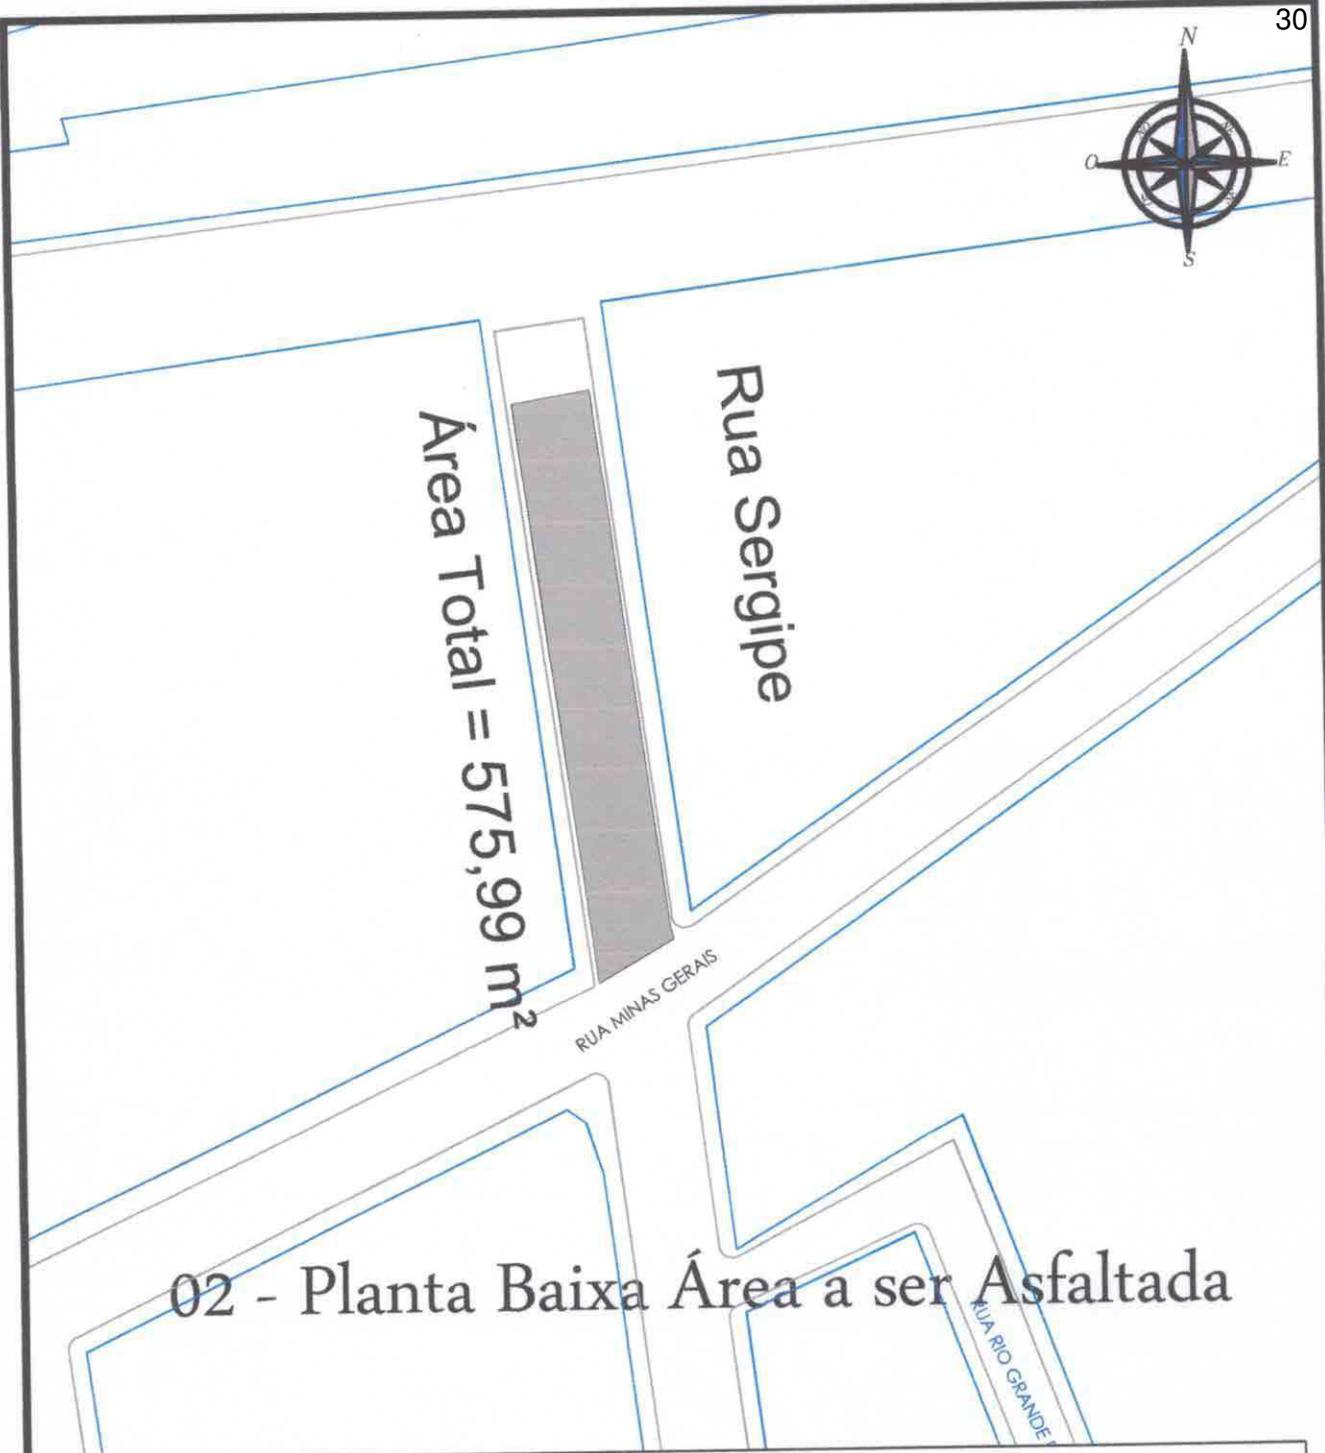


02 - Planta Baixa Área a ser Asfaltada


Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: Sergipe	
Bairro: Liberdade	
Data/Ano: outubro/2020	Prancha: 2/2
RUA SERGIPE	
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²
ÁREA DA RUA	575,99 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	65,02 m
LARGURA DA RUA (média)	8,86 m

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng.º Civil - CREA-PB Nº 160.293594-2

Adriano Gomes do Nascimento
 PMCG/SECOB - Coordenador
 de Planejamento de Obras

03 - Planta de Situação

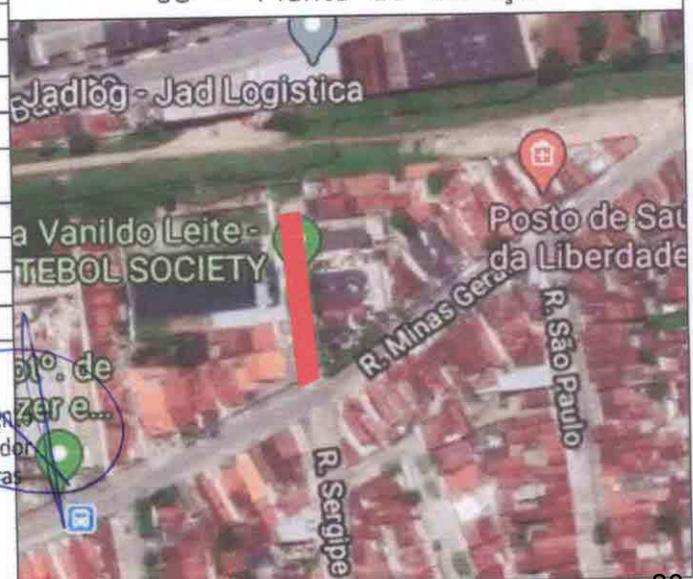


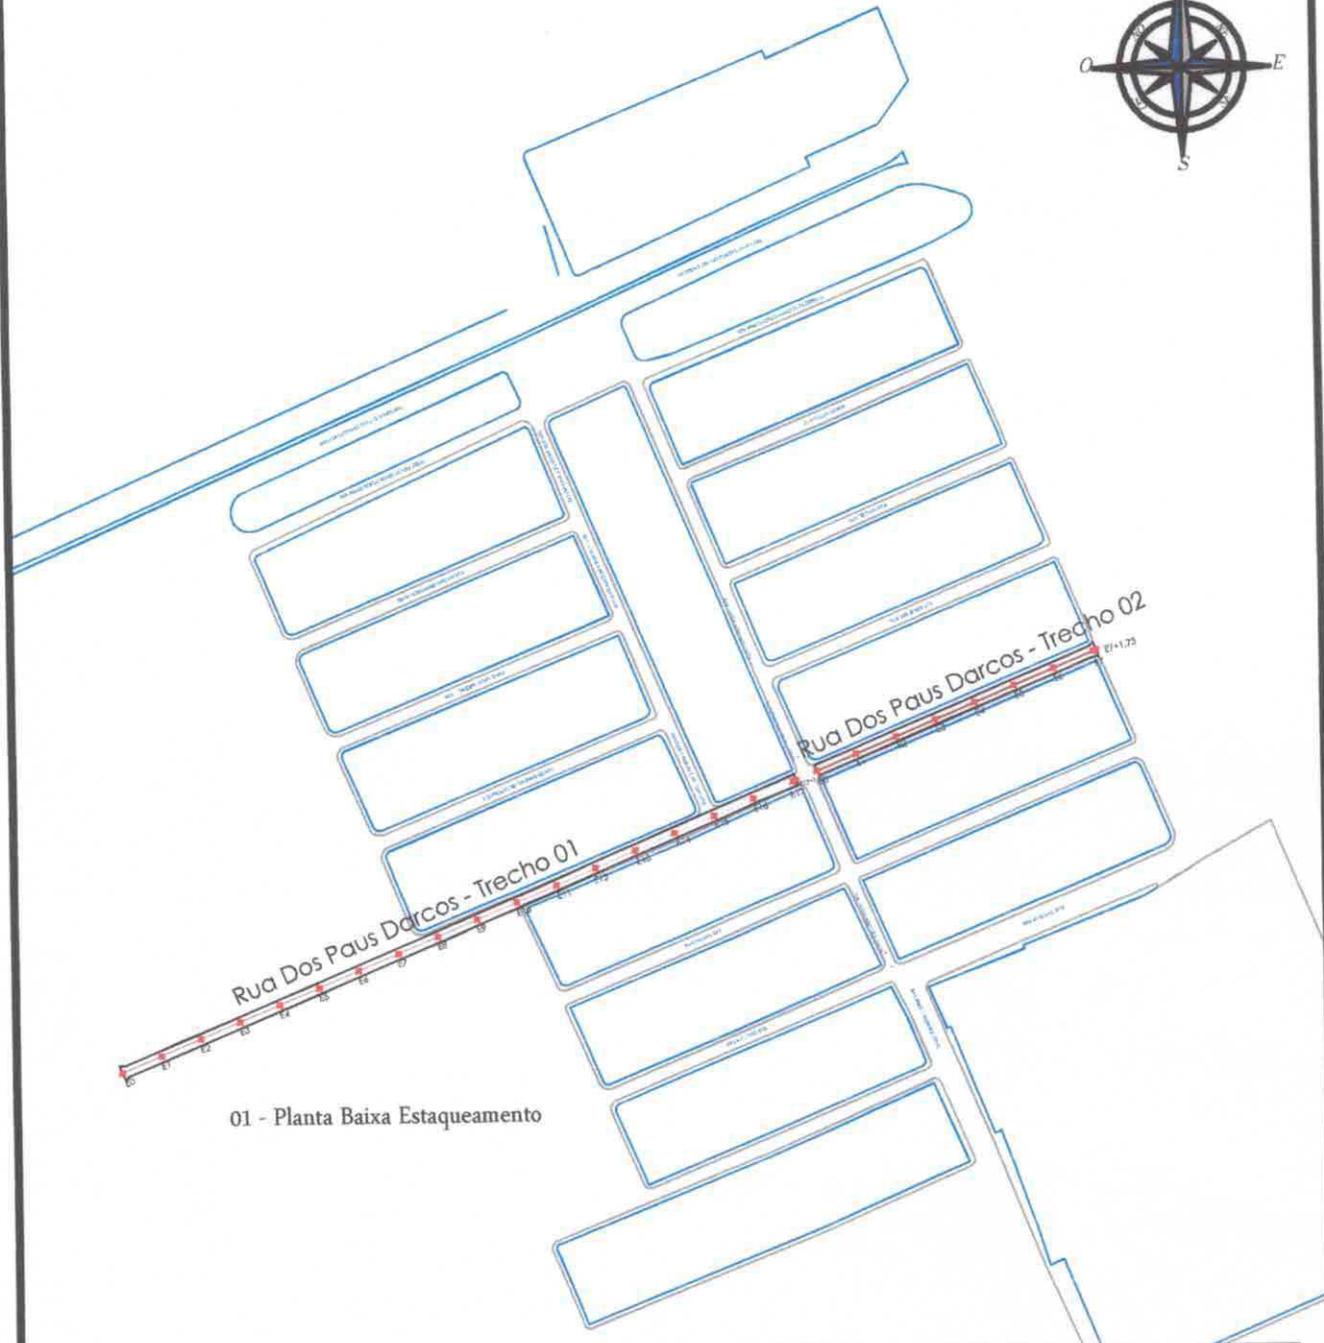

01 - Planta Baixa Estaqueamento


03 - Planta de Situação

Proprietário:	Construtora Rocha Cavalcante LTDA		
Projeto:	Pavimentação Asfáltica		
Rua:	Dos Paus Darcos		
Bairro:	Malvinas		
Data/Ano:	novembro/2020	Prancha:	1/2
RUA DOS PAUS DARCOS			
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²		
ÁREA DA RUA	2.521,73 m ²		
COMPRIMENTO DO EIXO	483,30 m		
LARGURA DA RUA (média)	5,22 m		

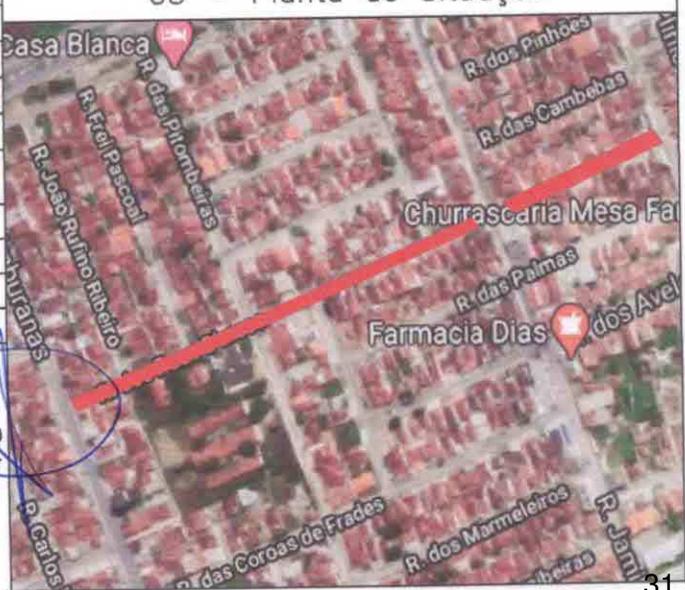

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
 Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng.º Civil - CREA-PB Nº 160.283594-7

Adriano Gomes do Nascimento
 PMCG/SECOB - Coordenador
 de Planejamento de Obras

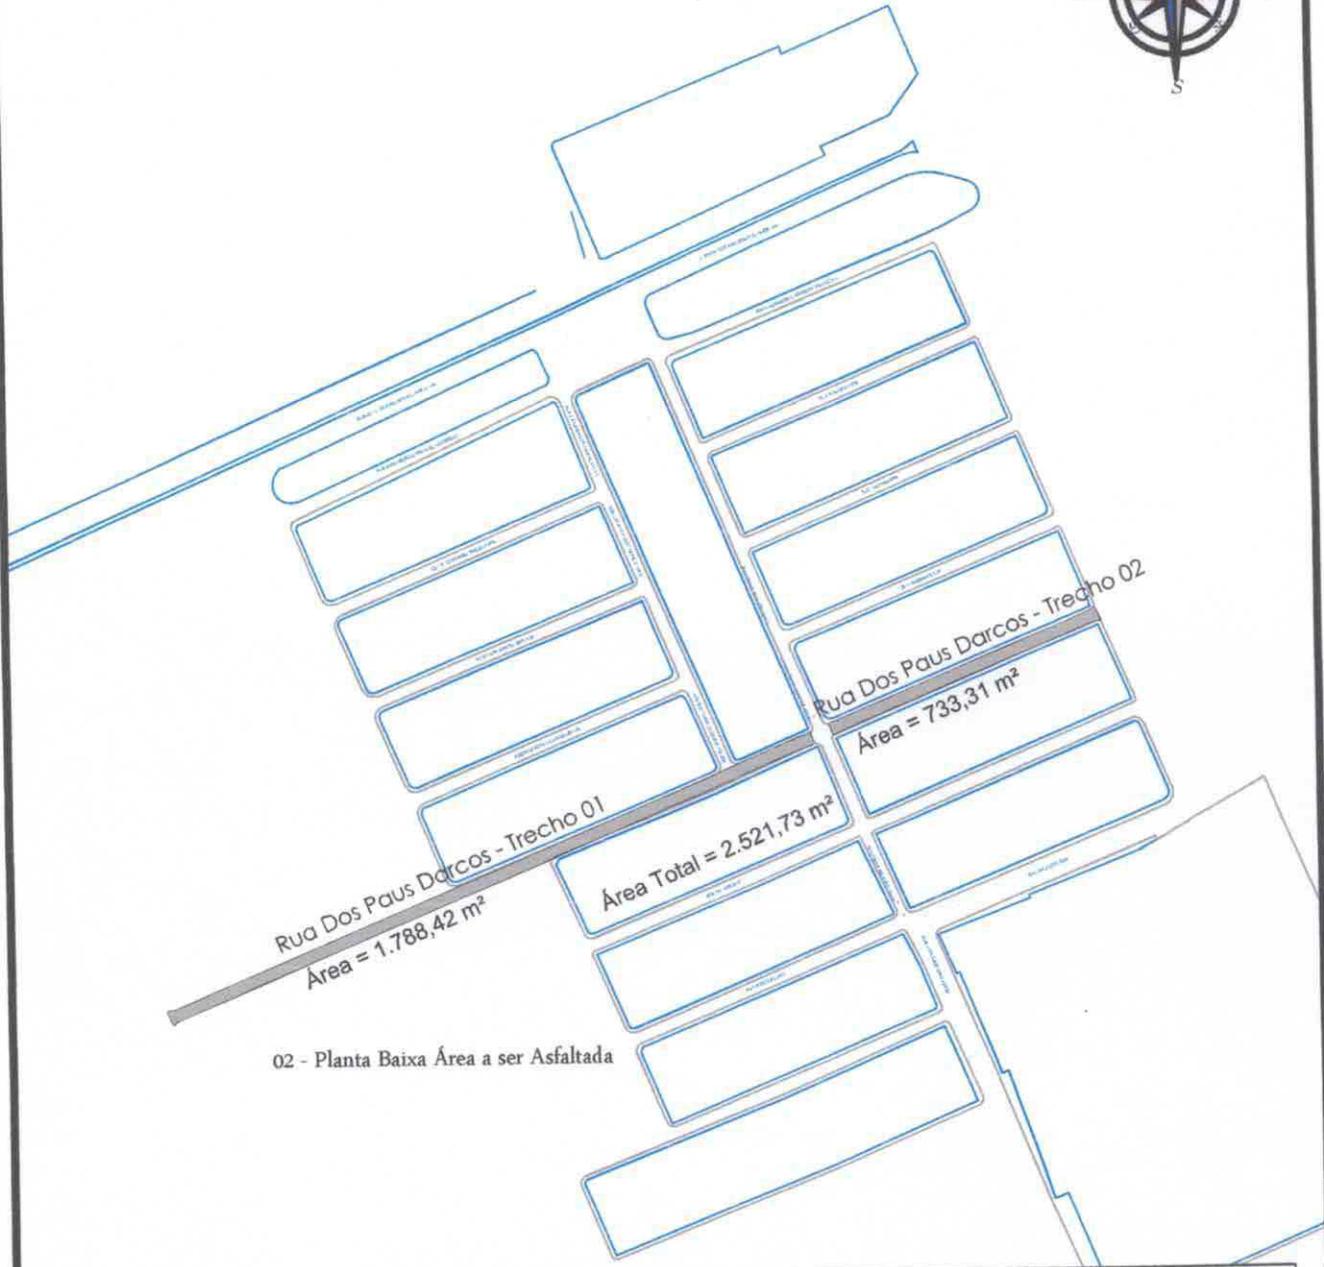

02 - Planta Baixa Área a ser Asfaltada

Proprietário:	Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto:	Pavimentação Asfáltica	
Rua:	Dos Paus Darcos	
Bairro:	Malvinas	
Data/Ano:	novembro/2020	Prancha: 2/2
RUA DOS PAUS DARCOS		
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²	
ÁREA DA RUA	2.521,73 m ²	
COMPRIMENTO DO EIXO	483,30 m	
LARGURA DA RUA (média)	5,22 m	

03 - Planta de Situação



PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
Eng. Civil - CREA-DF nº 150.220/0-1

Adriano Gomes do Nascimento
PMCG/SECOB - Coordenador
de Planejamento de Obras



02 - Planta Baixa Área a ser Asfaltada


Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: Das Umburanas	
Bairro: Malvinas	
Data/Ano: novembro/2020	Prancha: 2/2
RUA DAS UMBURANAS	
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²
ÁREA DA RUA	314,55 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	35,24 m
LARGURA DA RUA (média)	8,93 m

Francisco de Jesus C. Xavier
 FRANCISCO DE JESUS C. XAVIER
 Eng. Civil - CREA-PR Nº 480.28250-1

Adriano Gomes do Nascimento
 PMCG/SECOB - Coordenador
 de Planejamento de Obras

03 - Planta de Situação



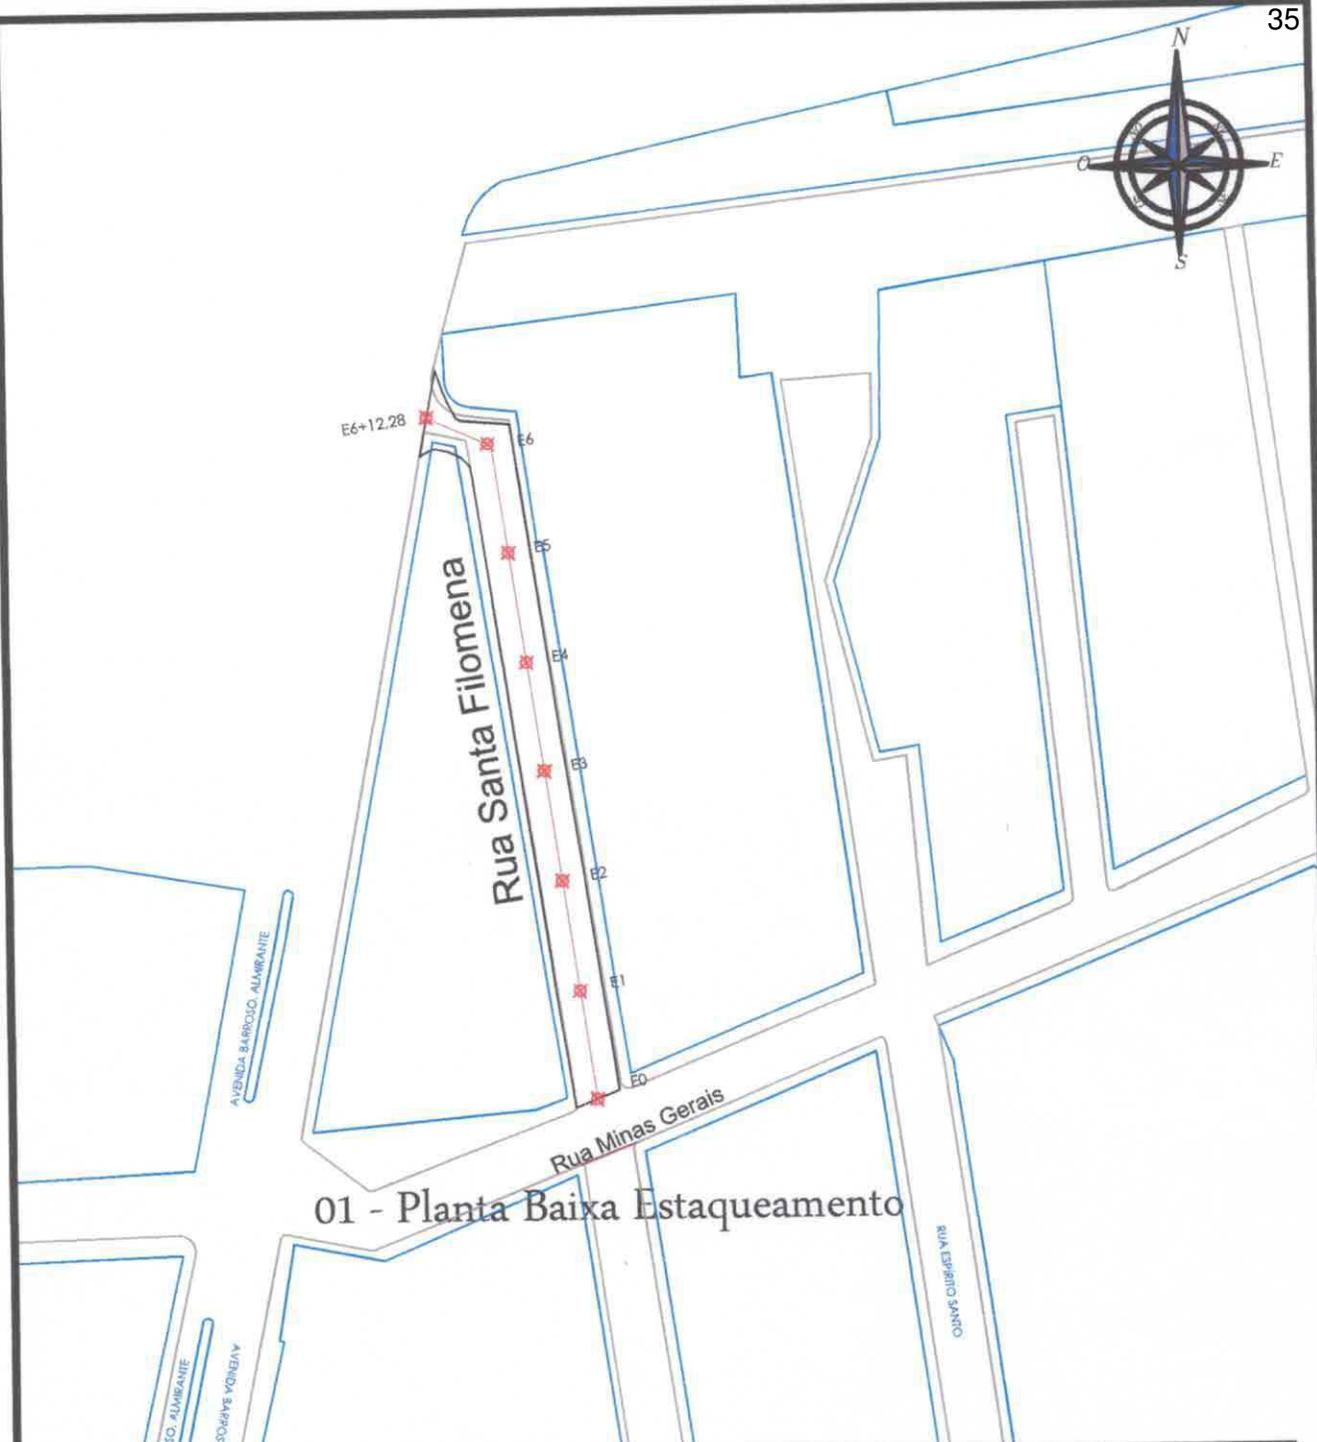

01 - Planta Baixa Estaqueamento


Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: Santa Filomena	
Bairro: Liberdade	
Data/Ano: novembro/2020	Prancha: 1/2
RUA SANTA FILOMENA	
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²
ÁREA DA RUA	1.085,61 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	132,28 m
LARGURA DA RUA (média)	8,21 m

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
 Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng. Civil - CREA nº 193.200/04

Adriano Gomes do Nascimento
 PMCG/SECOB - Coordenador
 de Planejamento de Obras

03 - Planta de Situação



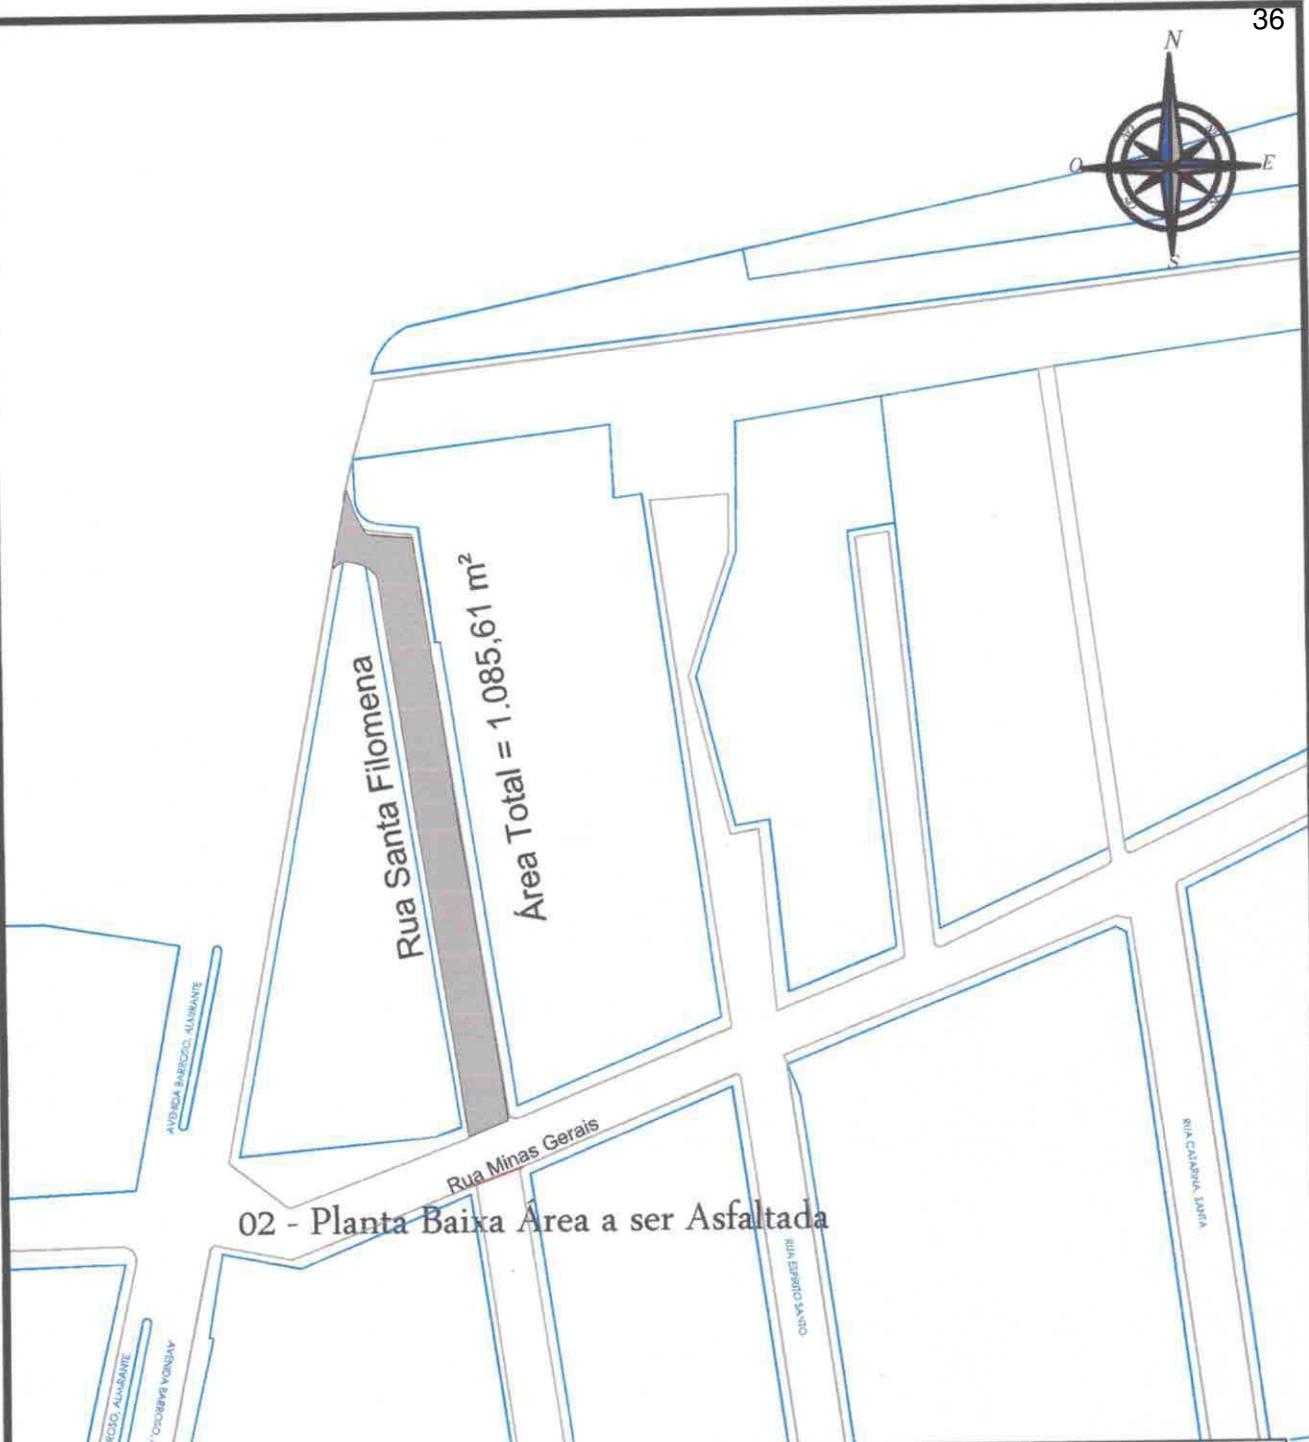


02 - Planta Baixa Área a ser Asfaltada

Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: Santa Filomena	
Bairro: Liberdade	
Data/Ano: novembro/2020	Prancha: 2/2
RUA SANTA FILOMENA	
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²
ÁREA DA RUA	1.085,61 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	132,28 m
LARGURA DA RUA (média)	8,21 m
<p>PREF. MUNIC. DE C. GRANDE Adriano Gomes do Nascimento PMCG/SECOB - Coordenador de Planejamento de Obras</p> <p>Francisco de Jesus C. Xavier Engº Civil - CRFA-09 Nº 160.293/21</p>	


03 - Planta de Situação



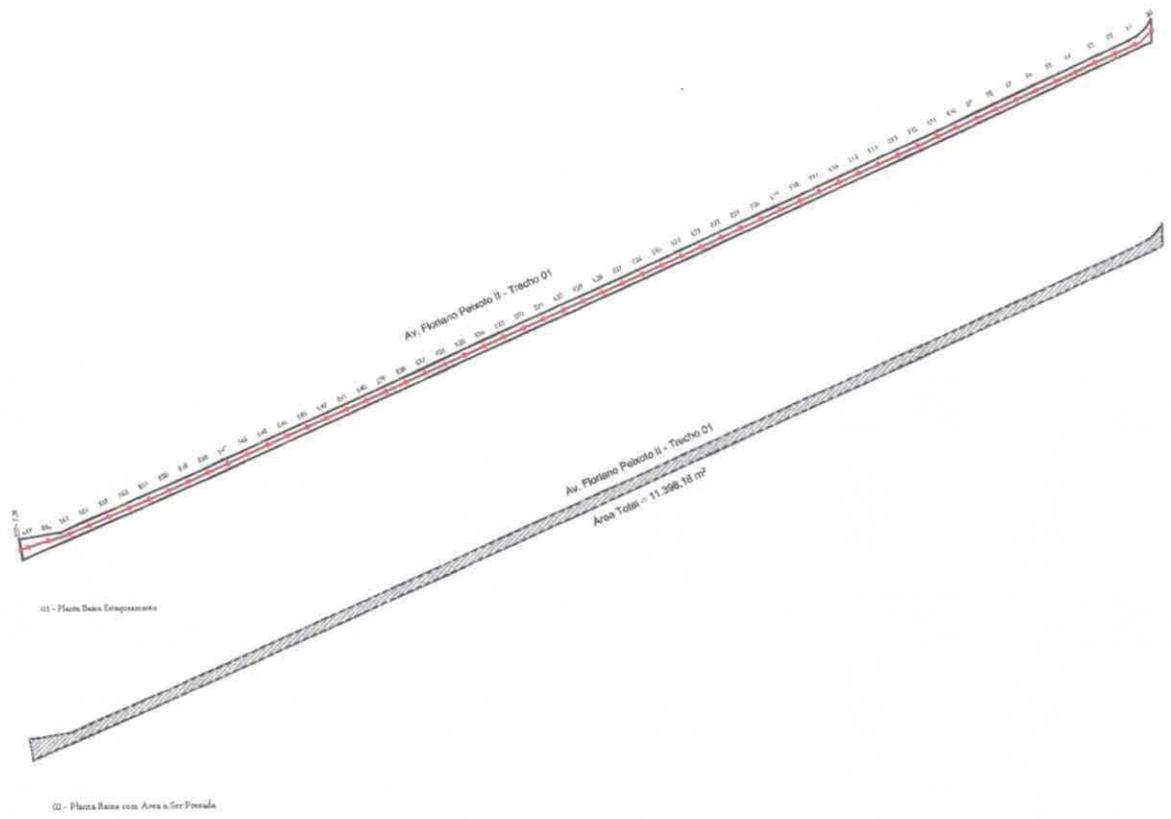


Proprietário:	Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto:	Pavimentação Asfáltica	
Rua:	Avenida Floriano Peixoto II – Trecho 01	
Bairro:	Dinamérica	
Data/Ano:	novembro/2020	Prancha: 1/2
AVENIDA FLORIANO PEIXOTO II – TRECHO 01		
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00	m ²
ÁREA DA RUA – FRESAGEM	11.398,18	m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	1.147,28	m
LARGURA DA RUA (média)	9,93	m

03 – Planta de Situação

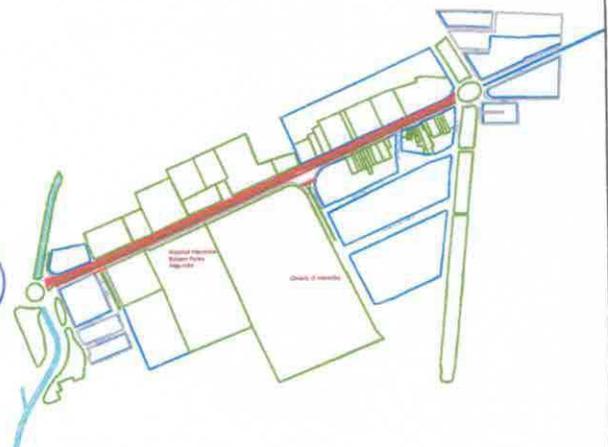



 Adriano Gomes do Nascimento
 Eng.º Civil - CR.º 3.079/2011 - 160.293.933
 PMCG/SECOB - Coordenador de Planejamento de Obras

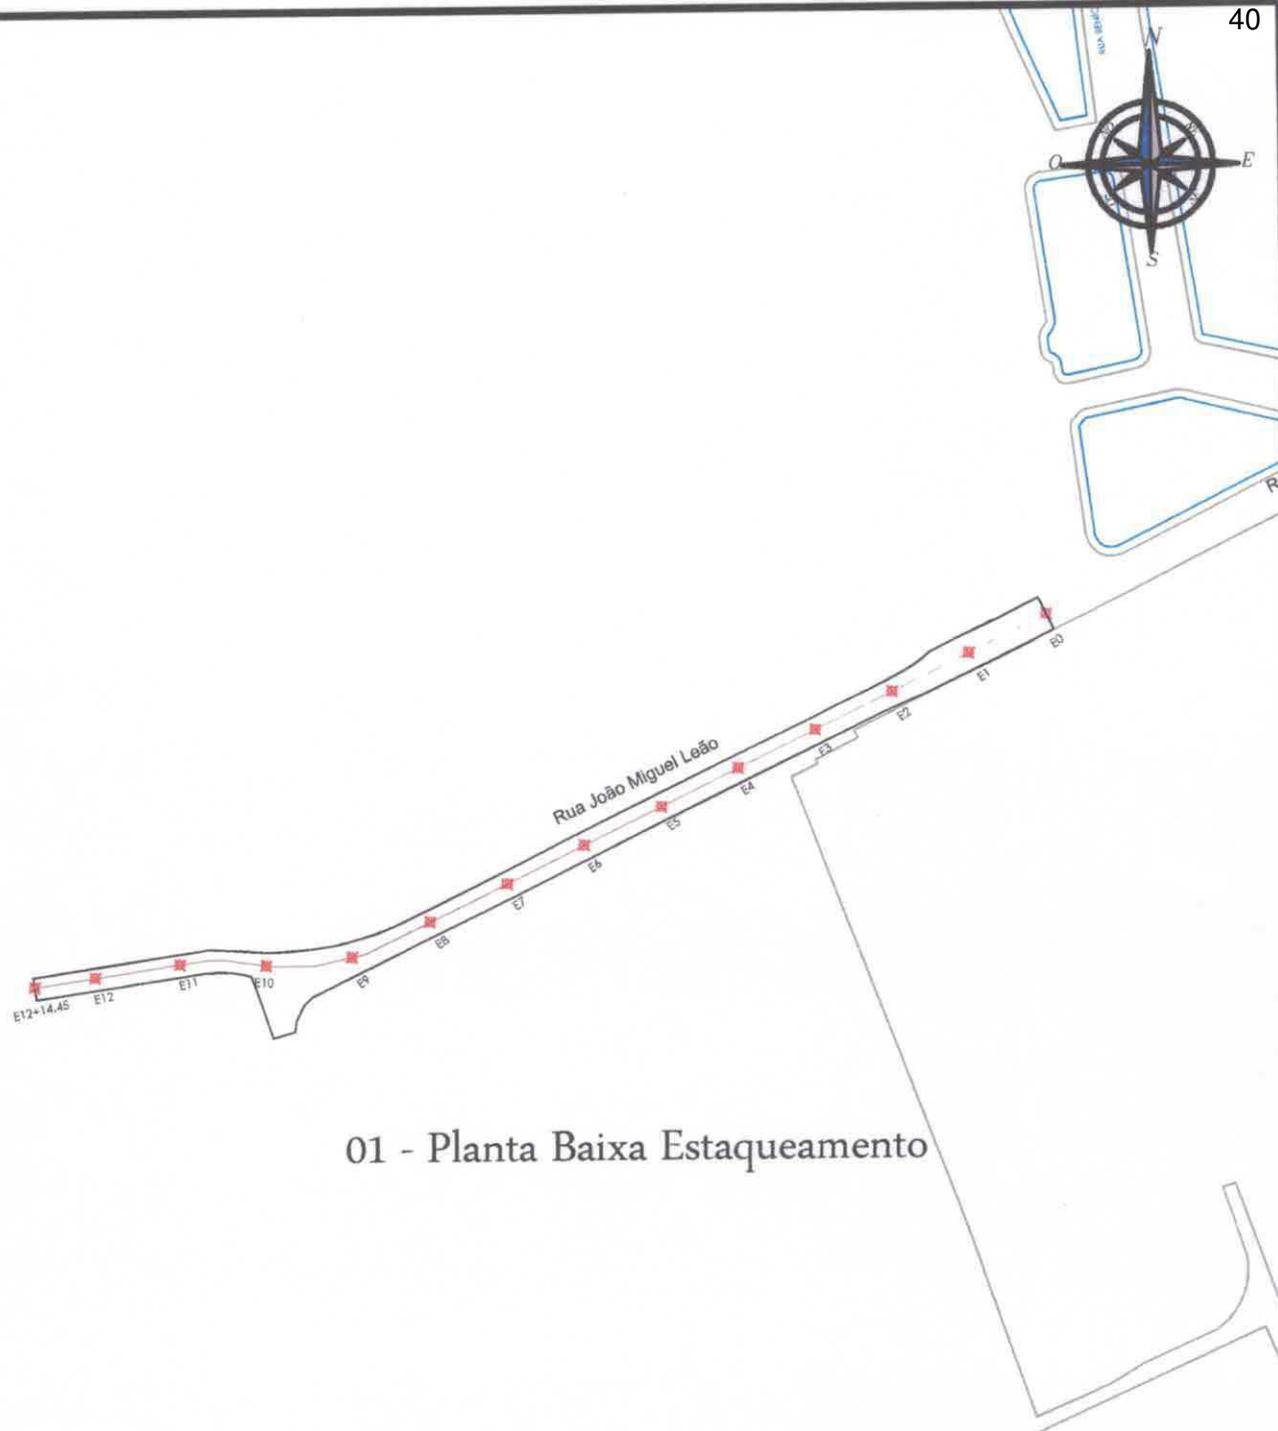

01 - Planta Baixa Estaqueamento

Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: João Miguel Leão	
Bairro: São José da Mata	
Data/Ano: agosto/2020	Prancha: 1/2
RUA JOÃO MIGUEL LEÃO	
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²
ÁREA DA RUA	1.769,95 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	254,45 m
LARGURA DA RUA (média)	6,96 m
<p>PREF. MUNIC. DE C. GRANDE Francisco de Jesus C. Xavier Eng. Civil - CREA-PB Nº 100.283594-2</p> <p>Adriano Gomes do Nascimento PMCG/SECOB - Coordenador de Planejamento de Obras</p>	

03 - Planta de Situação

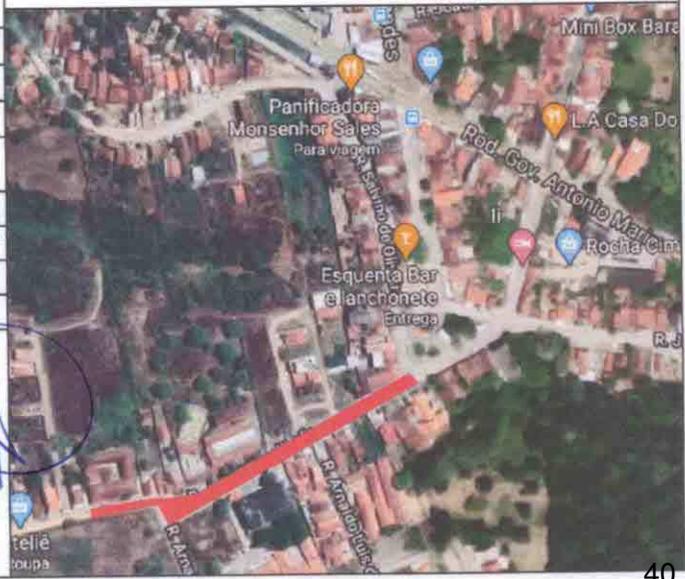





02 - Planta Baixa Área a ser Asfaltada


Proprietário: Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto: Pavimentação Asfáltica	
Rua: João Miguel Leão	
Bairro: São José da Mata	
Data/Ano: agosto/2020	Prancha: 2/2
RUA JOÃO MIGUEL LEÃO	
ÁREA DA BOCA DE RUA	0,00 m ²
ÁREA DA RUA	1.769,95 m ²
COMPRIMENTO DO EIXO	254,45 m
LARGURA DA RUA (média)	6,96 m

03 - Planta de Situação

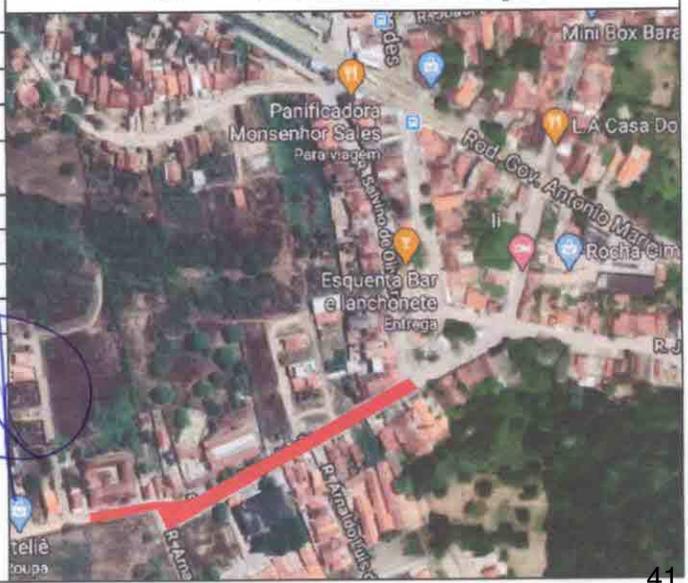


 PREFE. MUNIC. DE C. GRANITO
 Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng.º CIVIL - CREA-PE nº 160.263504-2

Adriano Gomes do Nascimento
 PMCG/SECOB - Coordenador
 de Planejamento de Obras

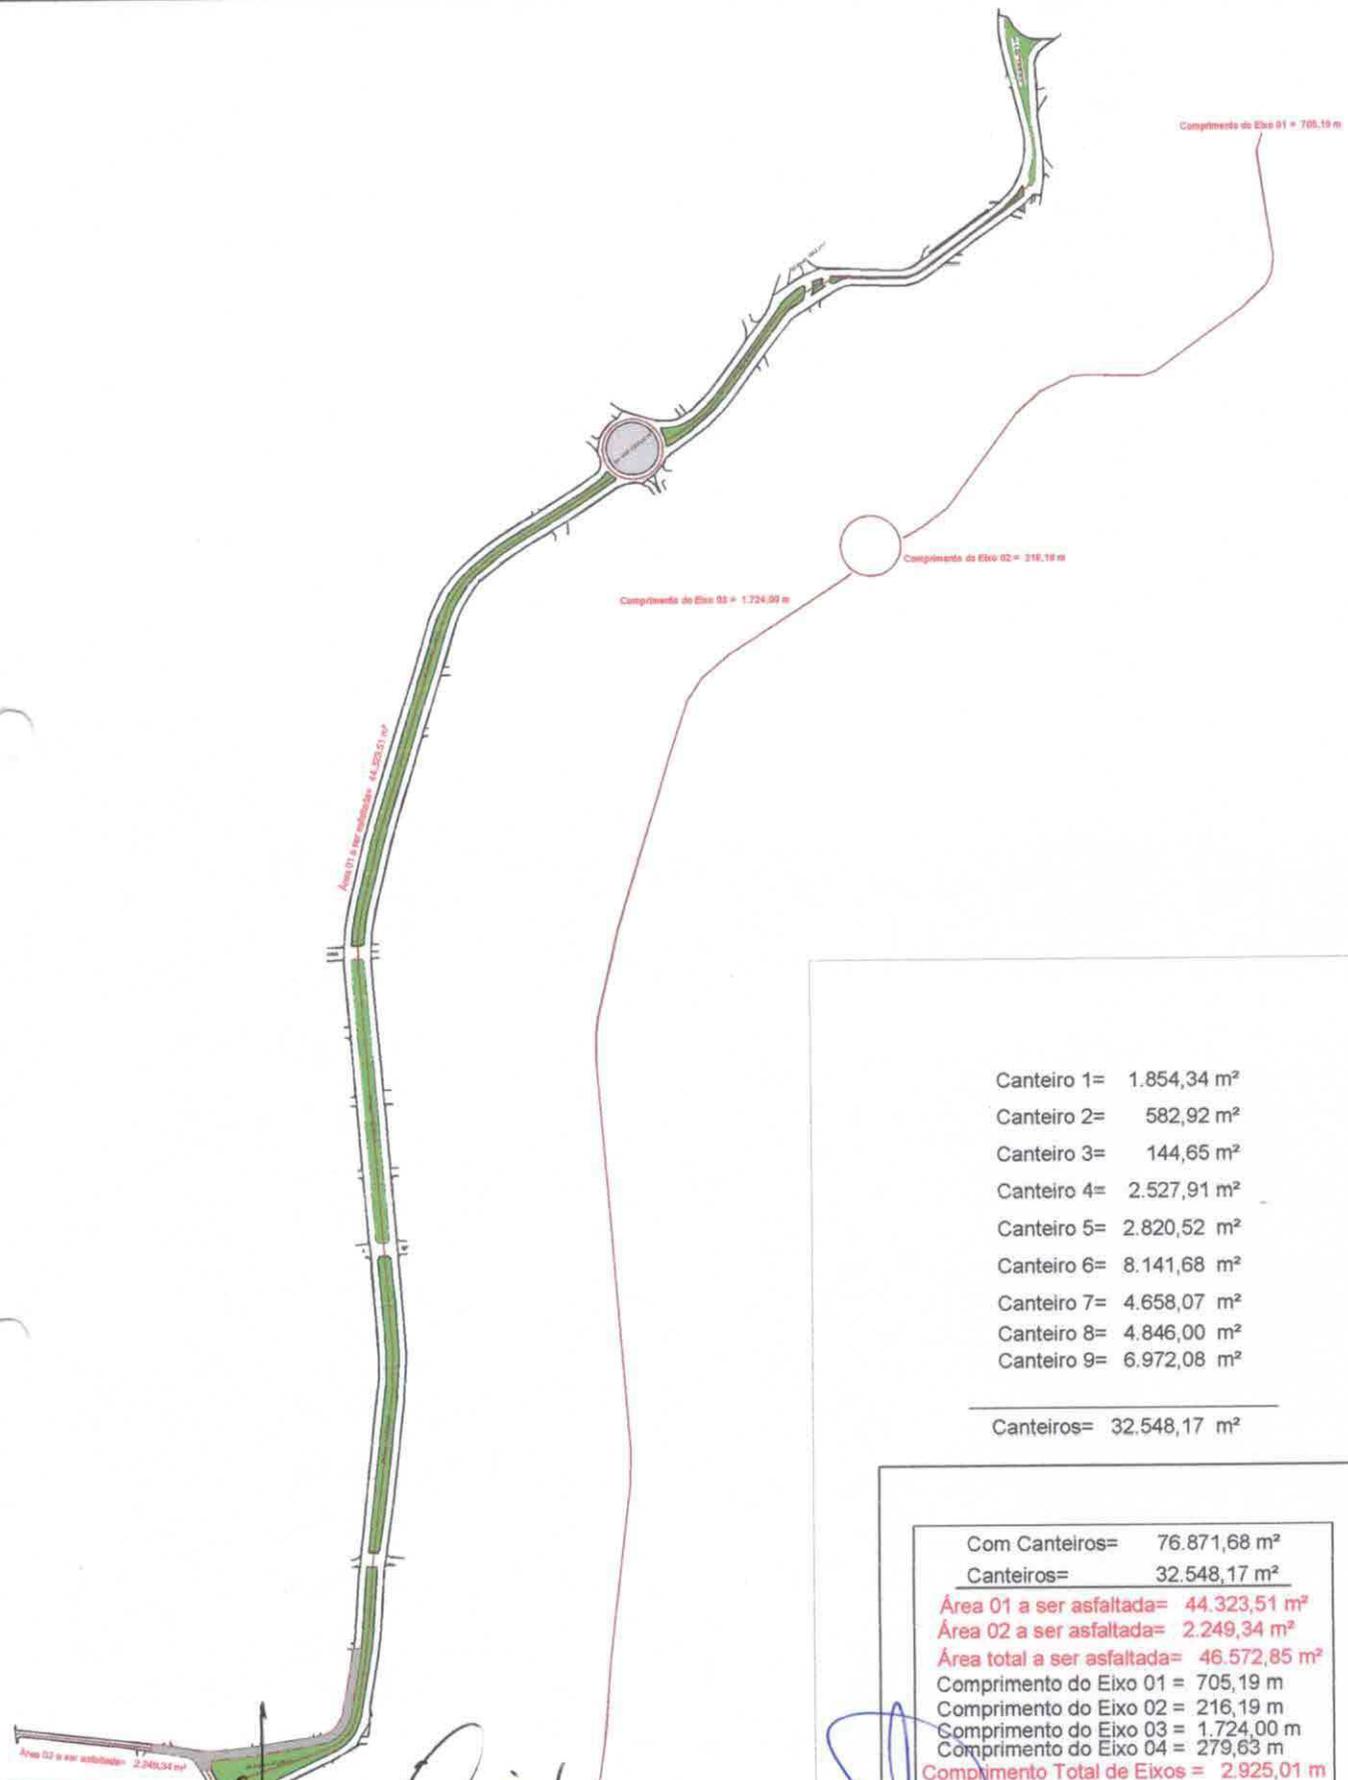

Canteiro 1=	1.854,34 m²
Canteiro 2=	582,92 m²
Canteiro 3=	144,65 m²
Canteiro 4=	2.527,91 m²
Canteiro 5=	2.820,52 m²
Canteiro 6=	8.141,68 m²
Canteiro 7=	4.658,07 m²
Canteiro 8=	4.846,00 m²
Canteiro 9=	6.972,08 m²
Canteiros=	32.548,17 m²

Com Canteiros=	76.871,68 m²
Canteiros=	32.548,17 m²
Área 01 a ser asfaltada=	44.323,51 m²
Área 02 a ser asfaltada=	2.249,34 m²
Área total a ser asfaltada=	46.572,85 m²
Comprimento do Eixo 01 =	705,19 m
Comprimento do Eixo 02 =	216,19 m
Comprimento do Eixo 03 =	1.724,00 m
Comprimento do Eixo 04 =	279,63 m
Comprimento Total de Eixos =	2.925,01 m

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng.º Civil - CREA-PB Nº 160.283594

Adriano Gomes do Nascimento
 PMCG/SECOB - Coordenador
 de Planejamento de Obras

Projeto: Levantamento Topográfico da Avenida Cônsul Joseph Noujaim Habib Nacad	Proprietário: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA	Prancha: 01
Localização: Avenida Cônsul Joseph Noujaim Habib Nacad, Campina Grande - PB	Descrição: Planta Baixa de Área a Ser Asfaltada	Topógrafo: Izaías Veríssimo Cordeiro
Área: Sem Esc. 46.572,85 m²	Data: novembro/2020	Técnico em Agrimensura: CFT.03407832494



Rua Ademar de Maia Paiva

Drenagem com Profundidade de 1,50 m



E7

E8


E9

E10

01 - Planta Baixa de Drenagem

Proprietário:	Construtora Rocha Cavalcante LTDA	
Projeto:	Drenagem	
Rua:	Ademar de Maia Paiva	
Bairro:	Alto Branco	
Data/Ano:	agosto/2020	Prancha: 1/1
RUA ADEMAR DE MAIA PAIVA		
CAIXA COLETORA	1 UNIDADE	
COMPRIMENTO DO DRENO	75,00 m	
LARGURA	0,80 m	
PROFUNDIDADE	1,50 m	

03 - Planta de Situação

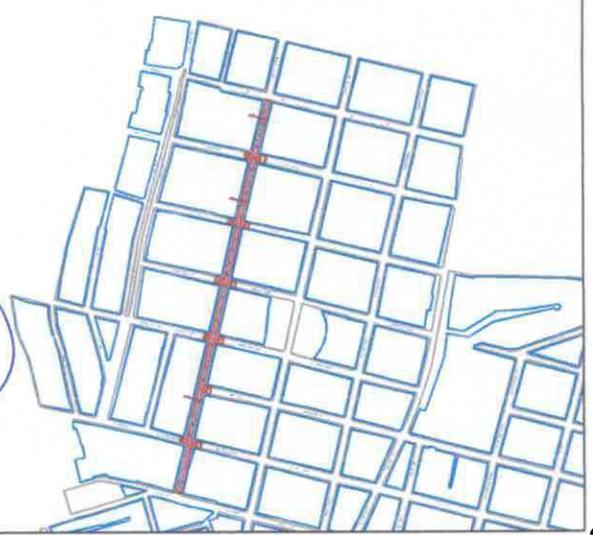

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
 Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng.º Civil - CREA-PB nº 180.2835-1

Adriano Gomes do Nascimento
 PMCG/SECOB - Coordenador
 de Planejamento de Obras



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.323.098/0001-92
Certidão nº: 8124982/2021
Expedição: 08/03/2021, às 10:57:09
Validade: 03/09/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.323.098/0001-92**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.323.098/0001-92 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/04/1980
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 64.93-0-00 - Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos 68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 68.10-2-03 - Loteamento de imóveis próprios 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R ALVARO DE ARAUJO PEREIRA	NÚMERO 255	COMPLEMENTO *****
CEP 58.402-300	BAIRRO/DISTRITO JARDIM TAVARES	MUNICÍPIO CAMPINA GRANDE
		UF PB
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (83) 3341-1471
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **25/05/2020** às **10:59:23** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
ASSESSORIA JURÍDICA**

PARECER Nº 02.08.007/2021

CONTRATO Nº 2.08.008/2018/SECOB/PMCG

**CONTRATO ADMINISTRATIVO.
ALTERAÇÃO. ADITIVO DE VALOR.
COMPROVAÇÃO DE MOTIVO
JUSTIFICADOR E OBEDEIÊNCIA AOS
LIMITES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
QUE REGE A MATÉRIA.**

I – RELATÓRIO

Cuida o presente parecer acerca da possibilidade jurídica de ser celebrado termo aditivo ao Contrato Administrativo nº **2.08.008/2018/SECOB/PMCG**, firmado entre a Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB, através de sua **SECRETARIA DE OBRAS** e a Empresa **CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA**, o qual tem por escopo o acréscimo de R\$ **3.536.449,97** (três milhões, quinhentos e trinta e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos), para a adequação das condições inicialmente pactuadas, em função da análise técnica realizada, de modo a adequar o objeto contratual às novas condições estabelecidas.

Juntado: Justificativa Técnica emitida pela Coordenadoria de Planejamento de Obras da SECOB, Certidões.

A mencionada alteração deve-se ao fato de que, no decorrer da execução, houve a necessidade de adequar a planilha orçamentária em decorrência da revisão em determinados itens para os serviços de melhoria da mobilidade urbana, com inclusão de novas ruas beneficiadas e/ou corrigidas, tudo em conformidade com a Justificativa Técnica apresentada pela Coordenadoria de Planejamento de Obras da SECOB.

É o relatório. Fundamento e opino.

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ TAVARES CAVALCANTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 14CD-97D9-8CAC-3B53



**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
ASSESSORIA JURÍDICA**

II - FUNDAMENTAÇÃO

A necessidade de alterar o valor basear-se-á no art. Art. 65, I, "a" e "b", II e §1º da Lei 8.666/93, em decorrência de acréscimo nos quantitativos de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei e suas alterações, conforme interesse da administração. Vejamos:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I – unilateralmente pela Administração:

- a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;*
- b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;*

(...)

§ 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

Serão mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurado o equilíbrio econômico-financeiro. Todas essas condições, previstas no ato convocatório e respectivo contrato.

Da dicção dos dispositivos transcritos em conjunto com o termo contratual, pode-se depreender, a princípio, que é juridicamente possível a pretendida alteração, pois será efetivada para corrigir os valores apontados sem que haja desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, haja vista tratar-se de acréscimo em percentual que respeita o dispositivo legal retro, tudo isso, indicado pela Coordenadoria de Planejamento de Obras da SECOB.

É importante ressaltar que a minuta do termo aditivo em análise ratifique todas as cláusulas e condições do contrato em curso.



**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
ASSESSORIA JURÍDICA**

Urge esclarecer, que toda a veracidade pelas informações e documentações apresentado é **de inteira responsabilidade dos contraentes.**

Nesse passo, convém chamar atenção para a possibilidade de aplicação de sanções de natureza administrativa, civil, pecuniária e penal **em caso de malversação da verba pública**, decorrentes de improbidade administrativa com a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, complementada pela Lei 10.028/2000, que criou novos tipos penais (crimes contra as finanças públicas), de modo a tornar mais efetivos os princípios constitucionais da Administração Pública (Art.37/CF).

Diante de todo o exposto, **opino pela viabilidade do presente Termo Aditivo nº 08 ao Contrato Administrativo nº 2.08.008/2018/SECOB/PMCG**, além das recomendações acima e publicações necessárias.

Como derradeiro argumento, devo esclarecer que o Parecer Jurídico é uma peça opinativa e que não vincula o Administrador e nem tampouco acarreta responsabilização para o Parecerista.

É o parecer.

À superior apreciação.

Campina Grande/PB, 26 de março de 2021.

ANDRÉ TAVARES CAVALCANTI

ASSESSOR JURÍDICO - SECOB

OAB - 17.453/PB



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 14CD-97D9-8CAC-3B53

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANDRÉ TAVARES CAVALCANTI (CPF 996.918.254-49) em 26/03/2021 12:03:58 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/14CD-97D9-8CAC-3B53>

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.323.098/0001-92
Razão Social: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA
Endereço: R ALVARO DE ARAUJO PEREIRA 255 / JARDIM TAVARES / CAMPINA
GRANDE / PB / 58402-300

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/03/2021 a 17/04/2021

Certificação Número: 2021031908113861619600

Informação obtida em 22/03/2021 07:43:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



uso das atribuições que lhe são conferidas e, ainda, em cumprimento às determinações contidas no Estatuto Federal das Licitações e Contratos com o Poder Público, Lei 8666/93, alterada, **CONVOCAR** a empresa **DIÁLISE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.407.854/0001-03, vencedora de itens do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 16750/2020/SMS/PMCG** para que seu representante legal compareça a **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE**, situada na Av. Assis Chateaubriand, 1376, Bairro da Liberdade, Campina Grande/PB, no **PRAZO 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS**, prazo este, em consonância com a cláusula 15.1, do edital do referido Pregão Eletrônico, a contar desta convocação, para assinar o Termo contratual, sob pena de perda do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 8.666/93, alterada.

FILIFE ARAÚJO REUL

Secretário Municipal de Saúde de Campina Grande - PB

LICITAÇÕES

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

CONVOCAÇÃO

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE/PB**, no uso das atribuições que lhe são conferidas e, ainda, em cumprimento às determinações contidas no Estatuto Federal das Licitações e Contratos com o Poder Público, Lei 8666/93, alterada, **CONVOCAR** a empresa **ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.407.854/0001-03, vencedora de itens do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 16635/2020/SMS/PMCG** para que seu representante legal compareça a **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE**, situada na Av. Assis Chateaubriand, 1376, Bairro da Liberdade, Campina Grande/PB, no **PRAZO 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS**, prazo este, em consonância com a cláusula 15.1, do edital do referido Pregão Eletrônico, a contar desta convocação, para assinar o Termo contratual, sob pena de perda do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 8.666/93, alterada.

FILIFE ARAÚJO REUL

Secretário Municipal de Saúde de Campina Grande - PB

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

CONVOCAÇÃO

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE/PB**, no uso das atribuições que lhe são conferidas e, ainda, em cumprimento às determinações contidas no Estatuto Federal das Licitações e Contratos com o Poder Público, Lei 8666/93, alterada, **CONVOCAR** a empresa **AGILLE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.697.594/0003-10, Contrato oriundo da Dispensa de Licitação Nº. **16198/2021/SMS/PMCG** para que seu representante legal compareça a **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE**, situada na Av. Assis Chateaubriand, 1376, Bairro da Liberdade, Campina Grande/PB, no **PRAZO 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS**, a contar desta convocação, para assinar o Termo contratual, sob pena de perda do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 8.666/93, alterada.

FILIFE ARAÚJO REUL

Secretário Municipal de Saúde de Campina Grande - PB

EXTRATOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

EXTRATOS DE CONTRATO

Objeto: Contratação de profissionais médicos, com comprovação de experiência de atuação, para atendimento de urgência e emergência, de forma complementar, em regime de atendimentos ambulatoriais, cirurgias, pareceres médicos, plantões presenciais e/ou sobreaviso, procedimentos ambulatoriais e visitas clínicas, para desempenharem suas atividades junto ao Fundo Municipal de Saúde de Campina Grande. **Prazo contratual:** 12 (doze) meses. **Fundamentação Legal:** Lei nº. 8666/93, alterada e Chamada Pública nº. 16.001/2019/FMS/PMCG, ratificada através de processo de Inexigibilidade de Licitação. **Funcional programática:** 10.302.1010.2104. **Elemento da despesa:** 3390.36. **Fonte dos recursos:** 1214.

Número do Contrato	Número da Inexigibilidade de Licitação	Valor Estimado do Contrato	Nome do Contratado
16165/2021	16161/2021	R\$ 288.000,00	André Pinto Villarim

FILIFE ARAÚJO REUL
Secretário de Saúde

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

EXTRATOS DE CONTRATO

Objeto: Contratação de profissionais médicos, com comprovação de experiência de atuação, para atendimento de urgência e emergência, de forma complementar, em regime de atendimentos ambulatoriais, cirurgias, pareceres médicos, plantões presenciais e/ou sobreaviso, procedimentos ambulatoriais e visitas clínicas, para desempenharem suas atividades junto ao Fundo Municipal de Saúde de Campina Grande. **Prazo contratual:** 12 (doze) meses. **Fundamentação Legal:** Lei nº. 8666/93, alterada e Chamada Pública nº. 16.001/2019/FMS/PMCG, ratificada através de processo de Inexigibilidade de Licitação. **Funcional programática:** 10.302.1010.2104. **Elemento da despesa:** 3390.36. **Fonte dos recursos:** 1214.

Número do Contrato	Número da Inexigibilidade de Licitação	Valor Estimado do Contrato	Nome do Contratado
16168/2021	16164/2021	R\$ 288.000,00	Monine Couto Farias Bem

FILIFE ARAÚJO REUL
Secretário de Saúde

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

EXTRATO DE CONTRATO

Instrumento: Termo De Contrato Nº 16796/2021/Sms/Pmccg. Partes: Fms/Pmccg 2021. Contrato Nº

Diagnóstico Humano Ltda. **Objeto:** Aquisição De Reagentes E Insumos Laboratoriais, Com Equipamentos De Automação E Semi-Automação E Acessórios Em Regime De Comodato, Para Atender As Necessidades Dos Laboratórios De Análises Clínicas Da Secretaria De Saúde De Campina Grande - Pb. **Valor Global:** R\$ 148.500,00. **Prazo Contratual:** Até 31 Dezembro De 2021. **Fundamentação Legal:** Pregão Eletrônico Nº. 16084/2021/Sms/Pmccg- Leis Nº 8.666/93, Nº 10.520/02, Nº 8.078/90 E Decreto Municipal 4.422/20 Alteradas. **Funcionais Programáticas:** 10.302.1010.2104. **Elemento Da Despesa:** 3390.30. **Fontes De Recursos:** 1214. **Signatários:** Filipe Araújo Reul E Gleide Maria Da Silva Medeiros. **FILIFE ARAÚJO REUL**
Secretário de Saúde

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Instrumento: Termo Aditivo Nº 002 Ao Contrato Nº 16081/2021/Sms/Pmccg, Oriundo Do Pregão Eletrônico Nº. 16787/2020. Partes: Sms/Pmccg E Posto De Combustível São Marcos Ltda. **Objeto Contratual:** Aquisição De “Combustível, Gasolina E Óleo Diesel”, Para Atender As Demandas Dos Veículos Da Secretaria Municipal De Saúde De Campina Grande - Pb. **Objeto Do Aditivo:** Aditivo Nos Itens 001 E 002. **Fundamentação:** Artigo 65 Da Lei Nº. 8.666/93. **Signatários:** Filipe Araujo Reul E Hussein Ramadan Moura. **FILIFE ARAÚJO REUL**
Secretário de Saúde

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

EXTRATO DE CONTRATO

Instrumento: Termo De Contrato Nº 16298/2021/Sms/Pmccg. **Partes:** Fms/Pmccg E Quibasa Quimica Basica Ltda. **Objeto:** Aquisição De Reagentes E Insumos Laboratoriais, Com Equipamentos De Automação E Semi-Automação E Acessórios Em Regime De Comodato, Para Atender As Necessidades Dos Laboratórios De Análises Clínicas Da Secretaria De Saúde De Campina Grande - Pb. **Valor Global:** R\$ 1.751.900,00. **Prazo Contratual:** Até 31 Dezembro De 2021. **Fundamentação Legal:** Pregão Eletrônico Nº. 16084/2021/Sms/Pmccg- Leis Nº 8.666/93, Nº 10.520/02, Nº 8.078/90 E Decreto Municipal 4.422/20 Alteradas. **Funcionais Programáticas:** 10.302.1010.2104. **Elemento Da Despesa:** 3390.30. **Fontes De Recursos:** 1214. **Signatários:** Filipe Araújo Reul E Victor Heinrich Arndt Junior. **Filipe Araújo Reul**
Secretário de Saúde

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS**

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE VALOR

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 08 AO CONTRATO Nº 2.08.008/2018/SECOB/PMCG. **PARTES:** SECOB/PMCG E CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA. **OBJETO CONTRATUAL:** RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIRROS: ALTO BRANCO, BELAVISTA, BODOCONGÓ/RAMADINHAI, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CENTRO, CONCEIÇÃO, CRUZEIRO, DINAMÉRIA, DISTRITO INDUSTRIAL, ESTAÇÃO VELHA, ITATARÉ, JARDIM PAULISTANO, JARDIM TAVARES, JOSÉ PINHEIRO, LIBERDADE, MALVINAS, MONTE SANTO, NOVA BRASÍLIA, NOVO BODOCONGÓ/ARAXÁ, PALMEIRA, PRATA, PRESIDENTE MÉDICI, QUARENTA, RAMADINHA, SANDRA CAVALCANTE, SANTA CRUZ, SANTA ROSA, SANTO ANTONIO, SÃO JOSÉ, SERROTÃO, TAMBOR, TRÊS IRMÃS, UNIVERSITÁRIO, VELAME, VILA CABRAL E NOS DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSÉ DA MATA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. **OBJETO DO ADITIVO:** ACRÉSCIMO DE R\$ 3.536.449,97 (TRÊS MILHÕES QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), AO VALOR ATUAL DE CONTRATO QUE ERA DE R\$ 34.147.903,10 (TRINTA E QUATRO MILHÕES CENTO E QUARENTA E SETE MIL NOVECIENTOS E TRÊS REAIS DEZ E CENTAVOS) PASSANDO ESTE PARA R\$ 37.684.353,07 (TRINTA E SETE MILHÕES SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SETE CENTAVOS). **FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:** 15 451 1025 2044. **ELEMENTO DA DESPESA:** 4490.51. **FONTE DE RECURSOS:** 1001. **RESERVA ORÇAMENTÁRIA:** 4831 **FUNDAMENTAÇÃO:** CONCORRÊNCIA Nº 2.08.002/2018/SECOB/PMCG E ARTIGO 65, I, “A” E “B”, II E § 1º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. **SIGNATÁRIOS:** FERNANDA RIBEIRO BARBOZA SILVA E JOSÉ DE ARIMATÉA ROCHA. **DATA DE ASSINATURA:** 26 DE MARÇO DE 2021.

Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES

**AVISO DE ADIAMENTO DO EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2021**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES/PB**, através de seu Pregoeiro Oficial, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, o **ADIAMENTO** da licitação divulgada no Diário do Estado da Paraíba no dia 16 de Março de 2021, folha 35, através do **EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2021**, tendo em vista a publicação da Medida Provisória nº 295 de 24 de Março de 2021 no Estado da Paraíba, para o dia **20 de Abril de 2021, às 10:00 (dez) horas** na sede da Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes/PB. Assim sendo, será publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba e no Diário oficial do Município de Santana dos Garrotes - PB. Qualquer informação poderá ser obtida no setor de Licitação no endereço acima mencionado, nos horários de expediente normal.

Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes/PB, 26 de Março de 2021.

Francisco Barboza de Moraes

Pregoeiro Oficial

RATIFICO/ADJUDICO o correspondente procedimento e convoco: NEIDE MARIA FERNANDES DE SOUZA - R\$ 15.000,00. Para assinar o termo de contrato, para que surta os efeitos legais conforme disposto na Lei nº 8.666/93.

Brejo do Cruz - PB, 26 de Março de 2021.
TALES TORRICELLI DE SOUSA COSTA E SILVA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Sólton de Lucena, 10 - Centro - Brejo do Cruz - PB, às 09:00 horas do dia 15 de Abril de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparadas, para: Contratação de empresa para prestar serviço de manutenção de equipamentos da Secretaria de Saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; Decreto Municipal nº 755/08; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3443-2240. E-mail: pmbcllicita@gmail.com. Edital: www.brejudocruz.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Brejo do Cruz - PB, 26 de Março de 2021.
ALISON DE SOUSA SILVA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021

A Pregoeira Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 00003/2021, para o dia 09 de Abril de 2021 às 13:30 horas; e do início da fase de lances para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Rua Capitão Pedro Moreira, 15 - Centro - Cacimba de Dentro - PB. Telefone: (83) 33791045. E-mail: cplcacimbadedentro@hotmail.com. Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Cacimba de Dentro - PB, 26 de Março de 2021
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO
Pregoeira

AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2021

A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Tomada de Preços nº 00001/2021, para o dia 07 de Abril de 2021 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Capitão Pedro Moreira, 15 - Centro - Cacimba de Dentro - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 33791045. E-mail: cplcacimbadedentro@hotmail.com.

Cacimba de Dentro - PB, 26 de Março de 2021
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO
Presidente da Comissão.

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2021

A Pregoeira Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 00002/2021, para o dia 12 de Abril de 2021 às 13:30 horas; e do início da fase de lances para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Rua Capitão Pedro Moreira, 15 - Centro - Cacimba de Dentro - PB. Telefone: (83) 33791045. E-mail: cplcacimbadedentro@hotmail.com. Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Cacimba de Dentro - PB, 26 de Março de 2021
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021

A Pregoeira Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 00001/2021, para o dia 05 de Abril de 2021 às 13:30 horas; e do início da fase de lances para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Rua Capitão Pedro Moreira, 15 - Centro - Cacimba de Dentro - PB. Telefone: (83) 33791040. E-mail: cplcacimbadedentro@hotmail.com. Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Cacimba de Dentro - PB, 26 de Março de 2021
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALÁU

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Nominando Firmo, 56 - Centro - Camaláu - PB, às 09h01min horas do dia 09 de abril 2021, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Registro de preços para futura e eventual aquisição de filtros óleos e lubrificantes para atender as demandas das secretarias municipais, conforme especificações do termo de referência. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08h00min as 14h00min horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33021013. E-mail: cplcamalaulicita@gmail.com. Edital: www.camlau.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Camaláu - PB, 25 de março de 2021.

JEFERSON DOUGLAS DA SILVA
pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Instrumento: Termo Aditivo Nº 08 Ao Contrato Nº 2.08.008/2018/Secob/Pmccg. Partes: Secob/Pmccg E Construtora Rocha Cavalcante Ltda. Objeto Contratual: Recapeamento Asfáltico Nos Bairros: Alto Branco, Belavista, Bodocongó/ Ramadinhaii, Catolé, Centenário, Centro, Conceição, Cruzeiro, Dinâmica, Distrito Industrial, Estação Velha, Itatapé, Jardim Paulistano, Jardim Tavares, José Pinheiro, Liberdade, Malvinas, Monte Santo, Nova Brasília, Novo Bodocongó/Araxá, Palmeira, Prata, Presidente Médici, Quarenta, Ramadinha, Sandra Cavalcante, Santa Cruz, Santa Rosa, Santo Antônio, São José, Serrotão, Tambor, Três Irmãs, Universitário, Velame, Vila Cabral E Nos Distritos De Galante E São José Da Mata, No Município De Campina Grande, Estado Da Paraíba. Objeto Do Aditivo: Acréscimo De R\$ 3.536.449,97 (Três Milhões Quinhentos E Cinquenta E Seis Mil Quatrocentos E Quarenta E Nove Reais E Noventa E Sete Centavos), Ao Valor Atual De Contrato Que Era De R\$ 34.147.903,10 (Trinta E Quatro Milhões Cento E Quarenta E Sete Mil Novecentos E Três Reais Dez E Centavos) Passando Este Para R\$ 37.684.353,07 (Trinta E Sete Milhões Seicentos E Oitenta E Quatro Mil Trezentos E Cinquenta E Três Reais E Sete Centavos). Funcional Programática: 15 451 1025 2044. Elemento Da Despesa: 4490.51. Fonte De Recursos: 1001. Reserva Orçamentária: 4831 Fundamentação: Concorrência Nº 2.08.002/2018/Secob/Pmccg E Artigo 65, I, "A" E "B", II E § 1º Da Lei Federal Nº 8.666/93 E Suas Alterações. Signatários: Fernanda Ribeiro Barboza Silva E José De Arimatéa Rocha. Data De Assinatura: 26 De Março De 2021.

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 15/2021 - UASG 981981

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21/2021

A Secretaria Municipal De Educação Da Prefeitura De Campina Grande - Pb, Através Do Pregoeiro Oficial, Torna Público, Que O Pregão Eletrônico Tipo "Menor Preço Por Item", Cujo Objeto É A Contratação De Empresa Especializada Na Prestação De Serviços De Desentupimento E Limpeza De Fossas Sépticas, Das Creches E Escolas Da Rede Municipal De Educação Da Prefeitura Municipal De Campina Grande, Estado Da Paraíba, Fica Adiado Para O Dia 14/04/2021 Às 08:30 Horas. O Novo Edital Estará À Disposição Através Do E-Mail (Cpmpmccg@Campinagrande.Pb.Gov.Br) E Dos Portais (Https://Campinagrande.Pb.Gov.Br/Portal-Da-Transparencia/Licitacoes-E-Contratos/), (Https://Www.Comprasgovernamentais.Gov.Br/) E (Https://Tramita.Tce.Pb.Gov.Br/Tramita/Pages/Main.Jsf).

Campina Grande, 26 De Março De 2021.
CALINE SINARA DA COSTA GUIMARÃES
Pregoeira I

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 16.001/2019

77ª HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS

A Secretaria Municipal de Saúde, depois de acolhida a prévia apreciação documental vem, por meio deste ato, homologar o credenciamento dos seguintes profissionais médicos, em sede do Chamamento Público Nº. 16.001/2019 por estarem revestidos da legalidade exigida pelo Edital do certame, para atuarem junto ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE. Campina Grande 25 de Fevereiro de 2021.

Nº	PROFISSIONAL	CPF
1	ANA MARIA DA SILVA ANSELMO	037.954.694-90
2	ARTHUR RIBEIRO PEREIRO	076.968.654-04
3	BRUNO BARBOSA DE MELO	022.379.794-48
4	DANIELE ANDRADE MOTA	113.215.994-63
5	DARLAN GOMES NOBREGA	070.346.514-77
6	DAYSY MAIA DINIZ	014.395.244-75
7	EUGENIO HENRIQUE VILELA SILVA	057.829.655-17
8	FELIPE NOBRE AREA LIMA	085.656.349-81
9	FELIZARDO CORDEIRO NETO	076.704.304-94
10	HERMANO BARBOSA DE LIMA	839.303.614-34
11	JESSICA SHARDELA ALMEIDA ALVES	057.716.544-50
12	JOÃO PAULO VITORINO ESMERALDO	016.744.813-73
13	JOSÉ MARIA CANDIDO COSTA	219.696.554-53
14	MELANIA MARIA RAMOS DE AMORIM	569.821.784-04
15	MIRANDA DE ALMEIDA MAIA	203.796.094-87
16	PEDRO HENRIQUE CALUETE DOS SANTOS	085.478.544-28
17	VANDENBERG CARNEIRO MENDES	081.532.624-49
18	VANIELY KALINY PINHEIRO DE QUEIROZ	072.235.814-84
19	VILAUBA MARIA SOUTO DE FIGUEIREDO	078.658.994-91
Nº	PROFISSIONAL	CNPJ
1	APBC CLINICA E SERVIÇOS LTDA	40.771.468/0001-02
2	CAMILLA MARIANA ALBUQUERQUE GALDINO EIRELI	34.957.850/0001-02
3	CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA	23.474.151/0001-87
4	CLIMED GESTAO DE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	40.797.247/0001-03
5	CLINICA MEDICA DRA. MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS IEIRELI - EPP	21.516.473/0001-16
6	ELIANE DANTAS PEREIRA E SILVA EIRELI	38.328.195/0001-76
7	ESPAÇO FISIO E FILATES CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	13.866.093/0001-83
8	KM SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	40.728.833/0001-98
9	LEANDRO ALVES CARVALHO PINTO EIRELI	29.102.360/0001-86
10	MEDLIFE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	34.235.803/0001-47
11	VIGOR GESTÃO DE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	37.735.147/0001-30

FILIPE ARAÚJO REUL
Secretário de Saúde



(DEZ MIL E QUINHENTOS REAIS). **VIGÊNCIA:** 31 DE DEZEMBRO DE 2021. **LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 050/2020. **FUNDAMENTAÇÃO:** LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. **FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:** 12 361 1015 2030 | 3390.39 / 4490.52 | 1120. **SIGNATÁRIOS:** RAYMUNDO ASFORA NETO E FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA. **DATA DE ASSINATURA:** 24 DE MARÇO DE 2021.

RAYMUNDO ASFORA NETO
Secretário De Educação

EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: CONTRATO Nº 2.06.029/2021. **PARTES:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ASTECENDIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - EPP. **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E RECARGA DE EXTINTORES DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. **VALOR:** R\$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais). **VIGÊNCIA:** 31 DE DEZEMBRO DE 2021. **LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 050/2020. **FUNDAMENTAÇÃO:** LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. **FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:** 12 361 1015 2030 | 3390.39 / 4490.52 | 1120. **SIGNATÁRIOS:** RAYMUNDO ASFORA NETO E FRANCISCO GUTEMBERG CAMPELO. **DATA DE ASSINATURA:** 24 DE MARÇO DE 2021.

RAYMUNDO ASFORA NETO
Secretário De Educação

EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: CONTRATO Nº 2.06.030/2021. **PARTES:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME. **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE IP FIXO, COM VELOCIDADE MÍNIMA GARANTIDA DE 100 (CEM) MBPS (MEGABITS POR SEGUNDO), VISANDO ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS DE CONEXÃO PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. **VALOR:** R\$ 16.799,76 (DEZESSEIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS). **VIGÊNCIA:** 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO PRESENTE TERMO. **LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 083/2020. **FUNDAMENTAÇÃO:** LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. **FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:** 12 361 1015 2030 | 3390.40 | 1111. **SIGNATÁRIOS:** RAYMUNDO ASFORA NETO E SMALEY SILVA DE ARAUJO. **DATA DE ASSINATURA:** 25 DE MARÇO DE 2021.

RAYMUNDO ASFORA NETO
Secretário De Educação

SECRETARIA DE OBRAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE VALOR

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 08 AO CONTRATO Nº 2.08.008/2018/SECOB/PMCG. **PARTES:** SECOB/PMCG E CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA. **OBJETO**

CONTRATUAL: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIRROS: ALTO BRANCO, BELAVISTA, BODOCONGÓ/RAMADINHAI, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CENTRO, CONCEIÇÃO, CRUZEIRO, DINAMÉRICA, DISTRITO INDUSTRIAL, ESTAÇÃO VELHA, ITATARÉ, JARDIM PAULISTANO, JARDIM TAVARES, JOSÉ PINHEIRO, LIBERDADE, MALVINAS, MONTESANTO, NOVA BRASÍLIA, NOVO BODOCONGÓ/ARAXÁ, PALMEIRA, PRATA, PRESIDENTEMÉDICI, QUARENTA, RAMADINHA, SANDRA CAVALCANTE, SANTA CRUZ, SANTA ROSA, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTÃO, TAMBOR, TRÊS IRMÃS, UNIVERSITÁRIO, VELAME, VILA CABRAL E NOS DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSÉ DA MATA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. **OBJETO DO ADITIVO:** ACRÉSCIMO DE R\$ 3.536.449,97 (TRÊS MILHÕES QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), AO VALOR ATUAL DE CONTRATO QUE ERA DE R\$ 34.147.903,10 (TRINTA E QUATRO MILHÕES CENTO E QUARENTA E SETE MIL NOVECENTOS E TRÊS REAIS DEZ E CENTAVOS) PASSANDO ESTE PARA R\$ 37.684.353,07 (TRINTA E SETE MILHÕES SEICENTOS E OITENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SETE CENTAVOS). **FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:** 15 451 1025 2044. **ELEMENTO DA DESPESA:** 4490.51. **FONTE DE RECURSOS:** 1001. **RESERVA ORÇAMENTÁRIA:** 4831 **FUNDAMENTAÇÃO:** CONCORRÊNCIA Nº 2.08.002/2018/SECOB/PMCG E ARTIGO 65, I, "A" E "B", II E § 1º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. **SIGNATÁRIOS:** FERNANDA RIBEIRO BARBOZA SILVA E JOSÉ DE ARIMATÉA ROCHA. **DATA DE ASSINATURA:** 26 DE MARÇO DE 2021.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: CONTRATO Nº 2.09.006/2021. **PARTES:** SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E EMPRESA CS BRASIL FROTAS LTDA. **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. **VALOR:** R\$ 28.261,68 (VINTE E OITO MIL, DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS). **VIGÊNCIA:** 12 MESES A PARTIR DA DATA DE PUBLICAÇÃO. **LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 098/2020. **FUNDAMENTAÇÃO:** LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. **FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:** 16 482 1023 2054 | 3390.30 | 1001 - 1510. **SIGNATÁRIOS:** FELIX ARAUJO NETO, ANSELMO TOLENTINO SOARES JÚNIOR E JOÃO BOSCO RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO. **DATA DE ASSINATURA:** 23 DE MARÇO DE 2021.

FÉLIX ARAÚJO NETO
Secretário De Planejamento

SECRETARIA DE SAÚDE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16.116/2021

O Secretário Municipal de Saúde de Campina Grande/PB, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar Nº.



ESTADO DA PARAÍBA...
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE VALOR

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 08 AO CONTRATO Nº 2.08.008/2018/SECOB/PMCG. **PARTES:** SECOB/PMCG E CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA. **OBJETO CONTRATUAL:** RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIRROS: ALTO BRANCO, BELAVISTA, BODOCONGÓ/RAMADINHAI, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CENTRO, CONCEIÇÃO, CRUZEIRO, DINAMÉRICA, DISTRITO INDUSTRIAL, ESTAÇÃO VELHA, ITATARÉ, JARDIM PAULISTANO, JARDIM TAVARES, JOSÉ PINHEIRO, LIBERDADE, MALVINAS, MONTE SANTO, NOVA BRASÍLIA, NOVO BODOCONGÓ/ARAXÁ, PALMEIRA, PRATA, PRESIDENTE MÉDICI, QUARENTA, RAMADINHA, SANDRA CAVALCANTE, SANTA CRUZ, SANTA ROSA, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTÃO, TAMBOR, TRÊS IRMÃS, UNIVERSITÁRIO, VELAME, VILA CABRAL E NOS DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSÉ DA MATA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. **OBJETO DO ADITIVO:** ACRÉSCIMO DE R\$ 3.536.449,97 (TRÊS MILHÕES QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), AO VALOR ATUAL DE CONTRATO QUE ERA DE R\$ 34.147.903,10 (TRINTA E QUATRO MILHÕES CENTO E QUARENTA E SETE MIL NOVECIENTOS E TRÊS REAIS DEZ E CENTAVOS) PASSANDO ESTE PARA R\$ 37.684.353,07 (TRINTA E SETE MILHÕES SEICENTOS E OITENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SETE CENTAVOS). **FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:** 15 451 1025 2044. **ELEMENTO DA DESPESA:** 4490.51. **FONTE DE RECURSOS:** 1001. **RESERVA ORÇAMENTÁRIA:** 4831 **FUNDAMENTAÇÃO:** CONCORRÊNCIA Nº 2.08.002/2018/SECOB/PMCG E ARTIGO 65, I, "A" E "B", II E § 1º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. **SIGNATÁRIOS:** FERNANDA RIBEIRO BARBOZA SILVA E JOSÉ DE ARIMATÉA ROCHA. DATA DE ASSINATURA: 26 DE MARÇO DE 2021.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS

8º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2.08.008/2018/SECOB/PMCG

8º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 2.08.008/2018/SECOB/PMCG, PACTUADO NO TIPO DE MENOR PREÇO GLOBAL, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRARAM A SECRETARIA DE OBRAS E A CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA, PARA ALTERAÇÃO DE VALOR, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FORMA ABAIXO:

A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ÓRGÃO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO, INSCRITA NO CNPJ DO MF SOB O Nº 08.993.917/0001-46, COM SEDE NA AV. TREZE DE MAIO, N.º 329, 5º ANDAR, CENTRO, NESTA CIDADE, A PARTIR DE AGORA CHAMADA SIMPLEMENTE CONTRATANTE, E NESTE ATO REPRESENTADO PELA SRA. FERNANDA RIBEIRO BARBOZA SILVA ALBUQUERQUE, BRASILEIRA, CASADA, ENGENHEIRA CIVIL, RESIDENTE E DOMICILIADA EM CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA DE UM LADO E, DE OUTRO, A CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 09.323.098/0001-92, COM SEDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DE AGORA POR DIANTE CHAMADA APENAS CONTRATADA, JÁ DEVIDAMENTE QUALIFICADA NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO INAUGURADO PELO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2.08.002/2018/SECOB/PMCG, NESTE ATO REPRESENTADA PELO SEU RESPONSÁVEL LEGAL SR. JOSÉ DE ARIMATEA ROCHA.

CONSIDERANDO A IMPERIOSA NECESSIDADE DE VIABILIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRATADAS, VISANDO PROMOVER À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OTIMIZAR AS MODIFICAÇÕES NECESSÁRIAS AO CONTRATO, ALTERA SEU VALOR EM VIRTUDE DA INCLUSÃO DE NOVAS RUAS E NOVOS SERVIÇOS, CONSOANTE JUSTIFICATIVA TÉCNICA EMITIDA PELA FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS DA SECOB.

CONSIDERANDO, AINDA, A SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR E O DEVER-DE-EFICIÊNCIA DO AGENTE PÚBLICO NOS CONTRATOS EM QUE SEJAM PARTE A UNIÃO, OS ESTADOS E OS MUNICÍPIOS, ONDE RESTE COMPROVADA SOBEJAMENTE A PRESERVAÇÃO FINANCEIRA DO ERÁRIO MUNICIPAL E FEDERAL.

CONSIDERANDO, POR DERRADEIRO, A AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA AUTORIDADE SUPERIOR QUE ORDENA DESPESAS NA SECOB.

DECIDIRAM AS PARTES CONTRATANTES ASSINAR DE COMUM ACORDO E NA MELHOR DA LEI o 8º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 2.08.008/2018/SECOB/PMCG, ORIGINADO DA CONCORRÊNCIA Nº 2.08.002/2018/SECOB/PMCG, CUJO OBJETO É: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIRROS: ALTO BRANCO, BELA VISTA, BODOCONGÓ/RAMADINHA II, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CENTRO, CONCEIÇÃO, CRUZEIRO, DINAMÉRICA, DISTRITO INDUSTRIAL, ESTAÇÃO VELHA, ITARARÉ, JARDIM PAULISTANO, JARDIM TAVARES, JOSÉ PINHEIRO, LIBERDADE, MALVINAS, MONTE SANTO, NOVA BRASÍLIA, NOVO BODOCONGÓ/ARAXÁ, PALMEIRA, PRATA, PRESIDENTE MÉDICI, QUARENTA, RAMADINHA, SANDRA CAVALCANTE, SANTA CRUZ, SANTA ROSA, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTÃO, TAMBOR, TRÊS IRMÃS, UNIVERSITÁRIO, VELAME, VILA CABRAL E NOS DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSÉ DA MATA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, CELEBRADO EM 16 DE OUTUBRO DE 2018, ENTRE AS MESMAS PARTES, PARA ALTERAR O VALOR, O QUAL SERÁ REGULADO PELAS CLÁUSULAS ADIANTE ADUZIDAS, PELOS PRECEITOS DE DIREITO PÚBLICO, APLICANDO-SE-LHE, SUPLETIVAMENTE, OS PRINCÍPIOS DA TEORIA GERAL DOS CONTRATOS E AS DISPOSIÇÕES DE DIREITO PRIVADO E CONDIÇÕES QUE MUTUAMENTE ACORDAM E ACEITAM:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR

FICA ACRESCIDO O VALOR DE R\$ 3.536.449,97 (TRÊS MILHÕES QUINHENTOS E TRINTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), AO VALOR ATUAL DE CONTRATO QUE ERA DE R\$ 34.147.903,10 (TRINTA E QUATRO MILHÕES CENTO E QUARENTA E SETE MIL NOVECENTOS E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS) PASSANDO ESTE PARA R\$ 37.684.353,07 (TRINTA E SETE MILHÕES SEICENTOS E OITENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SETE CENTAVOS). PERFAZENDO UM PERCENTUAL DE 16,43 (DEZESSEIS VIRGULA QUARENTA E TRÊS) POR CENTO.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS

VALOR INICIAL DO CONTRATO - CEF/PMCG	R\$ 32.427.053,06
VALOR DA 1ª ADEQUAÇÃO-PMCG(RECURSO PRÓPRIO)	R\$ 1.471.026,56
VALOR TOTAL DE CONTRATO APÓS 1ª ADEQUAÇÃO-PMCG (RECURSO PRÓPRIO)	R\$ 33.898.079,62
VALOR DA 2ª ADEQUAÇÃO-CORRESPONDE À 1ª ADEQUAÇÃO ACATADA PELA CEF	R\$ - 221.736,50
VALOR ATUAL DE CONTRATO APÓS 2ª ADEQUAÇÃO (PMCG X CEF)	R\$ 33.676.343,12
VALOR DA 3ª ADEQUAÇÃO-PMCG (RECURSO PRÓPRIO)	R\$ 201.141,98
VALOR ATUAL DE CONTRATO APÓS 3ª ADEQUAÇÃO-PMCG (RECURSO PRÓPRIO)	R\$ 33.877.485,10
VALOR DA 4ª ADEQUAÇÃO-PMCG (RECURSO PRÓPRIO)	R\$ 109.236,74
VALOR ATUAL DE CONTRATO APÓS 4ª ADEQUAÇÃO-PMCG (RECURSO PRÓPRIO)	R\$ 33.986.721,84
VALOR DA 5ª ADEQUAÇÃO -CORRESPONDE A 2ª ADEQUAÇÃO ACATADA PELA CEF	R\$ 161.181,26
VALOR ATUAL DE CONTRATO APÓS 5ª ADEQUAÇÃO(PMCG X CEF)	R\$ 34.147.903,10
VALOR DA 6ª ADEQUAÇÃO-PMCG (RECURSO PRÓPRIO)	R\$ 3.536.449,97
VALOR ATUAL DE CONTRATO APÓS 6ª ADEQUAÇÃO- PMCG (RECURSO PRÓPRIO)	R\$ 37.684.353,07
PERCENTUAL ATUALIZADO DE ADITIVO AO CONTRATO	16,43%

O VALOR DESSA 6ª ADEQUAÇÃO , OU SEJA, R\$ 3.536.449,97(TRES MILHÕES,QUINHENTOS E TRINTA E SEIS MIL,QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) SERÁ APENAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA PMCG E GERA UM VALOR FINAL DE CONTRATO IGUAL A R\$ 37.684.353,07 (TRINTA E SETE MILHÕES,SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E SETE CENTAVOS) E DIFERE PORTANTO DO VALOR ATUAL DE CONVÊNIO ABAIXO MENCIONADO, QUE É DE R\$ 32.366.497,82 (TRINTA E DOIS MILHÕES TREZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) EM VIRTUDE DE ALGUMAS ADEQUAÇÕES ANTERIORES TAMBÉM TEREM SIDO DE RESPONSABILIDADE APENAS DA PMCG.

VALOR FINAL DE CONTRATO – R\$ 37.684.353,07
 VALOR FINAL DE CONVÊNIO - R\$ 32.366.497,82

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

AS DESPESAS EM DECORRÊNCIA DO OBJETO DESTE ADITIVO CORRERÃO POR CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15 451 1025 2044
 ELEMENTO DA DESPESA: 4490.51
 FONTE DE RECURSOS: 1001
 RESERVA ORÇAMENTÁRIA: 4831

CLÁUSULA TERCEIRA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO FUNDAMENTO LEGAL O ARTIGO, 65, I, "A" E "B", II E § 1º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, E SUAS ALTERAÇÕES.

CLÁUSULA QUARTA -DA RATIFICAÇÃO:

SÃO MANTIDAS TODAS AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO Nº 2.08.008/2018/SEC0B/PMCG, DESDE QUE NÃO CONTRARIADAS PELO PRESENTE TERMO ADITIVO.




ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS

CLAUSULA QUINTA – DO FORO:


PARA DIRIMIR AS QUESTÕES DECORRENTES DESTE ADITAMENTO DE CONTRATO AS PARTES RATIFICAM QUE ELEGEM O FORO DE CAMPINA GRANDE/PB, RENUNCIANDO A QUALQUER OUTRO POR MAIS PRIVILEGIADO QUE SEJA. E POR ESTAREM DE PLENO ACORDO FOI LAVRADO O PRESENTE TERMO EM 03(TRÊS) VIAS DE IGUAL TEOR E FORMA PARA UM SÓ EFEITO, QUE AS PARTES CONTRATANTES ASSINAM NA PRESENÇA DAS TESTEMUNHAS QUE A TUDO ASSISTIRAM.


CAMPINA GRANDE/PB, 26 DE MARÇO DE 2021


FERNANDA RIBEIRO B. S. ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE OBRAS
CONTRATANTE


JOSÉ DE ARIMATEA ROCHA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:


NOME: 47 50.715.354-68


NOME: 063.994.994-02



Estado da Paraíba
 Prefeitura Municipal de Campina Grande
 Secretaria Municipal de Obras

**DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE DOTAÇÃO
 ORÇAMENTÁRIA E DECLARAÇÃO**

OBJETO: Termo Aditivo ao contrato Nº 2.08.008/2018 – Concorrência Nº 2.08.002/2018 – Recapeamento asfáltico nos bairros: Alto Branco, Bela Vista, Bodocongó/Ramadinha I, Catolé, Centenário, Centro, Conceição, Cruzeiro, Dinamérica, Distrito Industrial, Estação Velha, Itararé, Jardim Paulistano, Jardim Tavares, Jose Pinheiro, Liberdade, Malvinas, Monte Santo, Nova Brasília, Novo Bodocongó/Araxá, Palmeira, Prata, Presidente Médici, Quarenta, Ramadinha, Sandra Cavalcante, Santa Cruz, Santa Rosa, Santo Antonio, São José, Serrotão, Tambor, Três Irmãs, Universitário, Velame, Vila Cabral e nos Distritos de Galante e São José da Mata no município de Campina Grande – PB.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15 451 1025 2044 – Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária.
 Elemento da Despesa: **4490.51**
 Fonte de Recursos: **1001**


VALOR ESTIMADO DA DESPESA GERADA: R\$ 3.536.449,97

DOTAÇÃO ATUALIZADA R\$ 4.563.108,81

RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 4831

Declaro para os devidos fins, que a geração de despesa, referente objeto acima descrito, tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA), como também, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Campina Grande – PB, 23 de Março de 2021.


Fernanda Ribeiro Barbosa S. Albuquerque
 Secretária de Obras



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA
CNPJ: 09.323.098/0001-92

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:25:00 do dia 29/10/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/04/2021.

Código de controle da certidão: **30CF.DCC7.3817.A3E8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.



CERTIDÃO

CÓDIGO: **ECA7.0F17.5EA0.4446**

Emitida no dia 23/03/2021 às 07:27:44

Nome Empresarial:

CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA

Endereço:

ALVARO DE ARAUJO PEREIRA

Número:

255

Complemento:

Bairro:

JARDIM TAVARES

Município:

CAMPINA GRANDE

CEP:

58402-300

Inscr. Estadual:

16.056.310-0

Situação Cadastral:

BAIXADO EX OFFICIO

CNPJ/CPF:

09.323.098/0001-92

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.**

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.

OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.



ESTADO DA PARAIBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA PARA COM A FAZENDA MUNICIPAL

Certificamos para os devidos fins, em atendimento ao requerimento protocolado sob memorando nº **12.311 /2021**, que até a presente data, não consta em nossos arquivos, débitos tributários para com a Fazenda Municipal, com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, VI da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), de responsabilidade **CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA - CNPJ 09.323.098/0001-92**, inscrito no Cadastro Municipal de Contribuinte (CMC) **10942**, ficando ressalvado à Fazenda Municipal o direito de cobrar qualquer dívida que venha a ser apurado em levantamento posterior.

Certidão expedida nos termos do art. 23, da Lei Complementar nº 050, de 29 de dezembro de 2003, combinado com os arts. 205 e 206, da Lei nº 5.172, de 25.10.1966 (Código Tributário Nacional) e Portaria nº 035/2006 – GS/SEMUT, de 29 de maio de 2006.

Válida por 90 (noventa) dias

Campina Grande, 25 de março de 2021.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 54FE-C9AF-15C5-DDDE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CLÁUDIO ROBERTO DA SILVEIRA (CPF 363.368.074-87) em 25/03/2021 11:44:40 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/54FE-C9AF-15C5-DDDE>



RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 07/04/2021 às 12:26:02 foi protocolizado o processo sob o N° 06280/21 da subcategoria Termo Aditivo , exercício 2021, referente a(o) Secretaria de Obras e Serviços Urbanos de Campina Grande, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Helga Valeria Casullo de Araujo.

N° de Ordem do Aditivo: 8º Aditivo

Data da Assinatura do Aditivo: 26/03/2021

Data de Publicação do Aditivo: 26/03/2021

Tipo do Aditivo: Aditivo de Valor

Valor Adicionado: R\$ 3.536.449,97

Justificativa: O Contrato nr 2.08.008/2018 terá acréscimo de R\$ 3.536.449,97(tres milhões,quinhentos e trinta e seis mil,quatrocentos e quarenta e nove Reais e noventa e sete centavos) ao valor atual que era de R\$ 34.147.903,10(trinta e quatro milhões,cento e quarenta e sete mil,novecentos e tres Reais e dez centavos), passando o mesmo para R\$ 37.684.353,07(trinta e sete milhões,seiscentos e oitenta e quatro mil,trezentos e cinquenta e tres Reais e sete centavos).

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não

Documento	Informado?	Autenticação
(7) [PDF] Demonstrativo de vantajosidade econômica da prorrogação contratual, nos contratos de prestação de serviços de natureza contínua	Não	
(8) [PDF] Termo Aditivo	Sim	56c35cf3b3f2dc9d6fc1ef9bcd0574bd
[PDF] Certidão negativa de débitos perante a Justiça do Trabalho e prova atual do cumprimento de acordo trabalhista, quando houver	Sim	d9e0d3e4c52483f3ea98161ab2b4b5b9
[PDF] CPF ou CNPJ	Sim	c6fb0f2cfd42a081d79b10bc8e7ae56d
[PDF] Justificativa técnica	Sim	3831096b537dba932a201f0a890ed430
[PDF] Parecer jurídico, Lei 8.666/93, no seu art. 38	Sim	1b44e18457e3d36f6c40c9bc1aa00d08
[PDF] Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal	Não	
[PDF] Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal	Sim	da975593b2ae74be70a990c5eb35ded4
[PDF] Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS se Pessoa Jurídica	Sim	9cf0451dbdf5f61bd69096d05e6e8e10
[PDF] Publicação do Extrato de Aditivo	Sim	7b398b22d1603d29af426ee2a5178c8c
[PLANILHA] Planilhas com as alterações contratuais	Sim	4ce23f458ef6956dad09f823b99a3c27

João Pessoa, 07 de Abril de 2021



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB
